INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla, Mayo de 2026

Señor(a)
MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA
Supervisor(a) contrato nro. 9082920
Coordinador Académico Construcción
CONSTRUCCIÓN
Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mayo del año 2026

Referencia: No 9082920 del año 2026

YAMIL ENRIQUE CASTRO FONTALVO, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 8639186, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: c). un pago correspondiente al mes de Mayo de 2026 por valor de ($ 3.553.123). Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta AHORROS No. 293181913 BANCO DE BOGOTA, cuyo titular es el Contratista.

Plazo: Será hasta el 30 de Noviembre de 2026.

Objeto: Desarrollar formación profesional por competencias laborales, mediante la estrategia de aprendizaje por proyectos en los programas de formación de CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, participando en los equipos de diseño y desarrollo curricular y gestionando las actividades y proyectos a través de las tecnologías de la información y la comunicación que brinda la entidad, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente.

Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias

1	Planear procesos de formación que respondan a las necesidades de los gruposEjecutar procesos de enseñanza y aprendizajeEvaluar los aprendizajes de los estudiantesParticipar en la elaboración, actualización y revisión de los diseños curricularesActuar con pasión en su ejercicio laboral y profesionalMantener una comunicación permanente y continua con los aprendices.Motivar y concientizar a los aprendicesGuiar y orientar a los aprendices en el uso de las herramientas del LMSDominar las diferentes competencias del programaAplicar el enfoque pedagógico y metodológico del SENA.	Se realizó la inducción del programa. Las competencias y los procesos de formación y de prácticas que se realizarán en el programa.Se está realizando las visitas al corregimiento de san juan de tocagua. Para iniciar el proyecto de placa huella con la comunidad	Se toman evidencias FOTOGRÁFICAS del proceso o desarrollo de la construcción de la placa huella en san juan de tocagua y en los ambientes de formación que se usen para la formación. Se inició la formación el 02 de marzo en el nodo de las industrias de la construcción y en el corregimiento de san Juan de tocagua.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. 4653785093 - NUEVO SOI referente al mes de Abril.

Cordialmente,

YAMIL ENRIQUE CASTRO FONTALVO

Contratista

C.C. No. 8639186

MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA

Supervisor del contrato 9082920 de 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO. PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA. MUNICIPIO DE LURUACO.
INSTRUCTOR. YAMIL ENRIQUE CASTRO FONTALVO. Mayo del 2026.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

1. **Localización y replanteo**
    - Levantamiento topográfico.
    - Marcación de ejes, anchos y cotas.
    - Definición de pendientes longitudinales y transversales.
2. **Limpieza y descapote**
    - Retiro de vegetación, basura y material orgánico.
    - Tala y rocería si aplica.
    - Remoción de capa vegetal.
3. **Movimiento de tierras**
    - Excavaciones.
    - Corte y conformación de la rasante.
    - Rellenos y mejoramiento del terreno.
    - Transporte y disposición de material sobrante.
4. **Conformación y compactación de la subrasante**
    - Nivelación del terreno.
    - Humectación.
    - Compactación con equipo mecánico.
    - Ensayos de densidad y control de calidad.
5. **Construcción de drenajes**
    - Cunetas laterales.
    - Alcantarillas.
    - Filtros o drenajes longitudinales.
    - Obras de manejo de aguas lluvias.
6. **Colocación de subbase granular**
    - Extendido del material granular.
    - Humectación y compactación.
    - Verificación de espesores y pendientes.
7. **Formaletas y preparación para concreto**
    - Instalación de formaletas.
    - Definición de las franjas de rodadura.
    - Colocación de separadores y alineación.
8. **Instalación del acero de refuerzo** (si el diseño lo requiere)
    - Malla electrosoldada o varillas.
    - Amarres y separadores.
9. **Fundida de las placas de concreto**
    - Producción o suministro del concreto.
    - Transporte y vaciado.
    - Vibrado y nivelación.
    - Conformación de las huellas.
10. **Construcción de la franja central**

- Concreto, piedra pegada o material granular.
- Acabado según diseño.

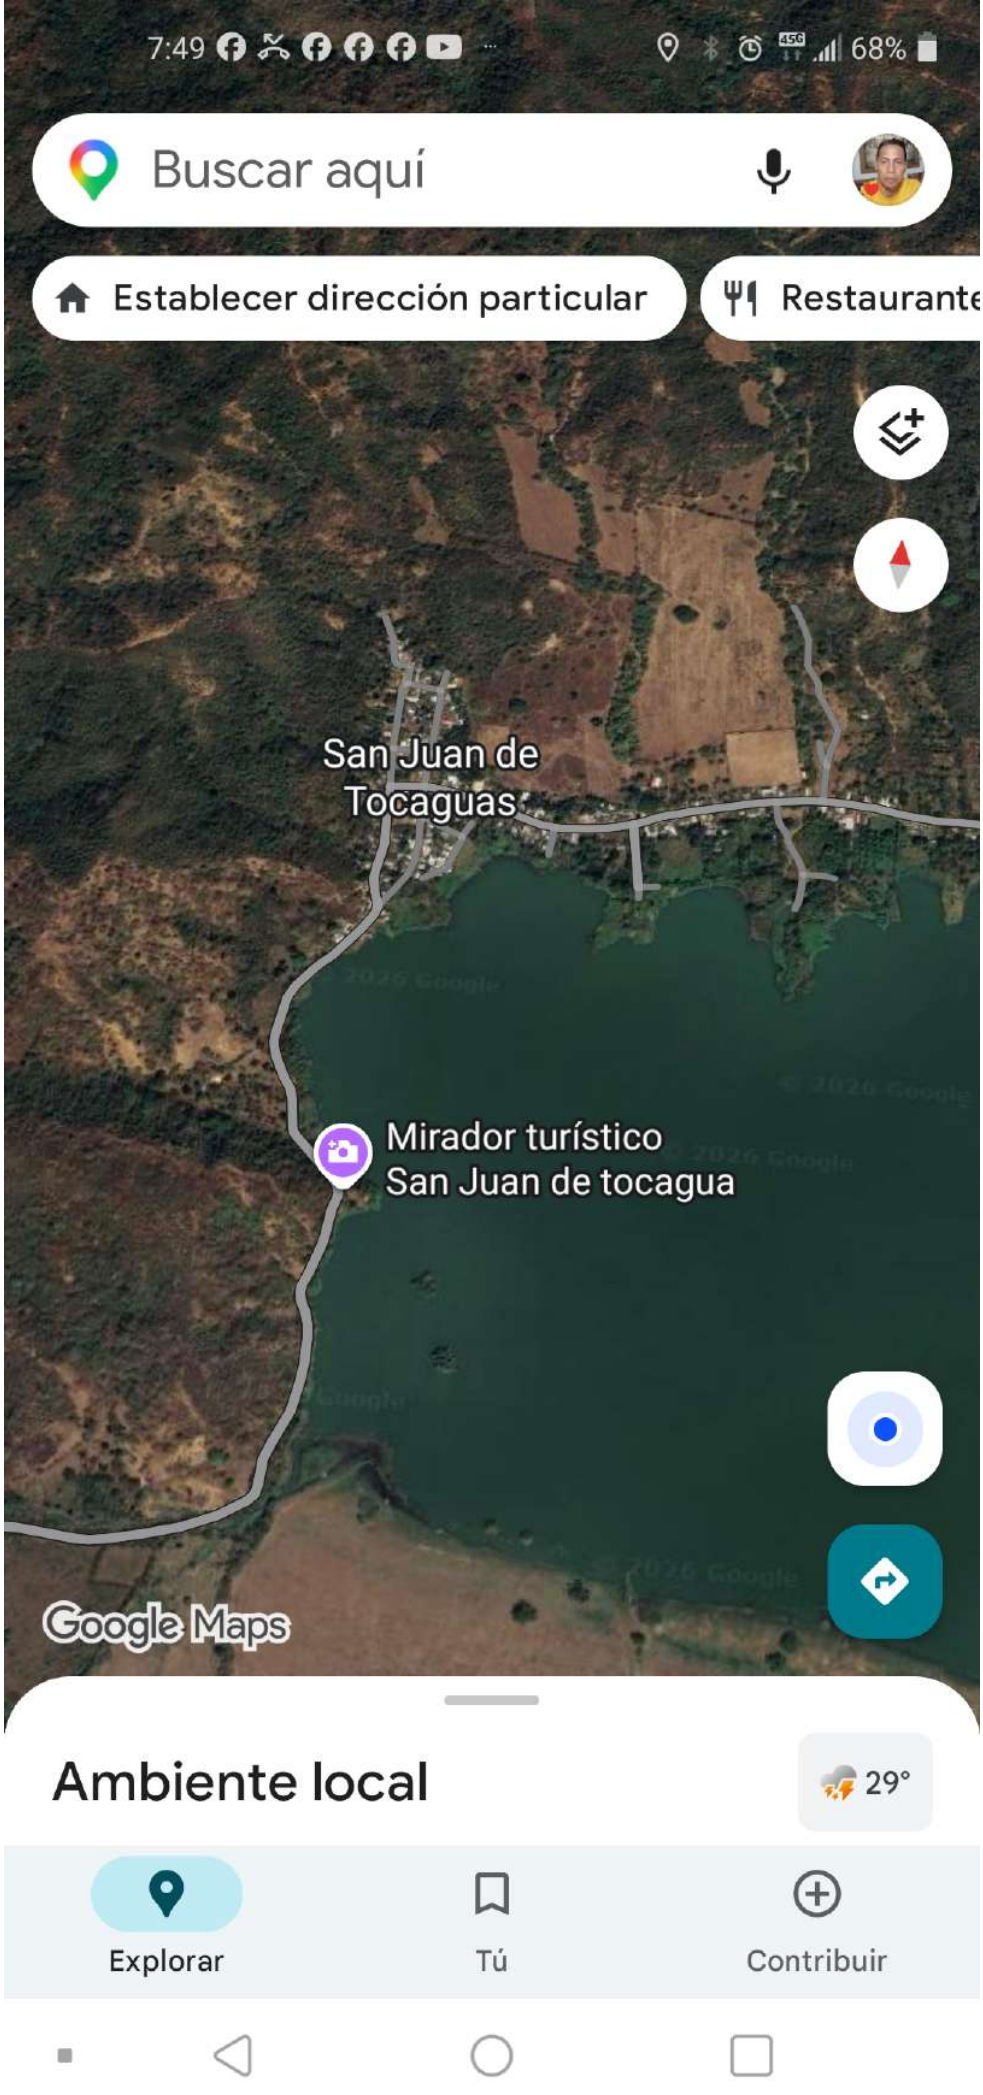
11. **Acabados superficiales**
- Rayado o texturizado antideslizante.
- Afinado de bordes.
- Sellado de juntas.

12. **Curado del concreto**
- Aplicación de agua o membrana de curado.
- Protección contra tránsito prematuro.

13. **Construcción de obras complementarias**
- Bordillos.
- Muros de contención.
- Disipadores.
- Señalización vial.

14. **Limpieza final y entrega**
- Retiro de formaletas y sobrantes.
- Limpieza del área.
- Apertura al tránsito.

15. **Control de calidad**
- Ensayos de concreto.
- Verificación de espesores.
- Revisión de compactación y pendientes.


7:49
68%
Buscar aquí
Establecer dirección particular
Restaurante
San Juan de Tocaguas
Mirador turístico San Juan de tocagua
Google Maps
Ambiente local
29°
Explorar
Tú
Contribuir


HERRADO


HERRACOL










PROMIGAS





