D&C Distribuciones Eléctricas De Colombia S.A.S
NIT: 901450.243-1
Bogotá - Cundinamarca

Distribuciones
Eléctricas
De Colombia

Lunes 27 de abril de 2026

Señores:

CONSORCIO PARQUE VILLA ALBA 2025
NIT. 902.020.097

Estimado CONSORCIO PARQUE VILLA ALBA 2025, tenemos la siguiente información relacionada a la orden de compra N° 2773-2026 llevada a cabo el día 20 de marzo de 2026, la cual hace referencia al siguiente material:

PRODUCTO - MATERIAL	CANTIDAD
POSTE METÁLICO DE 8 M X 510 KG	9,00
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02	9,00

Queremos hacerles saber, que ya se ha llevado el proceso completo de construcción de los postes metálicos y su embalaje. Hemos realizado las pruebas pertinentes según la norma ASTM A572 y las láminas cumplen con todas las especificaciones técnicas y de desarrollo para su posterior envío.

3102849851 dycdistricolsas@gmail.com www.dycdistricolsas.com

D&C Distribuciones Eléctricas De Colombia S.A.S
NIT: 901450.243-1
Bogotá - Cundinamarca

Distribuciones
Eléctricas
De Colombia

Siguiendo los lineamientos de preparación, elaboración, embalaje y envío de productos que se encuentren dentro del perímetro de la ciudad de Bogotá, sus productos quedan relacionados de la siguiente manera:

Recogida en bodega N°2: Jueves 30 de abril de 2026

Transporte: Jueves 30 de abril de 2026

Entrega: La entrega se realizará el día 02 de mayo de 2026 en
PARQUE BARRIO VILLA ALBA, JURIDISCCIÓN DE PACHAQUIARO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META

Hora: 10:00 A.M.

Para DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA el compromiso y la responsabilidad con nuestros clientes es parte fundamental de nuestra misión general, entendemos los atrasos que se puedan llevar a cabo en sus proyectos, pero son situaciones externas que generan una serie de incomodidades y ponen en riesgo el sistema de entregas de nuestros productos.

Esperamos se siga ratificando la confianza en nuestra compañía, trabajaremos en mejorar los espacios, los sistemas y los procesos de elaboración para no generar estas situaciones.

Atentamente,

JAVIER PINEDA HERNANDEZ
GERENTE GRAL

3102849851 dycdistricolsas@gmail.com www.dycdistricolsas.com

INFORME DE OBRA
PERIODO DEL *31,12,26* ***AL*** *09, 04, 26*
FECHA DE PRESENTACIÓN: *29, 04, 26*
AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02

INFORMACIÓN BASICA					
TIPO DE CONTRATO:	*OBRA*				
CONTRATO N° :	*103.13.09.04-2025*				
OBJETO CONTRATO:	*CONSTRUCCION URBANISTICA Y ARQUITECTONICA DEL PARQUE VILLA ALBA EN EL CORREGIMIENTO DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META.*				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($563.514.023,60)*				
CONTRATISTA:	*CONSORCIO PARQUE VILLA ALBA 2025*				
CORREO ELECTRONICO:	*consorciovillaalba@hotmail.com*				
FECHA DE INICIACIÓN:	*31 – 12 – 2025*				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*0*	***Meses***	*1*	***Días***	
FECHA DE TERMINACIÓN:	*31 – 12 – 2025*				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*103.13.07.09-2025*				
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION URBANISTICA Y ARQUITECTONICA DEL PARQUE VILLA ALBA EN EL CORREGIMIENTO DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META.*				
CORREO ELECTRONICO:	*yacon.ingenieria@gmail.com*				
SUPERVISOR ASIGNADO:	*MARYLIN PAOLA CRUZ FONSECA*				
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*29/12/2025*				
CORREO ELECTRONICO:	*secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co*				

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
SUSPENSIÓN N° 01:				*31/12/2025*
TIEMPO:	*0*	***Meses***	*14*	***Días***

NIT. 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co


REINICIO N° 01:				*14/01/2026*
PRORROGA N° 01:				*14/01/2026*
TIEMPO:	*3*	***Meses***	*0*	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*14/04/2026*
AMPLIACION N° XX A SUSPENSION N°XX:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
MODIFICACIÓN N°XX:				*N/A*
VALOR MODIFICADO:				*N/A*
FECHA ADICIONAL N° XX:				*N/A*
VALOR ADICIONAL :				*N/A*
VALOR ACTUALIZADO :				*N/A*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:				*14/04/2026*

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	***PUERTO LÓPEZ***	***VEREDA:***	***PACHAQUIARO***
CORREGIMIENTO:	***PACHAQUIARO***	***BARRIO:***	***VILLA ALBA***
COORDENADAS:	***LATITUD: 4° 3'16.23"N*** ***LONGITUD: 73°10'1.94"O***		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

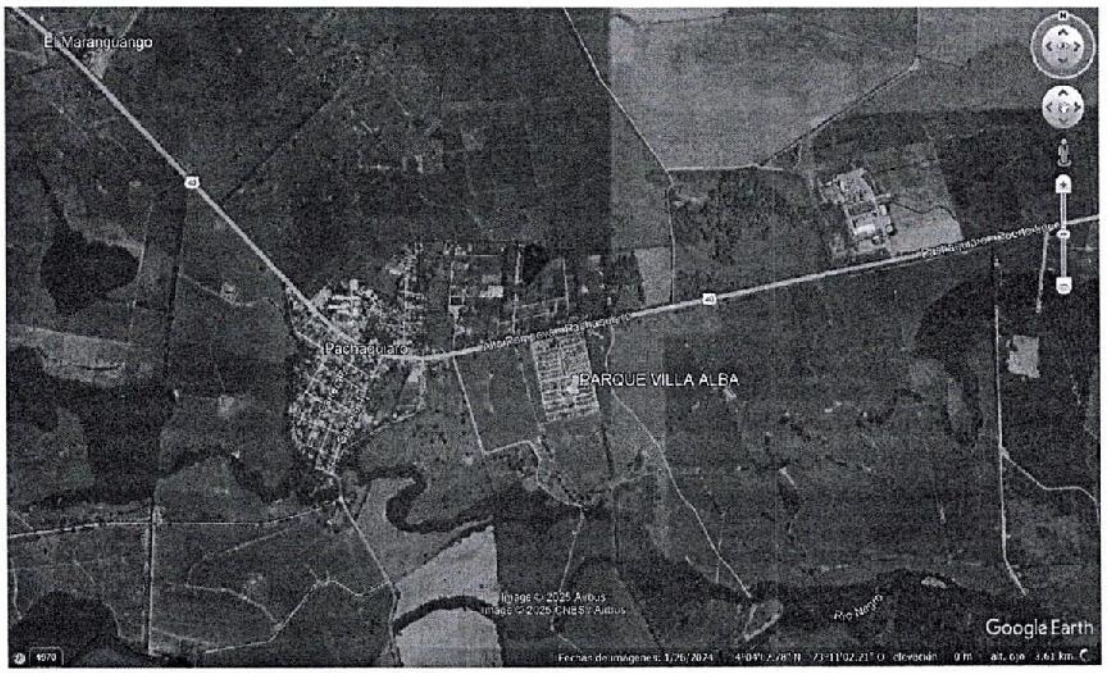

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGR	100 %	$ 5.350.201,63	100 %	$ 5.350.201,63	99,97 %	$ 5.348.616,05	99,97 %	$ 5.348.616,05

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

AFICA, CARTERA Y PLANOS								
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	100 %	$ 18.599.006,84	100 %	$ 18.599.006,84	97.44 %	$ 18.122.351,52	97.44 %	$ 18.122.351,52
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 5" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPOPESADO	100 %	$ 15.203.272,82	100 %	$ 15.203.272,82	62.32 %	$ 9.474.689,92	62.329 %	$ 9.474.689,92
SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCI	100 %	$ 19.872.605,51	100 %	$ 19.872.605,51	65.77 %	$ 13.071.160,00	65.77 %	$ 13.071.160,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION								
DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	*100%*	*$ 4.238.416,92*	*100%*	*$ 4.238.416,92*	*100%*	*$ 4.238.416,92*	*100%*	*$ 4.238.416,92*
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA	*30,00%*	*$ 16.552.822,85*	*30,00%*	*$ 16.552.822,85*	*97.85%*	*$ 16.197.297,00*	*97.85%*	*$ 16.197.297,00*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

SUPERFICIE DE APOYO								
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	25,00 %	$ 20.522.351,85	25,00 %	$ 20.522.351,85	99.52 %	$ 20.424.626,37	99.52 %	$ 20.424.626,37
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0,00 %	$ 11.339.830,18	0,00 %	$ 11.339.830,18	100%	$ 11.339.830,18	100 %	$ 11.339.830,18
MALLA ELECTRO SOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA.	0,00 %	$ 9.798.792,48	0,00 %	$ 9.798.792,48	83.36 %	$ 8.167.816,96	83.36 %	$ 8.167.816,96

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co
