
1. DIRECCIÓN: Carre 7J entre Calles 69 y 69A Los Pinos Comuna 7

2. INSERTAR ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA VÍA (Andén, Muro, Puente peatonal, Puente vehicular, Cicloinfraestructura, Cuneta, Alcantarilla, etc)

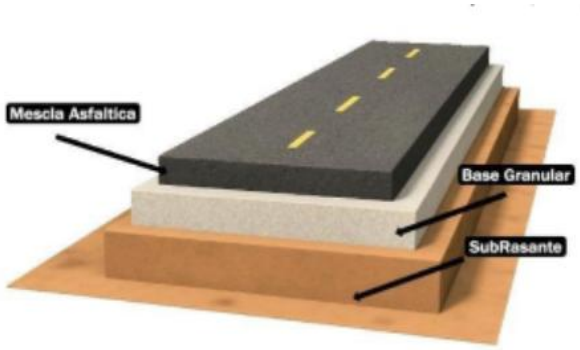

3.DESCRIPCIÓN: (Descripcion general del proyecto, mencionando las bondades del mismo y como influye positivamente en la comunidad la construccion del proyecto):

Según la visita realizada por la Secretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial, para conocer y atender las diferentes necesidades conforme al plan de desarrollo de la población en la comuna 7. Se realizó visita técnica en la Carrera 7J entre Calles 69 y 69A (ambos sentidos), donde se evidenció que, la vía cuenta con un pavimento flexible en carpeta asfáltica, la cual se encuentra en un mal estado con desprendimiento de material granular, huecos, abultamientos, baches y desgaste en general. Dicho lo anterior, se hará un MANTENIMIENTO DE LA VIA, el cual se realizara cambio total de la carpeta asfáltica mediante la demolicion y fresado de la capa de rodadura, mejoramiento de la estructura (BASE) y nivelación de cámaras y sumideros. se recomienda una carpeta asfáltica de 4 pulgadas ya que posee un tráfico mixto de vehículos pesados y livianos.

4. QUIEN FORMULA EL PROYECTO

4.1 NOMBRE: Juan Pablo Ortiz Saravia

4.2 CARGO: CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
