

1. INSERTAR ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA VÍA (Con especificaciones Técnicas, espesor, longitud, de acuerdo a lo consignado en el presupuesto)

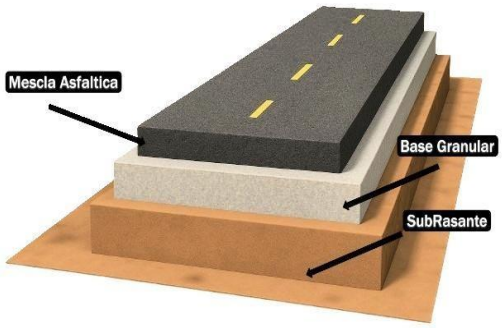



2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (Incluir la descripcion de cada actividad):

1. Actividades preliminares

Se realizan los estudios y trabajos iniciales necesarios para la ejecución del proyecto:

Localización y replanteo topográfico.
Señalización temporal y manejo de tráfico.
Limpieza, desbroce y retiro de capa vegetal.
Demoliciones (en caso de rehabilitación o reconstrucción).
2. Movimiento de tierras

Comprende la conformación de la estructura de soporte:

Excavación en corte o relleno según diseño.
Mejoramiento del terreno de fundación si es requerido.
Conformación y compactación de la subrasante, garantizando la capacidad portante especificada (CBR o módulo resiliente).
3. Construcción de subbase y/o base

Se ejecutan las capas granulares o estabilizadas que soportan la losa de concreto:

Extendido del material granular (subbase/base).
Humectación y conformación.
Compactación por capas hasta alcanzar la densidad especificada.
Control de calidad (densidad, humedad, espesor).
4. Colocación de formaletas o sistema de encofrado
Instalación de formaletas metálicas o sistemas deslizantes.
Verificación de alineamiento, nivel y geometría de la vía.
5. Instalación de elementos de transferencia de carga

3. QUIEN FORMULA EL PROYECTO:

3.1 NOMBRE: Miguel Angel Benitez Payan

3.2 CARGO: Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde
