	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 1 Del: 17 de JUNIO DE 2020 AL 21 DE JUNIO DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 10%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 23 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA -EL TRIUNFO MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	0,000%	0,00%
Valor de la Obra		

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ -

	TOTAL FRENTES	SIN INICIAR	INICIADOS	TERMINADOS
Frentes de obra	4	4	0	0

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	LOPECA S.A.S
Contrato No.	034-2020
Valor Inicial	$ 6.517.442.650,00
Valor Actualizado:	$ 6.517.442.650,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	CONSULTORES DONOVAN SAS
Contrato No.	037 DE 2020
Valor Inicial:	$ 661.839.734,00
Valor Actualizado:	$ 661.839.734,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Del 17 de junio de 2020 - al 21 de junio del 2020

Para la presente semana se inició con el levantamiento topográfico en los tramos 1 y 2 del proyecto

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se tiene contemplano continuar con el levantamiento topografico en los tramos 3 y 4 del proyecto

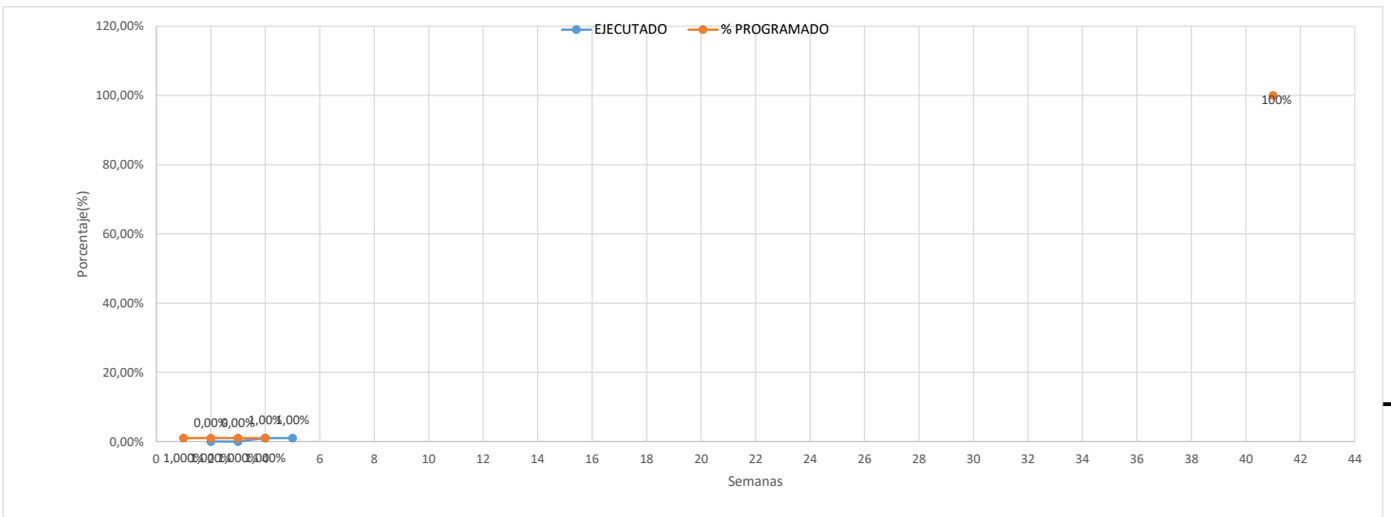

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Para el corte del presente informe el avance físico completado es del 1%, teniendo en cuenta la programación aprobada por interventoria mediante comunicado DON-ICUU-061-20, no se han iniciado con actividades constructivas toda vez que el contratista de obra se encuentra realizado el levantamiento topográfico de los cuatro tramos

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 1 Del: 17 de JUNIO DE 2020 AL 21 DE JUNIO DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 10%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 23 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas

FOTOGRÁFICO



Foto 1 VISITA DE REINICIO OBRA
Tramo: No. 4



Foto 2. LOCALIZACION PLACAS GPS
ramo: No. 1



Foto 3. PLACA GPS No.2
Tramo: No.1



Foto 4.POSICIONAMIENTO EQUIPO TOPOGRAFICO GPS
Tramo No.1

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 1 Del: 17 de JUNIO DE 2020 AL 21 DE JUNIO DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 10%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 23 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas



Foto 5. RECOLECCION DE DATOS GPS Y AMARRE CON PLACA No.1
Tramo. No.1



Foto 6. LOCALIZACION K0+000 POR COORDENADAS GPS
Tramo. No.1



Foto 7 . POSICIONAMIENTO PARA OBTENER COORDENADAS RTK PLACA No. 3



Foto 8 . TOMA DE SECCIONES TRANSVERSALES Y LOCALIZACION DE EJES
Tramo. No.1



Foto 9 .TOMA DE SECCIONES TRANSVERSALES Y LOCALIZACION DE EJES
Tramo. No. 1



Foto 9 .TOMA DE DETALLES DE TERRENO
Tramo. No. 1

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 1 Del: 17 de JUNIO DE 2020 AL 21 DE JUNIO DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 10%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 23 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas



Foto 10 .LOCALIZACION COORDENADA FINAL DEL TRAMO 1
Tramo. No.1



Foto 12 . LEVANTAMIENTO PLACA HUELLA EXISTENTE
Tramo. placa existente entre tramo No.2 y tramo No.3



Foto 13 . LEVANTAMIENTO PLACA HUELLA EXISTENTE
Tramo. placa existente entre tramo No.1 y tramo No.2



Foto 14 . LEVANTAMIENTO PLACA HUELLA EXISTENTE
Tramo. placa existente entre tramo No.1 y tramo No.2



Foto 15 . INSTALACION BAÑOS PORTATILES PARA PERSONAL DE LA OBRA
Tramo. No.2 (Oficina constratista)



Foto 16 INSTALACION BAÑOS PORTATILES PARA PERSONAL DE LA OBRA
Tramo. No.2 (Oficina constratista)

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 1 Del: 17 de JUNIO DE 2020 AL 21 DE JUNIO DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 10%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 23 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas



Foto 17 . MATERIALIZACION DE PUNTO GPS PARA AMARRE
Tramo.No.2



Foto1 8 . REPLANTEO ABSCISADO
Tramo. No. 2



Foto 19 . LOCALIZACION DE EJES Y TOMA DE SECCIONES TRANSVERSALES
Tramo. No. 2



Foto 20 . LOCALIZACION DE EJES Y TOMA DE SECCIONES TRANSVERSALES
Tramo. No. 2

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Ing. DIEGO IGNACIO ARENAS
