	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 8 Del: 27 DE JULIO DE 2020 AL 2 DE AGOSTO DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 27%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 64 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor: Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría: Diego Ignacio Arenas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA -EL TRIUNFO MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	1,09%	5,21%
Valor de la Obra	$ 71.040.124,89	$ 339.558.762,07

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	0,6673%	1,1505%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 43.490.734,63	$ 74.984.879,34

	TOTAL FRENTES	SIN INICIAR	INICIADOS	TERMINADOS
Frentes de obra	4	4	0	0

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	LOPECA S.A.S
Contrato No.	034-2020
Valor Inicial	$ 6.517.442.650,00
Valor Actualizado:	$ 6.517.442.650,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	CONSULTORES DONOVAN SAS
Contrato No.	037 DE 2020
Valor Inicial:	$ 661.839.734,00
Valor Actualizado:	$ 661.839.734,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Del 27 de julio de 2020 - al 2 de agosto del 2020

Replanteo y perfilación piso de estructura de descole k0+510
• Colocación de concreto ciclópeo de 200 psi y piedra rajón para atraque de tubería 36" concreto K0 + 510
• Verificación de alcantarilla existente k 0+290
• Relleno para estructuras para paso provisional vehicular compactado K0 + 510
• Figurado de hierro para refuerzo placa huella.
• Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos k0+030 al k0+ 200. Incluye nivelación y compactación.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
• Colocación de refuerzo para estructura de encole alcantarilla de 36" concreto K0+ 510.
• Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos k0+200 al k0+ 290. Incluye nivelación y compactación.
SUBDRENAJE.
• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN k0+190 a k0+290
• MATERIAL GRANULAR FILTRANTE k0+190 a k0+290.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana y de acuerdo a la programación aprobada por interventoría, se tiene programado lo siguiente:
1. Terminar alcantarilla 36" concreto k0+510
2. Cotinuar con construccion para estrucutura de pavimento incluye subbase - sebdrenaje tramo 1 km0+030 a k0+190

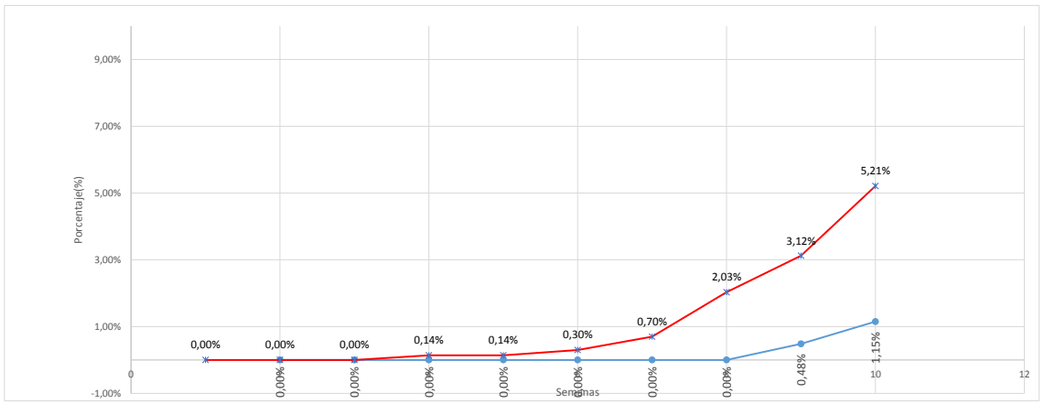

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Para el corte del presente informe el avance financiero programado del 3,12% versus un avance financiero ejecutado del 0,,483%, se empieza a evidenciar un atraso financiero del 2,63%, respecto al avance fisico, te tiene programado 16% versus un 9% ejecutado, esto de acuerdo a la programación aprobada por interventoria, el atraso financiero obedece a que el contratista de obra no ha iniciado con las actividades relevantes de obra en el tramo 2

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 8 Del: 27 DE JULIO DE 2020 AL 2 DE AGOSTO DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 27%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 64 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA K0+510 ESTRUCTURA DE DESCOLE



Foto 2. COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO PARA ATRAQUE DE ALCANTARILLA 36" K0+510
Tramo: No. 1



Foto 3. COLOCACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA DE ENCOLE K0 +510
Tramo: No. |



Foto 4 . EXCACVACION A MQUINA PARA CONSTRUCCION DE SUBDRENAJE K0 + 200

Tramo No. 1.



Foto 5. COLOCACION DE GEOTEXTIL PARA SUBDRENAJE. COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE K0+200

Tramo No.1



Foto 6. RELLENO PARA ESTRUCTURAS COSTADO IZQUIERDO (CUNETA) K0+220

Tramo No.1



Foto 7. VEERIFICACIION DE TUBERIAS EXISTENTES DE ACUEDUCTO K 0 +320 TRAMO 1.



Foto 8. EXCAVACION DE CAJON PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+160
Tramo No.1



Foto 9 . EXCAVACION DE CAJON PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+020
Tramo No.1



Foto 10 . EXCAVACION DE CAJON PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+160
Tramo No.1
.



Foto 11 . EXCAVACION DE CAJON PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+110
Tramo No.1
.



Foto 10 . EXCAVACION DE CAJON PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+200. CONTROL TOPOGRAFICO
Tramo No.1
.

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 8 Del: 27 DE JULIO DE 2020 AL 2 DE AGOSTO DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 27%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 64 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas



Foto 13 . EXCAVACION DE CAJON PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+120. COMPACTACION DE SUBRASANTE



Foto 14. EXCAVACION Y ESTABILIZACION DE FALLO EXISTENTE COSTADO DERECHO K 0+ 030 .TRAMO 1.

OBSERVACIONES

• Se debe continuar con el monitoreo en el k 2 +220 en relación al deslizamiento de talud por filtraciones de agua. SE INFORMA QUE LA ALCANTARILLA A CONSTRUIR EN EL TRAMO 1 K0+390 NO SE TIENE DESCOLE YA QUE SE TIENE UN PREDIO PRIVADO SIN POSIBILIDAD DE AFECTACION.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Ing. DIEGO IGNACIO ARENAS
