	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 13 Del 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido:** 41%

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 99 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor: Sandra Rocio Castillo — Nombre del Director de interventoría: Diego Ignacio Arenas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA -EL TRIUNFO MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	2,89%	17,64%
Valor de la Obra	$ 188.354.092,59	$ 1.149.676.883,46

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	1,0860%	7,82%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 70.777.368,83	$ 509.399.613,58

	TOTAL FRENTES	SIN INICIAR	INICIADOS	TERMINADOS
Frentes de obra	4	1	3	0

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	LOPECA S.A.S
Contrato No.	034-2020
Valor Inicial	$ 6.517.442.650,00
Valor Actualizado:	$ 6.517.442.650,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	CONSULTORES DONOVAN SAS
Contrato No.	037 DE 2020
Valor Inicial:	$ 661.839.734,00
Valor Actualizado:	$ 661.839.734,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRAMO 1.

• COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA DEL K0+020 AL K0+090 COSTADO DERECHO.
• COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 2000 PSI Y 40% DE RAJÓN K0+200 K0+280.
• COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA Y VIGAS RIOSTRAS K0+090 A K0+090 COSTADO DERECHO.
• EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN, DE FILTRO COSTADO DERECHO PARA SUBDRENAJE K0+120 K0+190.

TRAMO 3.


• EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO COSTADO IZQUIERDO PARA SUBDRENAJE K2+261 A K2 + 475.
• COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA FILTRO DE SUBDRENAJE COSTADO IZQUIERDO PARA SUBDRENAJE K2+261 A K2 + 475.
• COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PARA FILTRO DE SUBDRENAJE COSTADO IZQUIERDO PARA SUBDRENAJE K2+261 A K2 + 475.

TRAMO 4.

• **I**NICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, K4 + 167. EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN PARA DESVIÓ Y MANEJO DE AGUAS.
• LIMPIEZA DE BOX COULVERT EXISTENTE K4 + 167. SE OBSERVA UN PUENTE EN ARCO EN PIEDRA DE HACE 100 AÑOS APROXIMADAMENTE.
• VISITA POR PARTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT EXISTENTE K4 + 167, PARA DEFINIR LAS AFECTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana y de acuerdo a la programación aprobada por interventoría, se tiene programado lo siguiente:
1. COLOCACION DE REFUERZO K0+310 K0+360. COLOCACION DE CONCRETO PLACA HUELLA K0+310 K0+360.
2. CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE FILTRO TRAMO 2
3. CONTINUACION CONSTRUCCION ALCANTARILLA 36” CONCRETO K1 + 975
4. CONTINUACION BOX COULVERT K4+175.

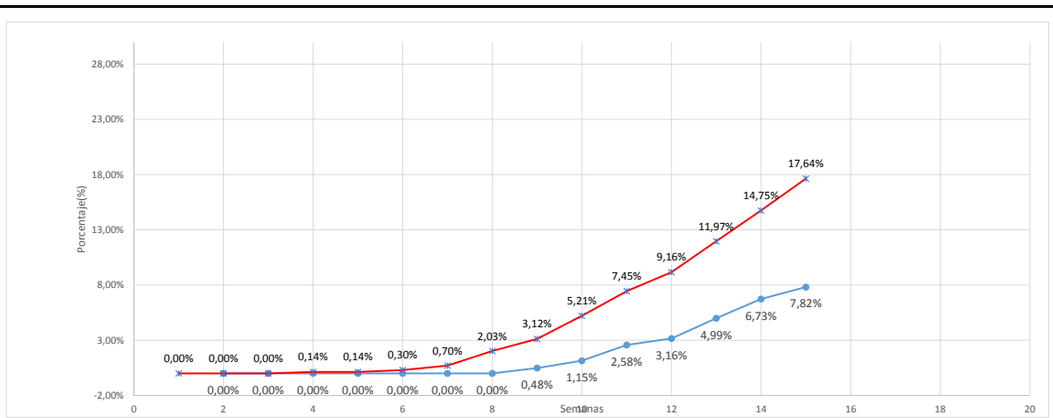

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 13 Del 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 41%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 99 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Para el corte del presente informe el avance financiero programado del **17,64%** versus un avance financiero ejecutado del **7,82%**, se empieza a evidenciar un atraso financiero del **9,82%**, respecto al avance en tiempo se lleva programado un 39**%** esto de acuerdo a la programación aprobada por interventoria, el atraso financiero obedece a que el contratista de obra no ha iniciado con las actividades relevantes de obra en **el tramo 2 QUE REPRESENTA EL 7,0% DEL AVANCE PROGRAMADO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 CONSTRUCCION DE FILTRO PARA SUBDRENAJE K2+261 K 3 + 400
Tramo: No. 3



Foto 2 TERMINACION DE ESTRUCTURA DE ENCOLE ALCANTARILLA 36" K2+261
Tramo: No. 3



Foto 3. COLOCACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLA 36" K1+965
Tramo: No. 2



Foto 4 MATERIAL PARA RELLENO DE ESTRUCTURA DE DESCOLE K0 +510
Tramo: No. 1

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 13 Del 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido:** 41%

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 99 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas



Foto 5. COLOCACION DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DE PAVIEMENTO K0+020A K0+090

Tramo No.1



Foto 6. COLOCACION CE CONCRETO PARA HUELLA EN CONCRETO CICLOPEO K0+145 K0+280

Tramo No.1



Foto 7 CONSTRUCCION DE FILTRO PARA SUBDRENAJE K0+120 K0+190
TRAMO 1.



Foto 8 CONSTRUCCION DE FILTRO PARA SUBDRENAJE K0+120 K0+190
TRAMO 1



Foto 9 COLOCACION DE ESTRUCTURA PROVISIONAL PARA PASO DE VEHICULOS
CONSTRUCCION DE BOX COULVERT K4 +175
Tramo No.4



Foto 10 COLOCACION DE ESTRUCTURA PROVISIONAL PARA PASO DE VEHICULOS CONSTRUCCION DE BOX COULVERT K4 +175

Tramo No.4

.

OBSERVACIONES

DEBIDO A LOS POSIBLES INCONVENIENTES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA K0+390. SE DEBE AJUSTAR EL FILTRO EN EL COSTADO IZQUIERDO PARA **LA INTERVENTORIA REALIZO EL BALANCE RESPECTIVO DE LAS CANTIDADES A EJECUTAR. DICHA INFORMACION SE ENTREGO AL CONTRATISTA PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES. A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO EL INFORME RESPECTIVO**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Ing. DIEGO IGNACIO ARENAS
