	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 18 Del: 28 DE SEPTIEMBRE AL 4DE OCTUBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido:** 56%

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 134 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor: Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría: Diego Ignacio Arenas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA -EL TRIUNFO MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	4,72%	31,77%
Valor de la Obra	$ 307.623.293,08	$ 2.070.591.529,91

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	3,9785%	21,79%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 259.299.240,09	$ 1.420.150.753,44

	TOTAL FRENTES	SIN INICIAR	INICIADOS	TERMINADOS
Frentes de obra	4	0	4	0

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	LOPECA S.A.S
Contrato No.	034-2020
Valor Inicial	$ 6.517.442.650,00
Valor Actualizado:	$ 6.517.442.650,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	CONSULTORES DONOVAN SAS
Contrato No.	037 DE 2020
Valor Inicial:	$ 661.839.734,00
Valor Actualizado:	$ 661.839.734,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• **SEMANA DEL 5 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE.**

TRAMO 1.

• Colocación de concreto ciclópeo costado derecho k0+090 k0+145.
• Colocación de bordillo costado izquierdo k0+180 k0+250.
• Colocación de bordillo derecho k0+100 k 0+130.
• Colocación de concreto para cuneta costado izquierdo de 3000 psi. K0+360 k0+380.
• Colocación de concreto para placa huella de 3000 psi costado derecho. K0+145 k0+270.
• Colocación de concreto para placa huella costado k0+580 k0+600.
• Verificación de compactación de subbase por parte de interventoría k+130-k0+280.
• Colocación de acero de refuerzo para placa huella k0+270-k0+145.
• Colocación de acero de refuerzo para cuneta k0+350 k0+400.
•

TRAMO 2.

• Colocación de concreto para placa huella de 3000 psi costado derecho. K1+900 k1+970.
• Colocación de concreto ciclópeo costado derecho K1+900 k1+970.
• Colocación de acero de refuerzo para placa huella k1+900 k1+970.

TRAMO 3.

• Colocación de subbase para estructura de pavimento k2+055-k2+300.
• Construcción de filtro para subdrenaje: Excavación a máquina en material común; colcoacion de geotextil; colocación de material fitrante. K2+470-K2+705 (IZQUIEERDO); K2+570+K2+705 (DERECHO)


TRAMO 4.

• Construcción de filtro para subdrenaje: Excavación a amauina en material común; colocación de geotextil; colocación de material fitrante. K3+310 + K3+675(DERECKHO); K3+680 K4+000.
• Colocación de concreto de 3000 psi para elevaciones. Alcantarilla 36" k3+675.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana y de acuerdo a la programación aprobada por interventoría, se tiene programado lo siguiente:

1. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS K0+180 - K0+280
2. CONTINUACION DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO TRAMO 2
3. CONTINUACION DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO 3.
4. CONTINUACION CONSTRUCCION ALCANTARILLA 36" CONCRETO K3 + 133 Y FILTROS COSTRADO DEREECHO K3+675 K4+175

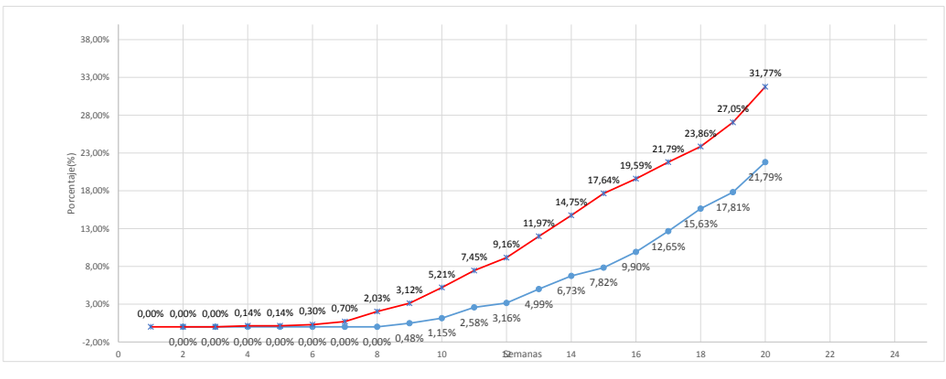

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 18 Del: 28 DE SEPTIEMBRE AL 4DE OCTUBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido:** 56%

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 134 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Para el corte del presente informe el avance financiero programado del **31,77%** versus un avance financiero ejecutado del **21,79%**, se continua con un atraso financiero del **9.88%,** respecto al avance en tiempo se lleva programado un **50%** esto de acuerdo a la programación aprobada por interventoria, el atraso financiero obedece a que el contratista de obra no ha iniciado con las actividades relevantes de obra en **el tramo 2 , tramo 3 y tramo 4.** Contratista de obra presenta plan de contingencia para mitigar el atraso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 COLOCACION DE REFUERZO Y FORMALETA EN MADERA PARA PLACA HUELLA K0 +240 COSTADO DERECHO



Foto 2 COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA K0 +190 COSTADO DERECHO
Tramo: No. 1



Foto 3 VERIFICACIN DE COMPACTACION POR INTERVENTORIA K0+600
Tramo: No. 1



Foto 4 COLOCACION CONCRETO PARA PLACA HUELLA COSTADO IZQUIERDO K0+580 K0+600
Tramo: No. 1

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 18 Del: 28 DE SEPTIEMBRE AL 4DE OCTUBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 56%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 134 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas



Foto 5. COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO K1+840 K1+900 COSTADO DERECHO

Tramo No.2



Foto 6. COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO K1+840 K1+900 COSTADO DERECHO

Tramo No.2



Foto 7 . COLOCACION DE SUBBASE PARA ESTRUCURA DE PAVIMENTOK2+155 K2 + 300 TRAMO 3.



Foto 8 . COLOCACION DE SUBBASE PARA ESTRUCURA DE PAVIMENTOK2+155 K2 + 300 TRAMO 3.



Foto 9 CONSTRUCCION DE FILTRO PARA SUBDRENAJE COSTADO DERECHO K3+560 - K3+675

Tramo No.4



Foto 10 CONSTRUCCION DE FILTRO PARA SUBDRENAJE COSTADO DERECHO K3+560 - K3+380

Tramo No.4

.



Foto 11 INCONVENIENTES POR EXCAVACIONES DESCUIDADAS POR EL CONTRATISTA PARA CONSTRUCCION DE FILTRO K3+810

Tramo No.4



Foto 10 MUESTRAS PARA VERIFICACION DE CBR DE LA SUBRASANTE POR INTERVENTORIA. K3+060

Tramo No.4

.

OBSERVACIONES

SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EN EL BOX COULVERT TRAMO 4 K4+475 POR ENCONTRAR EN SITIO UN PUENTE EN ARCO HISTORICO **SE HACE NECESARIO AJUSTAR LA CUNETA EN SU AREA EN LO REFERENTE AL MANEJO DE DRENAJE POR ESCORRENTIA EN EL TRAMO 4 K 3+675 K4+175**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Ing. DIEGO IGNACIO ARENAS
