	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 21 Del 25 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido:** 65%

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 155 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor: Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría: Diego Ignacio Arenas

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA -EL TRIUNFO MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	5,95%	48,75%
Valor de la Obra programada:	$ 387.787.837,68	$ 3.177.253.291,88

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra física ejecutada (%)	3,2000%	30,64%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 208.558.164,80	$ 1.996.944.427,96

	TOTAL FRENTES	SIN INICIAR	INICIADOS	TERMINADOS
Frentes de obra	4	0	4	0

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	LOPECA S.A.S
Contrato No.	034-2020
Valor Inicial	$ 6.517.442.650,00
Valor Actualizado:	$ 6.517.442.650,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	CONSULTORES DONOVAN SAS
Contrato No.	037 DE 2020
Valor Inicial:	$ 661.839.734,00
Valor Actualizado:	$ 661.839.734,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	OCHO (8) MESES
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2020
Fecha de Terminacion:	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de Suspension 1:	20 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 1:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Suspension 2:	24 DE MARZO DE 2020
Fecha de Reinicio 2:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspension 3:	13 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 3:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Suspensión 4:	27 DE ABRIL DE 2020
Fecha de Reinicio 4:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 5:	11 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 5:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 6:	25 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 6:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Suspensión 7:	31 DE MAYO DE 2020
Fecha de Reinicio 7:	17 DE JUNIO DE 2020
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2021

TRAMO	EJECUTADO A CORTE DE PRESENTE INFORME		PROGRAMADO A CORTE DE PRESENTE INFORME		ATRASO EN %
1	908.770.424	13,94%	1.185.402.776	18,19%	4,2%
2	241.506.793	3,71%	443.686.451	6,81%	3,1%
3	431.747.442	6,62%	55.471.268	0,85%	-5,8%
4	262.112.178	4,02%	1.315.013.922	20,18%	16,2%
PAGA PMT,	140.694.948	2,16%	168.534.321	2,59%	0,4%
TOTALES	1.984.831.785	30,45%	3.168.108.738	48,61%	**18,16%**

ACTIVIDADES SEMANALES DEL 25 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

TRAMO 1
- Colocación concreta de 3000 psi para accesos a predios.
- colocación concreta para ciclópeo en placa huella costado derecho. K0+340/ K0+390.
- Colocación concreta 3000 psi bordillo costado izquierdo en K0+350 / k0+390.
- Colocación concreta 3000 psi rodadura costado derecho K0+270 k0+390
- concreto de 3000 PSI para cuneta derecha batea k0+260 k0+280
- Colocación de hierro para placa huella sencilla costado derecho desde abs K0+270 /K0+420
- Colocación hierro para cuneta costado der. K0+260/K0+280 batea
- excavación manual riostras k0+390/k0+510

TRAMO 2
- Colocación de concreto para piedra a la vista de 2000 PSI K2+030/K1+058
- Excavación manual de Riostras costado izquierdo K1+840 /K1+870
- colocación concreta 3000 psi para bordillo k1+940/ k1+970
- colocación concreto3000 psi para cuneta en v K2+030 k2+050

TRAMO 3
- Colocación y compactación de Subbase para estructura de pavimento desde la abscisa k2+ 400
- k2+670
- Colocación de concreto para cuneta 3000 psi k2+200 k2+260
- Colocación de concreto para bordillo 3000 psi k2+150 k2+200

TRAMO 4
- Se realiza el respectivo relleno para el box coulvert. Box coulvert K3+308...

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 21 Del 25 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 65%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 155 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas

Para la siguiente semana y de acuerdo a la programación aprobada por interventoría, se tiene programado lo siguiente:
1. CONSTRUCCION CALZADA DERECHA TRAMO 1 K0+470 K0+600
2. CONTINUACION DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO TRAMO 2. COSTADO IZQUIERDO
3. CONTINUACION DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS TRAMO 3. CONSTRUCCION DE ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO K2+155 K2+800.
4.CONSTRUCCION DE BOX COULVERT K3+308.

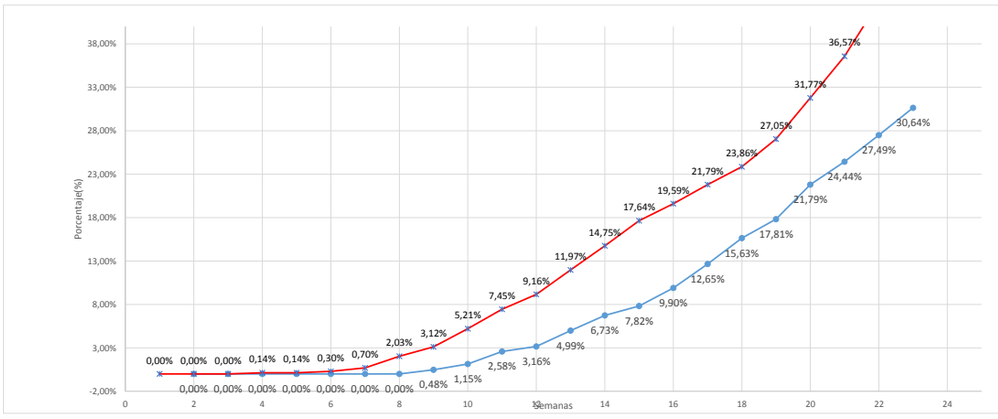

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 21 Del 25 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 65%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 155 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Para el corte del presente informe el avance financiero programado del **48,75%** versus un avance financiero ejecutado del **30,64%**, se continua con un atraso financiero del **18,11%**, respecto al avance en tiempo se lleva programado un **65%** esto de acuerdo a la programación aprobada por interventoria, el atraso financiero obedece a que el contratista de obra no ha iniciado con las actividades relevantes de obra en **el tramo 2 QUE REPRESENTA EL 7,0% DEL AVANCE PROGRAMADO.DE IGUAL FORMA, DEBIO TERMINAR EL TRAMO 1 EN LA SEMANA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2020. PARA PROXIMO COMITE SE ESTARA DEFINIENDO LAS MEDIDAS A ADOPTAR A QUE HAYA LUGAR.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 COLOCACION DE REFUERZO Y FORMALETA EN MADERA PARA PLACA HUELLA K0 +440 COSTADO DERECHO



Foto 2. COLOCACION DE REFUERZO PARA ACCESO Y CUNETA K0+260 COSTADO IZQUIERDO
Tramo: No. 1



Foto 3 COLOCACION CONCRETO 3000 PSI CUNETA Y ACCESO K0+180 COSTADO IZQUIERDO.
Tramo: No. 1



Foto 4 VERIFICACION DE COMPACTACION DE SUBBASE POR CONTRATISTA K0+450
Tramo: No. 1

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 21 Del 25 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido:** 65%

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 155 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas



Foto 5. COLOCACION DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA TA COSTADOIZQUIERDO K1+840 K1+900

Tramo No.2



Foto 5. COLOCACION DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA TA COSTADOIZQUIERDO K1+840 K1+900

Tramo No.2



Foto 7 COLOCACION DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA TA COSTADOIZQUIERDO K1+840 K1+900
TRAMO 2.



Foto 8 . COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA CONEXION CON EXISTENTE COSTADO DERECHO K2 + 000
TRAMO 2.



Foto 9 COLOCACION DE SUBBASE PARA ESTRUCTURA DDE PAVIMENTO K2+570 K2+705
TRAMO 3.



Foto 10 CONCOLOCOLOCACION DE SUBBASE PARA ESTRUCTURA DDE PAVIMENTO K2+470

TRAMO 3.



Foto 11 COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA K2+220
TRAMO 3.



Foto 12 VERIFICACION DE COMPACTACION POR INTERVENTORIA K2+330 DERECHA
Tramo No.4
.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**	CÓDIGO	PR-GP-03-F6
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	30/06/2020
	CONTRATO DE OBRA No: ICCU 034-2020	PÁGINA	

Semana Número: 21 Del 25 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 **% de tiempo transcurrido: 65%**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 155 Plazo total: 240 Días

Nombre del Supervisor Sandra Rocio Castillo Nombre del Director de interventoría Diego Ignacio Arenas



Foto 13. COLOCACION DE SUBBASE PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K2+400
TRAMO 3.



Foto 14 . COLOCACION DE REFUERZO PARA BOX COULVERT K3+308 COSTADO IZQUIERDO
TRAMO 4



Foto 15. MANEJO DE TRAFICO FIN DE SEMANA
TRAMO 2.



Foto 14 . MANEJO DE TRAFICO FIN DE SEMANA

TRAMO 1

OBSERVACIONES

SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EN EL BOX COULVERT TRAMO 4 K4+475 POR ENCONTRAR EN SITIO UN PUENTE EN ARCO HISTORICO SE AJUSTO LA CUNETA EN SU AREA EN LO REFERENTE AL MANEJO DE DRENAJE POR ESCORRENTIA EN EL TRAMO 1 2 3 Y 4 . **SE OBSERVA A FECHA DEL PRESENTE INFORME UN ATRASO DE 18,11 %. ATRASO CONSIDERABLE**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Ing. DIEGO IGNACIO ARENAS
