“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-077-2025

“ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA”

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

INFORME FINAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 21 DE AGOSTO 2025 A 20 DE ENERO DE 2026

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META"

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 13
2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO. 14
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 15
4. PRESUPUESTO CONTRATADO. 15
5. PRESUPUESTO EJECUTADO. 16
6. EJECUTADO EN VALOR. 16
7. EJECUTADO EN TIEMPO. 17
8. ACTIVIDADES. 17
8.1. CONTROL DE ACTIVIDADES. 17
8.2. ASPECTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS. 18
8.3. ACTIVIDADES TECNICAS POR BENEFICIARIO. 18
8.3.1. LISTADO DE BENEFICIARIOS. 18
8.3.2. SOCIALIZACIÓN. 21
8.3.3. VEREDA LA ESPERANZA. 22
8.3.4. VEREDA CANADÁ. 30
8.3.5. VEREDA VERACRUZ. 45
8.3.6. VEREDA LA ISLANDIA. 58
8.3.7. VEREDA CHAFURRAY. 66
8.3.8. VEREDA TIERRA GRATA. 80
8.3.9. VEREDA CHINATA. 97
8.3.10. VEREDA JOSÉ MARÍA. 109
8.3.11. VEREDA LA TIGRERA. 116
8.3.12. VEREDA LA UNIÓN. 134
8.3.13. VEREDA LA ESMERALDA. 157
9. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 162
9.1. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO. 162
9.2. CONTROL DE POLIZAS. 162
9.2.1. CONTROL DE POLIZAS ACTUALES. 162
9.2.2. ACTAS LEGALES TRAMITADAS. 162

10. INCONVENIENTES PRESENTADOS. 162

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 163

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Ubicación espacial del municipio de Puerto Lleras. 15

Imagen 2. Contratado VS Ejecutado. 16

Imagen 3. Programado VS Ejecutado. 17

Imagen 4. Localización Víctor Velasco. 22

Imagen 5. Localización Gilberto Mancilla. 22

Imagen 6. Localización Omar Moreno. 23

Imagen 7. Localización María Pérez. 23

Imagen 8. Localización Blanca Gaitán. 24

Imagen 9. Localización Rosa Zambrano. 24

Imagen 10. Localización José Espinosa. 25

Imagen 11. Localización Jesús Espinosa. 25

Imagen 12. Construcción de Estufa, Víctor Velasco. 26

Imagen 13. Construcción de Estufa, Gilberto Mancilla. 26

Imagen 14. Construcción de Estufa, Omar Moreno. 27

Imagen 15. Construcción de Estufa, María Pérez. 27

Imagen 16. Construcción de Estufa, Blanca Gaitán. 28

Imagen 17. Construcción de Estufa, Rosa Zambrano. 28

Imagen 18. Construcción de Estufa, José Espinosa. 29

Imagen 19. Construcción de Estufa, Jesús Espinosa. 29

Imagen 20. Localización Rosa Poveda. 30

Imagen 21. Localización Lino Yate. 30

Imagen 22. Localización Maribel Camacho. 31

Imagen 23. Localización José Monroy. 31

Imagen 24. Localización Martha González. 32

Imagen 25. Localización Julio Sánchez. 32

Imagen 26. Localización Luis Sánchez. 33

Imagen 27. Localización Luz Cantor. 33
Imagen 28. Localización Brisa Ovalle. 34
Imagen 29. Localización Marleny Gutiérrez. 34
Imagen 30. Localización Mercedes Cañadulce. 35
Imagen 31. Localización Resurrección Muñoz. 35
Imagen 32. Localización Nubia García. 36
Imagen 33. Localización Sandra Forero. 36
Imagen 34. Localización Leydi Soto. 37
Imagen 35. Construcción de Estufa, Rosa Poveda. 37
Imagen 36. Construcción de Estufa, Lino Yate. 38
Imagen 37. Construcción de Estufa, Maribel Camacho. 38
Imagen 38. Construcción de Estufa, José Monroy. 39
Imagen 39. Construcción de Estufa, Martha González. 39
Imagen 40. Construcción de Estufa, Julio Sánchez. 40
Imagen 41. Construcción de Estufa, Luis Sánchez. 40
Imagen 42. Construcción de Estufa, Luz Cantor. 41
Imagen 43. Construcción de Estufa, Brisa Ovalle. 41
Imagen 44. Construcción de Estufa, Marleny Gutiérrez. 42
Imagen 45. Construcción de Estufa, Mercedes Cañadulce. 42
Imagen 46. Construcción de Estufa, Resurrección Muñoz. 43
Imagen 47. Construcción de Estufa, Nubia García. 43
Imagen 48. Construcción de Estufa, Sandra Forero. 44
Imagen 49. Construcción de Estufa, Leydi Soto. 44
Imagen 50. Localización José Amado. 45
Imagen 51. Localización Jimi González. 45
Imagen 52. Localización Elizabeth Ríos. 46
Imagen 53. Localización Gilberto Vargas. 46
Imagen 54. Localización Fernando Chicue. 47
Imagen 55. Localización Gabriel Vaca. 47
Imagen 56. Localización Didier Arango. 48

Imagen 57. Localización María Hernández. 48
Imagen 58. Localización Marlene Aldana 49
Imagen 59. Localización Gloria Baquero. 49
Imagen 60. Localización Orlando Baquero. 50
Imagen 61. Localización Uriel Garzón. 50
Imagen 62. Localización Eiber Ordoñez. 51
Imagen 63. Construcción de Estufa, José Amado. 51
Imagen 64. Construcción de Estufa, Jimi González. 52
Imagen 65. Construcción de Estufa, Elizabeth Ríos. 52
Imagen 66. Construcción de Estufa, Gilberto Vargas. 53
Imagen 67. Construcción de Estufa, Fernando Chicue. 53
Imagen 68. Construcción de Estufa, Gabriel Vaca. 54
Imagen 69. Construcción de Estufa, Didier Arango. 54
Imagen 70. Construcción de Estufa, María Hernández. 55
Imagen 71. Construcción de Estufa, Marlene Aldana 55
Imagen 72. Construcción de Estufa, Gloria Baquero. 56
Imagen 73. Construcción de Estufa, Orlando Baquero. 56
Imagen 74. Construcción de Estufa, Uriel Garzón. 57
Imagen 75. Construcción de Estufa, Eiber Ordoñez. 57
Imagen 76. Localización Erlis Guarín. 58
Imagen 77. Localización Mayerly Urrego. 58
Imagen 78. Localización Rosa Hernández. 59
Imagen 79. Localización Paola Hernández. 59
Imagen 80. Localización Octavio Ayala. 60
Imagen 81. Localización José Rojas. 60
Imagen 82. Localización Adolfo Guerrero. 61
Imagen 83. Localización Jairo Amaya. 61
Imagen 84. Construcción de Estufa, Erlis Guarín. 62
Imagen 85. Construcción de Estufa, Mayerly Urrego. 62
Imagen 86. Construcción de Estufa, Rosa Hernández. 63

Imagen 87. Construcción de Estufa, Paola Hernández. 63
Imagen 88. Construcción de Estufa, Octavio Ayala. 64
Imagen 89. Construcción de Estufa, José Rojas. 64
Imagen 90. Construcción de Estufa, Adolfo Guerrero. 65
Imagen 91. Construcción de Estufa, Jairo Amaya. 65
Imagen 92. Localización Enrique Barón. 66
Imagen 93. Localización Luz Sánchez. 66
Imagen 94. Localización Mariana Arango. 67
Imagen 95. Localización María Guzmán. 67
Imagen 96. Localización Rosa Acosta. 68
Imagen 97. Localización Mónica Jiménez. 68
Imagen 98. Localización Rocío Varón. 69
Imagen 99. Localización Drucy Arebella. 69
Imagen 100. Localización Orlando Vargas. 70
Imagen 101. Localización Eva Lugo. 70
Imagen 102. Localización Leny Téllez. 71
Imagen 103. Localización Soledad Manrique. 71
Imagen 104. Localización Karen Barbosa. 72
Imagen 105. Localización William Escarraga. 72
Imagen 106. Construcción de Estufa, Enrique Barón. 73
Imagen 107. Construcción de Estufa, Luz Sánchez. 73
Imagen 108. Construcción de Estufa, Mariana Arango. 74
Imagen 109. Construcción de Estufa, María Guzmán. 74
Imagen 110. Construcción de Estufa, Rosa Acosta. 75
Imagen 111. Construcción de Estufa, Mónica Jiménez. 75
Imagen 112. Construcción de Estufa, Rocío Varón. 76
Imagen 113. Construcción de Estufa, Drucy Arebella. 76
Imagen 114. Construcción de Estufa, Orlando Vargas. 77
Imagen 115. Construcción de Estufa, Eva Lugo. 77
Imagen 116. Construcción de Estufa, Leny Téllez. 78

Imagen 117. Construcción de Estufa, Soledad Manrique. 78
Imagen 118. Construcción de Estufa, Karen Barbosa. 79
Imagen 119. Construcción de Estufa, William Escarraga. 79
Imagen 120. Localización Noralba Rodríguez. 80
Imagen 121. Localización María Rico. 80
Imagen 122. Localización Claudia Suarez. 81
Imagen 123. Localización Merly Corredor. 81
Imagen 124. Localización María Pulido. 82
Imagen 125. Localización Mélida Arias. 82
Imagen 126. Localización Ramiro Rubio. 83
Imagen 127. Localización Yemi Barón. 83
Imagen 128. Localización Carmen Garzón. 84
Imagen 129. Localización María Ríos. 84
Imagen 130. Localización Nidia García. 85
Imagen 131. Localización Anyyi Reyes. 85
Imagen 132. Localización Yesicca Ríos. 86
Imagen 133. Localización Rosa Cavieles. 86
Imagen 134. Localización Glenis Navarro. 87
Imagen 135. Localización Jhon Ortiz. 87
Imagen 136. Localización Matilde Romero. 88
Imagen 137. Construcción de Estufa, Noralba Rodríguez. 88
Imagen 138. Construcción de Estufa, María Rico. 89
Imagen 139. Construcción de Estufa, Claudia Suarez. 89
Imagen 140. Construcción de Estufa, Merly Corredor. 90
Imagen 141. Construcción de Estufa, María Pulido. 90
Imagen 142. Construcción de Estufa, Mélida Arias. 91
Imagen 143. Construcción de Estufa, Ramiro Rubio. 91
Imagen 144. Construcción de Estufa, Yemi Barón. 92
Imagen 145. Construcción de Estufa, Carmen Garzón. 92
Imagen 146. Construcción de Estufa, María Ríos. 93

Imagen 147. Construcción de Estufa, Nidia García.....93
Imagen 148. Construcción de Estufa, Anyyi Reyes.....94
Imagen 149. Construcción de Estufa, Yesicca Ríos.....94
Imagen 150. Construcción de Estufa, Rosa Cavieles. 95
Imagen 151. Construcción de Estufa, Glenis Navarro.....95
Imagen 152. Construcción de Estufa, Jhon Ortiz. 96
Imagen 153. Construcción de Estufa, Matilde Romero. 96
Imagen 154. Localización Vidalia Garzón. 97
Imagen 155. Localización Carmen Santana.....97
Imagen 156. Localización Lilia Santana.....98
Imagen 157. Localización María Benítez. 98
Imagen 158. Localización Liliana Mondragón. 99
Imagen 159. Localización Yaneth Espinosa.....99
Imagen 160. Localización Luis Rengifo.....100
Imagen 161. Localización Leonilde Ayala. 100
Imagen 162. Localización Faber de los Ríos. 101
Imagen 163. Localización Maribel de los Ríos. 101
Imagen 164. Localización Mauren Aullon.....102
Imagen 165. Localización Gilberto Ayala. 102
Imagen 166. Construcción de Estufa, Vidalia Garzón. 103
Imagen 167. Construcción de Estufa, Carmen Santana.....103
Imagen 168. Construcción de Estufa, Lilia Santana. 104
Imagen 169. Construcción de Estufa, María Benítez. 104
Imagen 170. Construcción de Estufa, Liliana Mondragón. 105
Imagen 171. Construcción de Estufa, Yaneth Espinosa.....105
Imagen 172. Construcción de Estufa, Luis Rengifo.....106
Imagen 173. Construcción de Estufa, Leonilde Ayala. 106
Imagen 174. Construcción de Estufa, Faber de los Ríos. 107
Imagen 175. Construcción de Estufa, Maribel de los Ríos. 107
Imagen 176. Construcción de Estufa, Mauren Aullon.....108

Imagen 177. Construcción de Estufa, Gilberto Ayala. 108
Imagen 178. Localización Jessica Vergara. 109
Imagen 179. Localización José Rojas. 109
Imagen 180. Localización María Hoyos. 110
Imagen 181. Localización Luis Rojas. 110
Imagen 182. Localización Concepción Mosquera. 111
Imagen 183. Localización Franklin Martin. 111
Imagen 184. Localización Susana Niño. 112
Imagen 185. Construcción de Estufa, Jessica Vergara. 112
Imagen 186. Construcción de Estufa, José Rojas. 113
Imagen 187. Construcción de Estufa, María Hoyos. 113
Imagen 188. Construcción de Estufa, Luis Rojas. 114
Imagen 189. Construcción de Estufa, Concepción Mosquera. 114
Imagen 190. Construcción de Estufa, Franklin Martin. 115
Imagen 191. Construcción de Estufa, Susana Niño. 115
Imagen 192. Localización Gilberto Ramírez. 116
Imagen 193. Localización Jessica Rodríguez. 116
Imagen 194. Localización Floro Olarte. 117
Imagen 195. Localización Bernardo Barrantes. 117
Imagen 196. Localización Himer Peña. 118
Imagen 197. Localización Luz Pérez. 118
Imagen 198. Localización Nelly Quiñonez. 119
Imagen 199. Localización Erika López. 119
Imagen 200. Localización Lucila López. 120
Imagen 201. Localización Camilo Trujillo. 120
Imagen 202. Localización Luz González. 121
Imagen 203. Localización Yenny Chingaté. 121
Imagen 204. Localización Flor Ospina. 122
Imagen 205. Localización Andrea Jurado. 122
Imagen 206. Localización Cecilia Gómez. 123

Imagen 207. Localización Mayerlyn Alvarado. 123
Imagen 208. Localización José Ocampo. 124
Imagen 209. Localización Serafina Aguirre. 124
Imagen 210. Construcción de Estufa, Gilberto Ramírez. 125
Imagen 211. Construcción de Estufa, Jessica Rodríguez. 125
Imagen 212. Construcción de Estufa, Floro Olarte. 126
Imagen 213. Construcción de Estufa, Bernardo Barrantes. 126
Imagen 214. Construcción de Estufa, Himer Peña. 127
Imagen 215. Construcción de Estufa, Luz Pérez. 127
Imagen 216. Construcción de Estufa, Nelly Quiñonez. 128
Imagen 217. Construcción de Estufa, Erika López. 128
Imagen 218. Construcción de Estufa, Lucila López. 129
Imagen 219. Construcción de Estufa, Camilo Trujillo. 129
Imagen 220. Construcción de Estufa, Luz González. 130
Imagen 221. Construcción de Estufa, Yenny Chingaté. 130
Imagen 222. Construcción de Estufa, Flor Ospina. 131
Imagen 223. Construcción de Estufa, Andrea Jurado. 131
Imagen 224. Construcción de Estufa, Cecilia Gómez. 132
Imagen 225. Construcción de Estufa, Mayerlyn Alvarado. 132
Imagen 226. Construcción de Estufa, José Ocampo. 133
Imagen 227. Construcción de Estufa, Serafina Aguirre. 133
Imagen 228. Localización Yurany Bermúdez. 134
Imagen 229. Localización Yolanda Ruiz. 134
Imagen 230. Localización Rafael Poveda. 135
Imagen 231. Localización Jairo Castro. 135
Imagen 232. Localización Lino Barreño. 136
Imagen 233. Localización María Segura. 136
Imagen 234. Localización María Santos. 137
Imagen 235. Localización José Remolina. 137
Imagen 236. Localización Fabiola Llanos. 138

Imagen 237. Localización María Lancheros. 138
Imagen 238. Localización Luz Moreno. 139
Imagen 239. Localización Jaime Granada. 139
Imagen 240. Localización María Ayala. 140
Imagen 241. Localización Martha Casas. 140
Imagen 242. Localización Luz Castiblanco. 141
Imagen 243. Localización Keny Molina. 141
Imagen 244. Localización Martha Verano. 142
Imagen 245. Localización Luz Sánchez. 142
Imagen 246. Localización Lady Rodríguez. 143
Imagen 247. Localización Gloria Peña. 143
Imagen 248. Localización Arturo Garzón. 144
Imagen 249. Localización Lucy Huila. 144
Imagen 250. Localización José Pacheco. 145
Imagen 251. Construcción de Estufa, Yurany Bermúdez. 145
Imagen 252. Construcción de Estufa, Yolanda Ruiz. 146
Imagen 253. Construcción de Estufa, Rafael Poveda. 146
Imagen 254. Construcción de Estufa, Jairo Castro. 147
Imagen 255. Construcción de Estufa, Lino Barreño. 147
Imagen 256. Construcción de Estufa, María Segura. 148
Imagen 257. Construcción de Estufa, María Santos. 148
Imagen 258. Construcción de Estufa, José Remolina. 149
Imagen 259. Construcción de Estufa, Fabiola Llanos. 149
Imagen 260. Construcción de Estufa, María Lancheros. 150
Imagen 261. Construcción de Estufa, Luz Moreno. 150
Imagen 262. Construcción de Estufa, Jaime Granada. 151
Imagen 263. Construcción de Estufa, María Ayala. 151
Imagen 264. Construcción de Estufa, Martha Casas. 152
Imagen 265. Construcción de Estufa, Luz Castiblanco. 152
Imagen 266. Construcción de Estufa, Keny Molina. 153

Imagen 267. Construcción de Estufa, Martha Verano. 153
Imagen 268. Construcción de Estufa, Luz Sánchez. 154
Imagen 269. Construcción de Estufa, Lady Rodríguez. 154
Imagen 270. Construcción de Estufa, Gloria Peña. 155
Imagen 271. Construcción de Estufa, Arturo Garzón. 155
Imagen 272. Construcción de Estufa, Lucy Huila. 156
Imagen 273. Construcción de Estufa, José Pacheco. 156
Imagen 274. Localización Ana Oviedo. 157
Imagen 275. Localización Nidia Pavón. 157
Imagen 276. Localización Carlos Martínez. 158
Imagen 277. Localización Gloria Hernández. 158
Imagen 278. Localización Wilson Almanza. 159
Imagen 279. Construcción de Estufa, Ana Oviedo. 159
Imagen 280. Construcción de Estufa, Nidia Pavón. 160
Imagen 281. Construcción de Estufa, Carlos Martínez. 160
Imagen 282. Construcción de Estufa, Gloria Hernández. 161
Imagen 283. Construcción de Estufa, Wilson Almanza. 161

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos del Contrato……14
Tabla 2. Presupuesto Contratado……..15
Tabla 3. Presupuesto Ejecutado……...16
Tabla 4. Listado de Beneficiarios……...18
Tabla 5. Balance General del Contrato……..162
Tabla 6. Control de Pólizas……..162

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

1. INTRODUCCIÓN.

En este informe final, encontramos el resultado al 100,00% de las acciones de campo y de oficina concertadas entre el equipo profesional y técnico de la interventoría y del **Contrato de Obra Nro. CO-076-2025** adjudicado a **CONSORCIO ESTUFAS PUERTO LLERAS 2025**, identificada con el Nit. Nro. 901.977.311-7, cuyo representante es el señor HEIDER VICENTE LOZANO CARDENAS y que tiene por objeto la “**CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META**” Se presenta la información técnica, de obra, localización y replanteo en el proyecto parte administrativa, financiera, legal y ambiental correspondiente al resultado parcial de las actividades realizadas en campo y administrativos de las actividades contratadas que corresponden al periodo comprendido entre el **21 de Agosto 2025 de 2025 al 20 de Enero de 2026**.

El informe final se evidencia las actividades de la construcción de estufas en el Municipio de Puerto lleras - Meta durante el trabajo ejecutado por el seguimiento de este por parte de la interventoría.

En el informe de ejecución se presenta el reporte y resultados de las construcciones de las estufas en los diferentes predios, socialización general y la realización concertada de reuniones entre el contratista y la interventoría, así como un comité mensual para la evaluación del avance, imprevistos y solicitudes de los diferentes actores de este proyecto.

El informe esta soportado con un registro fotográfico, en cada componente, así como de las reuniones llevadas a cabo a la fecha, y al final de este presentamos las conclusiones y recomendaciones , las cuales van en dirección hacia una ejecución del contrato de obra que este ajustado en el avance real de actividades con relación al cronograma y que estas se estén realizando con la superación a tiempo de imprevistos, dificultades y de una manera óptima, eficiente y con la celeridad que este lo requiere.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META"

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

Tabla 1. Datos del Contrato.

CONTRATO No:	CI-077-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE:	ASMETA
NIT No.:	900.056.772-3
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS
NIT. No.	901.444.436-1
R.L.:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO
C.C. No.:	35.264.167 de Villavicencio
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS PESOS ($35.788.536) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 2	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE PRORROGA No. 2	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	20 DE ENERO DE 2026

Fuente: Contratista.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META"

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Imagen 1. Ubicación espacial del municipio de Puerto Lleras.



Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-Meta-_PuertoLleras.svg

4. PRESUPUESTO CONTRATADO.

Tabla 2. Presupuesto Contratado.

1. PERSONAL							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CARGO**	**DEDICACION (Hombre-Mes) (1)**	**NUMERO DE PERSONAS (2)**	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (3)**	**DURACION (Meses) (4)**	**VALOR TOTAL (1) *(2) *(3) *(4) = (5)**
A. PERSONAL PROFESIONAL							
1	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	Director de interventoría	20%	1,00	$ 4.285.000,00	3,00	$ 2.571.000,00
2	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	Residente de interventoría	100%	1,00	$ 3.320.000,00	3,00	$ 9.960.000,00
						SUBTOTAL PERSONAL:	**$ 12.531.000,00**
						FACTOR MULTIPLICADOR (FM) (%):	**2,40**
C						**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)*FM**	**$ 30.074.400**
D						**TOTAL, DE COSTOS DE CONSULTORA (C)**	**$ 30.074.400,00**
E						**IVA SOBRE (C) 19%:**	**$ 5.714.136,00**
						VALOR DE LA CONSULTORIA (D+E) AJUSTADA AL PESO	**$ 35.788.536,00**

Fuente: Contratista.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META"

5. PRESUPUESTO EJECUTADO.

Tabla 3. Presupuesto Ejecutado.


1. PERSONAL							
ITEM	**DESCRIPCION**	**CARGO**	**DEDICACION (Hombre-Mes) (1)**	**NUMERO DE PERSONAS (2)**	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (3)**	**DURACION (Meses) (4)**	**VALOR TOTAL (1) *(2) *(3) *(4) = (5)**
A. PERSONAL PROFESIONAL							
1	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.	Director de interventoría	20%	1,00	$ 2.531.000,00	5,00	$ 2.531.000,00
2	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.	Residente de interventoría	100%	1,00	$ 2.000.000,00	5,00	$ 10.000.000,00
						SUBTOTAL PERSONAL:	**$ 12.531.000,00**
						FACTOR MULTIPLICADOR (FM) (%):	**2,40**
C						**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)*FM**	**$ 30.074.400**
D						**TOTAL, DE COSTOS DE CONSULTORA (C)**	**$ 30.074.400,00**
E						**IVA SOBRE (C) 19%:**	**$ 5.714.136,00**
						VALOR DE LA CONSULTORIA (D+E) AJUSTADA AL PESO	**$ 35.788.536,00**

Fuente: Contratista.

6. EJECUTADO EN VALOR.

El porcentaje ejecutado acumulado es del **100,00%,** que equivale a **$35.788.536,00** (Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Treinta Seis Pesos Ml/Cte.) por un valor contratado del **100,00%** que equivale a **$35.788.536,00** (Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Treinta Seis Pesos Ml/Cte.).

Imagen 2. Contratado VS Ejecutado.

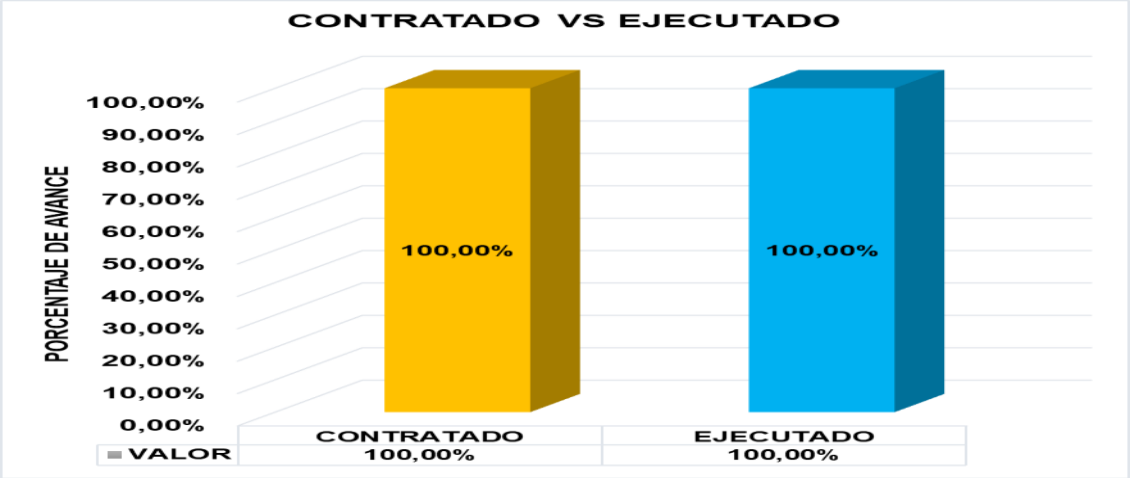


Fuente: Contratista.

7. EJECUTADO EN TIEMPO.

El día **21 de Agosto de 2025** se dio inicio al contrato de interventoría con un total de **Ciento Cincuenta (150) Días,** para lo cual el tiempo ejecutado es de **Ciento Cincuenta (150) Días,** que equivale al **100,00%** del plazo total del proyecto.

Imagen 3. Programado VS Ejecutado.

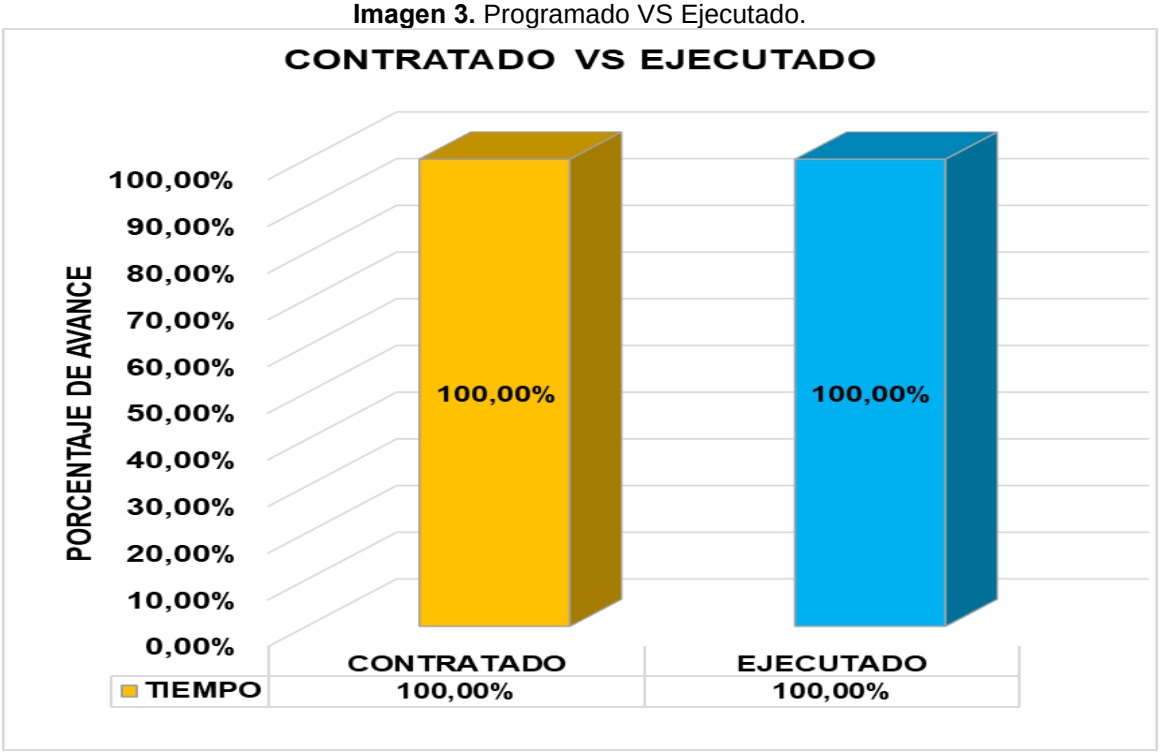

Fuente: Contratista.

8. ACTIVIDADES.

8.1. CONTROL DE ACTIVIDADES.

- ✓ Mediciones directas en el terreno con el fin de supervisar, controlar y verificar las cantidades reales y la calidad de materiales utilizados en el proyecto.
- ✓ Verificación que los equipos empleados por el contratista se encuentren en buenas condiciones para garantizar un adecuado rendimiento y avance de las actividades y así evitar contratiempos inesperados y prevenir accidentes en el proyecto.
- ✓ Registro de lluvias y estado del clima, donde se toman las lecturas del tiempo diariamente.

- ✓ Verificación y recibo de cada actividad desarrollada, observaciones y correcciones a realizar de acuerdo a especificaciones generales y particulares de cada actividad.
- ✓ Revisión de los materiales empleados en la construcción verificando su control de calidad, para verificar que las cantidades son las requeridas y contratadas, además se verifica que los diámetros correspondan a los contratados.
- ✓ Desarrollo normal del programa de control de calidad y un plan de acción en caso de que este no se cumpla.

8.2. ASPECTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS.

- ✓ Verificación del cumplimiento de las normas vigentes de seguridad social integral y trabajos en alturas de todo el personal que se vincule al proyecto para garantizar que todo transcurra en normal desarrollo sin que se afecte en algo trabajadores, contratistas o contratantes.
- ✓ Respuesta inmediata a los requisitos o recomendaciones hechas por la supervisión y/o entidad contratante, para dar solución a los inconvenientes presentados en el proyecto. Participación en forma activa en el control de la ejecución de los trabajos del proyecto.

8.3. ACTIVIDADES TECNICAS POR BENEFICIARIO.

8.3.1. LISTADO DE BENEFICIARIOS.

Tabla 4. Listado de Beneficiarios.

No.	NOMBRES	CEDULA CIUDADANIA No.	TELEFONO	VEREDA
1	VIDALIA GARZON MEJIA	31.007.337 Pto Lleras	3115514083	CHINATA
2	CARMEN R. SANTANA RODRIGUEZ	31.006.832 Pto Lleras	3144827970	CHINATA
3	LILIA SANTANA RODRIGUEZ	31.007.028 Pto Lleras	3226180257	CHINATA
4	MARIA ROSALBA BENITEZ DE MUÑOZ	21.174.105 Acacias	3209163631	CHINATA
5	LILIANA MONDRAGON VARGAS	31.007.343 Pto Lleras	3202519271	CHINATA
6	YANETH ESPINOSA RODRIGUEZ	21.201.759 San Martin	3114774919	CHINATA
7	LUIS FELIPE RENGIFO HOYOS	16.553.380 Roldanillo	3142330520	CHINATA
8	LEONILDE AYALA PAEZ	31.006.308 Pto Lleras	3144533594	CHINATA
9	FABER DE LOS RIOS ARROYAVE	7.817.668 Pto Lleras	3133211679	CHINATA
10	MARIBEL DE LOS RIOS FAJARDO	31.008.056 Pto Lleras	3112443778	CHINATA
11	MAUREN LORENA AULLON SUAREZ	1.115.794.182 Belén	3118130884	CHINATA
12	GILBERTO AYALA PAEZ	17.300.751 de Villavicencio	3132918657	CHINATA
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
13	JESSICA A. VERGARA CARDONA	1.120.373.314 Granada	3142765977	JOSE MARIA
14	JOSE MIGUEL ROJAS GUERRERO	7.817.889 Pto Lleras	3166540729	JOSE MARIA
15	MARIA VIANEY HOYOS DE AGUILAR	40.265.037 Pto Rico	3103797655	JOSE MARIA
16	LUIS IRLEY ROJAS CASTILLO	83.233.598 Palermo	3142507918	JOSE MARIA
17	CONCEPCION MOSQUERA BARRERA	28.476.654 Vélez	3123599550	JOSE MARIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-077-2025.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META"

18	FRANKLIN MARTIN TUNJANO	7.818.162 Pto Lleras	3137854157	JOSE MARIA
19	SUSANA NIÑO CUELLAR	31.006.854 Pto Lleras	3207919685	JOSE MARIA
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
20	YURANY A. BERMUDEZ CORDERO	1.120.375.494 Granada	3222502088	LA UNION
21	YOLANDA RUIZ MORENO	65.500.565 Armero	3112481898	LA UNION
22	RAFAEL POVEDA SANCHEZ	1.006.729.721 Villavicencio	3133758538	LA UNION
23	JAIRO CASTRO ORTIZ	17.354.333 San Martin	3143440384	LA UNION
24	LINO BARREÑO GONZALEZ	7.818.906 Pto Lleras	3133008422	LA UNION
25	MARIA ROSALBA SEGURA ALZATE	31.006.810 Pto Lleras	3142453992	LA UNION
26	MARIA ARACELLY SANTOS ROJAS	31.007.074 Pto Lleras	3103039167	LA UNION
27	JOSE REMOLINA MONTERO	17.305.066 Villavicencio	3118734631	LA UNION
28	FABIOLA LLANOS GALLEGO	31.007.969 Pto Lleras	3114515989	LA UNION
29	MARIA DE JESUS LANCHEROS CORTES	31.006.555 Pto Lleras	3204309662	LA UNION
30	LUZ MILA MORENO GALINDO	1.124.216.862 Lejanías	3222026250	LA UNION
31	JAIME DANIEL GRANADA LOPEZ	7.817.628 Pto Lleras	3167619042	LA UNION
32	MARIA NIEVES AYALA DE VERANO	31.006.702 Pto Lleras	3213035014	LA UNION
33	MARTHA ELENA CASAS	40.275.483 Vista Hermosa	3214498143	LA UNION
34	LUZ DARY CASTIBLANCO GARCIA	28.012.365 Barrancabermeja	3125772063	LA UNION
35	KENY NAIDU MOLINA ROJAS	31.007.391 Pto Lleras	3118312853	LA UNION
36	MARTHA LUCIA VERANO AYALA	31.007.496 Pto Lleras	3202942077	LA UNION
37	LUZ YOLANDA SANCHEZ ESPITIA	31.007.274 Pto Lleras	3138664564	LA UNION
38	LADY MARCELA RODRIGUEZ VARGAS	1.121.148.013 Pto Lleras	3144277503	LA UNION
39	GLORIA ILMA PEÑA DE DIAZ	21.188.555 Restrepo	3228233575	LA UNION
40	ARTURO GARZON MATIZ	86.001.279 Granada	3143420253	LA UNION
41	LUCY ELVIRA HUILA	40.270.649 Mesetas	3222805772	LA UNION
60	JOSE HUMBERTO PACHECO	1.121.147.382 Pto Lleras	3147144360	LA UNION
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
42	GILBERTO ANTONIO RAMIREZ RUBIO	86.006.285 Pto Lleras	3133178003	LA TIGRERA
43	JESSICA C. RODRIGUEZ GOMEZ	1.121.895.311 Villavicencio	3219778817	LA TIGRERA
44	FLORO OLARTE MATEUS	17.311.438 Villavicencio	3112112115	LA TIGRERA
45	BERNARDO BARRANTES PEDRAZA	3.241.859 Villa pinzón	3223411516	LA TIGRERA
46	HIMER ALCIDES PEÑA MOJICA	3.276.287 Restrepo	3184283508	LA TIGRERA
47	LUZ MARINA PEREZ PEREZ	40.316.952 Guamal	3132148826	LA TIGRERA
48	NELLY QUIÑONEZ PULIDO	1.120.373.925 Granada	3235049233	LA TIGRERA
49	ERIKA VIVIANA LOPEZ RAMIREZ	1.120.370.860 Granada	3114480207	LA TIGRERA
50	LUCILA LOPEZ RAMIREZ	40.446.221 Granada	3136008922	LA TIGRERA
51	CAMILO TRUJILLO TRIANA	17.320.083 Villavicencio	3202816123	LA TIGRERA
52	LUZ MIRYAM GONZALEZ LOPEZ	1.120.379.817 Granada	3224342619	LA TIGRERA
53	YENNY YANETH CHINGATÉ OSPINA	1.121.870.649 Villavicencio	3124183596	LA TIGRERA
54	FLOR MARINA OSPINA	40.210.076 Uribe	3124030673	LA TIGRERA
55	ANDREA JURADO GOMEZ	1.121.827.729 Villavicencio	3158989051	LA TIGRERA
56	CECILIA GOMEZ VASQUEZ	31.007.260 Pto Lleras	3114591099	LA TIGRERA
57	MAYERLYN ALVARADO LINARES	40.272.207 Mesetas	3124754593	LA TIGRERA
58	JOSE REINEL OCAMPO GIRALDO	7.817.294 Pto Lleras	3133221413	LA TIGRERA
59	SERAFINA AGUIRRE CIFUENTES	31.007.758 Pto Lleras	3118784839	LA TIGRERA
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
61	NORALBA RODRIGUEZ TREJOS	40.449.239 Granada	3224356359	TIERRA GRATA
62	MARIA ELENA RICO MORA	31.007.363 Pto Lleras	3112560441	TIERRA GRATA
63	CLAUDIA JULIANA SUAREZ RUIZ	65.770.739 Ibagué	3222161221	TIERRA GRATA
64	MERLY ZAYURY CORREDOR LOPEZ	31.008.103 Pto Lleras	3132689773	TIERRA GRATA
65	MARIA EVELIA PULIDO ELIZALDE	30.001.750 Granada	3222533039	TIERRA GRATA
66	MELIDA ARIAS CARO	30.030.755 Fuente de Oro	3133524133	TIERRA GRATA
67	RAMIRO RUBIO	3.084.408 La Vega	3209236406	TIERRA GRATA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META"

68	YEMI BARON DURAN	7.817.738 Pto Lleras	3144327438	TIERRA GRATA
69	CARMEN GARZON GARCIA	31.007.413 Pto Lleras	3118487434	TIERRA GRATA
70	MARIA ELENA RIOS QUINTERO	40.266.069 Pto Rico	3102839879	TIERRA GRATA
71	NIDIA MARCELA GARCIA LONDOÑO	1.121.147.922 Pto Lleras	3227613596	TIERRA GRATA
72	ANYYI ANDREA REYES CASTELLANOS	1.120.375.716 Granada	3124413361	TIERRA GRATA
73	YESICCA PAOLA RIOS TOQUICA	1.120.371.942 Granada	3209440613	TIERRA GRATA
74	ROSA ELENA CAVIELES CASTELLANOS	41.212.379 San José Guaviare	3227067565	TIERRA GRATA
75	GLENIS VANESA NAVARRO LOPEZ	1.082.954.539 Santa Marta	3108939878	TIERRA GRATA
76	JHON FREDDY ORTIZ PULIDO	17.281.758 Pto Rico	3124117433	TIERRA GRATA
77	MATILDE ROMERO BARBOSA	38.964.303 Cali	3114473570	TIERRA GRATA
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
78	ENRIQUE BARON HERRERA	3.296.425 Villavicencio	3204971024	CHAFURRAY
79	LUZ DARY SANCHEZ MARTINEZ	1.120.499.650 San Martin	3209980465	CHAFURRAY
80	MARIANA ARANGO ARAGON	38.211.497 Ibagué	3142466489	CHAFURRAY
81	MARIA CLELIA GUZMAN SAAVEDRA	40.764.231	3124665913	CHAFURRAY
82	ROSA ELENA ACOSTA RESTREPO	29.873.660 Tuluá	3214407721	CHAFURRAY
83	MONICA A. JIMENEZ RODRIGUEZ	1.121.147.958 Pto Lleras	3223638079	CHAFURRAY
84	ROCIO VARON TORRES	31.007.601 Pto Lleras	3202271542	CHAFURRAY
85	DRUCY AREBELLA MARTINEZ	40.363.026 San Juan Arama	3126199543	CHAFURRAY
86	ORLANDO JOSE VARGAS VARGAS	86.014.964 Granada	3114472367	CHAFURRAY
87	EVA LUGO	21.200.784 San Martin	3116273700	CHAFURRAY
88	LENY PATRICIA TELLEZ AGUIRRE	1.121.147.485 Pto Lleras	3128954934	CHAFURRAY
89	SOLEDAD MANRIQUE BETANCOURT	31.006.829 Pto Lleras	3203192271	CHAFURRAY
90	KAREN DAYANNA BARBOSA TORRES	1.006.820.613 Villavicencio	3025160276	CHAFURRAY
91	WILLIAM E. ESCARRAGA GOMEZ	3.273.533 Cumaral	3154710047	CHAFURRAY
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
92	VICTOR HUGO VELASCO	86.044.424 Villavicencio	3232813059	LA ESPERANZA
93	GILBERTO MANCILLA MANCILLA	7.817.838 Pto Lleras	3114810320	LA ESPERANZA
94	OMAR VICENTE MORENO AVELLA	9.655.184 Yopal	3219428267	LA ESPERANZA
95	MARIA BETTY PEREZ MORENO	31.007.746 Pto Lleras	3212272481	LA ESPERANZA
96	BLANCA NUBIA GAITAN ESPINOSA	52.090.966 Bogotá	3228182515	LA ESPERANZA
97	ROSA HELENA ZAMBRANO	31.006.884 Granada	3202495635	LA ESPERANZA
98	JOSE HECTOR ESPINOSA MUÑOZ	6.349.455 La Victoria	3114816032	LA ESPERANZA
99	JESUS ANTONIO ESPINOSA MUÑOZ	7.497.952 Armenia	3102882178	LA ESPERANZA
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
100	JOSE LUIS AMADO VERGARA	86.087.510 Villavicencio	3138613156	VERACRUZ
101	JIMI JOHANI GONZALEZ ORTIZ	7.819.335 Pto Lleras	3202214464	VERACRUZ
102	ELIZABETH RIOS PULGARIN	31.007.760 Pto Lleras	3229319220	VERACRUZ
103	GILBERTO VARGAS	3.273.515 Cumaral	3203801417	VERACRUZ
104	FERNANDO CHICUE FUENTES	86.047.111 Villavicencio	3224379986	VERACRUZ
105	GABRIEL VACA AMADO	7.819.242 Pto Lleras	3204416300	VERACRUZ
106	DIDIER ARANGO MONTOYA	94.406.584 Alcalá	3213871664	VERACRUZ
107	MARIA A. HERNANDEZ TORRES	31.006.719 Pto Lleras	3114468095	VERACRUZ
108	MARLENE ALDANA HERNANDEZ	31.007.978 Pto Lleras	3105827137	VERACRUZ
109	GLORIA YANETH BAQUERO RUIZ	31.007.141 Pto Lleras	3144725605	VERACRUZ
110	ORLANDO BAQUERO RUIZ	86.008.233 Granada	3142812037	VERACRUZ
111	URIEL GARZON ROSALES	74.754.618 Aguazul	3112114053	VERACRUZ
112	EIBER ORDOÑEZ MEJIA	7,819.500 Pto Lleras	3114759609	VERACRUZ
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
113	ERLIS GUARIN VACA	86.070.642 Villavicencio	3102680383	LA ISLANDIA
114	MAYERLY URREGO AGUDELO	1.121.895.889 Villavicencio	3115199528	LA ISLANDIA
115	ROSA ISABEL HERNANDEZ BROCHERO	1.070.327.034 El Colegio	3143467356	LA ISLANDIA
116	PAOLA A. HERNANDEZ BROCHERO	1.121.148.059 Pto Lleras	3118183543	LA ISLANDIA

117	OCTAVIO AYALA AYALA	7.818.228 Pto Lleras	3172488173	LA ISLANDIA
118	JOSE ALVARO ROJAS GUERRERO	7.817.879 Pto Lleras	3142674727	LA ISLANDIA
119	ADOLFO GUERRERO	17.350.535 San Martin	3214202299	LA ISLANDIA
120	JAIRO AMAYA PEREZ	7.818.652 Pto Lleras	3115107788	LA ISLANDIA
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
121	ROSA TULIA POVEDA VARELA	20.501.306 El Colegio	3114587659	CANADA
122	LINO YATE CADENA	1.121.146.236 Pto Lleras	3124766892	CANADA
123	MARIVEL CAMACHO ROJAS	40.265.322 Pto Rico	3224657865	CANADA
124	JOSE OLIVERIO MONROY MONROY	17.303.975 Villavicencio	3114590080	CANADA
125	MARTHA LUCIA GONZALEZ SAENZ	31.007.480 Pto Lleras	3123329460	CANADA
126	JULIO CESAR SANCHEZ	17.351.349 San Martin	3105518129	CANADA
127	LUIS ENRIQUE SANCHEZ LOPEZ	5.933.249 Icononzo	3202058650	CANADA
128	LUZ MARY CANTOR MENDEZ	30.080.717 Villavicencio	3124951790	CANADA
129	BRISA EDILMA OVALLE CASTILLO	52.522.202 Bogotá	3107989508	CANADA
130	MARLENY GUTIERREZ ALVAREZ	24.575.679 Calarcá	3142822425	CANADA
131	MERCEDES CAÑADULCE BELLO	40.393.303 Villavicencio	3115277257	CANADA
132	RESURECCION MUÑOZ CARVAJAL	31.006.175 Pto Lleras	3204894138	CANADA
133	NUBIA JANETH GARCIA	52.239.733 Bogotá	3144902989	CANADA
134	SANDRA PATRICIA FORERO GARZON	1.121.147.543 Pto Lleras	3209041599	CANADA
135	LEYDI JOHANA SOTO FAJARDO	1.006.729.482 Pto Lleras	3114914470	CANADA
No.	**NOMBRES**	**CEDULA CIUDADANIA No.**	**TELEFONO**	**VEREDA**
136	ANA MAGNOLIA OVIEDO MURILLO	42.546.122 Inírida	3106800799	LA ESMERALDA
137	NIDIA YULEY PAVON GARCIA	1.120.375.648 Granada	3212115962	LA ESMERALDA
138	CARLOS JULIO MARTINEZ HERNANDEZ	1.121.416.908 Pto Rico	3209839337	LA ESMERALDA
139	GLORIA LUZ HERNANDEZ TORRES	40.265.811 Pto Rico	3142088167	LA ESMERALDA
140	WILSON ALMANZA FIERRO	17.282.018 Pto Rico	3232389123	LA ESMERALDA

Fuente: Contratista.

8.3.2. SOCIALIZACIÓN.

Se realiza la socialización en el municipio de Puerto lleras, iniciando con del paso a paso del proceso en el que se iban a realizar las actividades según el cronograma establecido, se hizo entrega de un folleto donde se le da pautas de uso y manejo de la estufa ecoeficiente, presentación de maestros de mano obra no calificada, seguidamente les dieron la explicación de todo lo relacionado a la estufa ecoeficientes materiales y accesorios que hacen parte de ella, se realizó una explicación detallada de las formas de uso y beneficios que se tienen con la construcción de estas y las diferencias entre la estufa tradicional y la estufa ecoeficiente se les dio las recomendaciones y observaciones que se deben tener una vez construida la estufa ecoeficiente, la unión temporal dio la presentación al equipo de interventoría, y se les informo a los beneficiarios que una vez terminada la construcción el proceso de fraguado tendría una durabilidad de 20 días por lo tanto deberían tener espera de la visita del equipo tanto de obra como de interventoría.

8.3.3. VEREDA LA ESPERANZA.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: VICTOR HUGO VELASCO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 4. Localización Víctor Velasco.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GILBERTO MANCILLA MANCILLA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 5. Localización Gilberto Mancilla.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: OMAR VICENTE MORENO AVELLA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 6. Localización Omar Moreno.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA BETTY PEREZ MORENO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 7. Localización María Pérez.




Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BLANCA NUBIA GAITAN ESPINOSA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 8. Localización Blanca Gaitán.

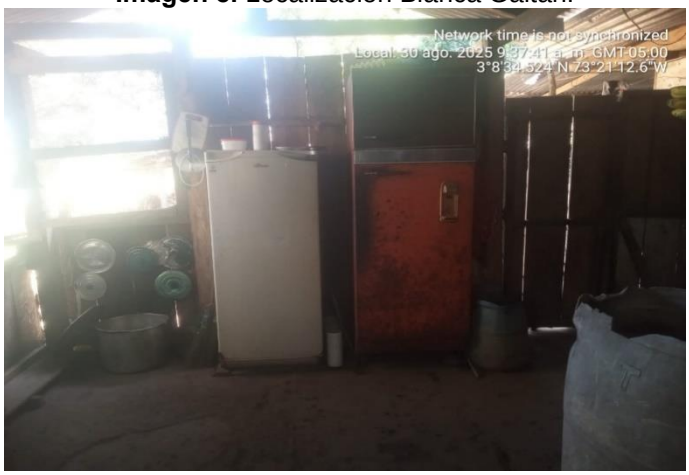

Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA HELENA ZAMBRANO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 9. Localización Rosa Zambrano.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE HECTOR ESPINOSA MUÑOZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 10. Localización José Espinosa.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JESUS ANTONIO ESPINOSA MUÑOZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 11. Localización Jesús Espinosa.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: VICTOR HUGO VELASCO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 12. Construcción de Estufa, Víctor Velasco.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GILBERTO MANCILLA MANCILLA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 13. Construcción de Estufa, Gilberto Mancilla.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: OMAR VICENTE MORENO AVELLA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 14. Construcción de Estufa, Omar Moreno.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA BETTY PEREZ MORENO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 15. Construcción de Estufa, María Pérez.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BLANCA NUBIA GAITAN ESPINOSA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 16. Construcción de Estufa, Blanca Gaitán.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA HELENA ZAMBRANO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 17. Construcción de Estufa, Rosa Zambrano.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE HECTOR ESPINOSA MUÑOZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 18. Construcción de Estufa, José Espinosa.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JESUS ANTONIO ESPINOSA MUÑOZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 19. Construcción de Estufa, Jesús Espinosa.



Fuente: Contratista.

8.3.4. VEREDA CANADÁ.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA TULIA POVEDA VARELA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 20. Localización Rosa Poveda.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LINO YATE CADENA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 21. Localización Lino Yate.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIBEL CAMACHO ROJAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 22. Localización Maribel Camacho.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE OLIVERIO MONROY MONROY
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 23. Localización José Monroy.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARTHA LUCIA GONZALEZ SAENZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 24. Localización Martha González.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JULIO CESAR SANCHEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 25. Localización Julio Sánchez.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUIS ENRIQUE SANCHEZ LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.


Imagen 26. Localización Luis Sánchez.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ MARY CANTOR MENDEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 27. Localización Luz Cantor.

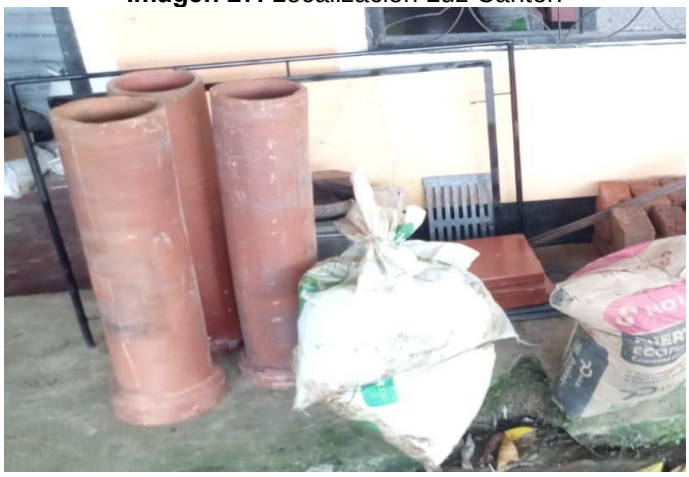

Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BRISA EDILMA OVALLE CASTILLO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 28. Localización Brisa Ovalle.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARLENY GUTIERREZ ALVAREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 29. Localización Marleny Gutiérrez.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MERCEDES CAÑADULCE BELLO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 30. Localización Mercedes Cañadulce.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: RESURECCION MUÑOZ CARVAJAL
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 31. Localización Resurrección Muñoz.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NUBIA JANETH GARCIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 32. Localización Nubia García.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SANDRA PATRICIA FORERO GARZON
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 33. Localización Sandra Forero.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LEYDI JOHANA SOTO FAJARDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 34. Localización Leydi Soto.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA TULIA POVEDA VARELA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 35. Construcción de Estufa, Rosa Poveda.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LINO YATE CADENA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 36. Construcción de Estufa, Lino Yate.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIBEL CAMACHO ROJAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 37. Construcción de Estufa, Maribel Camacho.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE OLIVERIO MONROY MONROY
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 38. Construcción de Estufa, José Monroy.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARTHA LUCIA GONZALEZ SAENZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 39. Construcción de Estufa, Martha González.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JULIO CESAR SANCHEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 40. Construcción de Estufa, Julio Sánchez.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUIS ENRIQUE SANCHEZ LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 41. Construcción de Estufa, Luis Sánchez.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ MARY CANTOR MENDEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 42. Construcción de Estufa, Luz Cantor.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BRISA EDILMA OVALLE CASTILLO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 43. Construcción de Estufa, Brisa Ovalle.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARLENY GUTIERREZ ALVAREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 44. Construcción de Estufa, Marleny Gutiérrez.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MERCEDES CAÑADULCE BELLO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 45. Construcción de Estufa, Mercedes Cañadulce.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: RESURECCION MUÑOZ CARVAJAL
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 46. Construcción de Estufa, Resurrección Muñoz.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NUBIA JANETH GARCIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 47. Construcción de Estufa, Nubia García.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SANDRA PATRICIA FORERO GARZON
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 48. Construcción de Estufa, Sandra Forero.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LEYDI JOHANA SOTO FAJARDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 49. Construcción de Estufa, Leydi Soto.



Fuente: Contratista

8.3.5. VEREDA VERACRUZ.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE LUIS AMADO VERGARA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 50. Localización José Amado.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JIMI JOHANI GONZALEZ ORTIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 51. Localización Jimi González.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ELIZABETH RIOS PULGARIN
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 52. Localización Elizabeth Ríos.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GILBERTO VARGAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 53. Localización Gilberto Vargas.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FERNANDO CHICUE FUENTES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 54. Localización Fernando Chicue.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GABRIEL VACA AMADO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 55. Localización Gabriel Vaca.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DIDIER ARANGO MONTOYA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 56. Localización Didier Arango.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ALEJANDRINA HERNANDEZ TORRES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 57. Localización María Hernández.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARLENE ALDANA HERNANDEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 58. Localización Marlene Aldana



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GLORIA YANETH BAQUERO RUIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 59. Localización Gloria Baquero.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ORLANDO BAQUERO RUIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 60. Localización Orlando Baquero.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: URIEL GARZON ROSALES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 61. Localización Uriel Garzón.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EIBER ORDOÑEZ MEJIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 62. Localización Eiber Ordoñez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE LUIS AMADO VERGARA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 63. Construcción de Estufa, José Amado.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JIMI JOHANI GONZALEZ ORTIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 64. Construcción de Estufa, Jimi González.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ELIZABETH RIOS PULGARIN
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 65. Construcción de Estufa, Elizabeth Ríos.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GILBERTO VARGAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 66. Construcción de Estufa, Gilberto Vargas.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FERNANDO CHICUE FUENTES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 67. Construcción de Estufa, Fernando Chicue.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GABRIEL VACA AMADO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 68. Construcción de Estufa, Gabriel Vaca.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DIDIER ARANGO MONTOYA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 69. Construcción de Estufa, Didier Arango.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ALEJANDRINA HERNANDEZ TORRES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 70. Construcción de Estufa, María Hernández.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARLENE ALDANA HERNANDEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 71. Construcción de Estufa, Marlene Aldana



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GLORIA YANETH BAQUERO RUIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 72. Construcción de Estufa, Gloria Baquero.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ORLANDO BAQUERO RUIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 73. Construcción de Estufa, Orlando Baquero.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: URIEL GARZON ROSALES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 74. Construcción de Estufa, Uriel Garzón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EIBER ORDOÑEZ MEJIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 75. Construcción de Estufa, Eiber Ordoñez.



Fuente: Contratista

8.3.6. VEREDA LA ISLANDIA.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ERLIS GUARIN VACA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 76. Localización Erlis Guarín.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MAYERLY URREGO AGUDELO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 77. Localización Mayerly Urrego.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA ISABEL HERNANDEZ BROCHERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 78. Localización Rosa Hernández.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PAOLA ANDREA HERNANDEZ BROCHERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 79. Localización Paola Hernández.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: OCTAVIO AYALA AYALA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 80. Localización Octavio Ayala.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE ALVARO ROJAS GUERRERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 81. Localización José Rojas.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ADOLFO GUERRERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 82. Localización Adolfo Guerrero.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JAIRO AMAYA PEREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 83. Localización Jairo Amaya.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ERLIS GUARIN VACA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 84. Construcción de Estufa, Erlis Guarín.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MAYERLY URREGO AGUDELO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 85. Construcción de Estufa, Mayerly Urrego.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA ISABEL HERNANDEZ BROCHERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 86. Construcción de Estufa, Rosa Hernández.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PAOLA ANDREA HERNANDEZ BROCHERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 87. Construcción de Estufa, Paola Hernández.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: OCTAVIO AYALA AYALA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 88. Construcción de Estufa, Octavio Ayala.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE ALVARO ROJAS GUERRERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 89. Construcción de Estufa, José Rojas.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ADOLFO GUERRERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 90. Construcción de Estufa, Adolfo Guerrero.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JAIRO AMAYA PEREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 91. Construcción de Estufa, Jairo Amaya.



Fuente: Contratista

8.3.7. VEREDA CHAFURRAY.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ENRIQUE BARON HERRERA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 92. Localización Enrique Barón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ DARY SANCHEZ MARTINEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 93. Localización Luz Sánchez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIANA ARANGO ARAGON
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 94. Localización Mariana Arango.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA CLELIA GUZMAN SAAVEDRA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 95. Localización María Guzmán.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA ELENA ACOSTA RESTREPO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 96. Localización Rosa Acosta.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MONICA ALEJANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 97. Localización Mónica Jiménez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROCIO VARON TORRES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 98. Localización Rocío Varón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DRUCY AREBELLA MARTINEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 99. Localización Drucy Arebella.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ORLANDO JOSE RAUL VARGAS VARGAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 100. Localización Orlando Vargas.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EVA LUGO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 101. Localización Eva Lugo.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LENY PATRICIA TELLEZ AGUIRRE
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 102. Localización Leny Téllez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SOLEDAD MANRIQUE BETANCOURT
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 103. Localización Soledad Manrique.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: KAREN DAYANNA BARBOSA TORRES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 104. Localización Karen Barbosa.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: WILLIAM EDUARDO ESCARRAGA GOMEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 105. Localización William Escarraga.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ENRIQUE BARON HERRERA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 106. Construcción de Estufa, Enrique Barón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ DARY SANCHEZ MARTINEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 107. Construcción de Estufa, Luz Sánchez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIANA ARANGO ARAGON
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 108. Construcción de Estufa, Mariana Arango.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA CLELIA GUZMAN SAAVEDRA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 109. Construcción de Estufa, María Guzmán.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA ELENA ACOSTA RESTREPO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 110. Construcción de Estufa, Rosa Acosta.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MONICA ALEJANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 111. Construcción de Estufa, Mónica Jiménez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROCIO VARON TORRES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 112. Construcción de Estufa, Rocío Varón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DRUCY AREBELLA MARTINEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 113. Construcción de Estufa, Drucy Arebella.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ORLANDO JOSE RAUL VARGAS VARGAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 114. Construcción de Estufa, Orlando Vargas.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EVA LUGO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 115. Construcción de Estufa, Eva Lugo.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LENY PATRICIA TELLEZ AGUIRRE
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 116. Construcción de Estufa, Leny Téllez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SOLEDAD MANRIQUE BETANCOURT
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 117. Construcción de Estufa, Soledad Manrique.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: KAREN DAYANNA BARBOSA TORRES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 118. Construcción de Estufa, Karen Barbosa.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: WILLIAM EDUARDO ESCARRAGA GOMEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 119. Construcción de Estufa, William Escarraga.



Fuente: Contratista

8.3.8. VEREDA TIERRA GRATA.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NORALBA RODRIGUEZ TREJOS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 120. Localización Noralba Rodríguez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA RICO MORA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 121. Localización María Rico.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CLAUDIA JULIANA SUAREZ RUIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 122. Localización Claudia Suarez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MERLY ZAYURY CORREDOR LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 123. Localización Merly Corredor.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA EVELIA PULIDO ELIZALDE
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 124. Localización María Pulido.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MELIDA ARIAS CARO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 125. Localización Mélida Arias.




Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: RAMIRO RUBIO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 126. Localización Ramiro Rubio.

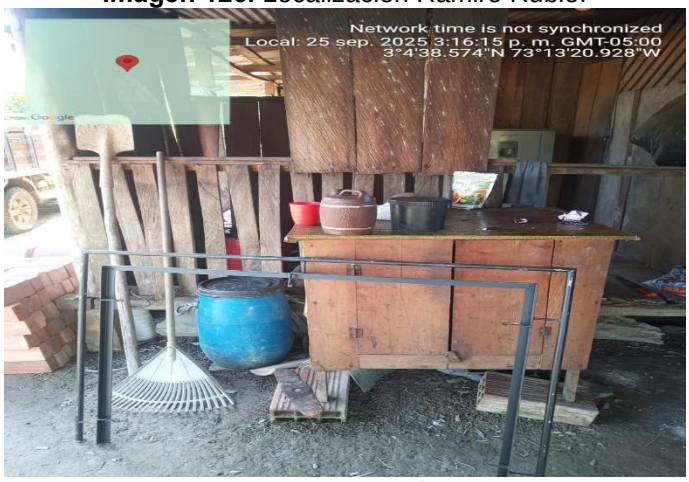

Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YEMI BARON DURAN
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 127. Localización Yemi Barón.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARMEN GARZON GARCIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 128. Localización Carmen Garzón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA RIOS QUINTERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 129. Localización María Ríos.




Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NIDIA MARCELA GARCIA LONDOÑO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 130. Localización Nidia García.

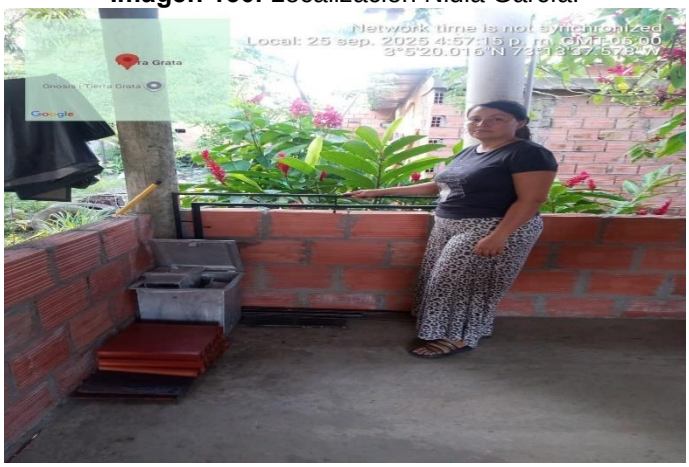

Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANYYI ANDREA REYES CASTELLANOS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 131. Localización Anyyi Reyes.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YESICCA PAOLA RIOS TOQUICA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 132. Localización Yesicca Ríos.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA ELENA CAVIELES CASTELLANOS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 133. Localización Rosa Cavieles.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GLENIS VANESA NAVARRO LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 134. Localización Glenis Navarro.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JHON FREDDY ORTIZ PULIDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 135. Localización Jhon Ortiz.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MATILDE ROMERO BARBOSA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 136. Localización Matilde Romero.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NORALBA RODRIGUEZ TREJOS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 137. Construcción de Estufa, Noralba Rodríguez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA RICO MORA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 138. Construcción de Estufa, María Rico.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CLAUDIA JULIANA SUAREZ RUIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 139. Construcción de Estufa, Claudia Suarez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MERLY ZAYURY CORREDOR LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 140. Construcción de Estufa, Merly Corredor.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA EVELIA PULIDO ELIZALDE
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 141. Construcción de Estufa, María Pulido.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MELIDA ARIAS CARO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 142. Construcción de Estufa, Mélida Arias.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: RAMIRO RUBIO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 143. Construcción de Estufa, Ramiro Rubio.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YEMI BARON DURAN
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 144. Construcción de Estufa, Yemi Barón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARMEN GARZON GARCIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 145. Construcción de Estufa, Carmen Garzón.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA RIOS QUINTERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 146. Construcción de Estufa, María Ríos.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NIDIA MARCELA GARCIA LONDOÑO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 147. Construcción de Estufa, Nidia García.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANYYI ANDREA REYES CASTELLANOS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 148. Construcción de Estufa, Anyyi Reyes.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YESICCA PAOLA RIOS TOQUICA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 149. Construcción de Estufa, Yesicca Ríos.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSA ELENA CAVIELES CASTELLANOS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 150. Construcción de Estufa, Rosa Cavieles.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GLENIS VANESA NAVARRO LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 151. Construcción de Estufa, Glenis Navarro.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JHON FREDDY ORTIZ PULIDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 152. Construcción de Estufa, Jhon Ortiz.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MATILDE ROMERO BARBOSA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 153. Construcción de Estufa, Matilde Romero.



Fuente: Contratista

8.3.9. VEREDA CHINATA.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: VIDALIA GARZON MEJIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 154. Localización Vidalia Garzón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARMEN ROSA SANTANA RODRIGUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 155. Localización Carmen Santana.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LILIA SANTANA RODRIGUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 156. Localización Lilia Santana.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ROSALBA BENITEZ DE MUÑOZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 157. Localización María Benítez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LILIANA MONDRAGON VARGAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 158. Localización Liliana Mondragón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YANETH ESPINOSA RODRIGUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 159. Localización Yaneth Espinosa.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUIS FELIPE RENGIFO HOYOS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 160. Localización Luis Rengifo.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LEONILDE AYALA PAEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 161. Localización Leonilde Ayala.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FABER DE LOS RIOS ARROYAVE
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 162. Localización Faber de los Ríos.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIBEL DE LOS RIOS FAJARDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 163. Localización Maribel de los Ríos.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MAUREN LORENA AULLON SUAREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 164. Localización Mauren Aullon.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GILBERTO AYALA PAEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 165. Localización Gilberto Ayala.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: VIDALIA GARZON MEJIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 166. Construcción de Estufa, Vidalia Garzón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARMEN ROSA SANTANA RODRIGUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 167. Construcción de Estufa, Carmen Santana.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LILIA SANTANA RODRIGUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 168. Construcción de Estufa, Lilia Santana.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ROSALBA BENITEZ DE MUÑOZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 169. Construcción de Estufa, María Benítez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LILIANA MONDRAGON VARGAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 170. Construcción de Estufa, Liliana Mondragón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YANETH ESPINOSA RODRIGUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 171. Construcción de Estufa, Yaneth Espinosa.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUIS FELIPE RENGIFO HOYOS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 172. Construcción de Estufa, Luis Rengifo.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LEONILDE AYALA PAEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 173. Construcción de Estufa, Leonilde Ayala.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FABER DE LOS RIOS ARROYAVE
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 174. Construcción de Estufa, Faber de los Ríos.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIBEL DE LOS RIOS FAJARDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 175. Construcción de Estufa, Maribel de los Ríos.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MAUREN LORENA AULLON SUAREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 176. Construcción de Estufa, Mauren Aullon.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GILBERTO AYALA PAEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 177. Construcción de Estufa, Gilberto Ayala.



Fuente: Contratista

8.3.10. VEREDA JOSÉ MARÍA.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JESSICA ALEJANDRA VERGARA CARDONA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 178. Localización Jessica Vergara.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE MIGUEL ROJAS GUERRERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 179. Localización José Rojas.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA VIANEY HOYOS DE AGUILAR
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 180. Localización María Hoyos.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUIS IRLEY ROJAS CASTILLO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 181. Localización Luis Rojas.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CONCEPCION MOSQUERA BARRERA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 182. Localización Concepción Mosquera.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FRANKLIN MARTIN TUNJANO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 183. Localización Franklin Martin.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SUSANA NIÑO CUELLAR
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 184. Localización Susana Niño.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JESSICA ALEJANDRA VERGARA CARDONA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 185. Construcción de Estufa, Jessica Vergara.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE MIGUEL ROJAS GUERRERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 186. Construcción de Estufa, José Rojas.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA VIANEY HOYOS DE AGUILAR
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 187. Construcción de Estufa, María Hoyos.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUIS IRLEY ROJAS CASTILLO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 188. Construcción de Estufa, Luis Rojas.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CONCEPCION MOSQUERA BARRERA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 189. Construcción de Estufa, Concepción Mosquera.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FRANKLIN MARTIN TUNJANO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 190. Construcción de Estufa, Franklin Martin.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SUSANA NIÑO CUELLAR
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 191. Construcción de Estufa, Susana Niño.



Fuente: Contratista

8.3.11. VEREDA LA TIGRERA.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GILBERTO ANTONIO RAMIREZ RUBIO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 192. Localización Gilberto Ramírez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JESSICA CATERINE RODRIGUEZ GOMEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 193. Localización Jessica Rodríguez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FLORO OLARTE MATEUS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 194. Localización Floro Olarte.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BERNARDO BARRANTES PEDRAZA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 195. Localización Bernardo Barrantes.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: HIMER ALCIDES PEÑA MOJICA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 196. Localización Himer Peña.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ MARINA PEREZ PEREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 197. Localización Luz Pérez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NELLY QUIÑONEZ PULIDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 198. Localización Nelly Quiñonez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ERIKA VIVIANA LOPEZ RAMIREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 199. Localización Erika López.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUCILA LOPEZ RAMIREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 200. Localización Lucila López.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CAMILO TRUJILLO TRIANA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 201. Localización Camilo Trujillo.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ MIRYAM GONZALEZ LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 202. Localización Luz González.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YENNY YANETH CHINGATÉ OSPINA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 203. Localización Yenny Chingaté.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FLOR MARINA OSPINA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 204. Localización Flor Ospina.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANDREA JURADO GOMEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 205. Localización Andrea Jurado.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CECILIA GOMEZ VASQUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.


Imagen 206. Localización Cecilia Gómez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MAYERLYN ALVARADO LINARES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 207. Localización Mayerlyn Alvarado.

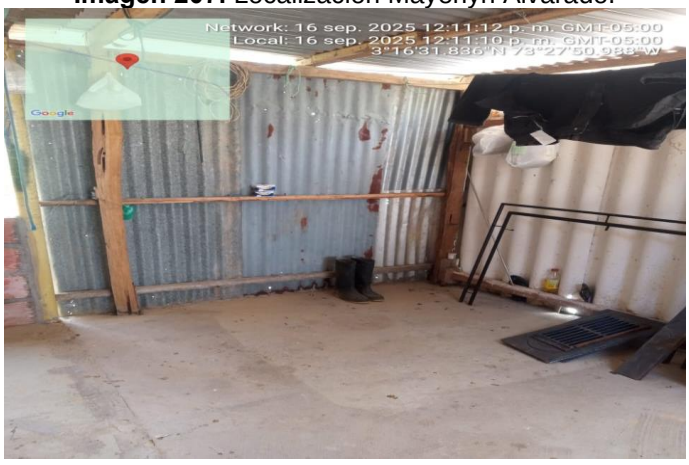

Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE REINEL OCAMPO GIRALDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 208. Localización José Ocampo.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SERAFINA AGUIRRE CIFUENTES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 209. Localización Serafina Aguirre.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GILBERTO ANTONIO RAMIREZ RUBIO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 210. Construcción de Estufa, Gilberto Ramírez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JESSICA CATERINE RODRIGUEZ GOMEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 211. Construcción de Estufa, Jessica Rodríguez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FLORO OLARTE MATEUS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 212. Construcción de Estufa, Floro Olarte.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BERNARDO BARRANTES PEDRAZA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 213. Construcción de Estufa, Bernardo Barrantes.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: HIMER ALCIDES PEÑA MOJICA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 214. Construcción de Estufa, Himer Peña.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ MARINA PEREZ PEREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 215. Construcción de Estufa, Luz Pérez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NELLY QUIÑONEZ PULIDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 216. Construcción de Estufa, Nelly Quiñonez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ERIKA VIVIANA LOPEZ RAMIREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 217. Construcción de Estufa, Erika López.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUCILA LOPEZ RAMIREZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 218. Construcción de Estufa, Lucila López.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CAMILO TRUJILLO TRIANA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 219. Construcción de Estufa, Camilo Trujillo.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ MIRYAM GONZALEZ LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 220. Construcción de Estufa, Luz González.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YENNY YANETH CHINGATÉ OSPINA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 221. Construcción de Estufa, Yenny Chingaté.




Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FLOR MARINA OSPINA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 222. Construcción de Estufa, Flor Ospina.

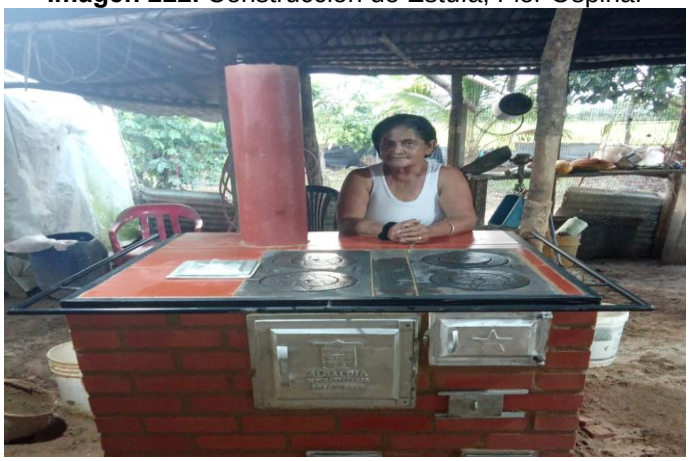

Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANDREA JURADO GOMEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 223. Construcción de Estufa, Andrea Jurado.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CECILIA GOMEZ VASQUEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 224. Construcción de Estufa, Cecilia Gómez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MAYERLYN ALVARADO LINARES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 225. Construcción de Estufa, Mayerlyn Alvarado.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE REINEL OCAMPO GIRALDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.


Imagen 226. Construcción de Estufa, José Ocampo.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SERAFINA AGUIRRE CIFUENTES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 227. Construcción de Estufa, Serafina Aguirre.

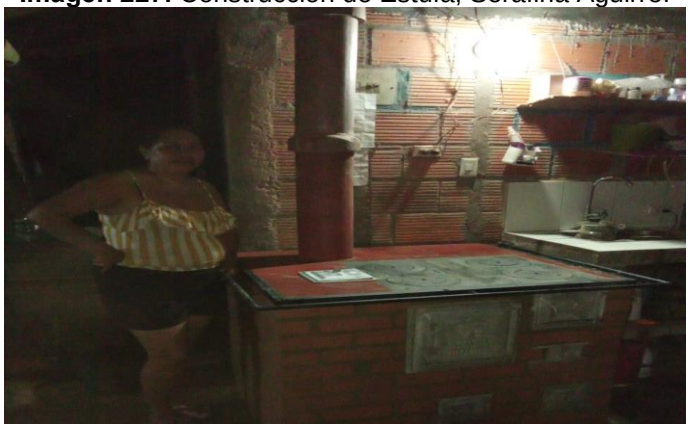

Fuente: Contratista

8.3.12. VEREDA LA UNIÓN.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YURANY ANDREA BERMUDEZ CORDERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 228. Localización Yurany Bermúdez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YOLANDA RUIZ MORENO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 229. Localización Yolanda Ruiz.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: RAFAEL POVEDA SANCHEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 230. Localización Rafael Poveda.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JAIRO CASTRO ORTIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 231. Localización Jairo Castro.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LINO BARREÑO GONZALEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 232. Localización Lino Barreño.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ROSALBA SEGURA ALZATE
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 233. Localización María Segura.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ARACELLY SANTOS ROJAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 234. Localización María Santos.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE DEL CARMEN REMOLINA MONTERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 235. Localización José Remolina.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FABIOLA LLANOS GALLEGO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 236. Localización Fabiola Llanos.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA DE JESUS LANCHEROS CORTES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 237. Localización María Lancheros.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ MILA MORENO GALINDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 238. Localización Luz Moreno.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JAIME DANIEL GRANADA LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 239. Localización Jaime Granada.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA NIEVES AYALA DE VERANO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 240. Localización María Ayala.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARTHA ELENA CASAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 241. Localización Martha Casas.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ DARY CASTIBLANCO GARCIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 242. Localización Luz Castiblanco.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: KENY NAIDU MOLINA ROJAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 243. Localización Keny Molina.




Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARTHA LUCIA VERANO AYALA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 244. Localización Martha Verano.

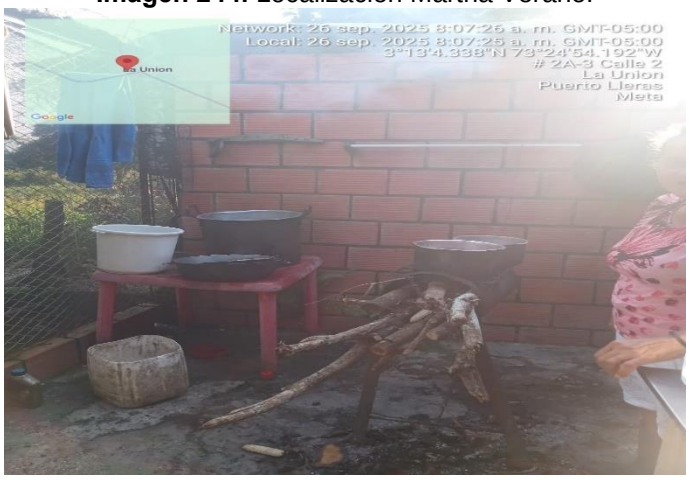

Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ YOLANDA SANCHEZ ESPITIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 245. Localización Luz Sánchez.




Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LADY MARCELA RODRIGUEZ VARGAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 246. Localización Lady Rodríguez.

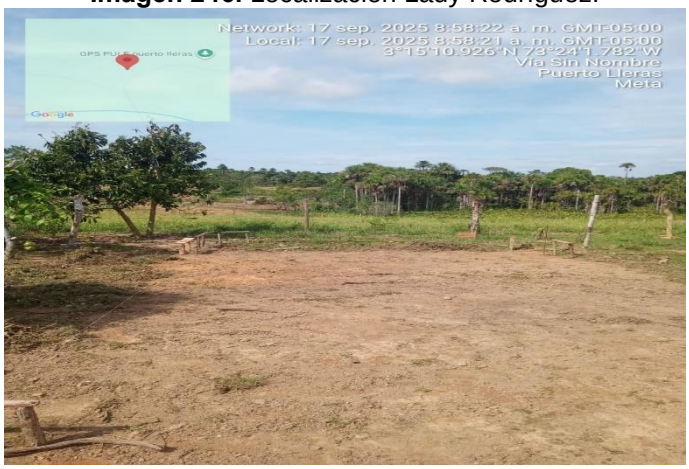

Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GLORIA ILMA PEÑA DE DIAZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 247. Localización Gloria Peña.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ARTURO GARZON MATIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 248. Localización Arturo Garzón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUCY ELVIRA HUILA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 249. Localización Lucy Huila.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE HUMBERTO PACHECO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 250. Localización José Pacheco.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YURANY ANDREA BERMUDEZ CORDERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 251. Construcción de Estufa, Yurany Bermúdez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YOLANDA RUIZ MORENO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 252. Construcción de Estufa, Yolanda Ruiz.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: RAFAEL POVEDA SANCHEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 253. Construcción de Estufa, Rafael Poveda.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JAIRO CASTRO ORTIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 254. Construcción de Estufa, Jairo Castro.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LINO BARREÑO GONZALEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 255. Construcción de Estufa, Lino Barreño.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ROSALBA SEGURA ALZATE
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 256. Construcción de Estufa, María Segura.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA ARACELLY SANTOS ROJAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 257. Construcción de Estufa, María Santos.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE DEL CARMEN REMOLINA MONTERO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.


Imagen 258. Construcción de Estufa, José Remolina.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FABIOLA LLANOS GALLEGO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 259. Construcción de Estufa, Fabiola Llanos.

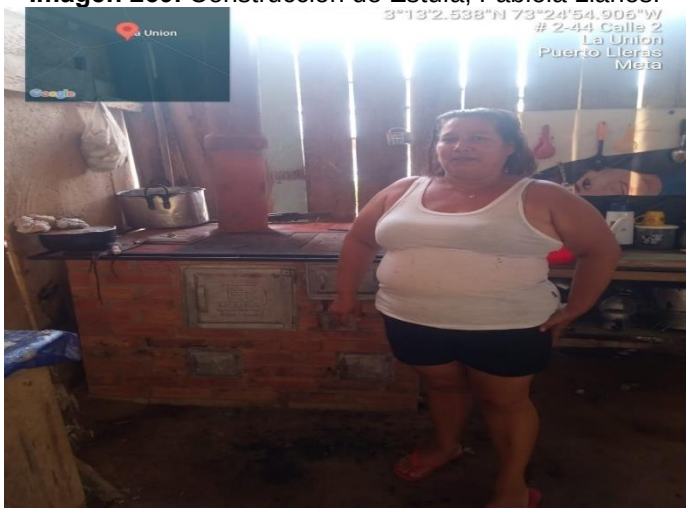

Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA DE JESUS LANCHEROS CORTES
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 260. Construcción de Estufa, María Lancheros.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ MILA MORENO GALINDO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 261. Construcción de Estufa, Luz Moreno.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JAIME DANIEL GRANADA LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 262. Construcción de Estufa, Jaime Granada.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA NIEVES AYALA DE VERANO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 263. Construcción de Estufa, María Ayala.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARTHA ELENA CASAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 264. Construcción de Estufa, Martha Casas.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ DARY CASTIBLANCO GARCIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 265. Construcción de Estufa, Luz Castiblanco.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: KENY NAIDU MOLINA ROJAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 266. Construcción de Estufa, Keny Molina.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARTHA LUCIA VERANO AYALA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 267. Construcción de Estufa, Martha Verano.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ YOLANDA SANCHEZ ESPITIA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 268. Construcción de Estufa, Luz Sánchez.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LADY MARCELA RODRIGUEZ VARGAS
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 269. Construcción de Estufa, Lady Rodríguez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GLORIA ILMA PEÑA DE DIAZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 270. Construcción de Estufa, Gloria Peña.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ARTURO GARZON MATIZ
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 271. Construcción de Estufa, Arturo Garzón.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUCY ELVIRA HUILA
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 272. Construcción de Estufa, Lucy Huila.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE HUMBERTO PACHECO
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 273. Construcción de Estufa, José Pacheco.



Fuente: Contratista

8.3.13. VEREDA LA ESMERALDA.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANA MAGNOLIA OVIEDO MURILLO.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 274. Localización Ana Oviedo.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NIDIA YULEY PAVON GARCIA.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 275. Localización Nidia Pavón.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARLOS JULIO MARTINES HERNANDEZ.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 276. Localización Carlos Martínez.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GLORIA LUZ HERNANDEZ TORRES.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 277. Localización Gloria Hernández.



Fuente: Contratista.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: WILSON ALMANZA FIERRO.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 278. Localización Wilson Almanza.



Fuente: Contratista.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANA MAGNOLIA OVIEDO MURILLO.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 279. Construcción de Estufa, Ana Oviedo.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META″

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NIDIA YULEY PAVON GARCIA.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 280. Construcción de Estufa, Nidia Pavón.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARLOS JULIO MARTINES HERNANDEZ.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 281. Construcción de Estufa, Carlos Martínez.



Fuente: Contratista

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META”

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GLORIA LUZ HERNANDEZ TORRES.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 282. Construcción de Estufa, Gloria Hernández.



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: WILSON ALMANZA FIERRO.
MUNICIPIO: PUERTO LLERAS - META
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META.

Imagen 283. Construcción de Estufa, Wilson Almanza.



Fuente: Contratista

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META"

9. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

9.1. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO.

Tabla 5. Balance General del Contrato.

	CONTRATO	EJECUTADO	PAGADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 35.788.536,00		
VALOR PAGADO POR ACTA PARCIAL			$ -
VALOR POR PAGAR Y NO EJECUTADO		$ 35.788.536,00	$ 35.788.536,00
SUMAS IGUALES	**$ 35.788.536,00**	**$ 35.788.536,00**	**$ 35.788.536,00**

Fuente: Contratista.

9.2. CONTROL DE POLIZAS.

9.2.1. CONTROL DE POLIZAS ACTUALES.

Tabla 6. Control de Pólizas.

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO PÓLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	30-44-101065413	21/08/2025	25/05/2026	$ 3.578.853,60
PAGO DE SALARIOS			21/08/2025	25/01/2029	$ 1.789.426,80
CALIDAD DEL SERVICIO			21/08/2025	25/05/2026	$ 3.578.853,60

Fuente: Contratista.

9.2.2. ACTAS LEGALES TRAMITADAS.

A la fecha se han realizado las siguientes actas:

- ✓ Acta de Inicio de fecha 21 de Agosto de 2025.
- ✓ Acta de Prorroga No. 01, 12 de Noviembre de 2025.
- ✓ Acta de Terminación, 20 de Enero de 2026.

10. INCONVENIENTES PRESENTADOS.

Durante el desarrollo y ejecución de actividades no se presentaron demasiados inconvenientes.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META"

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ El porcentaje ejecutado acumulado es del **100,00%,** que equivale a **$35.788.536,00** (Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Treinta Seis Pesos Ml/Cte.) por un valor contratado del **100,00%** que equivale a **$35.788.536,00** (Treinta Cinco Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Treinta Seis Pesos Ml/Cte.).
- ✓ El día **21 de Agosto de 2025** se dio inicio al contrato de interventoría con un total de **Ciento Cincuenta (150) Días,** para lo cual el tiempo ejecutado es de **Ciento Cincuenta (150) Días,** que equivale al **100,00%** del plazo total del proyecto.
- ✓ Realizar mantenimientos preventivos a cada una de las estufas de manera rutinaria para cumplir con la vida útil de cada una de ellas.



Elaboró:
SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO
R.L GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS

Anexos:

- ✓ Planillas de Seguridad Social.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 50 SUR 31A 21 TORRE 2 APTO 201	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	11 - INTER - ESTUFAS PUERTO LLERAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7987388875**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	7						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1781190867		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 45.800	$ 300	$ 46.100
230201	230201- PROTECCION	1	$ 177.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 177.100	$ 800	$ 177.900
SUBTOTALES:										**$ 222.900**	**$ 1.100**	**$ 224.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 0	$ 100	$ 0	$ 11.500	$ 100	$ 0	$ 11.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 44.300	$ 200	$ 0	$ 44.500
SUBTOTALES:													**$ 55.800**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 56.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.000	$ 97.000	$ 500	$ 0	$ 97.500
SUBTOTALES:									**$ 97.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 97.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 55.800	$ 300	$ 56.100
SUBTOTALES:			**$ 55.800**	**$ 300**	**$ 56.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 50 SUR 31A 21 TORRE 2 APTO 201	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	11 - INTER - ESTUFAS PUERTO LLERAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7987649148**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1820927409		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 531.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.200	$ 0	$ 531.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 137.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.200	$ 0	$ 137.200
SUBTOTALES:										**$ 668.400**	**$ 0**	**$ 668.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 132.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.300	$ 0	$ 0	$ 34.300
SUBTOTALES:													**$ 167.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 167.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 290.800	$ 290.800	$ 0	$ 0	$ 290.800
SUBTOTALES:									**$ 290.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 290.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 167.100	$ 0	$ 167.100
SUBTOTALES:			**$ 167.100**	**$ 0**	**$ 167.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 40404623	SABOGAL MORALES ASTRID	DEPEND		$ 4.285.000	FIJO			SI	01	06															25-14 COLPENSIONES	6	$ 857.000	$ 137.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 137.200	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 857.000	$ 34.300	$ 0	$ 34.300	14-11 - ARL SURA	6	$ 857.000		$ 59.700	6	$ 857.000	CCF34-COFREM META	$ 34.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 86060928	BONILLA AREVALO EDWIN	DEPEND		$ 3.320.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.320.000	$ 531.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 531.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.320.000	$ 132.800	$ 0	$ 132.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.320.000		$ 231.100	30	$ 3.320.000	CCF34-COFREM META	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.293.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 50 SUR 31A 21 TORRE 2 APTO 201	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	11 - INTER - ESTUFAS PUERTO LLERAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989354560**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905810007		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 137.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.200	$ 0	$ 137.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 531.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.200	$ 0	$ 531.200
SUBTOTALES:										**$ 668.400**	**$ 0**	**$ 668.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 132.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.300	$ 0	$ 0	$ 34.300
SUBTOTALES:													**$ 167.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 167.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 290.800	$ 290.800	$ 0	$ 0	$ 290.800
SUBTOTALES:									**$ 290.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 290.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 167.100	$ 0	$ 167.100
SUBTOTALES:			**$ 167.100**	**$ 0**	**$ 167.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 50 SUR 31A 21 TORRE 2 APTO 201	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	11 - INTER - ESTUFAS PUERTO LLERAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993907329**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1999858064

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 531.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 531.200	$ 400	$ 531.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 137.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 137.200	$ 100	$ 137.300
SUBTOTALES:										**$ 668.400**	**$ 500**	**$ 668.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 132.800	$ 100	$ 0	$ 132.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34.300	$ 0	$ 100	$ 0	$ 34.300	$ 100	$ 0	$ 34.400
SUBTOTALES:													**$ 167.100**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 167.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 290.800	$ 290.800	$ 200	$ 0	$ 291.000
SUBTOTALES:									**$ 290.800**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 291.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 167.100	$ 200	$ 167.300
SUBTOTALES:			**$ 167.100**	**$ 200**	**$ 167.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 50 SUR 31A 21 TORRE 2 APTO 201	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	11 - INTER - ESTUFAS PUERTO LLERAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7998902732**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3877849

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 531.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 531.200	$ 3.300	$ 534.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 137.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 137.200	$ 900	$ 138.100
SUBTOTALES:										**$ 668.400**	**$ 4.200**	**$ 672.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34.300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 34.300	$ 300	$ 0	$ 34.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 900	$ 0	$ 132.800	$ 900	$ 0	$ 133.700
SUBTOTALES:													**$ 167.100**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 168.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 290.800	$ 290.800	$ 1.800	$ 0	$ 292.600
SUBTOTALES:									**$ 290.800**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 292.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 167.100	$ 1.100	$ 168.200
SUBTOTALES:			**$ 167.100**	**$ 1.100**	**$ 168.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444436
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 50 SUR 31A 21 TORRE 2 APTO 201	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	11 - INTER - ESTUFAS PUERTO LLERAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004216059**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3893066		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 354.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.200	$ 0	$ 354.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 137.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.200	$ 0	$ 137.200
SUBTOTALES:										**$ 491.400**	**$ 0**	**$ 491.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.300	$ 0	$ 0	$ 34.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.600	$ 0	$ 0	$ 88.600
SUBTOTALES:													**$ 122.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 122.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 213.800	$ 213.800	$ 0	$ 0	$ 213.800
SUBTOTALES:									**$ 213.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 213.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 122.900	$ 0	$ 122.900
SUBTOTALES:			**$ 122.900**	**$ 0**	**$ 122.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		
