| | | |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SABANETA | |
| | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | |
| | NUMERO DE CONTRATO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| | OBJETO DEL CONTRATO: | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| CAPITULO | DESMONTE Y DEMOLICION | FECHA DE CORTE: | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPE Y/O REVOQUE EN MUROS O PISOS en cualquier material, diseño y espesor. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro, retiro de rejillas y demas elementos. Incluye retiro del material sobrante producto de la demolicion | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1= | 0,00 | UNIDAD DE MEDIDA= | M2 |
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2= | 75,2 | CANTIDAD CONTRACTUAL= | 357 |
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3= | 11,20 | PRECIO UNITARIO= | $ 24.733 |
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4= | | ACUMULADO ACTAS= | 86,40 |
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5= | | | |

**ACTA DE OBRA 2**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | No. ELEM. | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALTO | LARGO | ANCHO | | |
|  | DEMOLICION DE REVOQUE EN MAL ESTADO EN LA LOSA DEBAJO DE LOS NUEVOS BANCOS DE SUPLENTE | 7,00 | | 0,80 | 2,00 | 11,20 |
| | *CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE OBRA N°2=* | | | | | 11,20 |

Director contratista de obra

VoBo Supervisor

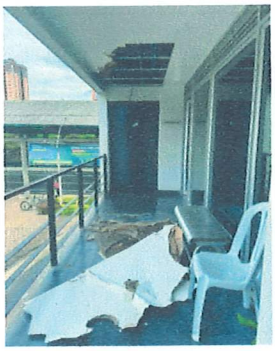
| | | |
|---|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** | |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| **CAPITULO** | DESMONTE Y DEMOLICION | **FECHA DE CORTE:** | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| **2.3** | DESMONTE Y RETIRO DE CIELO FALSO en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0,00 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | M2 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 0 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 30 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 27.898 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 0,00 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 2**

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | **DESCRIPCION** | **DIMENSIONES** | | | **No. ELEM.** | **MEDIDA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **LARGO** | **ANCHO** | | |
|  | DESMONTE DEL CIELO FALSO EN MAL ESTADO EN EL CORREDOR DE ACCESO EXTERNO A LAS OFICINAS | 10,00 | | 1,80 | 1,00 | 18,00 |
| | CORREDOR SEGUNDO PISO | 10,00 | | 1,30 | 1,00 | 13,00 |
| | CORREDOR SEGUNDO PISO | 6,90 | | 0,70 | 1,00 | 4,83 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE OBRA N°2=*** | 35,83 |

Director contratista de obra

VoBo Supervisor

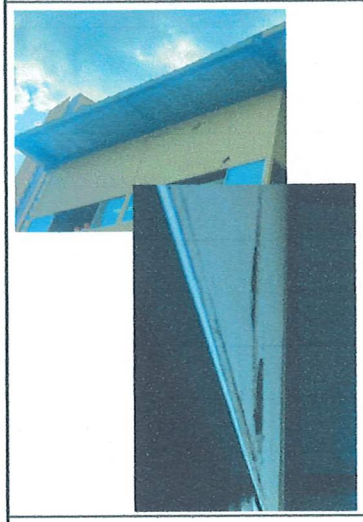
| | |
|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| **CAPITULO** | DESMONTE Y DEMOLICION | **FECHA DE CORTE:** | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| 2.4 | DEMOLICIÓN MURO EN SISTEMA DRYWALL, SUPERBOARD O SIMILAR de cualquier espesor con su estructura y accesorios. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. Incluye retiro del material sobrante producto de la demolicion | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0,00 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | M2 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 0 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 51 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 33.525 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 0,00 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 2**

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | **DESCRIPCION** | **DIMENSIONES** | | | **No. ELEM.** | **MEDIDA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **LARGO** | **ANCHO** | | |
|  | | | | | | |
| | DEMOLICION DE MUROS EN MAL ESTADO EN EL SALON DE ARTES MARCIALES, COSTADO DERECHO DE LAS GRADAS | | | | | |
| | | | 6,45 | 3,95 | | 25,48 |
| | | | 3,95 | 2,10 | | 8,30 |
| | | | 4,00 | 2,00 | | 8,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| **CAPITULO** | DESMONTE Y DEMOLICION | **FECHA DE CORTE:** | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| **2.9** | DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIA, toma, suiches, tubería, caja, adaptadores, bombillas en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | UNIDAD |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 0,00 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 26 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | 20,00 | **PRECIO UNITARIO=** | $ 18.702 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 20,00 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 1**

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | **DESCRIPCION** | **DIMENSIONES** | | | **No. ELEM.** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **LARGO** | **ANCHO** | | |
|  | DESMONTE DE LUMINARIAS EN LAS UNIDADES SANITARIAS | | | | | |
| | BAÑO DE HOMBRE | | | | 5,00 | 5,00 |
| | BAÑO DE MUJERES | | | | 4,00 | 4,00 |
| | CAMERINO SUR | | | | 6,00 | 6,00 |
| | CAMERINO NORTE | | | | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| **CAPITULO** | CUBIERTA Y CIELO FALSOS | **FECHA DE CORTE:** | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | Suministro e instalación de BAJANTE TUBERIA PVC SANITARIA 4" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, soportes, pintura esmalte para exteriores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | ML |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 0,00 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 130 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | 21,20 | **PRECIO UNITARIO=** | $ 68.283 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 21,20 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 1**

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | **DESCRIPCION** | **DIMENSIONES** | | | **No. ELEM.** | **MEDIDA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **LARGO** | **ANCHO** | | |
|  | S.T.I DE BAJANTES INSTALADOS EN LA NUEVA CANOA | | 5,30 | | 4,00 | 21,20 |
| | | | | | | |

***CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE OBRA 1=*** 21,20

Director contratista de obra

VoBo Supervisor

**MUNICIPIO DE SABANETA**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

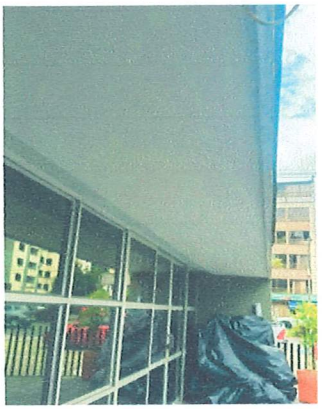
| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| **CAPITULO** | CUBIERTA Y CIELO FALSOS | **FECHA DE CORTE:** | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| 4.7 | Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PLACA DE FIBROCEMENTO (SUPERBOARD) 8mm SIN ESTRUCTURA. Incluye suministro, transporte e instalación de placa de fibrocemento de 8mm, masilla y tornillos. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 2 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | M2 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 0,00 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 5 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | 35,83 | **PRECIO UNITARIO=** | $ 94.425 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 35,83 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 1**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | No. ELEM. | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALTO | LARGO | ANCHO | | |
|  | | | | | | |
| | INSTALACION DEL CIELO FALSO EN MAL ESTADO EN EL CORREDOR DE ACCESO EXTERNO A LAS OFICINAS | 10,00 | | 1,80 | 1,00 | 18,00 |
| | | | | | | |
| | CORREDOR SEGUNDO PISO | 10,00 | | 1,30 | 1,00 | 13,00 |
| | | 6,90 | | 0,70 | 1,00 | 4,83 |

***CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE OBRA 1=*** 35,83

Director contratista de obra

VoBo Supervisor

| | | |
|---|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** | |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| **CAPITULO** | PRELIMINARES Y ANDAMIOS | **FECHA DE CORTE:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Suministro e instalación de MURO EN PANEL YESO (DRYWALL) 1/2" UNA CARA SIN ESTRUCTURA. Incluye suministro, transporte e instalación de panel de yeso de 1/2", masilla, tornillos y accesorios. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0,00 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | M2 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 83,55 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 51 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 57.066 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 83,55 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 2**

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | **DESCRIPCION** | **DIMENSIONES** | | | **No. ELEM.** | **MEDIDA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **LARGO** | **ANCHO** | | |
| | MURO DOBLE CON ESTRUCTURA EN SUPERBOARD SALON DE ARTES MARCIALES | | | | | |
|  | | | 6,45 | 3,95 | 2,00 | 50,96 |
| | | | 3,95 | 2,10 | 2,00 | 16,59 |
| | | | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ***CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE OBRA N°2=*** | 83,55 |

Director contratista de obra

VoBo Supervisor

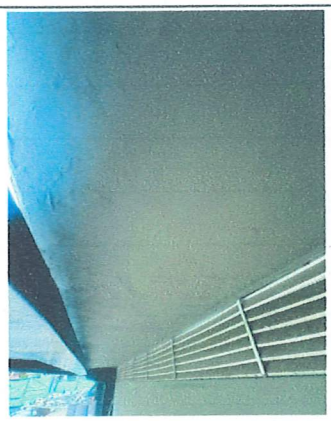
| | | |
|---|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** | |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** | |
| | **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| | **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| **CAPITULO** | PRELIMINARES Y ANDAMIOS | **FECHA DE CORTE:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| **6.2** | Aplicación de REVOQUE SOBRE MUROS con mortero 1:4 en mampostería, drywall o materiales similares, una mano o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0,00 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | M2 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 11,20 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 20 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 39.169 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 11,20 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 2**

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | **DESCRIPCION** | **DIMENSIONES** | | | **No. ELEM.** | **MEDIDA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **LARGO** | **ANCHO** | | |
|  | APLICACION DE REVOQUE EN LA LOSA DEBAJO DE LOS NUEVOS BANCOS DE SUPLENTE | 7,00 | | 0,80 | 2,00 | 11,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | **FECHA DE CORTE:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **7.1** | Suminsitro e instalación de MEMBRANA LANZADA APLICADA EN FRIO DE CURADO INSTANTANEO, ESPESOR DE 1,5mm. Incluye suministro, transporte e instalación la membrana, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0,00 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | M2 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 63,84 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 41 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 206.798 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 63,84 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 2**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | No. ELEM. | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALTO | LARGO | ANCHO | | |
|  | IMPERMEABILIZACION LOSA AREA ADMINISTRATIVA | | 11,20 | 5,70 | | 63,84 |
| | | | | | | |

***CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE OBRA N°2=*** 63,84

Director contratista de obra

VoBo Supervisor

**MUNICIPIO DE SABANETA**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| **CAPITULO** | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | **FECHA DE CORTE:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| 7.4 | Aplicación de PINTURA PLASTICA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados en mamposteria o drywall, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. El personal debe contar con certificado y equipo para trabajos en altura. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0,00 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | M2 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 92,50 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 150 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 32.863 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 92,50 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 2**

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | **DESCRIPCION** | **DIMENSIONES** | | | **No. ELEM.** | **MEDIDA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **LARGO** | **ANCHO** | | |
|  | BAÑO HOMBRE | | 5,20 | 3,80 | 1,00 | 19,76 |
| | | | 3,80 | 0,50 | 2,00 | 3,80 |
| | | | 2,80 | 0,50 | 2,00 | 2,80 |
| | | | 5,80 | 0,50 | 2,00 | 5,80 |
| | BAÑO MUJERES | | 4,85 | 3,70 | 1,00 | 17,95 |
| | | | 4,85 | 0,50 | 2,00 | 4,85 |
| | | | 3,75 | 0,50 | 2,00 | 3,75 |
| | | | 2,25 | 0,50 | 2,00 | 2,25 |
| | CAMERINO NORTE | | 3,00 | 1,39 | 1,00 | 4,16 |
| | | | 2,80 | 2,60 | 1,00 | 7,28 |
| | | | 4,50 | 2,60 | 1,00 | 11,70 |
| | | | 3,00 | 2,80 | 1,00 | 8,40 |
|  | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE OBRA N°2=*** | 92,50 |

Director contratista de obra

VoBo Supervisor

| | |
|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| **CAPITULO** | COMPONENTE ELECTRICO | **FECHA DE CORTE:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|
| **11.1** | SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 4m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tuberia EMT 1/2", accesorios, adaptador EMT, unión EMT, abrazaderas, caja EMT, interruptor doble, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), conector, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE. No incluye luminaria, la misma se pagará en su respectivo ítem | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0,00 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | M2 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 20,00 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 41 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 206.798 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 20,00 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 2**

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | **DESCRIPCION** | **DIMENSIONES** | | | **No. ELEM.** | **MEDIDA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **LARGO** | **ANCHO** | | |
|  | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SALIDAS DE LUMINARIAS EN LAS UNIDADES SANITARIAS | | | | | |
| | | | | | | |
| | BAÑO DE HOMBRE | | | | 5,00 | 5,00 |
| | BAÑO DE MUJERES | | | | 4,00 | 4,00 |
| | CAMERINO SUR | | | | 6,00 | 6,00 |
| | CAMERINO NORTE | | | | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

**MUNICIPIO DE SABANETA**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

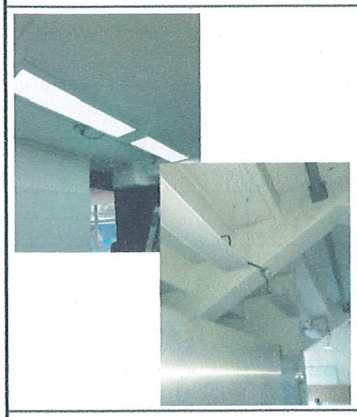
| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | **FECHA DE CORTE:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **11.2** | Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 48W BLANCA 30x120cm empotrada o sobrepuesta en cielo raso de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, luminaria, accesorios, cable encauchetado 3x16, clavija en caucho polo a tierra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 0,00 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | M2 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | 20,00 | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 41 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 206.798 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 20,00 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 2**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | No. ELEM. | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALTO | LARGO | ANCHO | | |
|  | INSTALACION DE LUMINARIAS EN LAS UNIDADES SANITARIAS | | | | | |
| | BAÑO DE HOMBRE | | | | 5,00 | 5,00 |
| | BAÑO DE MUJERES | | | | 4,00 | 4,00 |
| | CAMERINO SUR | | | | 6,00 | 6,00 |
| | CAMERINO NORTE | | | | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | | |

***CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE OBRA N°2=*** 20,00

Director contratista de obra

VoBo Supervisor


| | | |
|---|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** | |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | PRELIMINARES Y ANDAMIOS | **FECHA DE CORTE:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 12.9 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA SOBRE GRADERIAS, ELEMENTOS: DIAGONALES DE SECCIÓN APROXIMADA 3" O SIMILAR. INCLUYE LA CONEXION CON LA ESTRUCTURA. Incluye limpieza y lijada del elemento, adecuación de la superficie a intervenir, reparaciones, aplicación de anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte para elementos metalicos en exterior (o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), acabado final, accesorios, andamios, equipo de trabajo en alturas, soldadura, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Incluye filos y dilataciones, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 274 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | ML |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | 144 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 55.859 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 77,70 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 1**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | No. ELEM. | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KG/ML | LARGO | DIAGONALES | | |
|  | LAS ESTRUCTURA DE LA CUBIEERTA TIENE 12 COLUMNAS O IP Y DE ESTOS 12 ELEMENTOS SE DESPRENDEN O TENSORAN ESTA DIAGONALES CON 3 LONGITUDES DIFERENTES | | 5,70 | | 1,00 | 5,70 |
| | | | 3,10 | | 12,00 | 37,20 |
| | | | 2,90 | | 12,00 | 34,80 |

| | |
|---|---|
| ***CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE OBRA 1=*** | 77,70 |

Director contratista de obra

VoBo Supervisor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SABANETA | | | |
| | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | | | |
| | NUMERO DE CONTRATO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 | | |
| | OBJETO DEL CONTRATO: | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | | |
| MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES | | | | |
| CAPITULO | PRELIMINARES Y ANDAMIOS | | FECHA DE CORTE: | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| OE-1 | SALIDA SANITARIA EN PVC 2 Y/O 1 1/2" de acuerdoa las necesidades encontradas. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones de concreto y mamposteria, tuberia, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes en adobe y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | | | |
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1= | | | UNIDAD DE MEDIDA= | ML |
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2= | | | CANTIDAD CONTRACTUAL= | |
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3= | | | PRECIO UNITARIO= | $ 218.800 |
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4= | | | ACUMULADO ACTAS= | 24,00 |
| CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5= | | | | |

ACTA DE OBRA 1

| REGISTRO FOTOGRAFICO | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | No. ELEM. | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KG/ML | LARGO | DIAGONALES | | |
|  | SALIDAS SANITARIAS PARA LOS SIGUIENTES APARATOS SANITARIOS | | | | | |
| | BAÑO HOMBRES | | | | | |
| | ORINALES | | | | 4,00 | 4,00 |
| | LAVAMANOS | | | | 4,00 | 4,00 |
| | BAÑO MUJERES | | | | | |
| | LAVAMANOS | | | | 4,00 | 4,00 |
| | CAMERINO SUR | | | | | |
| | ORINALES | | | | 4,00 | 4,00 |
| | LAVAMANOS | | | | 2,00 | 2,00 |
|  | CAMERINO NORTE | | | | | |
| | ORINALES | | | | 3,00 | 3,00 |
| | LAVAMANOS | | | | 3,00 | 3,00 |
| | TOTAL | | | | | 24,00 |

Director contratista de obra

VoBo Supervisor

| | | |
|---|---|---|
| | **MUNICIPIO DE SABANETA** | |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** | |
| | **NUMERO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAB-03-009-25 |
| | **OBJETO DEL CONTRATO:** | RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | PRELIMINARES Y ANDAMIOS | **FECHA DE CORTE:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **OE-2** | S.T.J Mortero de nivelacion de 5 cm espesor, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 1=** | 274 | **UNIDAD DE MEDIDA=** | ML |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 2=** | | **CANTIDAD CONTRACTUAL=** | |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 3=** | | **PRECIO UNITARIO=** | $ 67.005 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 4=** | | **ACUMULADO ACTAS=** | 63,84 |
| **CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA 5=** | | | |

**ACTA DE OBRA 1**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | No. ELEM. | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KG/ML | LARGO | DIAGONALES | | |
|  | MORTERO DE NIVELACION PARA IMPERMEABILIZACION LOSA AREA ADMINISTRATIVA | | 11,20 | 5,70 | | 63,84 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
