
Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
1		**ITEM**	**CRONOGRAMA - 108-00-A-COFAC-DIFRA-2026 DE ALISTAMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1. CONFORME A ANEXO TECNICO.**	**18 días?**	**lun 4/05/26**	**jue 21/05/26**	
2		-	**INICIO**	0 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26	
3		**1**	**PRELIMINARES**	**7 días**	**mar 5/05/26**	**lun 11/05/26**	
4		1.1	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	3 días	mar 5/05/26	jue 7/05/26	2CC+1 día
5		1.2	CORTE DE CONCRETO CON DISCO DIAMANTADO	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	4FF
6		1.3	ESCARIFICADO DE PLACAS, PAREDES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN ZONAS CON AFECTACIÓN SUPERFICIAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 1CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVAR ACABO	3 días	jue 7/05/26	sáb 9/05/26	5CC
7		1.4	DESMONTE DE PISO EN VINILO Y/O CAUCHO INCLUYE LIMPIEZA	1 día	dom 10/05/26	dom 10/05/26	6
8		1.5	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE PANELES DE PISO MICARTA	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26	7
9		**2**	**ESTRUCTURA**	**4 días**	**mar 12/05/26**	**vie 15/05/26**	
10		2.1	APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SIKATOP 122 PLUS MONOCOMPONENTE CLIMA CÁLIDO O SIMILAR E+- 1cm. INCLUYE APLICACIÓN DE IMPRIMANTE TIPO SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS	3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	8
11		2.2	TRATAMIENTO DE FISURAS CON EUCOTOP LEVEL O SIMILAR. INCLUYE ESCARIFICADO SUPERFICIE, APLICACIÓN DE ADERCRIL COMO PUENTE ADHERENCIA.	2 días	jue 14/05/26	vie 15/05/26	10CC+2 días
12		**3**	**MAMPOSTERIA**	**8 días**	**lun 4/05/26**	**lun 11/05/26**	
13		3.1	DESMONTE CONTROLADO DE PIEZAS SUELTAS, RESTAURACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE MURO EN BLOQUE No. 5, PV, E = 0,12 m, (FOSO DEL ASCENSOR). INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO 3.000 PSI PARA RELLENO DE DOVELAS, DILATACIONES EN	8 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	2
14		**4**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**2 días**	**vie 15/05/26**	**sáb 16/05/26**	
15		4.1	REEMPLAZO DE SENSOR DE OCUPACIÓN MANUAL REMOTO 3-VÍAS DE PARED, INCLUYE DESINSTALACIÓN ELEMENTO ACTUAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN, NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLEADO	2 días	vie 15/05/26	sáb 16/05/26	11CC+1 día
16		4.2	PASAMURO PVC 2", INCLUYE PERFORACIÓN, RESANE, SELLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1 día	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	15FF
17		**5**	**PAÑETES FILOS Y DILATACIONES**	**3 días**	**dom 17/05/26**	**mar 19/05/26**	
18		5.1	PAÑETE LISO PARA FILOS Y DILATACIONES. (REEMBOQUILLADO DE MUROS Y UNIONES MURO-CIELORRASOS	2 días	dom 17/05/26	lun 18/05/26	16
19		5.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26	18
20		**6**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**8 días**	**mar 12/05/26**	**mar 19/05/26**	
21		6.1	REVESTIMIENTO EN GRAVILLA MONA LAVADA N° 2 ANCHO HASTA 0.25	2 días	lun 18/05/26	mar 19/05/26	19FF
22		6.2	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP1 ; SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE FACHADA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO	2 días	dom 17/05/26	lun 18/05/26	18CC
23		6.3	PISO EN CAUCHO Y/O VINILO EN ROLLO 3MM COLOR GRIS CARBÓN, CORTADO Y PEGADO EN MÓDULOS DE 60X60CM APROXIMADAMENTE PARA ACABADO DE PISO MICARTA.	4 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26	13
24		**7**	**PINTURAS**	**8 días**	**dom 10/05/26**	**dom 17/05/26**	
25		7.1	VINILO TIPO-1, 2 MANOS (INCLUYE RESANES FILOS Y DILATACIONES)	8 días	dom 10/05/26	dom 17/05/26	6
26		**8**	**APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES**	**1 día**	**dom 17/05/26**	**dom 17/05/26**	
27		8.1	CAMBIO DE LOS ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS. (ACOPLES, OBTURADOR, VÁLVULA DE LLENADO, FLOTADOR, MANIJA, HERRAJES), ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN (BRIDA, PERNOS, SILICONA, ACOPLE Y TODOS LOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO	1 día	dom 17/05/26	dom 17/05/26	25FF
28		**9**	**OBRAS GENERALES**	**9 días?**	**mar 12/05/26**	**mié 20/05/26**	
29		9.1	LÁMINA EN ALFAJOR O ANTIDESLIZANTE, ESPESOR 3,5MM, INCLUYE REFUERZOS EN ÁNGULO DE 1½", AGARRADERAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1 día?	dom 17/05/26	dom 17/05/26	27FF
30		9.2	ALERO EXCEL 90X150CM SOPORTE GRIS WINDOOR. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 días	dom 17/05/26	lun 18/05/26	29CC
31		9.3	PELÍCULA ADHESIVA SANDBLASS FROSTED SEGÚN DISEÑO	1 día?	mar 19/05/26	mar 19/05/26	30
32		9.4	MURO SUPERBOARD INTEMPERIE 10MM CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= ENTRE 0,12 Y 0,8 MTS (FOSO DEL ASCENSOR)	4 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26	13
33		9.5	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE.	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26	31CC
34		9.6	MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, MALLA FIBRA DE VIDRIO, MASILLADO Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 DOS CARAS E=0,12 MTS INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR A PLACA	2 días	sáb 16/05/26	dom 17/05/26	32
35		9.7	FLANCHE EN LÁMINA DESARROLLO 0,43 ÚTIL 20CM TRASLAPOS DE 20CM CADA 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA CUBIERTA/MURO INCRUSTADO EN PARED Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	1 día	mié 20/05/26	mié 20/05/26	31
36		9.8	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE REJILLA TRAGANTE Ø 4" EN ALUMINIO EN PISO PLACA DE CONCRETO.	1 día?	mié 20/05/26	mié 20/05/26	35FF
37		9.10	FIJACIÓN MECÁNICA DE LA ESTRUCTURA DE PISO FALSO (PEDESTALES) A LA PLACA ESTRUCTURAL EXISTENTE, MEDIANTE PERNOS DE EXPANSIÓN Y/O TORNILLOS DE ANCLAJE DE 1/4" O 3/8" DE DIÁMETRO; INCLUYE EL DESMONTE Y LA POSTERIOR	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	36FF
38		**11**	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**	**1 día?**	**jue 21/05/26**	**jue 21/05/26**	
39		11.1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	1 día?	jue 21/05/26	jue 21/05/26	37
40		11.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO	1 día?	jue 21/05/26	jue 21/05/26	39FF
41		-	**I.V.A**	**0 días**	**lun 4/05/26**	**lun 4/05/26**	
42		-	19%	0 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26	
43		-	FINAL	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	40

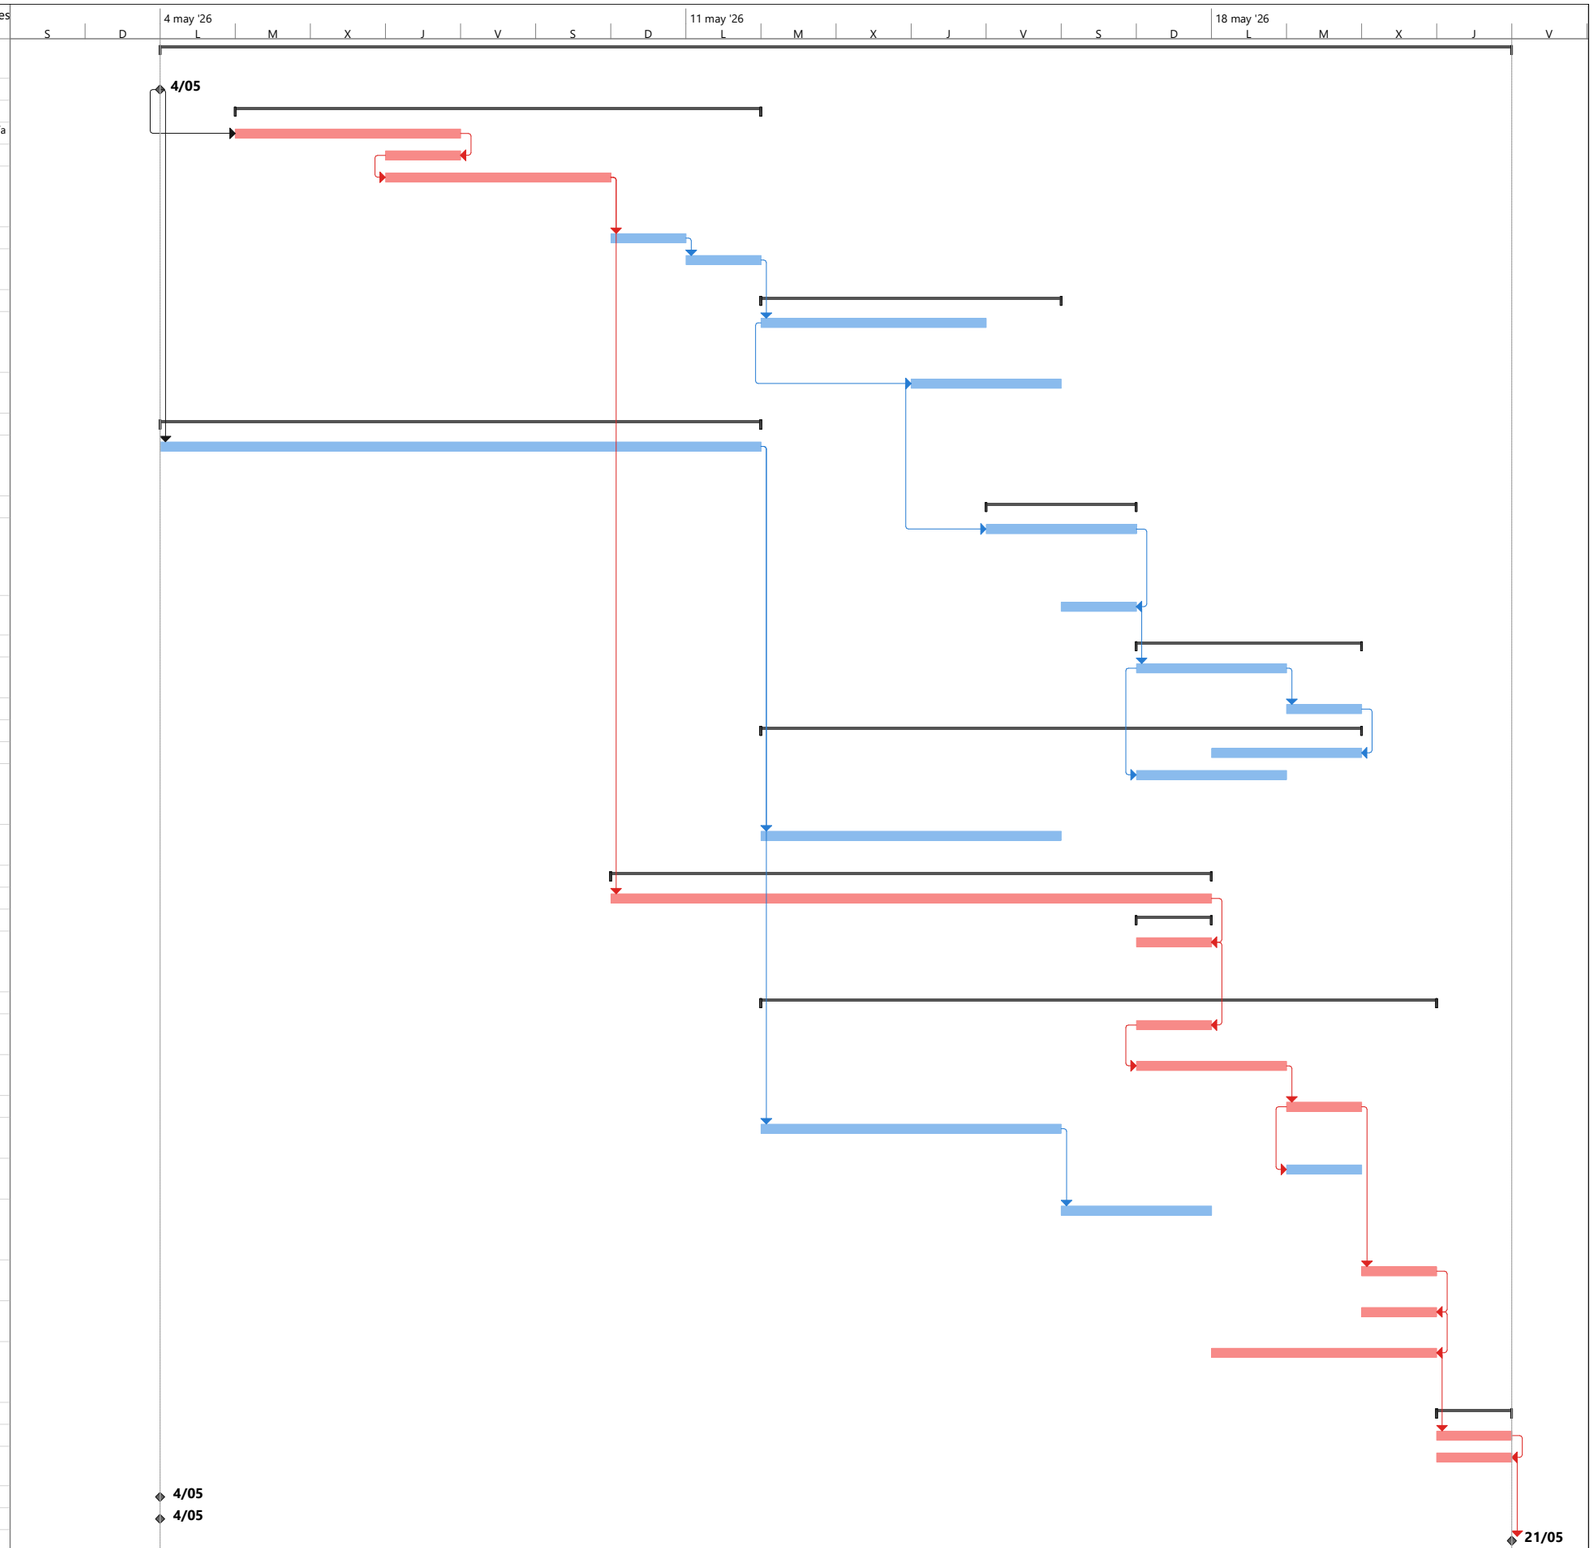

Proyecto: CRONOGRAMA - 108
Fecha: mié 29/04/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
