ACTA PARCIAL No 002
PUESTO DE SALUD EL PARÁ

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CI 001 del 03 de Octubre de 2025		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
1	**PRELIMINARES**				**35,234,729.00**				**208,970.00**	**- 15,448,595.00**		**802,920.00**		**19,995,004.00**	-	-		**19,995,004.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES)	UND	5.00	32,516.00	162,580.00	-	-	-	-	-		-	5.00	162,580.00	-	-	5.00	162,580.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES.	M2	218.00	61,719.00	13,454,742.00	-	-	-105.58	-	- 6,516,292.00		-	112.42	6,938,450.00	-	-	112.42	6,938,450.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	173.07	32,925.00	5,698,330.00	-	-	- 70.40	-	- 2,317,920.00		-	102.67	3,380,410.00	-	-	102.67	3,380,410.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	178.61	37,820.00	6,755,030.00	-	-	- 85.42	-	- 3,230,584.00		-	93.19	3,524,446.00	-	-	93.19	3,524,446.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS	M2	34.19	29,709.00	1,015,751.00	-	-	-	-	-		-	34.19	1,015,751.00	-	-	34.19	1,015,751.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	22.60	28,102.00	635,105.00	-	-	-	-	-		-	22.60	635,105.00	-	-	22.60	635,105.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	31.80	32,925.00	1,047,015.00	-	-	- 4.24	-	- 139,602.00		-	27.56	907,413.00	-	-	27.56	907,413.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	1.00	54,186.00	54,186.00	-	-	-	-	-		-	1.00	54,186.00	-	-	1.00	54,186.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	188.09	22,894.00	4,306,132.00	-	-	- 75.67	-	- 1,732,389.00		-	112.42	2,573,743.00	-	-	112.42	2,573,743.00
1.10	DESMONTE DE MUROS EN LAMINA METALICAS, INCLUYE RETIRO.	M2	94.03	16,079.00	1,511,908.00	-	-	- 94.03	-	- 1,511,908.00		-	-	-	-	-	0.00	-
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	5.48	77,181.00	422,952.00	+	2.27	-	175,201.00	-	7.75	598,153.00	7.75	598,153.00	-	-	7.75	598,153.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	4.76	35,924.00	170,998.00	+	0.94	-	33,769.00	-	5.70	204,767.00	5.70	204,767.00	-	-	5.70	204,767.00
2	**CONCRETOS**				**12,672,670.00**				**22,958,619.00**	-		**25,132,080.00**		**35,631,289.00**		-		**35,631,289.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	21.80	153,072.00	3,336,970.00	+	86.99	-	13,315,733.00	-	40.20	6,153,494.00	108.79	16,652,703.00	-	-	108.79	16,652,703.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	61.39	152,072.00	9,335,700.00	+	63.41	-	9,642,886.00	-	124.80	18,978,586.00	124.80	18,978,586.00	-	-	124.80	18,978,586.00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**50,137,829.00**				**3,675,714.00**	**- 8,989,158.00**		**19,740,135.00**		**19,740,135.00**		**26,084,250.00**		**44,824,385.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	130.96	75,360.00	9,870,653.00	-	-	- 3.41	-	- 256,978.00	127.57	9,613,675.00	127.57	9,613,675.00	-	-	127.57	9,613,675.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	249.96	49,375.00	12,341,775.00	+	6.27	-	309,581.00	-	50.00	2,468,750.00	50.00	2,468,750.00	206.23	10,182,606.00	256.23	12,651,356.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO 25X 30	M2	74.31	128,540.00	9,551,807.00	-	-	- 53.16	-	- 6,833,186.00	14.00	1,799,560.00	14.00	1,799,560.00	7.15	919,061.00	21.15	2,718,621.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	117.26	35,807.00	4,196,729.00	-	-	- 18.76	-	- 671,739.00	50.00	1,790,350.00	50.00	1,790,350.00	48.50	1,736,640.00	98.50	3,526,990.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	193.23	40,678.00	7,860,210.00	-	-	- 30.17	-	- 1,227,255.00	100.00	4,067,800.00	100.00	4,067,800.00	63.06	2,565,155.00	163.06	6,632,955.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	123.83	42,385.00	5,248,535.00	+	28.22	-	1,196,105.00	-	-	-	-	-	152.05	6,444,639.00	152.05	6,444,639.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	25.11	42,458.00	1,066,120.00	+	51.11	-	2,170,028.00	-	-	-	-	-	76.22	3,236,149.00	76.22	3,236,149.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**125,459,871.00**				**3,652,393.00**	**- 28,324,159.00**		**24,118,720.00**		**75,365,140.00**		**25,422,966.00**		**100,788,106.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	466.00	137,831.00	64,229,246.00	-	-	-139.50	-	- 19,227,425.00		-	240.00	33,079,440.00	86.50	11,922,382.00	326.50	45,001,822.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	219.03	134,576.00	29,476,181.00	+	27.14	-	3,652,393.00	-	80.00	10,766,080.00	209.00	28,126,384.00	37.17	5,002,190.00	246.17	33,128,574.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	22.60	67,223.00	1,519,240.00	-	-	- 10.60	-	- 712,564.00		-	12.00	806,676.00	-	-	12.00	806,676.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	48.06	183,048.00	8,797,287.00	-	-	- 28.06	-	- 5,136,327.00		-	-	-	20.00	3,660,960.00	20.00	3,660,960.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	30.00	39,102.00	1,173,060.00	-	-	- 13.00	-	- 508,326.00		-	-	-	17.00	664,734.00	17.00	664,734.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	182.12	111,272.00	20,264,857.00		-	- 24.62	-	- 2,739,517.00	120.00	13,352,640.00	120.00	13,352,640.00	37.50	4,172,700.00	157.50	17,525,340.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**31,570,619.00**				-	- **10,566,527.00**		**15,838,340.00**		**17,350,248.00**		**3,653,844.00**		**21,004,092.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	169.25	68,373.00	11,572,130.00	-	-	- 64.57	-	- 4,414,783.00	82.57	5,645,460.00	104.68	7,157,368.00	-	-	104.68	7,157,368.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO 45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	137.24	127,411.00	17,485,886.00	-	-	- 38.03	-	- 4,845,440.00	80.00	10,192,880.00	80.00	10,192,880.00	19.21	2,447,565.00	99.21	12,640,445.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	61.28	41,002.00	2,512,603.00	-	-	- 31.86	-	- 1,306,324.00		-	-	-	29.42	1,206,279.00	29.42	1,206,279.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**53,264,252.00**				**19,764,497.00**	- **72,410.00**		-		-		**72,956,339.00**		**72,956,339.00**
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	4.20	1,034,425.00	4,344,585.00	-	-	- 0.07	-	- 72,410.00		-	-	-	4.13	4,272,175.00	4.13	4,272,175.00
6.02	Suministro e Instalación de 16 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	20.99	1,291,803.00	27,114,945.00	+	15.00	-	19,377,045.00	-		-	-	-	35.99	46,491,990.00	35.99	46,491,990.00
6.03	Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2.40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND	1.00	3,207,018.00	3,207,018.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	3,207,018.00	1.00	3,207,018.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CI 001 del 03 de Octubre de 2025		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
6.04	8 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	17.28	1,076,256.00	18,597,704.00	+	0.36	-	387,452.00	-		-	-	-	17.64	18,985,156.00	17.64	18,985,156.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**30,152,053.00**				-	-	-	**12,579,575.00**		**12,579,575.00**		**17,572,478.00**		**30,152,053.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	40.00	155,748.00	6,229,920.00		-	-	-	-		-	-	-	40.00	6,229,920.00	40.00	6,229,920.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,046,924.00	1,046,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,046,924.00	1.00	1,046,924.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	813,573.00	813,573.00	-	-	-	-	-	1.00	813,573.00	1.00	813,573.00	-	-	1.00	813,573.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	39.00	198,161.00	7,728,279.00	-	-	-	-	-	22.00	4,359,542.00	22.00	4,359,542.00	17.00	3,368,737.00	39.00	7,728,279.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27.00	162,429.00	4,385,583.00	-	-	-	-	-	20.00	3,248,580.00	20.00	3,248,580.00	7.00	1,137,003.00	27.00	4,385,583.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CI 001 del 03 de Octubre de 2025		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	167,214.00	836,070.00	-	-	-	-	-		-	-	-	5.00	836,070.00	5.00	836,070.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	772,586.00	772,586.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	772,586.00	1.00	772,586.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	124,183.00	620,915.00	-	-	-	-	-		-	-	-	5.00	620,915.00	5.00	620,915.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	788,403.00	788,403.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	788,403.00	1.00	788,403.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	69,298.00	6,929,800.00	-	-	-	-	-	60.00	4,157,880.00	60.00	4,157,880.00	40.00	2,771,920.00	100.00	6,929,800.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**26,053,435.00**				**1,740,332.00**	**- 4,574,237.00**		**5,405,600.00**		**5,750,408.00**		**17,469,123.00**		**23,219,531.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	4.16	2,211,207.00	9,198,621.00		-	- 0.56	-	- 1,238,276.00		-	-	-	3.60	7,960,345.00	3.60	7,960,345.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	3.00	682,190.00	2,046,570.00	-	-	- 1.00	-	- 682,190.00		-	-	-	2.00	1,364,380.00	2.00	1,364,380.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00	390,928.00	2,736,496.00	-	-	- 1.00	-	- 390,928.00		-	-	-	6.00	2,345,568.00	6.00	2,345,568.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	893,449.00	893,449.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	893,449.00	1.00	893,449.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	16.00	72,736.00	1,163,776.00	-	-	- 4.00	-	- 290,944.00	12.00	872,832.00	12.00	872,832.00	-	-	12.00	872,832.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	15.00	90,576.00	1,358,640.00	-	-	- 4.00	-	- 362,304.00	9.00	815,184.00	11.00	996,336.00	-	-	11.00	996,336.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	3.00	163,656.00	490,968.00	-	-	- 1.00	-	- 163,656.00	1.00	163,656.00	2.00	327,312.00	-	-	2.00	327,312.00
8.08	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	27.58	37,513.00	1,034,609.00	-	-	- 13.22	-	- 495,772.00		-	-	-	14.36	538,837.00	14.36	538,837.00
8.09	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	9.01	73,739.00	664,388.00	-	-	- 2.01	-	- 148,215.00	7.00	516,173.00	7.00	516,173.00	-	-	7.00	516,173.00
8.10	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	616,223.00	616,223.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	616,223.00	1.00	616,223.00
8.11	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y taleducha independiente.	UND	2.00	803,497.00	1,606,994.00	-	-	-	-	-		-	-	-	2.00	1,606,994.00	2.00	1,606,994.00
8.12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	12.38	49,280.00	610,086.00	+	1.79	-	88,211.00	-	14.17	698,298.00	14.17	698,298.00	-	-	14.17	698,298.00
8.13	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto	und	2.00	801,952.00	1,603,904.00	-	-	- 1.00	-	- 801,952.00	1.00	801,952.00	1.00	801,952.00	-	-	1.00	801,952.00
8.14	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6".	ml	6.00	111,867.00	671,202.00	+	10.04	-	1,123,145.00	-		-	-	-	16.04	1,794,347.00	16.04	1,794,347.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Hidráulica 1/2"	ml	19.41	58,661.00	1,138,610.00	+	6.80	-	398,895.00	-	26.21	1,537,505.00	26.21	1,537,505.00	-	-	26.21	1,537,505.00
8.16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4.52	48,429.00	218,899.00	+	2.69	-	130,081.00	-		-	-	-	7.21	348,980.00	7.21	348,980.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**								**15,974,658.75**	-		**14,828,094.00**		**14,828,094.00**		**1,146,565.00**		**15,974,659.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		128,100.00		+	36.53	-	4,679,493.00	-	36.53	4,679,493.00	36.53	4,679,493.00	-	-	36.53	4,679,493.00
NP02	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	UND		162,055.00		+	3.00	-	486,165.00	-		-	-	-	3.00	486,165.00	3.00	486,165.00
NP03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		127,000.00		+	31.20	-	3,962,400.00	-	26.00	3,302,000.00	26.00	3,302,000.00	5.20	660,400.00	31.20	3,962,400.00
NP04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML		198,165.00		+	34.55	-	6,846,600.75	-	34.55	6,846,601.00	34.55	6,846,601.00	0.00	-	34.55	6,846,601.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**364,545,458.00**				**67,975,186.00**	**- 67,975,186.00**	**% EJE ACTA 2**	**118,445,464.00**	**% ACUM**	**201,239,893.00**	**POR COBRAR**	**163,305,565.00**	**% BALANCE**	**364,545,458.00**
	ADMINISTRACION			**26.24%**	**95,656,728.00**				**17,836,689.00**	**- 17,836,689.00**		**31,080,090.00**		**52,805,348.00**		**42,851,380.00**		**95,656,728.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,645,455.00**				**679,752.00**	**- 679,752.00**		**1,184,455.00**		**2,012,399.00**		**1,633,056.00**		**3,645,455.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**18,227,273.00**				**3,398,759.00**	**- 3,398,759.00**		**5,922,273.00**		**10,061,995.00**		**8,165,278.00**		**18,227,273.00**
TOTAL OBRA					**482,074,914.00**				**89,890,386.00**	**- 89,890,386.00**	**32.49%**	**156,632,282.00**	**55.20%**	**266,119,635.00**	**44.80%**	**215,955,279.00**	**100.00%**	**482,074,914.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS	POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL					
																$ -	

RESUMEN FINANCIERO EL PARÁ		
Valor Inicial Contrato:	$	482,074,914.00
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	482,074,914.00
Valor Acta No 001	$	109,487,351.00
Valor Acta No 002	$	156,632,282.00
Valor A Girar Acta No 002	$	156,632,282.00
Valor Acumulado Actas	$	266,119,633.00
% Ejecución Acumulado		55.20%
Saldo Por Ejecutar	$	215,955,279.00

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 002 FUE REVISADA Y APROBADA POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE COENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE **($ 156.632.282.00)**, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL **55,20%.**
APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DOS DÍAS (02) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

Adriana Marcela G

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 73202138618 TLM
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORÍA

JHONATAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 4	3,90			3,00	11,70
TM GINECOLOCO	3,00			3,00	9,00
	3,61			3,00	10,83
CUARTO DE DISPOSICIÓN	2,50			2,00	5,00
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD BALANCE	**36,53**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**36,53**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 DICIEMBRE DE 2025	
ÍTEM	NP03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO N° 4 Y GINECOLOGÍA	27,00			1,00	27,00
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	2,10			2,00	4,20
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD BALANCE	**31,20**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**26,00**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	NP04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO N° 4 Y GINECOLOGÍA	4,70			3,00	14,10
	5,25			2,00	10,50
	5,75			1,00	5,75
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	2,10			2,00	4,20
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD BALANCE	**34,55**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**34,55**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PRELIMINARES		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	1,11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	**Unidad Medida**	M3	









Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
Caja de inspección	0,80	1,00	0,80	1,00	0,64
Tubería Sanitaria	6,00	0,30	0,30	1,00	0,54
	0,89	0,30	0,30	1,00	0,08
	1,50	0,30	0,30	1,00	0,14
	1,45	0,30	0,30	1,00	0,13
	1,77	0,30	0,30	1,00	0,16
	9,12	0,30	0,30	1,00	0,82
	1,52	0,30	0,30	1,00	0,14
	1,32	0,30	0,30	1,00	0,12
	5,67	0,30	0,30	1,00	0,51
	1,29	0,30	0,30	1,00	0,12
	1,30	0,30	0,30	1,00	0,12
	4,05	0,30	0,30	1,00	0,36
	1,41	0,30	0,30	1,00	0,13
	1,66	0,30	0,30	1,00	0,15
	2,12	0,30	0,30	1,00	0,19
	7,15	0,30	0,30	1,00	0,64
Consultorio ginecología	5,00	0,30	0,30	3,00	1,35
	2,63	0,30	0,30	6,00	1,42

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**7,75**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**7,75**
TOTAL CONTRACTUAL	5,48

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	PRELIMINARES	**FECHA**	02 DE MARZO 2026		
ÍTEM	1,12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	**Unidad Medida**	M3	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
Caja de inspección	0,80	1,00	0,80	1,00	0,64
Tubería Sanitaria	6,00	0,30	0,30	1,00	0,54
	0,89	0,30	0,30	1,00	0,08
	1,50	0,30	0,30	1,00	0,14
	1,45	0,30	0,30	1,00	0,13
	1,77	0,30	0,30	1,00	0,16
	9,12	0,30	0,30	1,00	0,82
	1,52	0,30	0,30	1,00	0,14
	1,32	0,30	0,30	1,00	0,12
	5,67	0,30	0,30	1,00	0,51
	1,29	0,30	0,30	1,00	0,12
	1,30	0,30	0,30	1,00	0,12
	4,05	0,30	0,30	1,00	0,36
	1,41	0,30	0,30	1,00	0,13
	1,66	0,30	0,30	1,00	0,15
	2,12	0,30	0,30	1,00	0,19
	7,15	0,30	0,30	1,00	0,64
consultorio 4	0,90	1,00	0,80	1,00	0,72

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5,70**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**5,70**
TOTAL CONTRACTUAL	4,76

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	m2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1	3,89		3,40	1,00	13,23
CONSULTORIO 2	3,89		3,37	1,00	13,11
CONSULTORIO 3	4,33		2,74	1,00	11,86
BODEGA	2,03		2,71	1,00	5,50
ALMACENAMIENTO	1,62		3,58	1,00	5,80
CIRCULACIÓN	1,58		3,57	1,00	5,64
	0,89		2,20	2,00	3,92
SALA DE ESPERA	3,57		3,43	1,00	12,25
BAÑO 1 PMR	1,72		2,20	1,00	3,78
CONSULTORIO 4	6,00		5,00	1,00	30,00
DISPOSICION DE RESIDUOS	1,85		2,00	1,00	3,70

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**108,79**
COBRO ACTA N.1	68,59
ACTA N.2	**40,20**
TOTAL CONTRACTUAL	21,80

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR



E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO DE SALUD					
ANDEN FRONTAL	3,20		3,80	1,00	12,16
	7,70		4,12	2,00	63,45
ANDEN LAR IZQ	9,10		0,70	1,00	6,37
ANDEN POSTERIOR	7,00		0,90	1,00	6,30
	3,00		0,60	1,00	1,80
MODULO 1-2	6,20		2,00	1,00	12,40
FRONTAL MODULO 2	6,00		1,20	2,00	14,40
CUARTO DISPO	2,88		1,20	1,00	3,46
	4,47		1,00	1,00	4,47

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**124,80**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**124,80**
TOTAL CONTRACTUAL	61,39

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	3,01	MURO EN BLOQUE No 4		**Unidad Medida**	M2









Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICIÓN	1,50	2,10		1,00	3,15
	1,70	2,10		1,00	3,57
	0,90	2,10		1,00	1,89
	2,10	0,52		1,00	0,55
BAÑO DISCAPACITADO	2,20	3,00		1,00	6,60
	1,72	3,00		1,00	5,16
MURO CONSULTORIO 1	3,99	3,00		1,00	11,97
PUERTA CONSUL 1	0,90	1,00		1,00	0,90
PUERTA BAÑO DISCA.	0,90	1,00		1,00	0,90
PUERTA CONSUL 2	0,90	1,00		1,00	0,90
MURO CONSUL 2-3	0,90	3,00		1,00	2,70
PUERTA CONSUL 3	0,90	1,00		1,00	0,90
CONSULTORIO 4	5,00	3,50		2,00	35,00
	6,00	4,10		1,00	24,60
	6,00	3,50		1,00	21,00
BAÑO CONSULTORIO 4	2,55	3,00		1,00	7,65
MURO INTERMEDIO CONSULT 4	3,46	3,00		1,00	10,38
VENTANA	1,20	0,40		-4,00	-1,92
	1,64	1,60		-2,00	-5,25
	1,50	1,60		-1,00	-2,40
	1,70	0,40		-1,00	-0,68

OBSERVACIONES:

	TOTAL DE ACTIVIDAD	**127,57**
	COBRO ACTA N.1	
	ACTA N.2	**127,57**
	TOTAL CONTRACTUAL	130,98

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**Unidad Medida**	M2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICIÓN	1,50	2,10		1,00	3,15
	1,70	2,10		1,00	3,57
	0,90	2,10		1,00	1,89
	2,10	0,52		1,00	0,55
BAÑO DISCAPACITADO	2,20	3,00		2,00	13,20
	1,72	3,00		2,00	10,32
MURO CONSULTORIO 1	3,99	3,00		2,00	23,94
PUERTA CONSUL 1	0,90	1,00		2,00	1,80
PUERTA BAÑO DISCA.	0,90	1,00		2,00	1,80
PUERTA CONSUL 2	0,90	1,00		2,00	1,80
MURO CONSUL 2-3	0,90	3,00		2,00	5,40
PUERTA CONSUL 3	0,90	1,00		2,00	1,80
CONSULTORIO 4	5,00	3,50		4,00	70,00
	6,00	4,10		2,00	49,20
	6,00	3,50		2,00	42,00
BAÑO CONSULTORIO 4	2,55	3,00		2,00	15,30
MURO INTERMEDIO CONSULT 4	3,46	3,00		2,00	20,76
VENTANA	1,20	0,40		-4,00	-1,92
	1,64	1,60		-2,00	-5,25
	1,50	1,60		-1,00	-2,40
	1,70	0,40		-1,00	-0,68

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**256,23**
COBRO ACTA N.1	**0,00**
ACTA N.2	**50,00**
TOTAL CONTRACTUAL	249,96

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS	3,92	1,80		2,00	14,11
PUERTA	0,97	2,00		-1,00	- 1,94
VENTANA BAÑO	0,80	0,40		-1,00	- 0,32
MESÓN CONSUL. 02	2,00	0,90		0,00	-
MESÓN CONSUL. 01	2,00	0,90		0,00	-
MESÓN CONSUL. 04	1,60	0,70		0,00	-
BAÑO TM GINECO	2,00	1,80		1,00	3,60
	1,38	1,80		1,00	2,48
	1,05	1,80		1,00	1,89
VENTANA BAÑO GINECO	1,20	0,40		-1,00	- 0,48
LAVAMANOS CONSUL.3	2,00	0,90		1,00	1,80
CUARTO DISPO.	1,70	2,40		0,00	-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**21,15**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**14,00**
TOTAL CONTRACTUAL	74,31

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	**Unidad Medida**	M2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION	1,70	2,50		3,00	12,75
	0,80	2,50		1,00	2,00
VENTANAS CUARTO DISPO	1,70	0,40		- 2,00	- 1,36
BODEGA	2,72	2,60		2,00	14,14
	2,03	2,60		2,00	10,56
PUERTA BODEGA	0,90	2,20		- 1,00	- 1,98
	0,90	2,00		- 1,00	- 1,80
BAÑO DISCAPACITADOS	7,20	0,80		1,00	5,76
ALMACENAMIENTO	3,58	2,60		2,00	18,62
	1,62	1,00		1,00	1,62
	0,62	2,60		1,00	1,61
SALA DE ESPERA	0,30	2,40		1,00	0,72
	1,00	2,60		1,00	2,60
	1,27	2,60		1,00	3,30
	2,13	2,60		1,00	5,54
	0,12	2,60		1,00	0,31
	1,65	2,60		1,00	4,29
	3,58	2,60		1,00	9,31
	1,62	1,00		1,00	1,62
	1,66	1,00		1,00	1,66
	1,67	1,00		1,00	1,67
	0,12	2,60		3,00	0,94
	0,89	2,60		2,00	4,63

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**98,50**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**50,00**
TOTAL CONTRACTUAL	**117,26**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO	**FECHA**	02 DE MARZO 2026
ÍTEM	3,05 ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	**Unidad Medida**	M2






Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION	2,00	2,72		3,00	16,32
	1,10	2,72		1,00	2,99
VENTANAS C. DISPO.	1,70	0,40		-2,00	- 1,36
BODEGA	0,83	2,60		1,00	2,16
	2,89	2,60		1,00	7,51
	1,26	2,60		1,00	3,28
	0,13	2,60		1,00	0,34
VENTANAS BODEGA	1,64	1,60		-1,00	- 2,62
CONSULTORIO 3	5,61	3,20		1,00	17,95
BAÑO DISCAPACITADOS	0,80	2,80		1,00	2,24
FACHADA POSTERIOR	10,04	2,60		1,00	26,10
VENTANAS FP	7,93	1,60		-1,00	- 12,69
FACHADA LAT IZQ	8,63	3,20		1,00	27,62
FACHADA FRONTAL	7,06	2,60		1,00	18,36
VENTANAS F FRONTAL	6,54	1,60		-1,00	- 10,46
CONSUL 4-TM GINECO	6,00	3,20		4,00	76,80
VENTANAS GINECO	1,60	1,50		-1,00	- 2,40
	1,20	0,40		-2,00	- 0,96
VENTANAS CONSUL 4	1,60	0,40		-1,00	- 0,64
	1,20	1,50		-2,00	- 3,60
PUERTA TM GINECO	0,90	2,00		-1,00	- 1,80
	0,90	2,30		-1,00	- 2,07
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**163,06**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**100,00**
TOTAL CONTRACTUAL	193,23

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

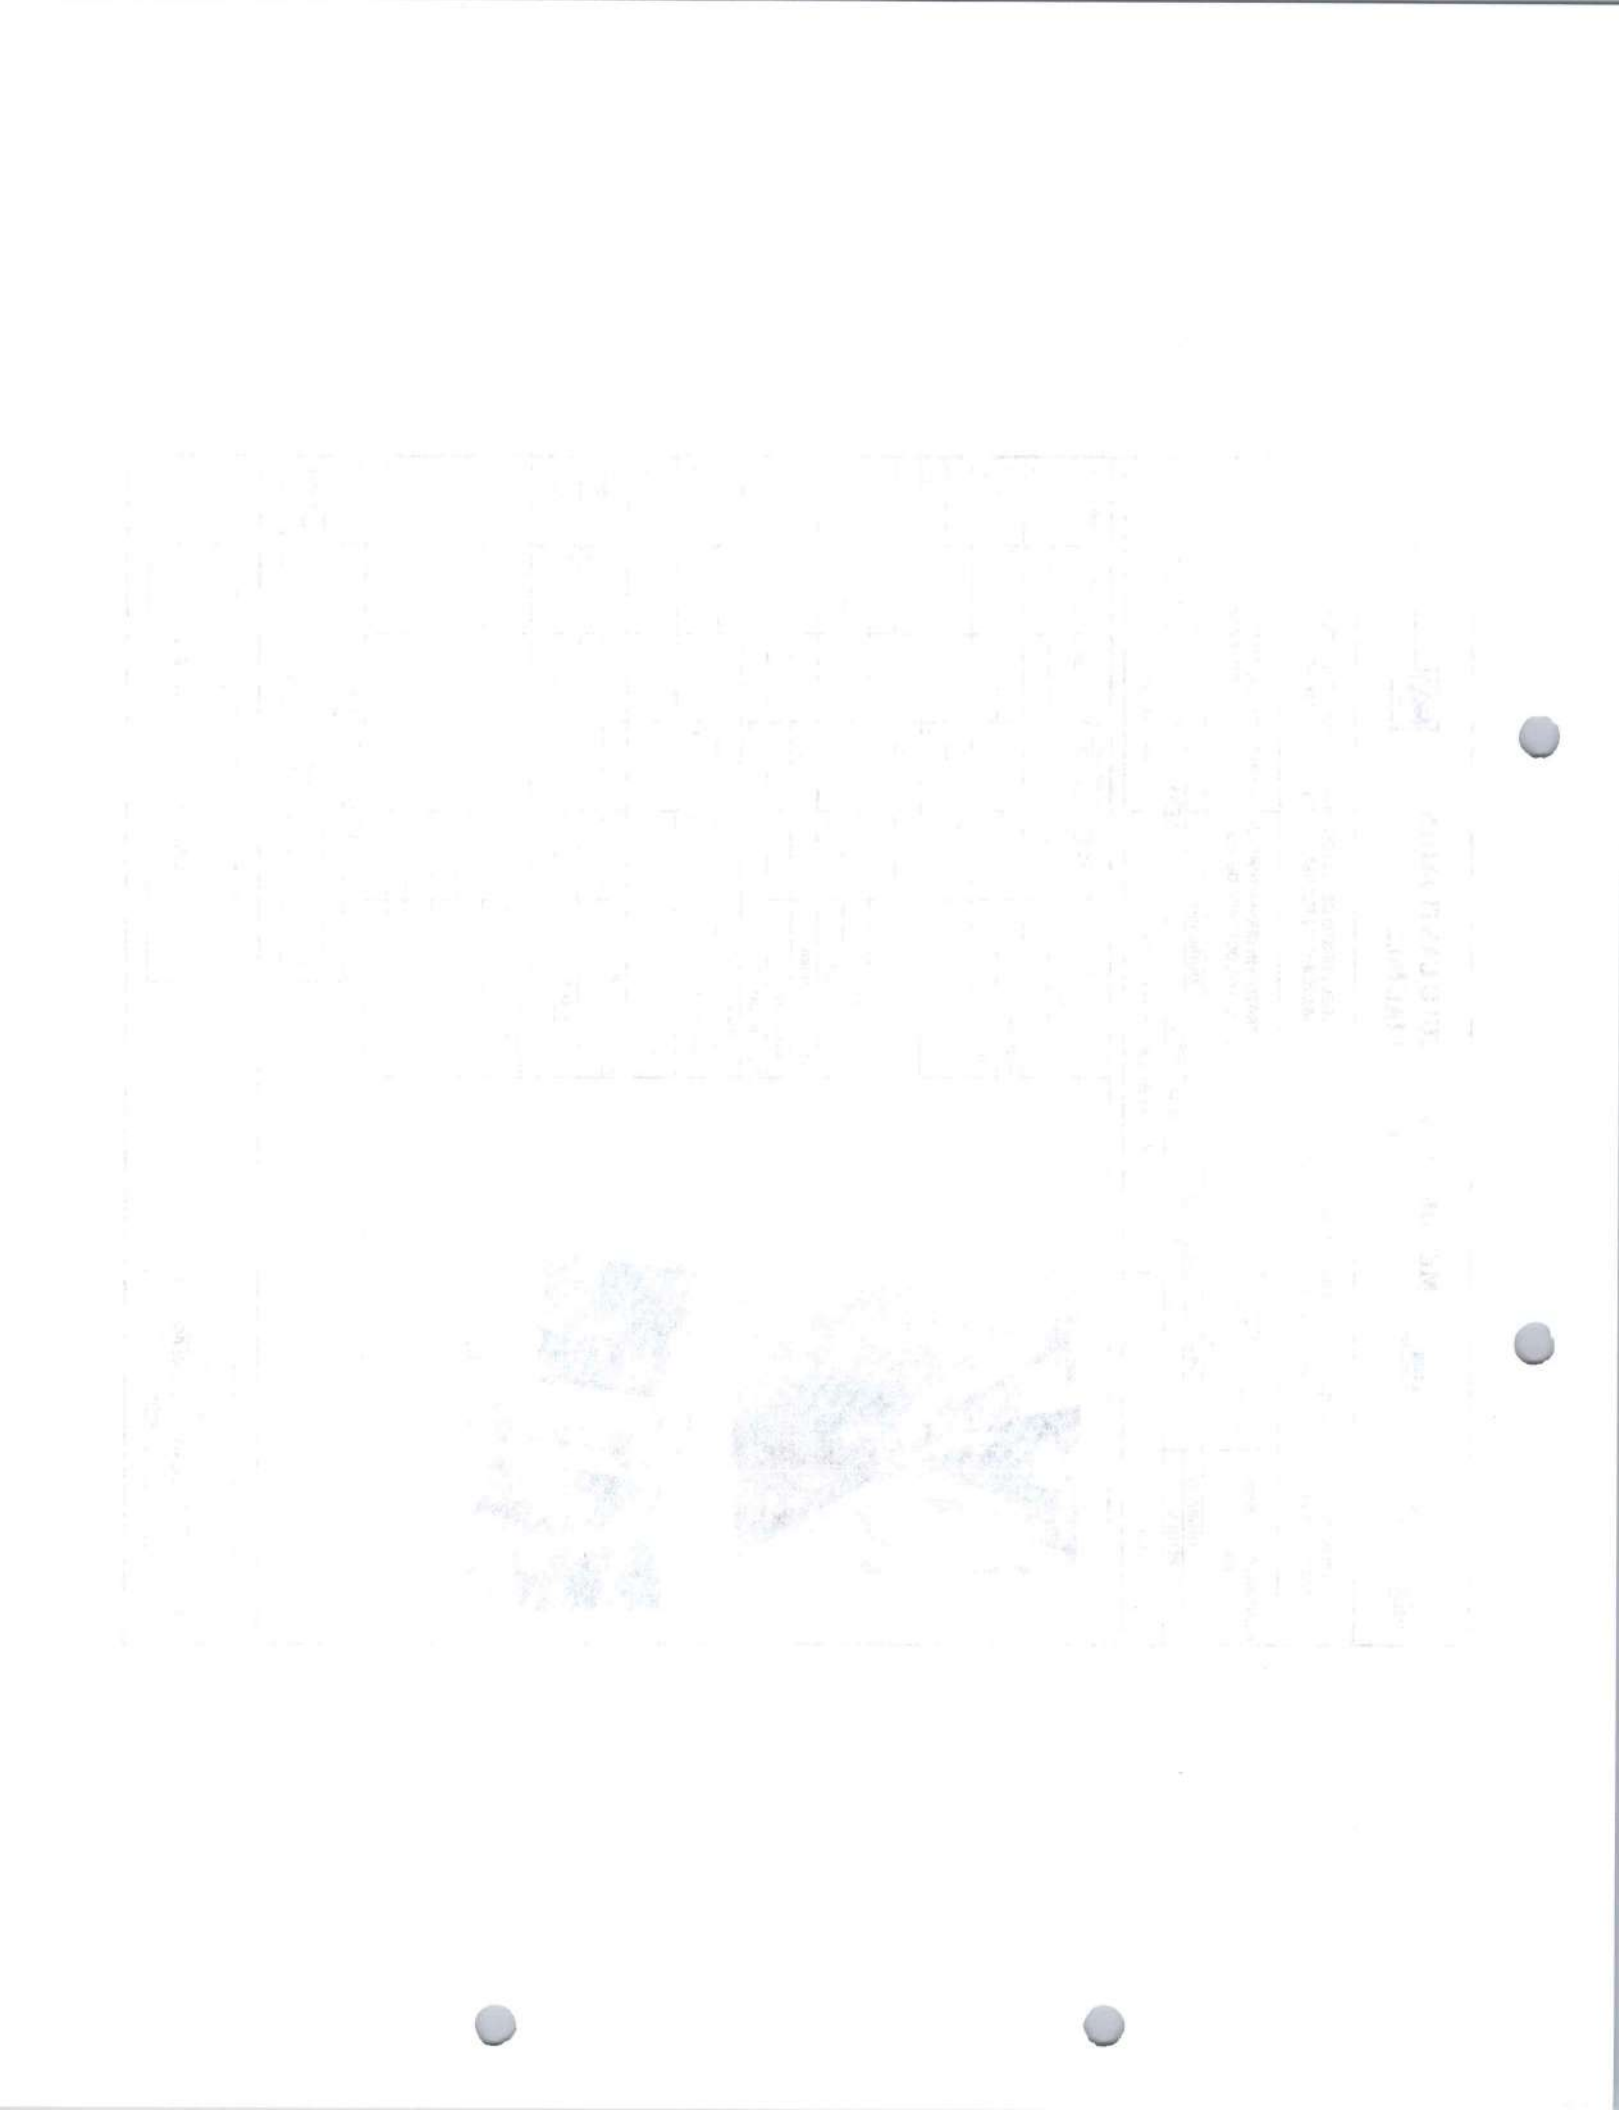

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,02 . SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**Unidad Medida**	m2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
					-
PUESTO SALUD	12,00		5,29	1,00	63,48
	12,00		5,62	1,00	67,44
	7,90		6,00	2,00	94,80
	2,90		2,35	3,00	20,45
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**246,17**
COBRO ACTA N.1	129,00
ACTA N.2	**80,00**
TOTAL CONTRACTUAL	219,03

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026
ÍTEM	4,06 — SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	**Unidad Medida**	m2



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
MODULO 1	11,00		10,50	1,00	115,50
MODULO 2	5,00		7,20	1,00	36,00
CUARTO DE RESIDUOS	3,00		2,00	1,00	6,00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**157,50**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**120,00**
TOTAL CONTRACTUAL	182,12

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra
Arquitecta

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO


UNION TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	5,01	MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	**Unidad Medida**	m2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISÓSICIÓN	1,70		1,70	1,00	2,89
BODEGA	2,03		2,72	1,00	5,52
BAÑO DISCAPACITADOS	1,80		2,25	1,00	4,05
CONSULTORIO 1	3,87		2,95	1,00	11,42
CONSULTORIO 2	3,89		3,11	1,00	12,10
CONSULTORIO 3	3,89		3,44	1,00	13,38
ALMACENAMIENTO	1,62		3,58	1,00	5,80
SALA DE ESPERA	6,08		2,25	1,00	13,68
	3,46		1,20	1,00	4,15
CONSULTORIO 4	5,70		2,73	1,00	15,56
TM GINECOLOGICAS	5,70		2,83	1,00	16,13

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**104,68**
COBRO ACTA N.1	22,11
ACTA N.2	**82,57**
TOTAL CONTRACTUAL	169,25

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR



MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS		**Unidad Medida**	m2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICIÓN	1,80		1,80	1,00	3,24
BODEGA	2,03		2,72	1,00	5,52
BAÑO DISCAPACITADOS	1,72		2,20	1,00	3,78
CONSULTORIO 1	3,87		2,95	1,00	11,42
CONSULTORIO 2	3,89		3,11	1,00	12,10
CONSULTORIO 3	3,89		3,44	1,00	13,38
ALMACENAMIENTO	1,62		3,58	1,00	5,80
SALA DE ESPERA	6,08		2,25	1,00	13,68
	3,46		1,20	1,00	4,15
CONSULTORIO 4	4,70		2,73	1,00	12,83
TM GINECOLOGICAS	4,70		2,83	1,00	13,30

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**99,21**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**80,00**
TOTAL CONTRACTUAL	137,24

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra


Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR



MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**1,00**
TOTAL CONTRACTUAL	1,00

Elaboró


JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	**Unidad Medida**	UND	








Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION				1,00	1,00
BODEGA				2,00	2,00
BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
COLSULTORIO 3				3,00	3,00
CONSULTORIO 2				3,00	3,00
CONSULTORIO 1				3,00	3,00
ALMACENAMIENTO				2,00	2,00
SALA DE ESPERA				4,00	4,00
FACHADA FRONTAL				2,00	2,00
FACHADA LAT IZQ				2,00	2,00
FACHADA LAT DER				3,00	3,00
FACHADA POSTERIOR				2,00	2,00
CONSULTORIO 4				4,00	4,00
TM GINECOLOGICA				4,00	4,00
ANDENES				2,00	2,00
BAÑO TM				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**39,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**22,00**
TOTAL CONTRACTUAL	39,00

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

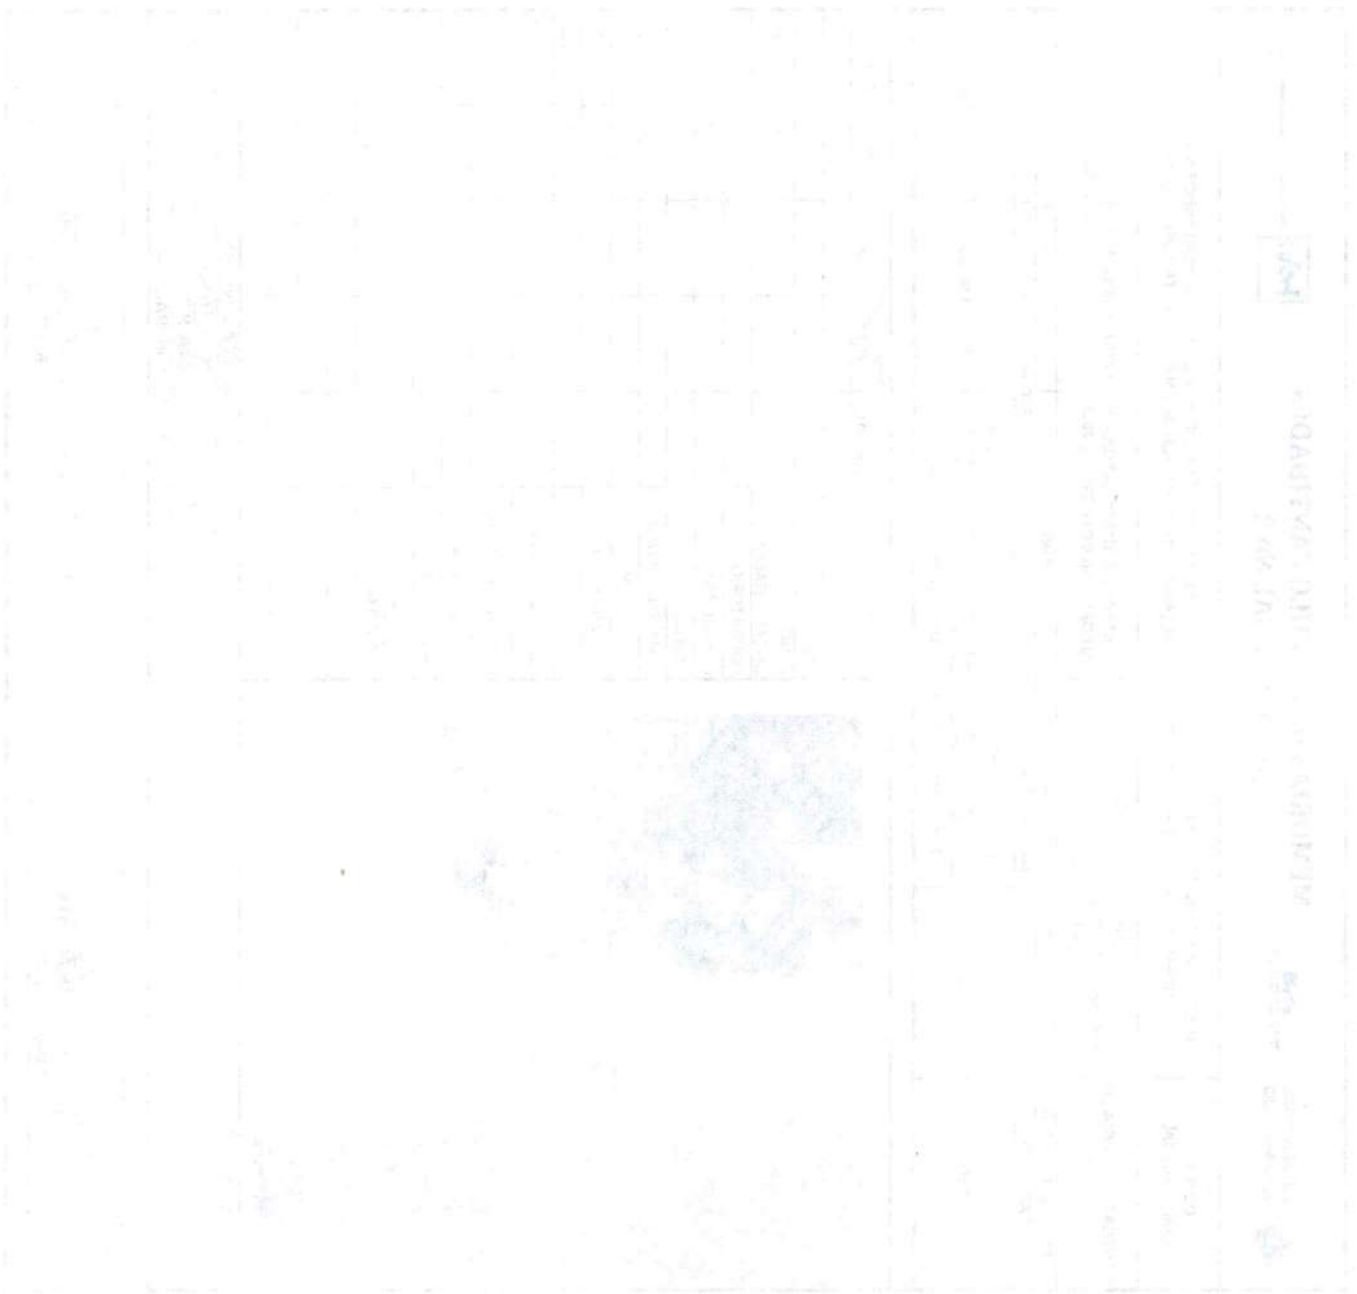

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS


OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**Unidad Medida**	UND











Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION				1,00	1,00
BODEGA				2,00	2,00
BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
COLSULTORIO 3				3,00	3,00
CONSULTORIO 2				4,00	4,00
CONSULTORIO 1				3,00	3,00
ALMACENAMIENTO				2,00	2,00
SALA DE ESPERA				5,00	5,00
CONSULTORIO 4				4,00	4,00
TM GINECOLOGICA				4,00	4,00
BAÑO TM GINECO				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**30,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**20,00**
TOTAL CONTRACTUAL	27,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	**Unidad Medida**	ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
TOMA CORRIENTES	50,00			1,00	50,00
LUMINARIAS	50,00			1,00	50,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**100,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**60,00**
TOTAL CONTRACTUAL	100,00

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026
ÍTEM	8,05 — Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS				3,00	3,00
CONSULTORIO 3				1,00	1,00
CONSULTORIO 2				1,00	1,00
CONSULTORIO 1				2,00	2,00
CONSULTORIO 4				1,00	1,00
TM GINECOLOGICA				3,00	3,00
DISPOSICION DE RESIDUOS				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**12,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**12,00**
TOTAL CONTRACTUAL	16,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra


Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO — UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 — H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	**Unidad Medida**	UND

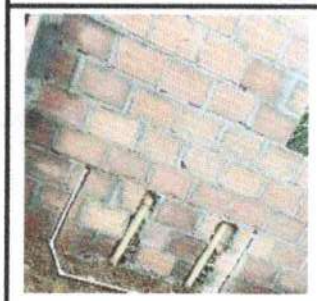



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS				3,00	3,00
CONSULTORIO 3				1,00	1,00
CONSULTORIO 2				1,00	1,00
CONSULTORIO 1				2,00	2,00
CONSULTORIO 4				1,00	1,00
TM GINECOLOGICA				3,00	3,00
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**11,00**
COBRO ACTA N.1	2,00
ACTA N.2	**9,00**
TOTAL CONTRACTUAL	15,00

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
BAÑO TM GINECO				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**2,00**
COBRO ACTA N.1	1,00
ACTA N.2	**1,00**
TOTAL CONTRACTUAL	**3,00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,09	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 4"	**Unidad Medida**	ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS	3,00			1,00	3,00
BAÑO TM GINECO	4,00			1,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**7,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**7,00**
TOTAL CONTRACTUAL	9,01

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR


E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	**Unidad Medida**	ML

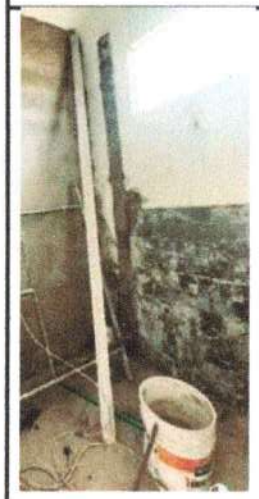





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO	1,50			1,00	1,50
CONSULTORIO 3	1,52			1,00	1,52
CONSULTORIO 2	1,29			1,00	1,29
CONSULTORIO 1	1,30			1,00	1,30
BAÑO TM GINECO	1,41			1,00	1,41
CONSULTORIO 4	7,15			1,00	7,15
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**14,17**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**14,17**
TOTAL CONTRACTUAL	12,38

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO


UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,13	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,80x0,80 en concreto.	**Unidad Medida**	UND	



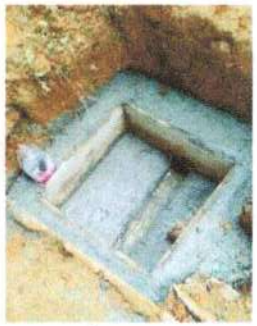

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
MODULO 1-2				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
TOTAL CONTRACTUAL	2,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,15	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 1/2"	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS	3,51			1,00	3,51
CONSULTORIOS	10,00			1,00	10,00
TM GINECOLOGICO	10,00			1,00	10,00
CONEXIÓN POR PUNTO	0,30			9,00	2,70
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**26,21**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**26,21**
TOTAL CONTRACTUAL	19,41

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

BITÁCORA EL PARÁ

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA
N° 002 11 SeP 2025

PUESTO SALUD EL PARÁ

Contratista: Hrm Arquitectos e Ingenieros Tomac
Contratante: ESE Hospital Malvinas
Hector Orozco Orozco
Interventoria: Union Temporal interMalvinas 25

Fecha de Inicio: 06 octubre 2025.

INDUCONTABLES

06 de octubre 2025 al 30 de octubre 2025

Durante el periodo comprendido entre el 06 y el 30 de octubre de 2025, posterior a la suscripción del Acta de inicio del contrato, se desarrollaron principalmente actividades de carácter administrativo, técnico y planeación, necesarias para la correcta ejecución del proyecto y previas al inicio de las labores constructivas en campo. Se realizó la revisión integral del alcance contractual, planos arquitectonicos, estructurales y de instalaciones, asi como cronograma de base, efectuando verificaciones de cantidades de obra, coherencia técnica y definición de requerimientos de materiales, equipos y personal.

De manera paralela, se adelantaron gestiones de socialización del proyecto con la comunidad y actores locales, asi como el reconocimiento técnico del área de intervención, verificando las condiciones de acceso,

INDUCONTABLES

el entorno rural y las posibles restricciones logísticas para el ingreso de materiales y equipos. Durante este periodo se mantuvo coordinación permanente con proveedores para el suministro de material pétreo, perfiles metálicos y elementos de cubierta, evidenciándose desde etapas tempranas limitaciones asociadas a la disponibilidad regional de insumos y a las condiciones de transporte.

Se identificaron inconvenientes logísticos relevantes relacionados con el cierre parcial del puente. El avispero, ubicado sobre la vía nacional Florencia - Suaza, actualmente en mantenimiento por parte del INVÍAS, lo cual ha limitado el tránsito vehicular y afectado la cadena de suministro hacia la zona del proyecto. Adicionalmente, se presentaron demoras en los pedidos de perfiles y cubierta debido al desabastecimiento de insumos en el departamento del Caquetá,

situación que incidio directamente en la programación inicial del inicio de las actividades constructivas.

En wonto al recurso humano, se dejó constancia de que el personal operativo tendria disponibilidad a partir del 01 de Noviembre de 2025, iniciando los procesos de aplicación correspondientes desde dicha fecha motivo por el cual no fue posible ejecutar actividades preliminares en campo durante el periodo evaluado. No obstante se continuó con el seguimiento administrativo del contrato, la planeación operativa

Al cierre del periodo, se evidenció que las actividades de obra aún no habia iniciado, generándose un desfase frente a la programación inicial atribuible principalmente a las limitaciones logisticas, en suministro de materiales y las condiciones de acceso propias del área rural. Como ingeniería residente de obra, se recomendó la formulación y presentación de un plan

INDUCONTABLES

de contingencia orientado a optimizar los recursos disponibles, ajustar los frentes de trabajo. y recuperar el tiempo requerido, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales y la ejecución eficiente del proyecto.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Jairo Merchan.
Residente Obra.

31 / 10 / 2025.

Se realizó visita a obra y se dió inicio a actividades preliminares en campo. Se ejecutarón labores de demolición puntual y retiro de carpintería metalica existente (puertas y Ventanas) así como el desmontaje de inodoro y lavamanos, con el fin de liberar áreas para las adecuaciones posteriores.

Se Verificó el estado general de los espacios intervenidos y Se coordino la disposición del material producto de las demoliciones.

Se mantiene limitación para el inicio de actividades constructivas mayores por falta de algunos insumos.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Iairo Merchan. — Residente Obra.

01/11/2025

No se ejecutaron actividades de obra en campo. Se realizó revisión de programación y analisis de ajustes necesarios en la secuencia de actividades, teniendo en cuenta las condiciones logisticas y de acceso al proyecto

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Iairo Merchan — Residente Obra.

03/11/2025.

Se continuo con visita técnica a la obra para verificación de las áreas demolidas y su estado actual. Se realizaron gestiones administrativas relacionadas con el suministro

INDUCONTABLES

de materiales, incluyendo seguimiento a pedidos y contacto con proveedores, debido a los retrasos presentados por las restricciones de movilidad en la vía de acceso.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Perchun — Residente Obra.

04/11/2025

Se permaneció en obra realizando labores de alistamiento y organización de frentes de trabajo. Se sostuvo coordinación con el contratista para la revisión del cronograma y la estructuración de un plan de recuperación que permita reorganizar actividades y optimizar los tiempos una vez se normalice el abastecimiento de insumos.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Perchun — Residente Obra.

05 / 11 / 2025

Se realizó recorrido general por la obra verificando condiciones del sitio y posibles ajustes en la ejecución.

persisten dificultades para el suministro oportuno de materiales debido al desabastecimiento regional y a la intervención del puente El avispero, situación que continúa afectando la logística del proyecto

Stephanie Q
Residente Interventoría

Jairo Merchan
Residente Obra.

06 / 11 / 2025.

Se efectuó seguimiento a las gestiones logísticas y administrativas adelantadas durante la semana. Se dejó constancia del avance en actividades preliminares y de las limitaciones presentadas para el inicio de actividades constructivas de mayor alcance. Se retira la necesidad de implementar el plan de recuperación y fortalecer la gestión logística para dar continú-

INDUCONTABLES

dad a la obra.

Farit Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

07/11/2025.

Se realizó el descargue de material pétreo en la zona de obras, verificando cantidades y condiciones del material recibido. Posteriormente, se continúo con las labores de demolición de pisos en consultorios y áreas comunes, avanzando en la liberación de superficies para las siguientes etapas del proyecto. Se coordino con el personal la disposición adecuada del material producto de las demoliciones.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

08/11/2025.

Se dio continuidad a las actividades de demolición de pisos, concentrando los trabajos

en áreas internas del puesto de salud. Se evidenció que la cantidad de personal disponible resulta limitada para finalizar de manera oportuna el desmonte total de elementos existentes, situaciones que relentiza el ritmo de ejecución previsto.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

09/11/2025.

No se desarrollaron actividades constructivas en campo. Como residente de obra, se realizó revisión de la programación y análisis del estado de avance de las actividades preliminares, identificando la necesidad de reforzar mano de obra y asegurar el suministro de materiales para las siguientes fases.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan. — Residente Obra.

INDUCONTABLES

10/11/2025

Se retomaron las labores en obra con la continuación de la demolición de pisos en consultorios y zonas comunes.

Durante la jornada se constató la escasez de algunos materiales básicos requeridos para dar inicio a actividades posteriores, lo cual impide avanzar conforme a la secuencia inicialmente planteada en el cronograma.

T. Stephanie Q. — Residente Interventoría

Junio Merchan — Residente Obra

11/11/2025.

Se realizaron trabajos parciales de demolición y limpieza de áreas intervenidas. Se sostuvo coordinación con el contratista para evaluar alternativas que permitan acelerar la finalización de las actividades de desmonte y gestionar con mayor anticipación la adquisición de materiales necesarios para el inicio de la

cimentación.

F. Idephanie Q. — Residente Interventoria

Lauro Merchan — Residente Obra.

12/11/2025

Se efectuó seguimiento en obra al avance de las actividades preliminares, verificando el estado de los pisos demolidos y las áreas pendientes de intervención, Persisten limitaciones relacionadas con la disponibilidad de mano de obra y materiales, lo que continúa afectando el ritmo normal de ejecución

F. Idephanie Q. — Residente Interventoria

Lauro Merchan — Residente Obra.

13/11/2025

Se realizó recorrido general de obra y verificación de los frentes intervenidos durante la semana. se constancia de que los actividades desarrolladas corresponden principal.

INDUCONTABLES

mente a trabajos preliminares, con un avance inferior al esperado. Se recomienda fortalecer la planificación operativa, ajustar el cronograma conforme al avance real y priorizar la gestión oportuna de recursos humanos y materiales para garantizar la continuidad de las obras.

f. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Juan Merchan
Residente Obra.

14/11/2025

Durante la jornada se dio continuidad a las labores finales de demolición, concentrándose en el retiro de enchapes de mesones y desmontaje de carpintería en madera, principalmente puertas y ventanas existentes.

Se verificaron las áreas intervenidas, dejando los espacios despejados para las siguientes etapas constructivas. Se sostuvo comunicación con el contratista respecto a la llegada pendiente de materiales necesarios para cimentación

y cubierta.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

15/11/2025

Se avanzó en actividades complementarias de demolición y limpieza de las zonas intervenidas. Durante el recorrido de obra se evidenció que aún no se cuenta con los insumos necesarios para iniciar actividades estructurales, lo cual continúa afectando la secuencia normal del cronograma. El contratista informó que se encuentra adelantando gestiones logísticas para el transporte y acopio de materiales.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

17/11/2025

Se retomaron labores en obra con el retiro final de elementos de carpintería pendientes y verifica-

INDUCONTABLES

ción general de las áreas demolidas. Durante la inspección se confirmó que el piso existente no contaba con la placa de contrapiso, encontrándose únicamente un mortero de bajo espesor, situación no prevista inicialmente y que requiere un ajuste técnico para garantizar la durabilidad de los nuevos acabados.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Luis Merchan — Residente Obra

18/11/2025

Se realizó seguimiento a las gestiones adelantados por el contratista para la adquisición de materiales críticos. Se analizó la necesidad de implementar soluciones técnicas adicionales, como la construcción de un muro de contención en la parte posterior de la edificación, con el fin de mitigar los asentamientos observados y prevenir futuros agrietamientos en los muros existentes.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Jairo Herchun
Residente Obra.

19/11/2025.
Durante el recorrido de obra se revisaron las condiciones generales de estabilidad y se evaluaron alternativas constructivas que permitan dar continuidad a los trabajos una vez se disponga de los materiales pendientes. Se dejó la recomendación de ajustar temporalmente la programación y avanzar, en la medida de lo posible, en actividades que no dependan directamente de los insumos aún no suministrados.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Jairo Herchun
Residente Obra.

20/11/2025
Se realizó cierre del periodo con verificación general del estado de la obra. Se constató que, aunque las actividades preliminares y de demo-

INDUCONTABLES

lición han sido finalizadas, el inicio de la fase de cimentación continúa condicionado a la llegada de materiales. Se recomendó formalizar un plan de recuperación y presentar los análisis técnicos y presupuestales correspondientes a los ítems no previstos identificados, con el fin de garantizar la estabilidad de la edificación y la correcta ejecución de los trabajos futuros.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Jairo Hernandez
Residente Obra.

21/11/2025.

Durante la jornada se verificó que el contratista continúa desarrollando actividades de taller correspondientes a la fabricación de ventanería y perfilería metálica destinada a la cubierta. En obra no se ejecutaron actividades constructivas debido a la ausencia de materiales necesarios para iniciar la fase de cimentación. Se realizó seguimiento a las gestiones logísticas adelantadas

para el suministro de dichos insumos.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Luiro Perchan
Residente Obra.

22/11/2025.

Se efectuó recorrido general en el puesto de salud con acompañamiento del supervisor y representantes del Ministerio de salud, durante el cúal se revisarón las condiciones actuales de la edificación.

Como resultado de la visita, se establecieron compromisos relacionados con la demolicion del muro lateral derecho, el refuerzo del muro posterior y el ajuste en la altura de la cubierta del cuarto de residuos, con el fin de cumplir los lineamientos tecnicos y funcionales requeridos.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Luiro Perchan
Residente Obra

INDUCONTABLES

24 / 11 / 2025.

Se sostuvo coordinación con el contratista para revisar el plan de choque presentado, orientado a reorganizar las actividades y recuperar el tiempo afectado por los retrasos en el suministro de materiales.

Se dejó constancia de que el inicio de las actividades de cimentación continúa condicionado a la llegada de los insumos críticos, situación que mantiene inactivos los frentes de trabajo asociados a esta fase.

f. Stephanie Q. — Residente Interventoría

Jairo Merchán. — Residente Obra.

25 / 11 / 2025.

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos respecto a la logística de abastecimiento persisten limitaciones derivadas del acceso rural y la disponibilidad de transporte, lo cual genera incertidumbre en las fechas de entrega de materiales y dificulta la toma

de decisiones operativas para la reactivación plena de la obra.

Stephanie Q. — Residente Interventoría

Jairo Merchan — Residente Obra.

26/11/2025.

Se efectuó recorrido de verificación en obra, constatando que las actividades ejecutadas durante el periodo corresponden principalmente a trabajos externos de taller y gestiones administrativas. Se reitera la necesidad de priorizar el suministro de materiales para cubierta y cimentación, así como evaluar alternativas de provisión que permitan dar inicio efectivo a las actividades constructivas y restablecer la secuencia prevista del cronograma.

INDUCONTABLES

Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

27/11/2025.

Durante la jornada se realizaron labores de instalación de red Sanitaria e Hidráulica, avanzando en el trazado y fijación de tuberías conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo, se ejecutaron actividades de demolición del muro lateral derecho del puesto de salud, como parte de los ajustes requeridos para la adecuación de los espacios interiores.

Adicionalmente, se llevo acabo una revisión técnica y diagnostico de cantidades adicionales, derivadas de los cambios solicitados durante la visita de la Supervision y del ministerio de salud

con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requerimientos minimos del proyecto, optimizando los recursos disponibles y evitando sobrecostos, dado el caracter de monto agotable del contrato.

Stephadi Q.
Residente Interventoria

Jairo Perchan
Residente Obra.

28/11/2025.

Se dio continuidad a las labores de instalación de tubería sanitaria e hidraulica, verificando niveles, alineación y correcta fijación de los elementos instalados.

Paralelamente, se avanzó en la evaluación tecnica de los ajustes de diseño, enfocados en la adecuación de nuevos espacios conforme a las condiciones ideales del puesto de Salud y los lineamientos establecidos por la Supervisión

INDUCONTABLES

Durante la jornada se realizaron recorridos de verificación en obra, con el fin de validar las actividades ejecutadas y establecer las cantidades finales necesarias para continuar con las siguientes fases del proyecto

f. Stephanie Q — f. Jairo Merchan.
Residente Interventoria — Residente Obra.

29/11/2025
Actividades: Continuación de demoliciones de muros y remoción de escombros. Iniciamos jornada reforzando la demolición de tabiques internos de acuerdo con las nuevas directrices del Ministerio de salud. Se esta priorizando la liberación de áreas para las nuevas acometidas sanitarias. El personal realiza el retiro manual del material sobrante para dejar el terreno nivelado para

la placa.

F. Stephanie Q	Lairo Merchan
Residente Interventoria	Residente Obra.

30/11/2025
No se labora día de descanso dominical

F. Stephanie Q	Lairo Merchan
Residente Interventoria	Residente Obra

01/12/2025.
Actividades: Recepción y acopio de materiales de construcción
Recibimos en obra el suministro de madera cemento, flejes y ladrillo. Se realizó el inventario de materiales para acometidas sanitarias y la malla electrosoldada que ya reposa en zona. Estamos listos para iniciar la fundicion de placa una vez terminemos de ajustar los niveles del terreno tras los cambios de diseño.

INDUCONTABLES

F. Stephanie Q
Residente Interventoria

Lairo Merchan.
Residente Obra.

02/12/2025.
Actividades: Verificación de espacios y replanteo de redes sanitarias.
Día dedicado a la verificación técnica de los espacios modificados según los lineamientos de la supervisión. Se ajustaron los cantidades de obra para optimizar el recurso debido a la adición de nuevos espacios. Se inicia la excavación de zanjas para las tuberías de drenaje que llegaron ayer.

F. Stephanie Q
Residente Interventoria

Lairo Merchan.
Residente Obra.

03/12/2025.
Actividades: Armado de refuerzos (flejes) y figurado de acero

El equipo de oficiales trabaja en el figurado de acero y preparación de flejes con el material en sitio. Presentamos un desfase del 10% respecto a la programación inicial (20% ejecutado vs 30% programado) por lo que se intensifican las tareas de preparación para la fundición de la próxima semana.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoría

Lairo Merchan — Residente Obra.

04/12/2025.

Actividades: Finalización de demoliciones y preparación de malla para placa. Cerramos la semana con la terminación total de las demoliciones solicitadas por el Ministerio de Salud. Se deja presentada la malla electrosoldada en los sectores críticos. El suministro oportuno de materiales en campo nos permitió subir un 5% de

INDUCONTABLES

avance esta semana, mitigando parte del retraso acumulado.

Stephanie Q — Jairo Merchan.

Residente Interventoria — Residente Obra

05/12/2025

Actividades: Inicio de excavaciones finales e instalación de tubería Sanitaria

Arrancamos el periodo con el objetivo de nivelar el cronograma iniciamos la instalación de la red sanitaria interna aprovechando que el material ya está en sitio. Persiste la dificultad por la mano de obra local limitada, pero estamos redistribuyendo al personal actual para no frenar el avance de las redes.

Stephanie Q — Jairo Merchan.

Residente Interventoria — Residente Obra

06 - 12 - 2025

Actividades: Instalación de tuberías de desagüe y cajas de conexión.

Continuamos con el montaje de la red sanitaria se están posicionando los puntos de desagüe de acuerdo con los nuevos planos. El equipo está trabajando en la fundición de los cajillos conectores para dejar el sistema listo antes de cubrir con la malla.

f stephanie Q — Residente Interventoria

Lairo Merchan — Residente Obra.

07/12/2025

No se labora (día de descanso dominical).

f stephanie Q — Residente Interventoria

Lairo Merchan. — Residente Obra.

INDUCONTABLES

08/12/2025

Actividades: Finalización de red sanitaria y fundición de cajas de inspección

Día Festivo, pero mantenemos ritmo para recuperar tiempo. Terminamos la instalación de la red y procedimientos con la fundición de la caja de inspección principal. Ya tenemos el personal de obra completo y los materiales listos para la siguiente fase de refuerzo de piso.

Stephanie Q. — Jairo Merchan.

Residente Interventoria — Residente Obra

09/12/2025.

Actividades: preparación del terreno y tendido de malla electrosoldada.

Una vez validadas las conexiones sanitarias, procedimos con la instalación de la malla electrosoldada en las áreas de intervención de la placa.

f. stephanie Q Jairo Merchan.
Residente Interventoria Residente Obra

10 - 12 - 2025.
Actividades Aseguramiento de niveles y refuerzo de malla.
Finalizamos la instalación de la malla en su totalidad. Estamos ajustando los niveles de piso para garantizar que la fundición sea uniforme. A pesar de los atrazos acumulados, el avance físico subido al 30%. aunque el programado según el plan de choque debería estar en el 50%.

f. stephanie Q Jairo Merchan
Residente Interventoria Residente Obra.

11 - 12 - 2025
Actividades: Verificación técnica previa a fundición y Organización de materiales.

INDUCONTABLES

Cerramos la semana con la red sanitaria instalada, las cajillas pendidas y la malla puesta. Tenemos todo preparado para iniciar la fundición de la placa a partir de mañana, 12 de diciembre, según lo programado. Se recomendó a la administración la contratación de personal no calificado local adicional para agilizar las tareas de limpieza y preliminares.

F. Stephanie Q — Jairo Merchan.
Residente Interventoria — Residente Obra

12/12/2025

Se ejecutaron las actividades de instalación de las redes hidraulicas y sanitarias. Las labores se realizaron conforme a los planos y especificaciones técnicas, dejando las tuberías protegidas para el posterior vaciado de concreto

F. Stephanie Q — Jairo Merchan
Residente Interventoría. — Residente Obra.

13/12/2025.
Tras la verificación de los puntos hidraulicos y sanitarios, se llevó a cabo la fundición de la placa de contrapiso en el puesto de Salud Esta actividad representa el inicio efectivo de las labores constructivas en el sitio.

f. Stephanie Q — f. Lairo Merchan
Residente Interventoria — Residente Obra.

15/12/2025
Se realizó el desencofrado y la inspeccion de la placa fundida el dió anterior. Se reportaron dificultades por el costo elevado de la mano de obra local y su disponibilidad limitada, lo que genera un desfase en el presupuesto de las actividades.

f. Stephanie Q — Lairo Merchan
Residente Interventoría — Residente Obra

16/12/2025
Recepcion y acopio de materiales en Obra. Se confirmó que la perfileria y la teja

INDUCONTABLES

ya se encuentran disponibles en sitio para las próximas fases de intervención. El personal operativo realizó limpieza y adecuación en áreas intervenidas.

F. Stephanie Q — Lairo Merchan
Residente Interventoría — Residente Obra.
17/12/2025
Jornada de seguimiento técnico. Se evidenció un avance de ejecución del 30% frente a un 70% programado. Debido al retraso, se analizó la necesidad de solicitar una prórroga del contrato, ya que la obra no se culminará en la vigencia del año 2025.

F. Stephanie Q — Lairo Merchan
Residente Interventoría — Residente Obra.
18/12/2025.
Cierre de la semana con la validación de las redes y la placa terminada. Se proyectó para las siguientes Semanas la construcción del consultorio 4 y la instalación

de carpintería, una vez se avance con la estructura de cubierta.

Ing. Stephanie Q.
Residente Interventoría

Ing. Tairo Merchán.
Residente Obra

INDUCONTABLES

ACTA PARCIAL No 002
PUESTO DE SALUD EL PARÁ

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CI 001 del 03 de Octubre de 2025		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
1	**PRELIMINARES**				**35,234,729.00**				**208,970.00**	**- 15,448,595.00**		**802,920.00**		**19,995,004.00**	-	-		**19,995,004.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES)	UND	5.00	32,516.00	162,580.00	-	-	-	-	-		-	5.00	162,580.00	-	-	5.00	162,580.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES.	M2	218.00	61,719.00	13,454,742.00	-	-	-105.58	-	- 6,516,292.00		-	112.42	6,938,450.00	-	-	112.42	6,938,450.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	173.07	32,925.00	5,698,330.00	-	-	- 70.40	-	- 2,317,920.00		-	102.67	3,380,410.00	-	-	102.67	3,380,410.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	178.61	37,820.00	6,755,030.00	-	-	- 85.42	-	- 3,230,584.00		-	93.19	3,524,446.00	-	-	93.19	3,524,446.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS	M2	34.19	29,709.00	1,015,751.00	-	-	-	-	-		-	34.19	1,015,751.00	-	-	34.19	1,015,751.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	22.60	28,102.00	635,105.00	-	-	-	-	-		-	22.60	635,105.00	-	-	22.60	635,105.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	31.80	32,925.00	1,047,015.00	-	-	- 4.24	-	- 139,602.00		-	27.56	907,413.00	-	-	27.56	907,413.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	1.00	54,186.00	54,186.00	-	-	-	-	-		-	1.00	54,186.00	-	-	1.00	54,186.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	188.09	22,894.00	4,306,132.00	-	-	- 75.67	-	- 1,732,389.00		-	112.42	2,573,743.00	-	-	112.42	2,573,743.00
1.10	DESMONTE DE MUROS EN LAMINA METALICAS, INCLUYE RETIRO.	M2	94.03	16,079.00	1,511,908.00	-	-	- 94.03	-	- 1,511,908.00		-	-	-	-	-	0.00	-
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	5.48	77,181.00	422,952.00	+	2.27	-	175,201.00	-	7.75	598,153.00	7.75	598,153.00	-	-	7.75	598,153.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	4.76	35,924.00	170,998.00	+	0.94	-	33,769.00	-	5.70	204,767.00	5.70	204,767.00	-	-	5.70	204,767.00
2	**CONCRETOS**				**12,672,670.00**				**22,958,619.00**	-		**25,132,080.00**		**35,631,289.00**		-		**35,631,289.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	21.80	153,072.00	3,336,970.00	+	86.99	-	13,315,733.00	-	40.20	6,153,494.00	108.79	16,652,703.00	-	-	108.79	16,652,703.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	61.39	152,072.00	9,335,700.00	+	63.41	-	9,642,886.00	-	124.80	18,978,586.00	124.80	18,978,586.00	-	-	124.80	18,978,586.00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**50,137,829.00**				**3,675,714.00**	**- 8,989,158.00**		**19,740,135.00**		**19,740,135.00**		**26,084,250.00**		**44,824,385.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	130.96	75,360.00	9,870,653.00	-	-	- 3.41	-	- 256,978.00	127.57	9,613,675.00	127.57	9,613,675.00	-	-	127.57	9,613,675.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	249.96	49,375.00	12,341,775.00	+	6.27	-	309,581.00	-	50.00	2,468,750.00	50.00	2,468,750.00	206.23	10,182,606.00	256.23	12,651,356.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO 25X 30	M2	74.31	128,540.00	9,551,807.00	-	-	- 53.16	-	- 6,833,186.00	14.00	1,799,560.00	14.00	1,799,560.00	7.15	919,061.00	21.15	2,718,621.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	117.26	35,807.00	4,196,729.00	-	-	- 18.76	-	- 671,739.00	50.00	1,790,350.00	50.00	1,790,350.00	48.50	1,736,640.00	98.50	3,526,990.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	193.23	40,678.00	7,860,210.00	-	-	- 30.17	-	- 1,227,255.00	100.00	4,067,800.00	100.00	4,067,800.00	63.06	2,565,155.00	163.06	6,632,955.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	123.83	42,385.00	5,248,535.00	+	28.22	-	1,196,105.00	-	-	-	-	-	152.05	6,444,639.00	152.05	6,444,639.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	25.11	42,458.00	1,066,120.00	+	51.11	-	2,170,028.00	-	-	-	-	-	76.22	3,236,149.00	76.22	3,236,149.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**125,459,871.00**				**3,652,393.00**	**- 28,324,159.00**		**24,118,720.00**		**75,365,140.00**		**25,422,966.00**		**100,788,106.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	466.00	137,831.00	64,229,246.00	-	-	-139.50	-	- 19,227,425.00		-	240.00	33,079,440.00	86.50	11,922,382.00	326.50	45,001,822.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	219.03	134,576.00	29,476,181.00	+	27.14	-	3,652,393.00	-	80.00	10,766,080.00	209.00	28,126,384.00	37.17	5,002,190.00	246.17	33,128,574.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	22.60	67,223.00	1,519,240.00	-	-	- 10.60	-	- 712,564.00		-	12.00	806,676.00	-	-	12.00	806,676.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	48.06	183,048.00	8,797,287.00	-	-	- 28.06	-	- 5,136,327.00		-	-	-	20.00	3,660,960.00	20.00	3,660,960.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	30.00	39,102.00	1,173,060.00	-	-	- 13.00	-	- 508,326.00		-	-	-	17.00	664,734.00	17.00	664,734.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	182.12	111,272.00	20,264,857.00		-	- 24.62	-	- 2,739,517.00	120.00	13,352,640.00	120.00	13,352,640.00	37.50	4,172,700.00	157.50	17,525,340.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**31,570,619.00**				-	- **10,566,527.00**		**15,838,340.00**		**17,350,248.00**		**3,653,844.00**		**21,004,092.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	169.25	68,373.00	11,572,130.00	-	-	- 64.57	-	- 4,414,783.00	82.57	5,645,460.00	104.68	7,157,368.00	-	-	104.68	7,157,368.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO 45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	137.24	127,411.00	17,485,886.00	-	-	- 38.03	-	- 4,845,440.00	80.00	10,192,880.00	80.00	10,192,880.00	19.21	2,447,565.00	99.21	12,640,445.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	61.28	41,002.00	2,512,603.00	-	-	- 31.86	-	- 1,306,324.00		-	-	-	29.42	1,206,279.00	29.42	1,206,279.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**53,264,252.00**				**19,764,497.00**	- **72,410.00**		-		-		**72,956,339.00**		**72,956,339.00**
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	4.20	1,034,425.00	4,344,585.00	-	-	- 0.07	-	- 72,410.00		-	-	-	4.13	4,272,175.00	4.13	4,272,175.00
6.02	Suministro e Instalación de 16 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	20.99	1,291,803.00	27,114,945.00	+	15.00	-	19,377,045.00	-		-	-	-	35.99	46,491,990.00	35.99	46,491,990.00
6.03	Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2.40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND	1.00	3,207,018.00	3,207,018.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	3,207,018.00	1.00	3,207,018.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CI 001 del 03 de Octubre de 2025		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
6.04	8 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	17.28	1,076,256.00	18,597,704.00	+	0.36	-	387,452.00	-		-	-	-	17.64	18,985,156.00	17.64	18,985,156.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**30,152,053.00**				-	-	-	**12,579,575.00**		**12,579,575.00**		**17,572,478.00**		**30,152,053.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	40.00	155,748.00	6,229,920.00		-	-	-	-		-	-	-	40.00	6,229,920.00	40.00	6,229,920.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,046,924.00	1,046,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,046,924.00	1.00	1,046,924.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	813,573.00	813,573.00	-	-	-	-	-	1.00	813,573.00	1.00	813,573.00	-	-	1.00	813,573.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	39.00	198,161.00	7,728,279.00	-	-	-	-	-	22.00	4,359,542.00	22.00	4,359,542.00	17.00	3,368,737.00	39.00	7,728,279.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27.00	162,429.00	4,385,583.00	-	-	-	-	-	20.00	3,248,580.00	20.00	3,248,580.00	7.00	1,137,003.00	27.00	4,385,583.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CI 001 del 03 de Octubre de 2025		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	167,214.00	836,070.00	-	-	-	-	-		-	-	-	5.00	836,070.00	5.00	836,070.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	772,586.00	772,586.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	772,586.00	1.00	772,586.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	124,183.00	620,915.00	-	-	-	-	-		-	-	-	5.00	620,915.00	5.00	620,915.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	788,403.00	788,403.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	788,403.00	1.00	788,403.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	69,298.00	6,929,800.00	-	-	-	-	-	60.00	4,157,880.00	60.00	4,157,880.00	40.00	2,771,920.00	100.00	6,929,800.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**26,053,435.00**				**1,740,332.00**	**- 4,574,237.00**		**5,405,600.00**		**5,750,408.00**		**17,469,123.00**		**23,219,531.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	4.16	2,211,207.00	9,198,621.00		-	- 0.56	-	- 1,238,276.00		-	-	-	3.60	7,960,345.00	3.60	7,960,345.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	3.00	682,190.00	2,046,570.00	-	-	- 1.00	-	- 682,190.00		-	-	-	2.00	1,364,380.00	2.00	1,364,380.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00	390,928.00	2,736,496.00	-	-	- 1.00	-	- 390,928.00		-	-	-	6.00	2,345,568.00	6.00	2,345,568.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	893,449.00	893,449.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	893,449.00	1.00	893,449.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	16.00	72,736.00	1,163,776.00	-	-	- 4.00	-	- 290,944.00	12.00	872,832.00	12.00	872,832.00	-	-	12.00	872,832.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	15.00	90,576.00	1,358,640.00	-	-	- 4.00	-	- 362,304.00	9.00	815,184.00	11.00	996,336.00	-	-	11.00	996,336.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	3.00	163,656.00	490,968.00	-	-	- 1.00	-	- 163,656.00	1.00	163,656.00	2.00	327,312.00	-	-	2.00	327,312.00
8.08	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	27.58	37,513.00	1,034,609.00	-	-	- 13.22	-	- 495,772.00		-	-	-	14.36	538,837.00	14.36	538,837.00
8.09	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	9.01	73,739.00	664,388.00	-	-	- 2.01	-	- 148,215.00	7.00	516,173.00	7.00	516,173.00	-	-	7.00	516,173.00
8.10	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	616,223.00	616,223.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	616,223.00	1.00	616,223.00
8.11	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y taleducha independiente.	UND	2.00	803,497.00	1,606,994.00	-	-	-	-	-		-	-	-	2.00	1,606,994.00	2.00	1,606,994.00
8.12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	12.38	49,280.00	610,086.00	+	1.79	-	88,211.00	-	14.17	698,298.00	14.17	698,298.00	-	-	14.17	698,298.00
8.13	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto	und	2.00	801,952.00	1,603,904.00	-	-	- 1.00	-	- 801,952.00	1.00	801,952.00	1.00	801,952.00	-	-	1.00	801,952.00
8.14	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6".	ml	6.00	111,867.00	671,202.00	+	10.04	-	1,123,145.00	-		-	-	-	16.04	1,794,347.00	16.04	1,794,347.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Hidráulica 1/2"	ml	19.41	58,661.00	1,138,610.00	+	6.80	-	398,895.00	-	26.21	1,537,505.00	26.21	1,537,505.00	-	-	26.21	1,537,505.00
8.16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4.52	48,429.00	218,899.00	+	2.69	-	130,081.00	-		-	-	-	7.21	348,980.00	7.21	348,980.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**								**15,974,658.75**	-		**14,828,094.00**		**14,828,094.00**		**1,146,565.00**		**15,974,659.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL						
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		128,100.00		+	36.53	-	4,679,493.00	-	36.53	4,679,493.00	36.53	4,679,493.00	-	-	36.53	4,679,493.00
NP02	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	UND		162,055.00		+	3.00	-	486,165.00	-		-	-	-	3.00	486,165.00	3.00	486,165.00
NP03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		127,000.00		+	31.20	-	3,962,400.00	-	26.00	3,302,000.00	26.00	3,302,000.00	5.20	660,400.00	31.20	3,962,400.00
NP04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML		198,165.00		+	34.55	-	6,846,600.75	-	34.55	6,846,601.00	34.55	6,846,601.00	0.00	-	34.55	6,846,601.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**364,545,458.00**				**67,975,186.00**	**- 67,975,186.00**	**% EJE ACTA 2**	**118,445,464.00**	**% ACUM**	**201,239,893.00**	**POR COBRAR**	**163,305,565.00**	**% BALANCE**	**364,545,458.00**
	ADMINISTRACION			**26.24%**	**95,656,728.00**				**17,836,689.00**	**- 17,836,689.00**		**31,080,090.00**		**52,805,348.00**		**42,851,380.00**		**95,656,728.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,645,455.00**				**679,752.00**	**- 679,752.00**		**1,184,455.00**		**2,012,399.00**		**1,633,056.00**		**3,645,455.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**18,227,273.00**				**3,398,759.00**	**- 3,398,759.00**		**5,922,273.00**		**10,061,995.00**		**8,165,278.00**		**18,227,273.00**
TOTAL OBRA					**482,074,914.00**				**89,890,386.00**	**- 89,890,386.00**	**32.49%**	**156,632,282.00**	**55.20%**	**266,119,635.00**	**44.80%**	**215,955,279.00**	**100.00%**	**482,074,914.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ACTA PARCIAL No.002

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **EL PARÁ**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS	POR COBRAR	SUBTOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL BALANCE
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL					
																$ -	

RESUMEN FINANCIERO EL PARÁ		
Valor Inicial Contrato:	$	482,074,914.00
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	482,074,914.00
Valor Acta No 001	$	109,487,351.00
Valor Acta No 002	$	156,632,282.00
Valor A Girar Acta No 002	$	156,632,282.00
Valor Acumulado Actas	$	266,119,633.00
% Ejecución Acumulado		55.20%
Saldo Por Ejecutar	$	215,955,279.00

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 002 FUE REVISADA Y APROBADA POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE COENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE **($ 156.632.282.00)**, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL **55,20%.**
APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DOS DÍAS (02) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

Adriana Marcela G

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 73202138618 TLM
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORÍA

JHONATAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 4	3,90			3,00	11,70
TM GINECOLOCO	3,00			3,00	9,00
	3,61			3,00	10,83
CUARTO DE DISPOSICIÓN	2,50			2,00	5,00
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD BALANCE	**36,53**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**36,53**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	17 DICIEMBRE DE 2025	
ÍTEM	NP03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO N° 4 Y GINECOLOGÍA	27,00			1,00	27,00
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	2,10			2,00	4,20
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD BALANCE	**31,20**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**26,00**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	NP04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO N° 4 Y GINECOLOGÍA	4,70			3,00	14,10
	5,25			2,00	10,50
	5,75			1,00	5,75
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	2,10			2,00	4,20
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD BALANCE	**34,55**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**34,55**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PRELIMINARES		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	1,11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	**Unidad Medida**	M3	









Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
Caja de inspección	0,80	1,00	0,80	1,00	0,64
Tubería Sanitaria	6,00	0,30	0,30	1,00	0,54
	0,89	0,30	0,30	1,00	0,08
	1,50	0,30	0,30	1,00	0,14
	1,45	0,30	0,30	1,00	0,13
	1,77	0,30	0,30	1,00	0,16
	9,12	0,30	0,30	1,00	0,82
	1,52	0,30	0,30	1,00	0,14
	1,32	0,30	0,30	1,00	0,12
	5,67	0,30	0,30	1,00	0,51
	1,29	0,30	0,30	1,00	0,12
	1,30	0,30	0,30	1,00	0,12
	4,05	0,30	0,30	1,00	0,36
	1,41	0,30	0,30	1,00	0,13
	1,66	0,30	0,30	1,00	0,15
	2,12	0,30	0,30	1,00	0,19
	7,15	0,30	0,30	1,00	0,64
Consultorio ginecología	5,00	0,30	0,30	3,00	1,35
	2,63	0,30	0,30	6,00	1,42

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**7,75**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**7,75**
TOTAL CONTRACTUAL	5,48

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	PRELIMINARES	**FECHA**	02 DE MARZO 2026		
ÍTEM	1,12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	**Unidad Medida**	M3	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
Caja de inspección	0,80	1,00	0,80	1,00	0,64
Tubería Sanitaria	6,00	0,30	0,30	1,00	0,54
	0,89	0,30	0,30	1,00	0,08
	1,50	0,30	0,30	1,00	0,14
	1,45	0,30	0,30	1,00	0,13
	1,77	0,30	0,30	1,00	0,16
	9,12	0,30	0,30	1,00	0,82
	1,52	0,30	0,30	1,00	0,14
	1,32	0,30	0,30	1,00	0,12
	5,67	0,30	0,30	1,00	0,51
	1,29	0,30	0,30	1,00	0,12
	1,30	0,30	0,30	1,00	0,12
	4,05	0,30	0,30	1,00	0,36
	1,41	0,30	0,30	1,00	0,13
	1,66	0,30	0,30	1,00	0,15
	2,12	0,30	0,30	1,00	0,19
	7,15	0,30	0,30	1,00	0,64
consultorio 4	0,90	1,00	0,80	1,00	0,72

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5,70**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**5,70**
TOTAL CONTRACTUAL	4,76

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO. — UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 — H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	m2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1	3,89		3,40	1,00	13,23
CONSULTORIO 2	3,89		3,37	1,00	13,11
CONSULTORIO 3	4,33		2,74	1,00	11,86
BODEGA	2,03		2,71	1,00	5,50
ALMACENAMIENTO	1,62		3,58	1,00	5,80
CIRCULACIÓN	1,58		3,57	1,00	5,64
	0,89		2,20	2,00	3,92
SALA DE ESPERA	3,57		3,43	1,00	12,25
BAÑO 1 PMR	1,72		2,20	1,00	3,78
CONSULTORIO 4	6,00		5,00	1,00	30,00
DISPOSICION DE RESIDUOS	1,85		2,00	1,00	3,70

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**108,79**
COBRO ACTA N.1	68,59
ACTA N.2	**40,20**
TOTAL CONTRACTUAL	21,80

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR



E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO DE SALUD					
ANDEN FRONTAL	3,20		3,80	1,00	12,16
	7,70		4,12	2,00	63,45
ANDEN LAR IZQ	9,10		0,70	1,00	6,37
ANDEN POSTERIOR	7,00		0,90	1,00	6,30
	3,00		0,60	1,00	1,80
MODULO 1-2	6,20		2,00	1,00	12,40
FRONTAL MODULO 2	6,00		1,20	2,00	14,40
CUARTO DISPO	2,88		1,20	1,00	3,46
	4,47		1,00	1,00	4,47

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**124,80**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**124,80**
TOTAL CONTRACTUAL	61,39

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	3,01	MURO EN BLOQUE No 4		**Unidad Medida**	M2









Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICIÓN	1,50	2,10		1,00	3,15
	1,70	2,10		1,00	3,57
	0,90	2,10		1,00	1,89
	2,10	0,52		1,00	0,55
BAÑO DISCAPACITADO	2,20	3,00		1,00	6,60
	1,72	3,00		1,00	5,16
MURO CONSULTORIO 1	3,99	3,00		1,00	11,97
PUERTA CONSUL 1	0,90	1,00		1,00	0,90
PUERTA BAÑO DISCA.	0,90	1,00		1,00	0,90
PUERTA CONSUL 2	0,90	1,00		1,00	0,90
MURO CONSUL 2-3	0,90	3,00		1,00	2,70
PUERTA CONSUL 3	0,90	1,00		1,00	0,90
CONSULTORIO 4	5,00	3,50		2,00	35,00
	6,00	4,10		1,00	24,60
	6,00	3,50		1,00	21,00
BAÑO CONSULTORIO 4	2,55	3,00		1,00	7,65
MURO INTERMEDIO CONSULT 4	3,46	3,00		1,00	10,38
VENTANA	1,20	0,40		-4,00	-1,92
	1,64	1,60		-2,00	-5,25
	1,50	1,60		-1,00	-2,40
	1,70	0,40		-1,00	-0,68

OBSERVACIONES:

	TOTAL DE ACTIVIDAD	**127,57**
	COBRO ACTA N.1	
	ACTA N.2	**127,57**
	TOTAL CONTRACTUAL	130,98

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**Unidad Medida**	M2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICIÓN	1,50	2,10		1,00	3,15
	1,70	2,10		1,00	3,57
	0,90	2,10		1,00	1,89
	2,10	0,52		1,00	0,55
BAÑO DISCAPACITADO	2,20	3,00		2,00	13,20
	1,72	3,00		2,00	10,32
MURO CONSULTORIO 1	3,99	3,00		2,00	23,94
PUERTA CONSUL 1	0,90	1,00		2,00	1,80
PUERTA BAÑO DISCA.	0,90	1,00		2,00	1,80
PUERTA CONSUL 2	0,90	1,00		2,00	1,80
MURO CONSUL 2-3	0,90	3,00		2,00	5,40
PUERTA CONSUL 3	0,90	1,00		2,00	1,80
CONSULTORIO 4	5,00	3,50		4,00	70,00
	6,00	4,10		2,00	49,20
	6,00	3,50		2,00	42,00
BAÑO CONSULTORIO 4	2,55	3,00		2,00	15,30
MURO INTERMEDIO CONSULT 4	3,46	3,00		2,00	20,76
VENTANA	1,20	0,40		-4,00	-1,92
	1,64	1,60		-2,00	-5,25
	1,50	1,60		-1,00	-2,40
	1,70	0,40		-1,00	-0,68

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**256,23**
COBRO ACTA N.1	**0,00**
ACTA N.2	**50,00**
TOTAL CONTRACTUAL	249,96

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS	3,92	1,80		2,00	14,11
PUERTA	0,97	2,00		-1,00	- 1,94
VENTANA BAÑO	0,80	0,40		-1,00	- 0,32
MESÓN CONSUL. 02	2,00	0,90		0,00	-
MESÓN CONSUL. 01	2,00	0,90		0,00	-
MESÓN CONSUL. 04	1,60	0,70		0,00	-
BAÑO TM GINECO	2,00	1,80		1,00	3,60
	1,38	1,80		1,00	2,48
	1,05	1,80		1,00	1,89
VENTANA BAÑO GINECO	1,20	0,40		-1,00	- 0,48
LAVAMANOS CONSUL.3	2,00	0,90		1,00	1,80
CUARTO DISPO.	1,70	2,40		0,00	-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**21,15**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**14,00**
TOTAL CONTRACTUAL	74,31

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	**Unidad Medida**	M2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION	1,70	2,50		3,00	12,75
	0,80	2,50		1,00	2,00
VENTANAS CUARTO DISPO	1,70	0,40		- 2,00	- 1,36
BODEGA	2,72	2,60		2,00	14,14
	2,03	2,60		2,00	10,56
PUERTA BODEGA	0,90	2,20		- 1,00	- 1,98
	0,90	2,00		- 1,00	- 1,80
BAÑO DISCAPACITADOS	7,20	0,80		1,00	5,76
ALMACENAMIENTO	3,58	2,60		2,00	18,62
	1,62	1,00		1,00	1,62
	0,62	2,60		1,00	1,61
SALA DE ESPERA	0,30	2,40		1,00	0,72
	1,00	2,60		1,00	2,60
	1,27	2,60		1,00	3,30
	2,13	2,60		1,00	5,54
	0,12	2,60		1,00	0,31
	1,65	2,60		1,00	4,29
	3,58	2,60		1,00	9,31
	1,62	1,00		1,00	1,62
	1,66	1,00		1,00	1,66
	1,67	1,00		1,00	1,67
	0,12	2,60		3,00	0,94
	0,89	2,60		2,00	4,63

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**98,50**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**50,00**
TOTAL CONTRACTUAL	**117,26**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MURO	**FECHA**	02 DE MARZO 2026
ÍTEM	3,05 ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	**Unidad Medida**	M2






Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION	2,00	2,72		3,00	16,32
	1,10	2,72		1,00	2,99
VENTANAS C. DISPO.	1,70	0,40		-2,00	- 1,36
BODEGA	0,83	2,60		1,00	2,16
	2,89	2,60		1,00	7,51
	1,26	2,60		1,00	3,28
	0,13	2,60		1,00	0,34
VENTANAS BODEGA	1,64	1,60		-1,00	- 2,62
CONSULTORIO 3	5,61	3,20		1,00	17,95
BAÑO DISCAPACITADOS	0,80	2,80		1,00	2,24
FACHADA POSTERIOR	10,04	2,60		1,00	26,10
VENTANAS FP	7,93	1,60		-1,00	- 12,69
FACHADA LAT IZQ	8,63	3,20		1,00	27,62
FACHADA FRONTAL	7,06	2,60		1,00	18,36
VENTANAS F FRONTAL	6,54	1,60		-1,00	- 10,46
CONSUL 4-TM GINECO	6,00	3,20		4,00	76,80
VENTANAS GINECO	1,60	1,50		-1,00	- 2,40
	1,20	0,40		-2,00	- 0,96
VENTANAS CONSUL 4	1,60	0,40		-1,00	- 0,64
	1,20	1,50		-2,00	- 3,60
PUERTA TM GINECO	0,90	2,00		-1,00	- 1,80
	0,90	2,30		-1,00	- 2,07
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**163,06**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**100,00**
TOTAL CONTRACTUAL	193,23

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

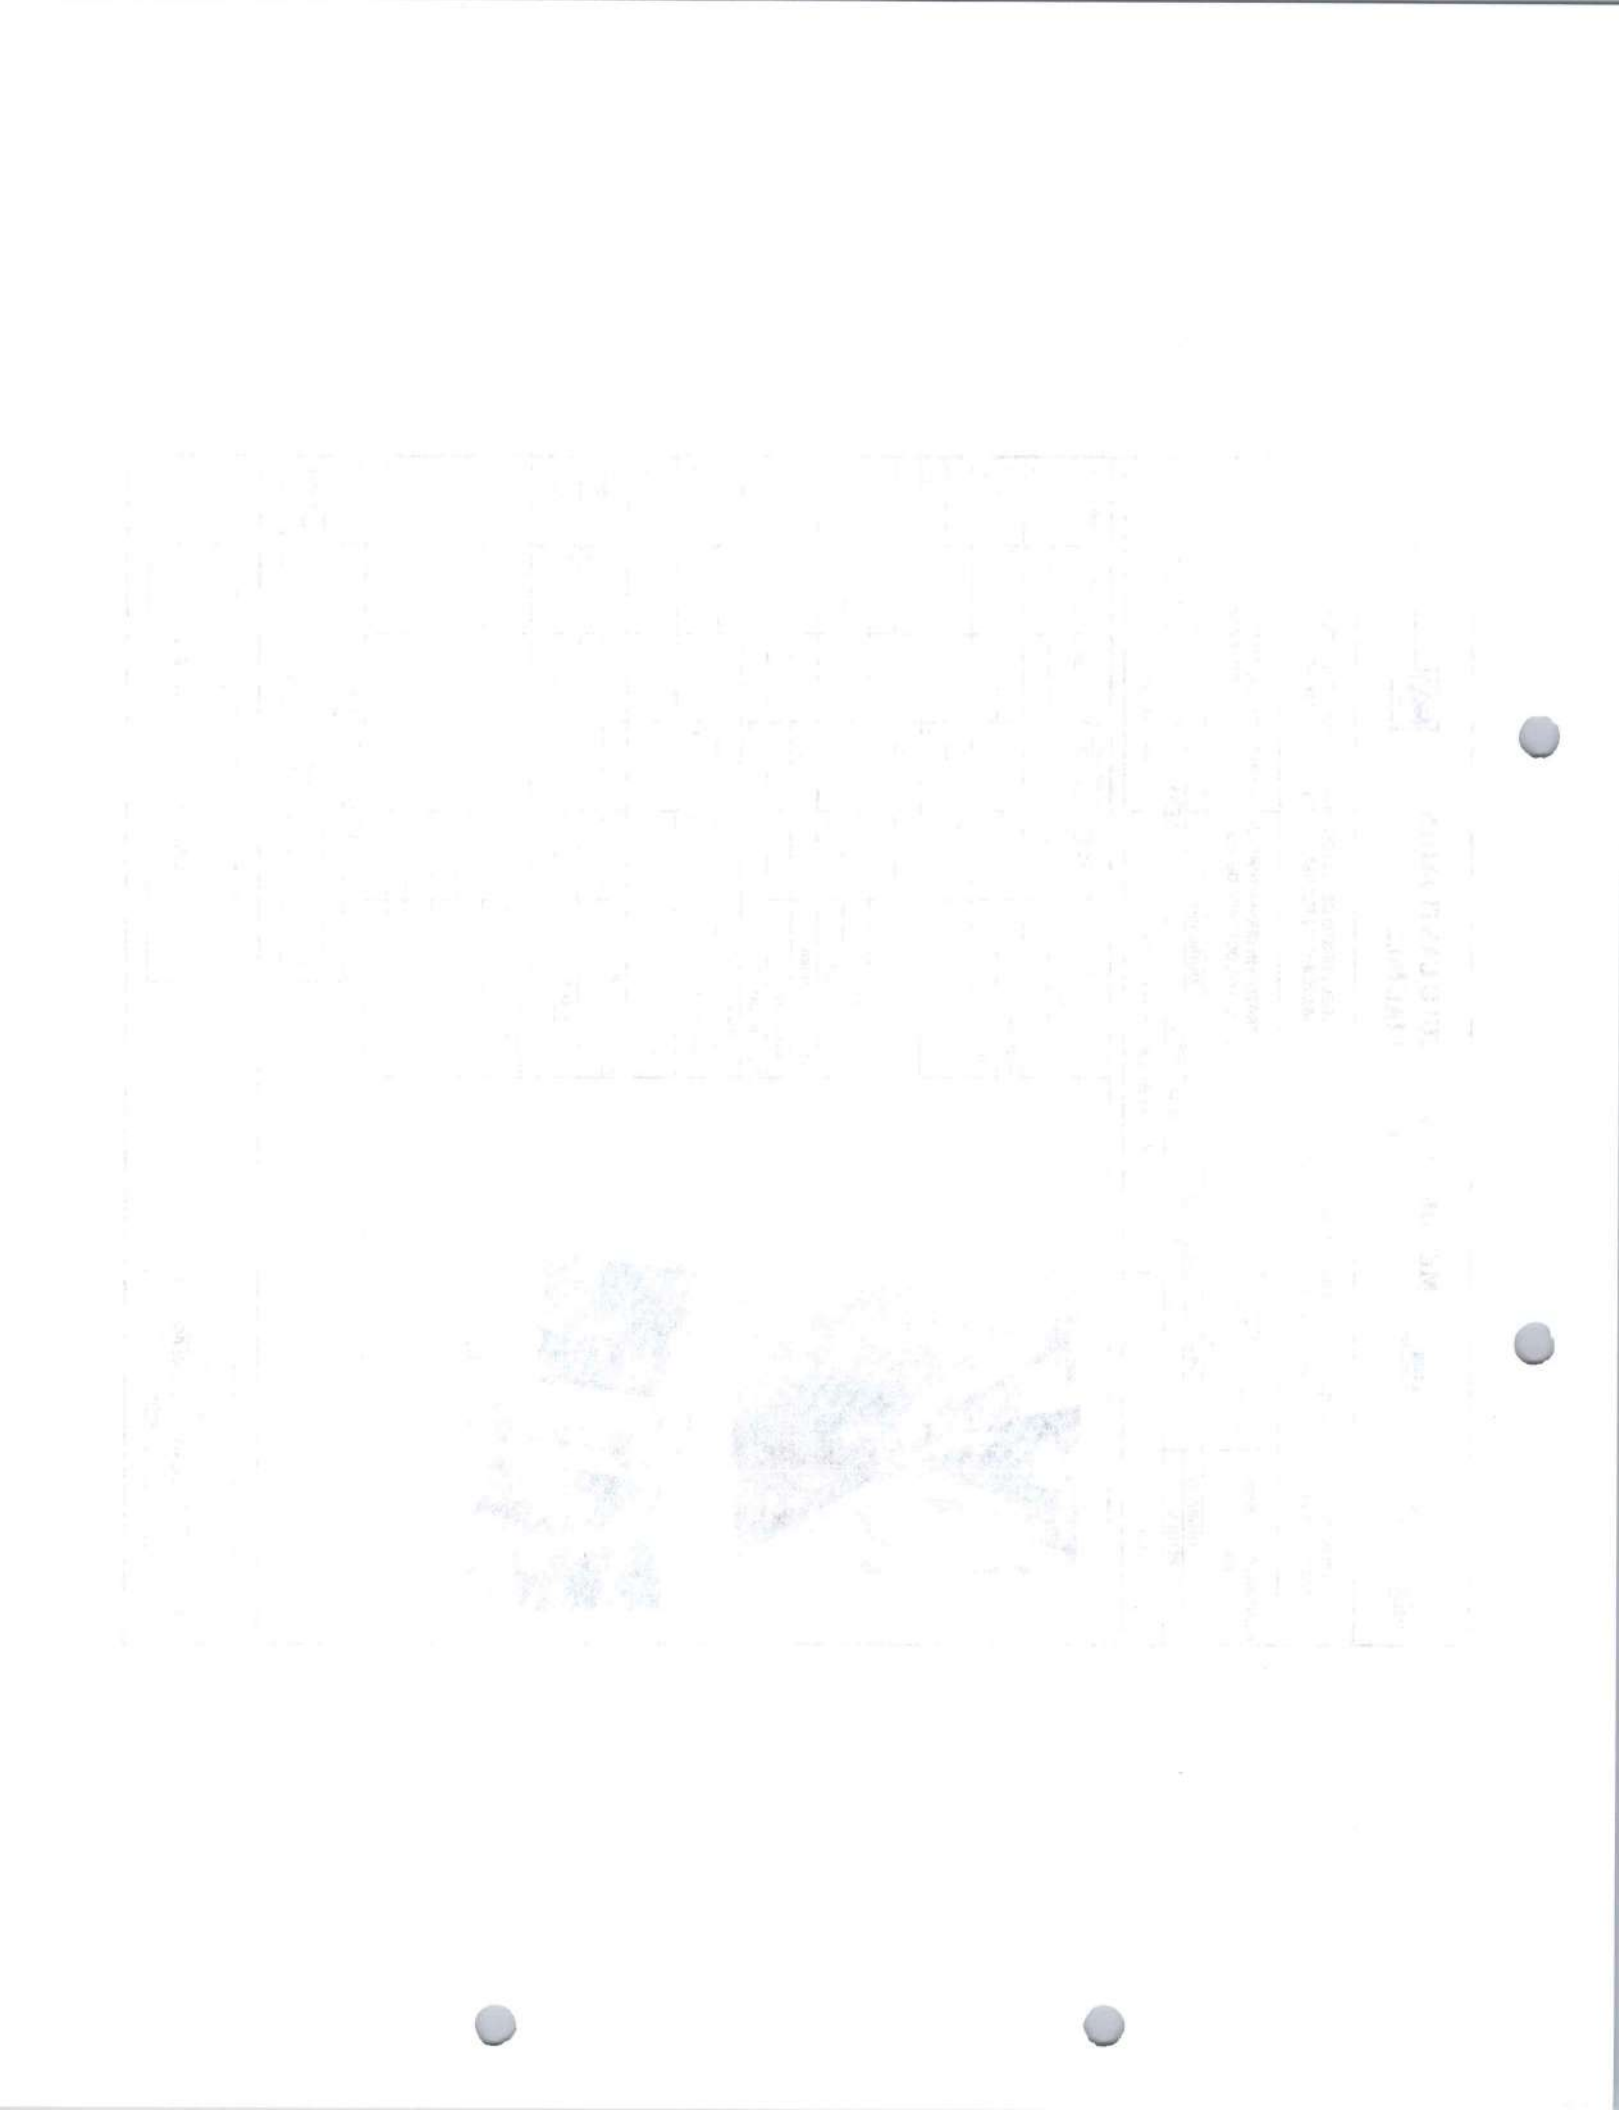

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,02 . SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**Unidad Medida**	m2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
					-
PUESTO SALUD	12,00		5,29	1,00	63,48
	12,00		5,62	1,00	67,44
	7,90		6,00	2,00	94,80
	2,90		2,35	3,00	20,45
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**246,17**
COBRO ACTA N.1	129,00
ACTA N.2	**80,00**
TOTAL CONTRACTUAL	219,03

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026
ÍTEM	4,06 — SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	**Unidad Medida**	m2



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
MODULO 1	11,00		10,50	1,00	115,50
MODULO 2	5,00		7,20	1,00	36,00
CUARTO DE RESIDUOS	3,00		2,00	1,00	6,00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**157,50**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**120,00**
TOTAL CONTRACTUAL	182,12

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra
Arquitecta

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO


UNION TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	5,01	MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	**Unidad Medida**	m2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISÓSICIÓN	1,70		1,70	1,00	2,89
BODEGA	2,03		2,72	1,00	5,52
BAÑO DISCAPACITADOS	1,80		2,25	1,00	4,05
CONSULTORIO 1	3,87		2,95	1,00	11,42
CONSULTORIO 2	3,89		3,11	1,00	12,10
CONSULTORIO 3	3,89		3,44	1,00	13,38
ALMACENAMIENTO	1,62		3,58	1,00	5,80
SALA DE ESPERA	6,08		2,25	1,00	13,68
	3,46		1,20	1,00	4,15
CONSULTORIO 4	5,70		2,73	1,00	15,56
TM GINECOLOGICAS	5,70		2,83	1,00	16,13

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**104,68**
COBRO ACTA N.1	22,11
ACTA N.2	**82,57**
TOTAL CONTRACTUAL	169,25

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR



MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS		**Unidad Medida**	m2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICIÓN	1,80		1,80	1,00	3,24
BODEGA	2,03		2,72	1,00	5,52
BAÑO DISCAPACITADOS	1,72		2,20	1,00	3,78
CONSULTORIO 1	3,87		2,95	1,00	11,42
CONSULTORIO 2	3,89		3,11	1,00	12,10
CONSULTORIO 3	3,89		3,44	1,00	13,38
ALMACENAMIENTO	1,62		3,58	1,00	5,80
SALA DE ESPERA	6,08		2,25	1,00	13,68
	3,46		1,20	1,00	4,15
CONSULTORIO 4	4,70		2,73	1,00	12,83
TM GINECOLOGICAS	4,70		2,83	1,00	13,30

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**99,21**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**80,00**
TOTAL CONTRACTUAL	137,24

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra


Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR



MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**1,00**
TOTAL CONTRACTUAL	1,00

Elaboró


JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**		UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	**Unidad Medida**	UND	








Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION				1,00	1,00
BODEGA				2,00	2,00
BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
COLSULTORIO 3				3,00	3,00
CONSULTORIO 2				3,00	3,00
CONSULTORIO 1				3,00	3,00
ALMACENAMIENTO				2,00	2,00
SALA DE ESPERA				4,00	4,00
FACHADA FRONTAL				2,00	2,00
FACHADA LAT IZQ				2,00	2,00
FACHADA LAT DER				3,00	3,00
FACHADA POSTERIOR				2,00	2,00
CONSULTORIO 4				4,00	4,00
TM GINECOLOGICA				4,00	4,00
ANDENES				2,00	2,00
BAÑO TM				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**39,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**22,00**
TOTAL CONTRACTUAL	39,00

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

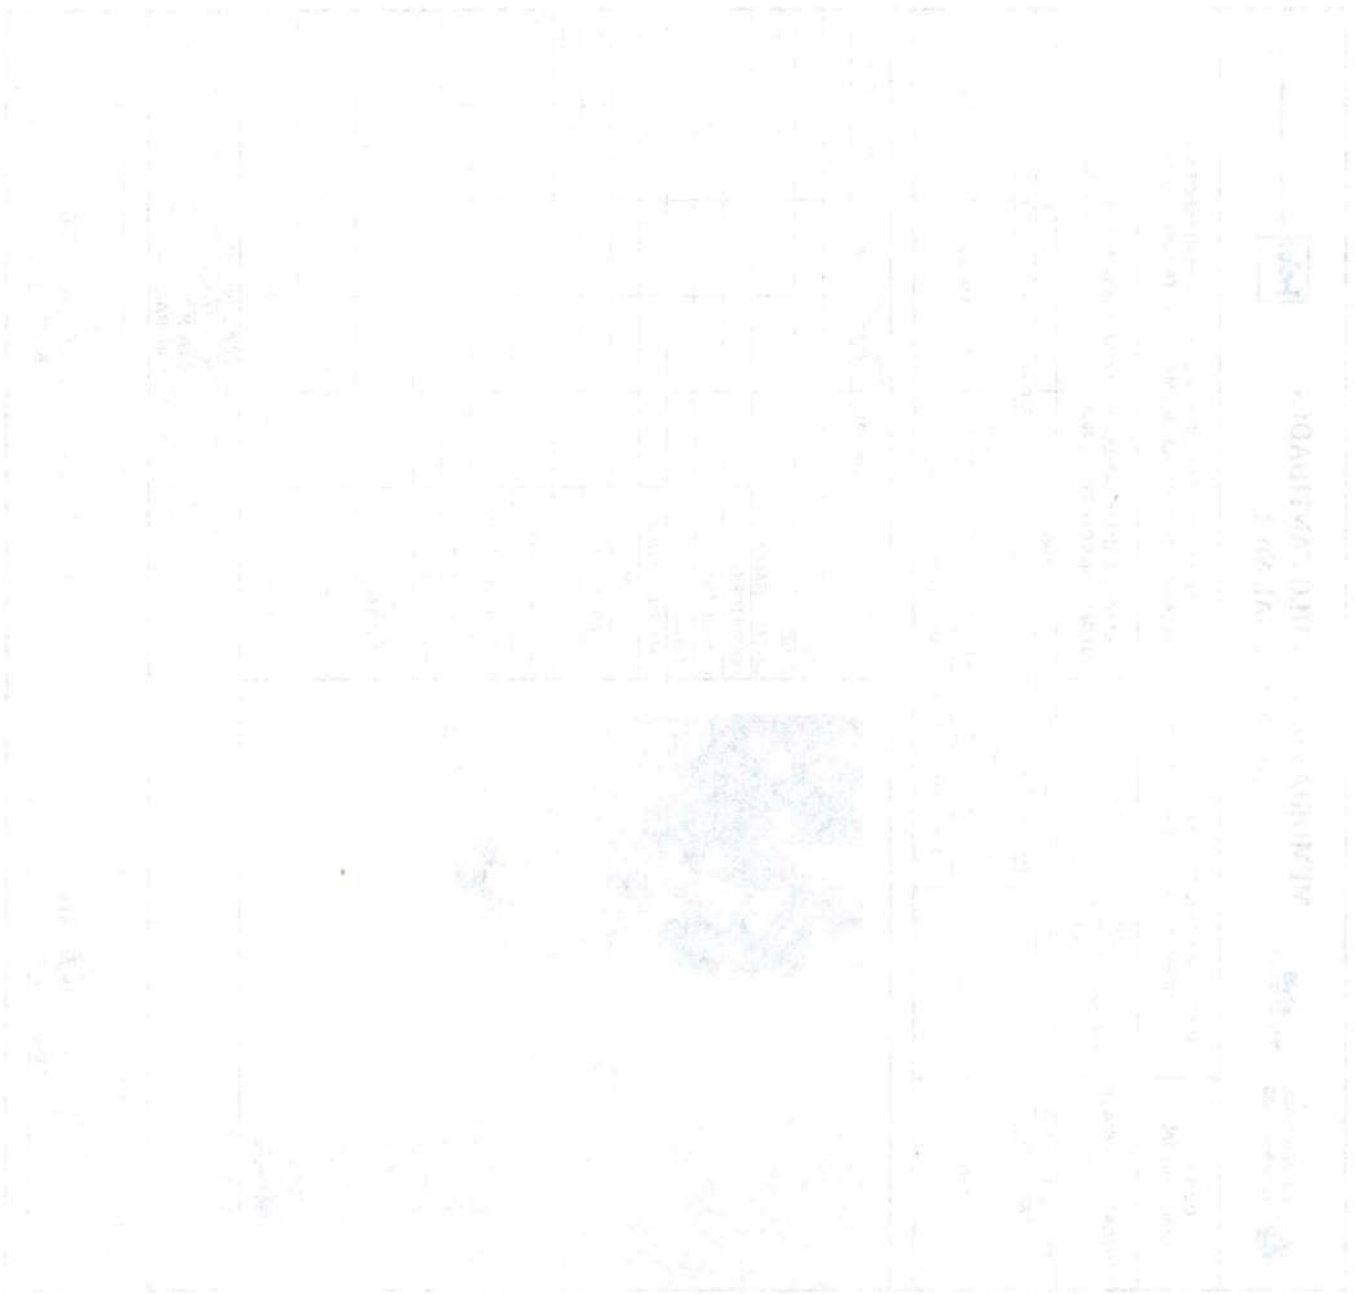

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS


OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**Unidad Medida**	UND











Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DISPOSICION				1,00	1,00
BODEGA				2,00	2,00
BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
COLSULTORIO 3				3,00	3,00
CONSULTORIO 2				4,00	4,00
CONSULTORIO 1				3,00	3,00
ALMACENAMIENTO				2,00	2,00
SALA DE ESPERA				5,00	5,00
CONSULTORIO 4				4,00	4,00
TM GINECOLOGICA				4,00	4,00
BAÑO TM GINECO				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**30,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**20,00**
TOTAL CONTRACTUAL	27,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	**Unidad Medida**	ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
TOMA CORRIENTES	50,00			1,00	50,00
LUMINARIAS	50,00			1,00	50,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**100,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**60,00**
TOTAL CONTRACTUAL	100,00

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026
ÍTEM	8,05 — Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS				3,00	3,00
CONSULTORIO 3				1,00	1,00
CONSULTORIO 2				1,00	1,00
CONSULTORIO 1				2,00	2,00
CONSULTORIO 4				1,00	1,00
TM GINECOLOGICA				3,00	3,00
DISPOSICION DE RESIDUOS				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**12,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**12,00**
TOTAL CONTRACTUAL	16,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra


Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO — UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 — H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	**Unidad Medida**	UND

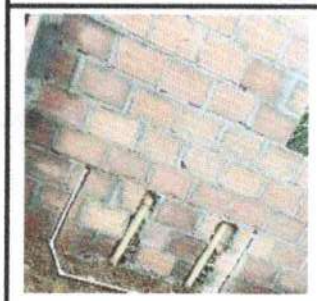



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS				3,00	3,00
CONSULTORIO 3				1,00	1,00
CONSULTORIO 2				1,00	1,00
CONSULTORIO 1				2,00	2,00
CONSULTORIO 4				1,00	1,00
TM GINECOLOGICA				3,00	3,00
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**11,00**
COBRO ACTA N.1	2,00
ACTA N.2	**9,00**
TOTAL CONTRACTUAL	15,00

Elaboró
JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló
STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
BAÑO TM GINECO				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**2,00**
COBRO ACTA N.1	1,00
ACTA N.2	**1,00**
TOTAL CONTRACTUAL	**3,00**

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,09	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 4"	**Unidad Medida**	ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS	3,00			1,00	3,00
BAÑO TM GINECO	4,00			1,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**7,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**7,00**
TOTAL CONTRACTUAL	9,01

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR


E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	**Unidad Medida**	ML

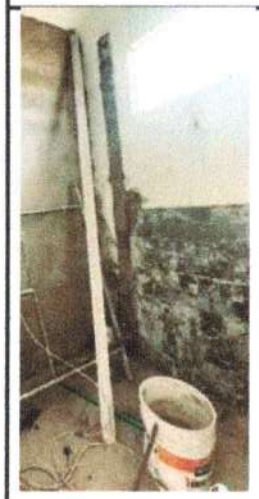





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO	1,50			1,00	1,50
CONSULTORIO 3	1,52			1,00	1,52
CONSULTORIO 2	1,29			1,00	1,29
CONSULTORIO 1	1,30			1,00	1,30
BAÑO TM GINECO	1,41			1,00	1,41
CONSULTORIO 4	7,15			1,00	7,15
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**14,17**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**14,17**
TOTAL CONTRACTUAL	12,38

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO


UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,13	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,80x0,80 en concreto.	**Unidad Medida**	UND	



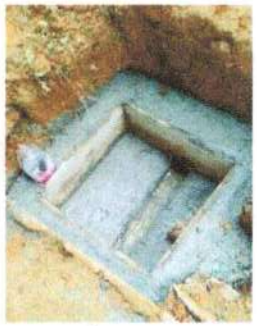

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
MODULO 1-2				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	
TOTAL CONTRACTUAL	2,00

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD RURAL EL PARÁ, PERTENECIENTE A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA CO No 002	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO E INTERVENTORÍA CI 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2025**	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT 901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD EL PARA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 DE MARZO 2026	
ÍTEM	8,15	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 1/2"	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO DISCAPACITADOS	3,51			1,00	3,51
CONSULTORIOS	10,00			1,00	10,00
TM GINECOLOGICO	10,00			1,00	10,00
CONEXIÓN POR PUNTO	0,30			9,00	2,70
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**26,21**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**26,21**
TOTAL CONTRACTUAL	19,41

Elaboró

JAIRO MERCHAN ACOSTA
Residente de Obra

Avaló

STEPHANIE QUINTERO MATEUS
INTERVENTOR

BITÁCORA EL PARÁ

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA
N° 002 11 SeP 2025

PUESTO SALUD EL PARÁ

Contratista: Hrm Arquitectos e Ingenieros Tomac
Contratante: ESE Hospital Malvinas
Hector Orozco Orozco
Interventoria: Union Temporal interMalvinas 25

Fecha de Inicio: 06 octubre 2025.

INDUCONTABLES

06 de octubre 2025 al 30 de octubre 2025

Durante el periodo comprendido entre el 06 y el 30 de octubre de 2025, posterior a la suscripción del Acta de inicio del contrato, se desarrollaron principalmente actividades de carácter administrativo, técnico y planeación, necesarias para la correcta ejecución del proyecto y previas al inicio de las labores constructivas en campo. Se realizó la revisión integral del alcance contractual, planos arquitectonicos, estructurales y de instalaciones, asi como cronograma de base, efectuando verificaciones de cantidades de obra, coherencia técnica y definición de requerimientos de materiales, equipos y personal.

De manera paralela, se adelantaron gestiones de socialización del proyecto con la comunidad y actores locales, asi como el reconocimiento técnico del área de intervención, verificando las condiciones de acceso,

INDUCONTABLES

el entorno rural y las posibles restricciones logísticas para el ingreso de materiales y equipos. Durante este periodo se mantuvo coordinación permanente con proveedores para el suministro de material pétreo, perfiles metálicos y elementos de cubierta, evidenciándose desde etapas tempranas limitaciones asociadas a la disponibilidad regional de insumos y a las condiciones de transporte.

Se identificaron inconvenientes logísticos relevantes relacionados con el cierre parcial del puente. El avispero, ubicado sobre la vía nacional Florencia - Suaza, actualmente en mantenimiento por parte del INVÍAS, lo cual ha limitado el tránsito vehicular y afectado la cadena de suministro hacia la zona del proyecto. Adicionalmente, se presentaron demoras en los pedidos de perfiles y cubierta debido al desabastecimiento de insumos en el departamento del Caquetá,

situación que incidio directamente en la programación inicial del inicio de las actividades constructivas.

En wonto al recurso humano, se dejó constancia de que el personal operativo tendria disponibilidad a partir del 01 de Noviembre de 2025, iniciando los procesos de aplicación correspondientes desde dicha fecha motivo por el cual no fue posible ejecutar actividades preliminares en campo durante el periodo evaluado. No obstante se continuó con el seguimiento administrativo del contrato, la planeación operativa

Al cierre del periodo, se evidenció que las actividades de obra aún no habia iniciado, generándose un desfase frente a la programación inicial atribuible principalmente a las limitaciones logisticas, en suministro de materiales y las condiciones de acceso propias del área rural. Como ingeniería residente de obra, se recomendó la formulación y presentación de un plan

INDUCONTABLES

de contingencia orientado a optimizar los recursos disponibles, ajustar los frentes de trabajo. y recuperar el tiempo requerido, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales y la ejecución eficiente del proyecto.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Jairo Merchan.
Residente Obra.

31 / 10 / 2025.

Se realizó visita a obra y se dió inicio a actividades preliminares en campo. Se ejecutarón labores de demolición puntual y retiro de carpintería metalica existente (puertas y Ventanas) así como el desmontaje de inodoro y lavamanos, con el fin de liberar áreas para las adecuaciones posteriores.

Se Verificó el estado general de los espacios intervenidos y Se coordino la disposición del material producto de las demoliciones.

Se mantiene limitación para el inicio de actividades constructivas mayores por falta de algunos insumos.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Iairo Merchan. — Residente Obra.

01/11/2025

No se ejecutaron actividades de obra en campo. Se realizó revisión de programación y analisis de ajustes necesarios en la secuencia de actividades, teniendo en cuenta las condiciones logisticas y de acceso al proyecto

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Iairo Merchan — Residente Obra.

03/11/2025.

Se continuo con visita técnica a la obra para verificación de las áreas demolidas y su estado actual. Se realizaron gestiones administrativas relacionadas con el suministro

INDUCONTABLES

de materiales, incluyendo seguimiento a pedidos y contacto con proveedores, debido a los retrasos presentados por las restricciones de movilidad en la vía de acceso.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Perchun — Residente Obra.

04/11/2025

Se permaneció en obra realizando labores de alistamiento y organización de frentes de trabajo. Se sostuvo coordinación con el contratista para la revisión del cronograma y la estructuración de un plan de recuperación que permita reorganizar actividades y optimizar los tiempos una vez se normalice el abastecimiento de insumos.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Perchun — Residente Obra.

05 / 11 / 2025

Se realizó recorrido general por la obra verificando condiciones del sitio y posibles ajustes en la ejecución.

persisten dificultades para el suministro oportuno de materiales debido al desabastecimiento regional y a la intervención del puente El avispero, situación que continúa afectando la logística del proyecto

Stephanie Q
Residente Interventoría

Jairo Merchan
Residente Obra.

06 / 11 / 2025.

Se efectuó seguimiento a las gestiones logísticas y administrativas adelantadas durante la semana. Se dejó constancia del avance en actividades preliminares y de las limitaciones presentadas para el inicio de actividades constructivas de mayor alcance. Se retira la necesidad de implementar el plan de recuperación y fortalecer la gestión logística para dar continú-

INDUCONTABLES

dad a la obra.

Farit Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

07/11/2025.

Se realizó el descargue de material pétreo en la zona de obras, verificando cantidades y condiciones del material recibido. Posteriormente, se continúo con las labores de demolición de pisos en consultorios y áreas comunes, avanzando en la liberación de superficies para las siguientes etapas del proyecto. Se coordino con el personal la disposición adecuada del material producto de las demoliciones.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

08/11/2025.

Se dio continuidad a las actividades de demolición de pisos, concentrando los trabajos

en áreas internas del puesto de salud. Se evidenció que la cantidad de personal disponible resulta limitada para finalizar de manera oportuna el desmonte total de elementos existentes, situaciones que relentiza el ritmo de ejecución previsto.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

09/11/2025.

No se desarrollaron actividades constructivas en campo. Como residente de obra, se realizó revisión de la programación y análisis del estado de avance de las actividades preliminares, identificando la necesidad de reforzar mano de obra y asegurar el suministro de materiales para las siguientes fases.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan. — Residente Obra.

INDUCONTABLES

10/11/2025

Se retomaron las labores en obra con la continuación de la demolición de pisos en consultorios y zonas comunes.

Durante la jornada se constató la escasez de algunos materiales básicos requeridos para dar inicio a actividades posteriores, lo cual impide avanzar conforme a la secuencia inicialmente planteada en el cronograma.

T. Stephanie Q. — Residente Interventoría

Junio Merchan — Residente Obra

11/11/2025.

Se realizaron trabajos parciales de demolición y limpieza de áreas intervenidas. Se sostuvo coordinación con el contratista para evaluar alternativas que permitan acelerar la finalización de las actividades de desmonte y gestionar con mayor anticipación la adquisición de materiales necesarios para el inicio de la

cimentación.

F. Idephanie Q. — Residente Interventoria

Lauro Merchan — Residente Obra.

12/11/2025

Se efectuó seguimiento en obra al avance de las actividades preliminares, verificando el estado de los pisos demolidos y las áreas pendientes de intervención, Persisten limitaciones relacionadas con la disponibilidad de mano de obra y materiales, lo que continúa afectando el ritmo normal de ejecución

F. Idephanie Q. — Residente Interventoria

Lauro Merchan — Residente Obra.

13/11/2025

Se realizó recorrido general de obra y verificación de los frentes intervenidos durante la semana. se constancia de que los actividades desarrolladas corresponden principal.

INDUCONTABLES

mente a trabajos preliminares, con un avance inferior al esperado. Se recomienda fortalecer la planificación operativa, ajustar el cronograma conforme al avance real y priorizar la gestión oportuna de recursos humanos y materiales para garantizar la continuidad de las obras.

f. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Juan Merchan
Residente Obra.

14/11/2025

Durante la jornada se dio continuidad a las labores finales de demolición, concentrándose en el retiro de enchapes de mesones y desmontaje de carpintería en madera, principalmente puertas y ventanas existentes.

Se verificaron las áreas intervenidas, dejando los espacios despejados para las siguientes etapas constructivas. Se sostuvo comunicación con el contratista respecto a la llegada pendiente de materiales necesarios para cimentación

y cubierta.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

15/11/2025

Se avanzó en actividades complementarias de demolición y limpieza de las zonas intervenidas. Durante el recorrido de obra se evidenció que aún no se cuenta con los insumos necesarios para iniciar actividades estructurales, lo cual continúa afectando la secuencia normal del cronograma. El contratista informó que se encuentra adelantando gestiones logísticas para el transporte y acopio de materiales.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

17/11/2025

Se retomaron labores en obra con el retiro final de elementos de carpintería pendientes y verifica-

INDUCONTABLES

ción general de las áreas demolidas. Durante la inspección se confirmó que el piso existente no contaba con la placa de contrapiso, encontrándose únicamente un mortero de bajo espesor, situación no prevista inicialmente y que requiere un ajuste técnico para garantizar la durabilidad de los nuevos acabados.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoria

Luis Merchan — Residente Obra

18/11/2025

Se realizó seguimiento a las gestiones adelantados por el contratista para la adquisición de materiales críticos. Se analizó la necesidad de implementar soluciones técnicas adicionales, como la construcción de un muro de contención en la parte posterior de la edificación, con el fin de mitigar los asentamientos observados y prevenir futuros agrietamientos en los muros existentes.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Jairo Herchun
Residente Obra.

19/11/2025.
Durante el recorrido de obra se revisaron las condiciones generales de estabilidad y se evaluaron alternativas constructivas que permitan dar continuidad a los trabajos una vez se disponga de los materiales pendientes. Se dejó la recomendación de ajustar temporalmente la programación y avanzar, en la medida de lo posible, en actividades que no dependan directamente de los insumos aún no suministrados.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Jairo Herchun
Residente Obra.

20/11/2025
Se realizó cierre del periodo con verificación general del estado de la obra. Se constató que, aunque las actividades preliminares y de demo-

INDUCONTABLES

lición han sido finalizadas, el inicio de la fase de cimentación continúa condicionado a la llegada de materiales. Se recomendó formalizar un plan de recuperación y presentar los análisis técnicos y presupuestales correspondientes a los ítems no previstos identificados, con el fin de garantizar la estabilidad de la edificación y la correcta ejecución de los trabajos futuros.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Jairo Hernandez
Residente Obra.

21/11/2025.

Durante la jornada se verificó que el contratista continúa desarrollando actividades de taller correspondientes a la fabricación de ventanería y perfilería metálica destinada a la cubierta. En obra no se ejecutaron actividades constructivas debido a la ausencia de materiales necesarios para iniciar la fase de cimentación. Se realizó seguimiento a las gestiones logísticas adelantadas

para el suministro de dichos insumos.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Luiro Perchan
Residente Obra.

22/11/2025.

Se efectuó recorrido general en el puesto de salud con acompañamiento del supervisor y representantes del Ministerio de salud, durante el cúal se revisarón las condiciones actuales de la edificación.

Como resultado de la visita, se establecieron compromisos relacionados con la demolicion del muro lateral derecho, el refuerzo del muro posterior y el ajuste en la altura de la cubierta del cuarto de residuos, con el fin de cumplir los lineamientos tecnicos y funcionales requeridos.

F. Stephanie Q.
Residente Interventoria

Luiro Perchan
Residente Obra

INDUCONTABLES

24 / 11 / 2025.

Se sostuvo coordinación con el contratista para revisar el plan de choque presentado, orientado a reorganizar las actividades y recuperar el tiempo afectado por los retrasos en el suministro de materiales.

Se dejó constancia de que el inicio de las actividades de cimentación continúa condicionado a la llegada de los insumos críticos, situación que mantiene inactivos los frentes de trabajo asociados a esta fase.

f. Stephanie Q. — Residente Interventoría

Jairo Merchán. — Residente Obra.

25 / 11 / 2025.

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos respecto a la logística de abastecimiento persisten limitaciones derivadas del acceso rural y la disponibilidad de transporte, lo cual genera incertidumbre en las fechas de entrega de materiales y dificulta la toma

de decisiones operativas para la reactivación plena de la obra.

Stephanie Q. — Residente Interventoría

Jairo Merchan — Residente Obra.

26/11/2025.

Se efectuó recorrido de verificación en obra, constatando que las actividades ejecutadas durante el periodo corresponden principalmente a trabajos externos de taller y gestiones administrativas. Se reitera la necesidad de priorizar el suministro de materiales para cubierta y cimentación, así como evaluar alternativas de provisión que permitan dar inicio efectivo a las actividades constructivas y restablecer la secuencia prevista del cronograma.

INDUCONTABLES

Stephanie Q. — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra.

27/11/2025.

Durante la jornada se realizaron labores de instalación de red Sanitaria e Hidráulica, avanzando en el trazado y fijación de tuberías conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo, se ejecutaron actividades de demolición del muro lateral derecho del puesto de salud, como parte de los ajustes requeridos para la adecuación de los espacios interiores.

Adicionalmente, se llevo acabo una revisión técnica y diagnostico de cantidades adicionales, derivadas de los cambios solicitados durante la visita de la Supervision y del ministerio de salud

con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requerimientos minimos del proyecto, optimizando los recursos disponibles y evitando sobrecostos, dado el caracter de monto agotable del contrato.

Stephadi Q.
Residente Interventoria

Jairo Perchan
Residente Obra.

28/11/2025.

Se dio continuidad a las labores de instalación de tubería sanitaria e hidraulica, verificando niveles, alineación y correcta fijación de los elementos instalados.

Paralelamente, se avanzó en la evaluación tecnica de los ajustes de diseño, enfocados en la adecuación de nuevos espacios conforme a las condiciones ideales del puesto de Salud y los lineamientos establecidos por la Supervisión

INDUCONTABLES

Durante la jornada se realizaron recorridos de verificación en obra, con el fin de validar las actividades ejecutadas y establecer las cantidades finales necesarias para continuar con las siguientes fases del proyecto

f. Stephanie Q — f. Jairo Merchan.
Residente Interventoria — Residente Obra.

29/11/2025
Actividades: Continuación de demoliciones de muros y remoción de escombros. Iniciamos jornada reforzando la demolición de tabiques internos de acuerdo con las nuevas directrices del Ministerio de salud. Se esta priorizando la liberación de áreas para las nuevas acometidas sanitarias. El personal realiza el retiro manual del material sobrante para dejar el terreno nivelado para

la placa.

F. Stephanie Q	Lairo Merchan
Residente Interventoria	Residente Obra.

30/11/2025
No se labora día de descanso dominical

F. Stephanie Q	Lairo Merchan
Residente Interventoria	Residente Obra

01/12/2025.
Actividades: Recepción y acopio de materiales de construcción
Recibimos en obra el suministro de madera cemento, flejes y ladrillo. Se realizó el inventario de materiales para acometidas sanitarias y la malla electrosoldada que ya reposa en zona. Estamos listos para iniciar la fundicion de placa una vez terminemos de ajustar los niveles del terreno tras los cambios de diseño.

INDUCONTABLES

F. Stephanie Q
Residente Interventoria

Lairo Merchan.
Residente Obra.

02/12/2025.
Actividades: Verificación de espacios y replanteo de redes sanitarias.
Día dedicado a la verificación técnica de los espacios modificados según los lineamientos de la supervisión. Se ajustaron los cantidades de obra para optimizar el recurso debido a la adición de nuevos espacios. Se inicia la excavación de zanjas para las tuberías de drenaje que llegaron ayer.

F. Stephanie Q
Residente Interventoria

Lairo Merchan.
Residente Obra.

03/12/2025.
Actividades: Armado de refuerzos (flejes) y figurado de acero

El equipo de oficiales trabaja en el figurado de acero y preparación de flejes con el material en sitio. Presentamos un desfase del 10% respecto a la programación inicial (20% ejecutado vs 30% programado) por lo que se intensifican las tareas de preparación para la fundición de la próxima semana.

F. Stephanie Q. — Residente Interventoría

Lairo Merchan — Residente Obra.

04/12/2025.

Actividades: Finalización de demoliciones y preparación de malla para placa. Cerramos la semana con la terminación total de las demoliciones solicitadas por el Ministerio de Salud. Se deja presentada la malla electrosoldada en los sectores críticos. El suministro oportuno de materiales en campo nos permitió subir un 5% de

INDUCONTABLES

avance esta semana, mitigando parte del retraso acumulado.

Stephanie Q — Jairo Merchan.

Residente Interventoria — Residente Obra

05/12/2025

Actividades: Inicio de excavaciones finales e instalación de tubería Sanitaria

Arrancamos el periodo con el objetivo de nivelar el cronograma iniciamos la instalación de la red sanitaria interna aprovechando que el material ya está en sitio. Persiste la dificultad por la mano de obra local limitada, pero estamos redistribuyendo al personal actual para no frenar el avance de las redes.

Stephanie Q — Jairo Merchan.

Residente Interventoria — Residente Obra

06 - 12 - 2025

Actividades: Instalación de tuberías de desagüe y cajas de conexión.

Continuamos con el montaje de la red sanitaria se están posicionando los puntos de desagüe de acuerdo con los nuevos planos. El equipo está trabajando en la fundición de los cajillos conectores para dejar el sistema listo antes de cubrir con la malla.

f stephanie Q — Residente Interventoria

Lairo Merchan — Residente Obra.

07/12/2025

No se labora (día de descanso dominical).

f stephanie Q — Residente Interventoria

Lairo Merchan. — Residente Obra.

INDUCONTABLES

08/12/2025

Actividades: Finalización de red sanitaria y fundición de cajas de inspección

Día Festivo, pero mantenemos ritmo para recuperar tiempo. Terminamos la instalación de la red y procedimientos con la fundición de la caja de inspección principal. Ya tenemos el personal de obra completo y los materiales listos para la siguiente fase de refuerzo de piso.

Stephanie Q. — Jairo Merchan.

Residente Interventoria — Residente Obra

09/12/2025.

Actividades: preparación del terreno y tendido de malla electrosoldada.

Una vez validadas las conexiones sanitarias, procedimos con la instalación de la malla electrosoldada en las áreas de intervención de la placa.

f. stephanie Q Jairo Merchan.
Residente Interventoria Residente Obra

10 - 12 - 2025.
Actividades Aseguramiento de niveles y refuerzo de malla.
Finalizamos la instalación de la malla en su totalidad. Estamos ajustando los niveles de piso para garantizar que la fundición sea uniforme. A pesar de los atrazos acumulados, el avance físico subido al 30%. aunque el programado según el plan de choque debería estar en el 50%.

f. stephanie Q Jairo Merchan
Residente Interventoria Residente Obra.

11 - 12 - 2025
Actividades: Verificación técnica previa a fundición y Organización de materiales.

INDUCONTABLES

Cerramos la semana con la red sanitaria instalada, las cajillas pendidas y la malla puesta. Tenemos todo preparado para iniciar la fundición de la placa a partir de mañana, 12 de diciembre, según lo programado. Se recomendó a la administración la contratación de personal no calificado local adicional para agilizar las tareas de limpieza y preliminares.

F. Stephanie Q — Jairo Merchan.
Residente Interventoria — Residente Obra

12/12/2025

Se ejecutaron las actividades de instalación de las redes hidraulicas y sanitarias. Las labores se realizaron conforme a los planos y especificaciones técnicas, dejando las tuberías protegidas para el posterior vaciado de concreto

F. Stephanie Q — Jairo Merchan
Residente Interventoría. — Residente Obra.

13/12/2025.
Tras la verificación de los puntos hidraulicos y sanitarios, se llevó a cabo la fundición de la placa de contrapiso en el puesto de Salud Esta actividad representa el inicio efectivo de las labores constructivas en el sitio.

f. Stephanie Q — f. Lairo Merchan
Residente Interventoria — Residente Obra.

15/12/2025
Se realizó el desencofrado y la inspeccion de la placa fundida el dió anterior. Se reportaron dificultades por el costo elevado de la mano de obra local y su disponibilidad limitada, lo que genera un desfase en el presupuesto de las actividades.

f. Stephanie Q — Lairo Merchan
Residente Interventoría — Residente Obra

16/12/2025
Recepcion y acopio de materiales en Obra. Se confirmó que la perfileria y la teja

INDUCONTABLES

ya se encuentran disponibles en sitio para las próximas fases de intervención. El personal operativo realizó limpieza y adecuación en áreas intervenidas.

F. Stephanie Q — Lairo Merchan
Residente Interventoría — Residente Obra.
17/12/2025
Jornada de seguimiento técnico. Se evidenció un avance de ejecución del 30% frente a un 70% programado. Debido al retraso, se analizó la necesidad de solicitar una prórroga del contrato, ya que la obra no se culminará en la vigencia del año 2025.

F. Stephanie Q — Lairo Merchan
Residente Interventoría — Residente Obra.
18/12/2025.
Cierre de la semana con la validación de las redes y la placa terminada. Se proyectó para las siguientes Semanas la construcción del consultorio 4 y la instalación

de carpintería, una vez se avance con la estructura de cubierta.

Ing. Stephanie Q.
Residente Interventoría

Ing. Tairo Merchán.
Residente Obra

INDUCONTABLES

ACTA PARCIAL No 002
PUESTO DE SALUD
MARACAIBO

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				**21,703,827.00**				**307,593.00**	**- 13,573.00**		**-**		**21,997,847.00**				**21,997,849.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5.00	31,642.00	158,210.00	-	-	-	-	-		-	5.00	158,210.00	-	-	5.00	158,210.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	162.15	60,470.00	9,805,211.00	-	-	-	-	-		-	162.15	9,805,210.50	-	-	162.15	9,805,211.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	101.31	32,175.00	3,259,649.00	-	-	-	-	-		-	101.31	3,259,649.25	-	-	101.31	3,259,649.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	97.05	36,895.00	3,580,660.00	-	-	-	-	-		-	97.05	3,580,659.75	-	-	97.05	3,580,660.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	26.69	28,959.00	772,916.00	-	-	-	-	-		-	26.69	772,915.71	-	-	26.69	772,916.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	27.92	27,352.00	763,668.00	-	-	-	-	-		-	27.92	763,667.84	-	-	27.92	763,668.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	12.12	32,175.00	389,961.00	+	9.56	-	307,593.00	-		-	21.68	697,554.00	-	-	21.68	697,554.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	3.00	52,561.00	157,683.00	-	-	-	-	-		-	3.00	157,683.00	-	-	3.00	157,683.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	78.24	22,519.00	1,761,887.00	-	-	-	-	-		-	78.24	1,761,886.56	-	-	78.24	1,761,887.00
1.10	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE	UND	1.00	100,150.00	100,150.00	-	-	-	-	-		-	1.00	100,150.00	-	-	1.00	100,150.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	10.72	77,181.00	827,380.00	-	-	- 0.12	-	- 9,262.00		-	10.60	818,118.60	-	-	10.60	818,119.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPACTACIÓN MECANICA.	M3	3.52	35,924.00	126,452.00	-	-	- 0.12	-	- 4,311.00		-	3.40	122,141.60	-	-	3.40	122,142.00
2	**CONCRETOS**				**26,670,680.00**				**9,093,418.00**	**- 1,683,677.00**		**1,282,417.00**		**34,080,420.00**		**-**		**34,080,419.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	21.37	149,823.00	3,201,718.00	+	52.42	-	7,853,722.00	-	2.54	380,550.00	73.79	11,055,439.17	-	-	73.79	11,055,439.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	m2	34.06	148,823.00	5,068,911.00	+	8.33	-	1,239,696.00	-	0.26	38,694.00	42.39	6,308,606.97	-	-	42.39	6,308,607.00

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
2.03	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	8.72	148,823.00	1,297,737.00	-	-	- 2.92	-	- 434,563.00	5.80	863,173.00	5.80	863,173.40	-	-	5.80	863,173.00
2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	80.00	198,165.00	15,853,200.00	-	-	-	-	-		-	80.00	15,853,200.00	-	-	80.00	15,853,200.00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO, REF. A10 DE 50X20X80 cm. INCLUYE EXCAVACIÓN, Y ATRAQUE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	8.72	143,247.00	1,249,114.00	-	-	- 8.72	-	- 1,249,114.00		-	-	-	-	-	-	-
3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS**				**72,109,365.00**				**7,049,270.00**	**- 15,837,124.00**		**25,808,151.00**		**31,717,031.59**		**31,604,480.00**		**63,321,511.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	102.51	73,861.00	7,571,491.00	-	-	- 2.69	-	- 198,686.00	19.82	1,463,925.00	99.82	7,372,805.02	-	-	99.82	7,372,805.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	345.59	47,876.00	16,545,467.00	-	-	-186.05	-	- 8,907,330.00	159.54	7,638,137.00	159.54	7,638,137.04	-	-	159.54	7,638,137.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	39.00	126,916.00	4,949,724.00	-	-	- 24.52	-	- 3,111,980.00	14.48	1,837,744.00	14.48	1,837,743.68	-	-	14.48	1,837,744.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	37.01	34,933.00	1,292,870.00	+	52.03	-	1,817,564.00	-	89.04	3,110,434.00	89.04	3,110,434.32	-	-	89.04	3,110,434.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	80.05	39,803.00	3,186,230.00	+	131.44	-	5,231,706.00	-	211.49	8,417,936.00	211.49	8,417,936.47	-	-	211.49	8,417,936.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	141.22	41,511.00	5,862,183.00	-	-	- 60.76	-	- 2,522,208.00	80.46	3,339,975.00	80.46	3,339,975.06	-	-	80.46	3,339,975.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	26.30	41,708.00	1,096,920.00	-	-	- 26.30	-	- 1,096,920.00		-	-	-	-	-	-	-
3.08	Malla esiabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tubería galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ml	80.00	395,056.00	31,604,480.00	-	-	-	-	-		-	-	-	80.00	31,604,480.00	80.00	31,604,480.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**73,383,270.00**				**228,944.00**	**- 455,891.00**		**13,816,977.00**		**67,649,896.46**		**5,506,426.00**		**73,156,323.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	269.00	135,331.00	36,404,039.00	-	-	- 1.90	-	- 257,129.00	7.10	960,850.00	267.10	36,146,910.10	-	-	267.10	36,146,910.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	143.15	131,577.00	18,835,248.00	+	1.74	-	228,944.00	-	9.69	1,274,981.00	144.89	19,064,191.53	-	-	144.89	19,064,192.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	13.00	65,973.00	857,649.00	-	-	-	-	-		-	13.00	857,649.00	-	-	13.00	857,649.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	26.00	180,924.00	4,704,024.00	-	-	-	-	-		-	-	-	26.00	4,704,024.00	26.00	4,704,024.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80	38,577.00	802,402.00	-	-	-	-	-		-	-	-	20.80	802,402.00	20.80	802,402.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	109.05	108,023.00	11,779,908.00	-	-	- 1.84	-	- 198,762.00	107.21	11,581,146.00	107.21	11,581,145.83	-	-	107.21	11,581,146.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**26,001,953.00**				**-**	**- 10,982,254.00**		**9,644,080.00**		**15,019,697.76**		**-**		**15,019,698.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	109.42	65,999.00	7,221,611.00	-	-	- 27.64	-	- 1,824,212.00	0.33	21,780.00	81.78	5,397,398.22	-	-	81.78	5,397,398.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO 45X 45m TRAFICO	M2	109.00	124,287.00	13,547,283.00	-	-	- 31.58	-	- 3,924,983.00	77.42	9,622,300.00	77.42	9,622,299.54	-	-	77.42	9,622,300.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	131.23	39,877.00	5,233,059.00	-	-	-131.23	-	- 5,233,059.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**CARPINTERIA METALICA**				**63,138,484.00**				**515,522.00**	**- 4,152,095.00**		**19,297,965.00**		**51,518,065.00**		**7,983,846.00**		**59,501,910.00**
6.01	1 Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	1.89	1,031,425.00	1,949,393.00	-	-	- 0.36	-	- 371,313.00	-	-	-	-	1.53	1,578,080.00	1.53	1,578,080.00
6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	31.71	1,288,804.00	40,867,975.00	+	0.40	-	515,522.00	-	6.71	8,647,875.00	31.71	40,867,974.84	0.40	515,522.00	32.11	41,383,496.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
6.03	1 Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND	1.00	3,195,771.00	3,195,771.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,195,771.00	1.00	3,195,771.00
6.04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	16.08	1,065,009.00	17,125,345.00	-	-	- 3.55	-	- 3,780,782.00	10.00	10,650,090.00	10.00	10,650,090.00	2.53	2,694,473.00	12.53	13,344,563.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**26,983,900.00**				**355,591.00**	**- 5,356,632.00**		**6,752,341.00**		**13,426,482.00**		**8,556,377.00**		**21,982,859.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	14.00	153,374.00	2,147,236.00	-	-	- 7.00	-	- 1,073,618.00	-	-	-	-	7.00	1,073,618.00	7.00	1,073,618.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,043,675.00	1,043,675.00	-	-	-	-			-	1.00	1,043,675.00	-	-	1.00	1,043,675.00

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	811,074.00	811,074.00	-	-	-	-	-		-	1.00	811,074.00	-	-	1.00	811,074.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	38.00	195,661.00	7,435,118.00	+	1.00	-	195,661.00	-	10.00	1,956,610.00	20.00	3,913,220.00	19.00	3,717,559.00	39.00	7,630,779.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	35.00	159,930.00	5,597,550.00	+	1.00	-	159,930.00	-	10.00	1,599,300.00	20.00	3,198,600.00	16.00	2,558,880.00	36.00	5,757,480.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	164,715.00	823,575.00	-	-	-	-		2.00	329,430.00	5.00	823,575.00	-	-	5.00	823,575.00

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	769,337.00	769,337.00	-	-	-	-			-	1.00	769,337.00	-	-	1.00	769,337.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	7.00	121,683.00	851,781.00	-	-	-	-		7.00	851,781.00	7.00	851,781.00	-	-	7.00	851,781.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	787,154.00	787,154.00	-	-	-	-		-	-	-	-	1.00	787,154.00	1.00	787,154.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	67,174.00	6,717,400.00	-	-	- 63.76	-	- 4,283,014.00	30.00	2,015,220.00	30.00	2,015,220.00	6.24	419,166.00	36.24	2,434,386.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**25,147,140.00**				**251,732.00**	**- 5,706,986.00**		**3,441,822.00**		**9,137,786.20**		**10,554,099.00**		**19,691,885.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0.60 m	ML	4.77	2,208,708.00	10,535,537.00	-	-	- 1.77	-	- 3,909,413.00		-	-	-	3.00	6,626,124.00	3.00	6,626,124.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	679,941.00	1,359,882.00	-	-	- 1.00	-	- 679,941.00		-	-	-	1.00	679,941.00	1.00	679,941.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	5.00	388,678.00	1,943,390.00	-	-	- 1.00	-	- 388,678.00		-	-	-	4.00	1,554,712.00	4.00	1,554,712.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	892,324.00	892,324.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	892,324.00	1.00	892,324.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	12.00	71,487.00	857,844.00	-	-	- 1.00	-	- 71,487.00	-	-	11.00	786,357.00	-	-	11.00	786,357.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	9.00	89,326.00	803,934.00	+	1.00	-	89,326.00	-	-	-	10.00	893,260.00	-	-	10.00	893,260.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2.00	162,406.00	324,812.00	+	1.00	-	162,406.00		-	-	3.00	487,218.00	-	-	3.00	487,218.00
8.08	Suministro e Instalacion de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la	UND	1.00	1,068,984.00	1,068,984.00	-	-	-	-			-	1.00	1,068,984.00	-	-	1.00	1,068,984.00
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	19.53	36,138.00	705,775.00	-	-	- 0.80	-	- 28,910.00		-	18.73	676,864.74	-	-	18.73	676,865.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	7.64	72,364.00	552,861.00	-	-	- 0.20	-	- 14,473.00		-	7.44	538,388.16	-	-	7.44	538,388.00
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	613,724.00	613,724.00	-	-	-	-		1.00	613,724.00	1.00	613,724.00	-	-	1.00	613,724.00
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1.00	800,998.00	800,998.00	-	-	-	-		-	-	-	-	1.00	800,998.00	1.00	800,998.00
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	8.95	47,656.00	426,521.00	-	-	- 0.24	-	- 11,437.00		-	8.71	415,083.76	-	-	8.71	415,084.00
8.14	Construcción de Caja de Inspeción de 0,60x0,60 en concreto	und	2.00	798,203.00	1,596,406.00	-	-	-	-	-	2.00	1,596,406.00	2.00	1,596,406.00	-	-	2.00	1,596,406.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6".	ml	15.76	109,368.00	1,723,640.00	-	-	- 4.50	-	- 491,947.00	11.26	1,231,692.00	11.26	1,231,692.39	-	-	11.26	1,231,692.00
8.16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4.37	40,093.00	175,206.00	-	-	- 1.10	-	- 44,102.00		-	3.27	131,104.11	-	-	3.27	131,104.00
8.17	Suministro e Instalación de Tubería Hidraulica de 1/2"	ml	13.33	57,412.00	765,302.00	-	-	- 1.16	-	- 66,598.00		-	12.17	698,704.04	-	-	12.17	698,704.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				-				**26,386,165.00**	-		**26,386,165.00**		**26,386,165.00**		-		**26,386,165.00**
NP1	COLUMNA DE 0,2 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML		304,367.00		+	23.00	-	7,000,441.00	-	23.00	7,000,441.00	23.00	7,000,441.00	-	-	23.00	7,000,441.00
NP2	COLUMNA DE 0,1 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML		125,000.00		+	18.00	-	2,250,000.00	-	18.00	2,250,000.00	18.00	2,250,000.00	-	-	18.00	2,250,000.00
NP3	Suministro e instalación Sistema Septico integrado de 1650 lts Rotoplast. Incluye Tanque pozo septico rotoplast de 1650 lts, Trampa de grasas, Excavación y rellenos del pozo.	Und		12,206,924.00		+	1.00	-	12,206,924.00	-	1.00	12,206,924.00	1.00	12,206,924.00	-	-	1.00	12,206,924.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **MARACAIBO**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALI	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
NP4	VIGA DE 0,2 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML		305,000.00		+	16.16	-	4,928,800.00	-	16.16	4,928,800.00	16.16	4,928,800.00	-	-	16.16	4,928,800.00
										-								-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					335,138,619.00				44,188,232.00	- 44,188,232.00	% EJE ACTA 2	106,429,918.00	% ACUM	270,933,391.00	POR COBRAR	64,205,228.00		335,138,619.00
ADMINISTRACION				28.10%	94,173,952.00				12,416,893.00	- 12,416,893.00		29,906,806.00		76,132,282.00		18,041,669.00		94,173,952.00
IMPREVISTOS				1.00%	3,351,386.00				441,882.00	- 441,882.00		1,064,299.00		2,709,333.00		642,052.00		3,351,386.00
UTILIDAD				5.00%	16,756,931.00				2,209,412.00	- 2,209,412.00		5,321,496.00		13,546,670.00		3,210,261.00		16,756,931.00
TOTAL OBRA					449,420,888.00				59,256,419.00	- 59,256,419.00	31.76%	142,722,519.00	80.84%	363,321,676.00	19.16%	86,099,210.00	100.00%	449,420,888.00

RESUMEN FINANCIERO MARACAIBO		
Valor Inicial Contrato:	$	449,420,888.00
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	449,420,888.00
Valor Acta No 001	$	220,599,159.00
Valor Acta No 002	$	142,722,519.00
Valor A Girar Acta No 002	$	142,722,519.00
Valor Acumulado Actas	$	363,321,678.00
% Ejecución Acumulado		80.84%
Saldo Por Ejecutar	$	86,099,210.00

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 002 FUE **REVISADA Y APROBADA** POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($ 142.722.519,00)**. CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 80,84%. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DOS (2) DÍAS, DEL MES DE MARZO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal

VoBo DIRECTOR DE OBRA

Adriana Marcela G

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM

INTERVENTORÍA

JHONATHAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	2,01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BAÑOS	1,70		2,05	1,00	3,49
COCINETA	2,98		2,20	1,00	6,56
	3,40		2,13	1,00	7,24
VACUNACIÓN	3,87		3,31	1,00	12,81
	3,61		1,58	1,00	5,70
CONSULTORIO 2	3,87		3,33	1,00	12,89
SALA DE ESPERA	5,11		3,58	1,00	18,29
PASILLO	2,84		1,20	1,00	3,41
CUARTO DE RESIDUOS	2,84		1,20	1,00	3,41

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**73,79**
COBRO ACTA N.1	71,25
ACTA N.2	**2,54**
TOTAL CONTRACTUAL	21,37

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ANDENES	10,02		1,00	2,00	20,04
	10,70		0,90	1,00	9,63
	10,70		1,00	1,00	10,70
	2,55		0,40	1,00	1,02
	6,69		0,15	1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**42,39**
COBRO ACTA N.1	42,13
ACTA N.2	0,26
TOTAL CONTRACTUAL	**34,06**

Elaboró

ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló

Daniela Onatra

DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	2,03	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
RAMPA	2,00		2,90	1,00	5,80
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5,80**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**5,80**
TOTAL CONTRACTUAL	8,72

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,01	MURO EN BLOQUE No 4	**Unidad Medida**	M2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO VACUNACIÓN - VENTANA INTERMEDIA	1,00	0,60		1,00	0,60
CONSULTORIO 2	0,70	2,50		1,00	1,75
BAÑO	0,76	3,00		1,00	2,28
	0,65	3,00		1,00	1,95
COCINETA	0,70	2,50		2,00	3,50
CUARTO ASEO Y RESIDUOS	2,44	2,50		1,00	6,10
	0,80	1,62		- 1,00	- 1,30
	1,40	0,88		1,00	1,23
	1,40	2,70		1,00	3,78
	1,40	2,50		1,00	3,50
	0,70	2,50		1,00	1,75
	0,50	2,64		1,00	1,32
	1,80	0,50		3,00	1,35
Cerramiento Perimetral	80,00	0,90		1,00	72,00
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**99,82**
COBRO ACTA N.1	**80,00**
ACTA N.2	19,82
TOTAL CONTRACTUAL	102,51

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**Unidad Medida**	M2	





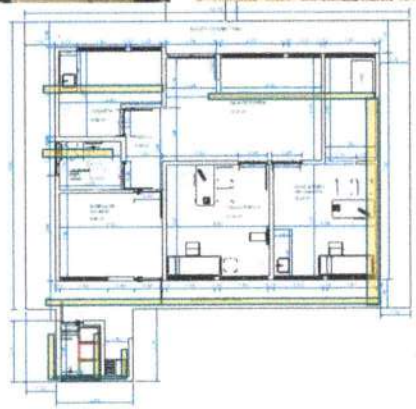

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
cuarto de aseo	2,44	2,50		1,00	6,10
	0,80	1,62		- 2,00	- 2,59
	1,40	0,88		1,00	1,23
	1,40	2,70		1,00	3,78
	1,40	2,50		1,00	3,50
	0,70	2,50		1,00	1,75
	0,50	2,64		1,00	1,32
	1,80	0,50		1,00	0,45
Bateria PMR	2,05	0,50		-	-
	1,70	0,50		0,00	0,00
	0,72	0,50		0,00	0,00
Cerramiento	80,00	0,90		2,00	144,00

TOTAL DE ACTIVIDAD	**159,54**
COBRO ACTA N.1	**0,00**
ACTA N.2	**159,54**
TOTAL CONTRACTUAL	345,59

OBSERVACIONES:

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30		**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BAÑO PMR		2,10	2,05	2,00	8,61
		2,10	1,70	1,00	3,57
		2,10	0,72	1,00	1,51
		2,10	0,47	1,00	0,99
MESON COCINETA		1,10	1,40	0,00	0,00
		1,10	0,55	0,00	0,00
MESON VACUNACION		1,10	1,60	0,00	0,00
		1,10	0,55	0,00	0,00
CUARTO DE ASEO Y LAVADERO		1,80	2,44	0,00	0,00
		1,80	1,80	0,00	0,00
		1,80	0,80	0,00	0,00
		1,80	1,33	0,00	0,00
ventana PMR		0,16	1,22	- 1,00	- 0,20

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**14,48**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**14,48**
TOTAL CONTRACTUAL	39,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÀ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MURO	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	3,04 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	**Unidad Medida**	M2





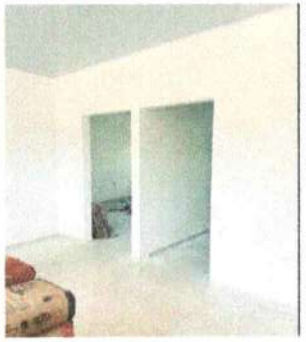

Localización	Dimensiones LONGUTUD	ALTO	ANCHO	CANT	Medida Total
Sala de espera	15,51	2,60		1,00	40,33
ventanas	3,14	1,70		- 1,00	- 5,34
puertas	4,00	2,00		- 1,00	- 8,00
cocineta	7,58	2,60		1,00	19,71
ventanas	2,63	1,70		- 1,00	- 4,47
Bodega	11,65	2,60		1,00	30,29
ventanas	1,60	1,70		- 1,00	- 2,72
cuarto de aseo	2,64	2,50		1,00	6,60
	0,80	1,30		- 1,00	- 1,04
ventana cuarto de aseo	1,00	0,40		- 1,00	- 0,40
	1,80	1,20		1,00	2,16
	1,80	2,70		2,00	9,72
	0,70	2,50		1,00	1,75
	1,80	0,50		1,00	0,45

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**89,04**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	89,04
TOTAL CONTRACTUAL	37,01

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372 267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MURO	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	3,05 ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	**Unidad Medida**	M2









Localización	Dimensiones LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANT	Medida Total
fachada frontal	10,48	2,60		1,00	27,25
ventana	1,70	0,55		- 1,00	- 0,94
	3,23	1,70		- 1,00	- 5,49
	1,78	1,75		- 1,00	- 3,12
	1,55	0,56		- 1,00	- 0,87
puerta	1,60	2,60		- 1,00	- 4,16
fachada lateral derecha y fachada lateral izq	7,72	2,60		2,00	20,07
ventana lateral izq	0,40	1,20		- 1,00	- 0,48
ventana lateral derecha	0,84	0,56		- 2,00	- 0,94
fachada posterior	10,48	2,60		1,00	27,25
Puerta salida de bodega	0,98	1,62		- 1,00	- 1,59
ventanas	1,70	1,62		- 1,00	- 2,75
	1,70	1,60		- 1,00	- 2,72
	0,50	0,88		- 1,00	- 0,44
cuarto de aseo	2,64	2,70		1,00	7,13
	0,80	1,30		- 1,00	- 1,04
	1,80	1,20		1,00	2,16
	1,80	2,70		1,00	4,86
	0,70	2,50		1,00	1,75
	1,80	0,50		2,00	0,90
	2,64	0,50		1,00	0,66
Cerramiento	80,00	0,90		2,00	144,00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**211,49**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**211,49**
TOTAL CONTRACTUAL	80,05

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MURO		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	**Unidad Medida**	M2	









Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
consultorio 2	3,33	2,60		2,00	17,32
	3,80	2,60		2,00	19,76
puerta	0,98	2,10		- 1,00	- 2,06
ventanería	1,70	1,60		- 2,00	- 5,44
consultorio de vacunación	3,87	2,60		2,00	20,12
	3,38	2,60		1,00	8,79
	1,58	2,60		2,00	8,22
	3,61	2,60		2,00	18,77
	0,62	2,60		2,00	3,22
	0,72	2,60		1,00	1,87
puerta	0,98	2,10		- 1,00	- 2,06
ventanería	1,63	1,60		- 2,00	- 5,22
	1,67	1,70		- 1,00	- 2,84
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**80,46**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**80,46**
TOTAL CONTRACTUAL	141,22

Elaboró

ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló

DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	**Unidad Medida**	ml







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Áreas Asistenciales	13,00			20,00	260,00
Cuarto Aseo	3,55			2,00	7,10
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES: Se plantean las Correas en pacha.

TOTAL DE ACTIVIDAD	**267,10**
COBRO ACTA N.1	260,00
ACTA N.2	**7,10**
TOTAL CONTRACTUAL	269,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026		
ÍTEM	4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**Unidad Medida**	m2	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Cubierta PPAL	13,00		10,40	1,00	135,20
Cubierta Aseo	3,55		2,73	1,00	9,69
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**144,89**
COBRO ACTA N.1	135,20
ACTA N.2	**9,69**
TOTAL CONTRACTUAL	143,15

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra


Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	4,06 — SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	**Unidad Medida**	m2



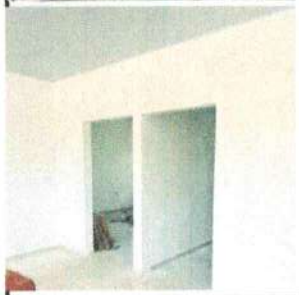



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
Area total	10,70		10,02	1,00	107,21
cambio de nivel frontal	10,70	0,30	1,00	0,00	0,00
cambio de nivel posterior	10,70	0,30	1,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**107,21**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	107,21
TOTAL CONTRACTUAL	109,05

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	5,01 — NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
AREA TOTAL	10,70		8,12	1,00	86,88
CUARTO DE ASEO	2,64		1,80	1,00	4,75
BODEGA	3,40		2,90	-1,00	-9,86

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**81,78**
COBRO ACTA N.1	81,45
ACTA N.2	**0,33**
TOTAL CONTRACTUAL	109,42

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra


Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	**Unidad Medida**	m2	



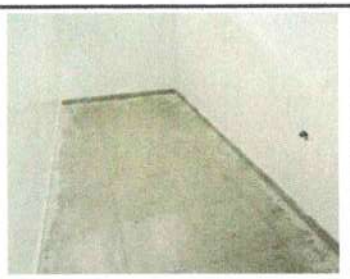



Localización	Dimensiones		AREA	CANT	Medida Total
COCINETA			8,87	1,00	8,87
PMR			3,49	1,00	3,49
BODEGA DE INSUMOS			9,86	1,00	9,86
CUARTO DE RESIDUOS			2,34	1,00	2,34
			1,36	0,00	0,00
PASILLO			3,66	1,00	3,66
SALA DE ESPERA			18,20	1,00	18,20
CONSULTORIO DE VACUNACIÓN			18,35	1,00	18,35
CONSULTORIO 2			12,65	1,00	12,65

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**77,42**
COBRO ACTA N.1	**0,00**
ACTA N.2	**77,42**
TOTAL CONTRACTUAL	109,42

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

ty

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	6,02	Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.	**Unidad Medida** M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
V1		0,50	1,61	3,00	2,42
V2		1,70	1,70	1,00	2,89
V3		1,70	1,58	2,00	5,37
V4		1,70	1,07	1,00	1,82
V5		0,50	1,62	2,00	1,62
V6		1,70	1,87	1,00	3,18
V7		1,70	1,52	1,00	2,58
V8-V10		1,70	1,62	2,00	5,51
V9-V11		1,70	1,60	2,00	5,44
V12-V13		0,50	0,88	2,00	0,88
V14 CUARTO DE RESIDUOS		0,40	1,00	1,00	0,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**32,11**
COBRO ACTA N.1	**25,00**
ACTA N.2	**6,71**
TOTAL CONTRACTUAL	31,71

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	6,04	Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**Unidad Medida**	M2	



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
COCINETA	0,98	2,15		1	2,11
PMR	0,98	2,15		1	2,11
BODEGA DE INSUMOS	0,95	2,15		2	4,09
CONSULTORIO 2	0,98	2,15		1	2,11
CONSULTORIO VACUNACION	0,98	2,15		1	2,11
CUARTO DE ASEO	0,73	2,15		0	0
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**12,53**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**10,00**
TOTAL CONTRACTUAL	16,08
TOTAL ACTIVIDAD	**22,53**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra


Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR



MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	7,04 — Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	**Unidad Medida**	UND

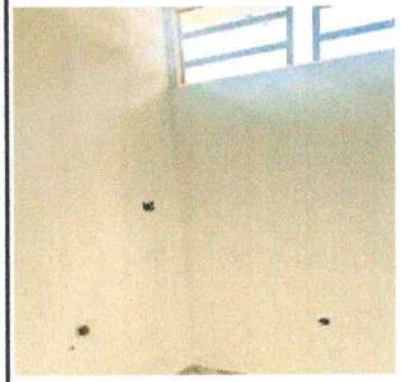



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Exterior				10,00	10,00
COCINETA				4,00	4,00
Baños				1,00	1,00
PASILLO				2,00	2,00
BODEGA				4,00	4,00
CONSULTORIO 2				4,00	4,00
CONSULTORIO VACUNACION				6,00	6,00
SALA DE ESPERA				6,00	6,00
Cuarto de Aseo				1,00	1,00
LAVADERO				1,00	1,00
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**39,00**
COBRO ACTA N.1	10,00
ACTA N.2	**10,00**
TOTAL CONTRACTUAL	38,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	28-nov-25	
ÍTEM	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
COCINETA				6,00	6,00
Baños				1,00	1,00
PASILLO				2,00	2,00
BODEGA				4,00	4,00
CONSULTORIO 2				5,00	5,00
CONSULTORIO VACUNACION				11,00	11,00
SALA DE ESPERA				5,00	5,00
Cuarto de Aseo				1,00	1,00
LAVADERO				1,00	1,00
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**36,00**
COBRO ACTA N.1	10,00
ACTA N.2	**10,00**
TOTAL CONTRACTUAL	35,00

Elaboró:
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	**Unidad Medida**	UND	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Tomacorriente AA				5,00	5,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**5,00**
COBRO ACTA N.1	3,00
ACTA N.2	**2,00**
TOTAL CONTRACTUAL	5,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	7,08 — ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	**Unidad Medida**	ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Planta electrica	7,00			1,00	7,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**7,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**7,00**
TOTAL CONTRACTUAL	7,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra.
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	**Unidad Medida**	ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
N°12	18,12			1,00	18,12
N°14	18,12			1,00	18,12
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**36,24**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**30,00**
TOTAL CONTRACTUAL	100,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	8,11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado	**Unidad Medida**	UND	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
LAVATRAPEROS				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**1,00**
TOTAL CONTRACTUAL	1,00

Elaboró

ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló Daniela Onatra

DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	8,14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.		**Unidad Medida**	UND







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Cajas sanitarias				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**2,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**2,00**
TOTAL CONTRACTUAL	2,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

ty

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	8,15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 6".	**Unidad Medida**	ML	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
RED SANITARIA	3,25			1,00	3,25
	2,87			1,00	2,87
	2,58			1,00	2,58
	2,56			1,00	2,56
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**11,26**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**11,26**
TOTAL CONTRACTUAL	15,76
TOTAL ACTIVIDAD	**22,52**

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

ty

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	NP1	COLUMNA DE 0,2 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	**Unidad Medida** ML



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CERRAMIENTO		0,90		20,0	18,0
		2,50		2,0	5,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**23,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**23,00**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	NP2	COLUMNA DE 0,1X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	**Unidad Medida**	ML	





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CERRAMIENTO		0,90		20,00	18,00
					-
CUARTO DE ASEO		0,50		-	-
		2,30		-	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**18,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**18,00**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00
TOTAL ACTIVIDAD	**18,00**

Elaboró

ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló

Daniela Onatra

DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE 1000 L (INCLUYE TRAMPA DE GRASAS OVOIDE DE 250 L , + FILTRO ANAEROBICO OVOIDE DE 250 L Y TRANSPORTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 30 KM) - NO INCLUYE EXCAVACIONES, SOLO INSTALACION .	**Unidad Medida**	UND	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO DE SALUD				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	1,00
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

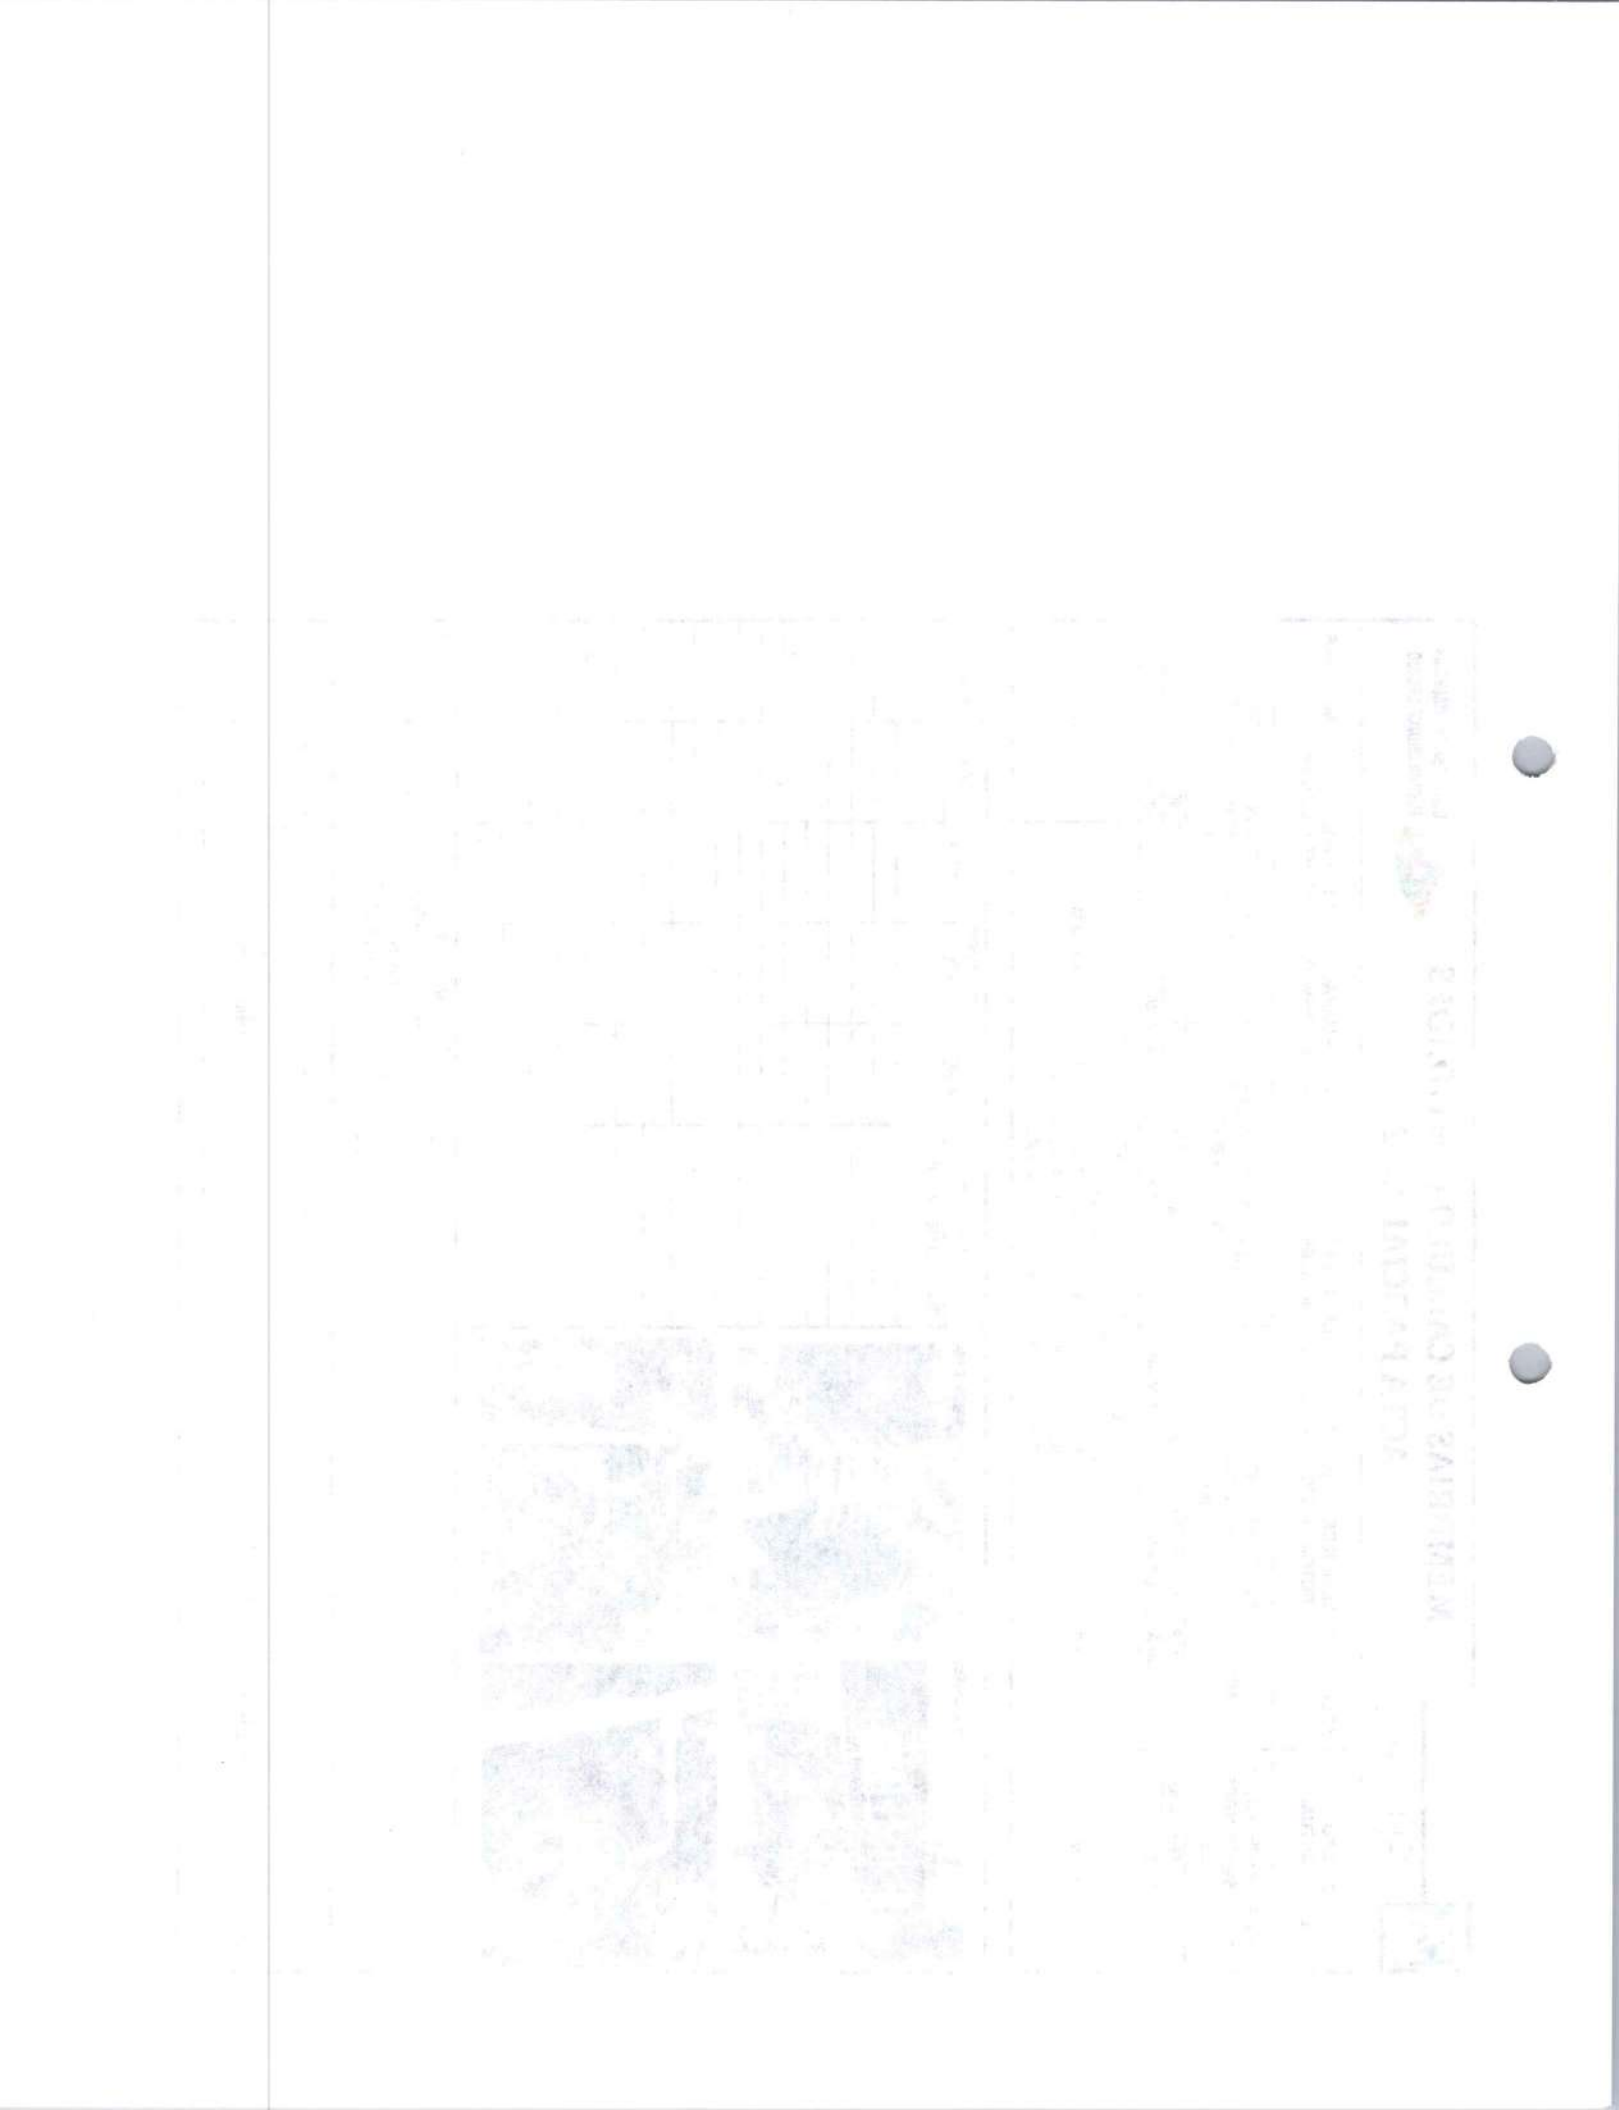

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD MARACAIBO	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	NP4 — VIGA DE 0,2 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO					
VIGA DE CIMENTACIÓN Y VIGA DE AMARRE	1,8			4,0	7,2
	2,24			4,0	9,0
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**16,16**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	16,16
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró
ADRIANA CASTRO
Residente de Obra

Avaló
Daniela Onatra
DANIELA ONATRA
INTERVENTOR

BITÁCORA MARACAIBO

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA

N° 002 11 Sep 2025

PUESTO DE SALUD MARACAIBO

Contratista: H2m Arquitectos e Ingenieros Zomac

Contratante: ESE Hospital Malvinas Hector Orozco Orozco.

Interventoria: unión Temporal Inter Malvinas 25.

Fecha de Inicio: 06 / octubre / 2025.

06/10/2025 al 23/10/2025

Desde la firma del Acta de inicio el 06 de octubre de 2025 hasta el 23 de octubre de 2025, el proyecto en el puesto de salud Maracaibo no registró actividades constructivas en campo, enfocándose exclusivamente en gestiones administrativas y logísticas. Durante este periodo, el contratista adelantó trámites de afiliación a seguridad social para el personal y coordinó la logística de transporte, hospedaje y acopio de materiales para esta zona rural de difícil acceso. El hito principal ocurrió el 20 de octubre con la visita técnica y socialización del contrato ante la comunidad de la vereda, espacio donde se presentó al equipo técnico y se explicó el alcance de obras para generar condiciones de confianza. posteriormente, se inició la vinculación de mano de obra local, priorizando la contratación de oficiales y ayudantes del sector. Al cierre de este reporte, se registra un avance físico de 0%. Con el compromiso

formal de iniciar labores físicas el lunes 27 de octubre de 2025 para mitigar el atraso de 20 días acumulado por las gestiones de socialización y acceso.

Residente Obra — Daniela ONatra C. Residente Interventoría.

24/10/2025

Se da apertura a los frentes de trabajo con la ejecución de demoliciones en el área de cocina. Se reporta la dificultad de acceso por el cierre vial en el puente el avispero.

Residente Obra — Daniela ONatra C. Residente Interventoría

25/10/2025

Labores de retiro de enchape y acabados en muros y pisos de la cocina. Se garantiza el cumplimiento de medidas de seguridad y protección en el sitio

Residente Obra — Daniela ONatra C. Residente Interventoría.

27 / 10 / 2025

Extension de los trabajos de demolicion hacia las areas administrativos y oficinas del puesto de salud. Preparacion para superficies para fases posteriores.

Residente Obra — Daniela Natra C. Residente Interventoría

28 / 10 / 2025

Recoleccion de escombros producto de las demoliciones y adecuaciones de espacios para permitir el flujo de personal técnico.

Residente Obra — Daniela Natra C. Residente Interventoría

29 / 10 / 2025

Jornada de Socializacion del proyecto con la comunidad local y coordinación en terreno con los profesionales técnicos.

Residente Obra — Daniela Natra C. Residente Interventoría

30/10/2025

Continuación de labores preliminares en los frentes internos. Seguimiento al desabastecimiento de insumos esenciales (perfiles y cubiertas) en el departamento

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría

31/10/2025

Se mantienen los trabajos de demolición en áreas internas. Se reporta la finalización de retiro de enchape de piso.

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría.

01/11/2025.

Ejecucion de actividades de retiro de inodoro y lavamanos en las áreas de servicios. Persisten dificultades logisticas por la intervencion del punto El Aljibe

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría.

03 / 11 / 2025

Inicio de las labores de desmonte de carpintería metálica en la infraestructura.

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría

04 / 11 / 2025

Ingreso y acopio de material pétreo en el sitio de obra para dar inicio al mejoramiento de muros y pisos.

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría

05 / 11 / 2025

Continuación del desmonte de carpintería. Se coordina la logística de abastecimiento ante las restricciones de movilidad en el área rural.

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría

06 / 11 / 2025

Finalización de la organización logística de materiales pétreos recibidos anteriormente

y preparación de herramientas para el inicio de las excavaciones exteriores y canalizaciones.

Chris Cuijsu — Residente Obra
Daniela Onatra C. — Residente Interventoría
07/11/2025

Ejecución de demoliciones técnicas orientadas a la ampliación de áreas, cumpliendo con la normativa vigente para puestos de salud.

Chris Cuijsu — Residente Obra
Daniela Onatra C. — Residente Interventoría
08/11/2025

Inicio de excavaciones manuales para el mejoramiento del ancho del andén exterior.

Chris Cuijsu — Residente Obra
Daniela Onatra C. — Residente Interventoría
10/11/2025

Labores de canalización de tubería

PVC para cableado electrico, preparación para la posterior fundición de placa

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría

11/11/2025

Aplicación de concreto de limpieza (baja resistencia) para nivelar el terreno en los frentes de trabajo internos.

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría

12/11/2025

Confirmación de la instalación de tuberías PVC y adecuación técnica de las áreas para las fases constructivas siguientes.

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría

13/11/2025

Verificación de las adecuaciones realizadas. Se reporta la necesidad de

aumentar la mano de obra para mitigar el consumo del plazo contractual

Residente Obra — Daniela Ovalra C. Residente Interventoría

14/11/2025

Inicio de excavaciones manuales para la viga de cimentación del cerramiento

Residente Obra — Daniela Ovalra C. Residente Interventoría

15/11/2025

Continuación de demoliciones de elementos para adecuación de áreas según los planos.

Residente Obra — Daniela Ovalra C. Residente Interventoría

17/11/2025

Se da inicio con labores de fundición de concreto para el cárcamo perimetral del puesto de salud.

Residente Obra — Daniela Ovalle C. Residente Interventoría

18/11/2025

Avance en la fundición de secciones de anden y preparación de terreno para cimentación.

Residente Obra — Daniela Ovalle C. Residente Interventoría

19/11/2025

Seguimiento a la baja disponibilidad de perfiles en C y ladrillo N°4 en el mercado Regional.

Residente Obra — Daniela Ovalle C. Residente Interventoría

20/11/2025

Continuamos con excavaciones y fundición de andenes. Se reporta la necesidad urgente de un plan de choque por retrasos.

Residente Obra — Daniela ONatra C
Residente Interventoría.

21/11/2025

Continuación de la instalación de tubería PVC para la canalización del cableado eléctrico.

Residente Obra — Daniela ONatra C
Residente Interventoría

22/11/2025

Avance en las labores de fundición del andén perimetral del puesto de salud

Residente Obra — Daniela ONatra C
Residente Interventoría.

24/11/2025

Actividades combinadas de demoliciones controladas y fundición de secciones de andén perimetral.

Residente Obra — Daniela ONatra C
Residente Interventoría

25/11/2025

Inicio de la fundición de vigas de cimentación y soportes destinados al cerramiento del puesto de salud

Residente Obra — Daniela Ónatra C
Residente Interventoría.

26/11/2025

Organización de materiales en sitio (ya disponibles) para actividades de cimentación y obra blanca.

Residente Obra — Daniela Ónatra C
Residente Interventoría

27/11/2025

Verificación de frentes activos. Se reporta que el avance ejecutado (20%) ha logrado alinearse con el programado (20%)

Residente Obra — Daniela Ónatra C
Residente Interventoría

28/11/2025

Labores de instalación de tubería en

la zona de lavado. Inicio de retiro de red sanitaria en baterias existentes

Daniela Onatra C
Residente Obra — Residente Interventoria
29/11/2025

preparacion y figurado de refuerzo metalico para la viga de cimentacion del cerramiento perimetral.

Daniela Onatra C
Residente Obra — Residente Interventoria
01/12/2025

Adecuacion y limpieza de las brechas para la fundicion de la viga de cimentacion del cierramiento.

Daniela Onatra C
Residente Obra — Residente Interventoria
02/12/2025

Suspencion parcial de ciertos frentes debido a cambios en el diseño aprobados tras la visita del Ministerio de Salud

y la supervisión.

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría.

03/12/2025

Inicio de la fundicion de concreto para la viga de cimentación del cerramiento, utilizando las materiales ya disponibles en sitio.

Residente Obra — Daniela Onatra C. Residente Interventoría

04/12/2025

Revisión de los nuevos espacios adicionados al puesto de salud de acuerdo a las condiciones ideales plantradas por el Ministerio.

Residente Oba. — Daniela Onatra C. Residente Interventoría.

05/12/2025

Ejecución de labores de instalaciones electricas Internas segun los nuevos

reforzamientos de rediseño.

Daniela Ondra C
Residente Obra — Residente Interventoría
06/12/2025
Continuación con el figurado de acero para las estructuras de soporte y refuerzo de las áreas intervenidas

Daniela Ondra C
Residente Obra — Residente Interventoría
08/12/2025
Inicio de nuevas demoliciones no contempladas inicialmente, necesarias para la redistribución de espacios solicitada por el Ministerio

Daniela Ondra C
Residente Obra — Residente Interventoría
09/12/2025
Labores de pegue de bloque para el cerramiento perimetral y adecuación de muros internos.

Residente Obra — Daniela Onatra C
Residente Interventoría

10/12/2025

Ajustes en la mampostería interna para cumplir con la nueva configuración de áreas del puesto de salud.

Residente Obra — Daniela Onatra C
Residente Interventoría

11/12/2025

Finalización de amarres de acero y preparación para vaciado en los frentes de cimentación del cerramiento.

Residente Obra — Daniela Onatra C
Residente Interventoría

12/11/2025

Verificación de áreas adicionales. Se registra un retraso acumulado del 15% debido a la carga extra de trabajo por los cambios de diseño.

Daniela Onatra C.
Residente Obra Residente Interventoría.
13/12/2025
Inicio de las labores de retiro de la estructura de techo existentes. Se reportan precauciones por condiciones climaticas.

Daniela Onatra C.
Residente Obra Residente Interventoría
15/12/2025
Se registra una disminucion critica en el ritmo de obra debido al inicio de un paro armado departamental en el caqueta, limitado el transporte y la movilidad

Daniela Onatra C.
Residente Obra Residente Interventoría
16/12/2025
Pese a las restricciones, Se logra avanzar en la construcción del muro

de cerramiento con material disponible en el sitio. el muro tiene una altura de 90 cm.

Residente Obra — Daniela Ovalra C. Residente Interventoría

17/12/2025

No hay ingreso de perfilería para techos debido a los bloqueos del paro armado. El personal se concentra en el levante de muros de cerramiento

Residente Obra — Daniela Ovalra C. Residente Interventoría

18/12/2025

Ante la imposibilidad de terminar en la vigencia 2025 por los retrasos acumulados y el paro, Se tramita la suspención del contrato hasta el 13 de enero de 2026

Residente Obra — Daniela Ovalra C. Residente Interventoría

19/12/2025

Inicio de labores de pintura anticorrosiva en los perfiles metálicos que servirán de soporte para la nueva cubierta

Residente Obra — Daniela Ovalle C. Residente Interventoría

20/12/2025

Continuación del levante del muro perimetral de cerramiento. Se mantienen los frentes de trabajo internos en adecuaciones menores

Residente Obra — Daniela Ovalle C. Residente Interventoría

22/12/2025

Labores de soldadura para las canastillas y cerchas que soportarán la cubierta galvanizada. Organización de materiales para el techado

Residente Obra — Daniela Ovalle C. Residente Interventoría

23 / 12 / 2025.

Se reporta la finalización de tramos del muro de cerramiento. Se realiza balance de obra previo a la solicitud de suspención por fin de vigencia

Residente Obra

Daniela Onatra C.
Residente Interventoría

ACTA PARCIAL No 002
PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL	CANT		CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				33,995,622.00				3,754,643.00	- 3,422,818.00		-		34,327,445.00				34,327,445.00
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5.00	32,866.00	164,330.00	-	-	-	-	-		-	5.00	164,330.00	-	-	5.00	164,330.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	255.85	62,219.00	15,918,731.00	-	-	- 51.63	-	- 3,212,367.00		-	204.22	12,706,364.00	-	-	204.22	12,706,364.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	154.83	33,225.00	5,144,227.00	+	43.06	-	1,430,669.00	-		-	197.89	6,574,895.00	-	-	197.89	6,574,895.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	154.83	38,190.00	5,912,958.00	+	49.43	-	1,887,732.00	-		-	204.26	7,800,689.00	-	-	204.26	7,800,689.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	31.74	30,009.00	952,486.00	+	0.55	-	16,505.00	-		-	32.29	968,991.00	-	-	32.29	968,991.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	48.76	28,401.00	1,384,833.00	-	-	- 7.41	-	- 210,451.00		-	41.35	1,174,381.00	-	-	41.35	1,174,381.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	54.84	33,225.00	1,822,059.00	+	2.66	-	88,378.00	-		-	57.50	1,910,438.00	-	-	57.50	1,910,438.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	2.00	54,836.00	109,672.00	+	1.00	-	54,836.00	-		-	3.00	164,508.00	-	-	3.00	164,508.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	90.00	23,044.00	2,073,960.00	-	-	-	-	-		-	90.00	2,073,960.00	-	-	90.00	2,073,960.00
1.10	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	4.53	77,181.00	349,630.00	+	2.61	-	201,442.00	-		-	7.14	551,072.00	-	-	7.14	551,072.00
1.11	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	4.53	35,924.00	162,736.00	+	2.09	-	75,081.00	-		-	6.62	237,817.00	-	-	6.62	237,817.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
2	**CONCRETOS**				**32,517,211.00**				**7,098,952.00**	**- 3,839,680.00**		**409,086.00**	**-**	**35,777,263.00**	**-**	**-**		**35,777,263.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	159.06	154,372.00	24,554,410.00	+	36.80	-	5,680,890.00	-	2.65	409,086.00	195.86	30,235,300.00	-	-	195.86	30,235,300.00
2.02	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND	1.00	786,957.00	786,957.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	786,957.00	-	-	1.00	786,957.00
2.03	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	4.00	218,334.00	873,336.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00	873,336.00	-	-	4.00	873,336.00
2.04	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2	1.56	311,790.00	486,392.00	-	-	- 0.00	-	- 779.00	-	-	1.56	486,392.00	-	-	1.56	486,392.00
2.05	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO. INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG	68.16	19,546.00	1,332,255.00	+	72.55	-	1,418,062.00	-	-	-	140.71	2,750,318.00	-	-	140.71	2,750,318.00
2.06	VIGA AEREA DE 0.25X0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.	ML	2.50	257,984.00	644,960.00	-	-	-	-	-	-	-	2.50	644,960.00	-	-	2.50	644,960.00
2.07	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	25.03	153,372.00	3,838,901.00	-	-	- 25.03	-	- 3,838,901.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**34,850,355.00**				**9,161,759.00**	**- 2,988,132.00**	**-**	**21,751,409.00**	**-**	**21,751,409.00**	**-**	**19,272,573.00**		**41,023,982.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	36.42	75,960.00	2,766,463.00	+	42.16	-	3,202,474.00	-	78.58	5,968,937.00	78.58	5,968,937.00	-	-	78.58	5,968,937.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	72.84	49,975.00	3,640,179.00	+	5.74	-	286,857.00	-	78.58	3,927,036.00	78.58	3,927,036.00	-	-	78.58	3,927,036.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	59.02	129,190.00	7,624,794.00	-	-	- 17.01	-	- 2,197,522.00	-	-	-	-	42.01	5,427,272.00	42.01	5,427,272.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	61.49	36,157.00	2,223,294.00	+	96.19	-	3,477,942.00	-	157.68	5,701,236.00	157.68	5,701,236.00	-	-	157.68	5,701,236.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	185.24	41,028.00	7,600,027.00	-	-	- 19.27	-	- 790,610.00	150.00	6,154,200.00	150.00	6,154,200.00	15.97	655,217.00	165.97	6,809,417.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1.886.044.345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	188.06	42,735.00	8,036,744.00	+	50.49	-	2,157,690.00	-		-	-	-	238.55	10,194,434.00	238.55	10,194,434.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	69.20	42,758.00	2,958,854.00	+	0.86	-	36,796.00	-		-	-	-	70.06	2,995,650.00	70.06	2,995,650.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**138,342,058.00**				**4,355.00**	**- 44,029,108.00**		**21,393,651.00**	-	**83,397,254.00**		**10,920,051.00**		**94,317,305.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	483.12	138,830.00	67,071,550.00	-	-	- 243.18	-	- 33,760,679.00	8.00	1,110,640.00	239.94	33,310,870.00	-	-	239.94	33,310,870.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	281.44	135,775.00	38,212,516.00	-	-	- 63.54	-	- 8,627,144.00	8.44	1,145,941.00	217.90	29,585,373.00	-	-	217.90	29,585,373.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	20.13	67,723.00	1,363,264.00	+	0.01	-	677.00	-		-	20.14	1,363,941.00	-	-	20.14	1,363,941.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	40.26	183,898.00	7,403,733.00	+	0.02	-	3,678.00	-		-	-	-	40.28	7,407,411.00	40.28	7,407,411.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80	39,312.00	817,690.00	-	-	-	-	-		-	-	-	20.80	817,690.00	20.80	817,690.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	208.52	112,571.00	23,473,305.00	-	-	- 14.58	-	- 1,641,285.00	170.00	19,137,070.00	170.00	19,137,070.00	23.94	2,694,950.00	193.94	21,832,020.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**35,438,333.00**				**10,545,575.00**	**- 1,478,178.00**		**25,732,000.00**	-	**38,165,773.00**		**6,339,955.00**		**44,505,728.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	154.76	69,323.00	10,728,427.00	+	24.60	-	1,705,346.00	-	-	-	179.36	12,433,773.00	-	-	179.36	12,433,773.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD	M2	154.76	128,660.00	19,911,422.00	+	68.71	-	8,840,229.00	-	200.00	25,732,000.00	200.00	25,732,000.00	23.47	3,019,650.00	223.47	28,751,650.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	115.76	41,452.00	4,798,484.00	-	-	- 35.66	-	- 1,478,178.00		-	-	-	80.10	3,320,305.00	80.10	3,320,305.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**36,189,373.00**				**15,527,206.00**	**- 4,383,280.00**		**33,672,330.00**	-	**33,672,330.00**		**13,660,996.00**		**47,333,326.00**
6.01	6 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	7.35	1,035,624.00	7,611,836.00	+	3.19	-	3,303,641.00	-	10.54	10,915,477.00	10.54	10,915,477.00	-	-	10.54	10,915,477.00
6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	20.99	1,293,003.00	27,140,133.00	-	-	- 3.39	-	- 4,383,280.00	17.60	22,756,853.00	17.60	22,756,853.00	-	-	17.60	22,756,853.00
6.03	1 Puerta En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	1.33	1,080,775.00	1,437,404.00	+	11.31	-	12,223,565.00	-	-	-	-	-	12.64	13,660,996.00	12.64	13,660,996.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**28,542,806.00**				**2,876,449.00**	**- 168,214.00**		**5,717,443.00**	-	**5,717,443.00**		**25,533,598.00**		**31,251,041.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor. en Cable Monofasico Encauchetado No 8. Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	30.00	156,698.00	4,700,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	4,700,940.00	30.00	4,700,940.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2.40m.	UND	1.00	1,048,233.00	1,048,233.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,048,233.00	1.00	1,048,233.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1.886.044.345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	814,573.00	814,573.00	-	-	-	-	-	1.00	814,573.00	1.00	814,573.00	-	-	1.00	814,573.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	32.00	199,160.00	6,373,120.00	+	4.00	-	796,640.00	-	-	-	-	-	36.00	7,169,760.00	36.00	7,169,760.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS)	UND	33.00	163,429.00	5,393,157.00	+	5.00	-	817,145.00	-	30.00	4,902,870.00	30.00	4,902,870.00	8.00	1,307,432.00	38.00	6,210,302.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC)	UND	6.00	168,214.00	1,009,284.00	-	-	- 1.00	-	- 168,214.00	-	-	-	-	5.00	841,070.00	5.00	841,070.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	773,886.00	773,886.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	773,886.00	1.00	773,886.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS,	ML	5.00	125,182.00	625,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	625,910.00	5.00	625,910.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**+/-**	**MAY (+)**	**MEN (-)**	**MAY (+)**	**MEN (-)**	**CANT**	**SUBTOTAL**			**CANT**	**SUBTOTAL**		
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	788,903.00	788,903.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	788,903.00	1.00	788,903.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	70,148.00	7,014,800.00	+	18.00	-	1,262,664.00	-	-	-	-	-	118.00	8,277,464.00	118.00	8,277,464.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**29,517,685.00**				**4,251,224.00**	**- 23,966.00**	-	-	-	**15,219,384.00**	-	**18,525,559.00**		**33,744,943.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES. HERRAJES EN	ML	4.20	2,212,207.00	9,291,269.00	+	0.65	-	1,437,935.00	-		-	-	-	4.85	10,729,204.00	4.85	10,729,204.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	683,090.00	1,366,180.00	+	1.00	-	683,090.00	-		-	-	-	3.00	2,049,270.00	3.00	2,049,270.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **LA ESPERANZA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	8.00	391,827.00	3,134,616.00	-	-	-	-	-		-	-	-	8.00	3,134,616.00	8.00	3,134,616.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	893,899.00	893,899.00	-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	893,899.00	1.00	893,899.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	16.00	73,236.00	1,171,776.00	+	5.00	-	366,180.00	-		-	21.00	1,537,956.00	-	-	21.00	1,537,956.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	17.00	91,076.00	1,548,292.00	+	1.00	-	91,076.00	-	-	-	18.00	1,639,368.00	-	-	18.00	1,639,368.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2.00	164,156.00	328,312.00	+	1.00	-	164,156.00	-	-	-	3.00	492,468.00	-	-	3.00	492,468.00
8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1.00	1,074,233.00	1,074,233.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,074,233.00	-	-	1.00	1,074,233.00
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	57.67	38,063.00	2,195,093.00	+	4.33	-	164,813.00	-		-	62.38	2,374,370.00	- 0.38	- 14,464.00	62.00	2,359,906.00
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	40.77	74,289.00	3,028,763.00	+	14.79	-	1,099,079.00	-		-	48.00	3,565,872.00	7.56	561,970.00	55.56	4,127,842.00
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	617,223.00	617,223.00	-	-	-	-	-		-	1.00	617,223.00	-	-	1.00	617,223.00
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1.00	804,497.00	804,497.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	804,497.00	-	-	1.00	804,497.00
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	21.48	49,930.00	1,072,496.00	-	-	- 0.48	-	- 23,966.00	-	-	21.01	1,049,029.00	- 0.01	- 499.00	21.00	1,048,530.00
8.14	Construcción de Caja de Inspección de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	803,452.00	1,606,904.00	-	-	-	-	-		-	2.00	1,606,904.00	-	-	2.00	1,606,904.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4.34	48,979.00	212,569.00	+	5.00	-	244,895.00	-	-	-	9.34	457,464.00	-	-	9.34	457,464.00
8.16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und	1.00	1,171,563.00	1,171,563.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,171,563.00	1.00	1,171,563.00
9	ITEMS NO PREVISTOS				-				7,112,400.00	-		1,294,800.00	-	7,112,400.00	-	-		7,112,400.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMUADO ACTAS		POR COBRAR		CANT ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
NP-01	VIGA CINTA EN CONCRETO DOSIFICACIÓN 1:2:3 DE 0,12X0,20 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		192,000.00	-	+	30.30	-	5,817,600.00	-		-	30.30	5,817,600.00	-	-	30.30	5,817,600.00
NP-02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,2 X 0,10m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML		130,000.00	-	+	9.96	-	1,294,800.00	-	9.96	1,294,800.00	9.96	1,294,800.00	-	-	9.96	1,294,800.00
											-	-		-	-	-		-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**369,393,433.00**				**60,333,375.00**	**- 60,333,375.00**	**% EJE ACTA 2**	**109,970,719.00**	**% ACUM**	**275,140,701.00**	**POR COBRA**	**94,252,732.00**		**369,393,433.00**
	ADMINISTRACION			**28.23%**	**104,279,766.00**				**17,032,112.00**	**- 17,032,112.00**	-	**31,044,734.00**		**77,672,220.00**	-	**26,607,546.00**		**104,279,766.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,693,934.00**				**603,334.00**	**- 603,334.00**	-	**1,099,707.00**		**2,751,407.00**	-	**942,527.00**		**3,693,934.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**18,469,672.00**				**3,016,669.00**	**- 3,016,669.00**		**5,498,536.00**		**13,757,035.00**		**4,712,637.00**		**18,469,672.00**
	TOTAL OBRA				**495,836,805.00**				**80,985,490.00**	**- 80,985,490.00**	**29.77%**	**147,613,696.00**	**74.48%**	**369,321,363.00**	**25.52%**	**126,515,442.00**	**100.00%**	**495,836,805.00**

RESUMEN FINANCIERO LA ESPERANZA		
Valor Inicial Contrato:	$	**495,836,805.00**
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	**495,836,805.00**
Valor Acta No 001	$	**221,707,667.00**
Valor Acta No 002	$	**147,613,696.00**
Valor A Girar Acta No 002	$	**147,613,696.00**
Valor Acumulado Actas	$	**369,321,363.00**
% Ejecución Acumulado		**74.48%**
Saldo Por Ejecutar	$	**126,515,442.00**

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 002 FUE **REVISADA** Y **APROBADA** POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.**($147.613.696,00)** CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL **74.48%**. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DOS (2) DÍAS, DEL MES DE MARZO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	2,01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	M2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
TOMA DE MUESTRAS	3,47		3,42	1,00	11,87
WC	3,17		1,30	1,00	4,12
WC DISC	3,16		2,14	1,00	6,76
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3,16		3,40	1,00	10,74
SALA DE ESPERA	6,64		9,40	1,00	62,42
PLACA LAVADERO	2,14		1,70	1,00	3,64
	2,56		1,00	1,00	2,56
BODEGA	2,05		3,14	1,00	6,44
WC 2	1,30		2,05	1,00	2,67
CONSULTORIO VACUNACION	5,17		2,05	1,00	10,60
	4,20		0,98	1,00	4,12
	2,21		2,18	1.00	4,82
CONSULTORIO 2	4,25		2,06	1,00	8,76
	3,15		2,08	1,00	6,55
CONSULTORIO 1	4,29		3,16	1,00	13,56
CIRCULACION	5,60		0,96	1,00	5,38
INGRESO	3,15		1,00	1,00	3,15
ANDEN POSTERIOR	8,74		1,00	1,00	8,74
ANDEN FRONTAL	9,19		0,90	1,00	8,27
	6,49		0,90	1,00	5,84
	0,92		0,50	1,00	0,46
	2,23		1,98	1,00	4,42

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**195,86**
COBRO ACTA N.1	193,21
ACTA N.2	**2,65**
TOTAL CONTRACTUAL	159,06

Elaboró

FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló


RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	2.01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**Unidad Medida**	M2	

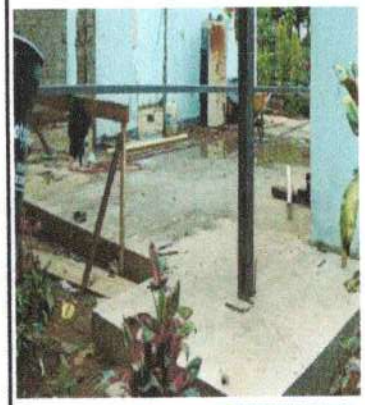





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
TOMA DE MUESTRAS	3,47		3,42	1,00	11,87
WC	3,17		1,30	1,00	4,12
WC DISC	3,16		2,14	1,00	6,76
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3,16		3,40	1,00	10,74
SALA DE ESPERA	6,64		9,40	1,00	62,42
PLACA LAVADERO	2,14		1,70	1,00	3,64
	2,56		1,00	1,00	2,56
BODEGA	2,05		3,14	1,00	6,44
WC 2	1,30		2,05	1,00	2,67
CONSULTORIO VACUNACION	5,17		2,05	1,00	10,60
	4,20		0,98	1,00	4,12
	2,21		2,18	1,00	4,82
CONSULTORIO 2	4,25		2,06	1,00	8,76
	3,15		2,08	1,00	6,55
CONSULTORIO 1	4,29		3,16	1,00	13,56
CIRCULACION	5,60		0,96	1,00	5,38
INGRESO	3,15		1,00	1,00	3,15
ANDEN POSTERIOR	8,74		1,00	1,00	8,74
ANDEN FRONTAL	9,19		0,90	1,00	8,27
	6,49		0,90	1,00	5,84
	0,92		0,50	1,00	0,46
	2,23		1,98	1,00	4,42

TOTAL DE ACTIVIDAD	**195,86**
COBRO ACTA N.1	193,21
ACTA N.2	**2,65**
TOTAL CONTRACTUAL	159,06

OBSERVACIONES:

Elaboró
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**Unidad Medida**	M2	





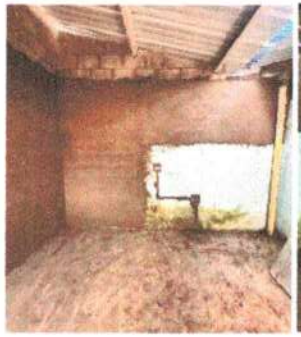


Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
MURO CONSUL 1 Y 2	1,10	2,00		1,00	2,20
CONSULTORIO	1,00	3,00		1,00	3,00
WC CONTIGUO A LA	0,52	2,00		1,00	1,04
	1,00	2,76		1,00	2,76
	2,04	2,76		1,00	5,63
BODEGA	0,80	2,00		2,00	3,20
TOMA DE MUESTRAS	3,16	0,20		1,00	0,63
WC DIS	3,02	3,16		1,00	9,54
	3,16	2,60		1,00	8,22
PUERTA	1,00	2,00		- 1,00	- 2,00
CONSULTORIO	3,40	2,90		1,00	9,86
	3,40	0,50		1,00	0,85
	3,40	3,40		1,00	11,56
	3,40	0,20		1,00	0,68
VENTANA	1,80	1,00		- 1,00	- 1,80
PUERTA	0,98	2,00		- 1,00	- 1,96
	2,01	1,1		2	2,21
MURO LAVADERO	5,44	1,00		1,00	5,44
	1,37	1,00		1,00	1,37
CUARTO DE RESIDUOS	2,18	2,76		1,00	6,02
	2,10	2,76		1,00	5,80
	1,46	2,76		1,00	4,03
PUERTA	0,98	2,00		- 1,00	- 1,96
LUCETA	1,30	0,50		- 1,00	- 0,65
VENTANA	1,09	0,85		1,00	0,93
FACHADA POSTERIOR	9,95	0,20		1,00	1,99

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**78,58**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**78,58**
TOTAL CONTRACTUAL	72,84

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE RESIDUOS	6,06	2,60		1,00	15,76
	1,00	0,85		1,00	0,85
WC1	7,94	0,80		1,00	6,35
	1,00	0,80		1,00	
WC2	5,70	0,80		1,00	4,56
	1,00	0,80		1,00	0,80
PMR	9,60	0,80		1,00	7,68
	1,00	0,80		1,00	0,80
BODEGA	9,38	2,60		1,00	24,39
	1,00	0,80		1,00	0,80
CIRCULACION 1	11,78	3,00		1,00	35,34
SALA DE ESPERA	20,25	3,00		1,00	60,75
VENTANA PMR	1,00	0,40		- 1,00	- 0,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**157,68**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	**157,68**
TOTAL CONTRACTUAL	61,49

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**		CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**		FLORENCIA	
CAPITULO	MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA		**Unidad Medida**	M2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	AREA		
FACHADA FRONTAL	8,21	2,50		1,00	20,53
	3,47	2,50		1,00	8,68
VENTANAS	1,30	0,40		- 1,00	- 0,52
	2,10	1,10		- 3,00	- 6,93
FACHADA POSTERIOR	8,21	2,50		1,00	20,53
MURO LAVADERO	6,81	1,00		1,00	6,81
VENTANAS	2,10	0,56		- 1,00	- 1,18
	1,90	1,10		- 2,00	- 4,18
	1,28	0,40		- 1,00	- 0,51
FACHADA LAT IZQ	7,90	2,69		2,00	42,50
PUERTAS	1,00	2,15		- 1,00	- 2,15
FACHADA LAT DER	10,91	2,69		2,00	58,70
PUERTAS	1,00	2,15		- 4,00	- 8,60
VENTANAS	1,00	0,40		- 1,00	- 0,40
	1,80	1,15		- 1,00	- 2,07
CULATAS			4,48	3,00	13,44
			3,68	1,00	3,68
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3,40	2,90		1,00	9,86
	3,40	3,40		1,00	11,56
VENTANA	1,80	1,00		- 1,00	- 1,80
PUERTA	0,98	2,00		- 1,00	- 1,96
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**165,97**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**150,00**
TOTAL CONTRACTUAL	185,24

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	**Unidad Medida**	ml







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Correas Metalicas	20,14			11,00	221,54
	4,00			2,00	8,00
	10,40			1,00	10,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**239,94**
COBRO ACTA N.1	231,94
ACTA N.2	**8,00**
TOTAL CONTRACTUAL	483,12

Elaboró fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR



H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Cubierta	5,45		20,14	1,00	109,76
	4,95		20,14	1,00	99,69
	4,00		2,11	1,00	8,44
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES: Se plantean las Correas en pacha.

TOTAL DE ACTIVIDAD	**217,90**
COBRO ACTA N.1	209,46
ACTA N.2	**8,44**
TOTAL CONTRACTUAL	281,44

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR



H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ANDEN FRONTAL	9,19		0,90	1,00	8,27
	6,49		0,90	1,00	5,84
	0,92		0,50	1,00	0,46
ZONA 1	10,91		3,47	1,00	37,86
ZONA 2	10,19		7,90	1,00	80,50
SALA DE ESPERA	9,40		6,49	1,00	61,01

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**193,94**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**170,00**
TOTAL CONTRACTUAL	208,52

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES	**FECHA**	02 de marzo 2026		
ÍTEM	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	**Unidad Medida**	m2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ZONA 1	10,91		3,47	1,00	37,86
ZONA 2	10,19		7,90	1,00	80,50
SALA DE ESPERA	9,40		6,49	1,00	61,01
BODEGA	3,14		2,05	1,00	6,44
CUARTO DE RESIDUOS	2,08		1,30	1,00	2,70
PISO LAVADERO	1,15		2,60	1,00	2,99
	1,00		1,10	1,00	1,10
ANDEN FRONTAL	9,19		0,90	1,00	8,27
	6,49		0,90	1,00	5,84
	0,92		0,50	1,00	0,46
	2,23		1,98	1,00	4,42
ANDEN POSTERIOR	8,74		1,00	1,00	8,74
INGRESO	3,15		1,00	1,00	3,15
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**223,47**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**200,00**
TOTAL CONTRACTUAL	154,76

Elaboró
fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	6,01	Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**Unidad Medida**	M2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
BODEGA	0,98	2,15		1,00	2,11
CUARTO DE RESIDUOS	0,98	2,15		1,00	2,11
WC1	0,98	2,15		1,00	2,11
WC2	0,98	2,15		1,00	2,11
PMR	0,98	2,15		1,00	2,11
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**10,54**
COBRO ACTA N.1	**0,00**
ACTA N.2	**10,54**
TOTAL CONTRACTUAL	10,02

Elaboró
fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR



H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3		**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA		**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	6,02	Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.	**Unidad Medida**	M2	








Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
VENTANAS FRONTALES	2,10	1,20		3,00	7,56
	1,50	0,40		1,00	0,60
VENTANAS POSTERIOR	2,50	0,60		1,00	1,50
	1,35	0,48		1,00	0,64
	2,00	1,10		2,00	4,40
	2,00	1,20		1,00	2,40
VENTANA LATERAL DER	1,00	0,50		1,00	0,50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**17,60**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**17,60**
TOTAL CONTRACTUAL	23,44

Elaboró
Fabian Martnez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**1,00**
COBRO ACTA N.1	
ACTA N.2	1,00
TOTAL CONTRACTUAL	1,00
TOTAL ACTIVIDAD	**2,00**

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR



H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**Unidad Medida** UND






Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD			-	37,00	37,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**37,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**30,00**
TOTAL CONTRACTUAL	33,00

Elaboró
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

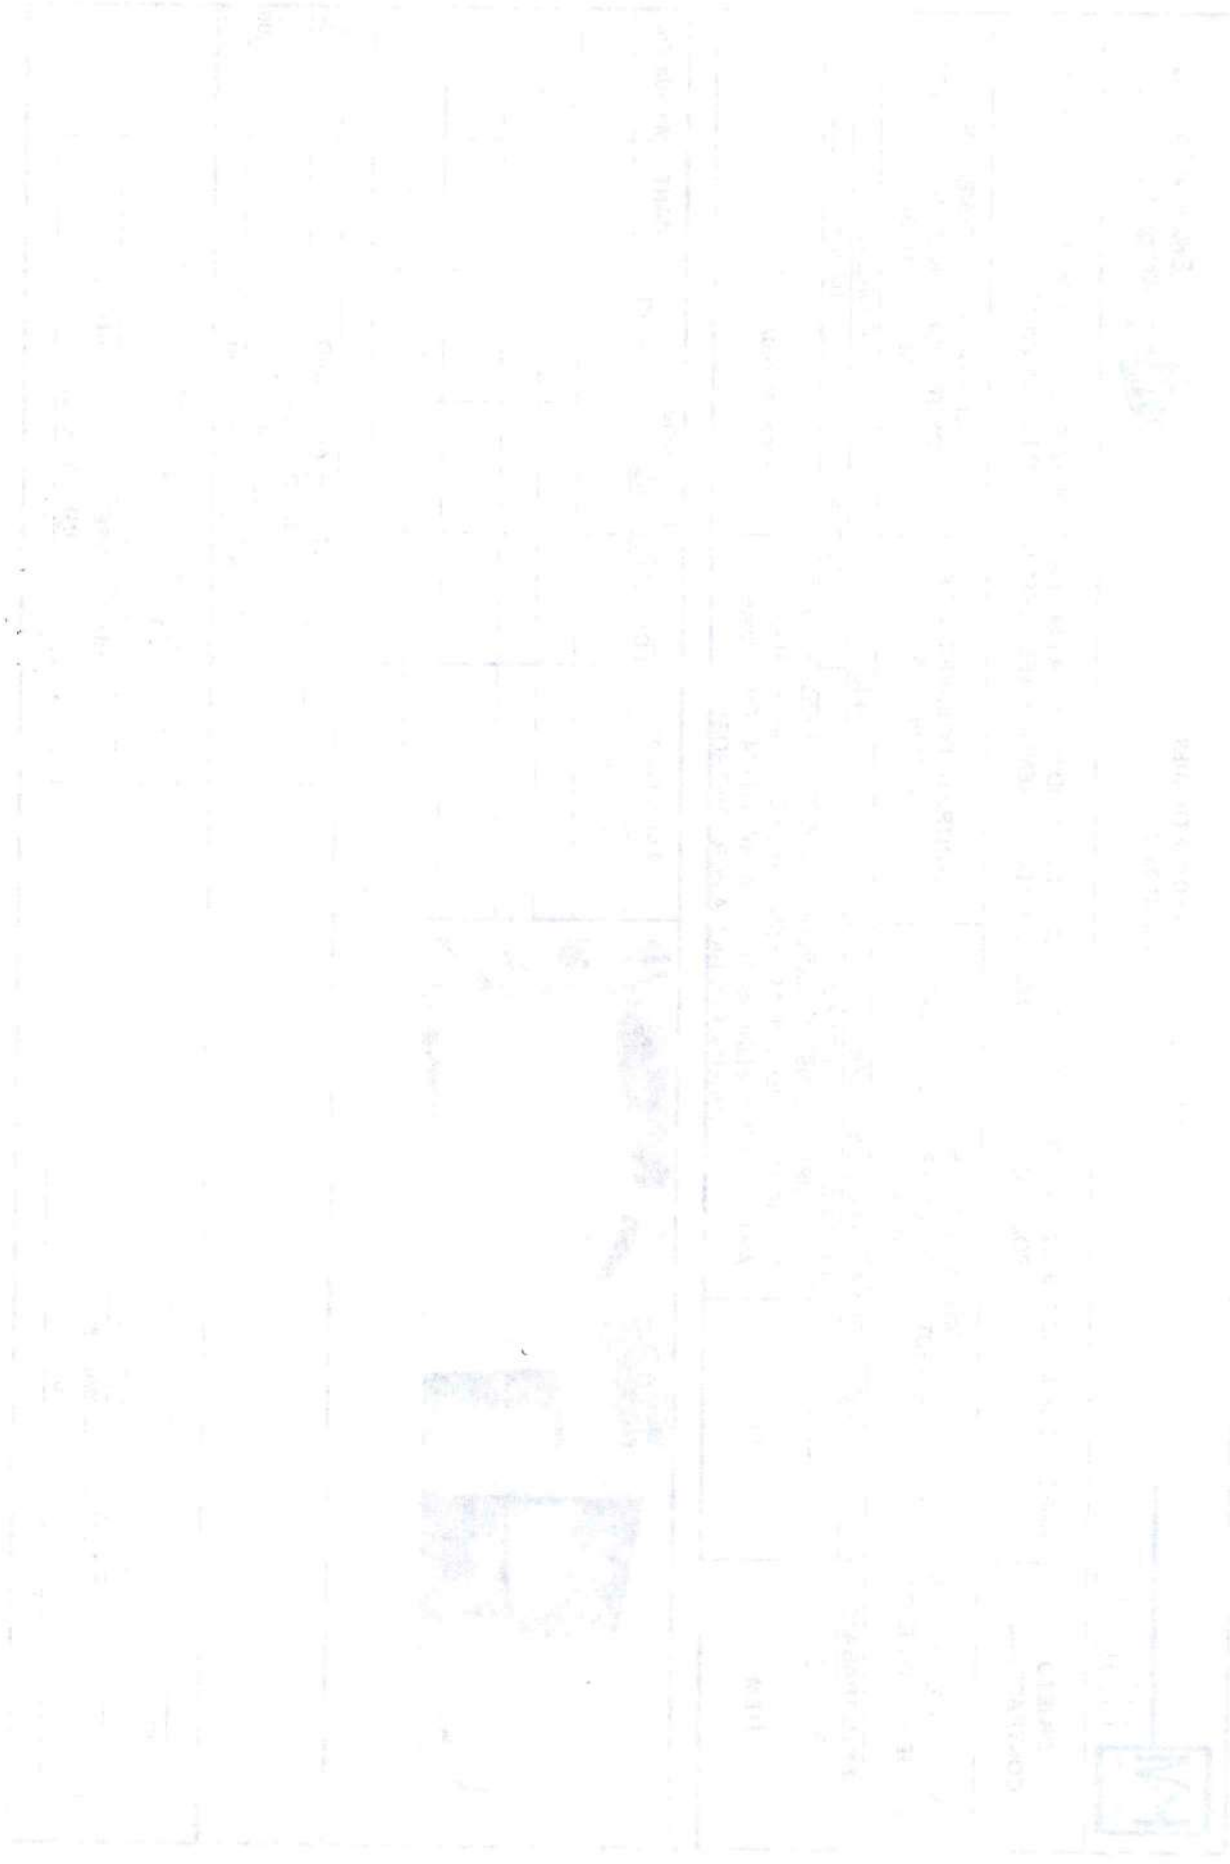

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA ESPERANZA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 NIT.901.994.584-2
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	NP2	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,2 X 0,10m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	**Unidad Medida** ML






Localización	Dimensiones			CANT	Medida Tota
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
VIGA CONFINAMIENTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	3,40			2,00	6,80
	3,16			1,00	3,16

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**9,96**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**9,96**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró
Fabian Martinez
FABIAN MARTINEZ MARTINEZ
Residente de Obra

Avaló
RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO
INTERVENTOR

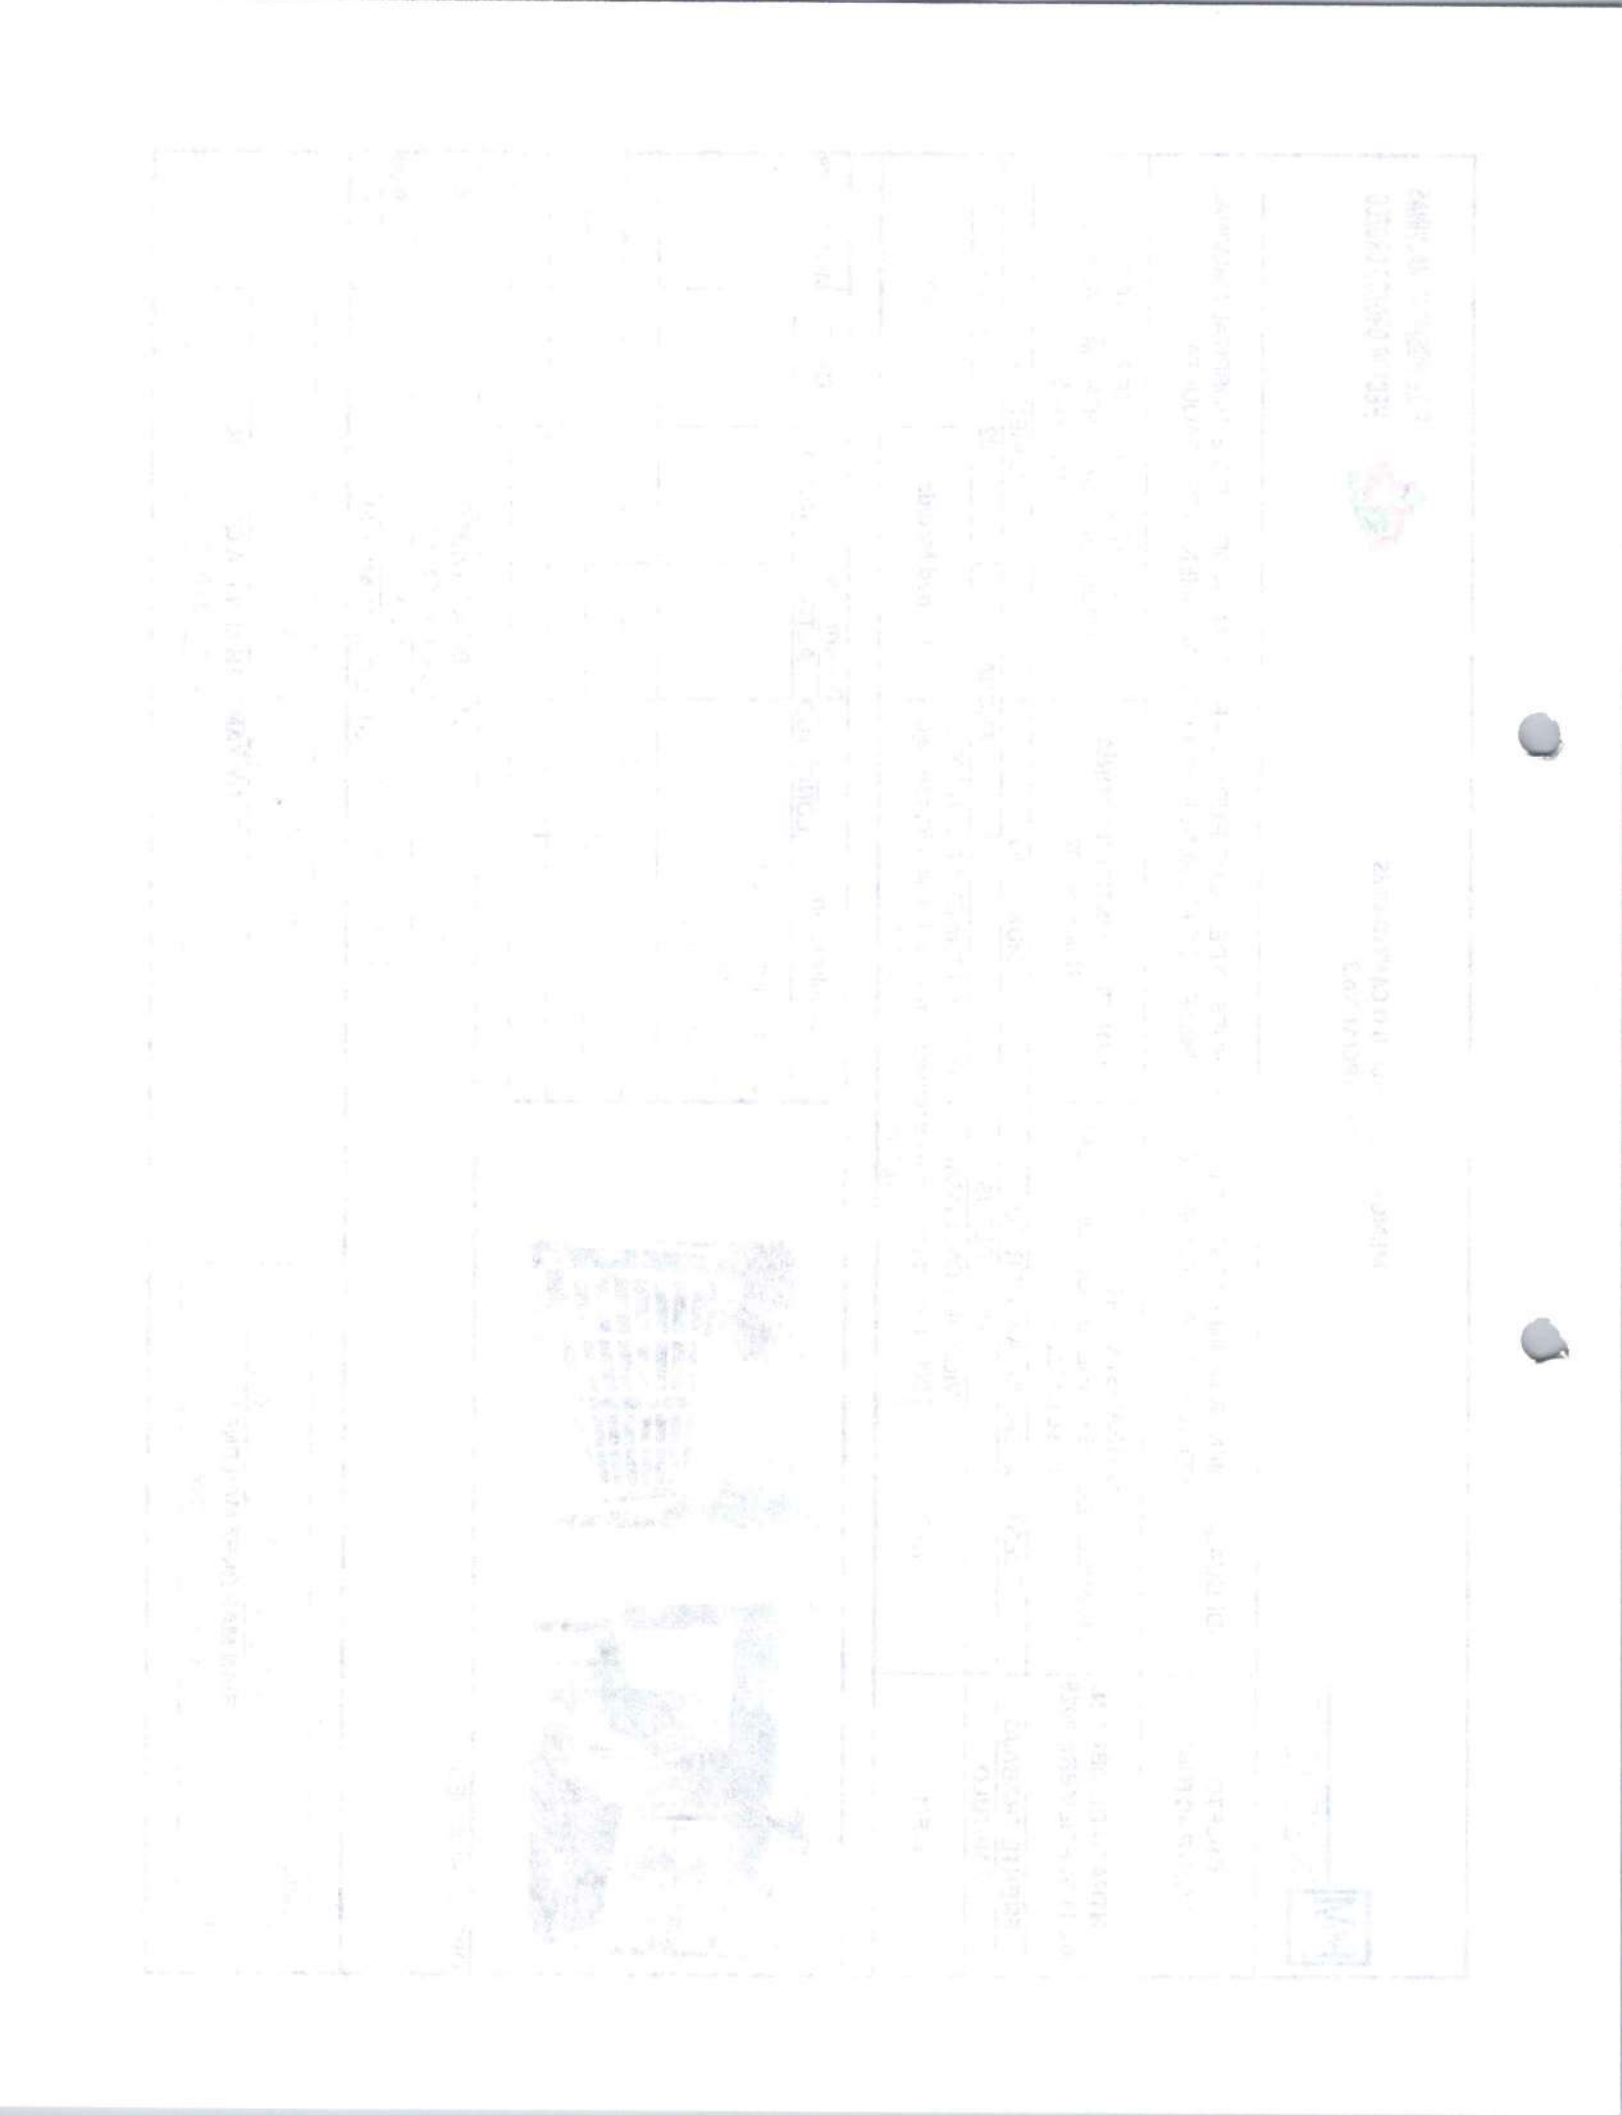

BITÁCORA LA ESPERANZA

Email: oficinah2m@hotmail.com
CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

Contrato de obra N° 002 2025 11/sept/2025

Contratante: Ese Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco

Contratista de obra: H2H Arquitectos e ingenieros Zomac S.A.S. (H2MAE)

Contratista de interventoria: Unión Temporal Inter Malvinas 25.

Puesto de Salud la Esperanza Florencia

Acta de inicio: 06 octubre 2025

Residente de obra:

Residente de interventoria:

Scanned with CamScanner

Lunes, 06 octubre 2025

Se Firma acta de inicio de actividades y revisión Preliminar de documentación técnica

Residente de obra — Residente de interventoría

Cristian A Otavoz

Martes, 07 octubre 2025

Gestión de programación para la socialización comunitaria, también se realiza acercamiento con los líderes para coordinar convocatorias.

Cristian Otavoz
~~Residente obra~~ — Residente interventoría

Miercoles, 08 octubre 2025

Seguimiento de la logistica para la socialización Presencial, tambien se realiza solicitud y verificación de disponibilidad de materiales

Cristian A Otavoz
~~Residente de obra~~ — ~~Residente de interventoría~~

Jueves, 09 Octubre 2025

Ajuste en el cronograma interno debido a no ejecución de labores, comunicación con el contratante para definir fecha socialización

Cristian Otavoz
~~Residente obra~~ — ~~Residente interventoría~~

Viernes, 10 octubre 2025

Continuación de actividades administrativas a la espera de la socialización y gestión


Scanned with CamScanner

de proveedores sobre tiempo estimado de entrega de materiales Residente obra Residente int.

Sábado, 11 octubre 2025

Revisión técnica de planos y de especificaciones en oficinas y planeación de actividades a ejecutar posterior a la socialización.


Cristian Otavoz
Residente de obra



Domingo, 12 octubre 2025

No se realizan actividades


Cristian A Otavoz
Residente de obra



Lunes; 13 octubre 2025

Actividades administrativas en espera de autorización para inicio efectivo y seguimiento a disponibilidad de mano de obra local.


Cristian A Otavoz
Residente de obra



Martes, 14 octubre 2025

Consolidación de documentos para la presentación a la comunidad e impresión de planos y contratos.

Residente de obra
Cristian A Otavoz



Scanned with CamScanner

Miercoles, 15 octubre 2025

Se realiza coordinación operativa para la jornada de socialización del día siguiente con el acompañamiento de interventoría y contratista ESE MALLINAS Residente obra ~~R. Interv~~

Jueves, 16 octubre 2025

Realización de la socialización formal del proyecto con la comunidad, levantamiento de observaciones y aweros para el inicio de actividades de obra.

Cristian A Otavot
Residente obra

Residente interventoría

Viernes, 17 octubre 2025.

Coordinación preliminar con el contiratista de interventoría para definir la logística administrativa de inicio de obra

Cristian A Otavot
Residente de obra

Residente de interventoría

Sábado, 18 octubre 2025

Gestión administrativa para la organización del equipo técnico y administrativo y verificación de mano de obra local

Cristian A Otavot
Residencia obra

Residente interventoría

Scanned with CamScanner

Domingo, 19 octubre 2025
No se ejecuta actividades
Cristian A Otavoz
Residente obra
Residente interventoria

Lunes, 20 octubre 2025
Continuación del proceso de vinculación de mano de obra local (oficial y ayudantes) Inicio de tramite de afiliaciones.
Cristian A Otavoz
Residente obra
Residente interventoria

Martes, 21 octubre 2025.
Gestión administrativa para formalización de documentos del personal.

Residente obra Residente interventoria

Miercoles, 22 octubre 2025
Organización interna de observaciones técnicas y administrativas presentadas en campo.
Cristian A Otavoz
Residente obra
Residente interventoria

Jueves, 23 octubre 2025
Se continua con los gestiones de planeación logistica, administrativa y operativa para inicio.
Cristian A Otavoz
Residente de obra
Residente interventoria

Scanned with CamScanner

Viernes, 24 octubre 2025

Se presenta dificultades en la disponibilidad de personal local para la ejecución de actividades. Por tal razón, se coordina gestionar traslado de personal desde la zona urbana.

Cristian A Otavot
Residente obra

Residente interventoría

Sabado, 25 octubre 2025

Continuación de gestiones para organizar el equipo de trabajo en campo. seguimiento a disponibilidad de perfiles, cubierta y material pétreo.

Cristian A Otavot
Residente obra

Residente interventoría

Domingo 26 octubre 2025

NO se ejecuta actividades

Cristian A Otavot
Residente obra

Residente interventoría

lunes 27 octubre 2025

Avance en la planeacion operativa para reorganizar frents de trabajo segun la disponibilidad de insumos. Se realiza gestión de alternativas de transporte debido a las restricciones del Paro Agropero.

Cristian A Otavot
Residente obra

Residente interventoría

Scanned with CamScanner

Martes,	28 octubre 2025 Seguimiento al pedido de perfiles y cubierta afectados por el agotamiento de materiales en el departamento. Se coordina el traslado del personal contratado hacia la zona rural. Cristian ADtavoz Residente obra Residente interventoría.
Miercoles	29 octubre 2025. Confirmación de entrega del material pétreo programado para el 31 octubre por disponibilidad de cantera. Cristian ADtavoz Residente de obra Residente interventoría.
Jueves	30 octubre 2025 Se recibe material petreos. Cristian ADtavoz Residente obra Residente interventoría
Viernes	31 octubre 2025 Actividades: Inicio administrativo y contratación de personal Se realizó la contratación formal del personal operativo y el proceso de ingreso legal. Verifico afiliaciones a seguridad

Scanned with CamScanner

social y entrego EPP para garantizar la seguridad en el frente de trabajo.

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria

01-11-2025
Actividades: Socialización y logistica de seguridad.
Se realizo la socalización de los actividades con el equipo de trabajo y el personal del centro de salud. Establezco las rutas de evacuación de escombros para no inferir con la operación hospitalaria.

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria

02/11/2025
No se trabaja día de descanso dominical

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría.

Scanned with CamScanner

03 / 11 / 2025

Actividades: Inicio de desmonte de carpintería metalico.

Se realizo desmonte de marcos y ventanas metálicos existentes. Inicio el acopio de material recuperable y la demolición controlada de muros no estructurales en áreas comunes.

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria.

04/11/2025

Actividades: Demolición de áreas comunes. Se continuó con la remoción de elementos arquitectónicos en zonas comunes. Detecta posibles demoras en el suministro de materiales regionales y activo plan de contingencia logística.

Cristian A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

05/11/2025

Actividades: Limpieza y retiro de escombros.

Se Coordino el retiro manual de escombros para mantener la higiene del área de salud. Se Supervizo que las áreas de trabajo queden despejados para el inicio de las fases de cimentación

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria

06/11/2025

Actividades: Cierre de semana preliminar Finalizo la primera fase de desmonte Refuerzo de la planificación operativa ante la interventoría para prevenir retrasos por falta de materiales en la región.

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

07/11/2025

Actividades: Demolición de pisos en sala de espera.
Inicio la demolición de los acabados de piso. Se evidencia que la dureza del material requiere mayor tiempo de ejecución del proyecto.

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente interventoría

08/11/2025

Actividades: Retiro de aparatos sanitarios. Superviso el desmonte de baterías sanitarias antiguas. Registro una limitación en la disponibilidad de mano de obra calificada en la zona, lo cual afecta el rendimiento diario.

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

10 / 11 / 2025

Actividades: Continuación de demoliciones generales.

Las actividades de desmonte se extienden por segunda semana consecutiva, superando los tiempos establecidos originalmente en el cronograma.

Cristian A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

11 / 11 / 2025

Actividades: Remoción de enchapes y limpieza

Se continúa con el desmonte de enchapes en muros. Se coordina el retiro de materiales sobrantes para liberar frentes de trabajo de cimentación

Cristian A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

12/11/2025

Actividades: Gestión de materiales de cimentación.

Se presentan retrazos críticos en la entrega de materiales requeridos para iniciar las etapas construtivas (cemento y agregados).

Cristian A Otavo2 — Residente Obra

Residente Interventoria

13/11/2025

Actividades: Balance de avance

Se repoita un avance ejecutado del 10%. frente al 25%. programado. El atraso del 15%. se atribuye a la falta de suministro oportuno y personal suficiente. implemento plan de choque con herramientas eléctricas para recuperar tiempo.

Cristián A Otavo2 — Residente Obra

Residente Interventoria

28/11/2025

Actividades: Excavación para zapata de tanque y red sanitaria.

Se inicio la excavación para la conexión de la red hidrosanitaria principal. Simultaneamente, Supervise la excavación para la zapata del tanque elevado y la fundición del concreto de limpieza.

Crishan A Olaya
Residente Obra

Residente Interventoría

29/11/2025

Actividades: Replanteo por visita del Ministerio de salud

Se ajusto cantidades de obra (bloque, tubería y concreto) debido a los cambios de diseño solicitados para alcanzar las condiciones ideales de atención.

Crishan A Olaya
Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

01/12/2025.

Actividades: Terminacion de placa de contrapiso.

Fundición de placa de contrapiso en áreas internas. Verifico que los niveles cumplan con la pendiente necesaria para el drenaje de las áreas hospitalarias.

Cristhan A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoría

02/12/2025

Se inicio el levante de muros con bloque N°4 para la batería Sanitaria y la rehubicación del cuarto de aseo y residuos, siguiendo el diseño actualizado.

Cristhan A. Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoría

03/12/2025

Actividades: Instalación de tubería adicional

Scanned with CamScanner

Se procede con la instalación de redes hidrosanitarias adicionales según las recomendaciones de la supervisión. Se dejo los espacios listos para la ejecución de las siguientes achvidades estructurales.

Crishan A Otavor — Residente Obra

Residente Interventoría

04 / 12 / 2025

El proyecto alcanza un 23% de avance real frente al 30% programado. Se ha realizado balance de cantidades para optimizar los recursos y asegurar la culminación en el plazo restante de 32 días.

Crishan A Otavor — Residente Obra

Residente Interventoría

05 / 12 / 2025

Achvidades: Conexion de tubería Sanitaria

Scanned with CamScanner

profunda.
Se realizo la conexión a la red de alcantarillado municipal a una profundidad de 1.90m. Se superviso el entibado y la seguridad del personal en la exlavación profunda.

Cristian A Ocavot
Residente Obra

Residente Interventoría

06/12/2025
Actividades: Armado de vigas de apoyo para cubierta.
Como obra adicional para mejorar el refuerzo de la cubierta, se ordeno el figurado de aceros para las vigas de apoyo de las correas.

Cristian A Ocavot
Residente Obra

Residente Interventoría

08/12/2025
Actividades: Fundición de vigas de apoyo

Scanned with CamScanner

Se aprovecho la jornada festiva para fundir las vigas de soporte de los correas. Se reporta retraso en la llegada de la cubierta por temas de logística de transporte.

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

09/12/2025

Actividades: Fundicion de cajas de inspección.

Se realizo fundicion de las cajas de inspección sanitaria y el inicio de la demolicion de muros para el consultorio odontologico.

Crishan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

10/12/2025

Actividades: Refuerzo de concreto en áreas existentes.

Scanned with CamScanner

Se aplico concreto de refuerzo para consolidar áreas preexistentes con la nueva intervención. Se proyecta un avance adicional del 10%. para el cierre de la jornada.

Cristian A Otavot
Residente Obra

Residente Interventoría

11/12/2025
Al cierre de hoy registramos un 38%. de avance real frente al 50%. programado. El atraso del 12%. se debe a la demora en la entrega de la cubierta, aunque la estructura de apoyo ya está lista. Nos restan 25 días para finalizar.

Cristian A Otavot
Residente Obra

Residente Interventoría

12/12/2025
Se registraron dificultades en el cronograma debido al retraso en el suministro de perfilería, el transporte hacia la zona

Scanned with CamScanner

rural del proyecto se vió restringido por un paro a nivel departamental en el cagueta.

Cristian AOtavoz — Residente Obra
Residente Interventoría
13/12/2025

Se registraron dificultades en el cronograma debido al retraso en el suministro de perfilería. Pero se realizaron labores de preparación para el apoyo estructural de correas de la cubierta.
Continúó la afectación por el paro armado, limitando el acceso de materiales e insumos necesarios para el levantamiento de muros

Cristian AOtavoz — Residente Obra
Residente Interventoría.
15/12/2025

Se (continuo) ejecutó la fundación de cinta cuelato.

Scanned with CamScanner

Se construyeron tres (3) elementos de sección 13*20cm para servir como apoyo estructural.
Se dio inicio a la instalación de pañetería metálica de acuerdo con los planos del proyecto.

Crishan A. Otavoz — Residente Obra
Residente Interventoría
16/12/2025

Se realizaron trabajos de adecuación técnica para las áreas internas del puesto de salud.
Se preparó el terreno para la fundición de concreto en zonas específicas de atención.

Crishan A Otavoz — Residente Obra
Residente Interventoría.
17/12/2025

Se realizó fundición del concreto de contrapiso en el consultorio odontológico
Se ejecutaron actividades como la

Scanned with CamScanner

fundición de placa en el área de lavatraperas, garantizando las condiciones técnicas de los siguientes etapas

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventor

18/12/2025

Se realizó la inspección de la viga de apoyo de las correas.
Se confirmó que el paro departamental fue levantado tras la concertación de términos, permitiendo el restablecimiento del tránsito vehicular.
Cierre del periodo con un avance real del 41% frente a un 70% programado.
Se formalizó la solicitud de suspensión del contrato para gestionar el trámite administrativo hacia la vigencia 2026.

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoría.

Scanned with CamScanner

19/12/2025.

Se realizaron actividades de instalación de perfilería en la cubierta del Puesto de salud. Sin embargo, el proceso se vio limitado por las constantes lluvias registradas en la zona, las cuales generaron imprevistos para las labores de soldadura en las estructuras.

Cristian A Otavo3 — Residente Obra

Residente Interventoría.

20/12/2025

Se continuó con la instalación de perfiles para la cubierta, buscando avanzar en actividades paralelas que no se vieran tan afectadas por el clima. A pesar de contar con el material en obra, las lluvias persistentes impidieron el desarrollo normal de las soldaduras de perfilería.

Cristian A Otavo3 — Residente Obra

Residente Interventoría

22/12/2025.

Se dio inicio a la instalación de cubierta propiamente dicha, con el objetivo de finalizar esta etapa al terminar la semana y así poder continuar con las actividades de mampostería programadas. Se mantuvo la supervisión sobre la perfilería instalada para asegurar el cumplimiento de los planos.

Cristhan A Otavo — Residente Obra

Residente Interventoría

23/12/2025.

Se prosiguió con la instalación de perfiles y los trabajos en la cubierta, alcanzando al cierre de la jornada un avance físico del 52% frente al 85% programado. La interventoría recomendó agilizar la construcción de muros e instalaciones eléctricas para recuperar el tiempo perdido por los factores climáticos

Scanned with CamScanner

Cristian A Otavoz.
Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

ACTA PARCIAL No 002
PUESTO DE SALUD NORCASIA

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				**25,117,715.00**				-	-		**8,500,085.00**		**24,842,986.00**		**274,729.00**		**25,117,715.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	2.00	31,642.00	63,284.00	-	-	-	-	-		-	2.00	63,284.00	-	-	2.00	63,284.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	119.41	60,470.00	7,220,723.00	-	-	-	-	-		-	119.41	7,220,723.00	-	-	119.41	7,220,723.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	91.16	32,175.00	2,933,073.00	-	-	-	-	-		-	91.16	2,933,073.00	-	-	91.16	2,933,073.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	55.79	36,895.00	2,058,372.00	-	-	-	-	-		-	55.79	2,058,372.00	-	-	55.79	2,058,372.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	28.17	28,959.00	815,775.00	-	-	-	-	-		-	28.17	815,775.00	-	-	28.17	815,775.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	11.92	27,352.00	326,036.00	-	-	-	-	-		-	11.92	326,036.00	-	-	11.92	326,036.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	15.48	32,175.00	498,069.00	-	-	-	-	-		-	15.48	498,069.00	-	-	15.48	498,069.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	und	3.00	52,561.00	157,683.00	-	-	-	-	-		-	3.00	157,683.00	-	-	3.00	157,683.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	90.00	22,519.00	2,026,710.00	-	-	-	-	-		-	90.00	2,026,710.00	-	-	90.00	2,026,710.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD NORCASIA	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
1.10	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	734.92	11,566.00	8,500,085.00	-	-	-	-	-	734.92	8,500,085.00	734.92	8,500,085.00	-	-	734.92	8,500,085.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1.00 m.	M3	2.15	77,181.00	165,939.00	-	-	-	-	-		-	2.15	165,939.00	-	-	2.15	165,939.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	2.15	35,924.00	77,237.00	-	-	-	-	-		-	2.15	77,237.00	-	-	2.15	77,237.00
1.13	DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE EXISTENTE.	ML	23.29	11,796.00	274,729.00	-	-	-	-	-		-	-	-	23.29	274,729.00	23.29	274,729.00
2	**CONCRETOS**				**53,110,702.00**				**1,340,895.00**	**- 10,201,112.00**		**4,954,125.00**		**21,434,655.00**		**22,815,831.00**		**44,250,486.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA	M2	115.83	149,823.00	17,353,998.00	-	-	- 5.73	-	- 858,486.00	-	-	110.00	16,480,530.00	0.10	14,982.00	110.10	16,495,512.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	117.85	148,823.00	17,538,791.00	+	9.01	-	1,340,895.00	-	-	-	-	-	126.86	18,879,686.00	126.86	18,879,686.00
2.03	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	19.40	148,823.00	2,887,166.00	-	-	- 9.59	-	- 1,427,213.00		-	-	-	9.81	1,459,954.00	9.81	1,459,954.00
2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	53.31	198,165.00	10,564,176.00	-	-	- 15.89	-	- 3,148,842.00	25.00	4,954,125.00	25.00	4,954,125.00	12.42	2,461,209.00	37.42	7,415,334.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
2.05	ZAPATA DE 0,60X0,60X0,25, INCLUYE DADO DE 0,20X0,20 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE PARRILLA INFERIOR EN 4 BARRAS DE 3/8" @0,15., INCLUYE PLATINA METALICA DE 2,5 mm CON BARRAS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUNDNIDAD 0.50M.	UND	9.00	529,619.00	4,766,571.00	-	-	- 9.00	-	- 4,766,571.00		-		-	-	-	0.00	-
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**35,241,857.00**				**18,345,389.00**	**- 12,131,230.00**	-	**10,696,480.00**		**10,696,480.00**	-	**30,759,535.00**		**41,456,015.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	38.60	73,861.00	2,851,035.00	+	120.98	-	8,935,704.00	-	80.00	5,908,880.00	80.00	5,908,880.00	79.58	5,877,858.00	159.58	11,786,738.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	106.12	47,876.00	5,080,601.00	+	70.22	-	3,361,853.00	-	100.00	4,787,600.00	100.00	4,787,600.00	76.34	3,654,854.00	176.34	8,442,454.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	44.39	126,916.00	5,633,801.00	-	-	- 30.03	-	- 3,811,287.00		-	-	-	14.36	1,822,514.00	14.36	1,822,514.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	31.73	34,933.00	1,108,424.00	+	150.76	-	5,266,499.00	-		-	-	-	182.49	6,374,923.00	182.49	6,374,923.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	176.31	39,803.00	7,017,667.00	+	19.63	-	781,333.00	-		-	-	-	195.94	7,799,000.00	195.94	7,799,000.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	133.52	41,511.00	5,542,549.00	-	-	- 7.52	-	- 312,163.00		-	-	-	126.00	5,230,386.00	126.00	5,230,386.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	49.59	41,708.00	2,068,300.00	-	-	- 49.59	-	- 2,068,300.00		-	-	-	-	-	0.00	-
3.08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral.	ML	15.71	378,070.00	5,939,480.00	-	-	- 15.71	-	- 5,939,480.00		-	-	-	-	-	0.00	-
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**104,337,854.00**				**12,713,346.00**	**- 26,256,054.00**	-	**35,798,982.00**		**35,798,982.00**	-	**54,996,163.00**		**90,795,146.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	229.35	135,331.00	31,038,165.00	+	93.94	-	12,713,346.00	-	126.40	17,105,838.00	126.40	17,105,838.00	196.89	26,645,673.00	323.29	43,751,511.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDADES				VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	246.57	131,577.00	32,442,941.00	-	-	- 38.43	-	- 5,056,504.00	142.07	18,693,144.00	142.07	18,693,144.00	66.07	8,693,292.00	208.14	27,386,437.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	24.45	65,973.00	1,613,040.00	-	-	- 11.81	-	- 779,141.00		-	-	-	12.64	833,899.00	12.64	833,899.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	51.33	180,924.00	9,286,829.00	-	-	- 13.29	-	- 2,404,480.00		-	-	-	38.04	6,882,349.00	38.04	6,882,349.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	64.00	38,577.00	2,468,928.00	-	-	- 38.60	-	- 1,489,072.00	-	-	-	-	25.40	979,856.00	25.40	979,856.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	112.99	108,023.00	12,205,519.00	-	-	- 11.52	-	- 1,244,425.00		-	-	-	101.47	10,961,094.00	101.47	10,961,094.00
4.07	COLUMNAS EN PERFIL 120X120 mm x 2,5 mm. Incluye anclaje en dado e concreto, protección en anticorrosivo y acabado en pintura a base de aceite.	ML	27.00	152,595.00	4,120,065.00	-	-	- 27.00	-	- 4,120,065.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
4.08	PERFIL 100X100 X 2,00 mm, PARA VIGAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.	ML	75.21	148,416.00	11,162,367.00	-	-	- 75.21	-	- 11,162,367.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**20,721,154.00**				**1,332,002.00**	**- 455,794.00**	**-**	**4,619,930.00**		**6,269,905.00**	**-**	**15,327,456.00**		**21,597,361.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	92.18	65,999.00	6,083,788.00	+	7.00	-	461,993.00	-	70.00	4,619,930.00	95.00	6,269,905.00	4.18	275,876.00	99.18	6,545,781.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	92.18	124,287.00	11,456,776.00	+	7.00	-	870,009.00	-	-	-	-	-	99.18	12,326,785.00	99.18	12,326,785.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	79.76	39,877.00	3,180,590.00	-	-	- 11.43	-	- 455,794.00	-	-	-	-	68.33	2,724,795.00	68.33	2,724,795.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**52,321,669.00**				**4,476,385.00**	-	-	-		-	-	**56,798,053.00**		**56,798,053.00**
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	3.78	1,031,425.00	3,898,787.00	+	4.34	-	4,476,385.00	-	-	-	-	-	8.12	8,375,171.00	8.12	8,375,171.00
6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	21.68	1,288,804.00	27,941,271.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.68	27,941,271.00	21.68	27,941,271.00
6.03	2 Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye trgaluz superior en vidrio 4mm y marcos.	UND	2.00	3,195,771.00	6,391,542.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	6,391,542.00	2.00	6,391,542.00
6.04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	13.23	1,065,009.00	14,090,069.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.23	14,090,069.00	13.23	14,090,069.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**26,545,451.00**				-	**- 4,586,765.00**		-		**7,523,476.00**	-	**14,435,210.00**		**21,958,686.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	30.00	153,374.00	4,601,220.00		-	- 10.00	-	- 1,533,740.00	-	-	-	-	20.00	3,067,480.00	20.00	3,067,480.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,043,675.00	1,043,675.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,043,675.00	-	-	1.00	1,043,675.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	811,074.00	811,074.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	811,074.00	-	-	1.00	811,074.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	31.00	195,661.00	6,065,491.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00	1,956,610.00	21.00	4,108,881.00	31.00	6,065,491.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27.00	159,930.00	4,318,110.00	-	-	- 16.00	-	- 2,558,880.00	-	-	10.00	1,599,300.00	1.00	159,930.00	11.00	1,759,230.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	164,715.00	823,575.00	-	-	- 3.00	-	- 494,145.00	-	-	-	-	2.00	329,430.00	2.00	329,430.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	769,337.00	769,337.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	769,337.00	-	-	1.00	769,337.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 5 LINEAS.	ML	5.00	121,683.00	608,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	608,415.00	5.00	608,415.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	787,154.00	787,154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	787,154.00	1.00	787,154.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y	ML	100.00	67,174.00	6,717,400.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00	1,343,480.00	80.00	5,373,920.00	100.00	6,717,400.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**24,008,583.00**				**2,468,651.00**	**- 2,466,994.00**		**769,076.00**		**6,853,023.00**	**-**	**17,157,217.00**		**24,010,240.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDADES				VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	3.54	2,208,708.00	7,818,826.00		-	- 0.04	-	- 88,348.00	-	-	-	-	3.50	7,730,478.00	3.50	7,730,478.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	679,941.00	1,359,882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,359,882.00	2.00	1,359,882.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00	388,678.00	2,720,746.00	-	-	- 1.00	-	- 388,678.00	-	-	-	-	6.00	2,332,068.00	6.00	2,332,068.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	892,324.00	892,324.00	+	1.00	-	892,324.00	-	-	-	-	-	2.00	1,784,648.00	2.00	1,784,648.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	15.00	71,487.00	1,072,305.00	-	-	- 4.00	-	- 285,948.00	1.00	71,487.00	11.00	786,357.00	-	-	11.00	786,357.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	14.00	89,326.00	1,250,564.00	-	-	- 6.00	-	- 535,956.00	-	-	8.00	714,608.00	-	-	8.00	714,608.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2.00	162,406.00	324,812.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	324,812.00	-	-	2.00	324,812.00
8.08	Suministro e instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1.00	1,068,984.00	1,068,984.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,068,984.00	1.00	1,068,984.00
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	31.17	36,138.00	1,126,421.00	-	-	-	-	-	-	-	31.17	1,126,421.00	-	-	31.17	1,126,421.00
8.10	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	19.90	72,364.00	1,440,044.00	+	1.74	-	125,913.00	-	9.64	697,589.00	21.64	1,565,957.00	-	-	21.64	1,565,957.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	613,724.00	613,724.00	+	1.00	-	613,724.00	-	-	-	-	-	2.00	1,227,448.00	2.00	1,227,448.00
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1.00	800,998.00	800,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	800,998.00	1.00	800,998.00
8.13	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	11.13	47,656.00	530,411.00	+	15.22	-	725,505.00	-	-	-	25.21	1,201,408.00	1.14	54,508.00	26.35	1,255,916.00
8.14	Construcción de Caja de Inspeción de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	798,203.00	1,596,406.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	798,203.00	1.00	798,203.00	2.00	1,596,406.00
8.15	Suministro e instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	3.95	56,727.00	224,072.00	+	1.96	-	111,185.00	-	-	-	5.91	335,257.00	-	-	5.91	335,257.00
8.16	Suministro e instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und	1.00	1,168,064.00	1,168,064.00	-	-	- 1.00	-	- 1,168,064.00	-	-	-	-	-	-		-
NP	NO PREVISTOS								15,421,283.00	-	-	7,493,030.00		7,493,030.00	-	7,928,253.00		15,421,283.00
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		125,000.00		+	44.25	-	5,531,250.00	-	20.00	2,500,000.00	20.00	2,500,000.00	24.25	3,031,250.00	44.25	5,531,250.00
NP02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		127,000.00		+	20.89	-	2,653,030.00	-	20.89	2,653,030.00	20.89	2,653,030.00	-	-	20.89	2,653,030.00
NP03	VIGA CINTA 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		130,000.00		+	18.00	-	2,340,000.00	-	18.00	2,340,000.00	18.00	2,340,000.00	-	-	18.00	2,340,000.00
NP04	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND		786,957.00	-	+	1.00	-	786,957.00	-		-	-	-	1.00	786,957.00	1.00	786,957.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL			CANT	SUBTOTAL		
NP05	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		218,334.00	-	+	4.00	-	873,336.00	-		-	-	-	4.00	873,336.00	4.00	873,336.00
NP06	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2		311,790.00	-	+	1.56	-	486,392.00	-		-	-	-	1.56	486,392.00	1.56	486,392.00
NP07	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG		19,546.00	-	+	140.71	-	2,750,318.00	-		-	-	-	140.71	2,750,318.00	140.71	2,750,318.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**341,404,985.00**				**56,097,951.00**	**- 56,097,951.00**	**% ACTA 2**	**72,831,708.00**	**% ACUM**	**120,912,537.00**	**POR COBRAR**	**220,492,447.00**		**341,404,985.00**
	ADMINISTRACION			**28.36%**	**96,822,454.00**				**15,909,379.00**	**- 15,909,379.00**		**20,655,072.00**		**34,290,795.00**		**62,531,658.00**		**96,822,454.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,414,050.00**				**560,980.00**	**- 560,980.00**		**728,317.00**		**1,209,125.00**		**2,204,924.00**		**3,414,050.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**17,070,249.00**				**2,804,898.00**	**- 2,804,898.00**		**3,641,585.00**		**6,045,627.00**		**11,024,622.00**		**17,070,249.00**
	TOTAL OBRA				**458,711,738.00**				**75,373,208.00**	**- 75,373,208.00**	**21.33%**	**97,856,682.00**	**35.42%**	**162,458,084.00**	**64.58%**	**296,253,651.00**		**458,711,738.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 002

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.2**	02 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES			ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO ACTAS	POR COBRAR		CANTIDAD ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
		UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANT	SUBTOTAL		CANT	SUBTOTAL		

RESUMEN FINANCIERO NORCASIA		
Valor Inicial Contrato:	**$**	**458,711,738.00**
Valor Adicional Contrato:	**$**	**-**
Valor Final Contrato:	**$**	**458,711,738.00**
Valor Acta No 001	**$**	**64,601,401.00**
Valor Acta No 002	**$**	**97,856,682.00**
Valor A Girar Acta No 002	**$**	**97,856,682.00**
Valor Acumulado Actas	**$**	**162,458,083.00**
% Ejecución Acumulado		**35.42%**
Saldo Por Ejecutar	**$**	**296,253,651.00**

$ -

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 002 FUE **REVISADA Y APROBADA** POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE..**($97.856.682,00).** CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 35,42%. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DOS (2) DÍAS, DEL MES DE MARZO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS
HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	2,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
FACHADA POSTERIOR	12,42			2,00	24,84
TERRAZA				5,00	-
FACHADA LATERAL DERECHA	8,31			2,00	16,62

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**41,46**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**25,00**
TOTAL CONTRACTUAL	53,31

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	PRELIMINARES	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	1,10 DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	**Unidad Medida**	m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Area Lote Puesto Salud	24,07		36,40	1,00	876,15
Menos C.S.	10,63		12,55	-1,00	-133,41
	2,43		3,22	-1,00	-7,82
BODEGA	2,96		2,17	-1,00	-6,42
FRENTE	0,51		12,55	1,00	6,43

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**734,92**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**734,92**
TOTAL CONTRACTUAL	734,92

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA		
CAPITULO	CONCRETOS		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	3,01	MURO EN BLOQUE No 4	**Unidad Medida**	M2	







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO	1,09	3,07		2,00	6,69
	1,30	3,07		1,00	3,99
CONSULTORIO 1	0,91	3,50		1,00	3,19
TOMA DE MUESTRAS	2,60	3,20		1,00	8,32
BAÑO DISCAPACITADOS	1,60	3,20		1,00	5,12
FRONTAL	2,60	2,60		1,00	6,76
LAT DERECHO	5,70	2,60		1,00	14,82
	1,40	0,50		1,00	0,70
	0,25	1,40		1,00	0,18
VENTANA 1	1,20	0,40		- 1,00	0,24
	0,80	0,40		- 1,00	0,16
LAT IZQUIERDO	4,15	2,60		1,00	10,79
	4,15	0,80		1,00	1,66
	4,23	2,60		1,00	11,00
	4,23	0,80		1,00	1,69
TERRAZA	4,56	3,20		4,00	58,37
					-
PUERTA	0,98	2,20		- 1,00	- 2,16
VENTANA	1,85	1,00		- 2,00	- 3,70
LADRILLO MURO DE CONTENCION ANDEN POSTERIOR	22,48	0,82		1,00	18,43
	8,40	0,82		1,00	6,89
CUARTO DE RESIDUOS	10,12	0,60		1,00	6,07
	3,07	0,24		2,00	0,37

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**159,58**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**80,00**
TOTAL CONTRACTUAL	38,60


Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	CONCRETOS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**Unidad Medida** M2

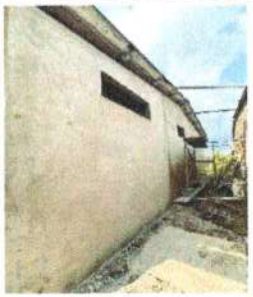





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO	1,09	3,07		4,00	13,39
	1,30	3,07		2,00	7,98
CONSULTORIO 1	0,91	3,50		2,00	6,37
TOMA DE MUESTRAS	2,60	3,20		2,00	16,64
BAÑO DISCAPACITADOS	1,60	3,20		2,00	10,24
CERRAMIENTO	21,52	0,65		2,00	27,98
TERRAZA	4,56	3,20		4,00	58,37
					-
PUERTA	0,98	2,20		- 1,00	- 2,16
VENTANA	1,85	1,00		- 2,00	- 3,70
LAT DERECHO	5,70	2,60		1,00	14,82
	1,40	0,50		1,00	0,70
	0,25	1,40		1,00	0,18
VENTANA 1	1,20	0,40		- 1,00	0,24
	0,80	0,40		- 1,00	0,16
LAT IZQUIERDO	4,15	2,60		1,00	10,79
	4,15	0,80		1,00	1,66
	4,23	2,60		1,00	11,00
	4,23	0,80		1,00	1,69

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**176,34**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**100,00**
TOTAL CONTRACTUAL	106,12

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR




MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS ; HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	**Unidad Medida**	ml



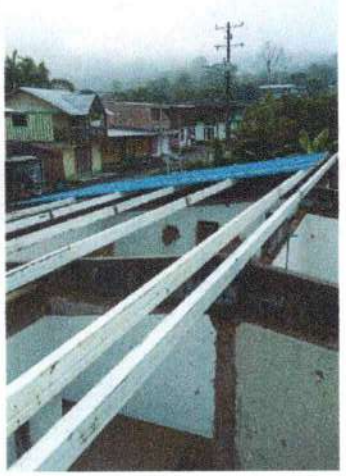

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CENTRO SALUD	12,64			20,00	252,80
CUARTO DE ASEO	2,76			2,00	5,52
CUARTO DISPOSICION	4,00			6,00	24,00
TERRAZA	8,19			5,00	40,97

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**323,29**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**126,40**
TOTAL CONTRACTUAL	229,35

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS ; HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**Unidad Medida**	m2







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO	2,76		1,11	1,00	3,06
CUARTO DISPOSICION	4,00		3,50	1,00	14,00
CENTRO DE SALUD	12,64		11,24	1,00	142,07
TERRAZA	7,00		7,00	1,00	49,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**208,14**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**142,07**
TOTAL CONTRACTUAL	246,57

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS ; HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	5,01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	**Unidad Medida** m2





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO	1,50		0,90	1,00	1,35
CUARTO DE DISPOSICION	2,84		1,94	1,00	5,51
CENTRO DE SALUD	11,11		8,31	1,00	92,32

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**99,18**
COBRO ACTA N.1	25,00
ACTA N.2	**70,00**
TOTAL CONTRACTUAL	92,18

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS ; HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	8,05	Punto Hidraulico de 1/2"	**Unidad Medida**	UND





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CUARTO DE ASEO				1,00	1,00
TOMA DE MUESTRAS				2,00	2,00
BAÑO DISCAPACITADOS				3,00	3,00
COLSULTORIO 2				1,00	1,00
CONSULTORIO 1				2,00	2,00
CUARTO DE DISPOSICION				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**11,00**
COBRO ACTA N.1	10,00
ACTA N.2	**1,00**
TOTAL CONTRACTUAL	15,00

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS ; HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	8,10 — Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	**Unidad Medida**	ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
SANITARIO BAÑO	10,00			1,00	10,00
SIFON	11,64			1,00	11,64

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**21,64**
COBRO ACTA N.1	12,00
ACTA N.2	**9,64**
TOTAL CONTRACTUAL	19,90
TOTAL ACTIVIDAD	**31,28**

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS ; HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
FACHADA POSTERIOR	0,80			7,00	5,60
FACHADA LAT DERECHA	0,80			6,00	4,80
	3,10			2,00	6,20
FACHADA LAT IZQ	3,40			1,00	3,40
	2,45			1,00	2,45
	2,60			1,00	2,60
TERRAZA	3,20			6,00	19,20

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**44,25**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**20,00**
TOTAL CONTRACTUAL	

Elaboró

MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra


Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA
CAPITULO		**FECHA**	02 de marzo 2026
ÍTEM	NP02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m. EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida** ML







Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
LAVADERO	2,70			2,00	5,40
CUARTO RESIDUOS	5,51			2,00	11,02
FACHADA LAT IZQ DEL PUESTO DE SALUD	4,47			1,00	4,47
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**20,89**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**20,89**
TOTAL CONTRACTUAL	

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
ALAN MOSQUERA GARCIA
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.2

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL LA MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO		**FECHA**	02 de marzo 2026	
ÍTEM	NP03	VIGA CINTA 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**Unidad Medida**	ML





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
FACHADA LATERALES	4,45			2,00	8,90
	4,55			2,00	9,10
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**18,00**
COBRO ACTA N.1	0,00
ACTA N.2	**18,00**
TOTAL CONTRACTUAL	0,00

Elaboró

MARÍA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló

ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR

BITÁCORA NORCASIA

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA
N°002 11 SEPT 2025

PUESTO SALUD NORCASIA

Contratista: H2M Arquitectos e ingenieros Zomac
Contratante: E.S.E Hospital Malvinas Hector Orozco Orozco
Interventoría: Union Temporal Intermalunas 25.

Fecha de Inicio: 06 Octubre 2025

INDUCONTABLES

06/10/2025

En la presente fecha se suscribio el acta de inicio del contrato, dando apertura formal al plazo de ejecución contractual. Durante la jornada no se ejecutaron actividades constructivas en campo. Se iniciarón actividades administrativas y técnicas relacionadas con la revisión general del contrato, alcance de los ítems, planos y especificaciones tecnicas, con el fin de organizar el arranque del proyecto.

Residen Interventoria. Residente Obra.

07/10/2025.

Se realizarón actividades administrativas Orientadas al análisis detallado del cronograma contractual, identificación de frentes de trabajo y revisión de rendimientos previstos. Se efectuó revisión preliminar de planos arquitectonicos y tecnicos. No se desarrollaron actividades fisicas en obra.

INDUCONTABLES

Alun Mosqueras — Residente Interventoria

[redacted] — Residente Obra.

08/10/2025

Se llevó acabo reconocimiento general del área de intervención, verificando condiciones actuales del sitio, accesos y estado de las instalaciones existentes. Se levantaron observaciones iniciales para la planeación del proyecto. Jornada dedicada a actividades tecnicas y administrativas.

Alun Mosqueras — Residente Interventoria

[redacted] — Residente Obra

09/10/2025.

Se adelantaron labores administrativas relacionadas con la planeación operativa del proyecto, definición preliminar de necesidades de materiales, equipos y personal. Se inicio gestión

para cotización y compra de materiales requeridos para las actividades preliminares.

Residente Interventoria — Residente Obra.

10/10/2025.
Se realizó seguimiento a procesos de compra y suministro de materiales, asi como coordinación con proveedores. Se verificaron cantidades y especificaciones tecnicas conforme a planos y presupuesto. No se ejecutaron activi dades en campo.

Residente Interventoria — Residente Obra.

11/10/2025
Jornada destinada a actividades abminis trativas internas, revisión de documentación contractual y

INDUCONTABLES

ajustes preliminares al plan del trabajo No se realizaron labores constructivas.

Residente Interventoria — Residente Obra.

13/10/2025

Se continuo con la gestión abministrativa del contrato, incluyendo coordinación para vinculación de personal operativo y revisión de requerimientos de seguridad y salud en el trabajo. Sin ejecución fisica en obra.

Residente Interventoria — Residente Obra.

14/10/2025.

Se adelantaron actividades administrativas relacionadas con la programación de actividades preliminares y revisión de cantidades de obra. Se efectuó análisis de logistica para el transporte de materiales hacia el

sitio del proyecto.

Residente Interventoria — Residente Obra.

15/10/2025.

Se realizó seguimiento a la disponibilidad de materiales y tiempos de entrega por parte de proveedores. Se evaluaron posibles restricciones logisticas que podrían afectar el inicio de actividades. No se ejecutaron labores de campo.

Residente Interventoria — Residente Obra.

16/10/2025

Se continuaron labores de planeación operativa, revisión tecnica de planos y definición de secuencia constructiva. jornada dedicada a actividades administrativas y técnicas.

INDUCONTABLES

Alan Mosquera — [illegible]

Residente Interventoria — Residente Obra.

17/10/2025.

Se efetud revisión del avance administrativo del proyecto frente al cronograma contraltual evidentemente se notó un retraso en el inicio efectivo de actividades. Se deja constancia para control y seguimiento Sin ejecución de obra

Alan Mosquera — [illegible]

Residente Interventoría — Residente Obra.

18/10/2025

Jornada dedicada a ajustes abminis-tiativos y tecnicos del proyecto, revisión de compras y programación interna. No se realizaron actividades construcc-as.

Alan Moragrera — Residente Interventoria

[illegible] — Residente Obra.

20/10/2025.

Se continúo con actividades administrativas relacionadas con logística, planeación y coordinación general del proyecto. Se verificaron nuevamente cantidades de materiales requeridos para el inicio de la obra.

Alan Moragrera — Residente Interventoria

[illegible] — Residente Obra

21/10/2025

Se realizó seguimiento a procesos de suministro y transporte de materiales. Se identificaron posibles afectaciones logisticas externas que podrían incidir en la ejecución del proyecto. Sin actividades en campo.

INDUCONTABLES

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

22/10/2025.

Se adelantaron actividades administrativas de control y seguimiento contractual, revisión de programación y ajustes técnicos. No se ejecutaron labores constructivas.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

23/10/2025.

Se continuaron actividades administrativas de control y seguimiento contractual revisión de programación previas al inicio de obra, enfocadas en la organización de recursos y frentes de trabajo

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

24/10/2025

Se efectuó revisión general del estado del proyecto, cronograma y recursos disponibles. se deja constancia del retraso acumulado frente a la programación inicial. Sin ejecución física.

Residente Interventoría — Residente Obra.

25/10/2025

Jornada dedicada a actividades administrativas internas, revisión documental y preparación para el inicio de actividades preliminares

Residente Interventoria — Residente Obra.

INDUCONTABLES

27/10/2025
Se realizaron gestiones administrativas finales orientadas al inicio de actividades preliminares, incluyendo coordinación del personal y logistica de materiales

Residente Interventoria — Residente Obra

28/10/2025
Se continúo con actividades administrativas y tecnicas, verificando disponibilidad de materiales y condiciones del sitio para el inicio de obra

Residente Interventoria — Residente Obra

29/10/2025
Se efectuó seguimiento administrativo al estado del contrato y planeación operativa. Sin ejecución de actividades fisicas.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

[illegible] — Residente Obra.

30/10/2025

Se cerro la etapa de alistamiento administrativo y tecnico del proyecto, dejando condiciones preparadas por el inicio de actividades preliminares

Alan Mosquera — Residente Interventoria

[illegible] — Residente Obra.

31/10/2025

Se realizó vinculación del prisonal de obra y se dio inicio a las actividades preliminares del proyecto. Se efectuó el descarge del materal pétreo, verificando cantidades y condiciones, con el fin de adecuar las zonas de intervención.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

[illegible] — Residente Obra.

INDUCONTABLES

01 / 11 / 2025

Se ejecutaron demoliciones en áreas específicas, conforme al alcance contractual, garantizando la adecuación de los espacios para las etapas posteriores del proyecto.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

[illegible] — Residente Obra.

03 / 11 / 2025

Se realizaron labores de retiro de elementos de carpintería metálica, correspondientes a puertas y ventanas, como parte de las actividades preliminares.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

[illegible] — Residente Obra

04 / 11 / 2025

Se adelantaron trabajos de desmonte de aparatos sanitarios, incluyendo inodo-

ros y lavamanos, conforme a lo previsto para la adecuación de las zonas de intervención.

Alan Mosquera — [illegible]

Residente Interventoria — Residente Obra

05/11/2025

Se continuo con la adecuación de áreas intervenidas. Se presentaron demoras en el suministro de materiales debido a afectaciones logisticas asociados al cierre parcial del puente El avispero. lo cuál obligó a ajustes en la secuencia de actividades.

Alan Mosquera. — [illegible]

Residente Interventoria — Residente Obra.

06/11/2025

Se realizó seguimiento general a las actividades ejecutadas durante la semana. Se evidencia un rehaso acumulado superior

INDUCONTABLES

a 25 días frente a la programación inicial, recomendandose la implementación de un plan de recuperación del cronograma reorganización de frentes de trabajo y Optimización de recursos.

Residente Interventoría — Residente Obra

7/11/2025

Durante la jornada se continuaron las actividades preliminares de desmonte y demolición de elementos existentes en las áreas de intervención. Se ejecutaron labores de retiro de puertas y ventanas, asi como demolición localizada de revestimientos de cerámica en pisos y paredes. Las actividades se desarrollaron de manera continua, priorizando limitaciones en el rendimiento debido a la disponibilidad de personal.

Residente Interventoría — Residente Obra

08/11/2025.

Se dio continuidad a los trabajos de demolición y retiro de elementos constructivo e'ocándose principalmente en el retiro manual de cerámica en pisos. Se realizó acopio temporal de escombros dentro del área de obra, a la espera de su transporte y disposición final. El avance se vio condicio nado por el uso de herramientas manuales y restricciones logísticas para la evaluación de materiales.

Ivan Moreno — Residente Interventoria

[illegible] — Residente Obra.

10/11/2025.

Se retoman actividades en campo, continuando con el desmonte de baterías sanitarias y la demo lición de revestimientos cerámicos en muros. Se efectuó organización de frentes de trabajo y verificación de áreas intervenidas. Persisten dificultades asociadas a la limitada

INDUCONTABLES

disponibilidad del personal operativo y a las condiciones de acceso para el transporte de escombros.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

11/11/2025

Durante la jornada se avanzó en labores de demolición manual y retiro de elementos existentes, priorizando la liberación de áreas para el inicio de nuevas instalaciones.

Se realizó seguimiento al avance frente al cronograma, evidenciándose que la duración de estas actividades superán lo previsto inicialmente.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

12/11/2025

Se continuaron las actividades preliminares de demolición y adecuación de espacios, con enfasis en el retiro de cerámica de piso. Se realizaron labores de limpieza parcial de áreas intervenidas. El ritmo de avance continúa efectado por limitaciones operativas y logísticas en el transporte de materiales y escombros.

Residente Interventoria

Residente Obra.

13/11/2025

Durante la jornada se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades preliminares de demolición y retiro de elementos existentes, verificando el estado de las áreas intervenidas y el rendimiento del personal en campo. Se evidenció que la duración de estas labores se ha extendido respecto a lo previsto, debido principalmente a las condiciones operativas

INDUCONTABLES

y al uso de herramientas manuales.
Se evaluaron alternativas de mejora que agil zan la excavación tales como el refuerzo del personal, la mejora en la organización de frentes de trabajo y el uso de herramientas más eficientes, dejando registro para el control y seguimiento en las próximas jornadas.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

14/11/2025

Durante la jornada se adelantaron gestiones administrativas y logisticas orientadas a garantizar el suministro de materiales requeridos para el inicio de las actividades de cimentación y cubierta. Se realizó seguimiento a proveedores y revisión de condiciones de acceso al sitio para el ingreso de materiales. No se ejecutaron actividades constructivas en campo, a la espera de la llegada de los insumos.

Alan Mosquera
Residente Interventoria

Residente Obra.

15/11/2025.

Se continuó con labores de coordinación logistica con proveedores, verificando tiempos estimados de entrega y disponibilidad de materiales en la región. Adicionalmente, se realizó organización y adecuación de áreas de acopio dentro del sitio de obra, con el fin de recibir los materiales una vez sean despachados. Sin actividades fisicas de obra.

Alan Mosquera.
Residente Interventoria

Residente Obra.

17/11/2025

Se efectuó seguimiento a las gestiones de suministro de elementos de cubierta y materiales para cimentación, evidenciandose que estos aun no

INDUCONTABLES

se encuentran disponibles en obra. Se revisó el cronograma contractual y se evaluaron actividades complementarias que puedan ejecutarse una vez se normalice el abastecimiento. No se ejecutaron actividades constructivas

Residente Interventoria — Residente Obra.

18/11/2025

Durante la jornada se adelantaron actividades administrativas relacionadas con la revisión de balances de mayores y menores cantidades, debido a la identificación de ítems no previstos, entre ellos la necesidad de adecuar un cuarto a ambiente a residuos, conforme a requerimientos de la supervisión del contrato. Se avanzó en la recopilación de información para la elaboración de los respectivos análisis de precios unitarios. (APU).

Alan Mosquera — [illegible]

Residente Interventoria — Residente Obra.

19/11/2025

Se continuó con la gestión logística y administrativa del proyecto, incluyendo el análisis de alternativas de abastecimiento ante la escasez de ladrillo No.4 y las demoras en la entrega de perfiles metálicos tipo C. Se evaluo la alternativa de uso de bloque en cemento de dimensiones similares, conforme a las recomendaciones técnicas. Sin ejecución de obra en campo.

Alan Mosquera — [illegible]

Residente Interventoria — Residente Obra.

20/11/2025

Se realizó seguimiento general al estado del proyecto, verificando que no fue posible iniciar la fase de cimentación debido a la ausencia de los materiales esenciales. Se dejó registro de la necesidad de ajustar temporalmente la

INDUCONTABLES

programación, fortalecer la coordinación con proveedores y preparar un plan de trabajo ajustado que permita avanzar de manera inmediata una vez se cuente con los insumos en obra. Se deja constancia para control y seguimiento.

Residente Interventoría — Residente Obra.

21/11/2025

Durante la jornada se realizaron actividades de seguimiento administrativos y técnico al proyecto, verificando el estado del suministro de materiales requeridos para el inicio de la fase de cimentación. Se mantuvo comunicación con proveedores para confirmar fechas estimadas de entrega. Adicionalmente, se continúo con la fabricación de ventanería y cercas metálicas en taller. las cuales serán instaladas una vez se habiliten los frentes de obra. No se ejecutaron actividades constructivas en el sitio debido a la

ausencia de materiales.

Residente Interventoria — Residente Obra.

22/11/2025

Se adelantaron gestiones de coordinación logística, orientadas a la organización del sitio de obra para la futura recepción y acopio de materiales. Se revisaron planos y especificaciones técnicas relacionadas con las actividades de cimentación y estructura, dejando observaciones para su ajuste previo al inicio de obra. Se realizó seguimiento al avance de los elementos fabricados en taller. No se registraron actividades constructivas en campo.

Residente Interventoria — Residente Obra.

24/11/2025

Durante la jornada se atendio visita de seguimiento por parte de la supervisión del contrato

INDUCONTABLES

y el ministerio de salud, quienes realizaron observaciones técnicas relacionadas con ajustes funcionales del proyecto, tales como adecuaciones para accesibilidad, disposición de residuos, ajustes en áreas asistenciales y ampliación de algunos espacios. Como Ingeniero Residente, se tomaron notas técnicas y se inició el analisis de los ajustes requeridos para su eventual incorporación al proyecto.

Residente Interventoria — Residente Obra.

25/11/2025

Se realizaron actividades administrativas y técnicas asociadas al análisis de las observaciones emitidas por la supervisión y el ministerio de salud, evaluando su impacto en planos, cantidades de obra y alcance contractual. Se continúo con el seguimiento al suministro de materiales y con la fabricación de elementos metálicos en taller. No se dio

inicio a actividades de cimentación por falta de insumos en obra.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

[illegible] — Residente Obra.

26/11/2025

Durante la jornada se avanzó en la revisión y ajuste preliminar de planos constructivos, considerándo las observaciones realizadas en la visita técnicas. Asimismo, se efectuo control al plan de choque presentado por el contratista, verificando la viabilidad de su implementación una vez se normalice la entrega de materiales. Se mantuvo coordinación con proveedores y no se ejecutaron actividades constructivas en sitio.

Alan Mosquera. — Residente Interventoria

[illegible] — Residente Obra.

INDUCONTABLES

27/11/2025.

Se realizó seguimiento general al estado del proyecto, dejando registro de la continuidad de actividades en taller y de las gestiones administrativas adelantadas durante la semana. Se verificó que aún no se cuenta con los materiales necesarios para iniciar la fase de cimentación, manteniéndose en espera la habilitación de los frentes de trabajo. Se dejó registrado para el control y seguimiento en proximas jornadas, a la espera de la normalización del suministro.

Alvin Mosquera — Residente Interventoria

[illegible] — Residente Obra

28/11/2025

Durante la jornada se verifico la llegada del material para acometidas sanitarias a la zona de obra, asi como el suministro de cemento, malla electrosoldada y acero, insumos necesarios para el inicio de actividades constructivas.

Se realizo inspección visual del estado y cantidades del material recibido, dejando registro para control de inventarios. Adicionalmente, se revisaron las observaciones realizadas en la visita de la supervisión y el ministerio de salud, con el fin de planificar los ajustes requeridos en obra.

Residente Interventoria

Residente Obra.

29/11/2025

Se adelantaron actividades de replanteo y verificacion de espacios, de acuerdo con las modificaciones solicitadas para el puesto de salud. Se realizaron marcaciones preliminares en sitio para identificar las aieas que requieren intervención. Asimismo, se organizó el material recibido y se definieron los frentes de trabajo para el inicio de las acometidas sanitarias y actividades de demolición asociadas a los ajustes de diseños.

INDUCONTABLES

Adam Mosquera. [signature]

Residente Interventoria Residente Obra.

01/12/2025.

Durante la jornada se dio inicio a actividades de demolición puntual, necesarias para la modificación de los espacios conforme a las observaciones realizados por la supervisión y el ministerio de salud. Estas labores se ejecutarán de manera controlada, priorizando la seguridad y la adecuada disposición de los residuos generados paralelamente, Se continuó con la verificación técnica de las acometidas sanitarias a ejecutar.

Adam Mosquera [signature]

Residente Interventoria Residente Obra

02/12/2025

Se continuaron las labores de demolición y adecuación de áreas, avanzando en la liberación de los espacios requeridos para los nuevos ajustes del proyecto. Se realizó seguimiento

al estado de los materiales en obra y se efectuó control de cantidades, verificando su correspondencia con los planos y actividades programadas. No se iniciarón aún las fundiciones dado que se priorizó la adecuación completa de las áreas intervenidas.

Alvin Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

03/12/2025.

Durante la jornada se avanzó en la verificación final de espacios modificados, dejando las áreas listas para el inicio de las acometidos sanitarios Se realizaron ajustes menores derivados del replanteo y se consolidó el balance de cantidades, con el objetivo de optimizar recursos y evitar reprocesos. Se sostuvo coordinación con el personal de obra para programar las actividades de instalaciónes y fundición.

INDUCONTABLES

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

04/12/2025

Se efectuó seguimiento general a las actividades ejecutadas durante la semana, dejando registro del avance logrado gracias al suministro de materiales de campo. Se verificó que las áreas intervenidas se encuentran preparadas para dar continuidad a las actividades de acometidas sanitarias y fundición de placa en los días siguientes. Se cerró la semana con control administrativo y técnico del proyecto, dejando constancia de las gestiones realizadas para mantener la continuidad de obra.

Alan Mosquera. — Residente Interventoria

Residente Obra.

05/12/2025

Actividades: Excavación profunda para conexión de red sanitaria principal y refuerzo de andén

Iniciamos jornada con el frente de excavación exterior. Estamos abriendo la brecha para conectar la tubería sanitaria del puesto de salud con la red principal del municipio. paralelamente, empezamos la excavación para el refuerzo del andén posterior, ya que estructuralmente es vital antes de seguir con acabados.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

06/12/2025

Actividades: Nivelación de terreno y preparación para acero.

Aprovechamos que el clima nos permite trabajar en exteriores para avanzar con la red sanitaria. En el interior, el personal está nivelando el suelo

INDUCONTABLES

para asegurar que el contrapiso quede perfecto. Sigo preocupado por la falta de personal capacitado, pero la cuadrilla actual está rindiendo al maximo para cumplir con el plan de choque.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

~~Firma~~ / Residente Obra

07/12/2025

No se labora (día de descanso dominical)

Alan Mosquera — Residente Interventoria

~~Firma~~ Residente Obra

08/12/2025

Actividades: Instalación de malla electrosoldada en áreas internas.

Procedimos con el tendido y traslape de la malla electrosoldada sobre el terreno ya compactado. Verificamos que los puntos sanitarios queden bién protegidos para que

no se muevan durante la fundición. Tenemos todo el material listo en obra para vaciar concreto mañana mismo.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

09/12/2025

Actividades: Fundición de placa de contrapiso

Realizamos la fundición de placa de contra piso de concreto. El acabado se deja nivelado para recibir posteriormente el piso definitivo. Con esta actividad garantizamos un salto importante en el porcentaje de ejecución, moviendonos hacia el 38% real que reportamos está semana.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

10/12/2025

Actividades: Curado de concreto y terminación

INDUCONTABLES

de excavaciones externas.
Estamos en proceso de curado de la placa para evitar retracciones y fisuras Mientras tanto, terminamos las excavaciones de la red sanitaria exterior. Ya se visualiza la nueva distribución de espacios que nos pidió el Ministerio; Aunque esto nos generó atrasos al principio, ya estamos retomando el ritmo lineal

Alan Mosquera — Residente Interventoría

[redacted] — Residente Obra.

11 / 12 / 2025

Actividades: Verificación de niveles y balance de materiales.
Cerramos la semana 9 con éxito en la fundición. Se realizó un balance de materiales ya contamos con lo necesario para la siguiente etapa de mampostería y adecuación muros. El interventor verificó los avances

y, aunque falta por llegar al 50% programado la obra ya tiene cara de progreso real.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

12/12/2025

Se dio apertura a la semana de labores con el inicio de actividades de demolición de muros que presentan fisuración estructural. De manera simultanea, se iniciaron los trabajos de instalaciones electricas en el costado correspondiente. Se realizó la revisión de los puntos hidráulicos existentes para su adecuación.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

13/12/2025.

Continuación de las actividades de demolición en el muro lateral derecho del puesto de salud. Se avanzó en la instalación de la nueva red electrica siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. Se verificó la disponibilidad de

INDUCONTABLES

la perfilería metalica en el sitio de la obra.

Alan Mosquera
Residente Interventoría

Residente Obra

15/12/2025

Se presentaron dificultades con la cuadrilla de mano de obra debido a inconvenientes con representante JAC. Esta situación afecto' el rendimiento de las actividades programadas, generando la necesidad de gestionar una nueva cuadrilla y un nuevo maestro de obra. No obstante, se mantuvo presencia de personal para avanzar en la red electrica.

Alan Mosquera
Residente Interventoría

Residente Obra.

6/12/2025.

Continuación de las labores de instalación e redes eléctricas. Se realizó el balance : obra y de las actividades adicionales

propuestas, donde se evidenció que no se contempla la ejecución de la placa de concreto ni de la cubierta contigua al puesto de Salud, priorizando la funcionalidad estructural.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

17/12/2025.

Debido al desfase del cronograma, se mantuvo el personal en obra con el fin de intentar superar el 45% de ejecución en la semana siguiente. Se iniciaron los trámites para la solicitud de suspensión del contrato, proyectando que las obras no culminarán en la vigencia 2025.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

18/12/2025

Cierre de semana con el reporte de actividades de demolición y redes eléctricas finalizado. Se determinó que el desmonte de la cubierta queda pendiente para dar continuidad a las

INDUCONTABLES

fases de intervención. Se formalizó la recomendación de continuar con la fundición de columnetas de apoyo y el refuerzo de muros en los días posteriores al reinicio.

Alan Mosquera. — Residente Obra.
Residente Interventoría.

19/12/2025

Se realizaron actividades de demolición controlada de los muros perimetrales que presentaban deficiencias estructurales y comprometían la seguridad de la edificación. De forma simultánea, se inició la construcción de nuevos muros en mampostería, garantizando los procesos de alineamiento, plomo y nivelación según los diseños arquitectónicos. Se reportaron dificultades por la escasez de mano de obra local en el sitio.

Alan Mosquera, — Residente Obra.
Residente Interventoría

20/12/2025

Se ejecutó la fundición de columnetas de apoyo y columnas de confinamiento para asegurar el correcto amarre estructural de los elementos de cerramiento. Así mismo, Se adelantaron trabajos de refuerzo en el andén posterior y lateral derecho mediante la ejecución de vigas de cimentación, medida necesaria para corregir asentamientos diferenciales y erosión por la pendiente del terreno.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

22/12/2025

Se adelantó el armado y preparación para la fundición de vigas de confinamiento y viga cinta en la parte superior de los muros, con el fin de mejorar la transmisión de cargas hacia la estructura metálica y la cubierta. Durante la jornada Se identificaron ítems no previstos inicialmente que requieren ser incorporados debido a las condiciones reales verifica-

INDUCONTABLES

das en campo.

Alun Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

23/12/2025

En la presente fecha se realizó la inspección técnica para el cierre del informe semanal, registrando un avance del ejecución del 42% frente a un programado del 80%. Se evaluó la necesidad de un nuevo diseño para el soporte del tanque de almacenamiento de agua para garantizar su estabilidad y funcionamiento por gravedad. Se recomendo al contratista continuar con el plan de choque y reforzar la cuadrilla con el personal no local para recuperar el atraso de obra

Alun Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra
