	FORMATO **GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	0
		FECHA	26/4/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	**4**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/1/2025	**FECHA INCIO**	2/4/2025
	ICCU-218-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/3/2025	**FECHA INCIO**	2/4/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VICGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901289190-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	“INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	ONCE (11) MESES o hasta el 31 de diciembre de 2025 (lo que primero ocurra), contados a partir del acta de inicio.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	ONCE (11) MESES o hasta el 31 de diciembre de 2025 (lo que primero ocurra), contados a partir del acta de inicio.				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N.A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N.A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N.A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N.A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N.A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N.A				
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2025 (Contrato de obra e interventoria).				
FORMA DE PAGO - OBRA	1.FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS: El sistema de pago del componente de caracterización de corredores viales y ensayos se realizará de la siguiente manera: a) Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. b) Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. c) Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. d) El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría.			**VALOR DEL CONTRATO**	$32.246.753.687,00

FORMA DE PAGO - OBRA	2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES: El sistema de pago del componente de obra de los corredores viales se realizará de la siguiente manera: a. En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. b. El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. c. Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe. Para su pago cada informe debe ser aprobado por LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN; el supervisor del contrato expedirá certificación de cumplimiento. Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3.246.753.087,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3.903.576.140,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1/07/2025 A 31/07/2025

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**NB-100367736 ANEXO 2 CERTIFICADO No. 72427007 CUMPLIMIENTO NB-100095036 ANEXO 2 CERTIFICADO No. 72427009 RCE COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	**2/4/2025**	**6/9/2026**	**$ 6.449.350.737,00**
Prestaciones sociales		**2/4/2025**	**9/3/2029**	**$ 1.612.337.684,35**
Estabilidad de la obra		**9/3/2026**	**8/3/2028**	**$ 9.674.026.106,10**
Responsabilidad civil		**2/4/2025**	**3/9/2026**	**$ 1.612.337.684,00**
Buen manejo del anticipo		**2/4/2025**	**9/3/2026**	**$ 9.674.026.106,10**
Calidad del servicio		**9/3/2026**	**9/3/2029**	**$ 725.674.942,25**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**310 47 994000014872, ANEXO 1, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**	**3/3/2025**	**30/6/2026**	**$ 585.536.421,00**
Prestaciones sociales		**3/3/2025**	**30/12/2028**	**$ 390.357.614,00**
Buen manejo del anticipo		**3/3/2025**	**30/6/2026**	**$ 780.715.228,00**
Calidad del servicio		**3/3/2025**	**31/12/2028**	**$ 780.715.228,00**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**Luis Fernando Rojas**
	Fecha diligenciamiento	**22/07/2025**

4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

A continuación, se relaciona un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2025:

-Durante el periodo reportado, el contratista adelantó actividades de laboratorio consistentes en la toma de muestras de suelo mediante apiques en los municipios de Nilo y Nariño, así como levantamientos topográficos en el municipio de Nilo.

-Se desarrollaron además tareas de procesamiento de información topográfica y ensayos de laboratorio correspondientes a las muestras obtenidas en los municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy, así como en las provincias del Alto Magdalena y Tequendama.


-Se avanzó en el componente SIG con la toma de foto ejes en los municipios de Cabrera, Pandi, Jerusalén, El Colegio, Anolaima, Viotá y Anapoima

-Se entregaron resultados de ensayos de granulometría, humedad, límites e índice de plasticidad y contenido de materia orgánica de las muestras del Sumapaz.

Sin embargo, no se registraron actividades de obra en campo en ninguna de las provincias durante este periodo.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION			
AVANCE FISICO DEL CONTRATO			**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**
	% PROGRAMADO A LA FECHA	**% EJECUTADO HASTA LA FECHA**	**DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)**
Acumulado anterior	6,15%	2,21%	-3,94%
Durante el periodo	0,35%	0,40%	0,06%
Acumulado Actual	6,49%	2,61%	-3,88%

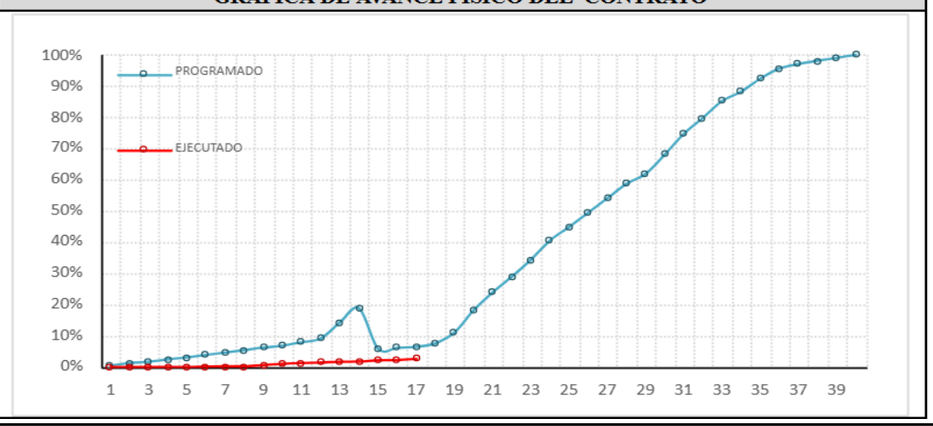

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	117,00	157,00	-10,63

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VICGER 2021	ECG INGENIERIA SAS
Anticipo	**$9.674.026.106,00**	**$780.715.228,00**
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5	$0,00	$0,00
Pago No. 6	$0,00	$0,00
Pago No. 7	$0,00	$0,00
Pago No. 8	$0,00	$0,00
Pago No. 9	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	**$9.674.026.106,00**	**$780.715.228,00**
Saldo Pendiente por Cancelar	**$22.572.727.581,00**	**$3.122.860.912,00**
Porcentaje de ejecución	30,00%	20,00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	**ECG INGENIERIA SAS**
	Fecha diligenciamiento	31/7/2025

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**NO**	**Chalecos**	**SI**
	Cascos	**NO**	**Otros**	**N.A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras Nilo



Toma de muestras Nariño



Reunión de seguimiento



Reunión de seguimiento



Recorrido de reconocimiento, Anapoima



Recorrido de reconocimiento, Anapoima



Estado actual de la vía



Estado actual de la vía


9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El avance del proyecto se mantiene en la fase de estudios y análisis de laboratorio, sin evidencia de ejecución física en campo, lo que limita el progreso general del contrato. Se recomienda al contratista programar y ejecutar las actividades de obra conforme al cronograma establecido, asegurando el inicio oportuno de los frentes de trabajo. Asimismo, se sugiere mantener la continuidad en la entrega de resultados de laboratorio y fortalecer la gestión técnica y administrativa para garantizar el cumplimiento de los plazos y metas contractuales.

10- ANEXOS

Se informa que en el expediente del contrato reposan los informes, actas de reuniones y comites realizados en desarrollo del contrato de obra ICCU 140 de 2025 para este periodo y que hacen parte de este informe.

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORO
Luis Fernando Rojas Cruz	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
Luz Angela Sanabria	SUBDIRECTORA TÉCNICA SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES / SUPERVISORA	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	4/08/2025	
