ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 9

PERIODO COMPRENDIDO DEL

7 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 6 DE ENERO DEL 2026

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (FDLPA)

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA


CONTRATO DE OBRA No. 846 DE 2024

EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

BOGOTÁ D.C.

TIPO DE DOCUMENTO	Informe Técnico No.9
FECHA	05/01/2026

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Residente de Obra	Director de Obra
Juan Carlos Aguirre	Julián Camilo Poveda
	
Firma	Firma

APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA

Aprobado por:
Representante Legal Interventoría
Santiago Carrillo Vargas
Firma

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
0	05/01/2026	Documento Inicial
1	15/04/2026	Correcciones

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. GENERALIDADES 6
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
2.1.1 Objeto del contrato 7
2.1.2 Información del contrato de obra 7
2.1.3 Información del contrato de interventoría 8
2.1.4 Localización del proyecto 9
2.1.5 Listado de segmentos viales a intervenir 9
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 12
3.1 PERSONAL CONTRACTUAL 12
3.2 PÓLIZAS 12
3.2.1 Pólizas contractuales 12
3.2.2 Pólizas Acta de inicio 13
3.3 ACTA DE INICIO 14
3.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO 14
3.5 CORRESPONDENCIA 14
3.5.1 Correspondencia Enviada 14
3.5.2 Correspondencia Recibida 15
4. GESTIÓN PRESUPUESTAL 15
4.1 ACTA PARCIAL DE OBRA 16
4.2 ACTAS ÍTEMS NO PREVISTOS 17
5. GESTIÓN FINANCIERA 17
5.1 ANTICIPO 17
5.2 CRONOGRAMA DE OBRA 17
6. GESTIÓN TÉCNICA 17
6.1 FECHAS DE INICIO SEGMENTOS VIALES 17
6.2 REUNIONES CON ESP 18
6.3 ACTIVIDADES DE OBRA 18
6.3.1 CIV 16001833 (CL 1C DESDE TV 53 BIS HASTA TV 53) 18
6.3.2 CIV 16001839 (TV 53 BIS ENTRE CL 1C Y CL 1 SUR) 18
6.3.3 CIV 16000124 (CL 18 ENTRE KR 55 Y KR 56) 19
6.3.4 CIV 16001124 (CL 15 ENTRE KR 35 Y KR 36) 19
6.3.5 CIV 16000696 (DG 5F BIS ENTRE TV 47 Y TV 48) 19
6.3.6 CIV 16000839 (KR 55 ENTRE CL 4B Y CL 4C BIS) 19
6.4 DISEÑO DE PAVIMENTOS 21

7. TRANSITO 22
7.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 22
8. CALIDAD 24
8.1 Plan de calidad 24
8.2 Ensayos y Densidades 24
9. CONCLUSIONES 25

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1.Información del contrato de obra. 7
Tabla 2.Información general del contrato de interventoría. 8
Tabla 3. Segmentos viales Contractuales. 9
Tabla 4.Segmento vial incluido en el contrato 10
Tabla 5.Segmentos viales incluidos para intervención total en la adición. 11
Tabla 6.Segmentos viales en evaluación por acciones de movilidad. 11
Tabla 7.Segmentos viales finales a intervenir. 11
Tabla 8.Porfesionales contractuales. 12
Tabla 9.Poliza de seguro de cumplimiento-Contractual 12
Tabla 10.Garantías de responsabilidad Civil-Contractual 13
Tabla 11. Póliza de seguro de cumplimiento-Acta de Inicio 13
Tabla 12. Garantías de responsabilidad Civil-Acta de Inicio 13
Tabla 13.Comites de seguimiento. 14
Tabla 14.Correspondencia Enviada. 14
Tabla 15.Correspondencia Recibida. 15
Tabla 16.Distribución del presupuesto del contrato. 15
Tabla 17.Listado actas parciales de obra 16
Tabla 18.Fechas de inicio segmentos viales. 18

Tabla 19.Diseños de pavimentos enviados. 21

Tabla 20,Diseños de pavimentos aprobados. 22

Tabla 21.Seguimiento PMT COP 846 de 2024 22

Tabla 22. Resultados ensayos de laboratorio 24

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Informes Semanales
Anexo 2. Acta de precios no previstos
Anexo 3. Ensayos de laboratorio
Anexo 4. Bitácoras de obra
Anexo 5. Minuta de adición y prórroga COP – 846 – 2024.

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones legales como empleador y las demás establecidas, el **CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA** elabora y presenta el **Informe técnico N°9**, correspondiente al periodo comprendido entre el **7 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 6 DE ENERO DEL 2026**, elaborado por el componente técnico del contratista, dentro del marco del contrato el Contrato No. 846 de 2024, cuyo objetivo es "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".
Dentro del presente se relacionará el alcance de cada uno de los siguientes aspectos:

- Generalidades del contrato 846-2024
- Gestión administrativa
- Gestión financiera
- Gestión presupuestal
- Gestión técnica
- Tránsito
- Calidad

2. GENERALIDADES

La Alcaldía Local de Puente Aranda con base en la necesidad de optimizar la movilidad en la localidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes y población flotante de las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) que la conforman, considero necesario contratar la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda. Este Proyecto tiene como objetivo alcanzar una meta física de intervención en 22 segmentos viales, logrando un mejoramiento significativo de la infraestructura vial de la localidad.

El contratista llevara a cabo las intervenciones viales de acuerdo con las especificaciones técnicas del IDU, las normas legales vigentes y los documentos contractuales. Además, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el plan de manejo ambiental (PMA) y el plan de manejo de Tráfico (PMT), asegurando que todas las actividades se realicen bajo los estándares de sostenibilidad y seguridad establecidos.

De esta manera, por medio de la adjudicación de la licitación FDLPA-LP-023-2024 se originó el contrato 846 del 2024.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1.1 Objeto del contrato

El Contrato No. 846 de 2024 tiene por objeto "*EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.*"

2.1.2 Información del contrato de obra

Tabla 1.Información del contrato de obra.

NUMERO DE CONTRATO	846 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.
LOCALIZACIÓN	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT	901.901.931-7
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.351.563.839
VALOR DE LA ADICION DEL CONTRATO	$3.175.781.919
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$9.527.345.758
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Ocho (8) Meses
PRORROGA	Tres (3) Meses
PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO	Once (11) Meses
FECHA DE INICIO	07 de abril del 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	06 de diciembre del 2025
FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06 de marzo de 2026

Fuente: Minuta del contrato

2.1.3 Información del contrato de interventoría

Tabla 2.Información general del contrato de interventoría.

NUMERO DE CONTRATO	CTO 850 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
NOMBRE INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025
NIT	901.929.491-1
REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO CARRILLO VARGAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 555.291.050
VALOR DE LA ADICION DEL CONTRATO	$225.450.312
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$780.741.362
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Ocho (8) Meses
PRORROGA	Tres (3) Meses
PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO	Once (11) Meses
FECHA DE INICIO	7 de abril de 2025
FECHA TERMINACIÓN	6 de diciembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	6 de marzo de 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda - FDLPA

Fuente: Minuta del contrato de interventoría

Se presenta una PRORROGA y una ADICIÓN al contrato suscrito, con una adición presupuestal de Tres mil ciento setenta y cinco millones setecientos ochenta y un mil novecientos diecinueve pesos ($3.175.781.919) y una prórroga de tiempo de tres (3) meses iniciando el 7 de diciembre de 2025.

2.1.4 Localización del proyecto

La localidad de Puente Aranda No 16 está ubicada en el centro de la ciudad y limita al norte con la localidad de Teusaquillo; al sur con la localidad de Tunjuelito; al oriente con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y al occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy.

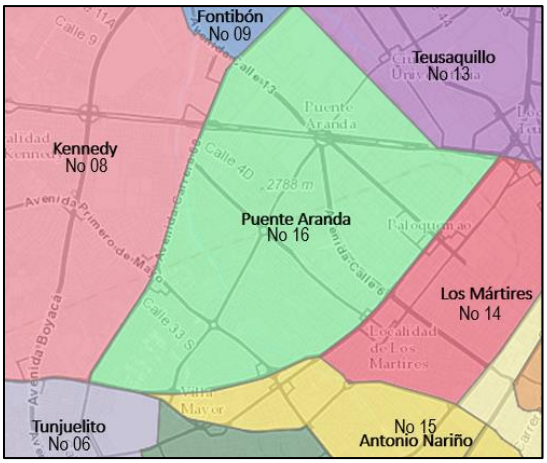


Ilustración 1.Localización general del proyecto.
Fuente:ARCGIS

2.1.5 Listado de segmentos viales a intervenir

A continuación, se relacionan lo segmentos viales contractuales correspondientes al contrato FDLPA-846-2024:

Tabla 3. Segmentos viales Contractuales.

No.	CIV	PK_ID	EJE	DESDE	HASTA
1	16001611	187710	CL5C	KR 39D	KR 40
2	16001664	187035	KR 39D	CL 5A	CL 5D
3	16000696	187769	DG 5F BIS	TV 47	TV 48
4	16000586	187770	DG 5F BIS	TV 48A	TV 48
5	16003772	185278	KR 39B	CL 29B SUR	29A SUR
6	16000124	189511	CL 18	KR 55	KR 56
7	16002911	186939	KR 30 A	AC 3	CL 4
8	16002866	186940	KR 30 A	CL 4	CL 4 BIS
9	16001545	188470	CL 2B	TV 53 A	KR 53B BIS
10	16001079	188061	KR 57A	CL 2B	TV 53 A
11	16002164	187517	CL 2D	KR 39	KR 39 A

12	16002834	185581	KR 51C	CL 24 S	AC 26 S
13	16003336	187260	CL 10 A S	KR 36	KR 37
14	16002708	186949	KR 31 A BIS	CL 4A	CL5
15	16000940	188548	CL 4A	KR 54	KR 55
16	16000839	188187	KR 55	CALLE 4B	CALLE 4CBIS
17	16001833	188405	CL 1C	TV 53BIS	TV 53
18	16001839	187820	TRANSVERSAL 53 BIS	CALLE 1 SUR	CALLE 1C
19	16002303	186854	KR 38 B BIS	CL 2B	CL 2C
20	16002253	186855	KR 38 B BIS	CL 2C	CL 2C BIS
21	16002241	186856	KR 38 B BIS	CL 2C BIS	CL 2D

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

El día 13 de mayo del 2025, mediante el oficio CIN-850-2024-013 interventoría aprobó la inclusión del segmento vial 16001124.

Tabla 4.Segmento vial incluido en el contrato.

No.	CIV	PK_ID	EJE	DESDE	HASTA
22	16001124	189329	CL15	KR 35	KR 36

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

Mediante el oficio COP-846-2024/034-2025, enviado por el contratista el día 07 de julio de 2025, se solicitó formalmente la prórroga y adición al contrato vigente, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades proyectadas y ampliar el alcance inicialmente establecido. Esta solicitud fue evaluada y aprobada por la interventoría el mismo día, 07 de julio de 2025, mediante el oficio CIN-850-2024-052, en el cual se dio visto bueno a los ajustes propuestos por el contratista, en concordancia con las necesidades del proyecto.

Adicionalmente, por solicitud expresa de la Alcaldía, se procederá a la inclusión de seis (6) nuevos segmentos viales dentro del alcance del contrato. De estos, tres (3) serán objeto de intervención total, con obras contempladas para su mejora integral (CIV´s 16002911, 16002708 y 16000940).

Tabla 5.Segmentos viales incluidos para intervención total en la adición.

No.	CIV	PK_ID	EJE	DESDE	HASTA
7	16002911	186939	KR 30 A	AC 3	CL 4
14	16002708	186949	KR 31 A BIS	CL 4A	CL5
15	16000940	188548	CL 4A	KR 54	KR 55

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

Los tres (3) segmentos restantes serán evaluados con el objetivo de identificar y proponer posibles acciones de movilidad que optimicen la circulación en dichos tramos, de acuerdo con los estudios técnicos que se realicen (CIV´s 16002303, 16002253 y 16002241).

Tabla 6.Segmentos viales en evaluación por acciones de movilidad.

No.	CIV	PK_ID	EJE	DESDE	HASTA
19	16002303	186854	KR 38 B BIS	CL 2B	CL 2C
20	16002253	186855	KR 38 B BIS	CL 2C	CL 2C BIS
21	16002241	186856	KR 38 B BIS	CL 2C BIS	CL 2D

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

De acuerdo con lo anterior, se presentan a continuación los segmentos viales priorizados a intervenir en el marco del contrato FDLPA-846-2024.

Tabla 7.Segmentos viales finales a intervenir.

No.	CIV	PK_ID	EJE	DESDE	HASTA
3	16000696	187769	DG 5F BIS	TV 47	TV 48A
4	16000586	187770	DG 5F BIS	TV 48A	TV 48
6	16000124	189511	CL 18	KR 55	KR 56
16	16000839	188187	KR 55	CALLE 4B	CALLE 4CBIS
17	16001833	188405	CL 1C	TV 53BIS	TV 53
18	16001839	187820	TV 53 BIS	CALLE 1 SUR	CALLE 1C
22	16001124	189329	CL15	KR 35	KR 36
7	16002911	186939	KR 30 A	AC 3	CL 4
14	16002708	186949	KR 31 A BIS	CL 4A	CL5
15	16000940	188548	CL 4A	KR 54	KR 55
19	16002303	186854	KR 38 B BIS	CL 2B	CL 2C

20	16002253	186855	KR 38 B BIS	CL 2C	CL 2C BIS
21	16002241	186856	KR 38 B BIS	CL 2C BIS	CL 2D

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 PERSONAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 3 del anexo técnico del proceso de contratación 846-2024, el día 12 de mayo del 2025 por medio de oficio COP-846-2024/022-2025 fueron radicadas a la interventoría las hojas de vida del personal profesional para la ejecución del contrato y estas fueron aprobadas mediante correo electrónico.

Tabla 8.Porfesionales contractuales.

CARGO	NOMBRE
Director de obra	Julián Camilo Poveda Moreno
Residente de obra	Juan Carlos Aguirre Gutiérrez
Especialista en pavimentos	Juan Ricardo Troncoso Rivera
Especialista en redes	Jorge Eliecer Ibarra Hernández
Especialista costos, presupuesto y programación	Héctor Ojeda
Profesional ambiental	Julieth Stefanny Ortiz Ortiz
Profesional social	Diana Marcela Sandoval Amaya

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

3.2 PÓLIZAS

Teniendo en cuenta la Cláusula 17 del contrato de obra FDLPA-846-2024, el Consorcio Vías de Puente Aranda presentó a la Interventoría y a la entidad las garantías que cubren cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, firmadas conforme al contrato.

3.2.1 Pólizas contractuales

Tabla 9.Poliza de seguro de cumplimiento-Contractual

DESCRIPCIÓN	PÓLIZA No.	VALOR	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de Contrato	66-44-101237057	$ 1.905.469.151,70	31/12/2024	28/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones	66-44-101237057	$ 635.156.383,90	31/12/2024	31/08/2028

Estabilidad y calidad de obra	66-44-101237057	$ 1.905.469.151,70	Tiene vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra entera	
Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipó	66-44-101237057	$ 2.540.625.353,60	31/12/2024	28/02/2026

Fuente: Póliza de seguro – Seguros del estado S.A

Tabla 10.Garantías de responsabilidad Civil-Contractual

DESCRIPCIÓN	PÓLIZA No.	VALOR	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	65-40-101079971	$ 711.750.000,00	31/12/2024	31/08/2025
Contratistas y Subcontratistas	65-40-101079971	$ 711.750.000,00	31/12/2024	31/08/2025
Vehículos propios y no propios	65-40-101079971	$ 711.750.000,00	31/12/2024	31/08/2025

Fuente: Póliza de seguro – Seguros del estado S.A

3.2.2 Pólizas Acta de inicio

Tabla 11. Póliza de seguro de cumplimiento-Acta de Inicio

DESCRIPCIÓN	PÓLIZA No.	VALOR	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de Contrato	66-44-101237057	$ 1.905.469.151,70	07/04/2025	05/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones	66-44-101237057	$ 635.156.383,90	07/04/2025	06/12/2028
Estabilidad y calidad de obra	66-44-101237057	$ 1.905.469.151,70	Tiene vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra entera	
Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipó	66-44-101237057	$ 2.540.625.353,60	07/04/2025	05/06/2026

Fuente: Póliza de seguro – Seguros del estado S.A

Tabla 12. Garantías de responsabilidad Civil-Acta de Inicio

DESCRIPCIÓN	PÓLIZA No.	VALOR	VIGENCIA	
			Desde	Hasta

Predios, labores y operaciones	65-40-101079971	$	711.750.000,00	07/04/2025	06/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	65-40-101079971	$	711.750.000,00	07/04/2025	06/12/2025
Vehículos propios y no propios	65-40-101079971	$	711.750.000,00	07/04/2025	06/12/2025

Fuente: Póliza de seguro – Seguros del estado S.A

3.3 ACTA DE INICIO

El acta de inicio se suscribió el día 7 de abril del 2025 entre el representante legal del Consorcio Vias de Puente Aranda; el señor Rafel Eduardo Montes Navas, y el señor alcalde Local de Puente Aranda; Víctor Alfonso Cruz Sánchez.

3.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO

A la fecha del presente informe, se realizaron los siguientes comités de seguimiento en conjunto con interventoría y supervisión del contrato:

Tabla 13.Comites de seguimiento.

No COMITÉ	FECHA
20	10 de diciembre de 2025
21	17 de diciembre de 2025

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

3.5 CORRESPONDENCIA

Durante este período, se recibió y radicó la correspondencia que se detalla en el Anexo 4 del presente informe.

3.5.1 Correspondencia Enviada

Tabla 14.Correspondencia Enviada.

No CONSECUTIVO DE ENVIÓ	FECHA DE RADICACIÓN Y/O ENTREGA	DIRIGIDO A:	ASUNTO Y RESUMEN DEL DOCUMENTO
COP-846-2024-073 - 2025	20/11/2025	CONSORCIO PAVIAS CIN 850-2024	ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS N° 3
COP-846-2024-074-2025	20/11/2025	CONSORCIO PAVIAS CIN 850-2024	RESPUESTA PQR # 13

No CONSECUTIVO DE ENVIÓ	FECHA DE RADICACIÓN Y/O ENTREGA	DIRIGIDO A:	ASUNTO Y RESUMEN DEL DOCUMENTO
COP-846-2024-080-2025	17/12/2025	CONSORCIO PAVIAS CIN 850-2024	RESPUESTA PQR # 14
COP-846-2024-081 - 2025	17/11/2025	CONSORCIO PAVIAS CIN 850-2024	RESPUESTA PQR # 16
COP-846-2024-082 - 2025	26/12/2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	RESPUESTA OFICIO DE INCUMPLIMIENTO
COP-846-2024-083 - 2025	26/12/2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	RESPUESTA OFICIO DE INCUMPLIMIENTO
COP-846-2024-084 - 2026	05/01/2026	CONSORCIO PAVIAS CIN 850-2024	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN
COP-846-2024-085 - 2026	05/01/2026	CONSORCIO PAVIAS CIN 850-2024	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN
COP-846-2024-086 - 2026	05/01/2026	CONSORCIO PAVIAS CIN 850-2024	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

3.5.2 Correspondencia Recibida

Tabla 15.Correspondencia Recibida.

No CONSECUTIVO DE ENVÍO	FECHA DE RADICACIÓN Y/O ENTREGA	RECIBIDO DE:	ASUNTO Y RESUMEN DEL DOCUMENTO
CIN-850-2024-121	11/12/2025	CONSORCIO PAVIAS CIN 850-2024	OBSERVACIONES DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN
CIN-850-2024-125	18/12/2025	CONSORCIO PAVIAS CIN 850-2024	OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO 8

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

4. GESTIÓN PRESUPUESTAL

El contrato 846 del 2025 cuenta con un presupuesto de $9.527.345.758 (NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO M/C), el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Tabla 16.Distribución del presupuesto del contrato.

COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS INICIALES	**$**	**6.232.781.806,57**
AIU	$	1.511.449.588,09
	$	62.327.818,07

	$	249.311.272,26
COSTO DIRECTO DE OBRA + AIU	**$**	**8.150.366.954,99**
PRESUPUESTO PARA EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO OBRAS INICIALES	$	142.649.677,21
PRESUPUESTO DE DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE OBRA INICIALES + IVA	$	376.311.119,96
PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO OBRAS INICIALES	$	177.771.402,69
	$	**696.732.199,86**
TOTAL	**$**	**8.847.099.154,85**
VALOR OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (VALOR QUE PROPONDRÁ EL PROPONENTE DE TAL FORMA QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEA IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL POR EL CUAL SE VA A SUSCRIBIR EL CONTRATO	$	680.246.603,15
VALOR TOTAL CONTRATO	**$**	**9.527.345.758,00**

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

4.1 ACTA PARCIAL DE OBRA

Tabla 17.Listado actas parciales de obra

CONCEPTO	VALOR ACTA PARCIAL	VALOR AMORTIZADO 40%	VALOR A PAGAR	% AVANCE
Acta parcial de obra No. 1 7 de abril al 6 de julio de 2025	$ 1.455.835.103,00	$ 582.334.041,00	$ 873.501.062,00	15,28%
Acta parcial de obra No. 2 7 de julio al 6 de agosto de 2025	$ 1.039.176.945,00	$ 415.670.778,00	$ 623.506.167,00	10,91%
Acta parcial de obra No. 3 7 de agosto al 6 de septiembre de 2025	$ 1.320.839.426,00	$ 528.335.770,00	$ 792.503.656,00	13,86%
Acta parcial de obra No. 4 7 de septiembre al 6 de octubre de 2025	$ 1.159.518.716,00	$ 464.883.168,00	$ 694.635.548,00	12,17%

Acta parcial de obra No. 5 7 de octubre al 6 de noviembre de 2025	$ 1.026.595.815,00	$ 410.638.326,00	$ 615.957.489,00	10,78%
Acta parcial de obra No. 6 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2025	$ 1.178.305.883,00	$ 139.839.135,00	$ 1.038.466.748,00	12.37%

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

4.2 ACTAS ÍTEMS NO PREVISTOS

Se remitió el Acta de Fijación de Precios Unitarios No previstos No.1 mediante el oficio COP-846-2024/031-2025 el día 19 de junio del 2025. Y el Acta de Fijación de Precios Unitarios No previstos No.2 mediante el oficio COP-846-2024/042-2025 el día 22 de julio de 2025. Estos se encuentran en el Anexo 2: Acta No previstos

El 20 de noviembre de 2025, se presentó a la interventoría bajo el oficio COP-846-2024-073-2025, el Acta de Fijación de Precios Unitarios No Previstos No. 3

5. GESTIÓN FINANCIERA

5.1 ANTICIPO

Teniendo en cuenta la cláusula 6 del contrato de obra, el CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA suscribió un contrato con la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. el día 28 de enero del 2025 para el manejo del anticipo, correspondiente al 40% del valor total del contrato contractual, es decir, $2.540.625.535,60 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL M/C).

5.2 CRONOGRAMA DE OBRA

A la fecha del presente informe se envió la programación de obra actualizada el día 09 de septiembre de 2025 bajo el oficio “COP-846-2024-056 ENTREGA DE BALANCE Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.”

6. GESTIÓN TÉCNICA

6.1 FECHAS DE INICIO SEGMENTOS VIALES

A la fecha del presente informe, se presentan a continuación las fechas de inicio correspondientes a cada segmento vial del contrato FDLPA-846-2024.

Tabla 18.Fechas de inicio segmentos viales.

No.	CIV	EJE	DESDE	HASTA	FECHA DE INICIO
17	16001833	CL 1C	TV 53BIS	TV 53	27/05/2025
18	16001839	TV 53 BIS	CALLE 1 SUR	CALLE 1C	27/05/2025
6	16000124	CL 18	KR 55	KR 56	16/06/2025
22	16001124	CL15	KR 35	KR 36	16/06/2025
3	16000696	DG 5F BIS	TV 47	TV 48A	10/07/2025
4	16000586	DG 5F BIS	TV 48A	TV 48	10/07/2025
16	16000839	KR 55	CL 4B	CL 4C BIS	25/08/2025
14	16002708	KR 31A BIS	CL 4A	CL 5	04/11/2025
7	16002911	KR 30A	CL 4	AC 3	21/10/2025
19	16002303	KR 38 B BIS	CL 2B	CL 2C	10/11/2025
20	16002253	KR 38 B BIS	CL 2C	CL 2C BIS	10/11/2025
21	16002241	KR 38 B BIS	CL 2C BIS	CL 2D	10/11/2025

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

6.2 REUNIONES CON ESP

Se realizó un recorrido inicial con un funcionario de VANTI S.A.S. el día 20 de junio de 2025 en los CIV 16001124 y 16000124. Posteriormente, se efectuó un segundo recorrido en el CIV 16000124 con el propósito de localizar la red de acero de 4”.

El día 7 de noviembre de 2025 se realizó recorrido y verificación con el acueducto (EAAB) en el frente de Colon 16000839 con el fin de detectar una fuga de agua potable que se filtraba al banco ducto que atraviesa el segmento.

6.3 ACTIVIDADES DE OBRA

En el período cubierto por el presente informe, se detallan las obras ejecutadas en los siguientes segmentos viales:

6.3.1 CIV 16001833 (CL 1C DESDE TV 53 BIS HASTA TV 53)

- Limpieza y orden en el tramo

6.3.2 CIV 16001839 (TV 53 BIS ENTRE CL 1C Y CL 1 SUR)

- Limpieza y orden en el tramo

6.3.3 CIV 16000124 (CL 18 ENTRE KR 55 Y KR 56)

- Limpieza y orden en el tramo

6.3.4 CIV 16001124 (CL 15 ENTRE KR 35 Y KR 36)

- Instalación de cajillas
- Instalación de concreto en hombros
- Instalación de concreto 3000 PSI en andenes
- Estampado de espacio publico
- Instalación de aceros de refuerzo (segundo costado)
- Instalación de parrillas de refuerzo para áreas irregulares en vía
- Instalación y amarre de canastillas pasa juntas para concreto en vía
- Instalación de concreto MR-45 en vía
- Fundida de viga de confinamiento
- Corte de pavimento para delimitación de vía
- Sello de juntas en concreto MR-45

6.3.5 CIV 16000696 (DG 5F BIS ENTRE TV 47 Y TV 48)

- Instalación de concreto 3000 PSI en andenes
- Estampado adoquín y toperol en andenes
- Verificación de niveles de base estabilizada
- Nivelación de pozos y sumideros
- Instalación de mezcla asfáltica MDC-25 (Primera capa)
- Limpieza y orden del tramo

6.3.6 CIV 16000839 (KR 55 ENTRE CL 4B Y CL 4C BIS)

- Instalación de concreto 3000PSI en andenes
- Estampado de andenes con adoquín y toperol
- Nivelación de placa cubierta y sumideros

- Corte de concreto para dilataciones
- Sello de juntas con Sika road y VULKEM
- Verificación de niveles de base estabilizada

6.3.7 CIV 16002708 (KR 31A BIS ENTRE CL 4A Y CL 5)

- Excavación mecánica para construcción de pozos
- Instalación de triturado ¾" para tubería y placa fondo
- Instalación de placa fondo
- Instalación de red residual principal de 10"
- Instalación de acometidas residuales 6"
- Excavación mecánica para instalación de redes principales (pluvial y residual)
- Instalación de red pluvial 12"
- Construcción de cárcamo de protección para red pluvial

6.3.8 CIV 16002911 (KR 30A ENTRE CL 4 Y AC 3)

- Instalación de Base granular
- Mejoramiento de base con cemento y aditivo
- Corte de concreto en andenes para cintas de ajuste
- Excavación manual en cintas de ajuste
- Instalación de base en andenes
- Instalación de tubería 12" para conexión a sumideros
- Compactación de base granular
- Orden y aseo del tramo

6.3.9 CIV 16002253 – 16002303 - 16002241 (KR 38B BIS ENTRE CL 2B Y CL 2D)

- Instalación de mezcla asfáltica MDC-19

6.3.10 CIV 16000940 (CL 4A ENTRE KR 54 Y KR 55)

- Demolición de carpeta asfáltica
- Excavación mecánica para cajeo de vía

- Demolición de sardinel existente
- Corte de concreto en andenes
- Demolición de andenes
- Instalación de Geotextil
- Instalación de Geocelda
- Llenos de Geocelda con sub base granular
- Instalación de sardinel A10
- Instalación de bajo rampa

Para el período correspondiente al siguiente informe, se elaboraron informes semanales detallados en los que se especifican las actividades realizadas para cada CIV, junto con sus respectivas proyecciones. Dichos informes se encuentran adjuntos en el Anexo 1. Informes semanales.

6.4 DISEÑO DE PAVIMENTOS

El consorcio emitió a la interventoría la versión definitiva de los diseños de pavimento por medio de correo electrónico el día 13 de mayo del 2025 bajo el oficio COP-846-2024/023-2025, se presentaron los siguientes diseños:

Tabla 19.Diseños de pavimentos enviados.

No	CIV	CÓDIGO	INFORME DE DISEÑO
22	16001124	GT02-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la calle15 entre carrera 35 y carrera 36
17	16001833	GT03-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la calle 1C entre transversal 53 y transversal 53 Bis, transversal 53 Bis entre calle 1 Sur y calle 1C
18	16001839		
6	16000124	GT04-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la calle 18 entre carrera 55 y carrera
3	16000696	GT05-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la diagonal 5F BIS entre transversal 47 y transversal 48A
4	16000586		
16	16000839	GT06-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la Carrera 55 entre calle 4B y Calle 4C Bis
14	16002708	GT07-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la carrera 31A Bis entre Calle 4A y Calle 5
12	16002834	GT08-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la carrera 51C entre calle 24 Sur y avenida calle 26 Sur

No	CIV	CÓDIGO	INFORME DE DISEÑO
10	16001079	GT09-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la carrera 57A entre calle 2B y transversal 53A

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

Los siguientes diseños fueron aprobados el día 5 de junio del 2025 por medio del oficio CIN-850-2024-030, CIN-850-2024-031, CIN-850-2024-032, CIN-850-2024-033 y CIN-850-2024-034.

Tabla 20,Diseños de pavimentos aprobados.

No	CIV	CÓDIGO	INFORME DE DISEÑO
22	16001124	GT02-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la calle15 entre carrera 35 y carrera 36
17	16001833	GT03-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la calle 1C entre transversal 53 y transversal 53 Bis, transversal 53 Bis entre calle 1 Sur y calle 1C
18	16001839		
6	16000124	GT04-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la calle 18 entre carrera 55 y carrera
3	16000696	GT05-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la diagonal 5F BIS entre transversal 47 y transversal 48A
4	16000586		
16	16000839	GT06-CVPA-V0	Diseño de pavimento de la Carrera 55 entre calle 4B y Calle 4C Bis

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

7. TRANSITO

7.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la fecha final del periodo que comprende el presente informe, se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados y vigentes.

Tabla 21.Seguimiento PMT COP 846 de 2024

NOMBRE DE TRAMO (BARRIO)	CIV´S	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		FECHA DE PRIMERA AMPLIACIÓN		FECHA DE SEGUNDA AMPLIACIÓN		ESTADO	DESCRIPCIÓN
			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
SAN FRANCISCO OCCIDENTAL	16000696	DG 5F BIS ENTRE TV 47 Y TV 48A	30/05/2025	19/06/2025	22/08/2025	18/12/2025	N/A	N/A	ACTIVO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

NOMBRE DE TRAMO (BARRIO)	CIV´S	DIRECCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		FECHA DE PRIMERA AMPLIACIÓN		FECHA DE SEGUNDA AMPLIACIÓN		ESTADO	DESCRIPCIÓN
			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
SAN FRANCISCO OCCIDENTAL	16000586	DG 5F BIS ENTRE TV 48A Y TV 48	30/05/2025	19/06/2025	22/08/2025	18/12/2025	N/A	N/A	CERRADO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
ESTACIÓN CENTRAL	16001124	CL15 ENTRE KR 35 Y KR 36	30/05/2025	19/06/2025	29/08/2025	18/12/2025	N/A	N/A	CERRADO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
PUENTE ARANDA	16000124	CL 18 ENTRE KR 55 Y KR 56	30/05/2025	19/06/2025	22/08/2025	18/12/2025	N/A	N/A	CERRADO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
CAMELIA	16001839	TV 53 BIS ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE 1C	23/05/2025	24/07/2025	15/08/2025	18/12/2025	N/A	N/A	CERRADO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
CAMELIA	16001833	CL 1C ENTRE TV 53BIS Y TV 53	23/05/2025	24/07/2025	15/08/2025	18/12/2025	N/A	N/A	CERRADO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
COLON	16000839	KR 55 ENTRE CALLE 4B Y CALLE 4CBIS	15/08/2025	18/12/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	CERRADO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
VERAGUAS	16002708	KR 31A BIS ENTRE CL 4A Y CL 5	03/10/2025	29/01/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	ACTIVO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
VERAGUAS	16002911	KR 30A ENTRE CL 4 Y AC 3	03/10/2025	29/01/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	CERRADO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
JORGE GAITÁN CORTEZ	16002303 16002253 1662241	KR 38B BIS ENTRE CL 2B Y CL 2D	28/11/2025	08/01/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	CERRADO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
COLON	16000940	CL 4A ENTRE KR 54 Y KR 55	14/11/2025	08/01/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	CERRADO	CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

8. CALIDAD

8.1 Plan de calidad

El CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA remitió a la interventoría el Plan de Calidad el día 5 de mayo de 2025, mediante el oficio No. COP-846-2024/017/2025. Dicho plan fue aprobado el 17 de junio de 2025, mediante el oficio No. CIN-850-2024-043.

8.2 Ensayos y Densidades

Durante el periodo comprendido entre el 07 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 se realizaron los siguientes ensayos:

Tabla 22. Resultados ensayos de laboratorio

FECHA DEL ENSAYO	CIV	MÉTODO	ENSAYO	RESULTADO MODULO RESILIENTE		
22/12/2025	16000696 - 0586	ASTM E2583	Deflector de Impacto Liviano (LWD)	270.4	371.3	210.5

Fuente: Elaboración Consorcio Vias de Puente Aranda

9. CONCLUSIONES

- El Plan de Calidad fue revisado y aprobado por la interventoría, cumpliendo con los estándares y requisitos establecidos en el contrato.
- A la fecha del presente informe se han presentado y aprobado las actas parciales de cobro 1 a 6 del contrato.
- Se llevaron a cabo las reuniones necesarias y para la correcta ejecución de todos los frentes de obra con las diferentes entidades.
- Se realizo la instalación de asfalto en el frente ACCIONES DE MOVILIDAD habilitando y mejorando la movilidad para la comunidad
- Se culmino la instalación de concreto para vía en el frente 1 CALLE 15 16001124
- Se dio inicio a la instalación de asfalto en el Frente de obra No. 4 (DG 5F)
- Se presento el Acta de Fijación de Precios Unitarios No previstos No.3

ANEXO 1. INFORMES SEMANALES

ANEXO 2. ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS

ANEXO 3. ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 4. BITÁCORAS DE OBRA

ANEXO 5. MINUTA DE PRÓRROGA Y ADICIÓN COP – 846 – 2024.

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT. 901901931-7

INFORME SEMANAL

OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Informe No.	29			
Periodo evaluado	Desde:	8/12/2025	Hasta:	13/12/2025

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	846 DE 2024
Fecha de Inicio:	lunes, 7 de abril de 2025
Fecha de Terminación	sábado, 6 de diciembre de 2025
Plazo Inicial	8 meses
Adiciones	3 meses
Fecha de Terminación final	viernes, 6 de marzo de 2026

2. INFORMACIÓN DE PERSONAL

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS	
N.A.	N.A.

PERSONAL EN LA OBRA	
DIRECTOR DE OBRA	1
INSPECTOR DE OBRA	1
RESIDENTES	4
ESPECIALISTA DE OBRA	3
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
AREA SISOMA	1
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1
AREA SOCIAL	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**14**
TOTAL PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA OBRA	**15**
TOTAL GENERAL	**29**

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

CIV	% EJECUTADO X CIV	% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO	% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO
16001124	84,00%	13,94%	**11,71%**
16001839	100,00%	24,76%	**24,76%**
16001833	100,00%	4,38%	**4,38%**
16000124	100,00%	7,34%	**7,34%**
16000696	86,00%	7,56%	**6,50%**
16000586	60,00%	1,12%	**0,67%**
16000839	72,00%	10,55%	**7,60%**
16002708	23,00%	11,60%	**2,67%**
16000940	15,00%	3,69%	**0,55%**
16002911	56,00%	5,12%	**2,87%**
ACCIONES MOVILIDAD			**0,00%**
16002303	85%	0,62%	**0,53%**
16002253	85%	0,24%	**0,20%**
16002241	85%	0,37%	**0,31%**
PKID 16000146	100%	0,14%	**0,14%**
PKID 16000120 - 32	0%	0,12%	**0,00%**
PKID 16000120 - 33	0%	2,67%	**0,00%**
CRUCE P.A	100%	0,82%	**0,82%**
16000533 P.A	0%	1,27%	**0,00%**
SEÑALIZACIÓN/RUBRO	0%	3,69%	**0,00%**
TOTAL		100,0%	71,1%


PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	245	251	-6
Prorroga	90	0	90
TOTAL	335	251	84

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

TIEMPO	Días	FECHA TERMINACIÓN OBRA	% TIEMPO TRANSCURRIDO
13-dic-25	251,00	6-mar-26	74,93%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

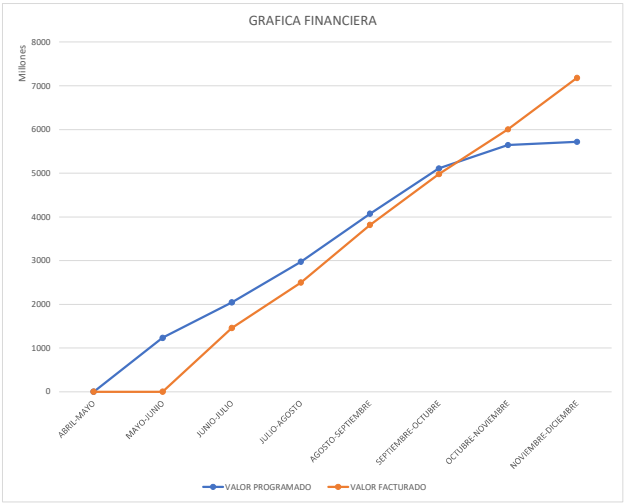

4. CONTROL DE COSTOS

CONTRATO DE OBRA

ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 6.351.563.839,00	$ 6.351.563.839,00	$ 7.180.271.888,00	75,36%
OBRAS ADICIONALES	N/A	$ 3.175.781.919,00	N/A	N/A
TOTAL	$ 6.351.563.839,00	$ 9.527.345.758,00	$ 7.180.271.888,00	75,36%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CIV 16001124 - ESTACION CENTRAL

1. Instalación de acero de refuerzo en rampas y areas irregulares de anden
2. Instalación de concreto en costado norte
3. Estampado de concreto
4. Limpieza y ordén

CIV 16000839 - COLON

1. Instalación de sardinel y conformación de espacio publico
2. Instalación de concreto y estampado en anden
3. Ordén y aseo de tramo

CIV 16000696-SAN FRANCISCO OCCIDENTAL

CIV 16002911 - VERAGUAS

1. Instalación de concreto en cintas de ajuste 2. Nivelación y compactación de espacio publico	1. Instalación de sardinel y bajo rampa 2. Instalación de sumideros 3. Instalación de malla multiaxial 4. Instalación de base granular estabilizada con cemento y aditivo 5. Ordén y aseo en el tramo
CIV 16002708 - VERAGUAS II	**CIV 16002303 - 16002253 - 16002241 - JORGE GAITAN CORTES**
1. Excavación para cambio de red residual 2. Instalación de red principal residual 10" y acometidas 6" 3. Construcción de pozos 4. Instalación de tuberia pluvial 5. Construcción de carcamo red pluvial 6. Orden y aseo del tramo	1. Nivelación y compactación de base granular 2. Ensayos LWD 3. Orden y aseo
CIV 16000940 - COLON II	
1. Instalación de sardinel 2. Limpieza de sumideros 3. Ordén y aseo del tramo	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 16001124



CIV 16001124



CIV 16001124



CIV 16001124



CIV 16001124



CIV 16001124

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT. 901901931-7

INFORME SEMANAL

	
CIV 16000696	**CIV 16000696**
	
CIV 16002708	**CIV 16002708**
	
CIV 16002708	**CIV 16002708**
	
CIV 16002708	**CIV 16002708**

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA NIT. 901901931-7	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ



CIV 16000940



CIV 16000940



CIV 16000940



CIV 16000940



CIV 16000839



CIV 16000839


CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA NIT. 901901931-7	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ



CIV 16000839



CIV 16000839

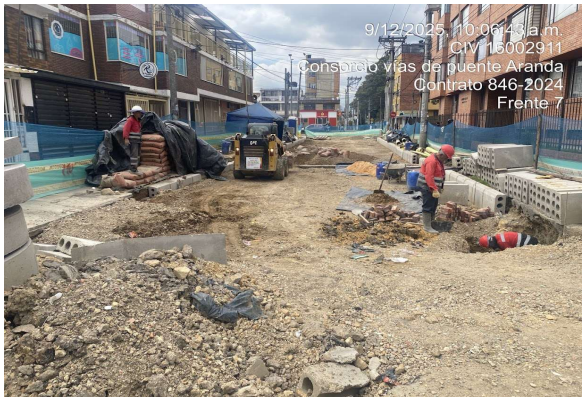

CIV 16002911



CIV 16002911



CIV 16002911




CIV 16002911

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT. 901901931-7

INFORME SEMANAL



CIV 16002911

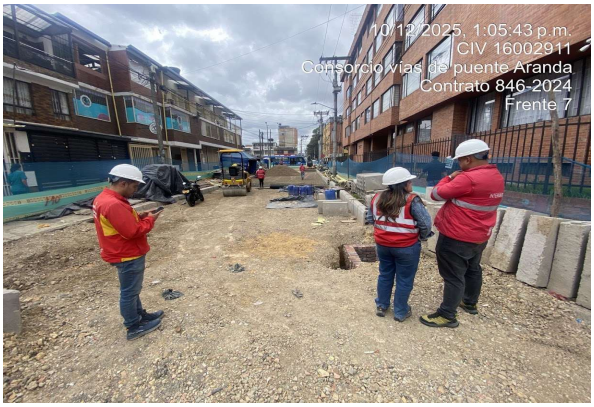

CIV 16002911



16002303 - 16002253 - 16002241



16002303 - 16002253 - 16002241



16002303 - 16002253 - 16002241



16002303 - 16002253 - 16002241

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

RESPONSABLE		
NOMBRE	JULIAN CAMILO POVEDA	**FECHA**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	13/12/2025
FIRMA		

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT. 901901931-7

INFORME SEMANAL

OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Informe No.	30			
Periodo evaluado	Desde:	15/12/2025	Hasta:	20/12/2025

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	846 DE 2024
Fecha de Inicio:	lunes, 7 de abril de 2025
Fecha de Terminación	sábado, 6 de diciembre de 2025
Plazo Inicial	8 meses
Adiciones	3 meses
Fecha de Terminación final	viernes, 6 de marzo de 2026

2. INFORMACIÓN DE PERSONAL

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS	
N.A.	N.A.

PERSONAL EN LA OBRA	
DIRECTOR DE OBRA	1
INSPECTOR DE OBRA	1
RESIDENTES	4
ESPECIALISTA DE OBRA	3
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
AREA SISOMA	1
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1
AREA SOCIAL	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**14**
TOTAL PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA OBRA	**15**
TOTAL GENERAL	**29**

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

CIV	% EJECUTADO X CIV	% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO	% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO
16001124	84.00%	13.94%	**11.71%**
16001839	100.00%	24.76%	**24.76%**
16001833	100.00%	4.38%	**4.38%**
16000124	100.00%	7.34%	**7.34%**
16000696	86.00%	7.56%	**6.50%**
16000586	70.00%	1.12%	**0.78%**
16000839	80.00%	10.55%	**8.44%**
16002708	30.00%	11.60%	**3.48%**
16000940	40.00%	3.69%	**1.48%**
16002911	70.00%	5.12%	**3.58%**
ACCIONES MOVILIDAD			**0.00%**
16002303	99%	0.62%	**0.61%**
16002253	99%	0.24%	**0.24%**
16002241	99%	0.37%	**0.37%**
PKID 16000146	100%	0.14%	**0.14%**
PKID 16000120 - 32	0%	0.12%	**0.00%**
PKID 16000120 - 33	0%	2.67%	**0.00%**
CRUCE P.A	100%	0.82%	**0.82%**
16000533 P.A	0%	1.27%	**0.00%**
SEÑALIZACIÓN/RUBRO	0%	3.69%	**0.00%**
TOTAL		100.0%	74.6%


PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	245	258	-13
Prorroga	90	0	90
TOTAL	335	258	77

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

TIEMPO	Días	FECHA TERMINACIÓN OBRA	% TIEMPO TRANSCURRIDO
20-dic-25	258.00	6-mar-26	77.01%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

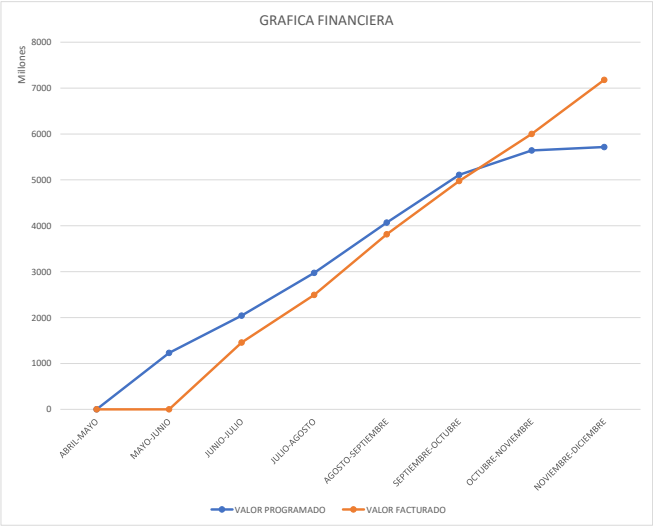

4. CONTROL DE COSTOS

CONTRATO DE OBRA

ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 6,351,563,839.00	$ 6,351,563,839.00	$ 7,180,271,888.00	75.36%
OBRAS ADICIONALES	N/A	$ 3,175,781,919.00	N/A	N/A
TOTAL	$ 6,351,563,839.00	$ 9,527,345,758.00	$ 7,180,271,888.00	75.36%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CIV 16001124 - ESTACION CENTRAL

1. Corte y figurado de acero
2. Instalación de acero de refuerzo en losas
3. Limpieza y despeje de pista

CIV 16000940 - COLON II

1. Instalación de sardinel y bajo rampa
2. Instalación de Geotextil y Geocelda
3. Instalación de sub base granular reciclada

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA NIT. 901901931-7	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

CIV 16000696-SAN FRANCISCO OCCIDENTAL	CIV 16002911 - VERAGUAS I
1. Instalación de concreto en cintas de ajuste 2. Se realiza CCTV y vactor en redes 3. Limpieza y despeje de pista	1. Instalación de Geomalla 2. Instalación de base granular mejorada con cemento y aditivo 3. Corte de pavimento para empalme de CIV
CIV 16000586-SAN FRANCISCO OCCIDENTAL	**CIV 16002708 - VERAGUAS II**
1. Instalación de concreto en anden 2. Extensión de material granular (Base estabilizada) 3. Nivelación y compactación	1. Excavación mecanica para instalación de red residual 2. Instalación de red principal de 10" 3. Instalación de acometidas 6" 4. Construcción de pozos 5. Construcción de carcamo red pluvial
CIV 16000839 - COLON I	**CIV 16002303 - 16002253 - 16002241 - JORGE GAITAN CORTES**
1. Instalación de concreto en andenenes 2. Cañuela en pozos 3. Limpieza y depeje de pista	1. Instalación de asfalto 2. Limpieza y orden

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 16001124



CIV 16001124




CIV 16001124




CIV 16001124




CIV 16001124

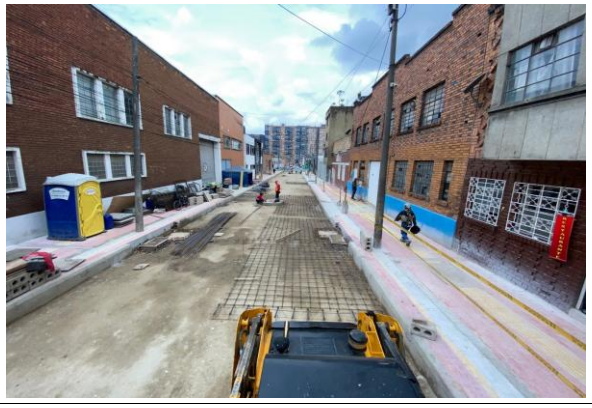

CIV 16001124

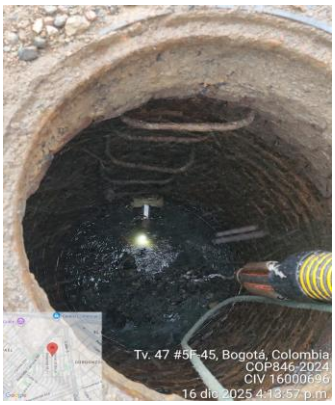	
CIV 16000696	**CIV 16000696**
	
CIV 16000696	**CIV 16000696**
	
CIV 16000586	**CIV 16000586**
	
CIV 16000839	**CIV 16000839**

	
CIV 16000839	**CIV 16000839**
	
CIV 16000940	**CIV 16000940**
	
CIV 16000940	**CIV 16000940**

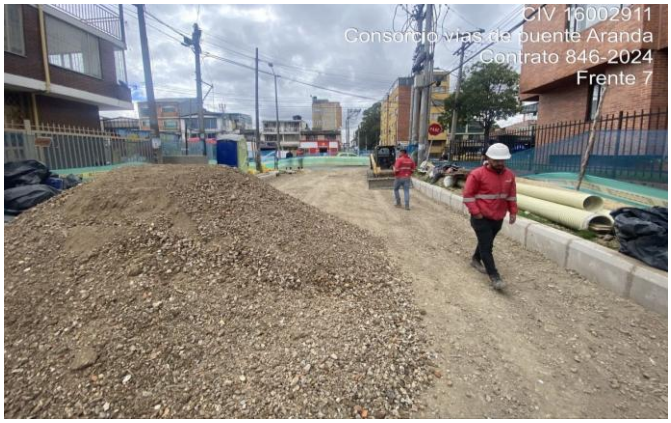
	
CIV 16002911	**CIV 16002911**
	
CIV 16002708	**CIV 16002708**
	
CIV 16002708	**CIV 16002708**

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT. 901901931-7

INFORME SEMANAL



CIV 16002303

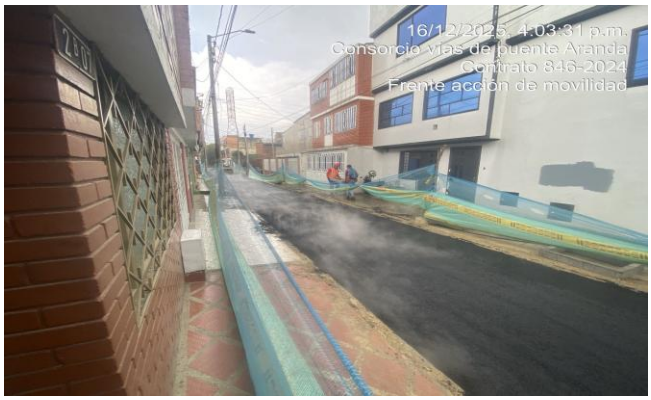

CIV 16002303



CIV 16002253



CIV 16002253



CIV 16002241



CIV 16002241

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

RESPONSABLE		
NOMBRE	JULIAN CAMILO POVEDA	**FECHA**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	20/12/2025
FIRMA		

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT. 901901931-7

INFORME SEMANAL

OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Informe No.	31			
Periodo evaluado	Desde:	22/12/2025	Hasta:	27/12/2025

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	846 DE 2024
Fecha de Inicio:	lunes, 7 de abril de 2025
Fecha de Terminación	sábado, 6 de diciembre de 2025
Plazo Inicial	8 meses
Adiciones	3 meses
Fecha de Terminación final	viernes, 6 de marzo de 2026

2. INFORMACIÓN DE PERSONAL

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS	
N.A.	N.A.

PERSONAL EN LA OBRA	
DIRECTOR DE OBRA	1
INSPECTOR DE OBRA	1
RESIDENTES	4
ESPECIALISTA DE OBRA	3
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
AREA SISOMA	1
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1
AREA SOCIAL	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**14**
TOTAL PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA OBRA	**15**
TOTAL GENERAL	**29**

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

CIV	% EJECUTADO X CIV	% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO	% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO
16001124	90.00%	13.94%	**12.55%**
16001839	100.00%	24.76%	**24.76%**
16001833	100.00%	4.38%	**4.38%**
16000124	100.00%	7.34%	**7.34%**
16000696	92.00%	7.56%	**6.96%**
16000586	70.00%	1.12%	**0.78%**
16000839	81.00%	10.55%	**8.55%**
16002708	31.00%	11.60%	**3.60%**
16000940	41.00%	3.69%	**1.51%**
16002911	72.00%	5.12%	**3.69%**
ACCIONES MOVILIDAD			**0.00%**
16002303	99%	0.62%	**0.61%**
16002253	99%	0.24%	**0.24%**
16002241	99%	0.37%	**0.37%**
PKID 16000146	100%	0.14%	**0.14%**
PKID 16000120 - 32	0%	0.12%	**0.00%**
PKID 16000120 - 33	0%	2.67%	**0.00%**
CRUCE P.A	100%	0.82%	**0.82%**
16000533 P.A	0%	1.27%	**0.00%**
SEÑALIZACIÓN/RUBRO	0%	3.69%	**0.00%**
TOTAL		100.0%	76.3%


PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	245	265	-20
Prorroga	90	0	90
TOTAL	335	265	70

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

TIEMPO	Días	FECHA TERMINACIÓN OBRA	% TIEMPO TRANSCURRIDO
27-dic-25	265.00	6-mar-26	79.10%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

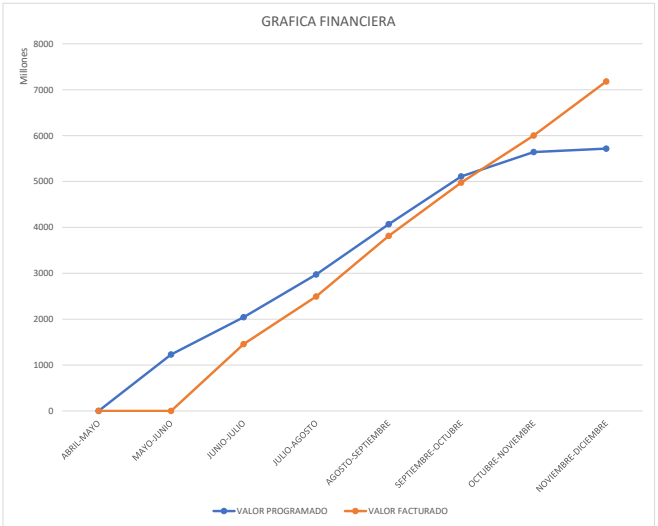

4. CONTROL DE COSTOS

CONTRATO DE OBRA

ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 6,351,563,839.00	$ 6,351,563,839.00	$ 7,180,271,888.00	75.36%
OBRAS ADICIONALES	N/A	$ 3,175,781,919.00	N/A	N/A
TOTAL	$ 6,351,563,839.00	$ 9,527,345,758.00	$ 7,180,271,888.00	75.36%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CIV 16001124 - ESTACION CENTRAL

1. Instalación de concreto MR 45 en via
2. Instalación de acero de refuerzo en losas
3. Instalación de formaleta en via
4. corte de pavimento (dilataciones)

CIV 16002911 - VERAGUAS

1. Demolición de concreto en espacio pulico
2. Limpieza y despeje de pista
3. Nivelación y compactación de base estabilizada

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA NIT. 901901931-7	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

CIV 16000696-SAN FRANCISCO OCCIDENTAL	CIV 16002708 - VERAGUAS II
1. Se realizaron ensayos LDW en via 2. Se realiza instalación de mezcla asfaltica MD 25 3. Limpieza y despeje de pista 4. Se realiza nivelación y compactación de mezcla asfaltica MD25	1. Continuan actividades de excavaciones para cambio de tuberia residual. 2. instalación de tuberia residual de 10" y acometidas de 6". 3. instalación de tuberia pluvial. 4. construcción de cárcamo para proteción de tubería pluvial. 5. retiro de material de excavación.
CIV 16000839 - COLON	**CIV 16002303 - 16002253 - 16002241 - JORGE GAITAN CORTES**
1. Se realiza nivelación y compactación de base estabilizada 2. Se realizaron ensayos LDW en via 3. Limpieza y despeje de pista	1. Demolición de concreto en espacio publico 2. Instalación de concreto de 3000psi en espacio publico
CIV 16000940 - COLON II	
1. Instalación de sardinel 2. Limpieza de sumideros 3. Ordén y aseo del tramo	


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 16001124




CIV 16001124

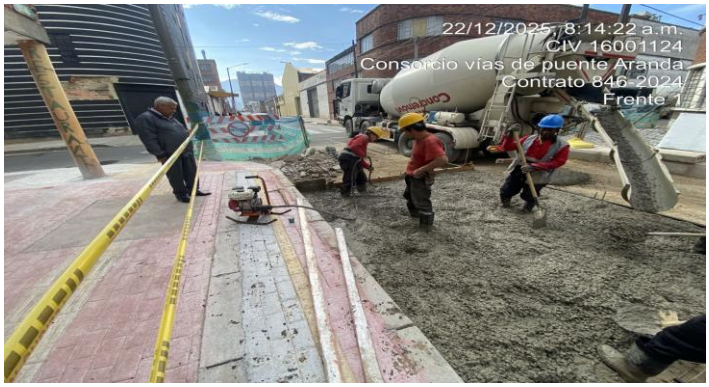

CIV 16001124



CIV 16001124

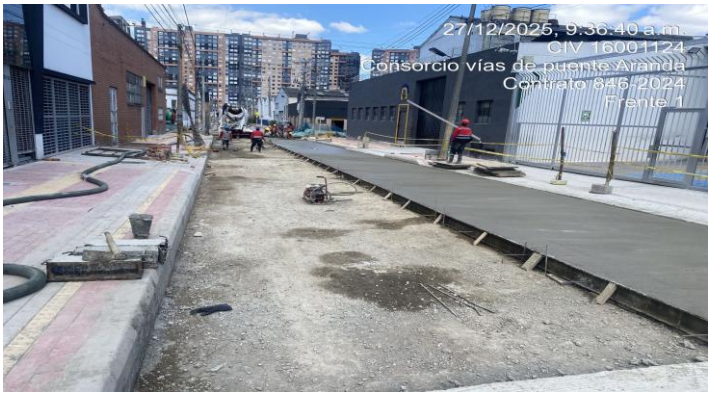

CIV 16001124



CIV 16001124

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA NIT. 901901931-7	INFORME SEMANAL



CIV 16000696



CIV 16000696



CIV 16000696



CIV 16000696

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT. 901901931-7

INFORME SEMANAL



CIV 16000696



CIV 16000696



CIV 160000839



CIV 160000839



CIV 16000940



CIV 16000940



CIV 16002911



CIV 16002911

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT. 901901931-7

INFORME SEMANAL



CIV 16002911



CIV 16002911



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708



CIV 16002708




CIV 16002708



CIV 16002708




CIV 16002303-16002253-16002241

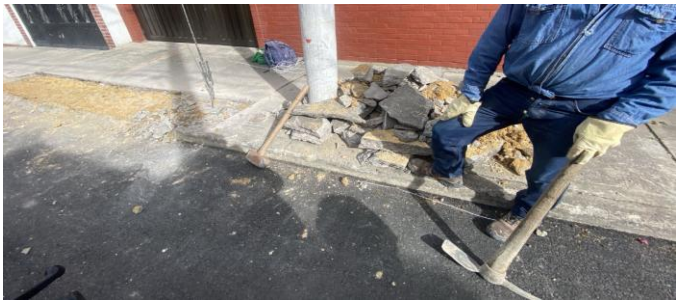

CIV 16002303-16002253-16002241



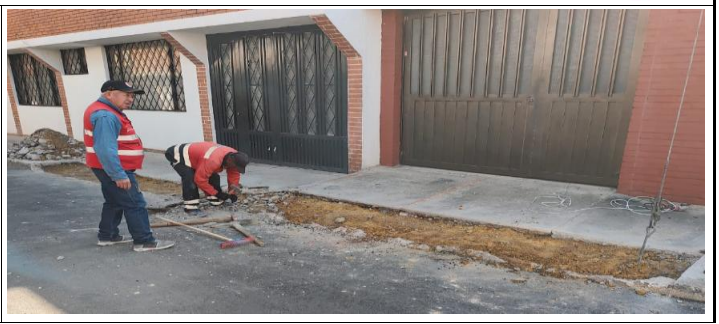

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA NIT. 901901931-7	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

CIV 16002303-16002253-16002241	CIV 16002303-16002253-16002241

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

RESPONSABLE		
NOMBRE	JULIAN CAMILO POVEDA	**FECHA**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	27/12/2025
FIRMA		

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
NIT. 901901931-7

INFORME SEMANAL

OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
INTERVENTOR	CONSORCIO PAVIAS 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Informe No.	32			
Periodo evaluado	Desde:	29/12/2025	Hasta:	3/1/2026

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	846 DE 2024
Fecha de Inicio:	lunes, 7 de abril de 2025
Fecha de Terminación	sábado, 6 de diciembre de 2025
Plazo Inicial	8 meses
Adiciones	3 meses
Fecha de Terminación final	viernes, 6 de marzo de 2026

2. INFORMACIÓN DE PERSONAL

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS	
N.A.	N.A.

PERSONAL EN LA OBRA	
DIRECTOR DE OBRA	1
INSPECTOR DE OBRA	1
RESIDENTES	4
ESPECIALISTA DE OBRA	3
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
AREA SISOMA	1
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1
AREA SOCIAL	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**14**
TOTAL PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA OBRA	**15**
TOTAL GENERAL	**29**

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

CIV	% EJECUTADO X CIV	% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO	% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO
16001124	97.00%	13.94%	**13.52%**
16001839	100.00%	24.76%	**24.76%**
16001833	100.00%	4.38%	**4.38%**
16000124	100.00%	7.34%	**7.34%**
16000696	92.00%	7.56%	**6.96%**
16000586	70.00%	1.12%	**0.78%**
16000839	81.00%	10.55%	**8.55%**
16002708	31.00%	11.60%	**3.60%**
16000940	41.00%	3.69%	**1.51%**
16002911	75.00%	5.12%	**3.84%**
ACCIONES MOVILIDAD			**0.00%**
16002303	99%	0.62%	**0.61%**
16002253	99%	0.24%	**0.24%**
16002241	99%	0.37%	**0.37%**
PKID 16000146	100%	0.14%	**0.14%**
PKID 16000120 - 32	0%	0.12%	**0.00%**
PKID 16000120 - 33	0%	2.67%	**0.00%**
CRUCE P.A	100%	0.82%	**0.82%**
16000533 P.A	0%	1.27%	**0.00%**
SEÑALIZACIÓN/RUBRO	0%	3.69%	**0.00%**
TOTAL		100.0%	77.4%


PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	245	272	-27
Prorroga	90	0	90
TOTAL	335	272	63

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

TIEMPO	Días	FECHA TERMINACIÓN OBRA	% TIEMPO TRANSCURRIDO
3-ene-26	272.00	6-mar-26	81.19%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

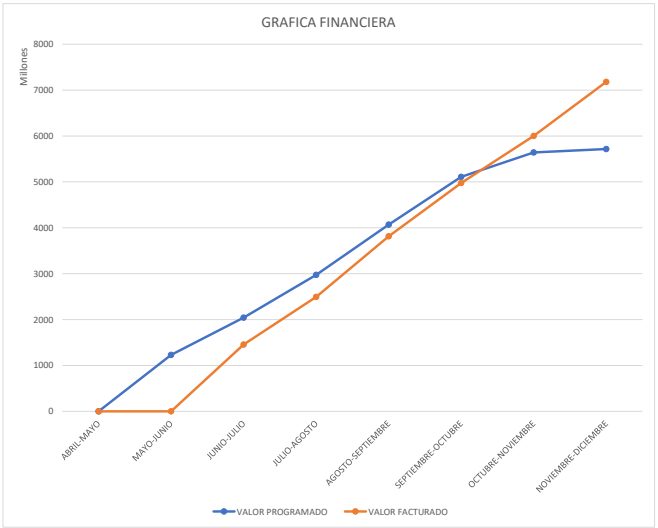

4. CONTROL DE COSTOS

CONTRATO DE OBRA

ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 6,351,563,839.00	$ 6,351,563,839.00	$ 7,180,271,888.00	75.36%
OBRAS ADICIONALES	N/A	$ 3,175,781,919.00	N/A	N/A
TOTAL	$ 6,351,563,839.00	$ 9,527,345,758.00	$ 7,180,271,888.00	75.36%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CIV 16001124 - ESTACION CENTRAL

1. Instalación de concreto MR 45 en via
2. Instalación de acero de refuerzo en losas
3. Instalación de formaleta en via
4. construcción de vigas de confinamiento

CIV 16002911 - VERAGUAS


1. Demolición de concreto en espacio pulico
2. Limpieza y despeje de pista
3. instalación tubo conexión pozo a sumidero red pluvial

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA NIT. 901901931-7	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 16001124

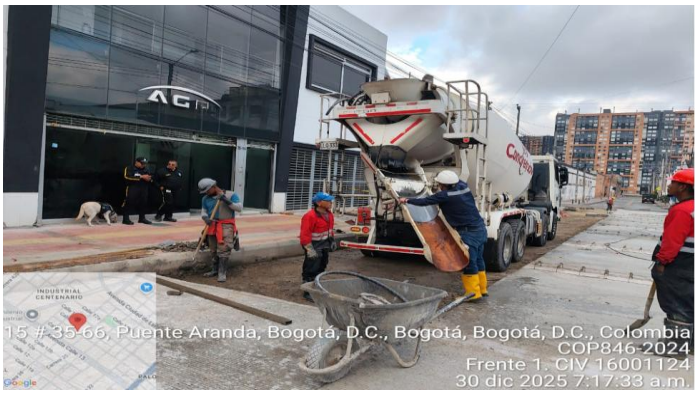

CIV 16001124

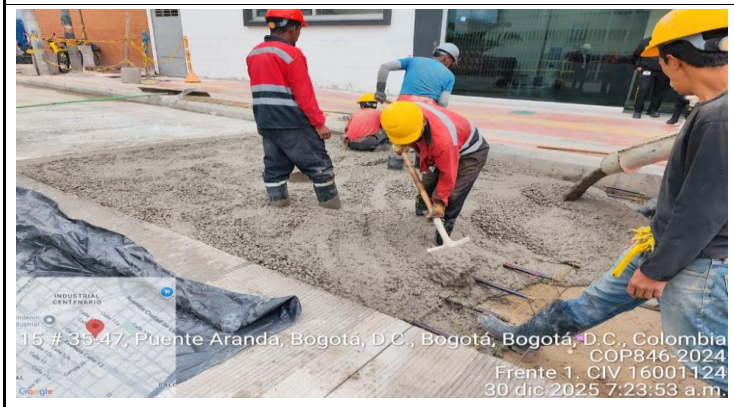

CIV 16001124



CIV 16001124



CIV 16001124



CIV 16001124





CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA	**CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA** **NIT. 901901931-7**	**INFORME SEMANAL**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ





CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA NIT. 901901931-7	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

RESPONSABLE		
NOMBRE	JULIAN CAMILO POVEDA	**FECHA**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	3/1/2026
FIRMA		

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

ACTA No. 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. 846-2024

OBJETO

Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación.

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

(Lista desplegable)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 850-2024

INTERVENTOR CONSORCIO PAVIAS 2025

SUPERVISOR DE APOYO **JUAN ALFREDO TORRES PRIETO**

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CODIGO
NP-01	PERFORACIONES EN SECO DE 4". Incluye Equipo de Perforación y Accesorios, Suministro e Instalación de Cal Comercial al 6%.	ML	$ 208.370	ESTRUCTURADO
NP-02	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN).	M2	$ 30.940	4034
NP-03	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	8617
NP-04	GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE 300 KN/M, RIGIDEZ COMPUESTA SUELO - GEOSINTETICO (KSGC) > 20 KN/M	M2	$ 47.999	ESTRUCTURADO
NP-05	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO e=10 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).	M2	$ 171.222	ESTRUCTURADO
NP-06	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Cargue, transporte y disposición final de sobrantes escombrera autorizada).	M2	$ 12.658	8606
NP-07	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	$ 2.508	9997
NP-08	ESTAMPADO PARA CONCRETO LOSETA GUIA Y ALERTA (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2	$ 46.628	ESTRUCTURADO
NP-09	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.557	4262
NP-10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 233.301	6538
NP-11	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 157.651	5412
NP-13	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 5.315.563	4550
NP-16	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 dias divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administraciòn y servicios).	MES	$ 14.320.209	9575
NP-17	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE	$ 1.107.979	4988
NP-18	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 193.249	8616
NP-19	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 1.151.212	8614
NP-20	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 1.173.196	8613
NP-21	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO PARA RAMPAS DE ACCESO e=15 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).	M2	$ 199.183	ESTRUCTURADO
NP-22	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.	HR	$ 168.226	5360

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los ocho dias del mes de julio de 2025.

(Firma)
RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)
SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

(Firma)
JUAN ALFREDO TORRES PRIETO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLPA

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

ACTA No. 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. 846-2024

OBJETO

Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación.

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

(Lista desplegable)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 850-2024

INTERVENTOR CONSORCIO PAVIAS 2025

SUPERVISOR DE APOYO **JUAN ALFREDO TORRES PRIETO**

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CODIGO
NP-23	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 6" EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	$ 433.446	ESTRUCTURADO
NP-24	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 10" EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	$ 497.555	ESTRUCTURADO
NP-25	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 12" EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	$ 532.454	ESTRUCTURADO
NP-26	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 14" EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	$ 605.834	ESTRUCTURADO
NP-27	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 6" CON BORDILLO PREFABRICADO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	$ 303.694	ESTRUCTURADO
NP-28	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 12" CON SARDINEL PREFABRICADO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	$ 454.370	ESTRUCTURADO
NP-29	CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA DE TUBERÍA Ø 12" EN MAMPOSTERIA (PARED SENCILLA) Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye suministro, formaleteo e instalación)	ML	$ 353.371	ESTRUCTURADO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los veintidos dias del mes de julio de 2025.

(Firma)
RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)
SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

(Firma)
JUAN ALFREDO TORRES PRIETO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLPA

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

ACTA No. 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. 846-2024

OBJETO

Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación.

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

(Lista desplegable)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 850-2024

INTERVENTOR CONSORCIO PAVIAS 2025

SUPERVISOR DE APOYO **JUAN ALFREDO TORRES PRIETO**

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CODIGO
NP-30	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 7.402	4237
NP-31	TUBERIA CONCRETO D=10" CL.2 EXTRAREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA.	ML	$ 323.904	ESTRUCTURADO
NP-32	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	$ 121.681	4128
NP-33	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	$ 1.257.142	ESTRUCTURADO
NP-34	PISO EN CONCRETO MR41 ESTAMPADO PARA RAMPAS DE ACCESO e=15 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).	M2	$ 251.587	ESTRUCTURADO
NP-35	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2" LOG. PROM = 6m, Y 2 UNIVERSALES CPVC 1/2").	UND	$ 28.588	ESTRUCTURADO
NP-36	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UND	$ 411.707	8970
NP-37	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10”. ESPESOR 3,00 mm. EC = 14.200 MPA.	UND	$ 1.892.100	8002
NP-38	DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O AMARILLA. LINEA 0.12M Y 16 MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL)	ML	$ 7.418	7862
NP-39	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 4.579	5225
NP-40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DE TRAFICO COLOR NEGRO IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES ESPESOR HÚMEDO DE 12 MILS	M2	$ 26.586	5227
NP-41	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	M2	$ 226.263	10263
NP-42	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64CM X 82.50CM REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4" H= 2.60M EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	$ 614.360	6374
NP-43	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	$ 575.926	7497
NP-44	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	$ 649.145	7503
NP-45	TUBERIA CONCRETO D=12" CL.2 EXTRAREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA.	ML	$ 360.797	ESTRUCTURADO
NP-46	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UND	$ 11.383	4569
NP-47	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye Suministro e Instalación)	UND	$ 19.434	5241
NP-48	SUBDREN EN GRAVILLA 3/4", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y EXTENDIDO MANUAL. INC. GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N Y TUBERIA PVC CORRUG.-FILTRO D=6").	ML	$ 288.727	3704
NP-49	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	$ 141.340	10257

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los veintidos dias del mes de julio de 2025.

(Firma)
RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)
SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

(Firma)
JUAN ALFREDO TORRES PRIETO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLPA

JML Ensayos e Ingeniería

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-014

INFORME DE ENSAYOS No. 0214-26-01

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida).

INV E 164:2013

COMPAÑIA:	CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
DIRECCIÓN:	CL 62 A # 7 - 65
OBRA:	JML-929 CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
CONTACTO:	JUAN AGUIRRE
SITIO EJECUCIÓN:	INSTALACIONES DEL CLIENTE

ITEM DE ENSAYO

EQUIPO USADO	MARCA:	TROXLER	FECHA DE TOMA:	2026-02-16	
	MODELO:	3430	FECHA DE EMISIÓN:	2026-02-17	
	N° DE SERIE:	31737	LABORATORISTA / TOE:	HERNANDO GACHARNA	
CONTEO ESTANDAR	DENSIDAD:	1603	**MÉTODO**	RD: Retro Dispersión	
	HÚMEDAD:	644		TD: Transmisión Directa	X

IDENTIFICACIÓN

Ensayo Nº:	1	2	3	4
*Localización:	TV 48A # 5F	TV 48A # 5F	-	-
*Costado:	-	-	-	-
*Capa Nº:	ULTIMA	ULTIMA	-	-
*Espesor de la capa ensayada (cm):	20	20	-	-
*Profundidad (cm):	15	15	-	-
*Material:	SBG-ESTABILIZADA	SBG-ESTABILIZADA	-	-

RESULTADOS OBTENIDOS

Densidad Máxima de Lab kg/m^3:	2031	2031	-	-
Humedad Óptima %:	-	-	-	-
Densidad Húmeda kg/m^3:	2165	2235	-	-
Densidad Seca kg/m^3:	1936	1959	-	-
Humedad Insitu %:	11,8	14,1	-	-
Porcentaje Compactación %:	**95,3**	**96,4**	**-**	**-**

OBSERVACIONES: **PROCTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE**

EL PRESENTE INFORME NO PODRA REPRODUCIRSE PARCIALMENTE SIN LA APROBACION DEL LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA, EXCEPTO CUANDO SE REPRODUCE EN SU TOTALIDAD.
LOS RESULTADOS RELACIONADOS EN ESTE INFORME SOLO SON APLICABLES A LOS ITEMS SOMETIDOS A ENSAYO TAL COMO SE RECEPCIONARON DESDE NUESTROS CLIENTES.
EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.
EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL MUESTREO ASOCIADO A LOS ITEMS DE ENSAYO
* DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

REVISÓ Y APROBÓ:

ING. JULIÁN MAZUERA R.
GERENTE TÉCNICO

JML ENSAYOS E INGENIERIA www.jmlingenieria.com
CALLE 78 N° 82- 73 Bogota- Colombia. Tel: 7260786 Cel: 3153390939
gerenciatecnica@jmlingenieria.com

FIN DE INFORME

JML Ensayos e Ingeniería


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-014

INFORME DE ENSAYO No. 1093-26C-01
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPÉCIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NORMA NTC 673:2021

COMPAÑÍA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
DIRECCIÓN: CL 62 A # 7 - 65
OBRA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

CÓDIGO CLIENTE: JML-929
CONTACTO: JUAN AGUIRRE
FECHA INFORME: 2026-02-21
SITIO DE EJECUCIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO JML

Espécimen No.	*Localización	*Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	*Edad de Ensayo días	Diámetro Promedio mm	Área Sección Transv mm^2	Carga Máxima kN	Resistencia a la Compresión MPa	*Resistencia Nominal MPa	Resistencia %	Tipo de Falla	Defectos del Espécimen
8	CIV 16000696	2025-12-06	2026-02-20	76	154,47	18739	388,3	20,7	**20,7**	**100,2**	4	N.A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DEFECTOS DEL ESPÉCIMEN

F: FRACTURADO
SD: SUPERFICIES DESNIVELES
FA: FALTA DE ADHERENCIA
EA: ESCASEZ DE AGREGADO
DP: DESPORTILLADO
PV: PRESENTA VACÍOS (POROS)
CO: CONTAMINADO
AR: ARENOSO

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

ING. JULIAN MAZUERA R.
GERENTE TÉCNICO

EL PRESENTE INFORME NO PODRA REPRODUCIRSE PARCIALMENTE SIN LA APROBACION DEL LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA, EXCEPTO CUANDO SE REPRODUCE EN SU TOTALIDAD.

LOS RESULTADOS RELACIONADOS EN ESTE INFORME SOLO SON APLICABLES A LOS ITEMS SOMETIDOS A ENSAYO TAL COMO SE RECEPCIONARON DESDE NUESTROS CLIENTES.

EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL MUESTREO ASOCIADO A LOS ITEMS DE ENSAYO

** DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE*

Trame cdón

CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA	**CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA** "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
	INTERVENTORÍA: CONSORCIO PAVIAS 2025 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
	BITÁCORA DE OBRA CIV 16000839 – KR 55 ENTRE CL 4B Y CL 4C BIS

Powered by CamScanner

CIV 16000839	CARRERA 55 ENTRE CALLE 4B Y CALLE 4C

Especificación IDU	Capa	Espesor
620-18	Concreto asfáltico MD19, asfalto 60/70	8 cm
611-18	Riego de liga, emulsión CRR-1	-
620-18	Concreto asfáltico MD25, asfalto 60/70	8 cm
610-18	Imprimación, emulsión CRL-1	-
520-18	Base granular AR_BG38 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m^3)	15 cm
242-18	Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ≥ 300 kN/m	-
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-
231-18	Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m	100 cm

Powered by CamScanner

06-12-2025 Alina Solano
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador y 1 inspector técnico
y
Equipos Sin equipos
Actividades
- nivelación y compactación de subbase granular estabilizada
- instalación de cajillas del acueducto
- nivelación de cajillas y marcos de cajas de inspección existentes

Interventoría

09-12-2025 Alina Solano
Personal: 1 boal, 3 oficiales, 3 ayudantes, comisión topografica y 1 inspector técnico
y
Equipos Sin equipos
Actividades
- perfilación y excavación manual de espacio público
- instalación de malla electrosoldada en espacio público
- instalación de concreto estampado de 3000 PSI

Interventoría

10-12-2025 Alina Solano
Personal 1 boal, 4 oficiales, 6 ayudantes, comisión topografica y
Equipos Sin equipos
Actividades
- instalación de concreto 3000 PSI estampado en espacio
- instalación de malla electrosoldada
- nivelación de cajillas de el acueducto

Interventoría

10-12-2025 Clima despejado
Personal: 1 boal, 4 oficiales, 4 ayudantes, 1 comisión topograf y 1 inspector SST
Equipos: Sin equipos
Actividades
- instalación de concreto 3000 PSI en andenes
- instalación de malla electrosoldada
- nivelación y compactación de subbase estabilizada en espacio público

interventoria

11-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 3 oficiales, 4 ayudantes y 1 inspector SST
Equipos: Sin equipos
Actividades
- instalación de concreto de 3000 PSI estampado
- nivelación de cajillas y marcos de cajas
- instalación de malla electrosoldada

interventoria

12-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 operador y
Equipos: Sin equipos
Actividades
- cargue mecanico de RCD
- demolición de concreto en andenes
- excavación manual para conformación de espacio publico

Nota: se presentan lluvias en el frente de obra

interventoria

13-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 4 ayudantes, 1 operador, comisión topografica y 1 inspector técnico
Equipos 1 minicargador
Actividades
- cargue mecanica de RCD
- acopio y trasiego de RCD
- nivelación y compactación de subrasante en espacio publico

interventoria

15-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 4 ayudantes y 3 oficiales
Equipos 1 minicargador
Actividades
- instalación de concreto 3000PSI estampado
- instalación de malla electrosoldada
- acopio y trasiego de RCD

interventoria

16-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 4 ayudantes y 3 oficiales
Equipos 1 minicargador
Actividades
- instalación de malla electrosoldada
- instalación de concreto estampado 3000PSI en espacio publico
- acopio y trasiego de RCD
- construcción de cañuelas de pozos

interventoria

Powered by CamScanner

17-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 4 oficiales, 3 ayudantes, 1 operador, 1 inspector técnico y 1 comisión topografica
Equipos 1 minicargador
Actividades
- acopio y traslado de RCD
- cargue mecanico de RCD
- corte de pavimento en paramentos de los predios

interventoria

18-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades
- pañete de cajas de inspección
- limpieza de sardineles
- boquilla en sardineles

interventoria

19-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante, 1 inspector SST y
Equipos sin equipos
Actividades
- pañete de cajas de inspección
- boquilla de sardinel
- limpieza y despeje de pista

Nota se presentan fuertes lluvias en el frente de obra

Se verifican obs actividades por parte de la interventoria

interventoria

20-12-2025 Alima resbado
Personal: 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• acopio y traslado de RCD
• cargue manual de RCD

interventoria

22-12-2025 Alima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos: Sin equipos
Actividades • demolición de concreto en cabezote
• acopio y traslado de RCD
• nivelación bozeilla de sardinel

interventoria

23-12-2025 Alima resbado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y comisión topografica
Equipos Sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• construcción de hombros
• instalación de concreto en sumidero

interventoria

24-12-2025 Alima despejado
Personal: 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y comisión topografica
Equipos Sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• nivelación de cargues red pluvial
• instalación de cinta peligro

interventoria

25-12-2025 festivo

26-12-2025 Clima despejado
Personal 1 oval, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades · nivelación cargues residuales
· limpieza y despeje de pista

intervento

27-12-2025 Clima soleado
Personal (soldado) 1 oval, 1 oficial y 1 ayudante
Equipos sin equipos
Actividades · acopio y trasiego de RCD
· traslado de carga y baño portátil

intervento

29-12-2025 Clima soleado
Personal 1 oval, 1 oficial, 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades · limpieza y brigada de aseo
· acopio y trasiego de RCD
· cargue manual de RCD

Nota: se presentan fuertes lluvias en
en el punto de obra

Se verifican actividades por
parte de la interventoría

30-12-2025 clima soleado
Personal 1 Coal, 1 oficial, 1 inspector SST y topografia
Equipos sin equipos
Actividades • chequeo de niveles de base granular
• chequeo de nivelen de sumideros SL-120
• boquilla de sardinel

interventoria

31-12-2025 clima soleado
Personal 1 Coal, 1 oficial, 1 inspector SST y topografia
Equipos sin equipos
Actividades • cargue manual de RCD
• limpieza y desmonte de pista
• instalación de cinta peligro en espacio publico

interventoria

02-01-2026 clima soleado
Personal 1 Coal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • remate en andenes
• corte de pavimento
• renivelación marco de tapa caja de inspección
• acopio y traslado de RCD

interventoria

03-01-2026 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • demolicion de concreto en andenes
• corte de concreto en andenes para dilataciones
• acopio y traslado de RCD

interventoria

05-01-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • cargue manual de agregados sobrante
• corte de pavimento en andenes para dilataciones
• acopio y traslado de RCD

interventoria

06-01-2026 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 ayudante, 1 oficial, 1 inspector técnico,
Equipos sin equipos
Actividades • acopio y traslado RCD
• retiro de materiales sobrantes
• remate en espacio publico
• limpieza y despeje de pista

Se verifican estas actividades por parte de la interventoria

CONSORCIO
VIAS DE PUENTE ARANDA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO PAVIAS 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 cuyo objeto es

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

BITÁCORA DE OBRA

CIV 16001124 CL 15 ENTRE KR 35 Y KR 36

Powered by CamScanner

Especificación IDU	Capa	Espesor
800-18	Concreto hidráulico MR45	20 cm
520-18	Subbase granular AR_SBG50 mejorado con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m3)	20 cm
242-18	Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ≥ 300 kN/m	-
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18 511-18	Geoceldа h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-
231-18	Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m	100 cm

Powered by CamScanner

05-12-2025 Alima despejado
Personal 1 boal, 2 oficiales, 3 ayudantes y 1 inspector SST
Equipos: sin equipos
Actividades • corte y figurado de acero para rampas
• instalación de acero para rampas de 1/2"
• instalación de concreto MR 41 estampado en rampas
Nota: se presentan fuertes lluvias en la instalación del concreto

interventoria

06-12-2025 Alima cubierto
Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal y comisión topográfica
Equipos: sin equipos
Actividades • instalación de malla electrosoldada
• nivelación y compactación de subbase granular en espacio publico
• instalación de concreto de 3000 PSI estampado a color en espacio publico

interventoria

08-12-2025 Festivo

09-12-2025 Alima soleado
Personal 1 boal, 2 oficiales, 2 ayudantes y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • nivelación de cajillas de acueducto
• nivelación y compactación de subbase
• instalación de malla electrosoldada
• instalación de concreto estampado 3000 PSI en espacio publico

interventoria

10-12-2025 Alima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudantes y 1 inspector técnico
Equipos Sin equipos
Actividades • instalación de concreto MR 41 en rampas de acceso vehicular estampado
• instalación de malla electrosoldada
• limpieza y despeje de pista

interventoria

11-12-2025 Alima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 inspector SST
Equipos Sin equipos
Actividades • acopio y traslado de RCD
• corte de pavimento en andenes
• construcción de hombros

interventoria

12-12-2025 Alima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 inspector técnico
Equipos Sin equipos
Actividades • cargue mecanico de RCD
• demolición de concreto en espacio publico
• acopio y traslado de RCD

interventoria

13-12-2025 Alima nublado
Personal 1 oficial, 1 ayudante, comisión topografica, 1 inspector técnico y 1 inspector SST
Equipos Sin equipos
Actividades • señalizacion e instalación de plafones en sumideros
• cargue mecanico de RCD
• acopio y traslado de RCD

interventoria

5-12-2025 Clima soleado
Personal (soldado) 1boal, 1oficial y comisión topografía
Equipos sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• se realiza densidades con densimetro nuclear en subbase estabilizada
• chiguero de muestras de subbase granular

interventoría

16-12-2025 Clima soleado
Personal 1boal, 1oficial, 1ayudante y 1inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • perfilado de subbase estabilizada
• prueba de cargue en estructura de pavimento
• limpieza y despeje de pista

interventoría

17-12-2025 Clima despejado
Personal 1boal, 1oficial, 1ayudante y 1inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • acopio y traslado de RCD
• traslado de carpa y punto ecológico
• construcción de hombros faltantes

interventoría

18-12-2025 Clima: soleado
Personal 1boal, 1oficial, 1ayudante y 1inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • corte y figurado de acero para parrillas
• limpieza y despeje de pista
• boquilla de sardinel
• se realizan CCTV en redes residual y pluvial

interventoría

Powered by CamScanner

19-12-2025 Clima soleado
Personal Total, 2 oficiales, 2 ayudantes y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• corte y figurado de acero para parrillas
• nivelación de cargue vial combinado

Luis A. interventoría

20-12-2025 Clima nublado
Personal Total, 2 oficiales, 2 ayudantes y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • corte y figurado de acero para parrillas
• perfilación de subbase granular
• acopio y traslado de RCD

Luis A. interventoría

22-12-2025 Clima (personal) nublado
Personal Total 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 inspector SST, y comisión topografica
Equipos sin equipos
Actividades • instalación de parrillas en vía de 1/2
• instalación de concreto MR45 en vía
• instalación de dovelas
• aplicación de antisol

Luis A. interventoría

23-12-2025 Clima soleado
Personal Total, 3 oficiales, 3 ayudantes, inspector y comisión topografia
Equipos sin equipos
Actividades • instalación de formaletas
• instalación de MR45 en vía
• instalación de malla en vía

Luis A. interventoría

24-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 4 oficiales, 4 ayudantes, inspector técnico, comisión topografica y aux técnico
Equipos sin equipos
Actividades • corte y figurado de acero para vigas de confinamiento
• instalación de formaletas
• instalación de cargue vial combinada

interventoria

25-12-2025 (Clima) Festivo

26-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 4 oficiales, 4 ayudantes, 1 inspector técnico y comisión topografica
Equipos sin equipos
Actividades • corte figurado de acero para parrillas
• corte de pavimento un bocacalle
• formaletas para vigas de confinamiento

interventoria

27-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 inspector técnico, comisión topografica
Equipos sin equipos
Actividades • instalación de parrilla de 1/2 para lozas irregulares
• instalación de MR45 en via
• instalación de dowels de 1"
• instalación de antisol

Se verifican estas actividades por parte de la interventoria

29-12-2025 Clima despejado
Personal (despejado) 1 boal, 2 oficiales, 3 ayudantes, inspector y
Equipos 1 minicargador
Actividades • corte y figurado de acero para parrillas
• instalación de marcos para sumideros
• formaletas para vigas de sumideros NS-04

intervientoria

30-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 inspector SST,
1 operador y comisión topografica
Equipos 1 minicargador
Actividades • instalación de dovelas de 4"
• instalación de concreto MR45 en via
• instalación de parrillas de 1/2 en via

intervientoria

31-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 inspector técnico
y comisión topografica
Equipos 1 minicargador
Actividades • limpieza y despeje de pista
• acopio y traslado de RCD
• instalación de sello con balkon en
dilataciones
• corte de pavimento de via

intervientoria

02-01-2026 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficiales, 1 operador y comisión topografica
Equipos (sin) 1 minicargador
Actividades • limpieza y despeje de pista
• acopio y traslado de RCD
• instalación de cola de ratón

intervientoria

03-01-2026 Clima soleado
Personal: 1 boal, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 inspector técnico, 1 operador y comisión topografica
Equipos: sin equipos
Actividades:
- corte de pavimento en via
- instalación de cola de ratón
- instalación y sello con bulken

interventoria

05-01-2026 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos: sin equipos
Actividades:
- instalación de cola de ratón
- instalación de bulken en dilataciones
- instalación de tapa valvulas gas natural

interventoria

06-01-2026 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos: sin equipos
Actividades:
- instalación de bolardos
- instalación de cola de ratón en dilataciones de la via
- instalación de bulken en dilataciones de la via
- cargue mecanico de RCD
- acopio y traslego de RCD

Se verifican estas actividades por parte de la interventoria.

CONSORCIO
VIAS DE PUENTE ARANDA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

INTERVENTORÍA: CONSORCIO PAVIAS 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 cuyo objeto es:

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

BITÁCORA DE OBRA

CIV 16002911 – KR 30A ENTRE CL 4 Y AC 3

Powered by CamScanner

CIV 16002911	CARRERA 30A ENTRE AC 3 Y CL 4

Especificación IDU	Capa	Espesor
620-18	Concreto asfáltico MD19, asfalto 60/70	5 cm
611-18	Riego de liga, emulsión CRR-1	-
625-18	Concreto asfáltico MCCh25	7 cm
610-18	Imprimación, emulsión CRL-1	-
520-18	Base granular AR_BG38 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo liquido iónico (1,0 l/m^3)	17 cm
242-18	Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ≥ 300 kN/m	-
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	6 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	10 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-
231-18	Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m	100 cm

Fuente: Elaboración propia

Powered by CamScanner

01-12-2025 Clima nublado.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador y camión topógrafo.
Equipos: 1 minicargador.
Actividades: • Instalación de sobrel A-10 y bajorampa A-85.
• Excavación manual para instalación de prefabricados.
• Construcción de rampa tipo sumidero.

Jurado interventor

02-12-2025 Clima nublado.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador y camión topógrafo.
Equipos: 1 minicargador.
Actividades: • Instalación de sobrel A-10 y bajo-rampa A-85.
• Excavación manual para instalación de prefabricados.
• Construcción de rampa tipo sumidero.

Jurado interventor

06-12-2025 Clima despejado.
Personal: 1 oficial y 2 ayudantes.
Actividades: • Instalación de sobrel A-10 y bajo-rampa A-85.
• Excavación manual y nivelación para instalación de prefabricados.
• Instalación de formaletas.
• fundida de tambor en sitio.
• Limpieza y Acopio.

Se verifican estas actividades por parte de la interventoría

Jurado

09-12-2025 Clima nublado.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 1 operador.
Equipos: 1 Minicargador.
Actividades: • Instalación de base estabilizada.
• Construcción de mampostería sumidero.

Juan interventoría

10-12-2025 Clima nublado.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 1 operador.
Equipos: 1 Minicargador.
Actividades: • Instalación de base estabilizada.
• Instalación de geomalla.

Juan interventoría

11-12-2025 Clima nublado.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 1 operador.
Equipos: 1 Minicargador.
Actividades: • Instalación de base estabilizada.
• Pañete de sumidero.
• Nivelación y compactación de base estabilizada.
• Instalacion de sardinel A-10.

Se verifican estas actividades por parte de la interventoría.

Juan

12-12-2025 Clima nublado

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 1 operador.

Equipos: 1 Minicargador.

Actividades:
- Instalación de base estabilizada.
- Instalación de Geomalla
- Nivelación y compactación de base estabilizada.
- Acopio y trasiego de material.
- Instalación de Sumidero SI-120.

interventoría

13-12-2025 Clima despejado

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 2 operadores.

Equipo: 1 Minicargador y 1 Vibrocompactador.

Actividades:
- Instalación de base estabilizada.
- Instalación de geomalla.
- Nivelación y compactación de base estabilizada.

interventoría

15-12-2025 Clima soleado

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 2 operadores

Equipo: 1 Minicargador y 1 Vibracompactador

Actividades:
- Instalación de base estabilizada.
- Nivelación y Compactación de base estabilizada.

interventoría

Powered by CamScanner

16-12-2025 Clima nublado

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 2 operadores

Equipo: 1 Minicargador y 1 Vibrocompactador

Actividades: • Instalación de base estabilizada.

• Nivelación y compactación de base estabilizada

intervento

17-12-2025 Clima soleado

Personal: 2 oficiales, 1 ayudante y 1 operador.

Equipo: 1 Minicargador.

Actividades: • Instalación de base estabilizada.

• Nivelación y compactación de base estabilizada.

• Pañete en pozo residual.

• Corte de pavimento.

• Acopio y trasiego de rcd.

intervento

18-12-2025 Clima nublado

Personal: 1 oficial y 2 ayudantes.

Actividades: • Instalación de base estabilizada.

• Nivelación y Compactación de base estabilizada.

• Pañete de pozo residual y Cañeta.

• Fundida de sardinel.

• limpieza y traslado de material para cintas de ajuste.

intervento

19-12-2025 Clima soleado
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 1 operador.
Equipos: Minicargador.
Actividades: • Instalación de base estabilizada.
• Nivelación y compactación de base estabilizada.
• Parrete en pozo red residual y cañuelas.

interventoria

20-12-2025 Clima soleado.
Personal: 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector SST-MA.
Equipos: Minicargador
Actividades: • Corte de pavimento para cintas de ajuste.
• Movimiento campamento de obra.
• Despeje y traslado de material.

interventoria

22-12-2025 Clima soleado
Personal: 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades: • Demolición de concreto de cintas de ajustes
• Despeje y traslado de material

interventoria

23-12-2025 Clima soleado
Personal: 1 oficial y 1 ayudante
Actividades: • Demolición de concreto de cintas de ajuste.
• Despeje y traslado de material.

interventoria

Powered by CamScanner

25-12-2025 Clima soleado

Personal: 1 oficial y 1 ayudante.

Actividades:
- Demolición de concreto de cintas de ajoste.
- Despeje y traslado de material.
- Acopio y trasiego de rcd.

26-12-2025 Clima soleado

Personal: 1 oficial y 1 ayudante.

Actividades:
- Excavación manual para cajeo de andenes.
- Despeje y traslado de material.
- Acopio y trasiego de rcd.
- Cargue mecánico de rcd.

interventoría

27-12-2025 Clima soleado

Personal: 1 oficial y 1 ayudante

Actividades:
- Excavación manual para cajeo de andenes.
- Despeje y traslado de material.
- Acopio y trasiego de rcd.
- Cargue mecánico de rcd.

interventoría

Powered by CamScanner

29-12-2025 Clima soleado

Personal: 1 oficial y 1 ayudante

Actividades:
- Excavación manual para cajeo de anclajes
- Despeje y traslado de material
- Acopio y trasiego de rcd.
- Cargue mecánico de rcd.
- Instalación de geotextil en espacio público.

intervento

30-12-2025 Clima soleado

Personal: 2 ayudantes, 1 operador y 1 boal.

Actividades:
- Demolición y corte de concreto en cintas de ajuste.
- Despeje y traslado de material.
- Excavación mecánica e instalación de tubería para conexión de sumidero.
- Cambio de polisombra en broche.

intervento

31-12-2025 Clima soleado

Personal: 2 ayudantes, 1 operador y 1 boal.

Actividades:
- Demolición y corte de concreto de cintas de ajuste.
- Despeje y traslado de material.
- Excavación mecánica e instalación de tubería para conexión de sumidero.
- Cambio de polisombra en broche

intervento

Powered by CamScanner

02-01-2026 Clima soleado

Personal: 2 ayudantes, 1 operador y 1 boal.

Actividades: • Demolición y corte de concreto de cintas de ajuste.

• Despeje y traslado de material

• Excavación manual para cajeo de espacio público.

interventoría

03-01-2025 Clima soleado

Personal 2 ayudantes, 2 boal, 1 oficial y 1 inspector SST

Equipos sin equipos

Actividades • demolición de concreto en cintas de ajuste

• despeje y traslado de material

• excavación manual para cajeo de espacio publico

interventoría

04-01-2025 Clima soleado

Personal 2 ayudantes, 2 oficiales, 1 boal, comisión topografía y 1 inspector SST

Equipos sin equipos

Actividades: • conformación de andenes

• nivelación y compactación de

• instalación de geotextil en espacio publico

Nota se presentan fuertes lluvias en el frente de obra (en ud f) a las 13:10

Se verifican estas actividades por parte de la interventoría

Powered by CamScanner

CONSORCIO
VIAS DE PUENTE ARANDA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO PAVIAS 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 cuyo objeto es

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL

LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

BITÁCORA DE OBRA

CIV 16000696 DG 5F BIS ENTRE TV 47 Y TV 48

Powered by CamScanner

Especificación IDU	Capa	Espesor
620-18	Concreto asfáltico MD19, asfalto 60/70	4 cm
611-18	Riego de liga, emulsión CRR-1	-
620-18	Concreto asfáltico MD25, asfalto 60/70	8 cm
610-18	Imprimación, emulsión CRL-1	-
520-18	Base granular AR_BG38 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo liquido iónico (1,0 l/m^3)	18 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Powered by CamScanner

09-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 inspector SST, 1 inspector técnico y comisión topografica
Equipos sin equipos
Actividades • corte de pavimento en andenes
• retiro de RCD
• limpieza y despeje de pista

interventoria

06-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 3 oficiales, 3 ayudantes, comisión topografica y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • cargue manual de granular sobrante
• limpieza y despeje de pista
• acopio y traslado de RCD

interventoria

09-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 3 ayudantes, 3 oficiales, comisión topografica, 1 inspector técnico
Equipos Sin equipos
Actividades • instalación de malla electrosoldada en andenes
• instalación de concreto de 3000 PSI en cintas de ajuste de espacio publico
• instalación de antisol en concreto
• limpieza y despeje de pista

Se verifican estas actividades por parte de la interventoria

10-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • limpieza y desbroce de pista
• acopio y traslego de RCD
• cargue manual de RCD

intervetor

11-12-2025 Clima (L.L.) despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador de 1 inspector SST
Equipos 1 minicargador
Actividades • construcción de bordos
• instalación de sardinel fundido en sitio

intervetor

12-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes y comisión topografica
Equipos sin equipos
Actividades • boquilla de sardineles
• cargue manual de granular sobrante
• limpieza y desbroce de pista
Nota se presentan lluvias en el frente de obra

intervetor

13-12-2025 Clima nublado
Personal: 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y comisión topog
Equipos sin equipos
Actividades • instalación de cinta peligro en espacio publico
• retiro y desinstalación de señalizacion

intervetor

Powered by CamScanner

15-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • pañete de cajas de inspección
• se realiza ensayo con densimetro nuclear
• limpieza y despeje de pista

interventoria

16-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador y 1 inspector técnico
Equipos 1 retro
Actividades • se realiza limpieza de red vertical con vactor
• pañete de cajas de inspección
• acopio y traslado de RCD

interventoria

17-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador y 1 comisión topografica
Equipos 1 excavadora y 1 minicargador
Actividades • cuadrilla de vactor realiza actividades de limpieza de red pluvial
• acopio y traslado de RCD
• cargue manual de RCD

interventoria

18-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • remate de bajantes de aguas lluvias
• corte de pavimento en espacio publico

interventoria

19-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • instalación de concreto en remate de cuneta
• nivelación de cuneta vial peatonal
• limpieza y despeje de pista

Interventoría

20-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • instalación de bajantes de aguas lluvias
• nivelación marcos cajas de inspección
• limpieza y despeje de pista

Interventoría

21-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 inspector SST y topografía
Equipos sin equipos
Actividades: • cargue de mixer de base granular
• cargue de mixer linea de cordinel
• cambio de tapas en caja de inspección

Interventoría

22-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • se realiza ensayo con cilindrometro
mucbar en base estabilizada
• limpieza y despeje de pista

Interventoría

Powered by CamScanner

4-2025 Clima despejado
Personal 2 boal, 1 oficial, cuadrilla de asfalto, 1 ayudante, y comisión topografica
Equipos 1 finisher, 1 minicargador y 1 rodillo
Actividades • instalación de imprimación en base
• instalación de mezcla asfaltica MDC 25
• limpieza y despeje de pista

interventoria

-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal y 1 ayudante
Equipos sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• acopio y traslado de RCD
• cargue manual de RCD

interventoria

5-12-2025 Festivo

6-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y topografia
Equipos sin equipos
Actividades • cunetas en bajante de aguas lluvias
• construcción de hombros
• chaques y verificación de cotas de base
• limpieza y despeje de pista

Nota se presentan fuertes lluvias en el frente de obra aproximadamente a las 10:10

Se verifican estas actividades por parte de la interventoria

27-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • acopio y traslego de RCD
• cargue manual de agregados sobrantes
• limpieza y despije de pista

interventoria

29-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • cargue manual de RCD
• limpieza y despije de pista
• chaqueo de niveles de base asfaltica

interventoria

30-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 inspector técnico, comisión topografica y 1 ayudante
Equipos sin equipos
Actividades • acopio y traslego de RCD
• traslado de carga y punto ecologico
• limpieza y despije de pista

interventoria

31-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 2 oficiales, 2 ayudantes y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • acopio y traslego de RCD
• cargue manual de RCD
• retiro y desinstalación de rollizos

interventoria

31-01-2026 Día Festivo

1-02-2026 clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • acopio y traslado de RCD
• cargue mecánico de material sobrante
• limpieza y retiro de pista

interventoría

2-02-2026 clima lluvioso
Personal 1 boal, 1 comisión topográfica, 1 oficial y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • cubicación de volumen para rodadura asfáltica
• jornada de aseo y limpieza
• señalización de material en vía con cinta peligro

interventoría

3-02-2026 clima nublado
Personal 1 boal, 1 ayudante, 1 inspector técnico, 1 oficial y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • pañete de cajas de inspección
• instalación pasos plásticos para pozos
• construcción cañuelas de pozos red residual

Se verifican estas actividades por parte de la interventoría

09-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante, 1 operador y 1 inspector técnico
Equipos 1 excavadora
Actividades
- demolición de capa asfáltica
- cargue mecánico de RCD
- acopio y traslado de RCD

Interventoría

10-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 operador y 1 inspector SST
Equipos 1 excavadora
Actividades
- demolición de capa asfáltica
- acopio y traslado de RCD
- cargue mecánico de RCD
- construcción cajas de inspección

Interventoría

11-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 operador y comisión topográfica
Equipos 1 excavadora y 1 vibrocompactador
Actividades
- excavación mecánica para cajeo de vía
- nivelación y compactación de subrasante
- instalación de subbase granular en vía
- demolición del sardinel A-10

Nota: se presentan fuertes lluvias en el frente de obra aproximadamente a las 11:30

Se verifican estas actividades por parte de la interventoría

12-12-2025 Alma Soledad
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 inspector técnico, 2 operadores, y comisión topografica y 1 inspector srt
Equipos 1 minicargador y 1 vibro
Actividades • excavación manual para conformación de espacio publico
• nivelación y compactación de subrasante en espacio publico
• instalación de sardinel A-10
• instalación de sardinel A-85
• concreto 3000 PSI en espacio publico

interventoria

13-12-2025 Alma Despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 inspector técnico y 1 inspector srt
y Equipos • 1 minicargador y 1 vibrocompactador
Actividades • excavación manual para conformación de espacio publico
• instalación de sardinel A-10
• limpieza y disipje de pista
• acopio y traslado de RCD
• construcción de hombros

interventoria

15-12-2025 Alma nublado
Personal 1 boal, 2 oficiales, 3 ayudantes, 2 operadores y 1 inspector tecnico
y Equipos 1 minicargador y 1 vibro
Actividades • construcción de hombros
• instalación de sardinel A-85
• nivelación de cajillas acueducto
• construcción caja de inspección
• se realiza ensayo con densimetro nuclear en base estabilizada

interventoria

16-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boral, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 operador y 1 inspector técnico
Equipos 1 excavadora
Actividades
- instalación y nivelación de cajillas del acueducto
- nivelación y compactación de (base) rubbare en espacio público
- instalación de sardinel A 85

Interventoría

17-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boral, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador y 1 inspector técnico
Equipos 1 retroexcavadora y 1 minicargador
Actividades
- instalación de malla electrosoldada en espacio público
- instalación concreto 3000 psi estampado en espacio público
- se realiza clavado de red residual con vactor

Interventoría

18-12-2025 Clima soleado
Personal 1 boral, 1 ayudante, 1 oficial y 1 inspector técnico
Equipos Sin equipos
Actividades
- limpieza y disposición de pista
- acopio y traslado de RCD
- limpieza de sumidero

Nota: se presentan lluvias moderadas en el frente de obra aproximadamente a las 10:30

Interventoría

19-11-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante, 1 inspector técnico y comisión topografica
y
Equipos Sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• acopio y traslado de RCD
• chequeo de imbornales obare granulares

intervención

20-11-2025 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector técnico
y
Equipos Sin equipos
Actividades • remate en bajantes de aguas lluvias
• instalación tapas de cajas de inspección
• acopio y traslado de RCD

intervención

22-11-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante, comisión topografica
y y 1 inspector técnico
Equipos Sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• chequeo imbornales y limpieza de sardinel
• cargue manual de RCD
• remate en espacio publico

Nota: se presentan fuertes lluvias en el frente de obra a las 10:15

Se presentan lluvias que impiden el progreso normal de las actividades

23-12-2025 clima soleado
Personal 1 oficial, 1 boal, 1 ayudante, inspector sst y 1 operadores
Equipos 1 minicargador y 1 vibrocompactador
Actividades · instalación de base estabilizada
· nivelación y compactación de base estabilizada
· limpieza y despeje de pista

interventoria

24-12-2025 clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante, 2 operadores y 1 inspector sst
Equipos 1 minicargador y 1 vibrocompactador
Actividades · nivelación y compactación de base estabilizada
· acopio y barrido de RCD
· cargue mecanico de RCD

interventoria

25-12-2025 dia festivo

26-12-2025 clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 operadores y 1 inspector sst
Equipos (Sin equipos) 1 minicargador y 1 vibro
Actividades · limpieza y despeje de pista (cut)
· cargue mecanico de RCD

interventoria

27-12-2025 clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 2 operadores y 1 inspector sst
Equipos 1 minicargador y 1 vibrocompactador
Actividades · instalación de cinta peligro encerramiento
· cargue manual de granular sobrante
· ornato espacio publico

interventoria

Powered by CamScanner

19-29-12-2025 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante, 1 inspector sst y 1 operador
Equipos Sin equipos
Actividades • limpieza y (de pista) despeje de pista
• remate en andenes
• cortes de pavimento en vía

intervientes

30-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante, 1 inspector sst y 2 operadores
20- Equipos Sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• rumates en rampas de acceso vehicular

intervientes

31-12-2025 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 ayudante, 2 operadores y 1 inspector sst
22- Equipos 1 minicargador y 1 vibrocompactador
Actividades • construcción de colombinas en concreto
• acopio y traslado de RCD
• cargue mecánico de RCD

intervientes

02-01-2026 Clima despejado (día festivo)
Personal 1 boal, 1 ayudante, 1 oficial, 2 operadores y
1 comisión topográfica
Equipos 1 minicargador y 1 vibrocompactador
Actividades • limpieza y despeje de pista
• acopio y traslado de RCD
• traslado de carga y punto ecológico

intervientes

03-01-2026 Clima soleado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 residente técnico
Equipos sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• cargue manual de material sobrante
• acopio y traslado de arenas

interventoría

05-01-2026 Clima despejado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante, 1 inspector técnico y
y comisión topografica
Equipos sin equipos
Actividades • limpieza y despeje de pista
• curados en espacio publico
• retiro de material granular sobrante

interventoría

06-01-2026 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante, 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • acopio y traslado de RCD
• cargue manual de RCD
• limpieza y despeje de pista

interventoría

07-01-2026 Clima nublado
Personal 1 boal, 1 oficial, 1 ayudante y 1 inspector sst
Equipos sin equipos
Actividades • se realiza imprimación con liga asfaltica
• limpieza y despeje de pista

interventoría

Powered by CamScanner

06-12-2025 Clima: Soleado

Personal: 1 Boal, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador

Equipo: 1 Retroexcavadora

Actividades:
- Construcción de cárcamo red pluvial
- Excavación mecánica red pluvial
- Acopio y traslego de RCD.
- Excavación mecánica red residual

interventoria

09-12-2025 Clima: Soleado

Personal: 1 Boal, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Operador, Comisión topográfica

Equipo: 1 Retroexcavadora

Actividades:
- Instalación tubería 10" red residual
- Instalación tubería 12" red pluvial
- Instalación hincado 3/4" red pluvial y residual
- Demolición de carpeta asfáltica
- Acopio y traslego de RCD.

NOTA: Cuadrilla de Vanti en obra: Traslado de 2 mangueras de 3/4" para construcción de cajas de inspección.

interventoria

10-12-2025 Clima: Soleado

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador

Equipos: 1 Retroexcavadora

Actividades:
- Construcción cárcamo red pluvial 12"
- Excavación mecánica para red pluvial
- Acopio y traslego de RCD.

interventoria

Scanned with CamScanner

11-12-2025	Clima: Soleado Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador, Comisión topográfica Equipos: 1 Retroexcavadora. Actividades: • Construcción cárcamo red pluvial • Instalación tubería 12" Novafort red pluvial • Instalación triturado 3/4" red pluvial • Cargue y retiro de excavación interventoria
12-12-2025	Clima: Soleado Personal: 1 Boal, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Operador, comisión topográfica Equipos: 1 Retroexcavadora Actividades: • Excavación mecánica red pluvial • Instalación tubería 12" red pluvial • Instalación triturado 3/4" red pluvial • Acopio y trasiego de RCD. interventoria
13-12-2025	Clima: Soleado Personal: 1 Boal, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Operador. Equipos: 1 Retroexcavadora Actividades: • Excavación mecánica red pluvial • Instalación triturado 3/4" red pluvial • Instalación tubera 12" novafort red pluvial • Cargue y retiro de excavación. Se verifican estas actividades interventoria

Scanned with CamScanner

15-12-2025	Clima: Despejado Personal: 1 Oficial, 1 ayudante, 1 Operador. Equipos: 1 Retroexcavadora Actividades: • Figurado de acero para tapa cárcamo 12" interventoria
16-12-2025	Clima: Soleado Personal: 1 Boal, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador, Comisión topográfica. Equipos: 1 Retroexcavadora. Actividades: • Figurado de acero para tapa cárcamo 12" • Excavación manual para acometidas • Instalación Enterrado 3/4" red residual • Instalación tubo 6" novaport para acometidas • Instalación de sillas Yee y Tee interventoria
17-12-2025	Clima: Soleado Personal: 1 Boal, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Operador Equipos: 1 Retroexcavadora Actividades: • Construcción dado provisional para acometidas • Llenado con B200 red residual • Cargue y retiro de excavación interventoria
18-12-2025	Clima: Despejado Personal: 1 Boal, 1 Oficial, 1 ayudante, 1 Operador. Equipos: 1 Retroexcavadora Actividades: • Figurado de acero tapa cárcamo. interventoria

Scanned with CamScanner

19-12-2025

Clima: Despejado
Personal: 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 operador, comisión topográfica
Equipos: 1 Retroexcavadora
Actividades:
- Excavación mecánica red residual
- Excavación manual para acometidas
- Instalación tubo 6" novafort red residual.
- Instalación tubo 10" novafort red residual
- Instalación triturado 3/4" red residual
- Instalación de silla yee
- Acopio y trasiego de RCD.

interventoria

20-12-2025

Clima: Soleado
Personal: 1 Boal, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador
Equipos: 1 Retroexcavadora
Actividades:
- Llenado B200 red residual
- Figurado de acero tapa cárcamo
- Fundida tapa cárcamo
- Cargue y retiro de excavación

interventoria

22-12-2025

Clima: Nublado
Personal: 1 Boal, 1 Oficial, 1 ayudante, 1 Operador
Equipo: 1 Retroexcavadora
Actividades:
- Instalación tubo 6" novafort para acometidas
- Instalación triturado 3/4" para acometidas.
- Instalación de Silla Yee
- Cargue mecánico de RCD.

interventoria

Scanned with CamScanner

23-12-2025

Clima: Nublado

Personal: 1 Oficial, 3 ayudantes, 1 Operador, 1 Boal

Equipos: 1 Retroexcavadora

Actividades:
- Excavación mecánica red residual
- Instalación tubería 6" para acometidas
- Instalación de Silla Yee
- Instalación B200 llenado red residual
- Acopio y trasiego de RCD.

interventoria

24-12-2025

Clima: Despejado

Personal: 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Operador

Equipos: 1 Retroexcavadora

Actividades:
- Excavación mecánica red residual
- Excavación manual para acometidas
- Instalación tubería 6" y 10" red residual.
- Instalación Silla Yee
- Llenado B200 red residual.

interventoria

26-12-2025

Clima: Nublado

Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Operador, 1 Boal

Equipos: 1 Retroexcavadora

Actividades:
- Instalación tubería 6" red residual
- Instalación tubería 10" red residual
- Instalación Entronado 3/4" red residual
- Instalación Silla Yee.
- Cargue mecánico de RCD.

interventoria

Scanned with CamScanner

27-12-2025 Clima: Nublado
Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Operador
Equipos: 1 Retroexcavadora
Actividades: • Instalacion B200 en red residual.
• Instalación de tuberia 10"
• Instalación de triturado 3/4"

interventoria

29-12-2025 Clima nublado
Personal 1 oficial, 2 ayudantes, 3 oficiales, 1 operador y 1 inspector técnico
Equipos 1 excavadora
Actividades • excavación mecanica para cajeo de via
• instalación de triturado 3/4"
• instalación tubo novafort de 10" red residual

interventoria

30-12-2025 Clima despejado
Personal 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador, 1 inspector SST y comisión topografica
Equipos: 1 excavadora
Actividades • excavación mecanica para cajeo de via
• instalación de silla yee de 6" a 10"
• instalación tubo 6" red residual
• instalación de triturado 3/4"
• instalación de B200 red residual

Se verifican estas actividades por parte de la interventoria

31-12-2025 Clima soleado
Personal 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 operadores y 1 inspector técnico
Equipos sin equipos
Actividades • instalación de tratubado 3/4" red residual
• instalación de tubo de 10" red residual
• instalación de B200 red residual

interventoria

02-01-2026 Clima nublado
Personal 1 boal, 2 oficiales, 2 ayudantes y 1 operador y comisión topografica
Equipos 1 retroexcavadora
Actividades • limpieza y despeje de pista
• cargue manual de materiales
• acopio y traslado de RCD

interventoria

03-01-2026 Clima soleado
Personal 1 boal, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 operador y comisión topografica
Equipos sin equipos
Actividades • acopio y traslado de RCD
• instalación dados en concreto red de 6"
• instalación de B200
• cargue mecanico de RCD

interventoria

04-01-2026 Clima: soleado
Personal 1 boal, 3 oficiales, 2 ayudantes, comisión topografica
y 1 excavadora
Equipos
Actividades • instalación de silla yee de 6" a 10"
• instalación de triturado 3/4 red vertical 6" y 10"
• construcción dado un concreto

intervantoria

05-01-2026 Clima: nublado
Personal: 1 boal, 3 oficiales, 2 ayudantes, comisión topografica,
y 1 inspector técnica
Equipos 1 excavadora
Actividades • instalación de silla yee de 6" a 10"
• instalación tubo 6" novafort"
• instalación triturado 3/4" red vertical

intervantoria

06-01-2026 Clima despejado
Personal 1 boal, 3 oficiales, 3 ayudantes, comisión topografica
y 1 inspector SST
Equipos sin equipos
Actividades • instalación tubo 10" novafort vertical
• acopio y traslado de RCD
• cargue mecanico de RCD
• limpieza y desenjue de pista

Se verifican estas actividades por parte de la intervantoria

Scanned with CamScanner

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 846 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA Y CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA

Contrato No.	846-2024
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra Publica
Objeto:	Ejecutar a precios fijos ya monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá DC con obras y actividades de conservación.
Nombre del Contratista:	**CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA**
Identificación:	**901.901.931-7**
Fecha de Suscripción	31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio:	7 de abril de 2025
Fecha prevista de terminación:	6 de diciembre de 2025
Plazo:	Ocho (8) meses
Valor	$ 6.351.563.839
Prórroga Nro. 1	TRES (03) MESES ES DECIR DESDE EL 7 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 6 DE MARZO DE 2026.
Adición Nro. 1	$3.175.781.919
Valor Total del Contrato incluido Adición Nro. 1	$ 9.527.345.758
Fecha de Terminación incluida Adición y Prórroga Nro. 1	6 de marzo de 2026

Entre los suscritos a saber, suscritos a saber, **VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.419.856 de Bogotá en calidad de Alcalde Local de Puente Aranda actuando en nombre y representación del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda con NIT. 899.999.061.9, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 238 del 17 de agosto de 2021 y Acta de posesión No. 255 del 18 de julio de 2024, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará **EL FONDO**, por una parte, y por la otra, **CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA** identificado con Nit. Nro. **901.901.931-7** representando legalmente por **RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78.038.056 de Ciénaga de Oro, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos acordado suscribir **Adición y Prórroga No. 1** al Contrato de Obra Pública No. 846 de 2024, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el día 31 de diciembre se suscribió el contrato cuyo objeto es: "Ejecutar a precios fijos ya monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la

ciudad de Bogotá DC con obras y actividades de conservación." **2).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por **OCHO (08) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, la cual se surtió el día 7 de abril de 2025, con fecha de terminación el día 6 de diciembre de 2025. **3).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($6.351.563.839) M/CTE. 4).** Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha del 18 de julio de 2025 el apoyo a la supervisión solicita adición y prórroga Nro. 1 al Contrato de Obra Pública No. 846 de 2024, por un plazo de **TRES MESES (3)**, por un valor de **TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($3.175.781.919)**, en atención a la necesidad del servicio contenida en precitado documento. **5).-** Que la solicitud de modificación contractual fue diligenciada de conformidad con la directriz de la Secretaría Distrital de Gobierno y cargada a la plataforma Sipse. **6).-** Que, en atención a lo anterior, el Alcalde Local, aprueba la modificación contractual solicitada y remite la documentación correspondiente al área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II. **7).-** Que los documentos que justifican la adición y prórroga No. 1 del Contrato, forman parte integral de la presente modificación contractual. **8).-** Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente**. 9).-** Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA**: Adicionar al Contrato de Obra Pública No. 846 de 2024, el valor de **TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($3.175.781.919)**, amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1058 del día 31 de julio de 2025 con cargo a los rubros O230117459920242464 "Conservación del espacio público para Puente Aranda" y O230117459920242528 "Vías seguras para Puente Aranda)". **CLÁUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 846 de 2024, por el plazo de **TRES MESES (3)** contados a partir del **SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2025** con nueva fecha de terminación el día **SEIS (6) DE MARZO DE 2026**, conforme al valor y forma de pago del contrato. **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás condiciones y obligaciones del Contrato se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA QUINTA:** La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II.

Proyectó:	Christian Camilo Suarez - Abogado de Apoyo FDLPA	Aprobado a través de la Plataforma Transaccional del SECOP II
Revisó:	Jenny Andrea Rocha // José Wilman Torres– Profesionales Contratos	
Revisó:	Jesús David Díaz Campos – Profesional Especializado de Despacho FDLPA	
Aprobó:	Víctor Alfonso Cruz Sánchez - Alcalde Local	
