
RECORRIDO SEGMENTO VIAL BARRIO GILMAR CONTRATO 1009 - 2024

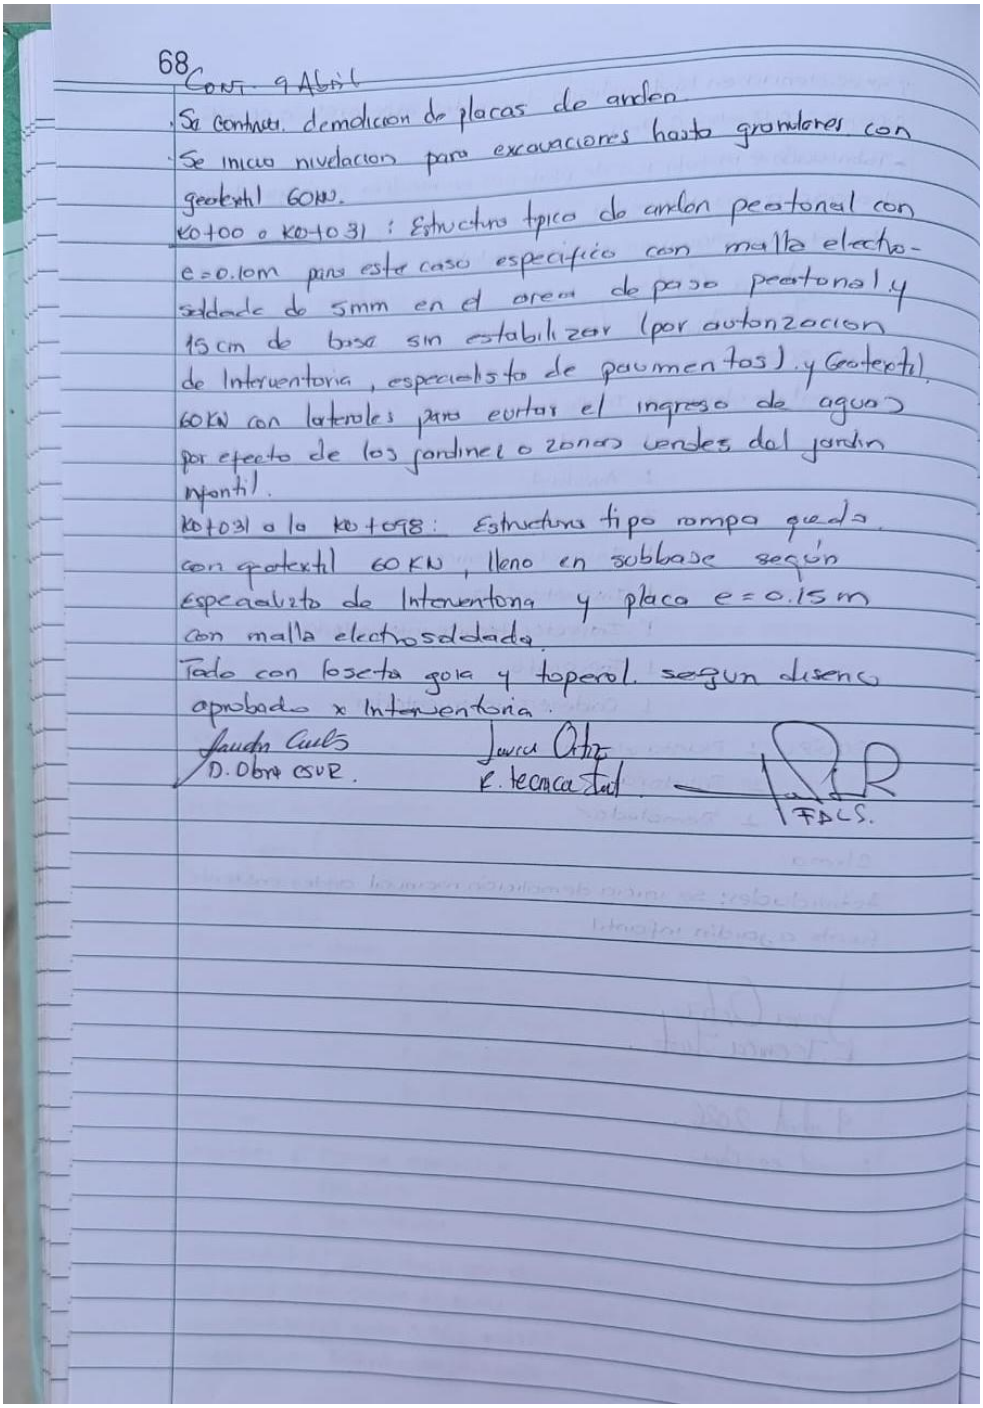

68
Cont. 9 Abril
Se continua demolicion de placas de anden
Se inicio nivelacion para excavaciones hasta granulares con geotextil 60KN.
K0+000 a K0+031 : Estructura tipica de anden peatonal con e=0.10m para este caso especifico con malla electrosoldada de 5mm en el area de paso peatonal y 15 cm de base sin estabilizar (por autorizacion de Interventoria, especialista de pavimentos) y Geotextil 60KN con laterales para evitar el ingreso de aguas por efecto de los jardines o zonas verdes del jardin infantil.
K0+031 a la K0+098: Estructura tipo rampa guada con geotextil 60 KN, lleno en subbase según especialista de Interventoria y placa e=0.15 m con malla electrosoldada.
Todo con roseta gola y toperol. segun diseno aprobado x Interventoria.
Claudia Cuels
D. Obra CSVR.
Jairo Ortiz
R. tecnica Tal.
FDCS.
