BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

www.gobiernobogota.gov.co

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

"CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL LOCALIDAD SUBA"

24 de abril 2026

1009-2024 OBRA CONSERVACIÓN

TIPO DE CONTRATO	OBRA	INTERVENTORIA
CONTRATO NUMERO	1009-2024	083-2025
OBJETO CONTRACTUAL	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR	CONSORCIO SUBA TH 003
VALOR INICIAL DE CONTRATO	$ 13.388.373.112	$ 1.673.546.671
ADICIÓN DE RECURSOS	$ 4.127.888.622	$ 608.562.426
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.516.261.734	$ 2.282.109.097
VALOR PAGADO (Corte 31/12/2025)	$ 8.327.325.651	$ 912.843.640
FECHA DE INICIO	1 de abril 2025	1 de abril 2025
PRORROGA EN DIAS	120 días	122 días
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de mayo de 2026	30 de junio de 2026
NOVEDADES	La adición y prórroga No. 1 se legalizó el 18/12/2025	La adición y prórroga No. 1 se legalizó el 18/12/2025


BOGOTÁ

RESUMEN 1009 -2024

	Total de CIVs	Calzadas	Anden	Resalto
CIV Activos (Ejecución)	6	4	2	
Propuesto para exclusión	24	18	1	5
CIVs Finalizados	30	18	12	
Por iniciar (Andenes y CIV 11002729 -POA)	17	1	16	
Respuesta de Acueducto - No intervención de CIVs	5	5		
Postergar Intervención (Siniestrados)	2	2		
Otro PMT vía (Andenes 11013032 - 11014786)	2		2	
No se logro la investigación CCTV (Santa Cecilia) y (Bilbao)	10	10		
Fase 3	8	8		
CIVs de Andenes de Turingia. Inician una vez finalice la vía	2		2	
En diagnostico	2	2		
	108	68	35	5

AVANCE 1009 -2024

OBRA	ACUMULADO		ACUMULADO	Atraso /Avance
Ejecución programada ($)	$ 11.407.464.736,00	Ejecución ejecutado ($)	$ 11.443.342.180,00	27.021.924,00
Ejecución programado (%)	68,21%	Ejecución ejecutado (%)	68,43%	0,215%

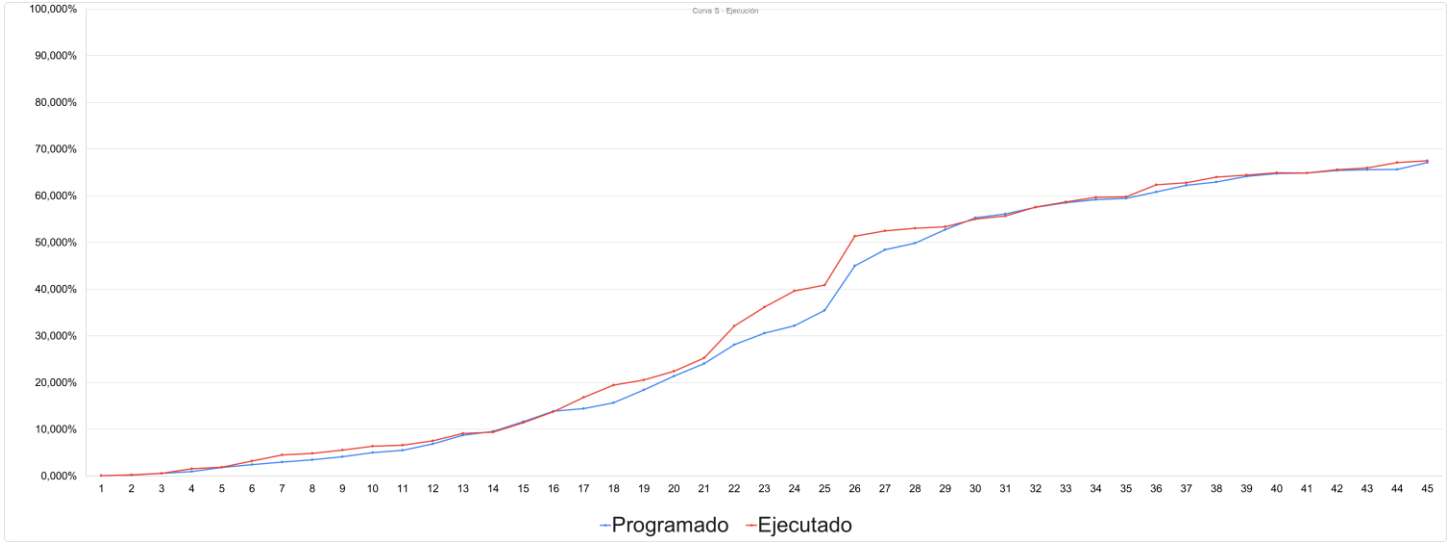

PRESUPUESTO INICIAL ENTORNOS ESCOLARES 1009 -2024

El 18 de diciembre de 2025, se firmo la modificación para la ejecución de 20 CIVs de entornos escolares de los cuales solo se han podido ejecutar 6 CIVS, dados los alcances de ejecución en estos segmentos.

Entornos Escolares		
Juan Lozano		
11001466	$	39.828.681,00
11001558	$	47.043.030,00
Vista Bella Sede A		
11002186	$	2.083.976,00
Toscana		
11003804	$	2.946.674,00
11003895	$	3.303.433,00
11011985	$	3.190.697,00
Total Ejecutado a marzo de 2026	$	98.396.491,00
Presupuesto estimado	$	495.738.857,79
Porcentaje		20%

ESTADO DE PIPs 1009 -2024 – EJECUTADOS 4 CIV sin redes

#	CIV	BARRIO	CODIGO	TIPO DE ELEMENTO	DIRECCIÓN			Detalle por sector	COSTO PROYECTADO
					TRAMO	DESDE	HASTA		
1	11014535	VILLA ELISA	43836	CALZADA	CL 134 Bis	K.R 91	lindero	Luego de la reunión realizada el 30 de marzo de 2026, en el que se informo por parte de Acueducto su no intervención el contratista inicia etapa de diagnosticos	554.608.280,00
SUBTOTAL KRA 91 GRASAS									$ 554.608.280,00
2	11001008	SALITRE	43806	CALZADA	CLL 157A	KR 97B	KR 98	Finalizado	5.000.000,00
3	11000998		43806	CALZADA	CLL 157A	KR 97B	KR 99	Ejecucion	152.380.500,00
CLL 15A SELLOS									$ 157.380.500,00
4	11012503	TUNA ALTA	43802	CALZADA	CL 157	KR 80	KR 89	En Diagnosticos	392.642.860,00
SUBTOTAL KRA 80									392.642.860,00
4	11002168	SABANA	43828	CALZADA	KR 127C	CL 143 A	CL 143 B	La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB informó que no tiene contemplada, dentro de su programación, la intervención correspondiente en el sector objeto de análisis. En revision interna del FDLS la reposicion y cambio de redes.	230.790.000,00
6	11002053	SABANA	43828	CALZADA	KR 127C	CL 143 B	LINDERO		185.649.819,00
SUBTOTAL SECTOR SABANA CONJ CERR									$ 416.439.819,00
7	11002121	LISBOA 150c	43802	CALZADA	CL 157	KR 80	KR 89	En Diagnosticos	600.079.645,00

#	CIV	BARRIO	CÓDIGO	TIPO DE ELEMENTO	DIRECCIÓN			Detalle por sector	COSTO PROYECTADO
					TRAMO	DESDE	HASTA		
SUBTOTAL LISBOA KRA 150C									600.079.645,00
8	11001615	LISBOA/ SIN CCTV REDES COLAPSADAS	43816	CALZADA	CL 143B	KR 151A	KR 153B	Se solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB la limpieza de la red sanitaria en el sector Bilbao, correspondiente a seis (6) CIVs que presentan un nivel de colmatación aproximado del 80%. En consecuencia, no ha sido posible realizar la verificación del estado actual de las redes. A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la EAAB.	148.589.980,00
9	11001609		43816	CALZADA	CL 143B	KR 150B	KR 153C		138.369.480,00
10	11001600		43816	CALZADA	CL 143B	KR 150C	KR 153D		128.901.360,00
11	11001584		43816	CALZADA	CL 143B	KR 150D	KR 153F		139.871.360,00
12	11001576		43816	CALZADA	CL 143B	KR 150F	KR 153G		134.508.420,00
13	11001562		43816	CALZADA	CL 143B	KR 150C	KR 153A		157.512.960,00
SUBTOTAL SECTOR LISBOA									847.753.560,00
14	11001059	SALITRE	43806	CALZADA	CLL 157A	KR 98	KR 98A	Finalizado	3.000.000,00
15	11013175		43806	CALZADA	CLL 157A	KR 98A	KR 98B	Finalizado	5.000.000,00
CLL 15A SELLOS									$ 8.000.000,00
16	11007996	EL TABOR	43833	CALZADA	CL 130A Bis	87A	KR 88 C	A la fecha, se continúa a la espera de la respuesta por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, en relación con la definición y autorización de la intervención correspondiente al cambio y reposición de redes.	32.500.000,00
17	11008029		43833	CALZADA	CL 130A Bis	87D	KR 88 A		32.500.000,00
18	11007978		43833	CALZADA	CL 130A Bis	87C	KR 89		204.508.402,00
KRA 89 PENDIENTE ALTA									$ 269.508.405,00
Total									$ 3.246.413.069,00

GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
