INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No.: 9513-2025

CONTRATISTA: ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE: Secretaría Distrital de Integración Social – Subdirección de Plantas Físicas

TIPO D

E CONTRATO: Suministro

OBJETO: Suministro e instalación de señalización y avisos para los centros y sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social.

FECHA DE INICIO: 24 de septiembre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de marzo de 2026

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $477.380.000

Abril 2026

1. **INFORMACION GENERAL:**

Contratante	Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS
Nit	899.999.061-9
Contrato No	9513-2025
Objeto	Suministro e instalación de señalización y avisos para los centros y sedes de la secretaria distrital de integración social
Tipo de contrato	Suministro
Contratista	Aliados de colombia sas
Nit	900,354,406-0
Valor Inicial	$365,480,000
Valor final	$477,380,000
Fecha de inicio	24/09/2025
Fecha de finalización	31/03/2026

INFORMACION LEGAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
ASEGURADO	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
NUMERO DE POLIZA CUMPLIMIENTO	18-44-101109201
NUMERO DE POLIZA RC	18-40-101080304

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA HASTA 30/09/2026
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	VIGENCIA HASTA 31/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	VIGENCIA HASTA 30/09/2026
PAGO DE SLARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	VIGENCIA HASTA 31/03/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VIGENCIA HASTA 31/03/2026

2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto contractual consistió en el suministro e instalación de señalización y avisos institucionales en los centros y sedes de la SDIS.

El alcance comprendió:

- Visitas técnicas y levantamientos de información.
- Diseño, producción y suministro de señalización institucional.
- Instalación de avisos exteriores e interiores.
- Implementación de señalización accesible con sistema braille.
- Mantenimiento y reposición de elementos deteriorados.
- Transporte, entrega e instalación en las veinte (20) localidades de Bogotá D.C.

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Durante la ejecución del contrato se realizaron modificaciones que permitieron ampliar su alcance y optimizar la prestación del servicio, generando un incremento en el valor contractual y la ampliación del plazo de ejecución.

Concepto	**Valor**
Valor Inicial	$365.480.000 COP
Valor Final	$477.380.000 COP
Incremento Presupuestal	$111.900.000 COP

Estas modificaciones garantizaron el cumplimiento integral del objeto contractual y la atención de las necesidades de la entidad.

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S. ejecutó el contrato conforme a las especificaciones técnicas, cronogramas y lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Durante la ejecución se realizaron actividades de fabricación, suministro e instalación de señalización en centros de atención, jardines infantiles y sedes administrativas, contribuyendo a la adecuada identificación institucional y orientación de los usuarios.

Asimismo, se instalaron avisos acrílicos en sedes como el Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes y el Jardín Infantil Colibrí de la Esperanza.

Pago 1 FE 2364 $36,965,383

Durante el mes de octubre de 2025 se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la instalación de avisos exteriores en diferentes unidades operativas y centros de atención pertenecientes a la Secretaría Distrital de Integración Social. Estas acciones se realizaron en cumplimiento de los lineamientos contractuales y con el fin de garantizar la correcta identificación institucional y orientación en los espacios intervenidos. En primer lugar, se realizó la instalación de avisos exteriores en acrílico sobre fachada en el Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes, ubicado en la localidad de Suba. Adicionalmente, se colocó un aviso exterior en el Jardín Infantil Colibrí de la Esperanza, el cual se encuentra dentro del mismo complejo institucional. Ambos avisos fueron elaborados conforme a los diseños aprobados, cumpliendo con los estándares de visibilidad, proporción y materiales establecidos por la Secretaría.

Fotos de referencia:



Asimismo, se completó la instalación de 32 avisos exteriores tipo lona banner en diferentes Jardines Infantiles, Centros Proteger, Casas de Juventud y Subdirecciones Locales. Estos

elementos fueron ubicados estratégicamente para garantizar la identificación clara de los servicios ofrecidos y reforzar la presencia institucional en los territorios. Las lonas fueron fabricadas en material resistente a la intemperie, con impresión en alta resolución y acabados que aseguran su durabilidad y correcta visualización en el espacio público. Fotos de referencia:



Todas las actividades de instalación se realizaron conforme al cronograma establecido, respetando las especificaciones técnicas, los requerimientos de visibilidad y los criterios de accesibilidad definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.


Pago 2 FE $280,938,143

Durante el mes de noviembre de 2025 se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la instalación de avisos exteriores y la implementación de señalización interna en diferentes unidades operativas, centros de atención y jardines infantiles pertenecientes a la Secretaría Distrital de Integración Social. Estas acciones se ejecutaron en cumplimiento de los lineamientos contractuales y con el propósito de garantizar la adecuada identificación institucional, mejorar la orientación de los usuarios y fortalecer la señalización en los espacios intervenidos.

NOMBRE DE LA UNIDAD	VALOR
MARIA ELENA WALSH	$ 6.418.588,00
CASA DE JUVENTUD NASQUA	$ 6.851.000,00
JARDIN INFANTIL EL NOGAL DE LA ESPERANZA	$ 8.245.816,00
CIUDAD QUE SOÑAMOS	$ 9.337.216,00
CDC MARIA GORETTI	$ 457.300,00
JARDIN EL ROSARIO	$ 7.330.740,00
CDI CAMILO TORRES	$ 6.722.616,00
ALDEA DE PENSADORES	$ 9.909.368,00
CENTRO AMOR ENGATIVA	$ 6.768.584,00
CASA DE JUVENTUD CHAPINERO	$ 3.548.172,00
SUBDIRECCION LOCAL LOS MARTIRES	$ 5.032.272,00
CENTRO DE PROTECCION CURMM	$ 14.811.420,00
JARDIN BOCHICA / SUEÑOS DE CUNA MARIA BARANOA	$ 3.389.800,00
HOGAR DE PASO PUENTE ARANDA	$ 4.680.644,00
SLIS FONTIBON	$ 8.226.844,00
CASA DE JUVENTUD HUITACA	$ 6.009.704,00

CASA DE JUVENTUD IWOKA	$	8.237.724,00
CDC PORVENIR	$	13.628.220,00
CASA DE LA JUVENTUD JOSE SARAMAGO	$	6.424.844,00
JARDIN INFANTIL AVENTURAS MAGICAS	$	13.108.972,00
CDC ARBORIZADORA ALTA	$	9.897.332,00
JARDIN INFANTIL PREGUNTARIO	$	6.682.088,00
CENTRO CRECER VISTA HERMOSA	$	8.903.988,00
SLIS TUNJUELITO - PABLO TARSO	$	8.547.940,00
CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	$	4.009.960,00
CASA DE LA JUVENTUD TUNJUELITO	$	3.249.788,00
BELLO HORIZONTE	$	3.395.988,00
SLIS SAN CRISTOBAL SUR	$	4.169.216,00
CDC LA VICTORIA	$	19.966.840,00
CDC SAMBLAS	$	11.144.996,00
TIBABUYES	$	41.883.410,00
AVISOS	$	9.918.800,00
VALOR TOTAL	$	280.910.190,00

Fotos de referencia:

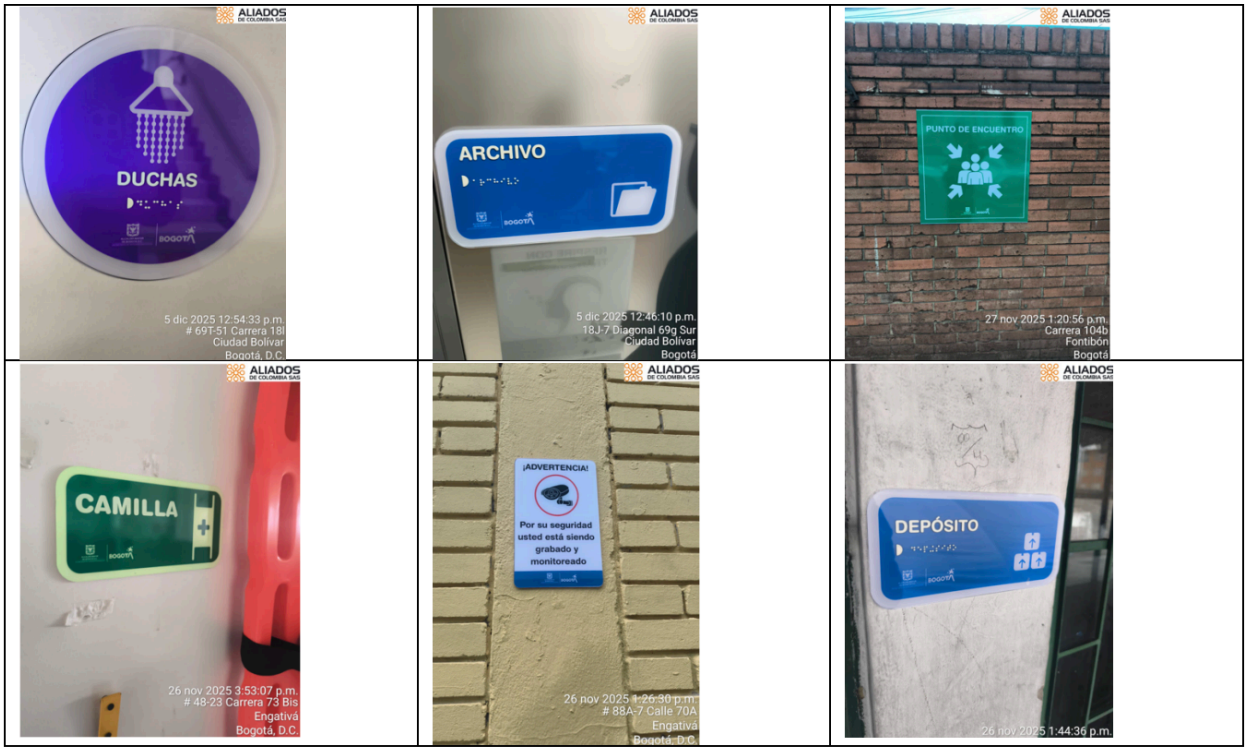

Todas las actividades de instalación se realizaron conforme al cronograma establecido, respetando las especificaciones técnicas, los requerimientos de visibilidad y los criterios de accesibilidad definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. Cualquier inquietud o requerimiento adicional relacionado con las activida

Pago 3 FE $40,887,125

Durante el mes de enero de 2026 se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la instalación de avisos exteriores y la implementación de señalización interna en diferentes unidades operativas, centros de atención y jardines infantiles pertenecientes a la Secretaría Distrital de Integración Social. Estas acciones se ejecutaron en cumplimiento de los lineamientos contractuales y con el propósito de garantizar la adecuada identificación institucional, mejorar la orientación de los usuarios y fortalecer la señalización en los espacios intervenidos.

Fotos de referencia:



Se anexan al presente informe los registros fotográficos correspondientes a los avisos instalados en los centros y sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social, como soporte y evidencia de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado.




Todas las actividades de instalación se realizaron conforme al cronograma establecido, respetando las especificaciones técnicas, los requerimientos de visibilidad y los criterios de accesibilidad definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Pago final

Durante los meses de febrero y marzo de 2026 se desarrollaron actividades relacionadas con el suministro e instalación de avisos exteriores y la implementación de señalización interna en diferentes unidades operativas, centros de atención y jardines infantiles pertenecientes a la Secretaría Distrital de Integración Social. Estas acciones se ejecutaron conforme a los lineamientos contractuales y a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, con el propósito de garantizar la adecuada identificación institucional, optimizar la orientación de los usuarios y fortalecer la accesibilidad y seguridad en los espacios intervenidos. Asimismo, los bienes y servicios suministrados durante este periodo corresponden a los valores facturados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato.

Registro fotografico



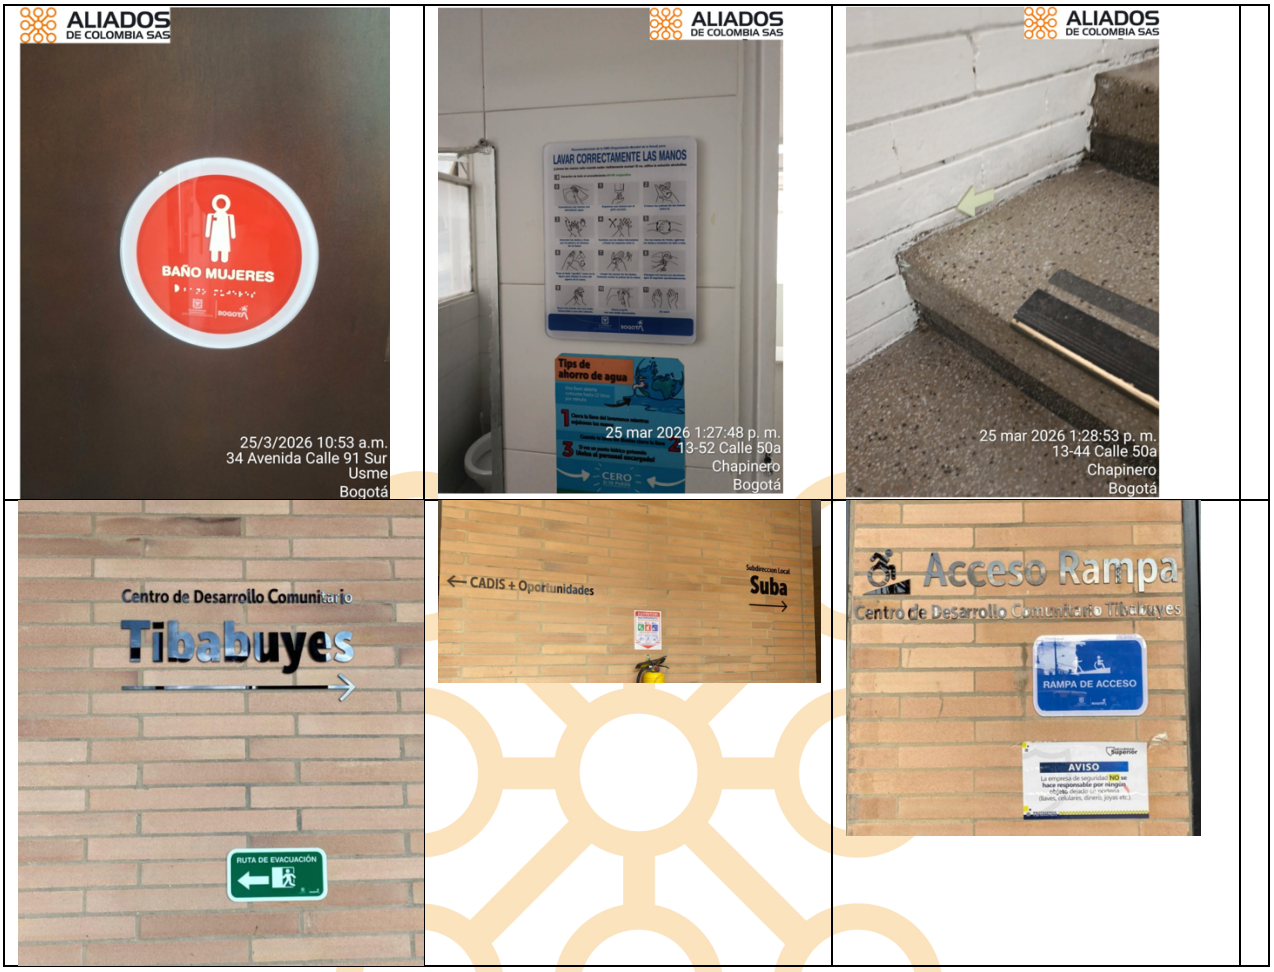

Todas las actividades de instalación se realizaron conforme al cronograma establecido, respetando las especificaciones técnicas, los requerimientos de visibilidad y los criterios de accesibilidad definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR
PAGO 1	$36,965,383
PAGO 2	$280,938,143
PAGO 3	$40,887,125
PAGO PENDIENTE	$76.177.544
PAGO PENDIENTE	$42,411,600

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato, entre ellas:

- Entrega oportuna de los bienes y servicios.
- Elaboración de informes de ejecución y registro fotográfico.
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Aplicación de buenas prácticas ambientales y del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.

7. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1 Obligaciones Ambientales

- Uso de materiales reciclables en embalajes.
- Reducción de plásticos de un solo uso.
- Aplicación de la política “Cero Papel”.

7.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

- Implementación del SG-SST.
- Uso de elementos de protección personal.
- Cumplimiento de la normativa vigente en trabajo en alturas.

8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión fue ejercida por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social, garantizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.

9. EJECUCIÓN FINANCIERA

9.1 Forma de Pago

La SDIS efectuó pagos mensuales conforme a los servicios prestados y productos entregados a satisfacción.

9.2 Plan de Pagos

No. de Pago	Factura	Valor	Estado
Pago 001	1264	$36.965.383	Pagado
Pago 002	1274	$280.938.143	Pagado
Pago 003	1286	$40.887.125	Pagado

10. GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista constituyó las garantías exigidas por la ley y el contrato, incluyendo:

- Cumplimiento.
- Calidad de los bienes.
- Calidad del servicio.
- Pago de salarios y prestaciones sociales.
- Responsabilidad civil extracontractual.

11. IMPACTO DEL CONTRATO

La ejecución del contrato permitió:

- Fortalecer la imagen institucional de la SDIS.
- Mejorar la orientación y accesibilidad de los usuarios.
- Garantizar entornos seguros e inclusivos.
- Optimizar la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C.

12. CONCLUSIONES

1. ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S. cumplió satisfactoriamente con el objeto del Contrato No. 9513-2025.
2. Las actividades se ejecutaron conforme a la normativa vigente y a las especificaciones técnicas establecidas.
3. El contrato se desarrolló bajo los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.
4. Se evidenció el cumplimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.
5. Se recomienda la suscripción del acta de liquidación bilateral.

Atentamente,



_____

Jenny Paola Torres Gómez
Representante Legal – ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.
C.C. 1.020.752.452 – Bogotá D.C.
