CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 12
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 13
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 14

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**25000814_ H1 DE 2025**
Nombre del Contratista:	**SKYTECH SAS, IDENTIFICADO CON NIT 900349758-8**
Periodo informe:	**JULIO-DICIEMBRE DE 2025**
Nombre de Supervisor:	**CARLIE CECILIA GARCIA CALONGE**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**GRUPO REGIONAL MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA-REGIONAL NOROCCIDENTE**

1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR E INSTALAR SISTEMA DE DESTELLO PARA EL AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERIA.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Con el fin de dejar constancia durante los meses julio-diciembre de 2025, se recibió a satisfacción objeto del presente contrato, por un valor de **$593.126.761,50**, cumpliendo el contratista con los Pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

De acuerdo con el formato 8 especificaciones técnicas del contrato y cronograma de actividades, se relaciona por etapas las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.

Por concepto de suministro e instalación contrato 25000814_H1 de 2025.

ETAPA 1:

Por parte del contratista, durante la etapa de ejecución se realiza la compra de equipos, bienes y materiales a suministrar requeridos durante el desarrollo y ejecución del contrato; adicional despacho de equipos de fabrica (envíos de equipos desde fábrica, nacionalización de equipos, transporte al sitito de entrega).

ETAPA 2:

Se realizó la adquisición e instalación del sistema de luces secuenciales de destello aeropuerto Los Garzones de Montería. La ejecución completa de esta actividad se realizó desde el día 28 del mes de noviembre al día 6 del mes de diciembre, en donde en dicha actividad se realiza el suministro e instalación de las luces de destello secuencial elevada fuente luminosa tipo led, el suministro e instalación de la unidad de control principal ubicado en la subestación subterránea ALS, junto a la integración y adecuación del control PLC para su funcionamiento y el suministro e instalación de las acometidas eléctricas para la interconexión entre la subestación subterránea ALS a unidades de control y de unidades de control a luces.

ETAPA 3:

Se realizó el mantenimiento y restauración a las 21 estructuras auto soportadas de las luces del sistema SFL. La ejecución completa de esta actividad se realizó desde el día 2 del mes de agosto al día 18 del mes de noviembre, en donde en dicha actividad se realiza la restauración de la estructura que se compone del retiro de pintura, tratamiento anticorrosivo, limpieza de barras, pintura, accesorios, anclajes, cambio de pernos existentes en base de frangibles y reemplazar por pernos en acero inoxidable.

ETAPA 4:

Se realizó el montaje de las acometidas eléctricas. La ejecución completa de esta actividad se realizó desde el día 29 del mes de julio al día 27 del mes de noviembre, en donde en dicha actividad se realiza el suministro e instalación del cable desnudo de cobre calibre N° 6 AWG y el desmonte del sistema de destello (SFL) junto a los gabinetes de control, potencia y luminarias entregadas en sitio a los funcionarios de la Aerocivil.

ETAPA 5:

Se recibe por parte del contratista los repuestos del sistema. La ejecución completa de esta actividad se realizó desde el día 18 del mes de julio al día 22 del mes de noviembre, en donde en dicha actividad el contratista realiza el suministro y entrega de 15 luces de destello secuencial elevada fuente luminosa tipo led, incluye accesorios de montaje y conexión, fuente de energía y control. Adicional se reciben 8 frangibles.

ETAPA 6:

Capacitación al personal técnico de Aerocivil Y entrega de material de estudio mediante una memoria USB de acuerdo con el contrato.

- Desmonte Sistema mástiles de aluminio





Destello SFL antiguo y reparación








jueves, 31 de julio de 2025 13:33:20.565
53° NE
Colombia
montería
Número de índice: 1.520






Remark: MONTERIA VOR
Número de índice: 3672
Network: 1 ago 2025 11:05:09 a. m. GMT-05:00
Local: 1 ago 2025 11:05:09 a. m. GMT-05:00

- Montaje de acometida eléctrica.





- Instalación del sistema destello SFL, cableado, conectores, tornillería inoxidable, frangibles, mástiles, bombillas, calibración de bombillas, cajas, unidades de control.










Airport
skytech





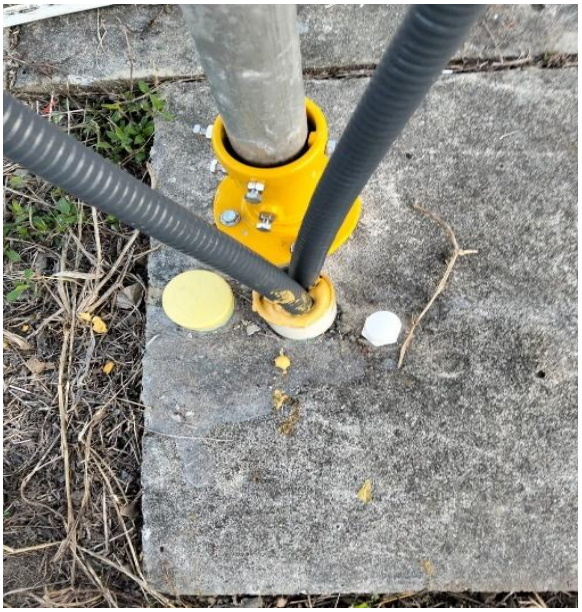

113° SE
Altitud:31.0msnm
Velocidad:0.2km/h
Número de índice: 1803













- Instalacion regulador de destello SFL, acometida eléctrica y conexión al sistema remoto PLC en la subestación subterranea.



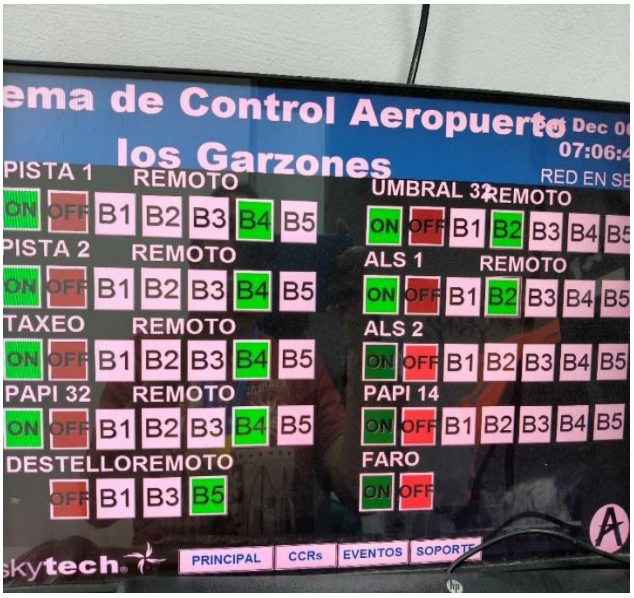


- Sistema destello SFL funcionando modo normal. Torre de control.



- Sistema destello SFL funcionando modo normal. Subestación energía.





- Repuestos entregados a personal de Aerocivil. 15 bombillas y 15 unidades de control, adicional quedaron 8 frangibles disponibles y 18 llaves de los gabinetes.

















b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Adquisición e instalación Sistema de Destello para el Aeropuerto de Montería	Todas las etapas		X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No aplica

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	(XXXX)
É	¿Cómo se mitigó el riesgo?	(XXXX)
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	**PAGO REALIZADO**	**V/R PENDIENTE POR PAGAR**
$ 593.126.761,50, INCLUIDO IVA		
		$593.126.761,50 INCLUIDO IVA

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

ETAPA 1. Adquisición de equipos de fábrica y compra de suministros y bienes materiales.	Completado
ETAPA 2. Adquisición e instalación del sistema de luces secuenciales de destello Aeropuerto los Garzones de Montería. Puesta en funcionamiento e integración a PLC.	Completado
ETAPA 3. Mantenimiento y restauración a las 21 estructuras auto soportadas de las luces del sistema SFL.	Completado
ETAPA 4. Montaje de las acometidas eléctricas.	Completado

ETAPA 5. Entrega por parte del contratista repuestos.	Completado
ETAPA 6. Capacitación del personal técnico de Aerocivil.	Completado

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100% al 9 de diciembre de 2025.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Carlie Garcia C.

CARLIE CECILIA GARCIA CALONGE
C.C. 50.933.988
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
