DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2257 DE 2025

"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".



INFORME DE OBRA No. 01

25 NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DEL 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
4. LOCALIZACIÓN 4
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 5
5.1. GENERALIDADES 5
6. ACTIVIDADES DEL CONTRATO 6
6.1. RESUMEN GENERAL 6
PRELIMINARES 6
DESMONTENTES Y DEMOLICIONES 7
PISOS Y ENCHAPES 9
LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS 10
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 10
REJILLAS CARCAMO 10
LUMINARIA EXTERIOR 10
SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO 11
SUMINISTROS 11
CONCRETOS Y ACEROS AMPLIAR CUARTO DE LA CALDERA 11
7. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO 12
8. INFORME DE PERSONAL Y EQUIPO 18
PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA 18
9. ACTIVIDADES EJECUTADAS 19
10. ESTADO FINANCIERO ..... ***¡Error! Marcador no definido.***
10.1. RESUMEN FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. ***¡Error! Marcador no definido.***
11. APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 20
12. PÓLIZAS Y GARANTIAS 21
13. CONCLUSIONES 22

1. INTRODUCCIÓN

Mediante Acta de Reunión No. 05 del 25 de abril de 2025, el COMITÉ DE ORDEN PUBLICO se aprobó la necesidad presentada por el EJERCITO NACIONAL con el nombre del proyecto: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BISER20, BR7, Y DIV4, por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTISIETE PESOS COP ($2.380.823.027), allegando la respectiva ficha técnica con su respectiva justificación. Identificación de la Situación Problemática conforme a la ficha técnica presentada por la entidad donde expone el siguiente contexto: Las instalaciones del rancho y comedor de tropa requieren un mantenimiento integral en todas sus áreas, ya que se encuentran en condiciones deficientes que afectan directamente su operatividad. este deterioro impacta negativamente el adecuado funcionamiento de los procesos relacionados con la preparación de alimentos, lo que podría comprometer la seguridad e higiene alimentaria, así como la eficiencia y bienestar del personal militar. Descripción de la situación actual Actualmente las instalaciones del rancho y comedor de tropa, se encuentran en un estado avanzado de deterioro generado por la falta de mantenimiento constante y/o preventivo necesario, debido a esta situación en ocasiones se ve afectado funcionamiento normal, lo que puede comprometer la calidad de los alimentos preparados provocando un alto riesgo a la salud. al realizar estas mejorar los soldados serán los más beneficiados, debido a que van a recibir sus alimentos preparados en óptimas condiciones, van a disfrutar de los mismos en un espacio moderno generando confort y elevando la moral dando como resultado un personal militar disponible y con actitud para prestar su servicio en la jurisdicción del meta

El presente informe pretende hacer una recopilación de las actividades ejecutadas, avance físico y financiero, entre otros, por el CONSORCIO CANTON MILITAR en el periodo comprendido del **25 de NOVIEMBRE al 18 de DICIEMBRE de 2025**.

2. OBJETIVO

Presentar de manera clara y detallada el seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Obra No. 2257 del 14 de noviembre de 2025, suscrito entre el Departamento del Meta y el CONSORCIO CANTÓN MILITAR, cuyo objeto es la remodelación de las instalaciones del rancho y comedor de tropa del Cantón Militar de Apiay del BISER20 BR y DIV4, en el municipio de Villavicencio – Meta; con el fin de verificar el cumplimiento del cronograma, el avance físico ejecutado, la inversión de los recursos, la calidad de las actividades desarrolladas y las obligaciones contractuales pactadas durante el período informado.

Asimismo, el informe tiene como propósito identificar posibles desviaciones frente a la programación establecida, registrar las situaciones técnicas presentadas en obra y dejar constancia del estado actual del proyecto, como soporte para la toma de decisiones por parte de la interventoría y la entidad contratante.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ofrecer seguridad a los soldados/operarios encargados de la preparación de los alimentos garantizando la higiene de los mismos. Brindar bienestar al personal uniformado mediante una alimentación inocua y balanceada elevando la moral del soldado viéndose reflejada en el cumplimiento de su misión al momento de prestar seguridad en los municipios contribuyendo al desarrollo del Departamento del Meta OPCIÓN DE SOLUCIÓN: 1. Mantenimiento de las redes eléctricas 2. Mantenimiento de redes hidráulicas internas ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: EL DEPARTAMENTO cumpliendo con los objetivos trazados desde el Plan de Desarrollo 2024- 2027, denominado "El Gobierno de la Unidad", considera necesario contratar: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META. El cual se encuentra registrado en el Banco de Programa y Proyectos de inversión, Departamento BPPID bajo el número 2024005500227, para el Fortalecimiento EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE DEL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, bajo la estructura del Plan de Desarrollo "EL GOBIERNO DE LA UNIDAD 2024-2027" PILAR 1. SEGURIDAD TOTAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL META. 1.1. EJE ESTRATEGICO CIUDADANIA SEGURA. 1.1.1. LINEA ESTRATEGICA FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD. 1.1.1.1. PROGRAMA CAPACIDADES INSTITUCIONALES. 1.1.1.1.1. Subprograma Infraestructura y Dotación para la seguridad. Sector 45 – Gobierno Territorial. Meta 11011014504. Construir, remodelar, y/o adquirir infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en seis (6) espacios, de acuerdo con lo establecido en la mesa conjunta para la infraestructura de seguridad departamental. Ello con el propósito de apoyar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales, la conservación del orden público, la seguridad ciudadana, la búsqueda de la paz y seguridad total y protección y garantía de los Derechos Humanos del Departamento del Meta.

4. LOCALIZACIÓN

El área general del proyecto se localiza en la República de Colombia, Departamento del Meta Municipio de Villavicencio.

Los límites geográficos del Municipio de Villavicencio están definidos de la siguiente manera:

- Norte: Restrepo y El Calvario
- Oriente: Puerto Lopez.
- Occidente: Acacias y Departamento de Cundinamarca

El acceso al proyecto se encuentra sobre la vía puerto López.

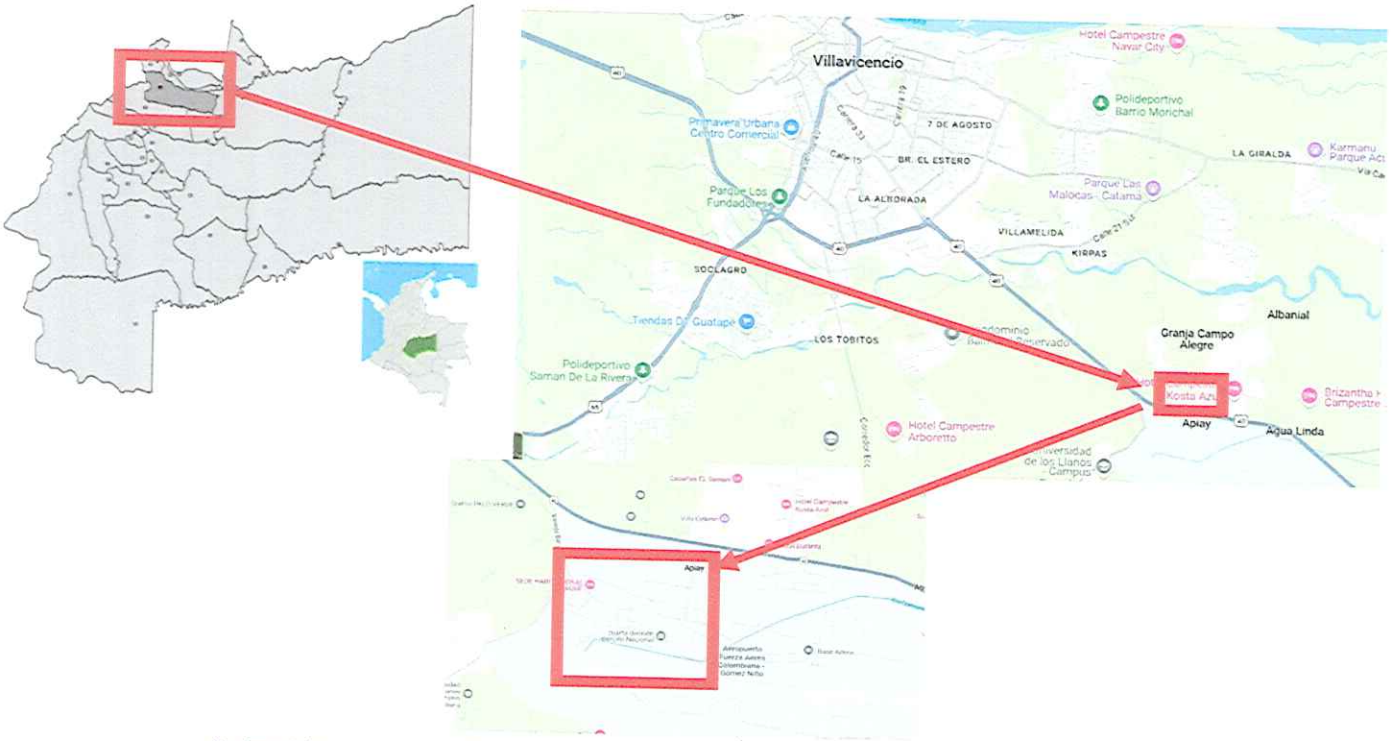


Ilustración 1. Localización general del proyecto en el Municipio de Villavicencio.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. GENERALIDADES

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL META
CONTRATISTA	CONSORCIO CANTON MILITAR NIT: 902.004.881-2 R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA C.C. 1.094.921.302 consorciocantonmilitar@gmail.com

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
OBJETO	"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE. ($2.380.487.919,00)
TERMINO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	18 DE DICIEMBRE DE 2025
TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN No.1	DOS (2) MESES.
FECHA DE REINICIO No. 1	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	01 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE 11 NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	BIMCON SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS

6. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

6.1. RESUMEN GENERAL

A continuación, se presenta un listado de las principales actividades a ejecutar por el CONSORCIO CANTON MILITAR:

PRELIMINARES

- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI

DESMONTENTES Y DEMOLICIONES

- DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO
- DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
- EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE.
- RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO
- TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

RED HIDRÁULICA SUMINISTRO PRESIÓN

- TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL
- VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN – DESAGÜES

- TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- SALIDA SANITARIA LAVADERO"
- SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- CAJA DE INSPECCION DE 0,80*0,80*0,80 MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO.SUMINSITRO Y ELABORACION.

- TRAMPA DE GRASAS EN PVC 250 LITROS.INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

LAVADERO

- LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CARPINTERÍA METÁLICA

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO3X1-1/2 CAL. 18
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON BRAZO CERRADOR Y BARRA ANTIPANICO DOBLE O DE DOS PUNTOS DE TRAFICO PESADO DE MEDIDAS 1.8M X 2.10M. MARCO DE LA HOJA EN PERFIL ALUMINIO 1102, INCLUYE BISAGRAS DE SEGURIDAD.

VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS

- ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS Y MESAS METALICAS

- VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA FRONTAL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTO 1.6M, INCLUYE MESON TIPO BUFFET EN ACERO INOXIDABLE DE 0.9M

MAMPOSTERIA Y PINTURA

- MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)
- PINTURA VINILO T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
- PINTURA VINILO TS/MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS
- ESTUCO PLASTICO
- SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR
- ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA

PAÑETES

- PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN

CUBIERTA

- SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, O, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR
- SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE
- CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.
- BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)

CIELORASOS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM

PISOS Y ENCHAPES

- AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM
- PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA TIPO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE

- GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRESS (ALTA CALIDAD)
- PORCELANATO BEIGE
- TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m
- PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA

- PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO MARMOL

LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS

- LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

- LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
- SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
- CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL
- REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS
- ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA

REJILLAS CARCAMO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE

LUMINARIA EXTERIOR

- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR PARA EXTERIORES, CON CAPACIDAD DE 100 W, INCLUYE BATERIA , CONTROLADOR , LUMINARIA LED Y PANEL SOLAR
- MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9M CON BRAZO RETORNEADO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW

SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO

- SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PANEL LED 60X60 W
- SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUMINISTROS

- SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 515HHE-5 HP BARNES

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL DE 3.3M X 10 M, MAS EXTRACTORES DE LA ZONA DE ESTRUFAS DE 3.5M X 0.80M, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (20 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA. APLICACIÓN SOBRE ÁREA DE COCCIÓN CON MARMITAS INDUSTRIALES. INCLUYE EXTRATOR DE AIRE DE EXTERIOR

CONCRETOS Y ACEROS AMPLIAR CUARTO DE LA CALDERA

- EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE
- ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)
- PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

- VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
- MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE
- MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)

7. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META						
CODIGO AIM	ITEM	DESCRIPCIÓN / ELEMENTOS	CANT.	U MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOAL
1,0 PRELIMINARES DE OBRA						
11010401	1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI	110.00	ML	$ 63,296.00	$ 6,962,560.00
2,0 DESMONTES Y DEMOLICIONES						
14010212	2.01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	13.00	UN	$ 87,280.00	$ 1,134,640.00
14010215	2.02	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	11.78	M2	$ 18,610.00	$ 219,226.00
14010204	2.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	1219.80	M2	$ 6,277.00	$ 7,656,685.00
14010230	2.04	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	547.65	M2	$ 12,988.00	$ 7,112,878.00
14010224	2.05	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	407.87	M2	$ 23,541.00	$ 9,601,668.00
CREADO CON INSUMOS AIM	2.06	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO	1508.00	M2	$ 20,693.00	$ 31,205,044.00

11020204	2.07	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	3.33	M3	$ 374,852.00	$ 1,248,257.00
14010228	2.08	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	68.57	M2	$ 15,561.00	$ 1,067,018.00
14010202	2.09	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	2.00	UN	$ 32,470.00	$ 64,940.00
14010223	2.10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	12.81	M3	$ 394,597.00	$ 5,054,788.00
11090207	2.11	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	10626.84	M3/KM	$ 1,723.00	$ 18,310,045.00
11060101	2.12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	87.48	M3	$ 81,175.00	$ 7,101,189.00
11060203	2.13	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	37.11	M3	$ 62,831.00	$ 2,331,658.00
11090201	2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	378.52	M3/KM	$ 1,723.00	$ 652,190.00
3,0 RED HIDRÁULICA SUMINISTRO PRESIÓN						
14130120	3.01	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	32.36	ML	$ 15,606.00	$ 505,010.00
14130202	3.02	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	6.00	UN	$ 76,381.00	$ 458,286.00
14130506	3.03	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	2.00	UN	$ 45,338.00	$ 90,676.00
14130445	3.04	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	30.00	UN	$ 28,622.00	$ 858,660.00
14130127	3.05	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	19.00	UN	$ 3,397.00	$ 64,543.00
14130124	3.06	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2.96	ML	$ 63,372.00	$ 187,581.00
4,0 RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜES						
CREADO CON INSUMOS AIM	4.01	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	104.97	ML	$ 52,785.00	$ 5,540,841.00
14140103	4.02	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	6.28	ML	$ 41,834.00	$ 262,718.00
14140107	4.03	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26.00	UN	$ 18,630.00	$ 484,380.00
14140108	4.04	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.00	UN	$ 32,063.00	$ 288,567.00
14140206	4.05	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1.00	UN	$ 87,898.00	$ 87,898.00
14140211	4.06	SALIDA SANITARIA LAVADERO"	4.00	UN	$ 91,899.00	$ 367,596.00
14140214	4.07	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3.00	UN	$ 115,262.00	$ 345,786.00

14140403	4.08	CAJA DE INSPECCION DE 0,80*0,80*0,80 MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO.SUMINSITRO Y ELABORACION.	8.00	UN	$ 750,045.00	$ 6,000,360.00
COT	4.09	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 250 LITROS.INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1.00	UN	$ 1,111,799.00	$ 1,111,799.00
5,0 LAVADERO						
14150303	5.01	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4.00	UN	$ 499,160.00	$ 1,996,640.00
6,0 CARPINTERÍA METÁLICA						
14110110	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO3X1-1/2 CAL. 18	19.80	M2	$ 688,373.00	$ 13,629,785.00
COT	6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON BRAZO CERRADOR Y BARRA ANTIPANICO DOBLE O DE DOS PUNTOS DE TRAFICO PESADO DE MEDIDAS 1.8M X 2.10M. MARCO DE LA HOJA EN PERFIL ALUMINIO 1102, INCLUYE BISAGRAS DE SEGURIDAD	3.00	UN	$ 10,752,787.00	$ 32,258,361.00
7,0 VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS						
CREADO CON INSUMOS AIM	7.01	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS Y MESAS METALICAS	297.50	M2	$ 23,749.00	$ 7,065,328.00
14170101	7.02	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	31.90	M2	$ 80,521.00	$ 2,568,620.00
COT	7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA FRONTAL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTO 1.6M, INCLUYE MESON TIPO BUFFET EN ACERO INOXIDABLE DE 0.9M	7.36	ML	$ 3,625,125.00	$ 26,680,920.00
8,0 MAMPOSTERIA Y PINTURA						
14050201	8.01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	11.07	M2	$ 55,927.00	$ 619,112.00
14070101	8.02	PINTURA VINILO T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	942.83	M2	$ 14,471.00	$ 13,643,693.00
14070102	8.03	PINTURA VINILO TS/MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS	1046.16	M2	$ 12,084.00	$ 12,641,797.00
14070108	8.04	ESTUCO PLASTICO	1100.96	M2	$ 17,516.00	$ 19,284,415.00
CREADO CON INSUMOS AIM	8.05	SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	1186.12	M2	$ 35,429.00	$ 42,023,045.00
14070208	8.06	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	99.18	ML	$ 25,671.00	$ 2,546,050.00
9,0 PAÑETES						

14060102	9.01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO .SUMINISTRO Y APLICACIÓN	154.31	M2	$ 37,862.00	$ 5,842,485.00
14060103	9.02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	130.07	M2	$ 27,032.00	$ 3,516,052.00
10,0 CUBIERTA						
COT	10.01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, O, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	1819.68	M2	$ 138,118.00	$ 251,330,562.00
COT	10.02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE	190.06	ML	$ 82,318.00	$ 15,645,359.00
14040452	10.03	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.	99.58	ML	$ 174,874.00	$ 17,413,953.00
14140306	10.04	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	28.00	ML	$ 26,754.00	$ 749,112.00
17010302	10.05	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	4721.76	KG	$ 30,803.00	$ 145,444,373.00
11,0 CIELORASOS						
COT	11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM	1219.80	M2	$ 195,782.00	$ 238,814,884.00
12,0 PISOS Y ENCHAPES						
14080302	12.01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	407.87	M2	$ 36,769.00	$ 14,996,972.00
14010233	12.02	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	407.87	M2	$ 7,111.00	$ 2,900,364.00
CREADO CON INSUMOS AIM + COT	12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA TIPO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE	407.87	M2	$ 238,223.00	$ 97,164,015.00
14080310	12.04	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRESS (ALTA CALIDAD)	238.15	ML	$ 14,576.00	$ 3,471,274.00
14080111	12.05	PORCELANATO BEIGE	547.65	M2	$ 134,466.00	$ 73,640,305.00
14080201	12.06	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	51.36	M2	$ 94,716.00	$ 4,864,614.00
14080320	12.07	PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA	836.69	M2	$ 83,598.00	$ 69,945,611.00
14080320	12.08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	34.19	M2	$ 833,396.00	$ 28,493,809.00
17010202	12.09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	973.93	KG	$ 8,618.00	$ 8,393,329.00

CREADO CON INSUMOS AIM + COT	12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO MARMOL	211.39	ML	$ 137,331.00	$ 29,030,400.00
13,0 LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS						
14180105	13.01	LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS	23.37	ML	$ 6,157.00	$ 143,889.00
14,0 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
14150108	14.01	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	3.00	UN	$ 520,866.00	$ 1,562,598.00
14150102	14.02	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	3.00	UN	$ 389,697.00	$ 1,169,091.00
14150306	14.03	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	2.00	UN	$ 151,732.00	$ 303,464.00
14150404	14.04	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	3.00	UN	$ 20,997.00	$ 62,991.00
14150111	14.05	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	3.00	UN	$ 847,152.00	$ 2,541,456.00
15,0 REJILLAS CARCAMO						
COT	15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE	31.08	ML	$ 782,855.00	$ 24,331,133.00
16,0 LUMINARIA EXTERIOR						
COT	16.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR PARA EXTERIORES, CON CAPACIDAD DE 100 W, INCLUYE BATERIA , CONTROLADOR , LUMINARIA LED Y PANEL SOLAR	9.00	UN	$ 12,625,000.00	$ 113,625,000.00
15010301	16.02	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9M CON BRAZO RETORNEADO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.00	UN	$ 2,527,071.00	$ 22,743,639.00
15011005	16.03	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	9.00	UN	$ 2,964,107.00	$ 26,676,963.00
17,0 SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO						
15011205	17.01	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	73.00	UN	$ 233,595.00	$ 17,052,435.00
15010813	17.02	PANEL LED 60X60 W	73.00	UN	$ 138,048.00	$ 10,077,504.00
15011206	17.03	SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.00	UN	$ 203,369.00	$ 1,830,321.00
15011201	17.04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	14.00	UN	$ 117,948.00	$ 1,651,272.00
15011203	17.05	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2.00	UN	$ 250,719.00	$ 501,438.00
18,0 SUMINISTROS						
15011502	18.01	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 515HHE-5 HP BARNES	1.00	UN	$ 5,002,504.00	$ 5,002,504.00

COT	18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL DE 3.3M X 10 M, MAS EXTRACTORES DE LA ZONA DE ESTRUFAS DE 3.5M X 0.80M, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (20 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA. APLICACIÓN SOBRE ÁREA DE COCCIÓN CON MARMITAS INDUSTRIALES. INCLUYE EXTRATOR DE AIRE DE EXTERIOR	1.00	UN	$ 192,675,000.00	$ 192,675,000.00
19,0 CONCRETOS Y ACEROS AMPLIAR CUARTO DE LA CALDERA						
11060101	19.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	17.50	M3	$ 81,175.00	$ 1,420,563.00
14020101	19.02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.50	M3	$ 949,091.00	$ 1,423,637.00
14020201	19.03	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2.14	M3	$ 1,017,257.00	$ 2,176,930.00
11063302	19.04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	8.43	M3	$ 654,983.00	$ 5,521,507.00
14020301	19.05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	10.33	M3	$ 833,396.00	$ 8,608,981.00
14030101	19.06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2.21	M3	$ 1,385,026.00	$ 3,060,907.00
14030201	19.07	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.83	M3	$ 1,350,008.00	$ 2,470,515.00
11062104	19.08	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	61.77	ML	$ 104,104.00	$ 6,430,504.00
17010202	19.09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	294.27	KG	$ 8,618.00	$ 2,536,019.00
17010201	19.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	1618.35	KG	$ 8,060.00	$ 13,043,901.00
14050201	19.11	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	86.66	M2	$ 55,927.00	$ 4,846,634.00
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,776,483,522.00
					ADMINISTRACION 28%	$ 497,415,386.00
					IMPREVISTOS 1%	$ 17,764,835.00
					UTILIDAD 5%	$ 88,824,176.00
					VALOR TOTAL	$ 2,380,487,919.00

8. INFORME DE PERSONAL Y EQUIPO

PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA

A continuación, se relaciona el equipo mínimo de trabajo ofrecido por el CONSORSOCIO CANTON MILITAR para el mes del **25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025.**

- **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ACTIVO**

CONSORCIO CANTON MILITAR		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	50%
RESIDENTE DE OBRA	PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ	100%
SST	JUAN CAMILO POSADA VARELA	50%

	CUARTA DIVISION				
	NOMBRES	**CC**	**PENSION**	**EPS**	**CARGO**
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1.072.716.978	COLPENSIONES	SANITAS	INGENIERO DE APOYO.
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1.121.868.371	PORVENIR	SANITAS	AYUDANTE
3	JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ	1.122.132.738	PORVENIR	NUEVA EPS	AYUDANTE


9. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS (PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025)				
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD EJECUTADA MENSUAL	VALOR EJECUTADO MENSUAL ($)	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO.	(%) EJECUTADO ACUMULADO.
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI	110,00	ML	$ 63.296,00	$6.962.560,00	72.90	$ 4.614.278,00	72.90	$ 4.614.278,00	66.27%



CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS (PERIODO 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025)				
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD EJECUTADA MENSUAL	VALOR EJECUTADO MENSUAL ($)	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO.	(%) EJECUTADO ACUMULADO.
2,03	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	1219,80	M2	$ 6.277,00	$ 7.656.685,00	1020,46	$ 6.405.440,60	1020,46	$ 6.405.440,60	83,66%



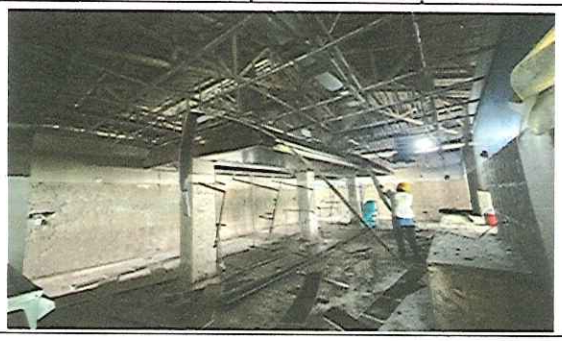

10. APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

Afiliación personal de obra periodo 25 de noviembre al 18 de diciembre del año 2025 y del 18 de febrero al 28 de febrero del año 2026.

- **Noviembre**

	CUARTA DIVISION				
	NOMBRES	CC	ARL	EPS	# PLANILLA
1	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	1.122.132.436	SURAMERICANA	SALUD TOTAL	9501707979
2	PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ	1121961750	SURAMERICANA	SANITAS	9501707979
3	JUAN CAMILO POSADA VARELA	1.094.921.302	SURAMERICANA	SANITAS	9501707979
4	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1.072.716.978	SURAMERICANA	SANITAS	9501707979
5	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	SURAMERICANA	SANITAS	9501707979
6	JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ	1122132738	SURAMERICANA	NUEVA EPS	9501707979

- **DICIEMBRE.**

	CUARTA DIVISION				
	NOMBRES	CC	ARL	EPS	# PLANILLA
1	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	1.122.132.436	SURAMERICANA	SALUD TOTAL	9501708153
2	PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ	1121961750	SURAMERICANA	SANITAS	9501708153
3	JUAN CAMILO POSADA VARELA	1.094.921.302	SURAMERICANA	SANITAS	9501708153
4	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1.072.716.978	SURAMERICANA	SANITAS	9501708153
5	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1121868371	SURAMERICANA	SANITAS	9501708153
6	JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ	1122132738	SURAMERICANA	NUEVA EPS	9501708153

11. PÓLIZAS Y GARANTIAS

11.1. POLIZAS SEGÚN CONTRATO.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	21008216200000		
ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.		
ANEXO	0		
VIGENCIA	14/11/2025 - 31/12/2030		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO CO	2025/11/14	2026/04/30	$ 238,048,791.90
PRESTACIONES SOCIALES	2025/11/14	2028/12/31	$ 119,024,395.95
ESTABILIDAD DE LA OBRA CO	2025/12/31	2030/12/31	$ 238,048,791.90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCION	2025/11/14	2026/04/30	$ 238,048,791.90

PÓLIZA RCE	12007560900000		
ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.		
ANEXO	0		
VIGENCIA	14/11/2025 – 31/12/2025		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
RESPOSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

11.2. POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	21008216200001		
ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.		
ANEXO	1		
VIGENCIA	14/11/2025 - 31/12/2030		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO CO	2025/11/25	2025/12/31	$ 238,048,791.90
PRESTACIONES SOCIALES	2025/11/25	2028/12/31	$ 119,024,395.95
ESTABILIDAD DE LA OBRA CO	2025/12/31	2030/12/31	$ 238,048,791.90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCION	2025/11/25	2025/12/31	$ 238,048,791.90

PÓLIZA RCE	12007560900001		
ASEGURADORA	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.		
ANEXO	1		
VIGENCIA	25/11/2025 – 31/12/2025		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	25/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	25/11/2025	25/11/2025	$ 284.700.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	25/11/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
RESPOSABILIDAD CIVIL PATRONAL	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

12. CONCLUSIONES

Con base en la ejecución registrada durante el período evaluado, se alcanzó un avance físico del 0,62 % respecto al valor total del contrato, correspondiente principalmente al desarrollo de actividades iniciales relacionadas con la adecuación del área de trabajo y el inicio de las labores de intervención al interior de la edificación.

Durante este período, la ejecución se concentró principalmente en el capítulo de preliminares, donde se realizó la instalación del cerramiento provisional en tela verde con altura de 2,10 m, estructura en madera común y bases en concreto de 2000 PSI, actividad que fue ejecutada al 100 %, permitiendo delimitar y asegurar el área de intervención, así como establecer las condiciones de control y seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades constructivas.

De igual manera, se registró avance en la actividad correspondiente al desmonte de cielo raso en lámina liviana, incluyendo el traslado del material hasta el sitio de cargue o almacenamiento, alcanzando una ejecución del 56,16 % respecto a la cantidad total prevista. Esta actividad hace parte del proceso de adecuación inicial de los espacios interiores y permite liberar las áreas necesarias para el desarrollo de las intervenciones posteriores contempladas dentro del proyecto.

En términos generales, el avance alcanzado durante el período evaluado es coherente con la etapa inicial de la obra, en la cual se priorizan las labores de organización del frente de trabajo, control del área de intervención y retiro de elementos existentes, permitiendo así continuar de manera progresiva con las demás actividades programadas dentro del cronograma del proyecto.

ING. JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

ACTA DE AVANCE DE OBRA MENSUAL

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA AVANCE DE OBRA No	1		
OBJETO CONTRATO:	"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".	**OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA:**	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTON MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE. ($2.380.487.919,00)	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($118.927.142,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA CC. N° 1.094.921.302 de Armenia	**CONTRATISTA INTERVENTORIA**	BIMCON S.A.S RL: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 de Acacias.
NIT:	902.004.661-2	**NIT:**	901.253.373-6
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	[redacted]	**CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:**	[redacted]
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	EDGAR ALEXANDER QUITIAN		
CORREO ELECTRONICO SUPERVISION:	[redacted]	**FECHA PRESENTE ACTA:**	18 DE DICIEMBRE DE 2025

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTON MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META

CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE MENSUAL					
						MES 1		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD (+)	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES										
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	110,00	$ 63.206,00	$ 6.952.660,00	72,90	$ 4.614.278,00	72,90	$ 4.614.278,00	37,10	$ 2.348.282,00
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES										
2,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	13,00	$ 87.280,00	$ 1.134.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 1.134.640,00
2,02	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,78	$ 18.610,00	$ 219.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,78	$ 219.226,00
2,03	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1210,80	$ 6.277,00	$ 7.656.685,00	1020,46	$ 6.405.427,00	1020,46	$ 6.405.427,00	199,34	$ 1.251.257,00
	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	547,65	$ 12.988,00	$ 7.112.878,00	0,00	$ -	0,00	$ -	547,65	$ 7.112.878,00
2,05	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0,07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	407,87	$ 23.541,00	$ 9.601.668,00	0,00	$ -	0,00	$ -	407,87	$ 9.601.668,00
2,06	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO	M2	1508,00	$ 20.693,00	$ 31.205.044,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1508,00	$ 31.205.044,00
2,07	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	3,33	$ 374.852,00	$ 1.248.257,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,33	$ 1.248.257,00
2,08	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	68,57	$ 15.561,00	$ 1.067.018,00	0,00	$ -	0,00	$ -	68,57	$ 1.067.018,00
2,09	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 32.470,00	$ 64.940,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 64.940,00
2,10	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	12,81	$ 394.597,00	$ 5.054.788,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,81	$ 5.054.788,00
2,11	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	10626,84	$ 1.723,00	$ 18.310.045,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10626,84	$ 18.310.045,00
2,12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	87,48	$ 81.175,00	$ 7.101.189,00	0,00	$ -	0,00	$ -	87,48	$ 7.101.189,00
2,13	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	37,11	$ 62.831,00	$ 2.331.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	37,11	$ 2.331.658,00
2,14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	378,52	$ 1.723,00	$ 652.190,00	0,00	$ -	0,00	$ -	378,52	$ 652.190,00
3	RED HIDRÁULICA SUMINISTRO PRESIÓN										
3,01	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,36	$ 15.606,00	$ 505.010,00	0,00	$ -	0,00	$ -	32,36	$ 505.010,00
3,02	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 76.381,00	$ 458.286,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 458.286,00
3,03	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO ORIVAL	UN	2,00	$ 45.338,00	$ 90.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 90.676,00
3,04	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 28.622,00	$ 858.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 858.660,00
3,05	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 3.397,00	$ 64.543,00	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 64.543,00
3,06	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,96	$ 63.372,00	$ 187.581,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,96	$ 187.581,00
4	RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜ										
4,01	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	104,97	$ 52.785,00	$ 5.540.641,00	0,00	$ -	0,00	$ -	104,97	$ 5.540.641,00
4,02	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,28	$ 41.834,00	$ 262.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,28	$ 262.718,00
4,03	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	26,00	$ 18.630,00	$ 484.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 484.380,00
4,04	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 32.063,00	$ 288.567,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 288.567,00
4,05	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 87.898,00	$ 87.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 87.898,00
4,06	SALIDA SANITARIA LAVADERO"	UN	4,00	$ 91.899,00	$ 367.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 367.596,00
4,07	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 115.262,00	$ 345.786,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 345.786,00
4,08	CAJA DE INSPECCION DE 0,60*0,60*0,60 MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO.SUMINSITRO Y ELABORACION.	UN	8,00	$ 750.045,00	$ 6.000.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 6.000.360,00

4,09	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 250 LITROS.INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.111.799,00	$ 1.111.799,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.111.799,00
5	LAVADERO										
5,01	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 499.160,00	$ 1.996.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.996.640,00
6	CARPINTERÍA METÁLICA										
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.98M HOJA CON TUBO33X1-1/2 CAL. 18	M2	19,80	$ 688.373,00	$ 13.629.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	19,80	$ 13.629.785,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON BRAZO CERRADOR Y BARRA ANTIPANICO DOBLE O DE DOS PUNTOS DE TRAFICO PESADO DE MEDIDAS 1.9M X 2.10M. MARCO DE LA HOJA EN PERFIL ALUMINIO 1102, INCLUYE BISAGRAS DE SEGURIDAD	UN	3,00	$ 10.752.787,00	$ 32.258.361,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 32.258.361,00
7	VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS										
7,01	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS Y MESAS METALICAS	M2	297,50	$ 23.749,00	$ 7.065.328,00	0,00	$ -	0,00	$ -	297,50	$ 7.065.328,00
7,02	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	31,90	$ 80.521,00	$ 2.568.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	31,90	$ 2.568.620,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA FRONTAL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTO 1.6M, INCLUYE MESON TIPO BUFFET EN ACERO INOXIDABLE DE 0.9M	ML	7,36	$ 3.625.125,00	$ 26.680.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,36	$ 26.680.920,00
8	MAMPOSTERIA Y PINTURA										
8,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO 5 1:3)	M2	11,07	$ 55.927,00	$ 619.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,07	$ 619.112,00
8,02	PINTURA VINILO T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	942,83	$ 14.471,00	$ 13.643.693,00	0,00	$ -	0,00	$ -	942,83	$ 13.643.693,00
8,03	PINTURA VINILO T3/MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS	M2	1046,16	$ 12.084,00	$ 12.641.797,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1046,16	$ 12.641.797,00
8,04	ESTUCO PLASTICO	M2	1100,96	$ 17.516,00	$ 19.284.415,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1100,96	$ 19.284.415,00
-	SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	1186,12	$ 35.429,00	$ 42.023.045,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1186,12	$ 42.023.045,00
8,06	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	99,18	$ 25.671,00	$ 2.546.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	99,18	$ 2.546.050,00
9	PAÑETES										
9,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO .SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	154,31	$ 37.862,00	$ 5.842.485,00	0,00	$ -	0,00	$ -	154,31	$ 5.842.485,00
9,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	130,07	$ 27.032,00	$ 3.516.052,00	0,00	$ -	0,00	$ -	130,07	$ 3.516.052,00
10	CUBIERTA										
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, O, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	1819,68	$ 138.118,00	$ 251.330.562,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1819,68	$ 251.330.562,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE	ML	190,06	$ 82.318,00	$ 15.645.359,00	0,00	$ -	0,00	$ -	190,06	$ 15.645.359,00
10,03	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.	ML	99,58	$ 174.874,00	$ 17.413.953,00	0,00	$ -	0,00	$ -	99,58	$ 17.413.953,00
10,04	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28,00	$ 26.754,00	$ 749.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	28,00	$ 749.112,00
10,05	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	4721,76	$ 30.803,00	$ 145.444.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4721,76	$ 145.444.373,00
11	CIELORASOS										
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM	M2	1219,80	$ 195.782,00	$ 238.814.884,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1219,80	$ 238.814.884,00
12	PISOS Y ENCHAPES										
12,01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	407,87	$ 36.769,00	$ 14.996.972,00	0,00	$ -	0,00	$ -	407,87	$ 14.996.972,00
12	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	407,87	$ 7.111,00	$ 2.900.364,00	0,00	$ -	0,00	$ -	407,87	$ 2.900.364,00
12,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA TIPO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE	M2	407,87	$ 238.223,00	$ 97.164.015,00	0,00	$ -	0,00	$ -	407,87	$ 97.164.015,00
12,04	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRESS (ALTA CALIDAD)	ML	238,15	$ 14.576,00	$ 3.471.274,00	0,00	$ -	0,00	$ -	238,15	$ 3.471.274,00
12,05	PORCELANATO BEIGE	M2	547,65	$ 134.466,00	$ 73.640.305,00	0,00	$ -	0,00	$ -	547,65	$ 73.640.305,00
12,06	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	51,36	$ 94.716,00	$ 4.864.614,00	0,00	$ -	0,00	$ -	51,36	$ 4.864.615,00
12,07	PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA	M2	836,69	$ 83.598,00	$ 69.945.611,00	0,00	$ -	0,00	$ -	836,69	$ 69.945.611,00
12,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	34,19	$ 833.396,00	$ 28.493.809,00	0,00	$ -	0,00	$ -	34,19	$ 28.493.809,00
12,09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	973,93	$ 8.618,00	$ 8.393.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	973,93	$ 8.393.329,00
12,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO MARMOL	ML	211,39	$ 137.331,00	$ 29.030.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	211,39	$ 29.030.400,00
13	LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS										
13,01	LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS	ML	23,37	$ 6.157,00	$ 143.889,00	0,00	$ -	0,00	$ -	23,37	$ 143.889,00
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS										
14,01	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	3,00	$ 520.866,00	$ 1.562.598,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.562.598,00
14,02	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	3,00	$ 389.697,00	$ 1.169.091,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.169.091,00
14,03	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	2,00	$ 151.732,00	$ 303.464,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 303.464,00
14,04	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	3,00	$ 20.997,00	$ 62.991,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 62.991,00
14,05	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y CORONA	UN	3,00	$ 847.152,00	$ 2.541.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.541.456,00

15	REJILLAS CARCAMO												
15,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE	ML	31,08	$ 782.855,00	$ 24.331.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	31,08	$ 24.331.133,00		
16	LUMINARIA EXTERIOR												
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR PARA EXTERIORES, CON CAPACIDAD DE 100 W, INCLUYE BATERIA , CONTROLADOR , LUMINARIA LED Y PANEL SOLAR	UN	9,00	$ 12.625.000,00	$ 113.625.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 113.625.000,00		
16,02	MASTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9M CON BRAZO RETORNEADO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 2.527.071,00	$ 22.743.639,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 22.743.639,00		
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	UN	9,00	$ 2.964.107,00	$ 26.676.963,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 26.676.963,00		
17	SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO												
17,01	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	73,00	$ 233.595,00	$ 17.052.435,00	0,00	$ -	0,00	$ -	73,00	$ 17.052.435,00		
17,02	PANEL LED 60X60 W	UN	73,00	$ 138.048,00	$ 10.077.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	73,00	$ 10.077.504,00		
17,03	SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 203.369,00	$ 1.830.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 1.830.321,00		
17,04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 117.948,00	$ 1.651.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 1.651.272,00		
17,05	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 250.719,00	$ 501.438,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 501.438,00		
18	SUMINISTROS												
18,01	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 515MHE-5 HP BARNES	UN	1,00	$ 5.002.504,00	$ 5.002.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.002.504,00		
18,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL DE 3.3M X 10 M, MAS EXTRACTORES DE LA ZONA DE ESTRUFAS DE 3.5M X 0.80M, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (20 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR CENTRIFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA. APLICACIÓN SOBRE AREA DE COCCIÓN CON MARMITAS INDUSTRIALES. INCLUYE EXTRATOR DE AIRE DE EXTERIOR	UN	1,00	$ 192.675.000,00	$ 192.675.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 192.675.000,00		
19	CONCRETOS Y ACEROS AMPLIAR CUARTO DE LA CALDERA												
19,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	17,50	$ 81.175,00	$ 1.420.563,00	0,00	$ -	0,00	$ -	17,50	$ 1.420.563,00		
19,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,50	$ 949.091,00	$ 1.423.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 1.423.637,00		
19,03	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,14	$ 1.017.257,00	$ 2.176.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,14	$ 2.176.930,00		
19,04	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	8,43	$ 654.983,00	$ 5.521.507,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,43	$ 5.521.507,00		
19,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10,33	$ 833.396,00	$ 8.608.961,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,33	$ 8.608.961,00		
19,06	COLUMNA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,21	$ 1.385.026,00	$ 3.060.907,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,21	$ 3.060.907,00		
19,07	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,83	$ 1.350.008,00	$ 2.470.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,83	$ 2.470.515,00		
19,08	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 60X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	61,77	$ 104.104,00	$ 6.430.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	61,77	$ 6.430.504,00		
19,09	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	294,27	$ 8.618,00	$ 2.536.019,00	0,00	$ -	0,00	$ -	294,27	$ 2.536.019,00		
19,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1618,35	$ 8.060,00	$ 13.043.901,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1618,35	$ 13.043.901,00		
19,11	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	86,66	$ 55.927,00	$ 4.846.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	86,66	$ 4.846.634,00		
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.776.483.622,00		$ 11.019.705,00		$ 11.019.705,00		$ 1.765.463.817,00		
	ADMINISTRACION	28%			$ 497.415.386,00		$ 3.085.517,00		$ 3.085.517,00		$ 494.329.869,00		
	IMPREVISTOS	1%			$ 17.764.835,00		$ 110.197,00		$ 110.197,00		$ 17.654.639,00		
	UTILIDAD	5%			$ 88.824.176,00		$ 550.985,00		$ 550.985,00		$ 88.273.191,00		
	VALOR TOTAL				$ 2.380.487.919,00		$ 14.766.404,00		$ 14.766.404,00		$ 2.365.721.516,00		

CONDICIONES GENERALES			
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 2.380.487.919,00	100,00%	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
CANTIDAD EJECUTADA EN EL PRESENTE MES	$ 14.766.404,00	0,62%	CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
CANTIDAD ACUMULADA	$ 14.766.404,00	0,62%	CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
CANTIDAD POR EJECUTAR	$ 2.365.721.515,00	99,38%	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 18 de DICIEMBRE de 2025:

JUAN CAMILO POSADA VARELA

R/L: CONSORCIO CANTON MILITAR

CONTRATO DE OBRA No. 2257 DE 2025

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO

R/L: BIMCON S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2331 DE 2025

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	25	11	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. *CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.*	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO		X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X		

OBSERVACIONES:	Jornada inicia con buen clima, presencia de lluvia ligera en horas de la noche.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, cinta métrica, nivel, estacas, hilo, martillo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inicio de obra. Replanteo general y alistamiento de materiales para cerramiento provisional.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	26	11	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES: Lluvias intermitentes en la tarde, leve afectación en rendimiento.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, martillo, serrucho, pistola de clavos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de estructura en madera para cerramiento provisional.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	27	11	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	

OBSERVACIONES: Condiciones favorables para ejecución de actividades.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, pala, balde, mezcladora, carretilla, palustre.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ejecución de bases en concreto de 2000 PSI para soporte del cerramiento

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	28	11	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES: Presencia de lluvias continuas en la tarde y noche.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, grapadora industrial, martillo, alicate.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de tela verde en cerramiento provisional (avance parcial).

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	29	11	2025	7:00am	12:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO *CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS*
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X		

OBSERVACIONES:	Condiciones favorables para ejecución de actividades.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, grapadora industrial, martillo, alicate.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de tela verde en cerramiento provisional (avance parcial).

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	1	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO		X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X		

OBSERVACIONES: Clima estable sin afectaciones.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, martillo, alicate, grapadora.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Finalización de instalación de tela verde y ajustes del cerramiento provisional.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	2	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Lluvias leves en la tarde.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, martillo, nivel.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación, aseguramiento y refuerzo de puntos críticos del cerramiento.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	3	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	

OBSERVACIONES: Jornada completamente favorable.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, martillo, nivel.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inicio de desmonte de cielo raso en lámina liviana (primer frente de trabajo).

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	4	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES: Lluvias moderadas, sin suspensión de actividades.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, destornillador, escalera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuación de desmonte de cielo raso.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	5	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X	X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			

OBSERVACIONES: Cielo cubierto durante toda la jornada.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, escalera, carretilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmonte de cielo raso y acopio de material.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR
CONSORCIO CANTÓN MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	6	12	2025	7:00am	12:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	

OBSERVACIONES: Jornada completamente favorable.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, escalera, carretilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmonte de cielo raso y acopio de material.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	8	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			

OBSERVACIONES:

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

HERRAMIENTAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

(festivo – no se registra actividad)

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR
CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	9	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO		X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X		

OBSERVACIONES:	Lluvias al finalizar la jornada.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, destornillador, escalera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reanudación de actividades. Continuación de desmonte de cielo raso.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	10	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Precipitaciones intermitentes.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, escalera, carretilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmonte de cielo raso en áreas restantes.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	11	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	

OBSERVACIONES:	Buenas condiciones climáticas.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, taladro, escalera.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Finalización de desmonte de cielo raso.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	12	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO	X	X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES: Lluvias constantes en la tarde.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, carretilla, palas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Cargue y traslado de material desmontado a sitio de almacenamiento.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	13	12	2025	7:00am	12:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	**OBJETO DEL CONTRATO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	**CONTRATISTA DE OBRA:**	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO *CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS*
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	**TIEMPO DE EJECUCION:**	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA		X	
LLUVIOSO			
SOLEADO			

OBSERVACIONES: Lluvias al finalizar la jornada.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, carretilla, palas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Cargue y traslado de material desmontado a sitio de almacenamiento.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	15	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X	X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			

OBSERVACIONES: ornada sin afectaciones.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, carretilla, patas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Continuación de traslado y disposición interna de materiales.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	16	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X	X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			

OBSERVACIONES:	Lluvias leves en la noche.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, escoba, pala, carretilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Limpieza general de áreas intervenidas.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	17	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE		
NUBLADO				OBSERVACIONES:	Condiciones óptimas de trabajo.
TORMENTA					
LLUVIOSO					
SOLEADO	X	X			

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

herramienta menor, nivel, cinta métrica.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de actividades ejecutadas y organización del frente de obra.

RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4

CIUDAD	FECHA			INICIO DE LABORES	TERMINACION DE LABORES
	DIA	MES	AÑO		
VILLAVICENCIO- META	18	12	2025	7:00am	4:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA DE OBRA		INFORMACION DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE OBRA No.	*2257 DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2025*	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	*2331 DE NOVIEMBRE DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIÓNES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20, BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANTON MILITAR R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA. CC.1.094.921.302 DE ARMENIA.	CONTRATISTA DE OBRA:	BIMCON S.A.S R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 DE ACACÍAS
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS	TIEMPO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y (6) SEIS DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			

OBSERVACIONES: Lluvias al cierre de la jornada. Dia de suspensión de obra.

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ RESIDENTE DE OBRA
JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO- DIRECTOR DE OBRA
JUAN CAMILO POSADA VARELA- PROFESIONAL SST
MATEO FAJARDO CIFUENTES - RESIDENTE DE APOYO
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ- OFICIAL DE OBRA
JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ- AYUDANTE DE OBRA.

HERRAMIENTAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Suspensión de la obra.


RESIDENTE DE OBRA
Nombre: PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ
CONSORCIO CANTON MILITAR

RESIDENTE INTERVENTORIA
Nombre: MIGUEL ANGEL GIRALDO MORALES
BIMCON S.A.S

INFORME MENSUAL DE SST N°1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2257 DE 2025

INFORME DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

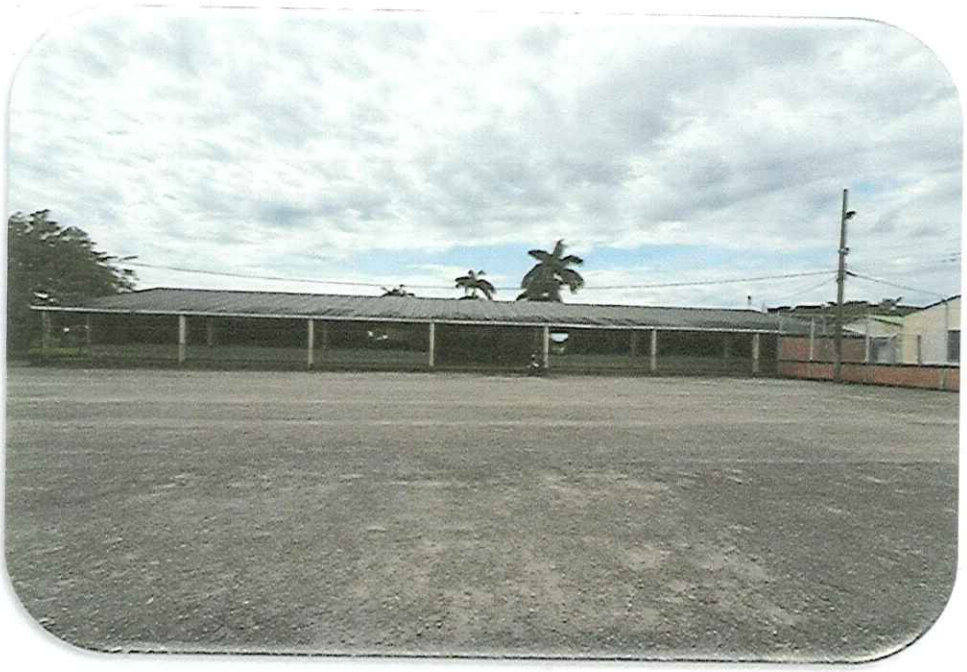

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO No. 2257 DE 2025 4
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO 5
3.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO 6
4. OBJETO 6
5. GENERALIDADES DEL SG-SST 7
6. RELACION DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA 7
A continuación, se relaciona el equipo mínimo de trabajo ofrecido por el CONSORSOCIO CANTON MILITAR para el mes del 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025. 7
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 8
8. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 9
9. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN 10
10. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO 10
11. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST 11
12. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA. 12
14. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 13
15. INDUCCIÓN DE PERSONAL 13
16. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 13
16.1. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA 14
16.2. INSPECCIÓN DE EXTINTOR 14
16.3. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO. 14
16.4. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS 15
17. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 16
18. KIT DE EMERGENCIA 16
19. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A RECOMENDACIONES DE SST POR IDCM 17

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por ello que el consorcio **RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR**, tiene como propósito desarrollar prevención en la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral. El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiental laboral, así como dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019 cumpliendo las funciones como contratista, La prevención en seguridad y salud en el trabajo dentro de la obra está orientada a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

2. OBJETIVO GENERAL

Presentar el informe de las actividades desarrolladas en seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA (MANTENIMIENTO) No. 2257 DEL 2025 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BISER20, BR7, Y DIV4**

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de los parámetros ejecutados en el desarrollo del cronograma SST.
- Cumplir las acciones propuestas para un proceso de interventoría.
- Dar cumplimiento a los criterios del contrato de obra.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO No. 2257 DE 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO CANTON MILITAR NIT: 902.004.881-2 R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA C.C. 1.094.921.302 consorciocantonmilitar@gmail.com
OBJETO	"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE. ($2.380.487.919,00)
TERMINO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	18 DE DICIEMBRE DE 2025
TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN No.1	DOS (2) MESES.
FECHA DE REINICIO No. 1	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	01 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2331 DE 11 NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	BIMCON SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS

Tabla 1. Información del proyecto

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto contempla el mantenimiento de la infraestructura del rancho y comedor de tropa del Cantón Militar de Apiay en Villavicencio – Meta, incluyendo el mantenimiento de redes eléctricas y redes hidráulicas internas, con el fin de mejorar las condiciones locativas, de seguridad e higiene, estas intervenciones buscan reducir riesgos eléctricos, locativos y sanitarios, garantizando condiciones seguras y saludables para el personal encargado de la manipulación de alimentos y para los soldados que utilizan estas instalaciones, contribuyendo así al bienestar y a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Durante el período comprendido entre el 25 de noviembre al 18 de diciembre de 2025, las actividades desarrolladas se concentraron principalmente en etapas preliminares de adecuación del área de intervención, necesarias para el inicio del proceso de mantenimiento de las instalaciones del rancho y comedor de tropa. Estas labores permitieron preparar las áreas de trabajo, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

Entre las principales labores ejecutadas durante este mes se destacan:

- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 ESTRUCTURA EN MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI
- DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

El avance obtenido durante este período evidencia un desarrollo de las actividades programadas, con énfasis en la instalación del cerramiento provisional para la delimitación del área de trabajo y el desmonte de cielo raso en lámina liviana, labores correspondientes a las etapas preliminares del proyecto. Estas actividades permiten avanzar en la adecuación inicial de las áreas intervenidas y consolidar el progreso físico del contrato para la ejecución de las siguientes fases previstas.

3.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El área general del proyecto se localiza en la República de Colombia, Departamento del Meta Municipio de Villavicencio.

Los límites geográficos del Municipio de Villavicencio están definidos de la siguiente manera:

- Norte: Restrepo y El Calvario
- Oriente: Puerto Lopez.
- Occidente: Acacias y Departamento de Cundinamarca

El acceso al proyecto se encuentra sobre la vía puerto López.

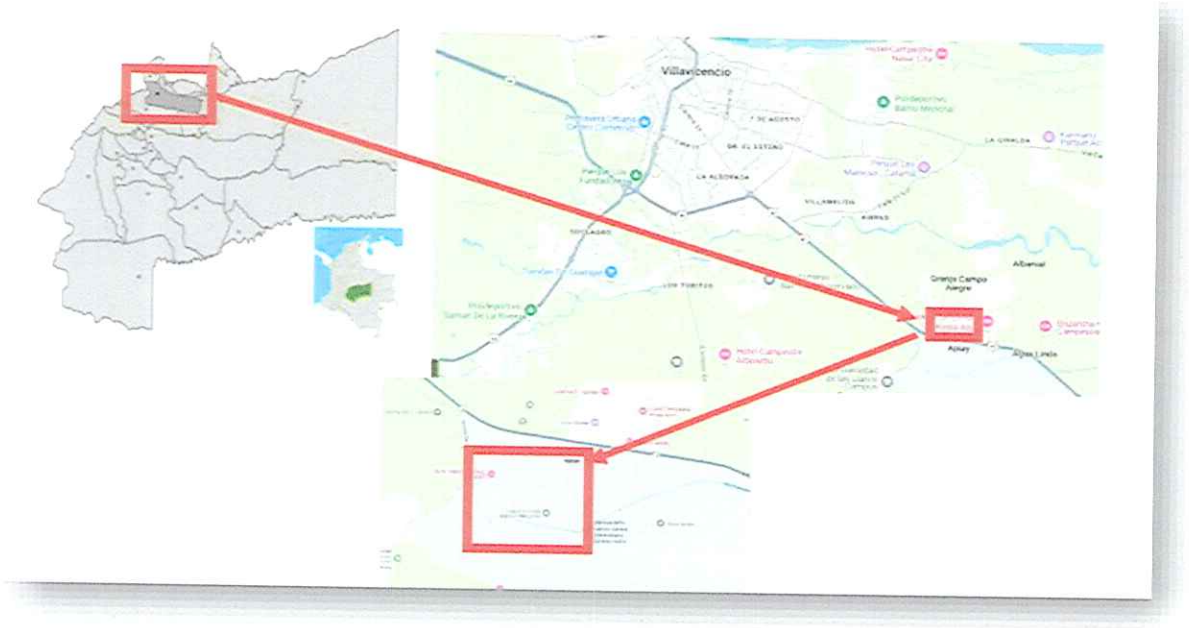


Ilustración 1. Localización general del proyecto en el Municipio de Villavicencio.

4. OBJETO

Mostrar el seguimiento de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementada en el periodo comprendido entre el 25 de noviembre al 18 de diciembre del 2025, en desarrollo del contrato 2257 de 2025, buscando prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera técnica, oportuna y eficiente los peligros y riesgos generados con las actividades del proyecto

5. GENERALIDADES DEL SG-SST

Conscientes de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo (SST) y consecuentes con la reglamentación legal existente en el país, el consorcio **RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR** en cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST; en todos los campos; condiciones de salud y condiciones de trabajo para el **CONTRATO DE OBRA (MANTENIMIENTO) 2257-2025.**

El presente documento corresponde al informe mensual de las actividades desarrolladas y aplicadas por los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como lo son la ley 9 de 1979, resolución 1016 de 1983, resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1262 de 2012, decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

6. RELACION DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

A continuación, se relaciona el equipo mínimo de trabajo ofrecido por el CONSORSOCIO CANTON MILITAR para el mes del **25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025.**

- **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ACTIVO**

CONSORCIO CANTON MILITAR		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	50%
RESIDENTE DE OBRA	PAULA YINETH CABEZAS LOPEZ	100%
SST	JUAN CAMILO POSADA VARELA	50%

	CUARTA DIVISION				
	NOMBRES	**CC**	**PENSION**	**EPS**	**CARGO**
1	MATEO FAJARDO CIFUENTES	1.072.716.978	COLPENSIONES	SANITAS	INGENIERO DE APOYO.
2	EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	1.121.868.371	PORVENIR	SANITAS	AYUDANTE
3	JHORMAN STIVEN TORRES PEREZ	1.122.132.738	PORVENIR	NUEVA EPS	AYUDANTE

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De acuerdo con lo estipulado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y la Política SST del **RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR** en el siguiente cuadro se evidencia la ejecución de las actividades, durante el periodo del 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2025:

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE (SI/NO)
1. LIDERAZGO / COMPROMISO / DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
Inspecciones Gerenciales- Director de obra / Residente de obra	SI
Revisión de desempeño en SST	SI
Divulgación de Políticas, Misión, Visión, objetivos y responsabilidades de SST	SI
Reuniones del COPASST – COCOLAB	SI
2. PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS SEGURAS	
Actualización de Matriz de Peligros	SI
Inspecciones de Frente de obra	NO
Inspección Locativa	SI
Inspección de Herramientas, Maquinaria y equipos	SI
Inspección de EPP´S	SI
Inspección de trabajos en alturas	SI
3. GESTION DEL RIESGO	
Identificación y divulgación de Peligros	SI
Definición y divulgación de procedimientos y tareas de alto riesgo	SI
Reporte de Actos / Condiciones Inseguras	SI
Investigación de Incidentes / Accidentes del periodo	NO
Ejecución de Planes de acción de las Investigaciones de Eventos reportados	NO
Capacitaciones del Plan SST	SI
3.1. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Demarcación y señalización de área de trabajo	SI
Entrega de Elementos de Protección Personal	SI
Actualización de cartelera informativa HSEQ.	NO
Mantenimiento de dique perimetral para productos químicos.	N/A
Accidentes / Incidentes reportados en el mes	NINGUNO
Charlas diarias de Seguridad y Salud en el Trabajo	SI
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	SI
Inspección de Puestos de trabajo	SI
Mediciones Higiénicas	NO
Campañas de SST	SI
Divulgación del MEDEVAC, líneas de emergencias, rutas de evacuación	SI

Inspección de Botiquines	SI
Inspección de Extintores	SI
Simulacros	NO
3.2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
Afiliación a seguridad social	SI
Exámenes médicos preocupacionales - periódicos -Posincapacidad y de egreso	NO
Seguimiento a los Programas de Vigilancia Epidemiológico	NO
Seguimiento a observaciones, restricciones y recomendaciones médicas ocupacionales	NO
Capacitación control de enfermedades endémicas propias de la región y Salud Pública.	NO
Capacitación estilos de vida saludable / Prevención de enfermedades crónicas	NO
Calistenia, Ejercicios físicos	SI
3.3. SANEAMIENTO BASICO / GESTIÓN AMBIENTAL	
Divulgación del Plan de Gestión de Residuos	SI
Fumigación, control de vectores	NO
Suministro de hidratación	SI
Charla de gestión ambiental	SI
Inspecciones de gestión de residuos y orden y aseo.	SI
Jornadas de Orden y Aseo	SI
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Seguimiento a los exámenes ocupacionales con observaciones del personal	N/A
Seguimiento a ejecución de Acciones preventivas/ correctivas / cierre de hallazgos	N/A
Seguimiento de los indicadores, objetivos y análisis de tendencias.	SI
Seguimiento del programa de capacitación y entrenamiento en SST	NO
Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	SI
Seguimiento Gerencial a Gestión SST	NO
Seguimiento de entrega de informes mensuales	SI

8. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el 25 de noviembre al 18 de diciembre de 2025, **RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR** se verifica que el contratista cumplió a cabalidad con el pago de la seguridad social.
El cual da cumplimiento a los lineamientos establecidos en La ley 100 de 1993 (Marco Legal General De La Seguridad Social).

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

9. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador a su ingreso a obra y se van renovando por desgaste. El registro de la entrega se hace en el formato de entrega de Equipos de Protección Personal y Dotación, en la que se contempla el Equipo entregado, la cantidad, la fecha de entrega y la firma del trabajador en conformidad.

Conforme al Art.230 SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015.





ANEXO 2. ENTREGA DE EPP

10. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO

Para el periodo de 25 de noviembre al 18 de diciembre, se reporta 0 accidente de origen laboral y 0 ausentismo por enfermedad laboral.
Tal como se representa en la siguiente tabla.

ITEM	INDICADOR	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	No. trabajadores expuestos por mes	0	0	0	0	4	6
2	No. De accidentes laborales por mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	No. De accidentes de trabajo mortales	0%	0%	0%	0%	0%	0%

4	No. De días de incapacidad por accidente de trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	No. Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	No. De casos nuevos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	No. De días de ausencia por incapacidad laboral o común	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabla 2. tabla de accidentalidad L

11. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST

Designación de Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

De acuerdo con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debe conformarse únicamente en aquellas empresas que cuenten con más de diez (10) trabajadores.

Dado que **RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR** no supera este número de colaboradores, no es posible conformar formalmente el COPASST. No obstante, en cumplimiento de la normatividad aplicable y con el fin de garantizar el seguimiento y mejora continua de las condiciones de trabajo, el día 3 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la reunión mensual correspondiente.

a la **designación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, quien asumirá las funciones de promoción, vigilancia y apoyo en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. La persona designada como vigía SST es:

NOMBRES Y APELLIDOS	DESIGNACIÓN	CARGO	ASISTENCIA
MATEO FAJARDO CIFUENTES	EMPLEADOR	PRINCIPAL	SI

ANEXO 3. REUNION DEL COPASST

12. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA.






La obra cuenta con señalización con la finalidad de llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible, De este modo el personal se mantiene bien informado con respecto a la señalización preventiva de obra

13. TRABAJO EN ALTURAS Y USO DE ANDAMIOS

Durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre al 18 de diciembre de 2025, se ejecutaron actividades relacionadas con el montaje, ajuste y aseguramiento de la estructura metálica de cubierta, mediante el uso de andamios móviles y trabajo en alturas, tal como se evidencia en la actividad desarrollada en obra.

Para la realización de estas labores, se verificó el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, tales como el uso adecuado de equipos de protección personal (casco, arnés de seguridad, línea de vida y botas de seguridad), inspección previa del andamio, aseguramiento de ruedas con freno y supervisión permanente del personal en altura. Asimismo, se garantizó que los trabajadores contaran con capacitación vigente para trabajo en alturas, minimizando el riesgo de caídas y accidentes laborales.

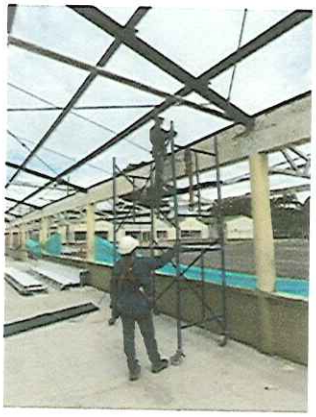



14. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Se realizaron las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte del profesional SST encargado, abarcando temas con referencia a la obra para el personal, logrando así, reforzar el comportamiento proactivo ante los peligros asociados al trabajo que realizan en obra y potenciar sus habilidades de observación preventiva. A continuación, se detallará los temas tratados.

CRONOGRAMA DE CHARLAS DE 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE	
Prevención de accidentes en el lugar de trabajo	29/11/2025
Orden y aseo como medida de seguridad	01/12/2025
Riesgo eléctrico y medidas preventiva	04/12/2025
Trabajo en alturas: normas básicas de seguridad	06/12/2025
Manipulación manual de cargas	09/12/2025
Identificación de peligros y control de riesgos	11/12/2025
Uso seguro de herramientas y equipos	15/12/2025
Prevención de caídas al mismo nivel	17/12/2025

ANEXO 4. CHARLA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

15. INDUCCIÓN DE PERSONAL

Para el mes correspondiente al presente informe, en las instalaciones provisionales del equipo constructor, se llevó a cabo la inducción al personal, para el inicio de actividades. Esta inducción es básica para que el trabajador conozca la gestión en seguridad, salud a realizarse en el proyecto, adquiriendo conocimiento de las políticas, reglas y normas de trabajo. Teniendo como instructor al profesional SST a cargo de esta labor.


ANEXO 5. ACTA DE INDUCCION

16. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Las inspecciones de seguridad es una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros, y se realiza de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones pre operacionales a realizar, herramientas manuales, camilla, extintor e inspecciones de SST.

16.1. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA



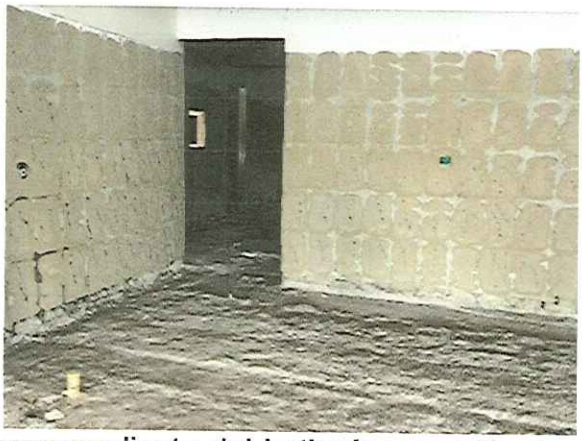

Se ha realizado la inspección mensual correspondiente del botiquín y camilla de primeros auxilios para verificar la existencia de insumos básicos para la atención de lesiones menores en el tópico de la obra. En la obra se cuenta con uno (01) botiquín de primeros auxilios el cual se encuentran en obra, y en la los cuales serán reabastecidos a medida que se agoten los medicamentos; se cuenta con una (1) camilla de primeros auxilios que contamos en la obra

16.2. INSPECCIÓN DE EXTINTOR

Se ha realizado la inspección del extintor existentes en obra para verificar las condiciones en las que se encuentran, se verificó fecha de recarga, tipo de carga, fecha de vencimiento de recarga y capacidad de los extintores, encontrándose el extintor en perfectas condiciones.

16.3. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO.

Se ha realizado la inspección de orden y aseo de la obra para verificar las condiciones en las que se encuentra la obra, para el desarrollo de actividades seguras.

a. Jornada de Aseo

Se realizan jornadas de aseo semanal y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra

b. Punto ecológico

Se cuenta con un punto Ecológico en la obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

c. Disposición de residuos

Se clasificarán los residuos domésticos, industriales y especiales, los residuos son llevados a un lugar o punto ecológico para que sean dispuestos por la empresa prestadora del servicio del municipio.
El punto ecológico es la zona especial claramente demarcada y señalizada, para incentivar, motivar y sensibilizar a los trabajadores a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, la separación de residuos en la fuente será más fácil, los colores a usar serán los mismos. Los colores son:

- **Blanco:** residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Negro:** residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc



Ilustración 2 Separación de los residuos

16.4. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

Se han realizado las inspecciones preoperacionales de herramientas, semanalmente.

ANEXO 6. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE SST

17. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Teniendo en cuenta que la reunión del Comité de Convivencia Laboral debe realizarse cada tres (3) meses, **RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR.** da cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de convivencia laboral. Por tal motivo, el día **10 de diciembre de 2025**, se llevó a cabo la reunión de conformación del comité

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTENCIA
JUAN CAMILO POSADA	R/LEGAL PRESIDENTE	SI
MATEO FAJARDO CIFUENTES	SECRETARIO SUPLENTE	SI
EDWIN JESUS PAEZ MARQUEZ	INTEGRANTE – TRABAJADORES	SI

ANEXO 7. REUNION DE COCOLAB

18. KIT DE EMERGENCIA

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR, con el propósito de contar con los elementos necesarios para la atención oportuna de situaciones de emergencia, da cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y a la normatividad legal vigente, mediante la disposición de un kit de emergencia que permite atender de manera inmediata cualquier eventualidad que pueda presentarse en el lugar de trabajo.

De igual manera, se generan los registros de verificación del kit de emergencia, en los cuales se realizan las respectivas inspecciones para comprobar el estado y disponibilidad de los elementos, con el fin de identificar si se requieren acciones de mejora, reposición o cambio de alguno de los componentes. A continuación, se detallan las inspecciones realizadas.





EXTINTOR *CAMILLA Y BOTIQUIN*

TIPO DE INSPECCION	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE	HALLAZGO
BOTIQUIN	NOVIEMBRE 2025	OBRA	JUAN CAMILO POSADA	NINGUNO
EXTINTOR	OCT 2025	OBRA	JUAN CAMILO POSADA	VENCE EL 2026

ANEXO 7. INSPECCION KIT DE EMERGENCIAS

19. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A RECOMENDACIONES DE SST POR IDCM

En el periodo del 25 de noviembre al 18 de diciembre no se realizaron recomendaciones por parte de IDCM

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 2. ENTREGA DE EPP
ANEXO 3. REUNION DEL COPASST
ANEXO 4. CHARLA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA
ANEXO 5. . INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE SST
ANEXO 6. REUNION DE COCOLAB
ANEXO 7. INSPECCION KIT DE EMERGENCIAS

JUAN CAMILO POSADA
RESIDENTE DE OBRA Y COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004881	2	CONSORCIO CANTON MILITAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA	CONJUNTO CERRADO BARCELONA T3 APTO 703	VILLAVICENCIO-META	3115050111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	154370207	9501707979	E	2025/12/18	2026/03/19	BANCOLOMBIA	91	$768,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121961750	CABEZAS PAULA	230201	6	$620,000	$99,200	EPS005	6	$620,000	$24,800	CCF34	6	$620,000	$24,800	14-11	6	$620,000	$43,200	6	$0	$0
2	CC	1072716978	FAJARDO MATEO	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF34	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
3	CC	1122132435	NARVAEZ JEYNI	230301	6	$410,000	$65,600	EPS002	6	$410,000	$16,400	CCF34	6	$410,000	$16,400	14-11	6	$410,000	$28,600	6	$0	$0
4	CC	1121868371	PAEZ EDWIN	230301	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF34	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
5	CC	1094921302	POSADA JUAN	230301	6	$460,000	$73,600	EPS005	6	$460,000	$18,400	CCF34	6	$460,000	$18,400	14-11	6	$460,000	$32,100	6	$0	$0
6	CC	1122132738	TORRES JHORMAN	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF34	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					**$2,344,100**	**$375,200**			**$2,344,100**	**$93,800**			**$2,344,100**	**$93,800**			**$2,344,100**	**$163,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$375,200	$21,600	$0	$396,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$45,600	$2,700	$0	$48,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$230,400	$13,200	$0	$243,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$99,200	$5,700	$0	$104,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$163,600	$9,400	$0	$173,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$163,600	$9,400	$0	$173,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$93,800	$5,400	$0	$99,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	$93,800	$5,400	$0	$99,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$93,800	$5,500	$0	$99,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$11,400	$700	$0	$12,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$16,400	$1,000	$0	$17,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$66,000	$3,800	$0	$69,800
TOTAL				**6**	**$726,400**	**$41,900**	**$0**	**$768,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004881	2	CONSORCIO CANTON MILITAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA	CONJUNTO CERRADO BARCELONA T3 APTO 703	VILLAVICENCIO-META	3115050111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	154370207	95017079?9	E	2025/12/18	2026/03/19	BANCOLOMBIA	91	$718,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121961750	CABEZAS PAULA	230201	6	$620,000	$99,200	EPS005	6	$620,000	$24,800	CCF34	6	$620,000	$24,800	14-11	6	$620,000	$43,400	6	$0	$0
2	CC	1072716978	FAJARDO MATEO	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF34	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
3	CC	1122132435	NARVAEZ JEYNI	230301	6	$410,000	$65,600	EPS002	6	$410,000	$16,400	CCF34	6	$410,000	$16,400	14-11	6	$410,000	$28,600	6	$0	$0
4	CC	1121868371	PAEZ EDWIN	230301	6	$284,700	$45,600	EPS001	6	$284,700	$11,400	CCF34	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
5	CC	1094926302	POSADA JUAN	230301	6	$460,000	$73,600	EPS005	6	$460,000	$18,400	CCF34	6	$460,000	$18,400	14-11	6	$460,000	$32,100	6	$0	$0
6	CC	1122132738	TORRES JHORMAN	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF34	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
Total	Afiliados(6)					$2,344,100	$375,200			$2,344,100	$93,800			$2,344,100	$93,800			$2,344,100	$163,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFIL/ADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$375,200	$21,600	$0	$396,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$45,600	$2,700	$0	$48,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$230,400	$13,200	$0	$243,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$99,200	$5,700	$0	$104,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$163,600	$9,400	$0	$173,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$163,600	$9,400	$0	$173,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$93,800	$5,400	$0	$99,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	$93,800	$5,400	$0	$99,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$93,800	$5,500	$0	$99,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$11,400	$700	$0	$12,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$16,400	$1,000	$0	$17,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$66,000	$3,800	$0	$69,800
TOTAL				6	$726,400	$41,900	$0	$768,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004881	2	CONSORCIO CANTON MILITAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA	CONJUNTO CERRADO BARCELONA T3 APTO 703	VILLAVICENCIO-META	3115050111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	154381259	9501708153	E	2026/01/21	2026/03/19	BANCOLOMBIA	57	$3,353,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121951750	CABEZAS PAULA	230201	18	$1,860,000	$297,600	EPS005	18	$1,860,000	$74,400	CCF34	18	$1,860,000	$74,400	14-11	18	$1,860,000	$129,500	18	$0	$0
2	CC	1121856147	CHAPARRO CARLOS	230301	18	$854,100	$136,700	CCFC55	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
3	CC	1072716978	FAJARDO MATEO	25-14	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
4	CC	1122132435	NARVAEZ JEYNI	230301	18	$1,230,000	$196,800	EPS002	18	$1,230,000	$49,200	CCF34	18	$1,230,000	$49,200	14-11	18	$1,230,000	$85,700	18	$0	$0
5	CC	1121865371	PAEZ EDWIN	230301	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
6	CC	1121840922	PALOMA SANTIAGO	230301	18	$854,100	$136,700	ESSC24	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
7	CC	1094921302	POSADA JUAN	230301	18	$1,380,000	$220,800	EPS005	18	$1,380,000	$55,200	CCF34	18	$1,380,000	$55,200	14-11	18	$1,380,000	$96,100	18	$0	$0
8	CC	1029986161	ROJAS DANIEL	230301	18	$854,100	$136,700	CCFC55	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
9	CC	1122132738	TORRES JHORMAN	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
10	CC	1121860007	VIVAS FRANK	230301	18	$854,100	$136,700	CCFC55	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$10,448,700	$1,672,100			$10,448,700	$418,200			$10,448,700	$418,200			$10,448,700	$727,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,672,100	$60,500	$0	$1,732,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$136,700	$5,000	$0	$141,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,237,800	$44,700	$0	$1,282,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$297,600	$10,800	$0	$308,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$727,800	$26,300	$0	$754,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$727,800	$26,300	$0	$754,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$418,200	$15,100	$0	$433,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$418,200	$15,100	$0	$433,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$418,200	$15,400	$0	$433,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$102,600	$3,800	$0	$106,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$34,200	$1,300	$0	$35,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$34,200	$1,300	$0	$35,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$49,200	$1,800	$0	$51,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$198,000	$7,200	$0	$205,200
TOTAL				10	$3,236,300	$117,300	$0	$3,353,600

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900004881	2	CONSORCIO CANTON MILITAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA	CONJUNTO CERRADO BARCELONA T3 APTO 703	VILLAVICENCIO-META	3115050111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	302959715	9504636393	N	2025/12/18	2026/05/12	BANCOLOMBIA	145	$64,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121961750	CABEZAS PAULA	230201	6	($620,000)	($59,200)	EPS005	6	($620,000)	($24,800)	CCF34	6	($620,000)	($24,800)	14-11	6	($620,000)	($43,400)	6	$0	$0
2	CC	1121961750	CABEZAS PAULA	230201	6	$1,751,446	$280,300	EPS005	6	$1,751,446	$70,100	CCF34	6	$1,751,446	$70,100	14-11	6	$1,751,446	$122,600	6	$0	$0
3	CC	1122132435	NARVAEZ JEYNI	230301	6	($410,000)	($65,600)	EPS002	6	($410,000)	($16,400)	CCF34	6	($410,000)	($16,400)	14-11	6	($410,000)	($28,600)	6	$0	$0
4	CC	1122132435	NARVAEZ JEYNI	230301	6	$1,093,937	$175,100	EPS002	6	$1,093,937	$43,800	CCF34	6	$1,093,937	$43,800	14-11	6	$1,093,937	$76,200	6	$0	$0
5	CC	1094921302	POSADA JUAN	230301	6	$548,404	$87,800	EPS005	6	$548,404	$22,000	CCF34	6	$548,404	$22,000	14-11	6	$548,404	$38,200	6	$0	$0
6	CC	1094921302	POSADA JUAN	230301	6	($460,000)	($73,600)	EPS005	6	($460,000)	($18,400)	CCF34	6	($460,000)	($18,400)	14-11	6	($460,000)	($32,100)	6	$0	$0
Total	Afiliados(3)					$1,903,787	$304,800			$1,903,787	$76,300			$1,903,787	$76,300			$1,903,787	$132,500		$0	$0

Jeyni → $813,148

Paula → $1751,446

Juan → $548,404

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$304,800	$28,600	$0	$333,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$123,700	$11,600	$0	$135,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$181,100	$17,000	$0	$198,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$132,500	$12,500	$0	$145,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$132,500	$12,500	$0	$145,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$76,300	$7,200	$0	$83,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$76,300	$7,200	$0	$83,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$76,300	$7,200	$0	$83,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$27,400	$2,600	$0	$30,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$48,900	$4,600	$0	$53,500
TOTAL				3	$589,900	$65,400	$0	$655,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004881	2	CONSORCIO CANTON MILITAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA	CONJUNTO CERRADO BARCELONA T3 APTO 703	VILLAVICENCIO-META	3115050111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	302973096	9504636583	N	2026/01/21	2026/05/12	BANCOLOMBIA	111	$1,8[illegible],500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121961750	CABEZAS PAULA	230201	18	($1,860,000)	($297,600)	EPS005	18	($1,860,000)	($74,400)	CCF34	18	($1,860,000)	($74,400)	14-11	18	($1,80,000)	($129,500)	18	$0	$0
2	CC	1121961750	CABEZAS PAULA	230201	18	$5,254,338	$840,700	EPS005	18	$5,254,338	$210,200	CCF34	18	$5,254,338	$210,200	14-11	18	$5,[illegible]34,338	$385,600	18	$0	$0
3	CC	1122132435	NARVAEZ JEYNI	230101	18	$3,281,808	$525,100	EPS002	18	$3,281,808	$131,300	CCF34	18	$3,281,808	$131,300	14-11	18	$3,[illegible]81,808	$228,500	18	$0	$0
4	CC	1122132435	NARVAEZ JEYNI	230101	18	($1,230,000)	($196,800)	EPS002	18	($1,230,000)	($49,200)	CCF34	18	($1,230,000)	($49,200)	14-11	18	($1,20,000)	($85,700)	18	$0	$0
5	CC	1094921302	POSADA JUAN	230101	18	($1,380,000)	($220,800)	EPS005	18	($1,380,000)	($55,200)	CCF34	18	($1,380,000)	($55,200)	14-11	18	($1,30,000)	($96,100)	18	$0	$0
6	CC	1094921302	POSADA JUAN	230101	18	$1,645,211	$263,300	EPS005	18	$1,645,211	$65,900	CCF34	18	$1,645,211	$65,900	14-11	18	$1,[illegible]45,211	$114,600	18	$0	$0
Total	Afiliados(3)					$5,711,357	$913,900			$5,711,357	$228,600			$5,711,357	$228,600			$5,711,357	$397,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$913,900	$66,500	$0	$981,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$370,800	$27,000	$0	$397,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$543,100	$39,500	$0	$581,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$397,600	$28,900	$0	$426,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$397,600	$28,900	$0	$426,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$228,600	$16,700	$0	$245,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$228,600	$16,700	$0	$245,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$228,600	$16,700	$0	$245,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$82,100	$6,000	$0	$88,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$146,500	$10,700	$0	$157,200
TOTAL				3	$1,766,700	$128,800	$0	$1,895,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004881	2	CONSORCIO CANTON MILITAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA	CONJUNTO CERRADO BARCELONA T3 APTO 703	VILLAVICENCIO-META	3115050111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	154381259	9501708153	E	2026/01/21	2026/03/19	BANCOLOMBIA	57	$3,313,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121961750	CABEZAS PAULA	230201	18	$1,860,000	$297,600	EPS005	18	$1,860,000	$74,400	CCF34	18	$1,860,000	$74,400	14-11	18	$1,860,000	$129,500	18	$0	$0
2	CC	1121856147	CHAPARRO CARLOS	230101	18	$854,100	$136,700	CCFC55	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
3	CC	1072716978	FAJARDO MATEO	23-14	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
4	CC	1122132435	NARVAEZ JEYNI	230101	18	$1,230,000	$196,800	EPS002	18	$1,230,000	$49,200	CCF34	18	$1,230,000	$49,200	14-11	18	$1230,000	$85,700	18	$0	$0
5	CC	1121868371	PAEZ EDWIN	230101	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
6	CC	1121840922	PALOMA SANTIAGO	230101	18	$854,100	$136,700	ESSC24	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
7	CC	1094921302	POSADA JUAN	230101	18	$1,380,000	$220,800	EPS005	18	$1,380,000	$55,200	CCF34	18	$1,380,000	$55,200	14-11	18	$1380,000	$96,100	18	$0	$0
8	CC	1029986161	ROJAS DANIEL	230101	18	$854,100	$136,700	CCFC55	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
9	CC	1122132738	TORRES JHORMAN	230101	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
10	CC	1121850007	VIVAS FRANK	230101	18	$854,100	$136,700	CCFC55	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
Total	Afillados(10)					$10,448,700	$1,672,100			$10,448,700	$418,200			$10,448,700	$418,200			$10,418,700	$727,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,672,100	$60,500	$0	$1,733,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$136,700	$5,000	$0	$141,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,237,800	$44,700	$0	$1,282,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$297,600	$10,800	$0	$308,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$727,800	$26,300	$0	$754,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$727,800	$26,300	$0	$754,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$418,200	$15,100	$0	$433,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$418,200	$15,100	$0	$433,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$418,200	$15,400	$0	$433,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$102,600	$3,800	$0	$106,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$34,200	$1,300	$0	$35,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$34,200	$1,300	$0	$35,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$49,200	$1,800	$0	$51,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$198,000	$7,200	$0	$205,200
TOTAL				10	$3,736,300	$167,300	$0	$3,903,600

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTON MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

SUPERVISIÓN:

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

MOTIVO: Entrada [X] Devolución: Por daño [ ] Por entrega de cargo [ ]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	Casco	1	28-11-25
2	Guantes	1	28-11-25
3	Gafas	1	28-11-25
4	Botas de Punta de acero	1	28-11-25
5	Tapabocas	1	28-11-25
6	Jeans	2	28-11-25
7	Ruana manga Larga	1	28-11-25

Al recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi segundad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores dianas; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autonzo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autonzo la compra de unos nuevos.

Recibido por:	Entregado por:	Vo. Bo.
Firma: Edwin Paez	Firma:	Firma:
Nombre: Edwin Jesus Paez M.	Nombre: Juan Camilo posada	Nombre:
Cargo: Ayudante	Cargo: Prof SST	Cargo

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO:	**2257 DE 2025**
OBJETO:	**REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CANTON MILITAR NIT: 902004881-2**
MUNICIPIO:	**VILLAVICENCIO**
	SUPERVISIÓN:
NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA:	**JUAN CAMILO POSADA**

MOTIVO: Entrada X Devolución: Por daño ____ Por entrega de cargo ____

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	Casco	1	28-11-25
2	Guantes	1	28-11-25
3	Gafas	1	28-11-25
4	Botas Punta de acero	1	28-11-25
5	Tapabocas	1	28-11-25
6	Buzo manga Larga	2	28-11-25
7	Jeans	2	28-11-25

Al recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi segundad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores diarias; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos

Recibido por.	Entregado por.	Vo. Bo.
Firma Mateo Fajardo	Firma	Firma
Nombre Mateo Fajardo cifuentes	Nombre Juan Camilo P.	Nombre
Cargo Ingeniero de apoyo	Cargo Prof. SST	Cargo

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRATO: 2257 DE 2025

OBJETO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO CANTON MILITAR
NIT: 902004881-2

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

SUPERVISIÓN:

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA: JUAN CAMILO POSADA

TIVO: Entrada X Devolución: Por daño ____ Por entrega de cargo ____

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
1	Casco	1	28/11/25
2	Guantes	1	28/11/25
3	Gafas	1	28/11/25
4	Botas Punta de acero	1	28/11/25
5	Tapabocas	1	28/11/25
6	Buzo manga larga	2	28/11/25
7	Jeans	2	28/11/25

Al recibir estos elementos de dotacion y/o elementos de proteccion individual, me compromento a: mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos durante su tiempo de vida util, ya entiendo que dichos elementos son para mi seguridad, el uso de ellos es obligatorio para mis labores dianas; que al terminar su vida util y/o culminar mis labor con la empresa es mi responsabilidad entregar dichos elementos a mi jefe inmediato para su disposicion y que, en caso de perdida autorizo a la empresa para que automaticamente sean descontados de mi salario y autorizo la compra de unos nuevos.

Recibido por:	Entregado por,	Vo. Bo.
Firma	Firma	Firma
Nombre: Jherman Stiven Torres P.	Nombre: Juan Camilo Posada	Nombre:
Cargo: Ayudante	Cargo: Prof. SST	Cargo

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR
CARTA DE CONFORMACION DEL VIGIA SST			
Código: FO-GPY-25	Versión: 01	Página 1 de 1	

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

CARTA DE CONFORMACIÓN DEL VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proyecto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

Fecha: 3 de diciembre de 2025

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, las empresas con diez (10) o menos trabajadores no están obligadas a conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). En su lugar, deberán contar con la designación de un Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), elegido por los trabajadores, quien tendrá la función de vigilar el cumplimiento de las normas, promover la prevención de riesgos y servir de enlace entre empleador y trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cumplimiento de la normatividad vigente, el día 8 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la reunión para la conformación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de la consorcia Rancho y comedor cantón militar

	'DESIGNACIO	CARGO	ASISTENCIA
MATEO FAJARDO CIFUENTES	EMPLEADOR	PRINCIPAL	

Conclusión de la reunión

- La empresa cumplió con la obligación de conformar el cargo de Vigía SST.

Firma de vigía de SST Mateo Fajardo C.

Firma de coordinador de SST .

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CODIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA

FECHA: 17/12/2025

FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN:

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Empresa	Cargo	Firma
1	Mateo fajardo	1072710978	Canton militar	Ingeniero Apoyo	Mateo fajardo
2	Harmon Torres	1122133738	Canton militar	Ayudante	Harmon
3	Edwin Paez	1121868371	Canton militar	Ayudante	Edwin Paez
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

TEMAS TRATADOS:

Prevención de caídas al mismo nivel

DOCUMENTOS CONSULTADOS O DE APOYO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD		OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 15/12/25				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTON MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN:

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Empresa	Cargo	Firma
1	Edwin Paez	1122868371	Canton Militar	Aprendiz	Edwin Paez
2	Mateo fajardo	1072716978	Canton Militar	Ingeniero Apoyo	Mateo fajardo
3	Jhoarman Torres.	1122137258	Canton Militar.	Aprendiz.	Jhoarman T.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

TEMAS TRATADOS:

Uso seguro de herramientas y equipos

DOCUMENTOS CONSULTADOS O DE APOYO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA

FECHA: 11/12/25

FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN:

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Empresa	Cargo	Firma
1	Jhorman Torres	1122132738	Canton Militar	Ayudante	Jhorman T.
2	Edwin Paez	1121868371	Canton Militar	Ayudante	Edwin Paez
3	Mateo fajardo	1072716178	Canton Militar	Ingeniero Apoyo	Mateo fajardo
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

TEMAS TRATADOS:

Identificacion de Peligros y Control de riesgos

DOCUMENTOS CONSULTADOS O DE APOYO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTON MIL 7XX

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001

VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN | | CHARLA DE SEGURIDAD | X | OTRO, CUAL _____

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA

FECHA: 09/12/2025

FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN:

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Empresa	Cargo	Firma
1	Thomas Torres	1.122.152.358	Cantón Militar	Ayudante	Thomas T.
2	Edwin Jesus paez	1.121.868.[illegible]	Cantón Militar	Ayudante	Edwin Paez
3	Mateo fgarido.	1.121.[illegible]978	Cantón Militar	Ayudante de [illegible]	Mateo fgerdo
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

TEMAS TRATADOS:

Manipulación manual de Cargas.

DOCUMENTOS CONSULTADOS O DE APOYO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 06/12/25				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISERZO BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN:

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Empresa	Cargo	Firma
1	Edwin Paez	1121868524	Canton Militar	Ayudante	Edwin Paez
2	Mateo fajardo	1092716998	Canton Militar	Ingeniero Apoyo	Mateo fajardo
3	Jhonnan Torres	1122132758	Canton Militar	Ayudante	Jhonnan T.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

TEMAS TRATADOS:

Trabajo en alturas: normas basicas de seguridad

DOCUMENTOS CONSULTADOS O DE APOYO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA

FECHA: 04/12/2025

FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN:

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Empresa	Cargo	Firma
	Mateo Fajardo C.	1072716978	Cantón Militar	Tapicero de sofa	Mateo fajardo
	Jhonson Erick T.	1.122.152.238	Cant Mil.	Ayudante	
	Edwin Jesus Paez	1.122.868.78	Cant Mil.	Ayudante	Edwin Paez
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

TEMAS TRATADOS:

Riesgo electrico y medidas preventivas

DOCUMENTOS CONSULTADOS O DE APOYO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CÓDIGO: CT-MSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1.0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____

INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA

FECHA: 1/12/25

FIRMA:

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN:

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Empresa	Cargo	Firma
1	Thomas olivos torres	1.122.152.218	Cantón militar	Ayudante	
2	Edwin jose garcia	1.122.[illegible]833	Cantón Militar	Ayudante	Edwin Paez
3	Mateo fajardo	1.022.146.978	Cantón Militar	Ingeniero de apoyo	Mateo fajardo
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

TEMAS TRATADOS:

Ordenes de Area como medida de Seguridad

DOCUMENTOS CONSULTADOS O DE APOYO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR	RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR	CODIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1.0

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 29-11-2025				

PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

DURACIÓN:

Nº	Nombres y Apellidos	C.C.	Empresa	Cargo	Firma
1	Edwin jesus paez Ma	1122868378	Canton Militar	Ayudante	Edwin Paez
2	Mateo fajardo cifuentes	1072716978	Canton Militar	Ingeniero de apoyo	Mateo fajardo
3	Jharman Torres	1122132738	Canton Militar	AYudante	Jharman
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

TEMAS TRATADOS:

Prevención de accidentes en el lugar de T.

DOCUMENTOS CONSULTADOS O DE APOYO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTA DE INDUCCIÓN
CONTRATO DE OBRA No.2257 DE 2025 Pág. 1 de 1

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

FECHA: 27 11 25

Nombre: Jhormon Torres **Lugar:** Villavicencio

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Firma del trabajador

En los siguientes Ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Jhormon Torres

Nombre del trabajador

CC 1122132738

Área SST Juan Camilo Posada

Cargo Prof. SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTA DE INDUCCIÓN
CONTRATO DE OBRA No.2257 DE 2025 Pág. 1 de 1

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

FECHA: 27 11 25.

Nombre: Mateo fajardo **Lugar:** Villavicencio

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Mateo fajardo

Firma del trabajador

En los siguientes Ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Mateo fajardo

Nombre del trabajador

CC 1072716978

Área SST Juan Camilo Posada

Cargo Prof. SST.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTA DE INDUCCIÓN
CONTRATO DE OBRA No.2257 DE 2025 Pág. 1 de 1

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

FECHA: 27 11 25

Nombre: Edwin jaimes **Lugar:** villavicencio

Con el presente manifiesto que he sido informado sobre mi cargo, funciones y responsabilidades dentro del **PROYECTO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RANCHO Y COMEDOR DE TROPA DEL CANTÓN MILITAR DE APIAY DEL BISER20 BR Y DIV4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META**, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, declaro que recibí información sobre el conducto regular que debo seguir a través de mi jefe inmediato para reportar cualquier situación relacionada con mis labores o con la seguridad y salud en el trabajo

Firma del trabajador

En los siguientes Ítems se describe el plan de inducción:

1. **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

N°	TEMA	SI	NA
1	Política se Seguridad y Salud en el Trabajo	x	
5	Conceptos SST	x	
6	Objetivos del SG-SST	x	
7	Manual SG-SST	x	
8	Peligros a los que se encuentran expuesto	x	
9	Reporte de accidentes e incidentes laborales	x	
10	Reporte de condiciones inseguras	x	
11	Plan de Emergencia	x	
12	COPPAST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LAB		

Finalmente, certifico que entiendo la información suministrada y me comprometo a cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Edwin jaimes

Nombre del trabajador

CC 1.121.868.321

Área SST Juan Camilo Posada

Cargo Prof. SST.

RANCHO Y COMEDOR CANTÓN MILITAR CONSORCIO CANTON MILITAR	**EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y CONTENIDO DEL BOTIQUIN**	

Proyecto: Rancho y Comedor Canton militar

Nombre quién realiza la inspección: Juan Camilo Posada

Ubicación o Codigo: Casa **Empresa:** Canton militar

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD/ PAQUETE	CANTIDAD	USO Y REPOSICIÓN
1	Aplicadores	1	50	
2	Apositos	1	8	
3	Aposito Ocular	1	8	
4	Bajalenguas	1	20	
5	Bolsa plastica de diferentes tamaños (Roja)	NO		
6	Compresas	1		
7	Curitas	1	20	
8	Esparadrapo de 2"	1		
9	Jabon desinfectante Liquido	1	120 ml	
10	Jeringa para lavado de heridas	1		
11	Micropore 1/2"	1		
12	Gasa Esteril	1		
13	Guantes de Latex	100		
14	Libreta y lapiz o lapicereo	1		
15	Linterna con pilas (Exclusivo para el botiquin)	1		
16	Lista de telefonos de emergencia	1		
17	Manual de primeros auxilios	1		
18	Protector para reanimación respiratoria	NO		
19	Suero fisiologico o solución salina normal 0,9% 250cc	1	500cm³	
20	Suero Oral	1		
21	Suero Antiofidico	NO		
22	Tapabocas	1		
23	Termometro Oral	1		
24	Tijera	1		
25	Toallas higienicas	1		
26	Venda de tela de 1" o de 2"	1		
27	Cuello Multitalla.	1		
28	Inmovilizador de cuello, brazos y piernas	1		

Responda con X según sea el caso SI, NO y No Aplica

	Camilla Primero auxilios	SI	NO	N/A	
	Se encuentra en buen estado	X			
	Se encuentra bien ubicada	X			
	Se encuentra en un área despejada	X			
	Las riatas de la camilla estan en buen estado	X			

Firma quien realiza inspección	Aprobado personal SST Nombre y Firma Juan Camilo Posada

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

CONSORCIO CANTÓN MILITAR

INSPECCIÓN EXTINTORES

Fecha Inspección: NOV 2026

Proyecto: Rancho y comedor M

Nombre y cargo personal quien realiza la Inspección: Juan Camilo Pascida **Firma:**

Convenciones Marque en la columna B Si esta bueno, M si esta malo, N/A Si no aplica

UBICACIÓN	CLASE	CAP.	FECHA VENC.	MANOM.	PRESIÓN	CUERPO	ETIQ	PASADOR/ SELLO	MANGUERA/ BOQUILLA	SEÑALIZACIÓN/ DEMARCACIÓN	EMPRESA
Obra	ABC	10L	Oct 26	B	150L	B	B	B	B	B	Canton militar

Convenciones: Marque en la columna B Si esta bueno, M si esta malo, N/A Si no aplica.

Observaciones:

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES
ORDEN Y ASEO

LUGAR DE INSPECCIÓN: Canton militar

FECHA DE INSPECCIÓN: 12/12/25

INSPECCIONADO POR: Juan Camilo Parada

CARGO: Prof SST **FIRMA:**

Convenciones: Marque con X Cumple (C) No cumple (N) N/A No Aplica (N/A)

Item	CONDICIONES LOCATIVAS	C	N	N/A
1	Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X		
2	Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X		
3	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X		
4	Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo	X		
5	Se cuenta punto ecologico.	X		
6	Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X		
7	La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X		
8	Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones	X		
9	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados			X
10	Las escaleras y plataformas están limpias, en buen estado y libres de obstáculos	X		

Item	CONDICIONES LOCATIVAS	C	N	N/A
11	El área se encuentra libre de caida de objetos.	X		
12	Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X		
13	Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X		
14	Los pasillos y/o áreas de circulación están libres de obstáculos.	X		
15	Los pisos tienen superficie segura, están limpios, secos y libres de obstáculos.	X		
16	La señalización, camillas, botiquines y extintores se observan limpios	X		
17	Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X		
18	Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X		
19	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	X		
20	Están las vías de circulación de personas y vehículos diferenciadas y señalizadas		X	

OBSERVACIONES:

RANCHO Y COMEDOR
CANTÓN MILITAR

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

Mes y año de inspección: 12/25 | Nombre del Operador: Edwin Paez | Código:

Lugar / Obra: Rancho Canton militar | Empresa ejecutante: Rancho canton militar | Tipo de mantenimiento:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B : CUMPLE (Buen estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) N/A : NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	B			B																											
2	ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (ASENTACION)	B			B																											
3	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	N			N																											
4	ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	N			N																											
5	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU EA GUIO	B			B																											
6	ESTADO DE LA GUIA DE LA GUAYA	N/A			N/A																											
7	SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (5500 - 11000)	N/A			N/A																											
8	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO ETC)	B			B																											
9	SE HAN INSTALADO BARRERAS Y O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B			B																											
10	ESTADO DEL DISCO	B			B																											
11	CARETA PARA PULIR	B			B																											
12	GUANTES DE CARNAZA	N			N																											
13	PROTECCION DE OJOS	N			N																											
	Nombre Operador	Edwin Paez																														
	Firma Supervisor SST	Juan Camilo Posada																														

Observaciones

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA ANDAMIOS

VERSION 01

Mes y año de Inspección: 10/12/25
Lugar / Obra: Rancho Canton militar
Nombre del Operador: Edwin Paez
Codigo:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B : CUMPLE (Buen estado / Completo) M : NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) NA : NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Marcos estructurales	B			B																											
2	Largeros y diagonales	B			B																											
3	Uniones estructurales	B			B																											
4	Elementos de fijación	B			B																											
5	Pasadores, Pines	B			B																											
6	Agarraderas y Tornillos	B			B																											
7	Mordazas y Tornillos	NA			NA																											
8	Pasarelas	B			B																											
9	Rodajes	B			B																											
10	Barandas	B			B																											
11	Escaleras y Puntos de apoyo, deben corresponder al sistema	NA			NA																											
12	Ruedas y Frenos	B			B																											
13	Tornillo de nivelación	NA			NA																											
14	Platinas de nivelación	NA			NA																											
15	Andamio Liberado y con tarjeta	B			B																											
	Firma del Andamiero	Edwin Paez																														
	Nombre Supervisor SST	Juan Camilo Posada																														

Observaciones

RANCHO Y CONFECCION CANTON MANTA

INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA

INSPECCIÓN MES Y AÑO DE: 12/12/25 | CAPACIDAD: 150kg | MATERIAL DE LA ESCALERA: Aluminio, Fibra de vidrio, Acero inoxidable, Dieléctrico | UBICACIÓN: Obra

TIPO DE ESCALERA: [ ] De mano [ ] Tipo A-con [ ] Tijo [x] Tipo Tijera [ ] Extensión [ ] Forrest | LONGITUD: 30x3.19 | SERIAL: _____

CRITERIO DE INSPECCIÓN: *B : CUMPLE (Buen estado / Completo)* *M : NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado)* *N/A : NO APLICA*

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	LA ESCALERA SE ENCUENTRAN EN CORROSION, OXIDACION, PARTES SUELTAS O RAJADAS	B			B																											
2	TODOS LOS LARGUEROS, PELDAÑOS Y PLATAFORMA DE LA ESCALERA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y COMPLETOS	B			B																											
3	TODOS LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA CUENTAN CON ANTIDESLIZANTE	B			B																											
4	LOS PELDAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (SIN ROTURA, DESGASTE O FALLAS APARENTES)	B			B																											
5	LA ESCALERA CUENTA CON ZAPATAS ANTIDESLIZANTES EN SU BASE O SOPORTE	B			B																											
6	LAS PIEZAS DE SOPORTE DE LA ESCALERA (TORNILLOS, PERNOS) SE ENCUENTRAN FLOJAS	B			B																											
7	SE EVIDENCIA ASEO EN LA ESCALERA Y LIBRE DE SUSTANCIAS GRASAS U OTROS CONTAMINANTES	B			B																											
8	LAS SUPERFICIES DONDE SE APOYA LOS PIES Y LAS MANOS SE ENCUENTRAN SECAS	B			B																											
9	LAS BISAGRAS Y PARALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (APLICA PARA ESCALERAS TIPO TIJERA)	B			B																											
10	LA CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA ESTA INDICADA EN LA ESCALERA	N			N																											
11	LA ESCALERA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ASEGURADA (ESCALERAS DE MANO FIJAS Y PORTATILES)	B			B																											
12	EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO (POR EJEMPLO, FRENOS) DE LA ESCALERA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO (ESCALERAS MOVILES)	N/A			N/A																											
13	LA ESCALERA SE ENCUENTRA ESTABLE	B			B																											
14	LA ESCALERA SE ENCUENTRA LIBRE DE BORDES AFILADOS, RAJADOS O SUELTOS	B			B																											
	Firma del Operador	Edwin Paez																														
	Firma supervisor SST	Juan Camilo Posada																														

Observaciones: Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso de la escalera

RANCHO Y COMEDOR CANTON MILITAR

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA TALADRO

Mes de Inspección: 12/26 | Nombre del Operador: Edwin Paez | Numero de Serie a Inspeccio

Lugar / Obra: Canton militar | Empresa ejecutante: Rancho y Comedor Canton militar | Tipo de Herramienta / Obra: alambico

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B: CUMPLE (Buen estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) N/A: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ENCHUFE CON POLO A TIERRA	N																						ENCHUFE							
2	CABLE	B																						CABLE							
3	SWTCH DE ENCENDIDO	B																						SWTCH DE							
4	MANDRIL	N/A																						MANDRIL							
5	LLAVE DE MANDRIL	N/A																						LLAVE DE							
6	MANIJA DE SUJECCIÓN	B																						MANIJA DE							
7	VOLTAJE	B																						VOLTAJE							
8	MANIJAS DE AGARRE	N																						MANIJAS I							
9	CARCAZA	B																						CARCAZA							
10	CORDON DE SEGURIDAD	B																						CORDON							
11	BROCAS	B																						BROCAS							
12	OTROS	-																						OTROS							
	Firma del Operador	Edwin Paez																														
	Firma de Supervisor	Juan Camilo Posada																														

Observaciones

rvaciones

BATALLON Y COMISION
CANTON MILITAR

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MARTILLO DEMOLEDOR

SISTEMA ELECTRICO / MECANICO	Mes y año de inspección: 11/25	Nombre del Operador: Edwin Paez	
	Lugar / Obra: obra canton militar Rancho	Codigo:	

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B : CUMPLE (Buen estado / Completo) M : NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) N/A : NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Cable de alimentación y enchufe sin cortes ni empalmes	B	B	B																												
2	Carcasa exterior sin grietas ni roturas	B	B	B																												
3	Gatillo de encendido y bloqueo funcionan suavemente	B	B	B																												
4	Ausencia de fugas de aceite o grasa en el cuerpo	B	B	B																												
5	Mangos y empuñaduras firmes y con caucho protector	B	B	B																												
6	Punta o cincel afilado y sin fisuras	B	B	B																												
7	El retenedor (seguro) sujeta la punta correctamente	B	B	B																												
8	Portaherramientas limpio y lubricado (si aplica)	B	B	B																												
9	Uso de protección auditiva y visual	B	B	B																												
10	Uso de guantes y botas de seguridad	B	B	B																												
11	Área de trabajo delimitada y libre de obstáculos	B	B	B																												
12	Ausencia de cables o tuberías vivas en la zona de impacto	B	B	B																												
	Nombre Operador		Edwin Paez.																													
	Nombre Supervisor SST		Juan Camilo Posada																													

Observaciones

RANCHO Y COMEDOR
CANTON MILITAR

CONSORCIO CANTON MILITAR

LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCION ARNES Y ESLINGA

FECHA: Nov 2025 | DESDE: Nov 25 | HASTA: Dic 2025

REALIZADA POR: Juan Camilo Rosero | TRABAJOR: Edwin Paez

Convenciones: Bueno: B Malo: M No Aplica: N/A

INSPECCION DE ARNES

MARCA: Sospoa | FECHA DE FABRICACION: 2025 - Enero.

MODELO: 162305 | SERIAL: Arnes x cuatro argollas en cadera | FECHA CERTIFICACIÓN EQUIPO: 28 Dic 2025

DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOM
ARGOLLA D (PRESENTE DESCASTE Y CORROSION)	B	B	B	B	B		
HEBILLAS (PRESENTE DESCASTE Y CORROSION)	B	B	B	B	B		
PASADORES (PRESENTE DESCASTE Y CORROSION)	B	B	B	B	B		
MATERIAL LIBRE DE DESHILACHADURAS	B	B	B	B	B		
COSTURAS EN BUEN ESTADO	B	B	B	B	B		
HEBRAS SUELTAS EN REATA	B	B	B	B	B		
PRESENTA DESGARRES	B	B	B	B	B		
PRESENTA QUEMADURAS	B	B	B	B	B		
ROTULO LEGIBLE	B	B	B	B	B		
LIMPIEZA GEENERAL	B	B	B	B	B		

INSPECCION DE ESLINGA

MARCA: | FECHA DE FABRICACIÓN:

MODELO | SERIAL: | FECHA CERTIFICACIÓN EQUIPO:

TIPO DE ESLINGA | POSCIONAMIENTO | ESLINGA EN Y

DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOM
GANCHOS ABREN Y CIERRAN CORRECTAMENTE	B	B	B	B	B		
SEGURO DEL GANCHO FUNCIONA ADECUADAMENTE	B	B	B	B	B		
MATERIAL LIBRE DE DESHILACHADURAS	B	B	B	B	B		
HEBRAS SUELTAS	B	B	B	B	B		
PRESENTA DESGARRES	B	B	B	B	B		
PRESENTA QUEMADURAS	B	B	B	B	B		
CONEXIÓN DE GANCHO CON MATERIAL DE ESLINGA EN BUEN ESTADO	B	B	B	B	B		

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO: si no

NOMBRE Y FIRMA

COORDINADOR DE ALTURAS:							
TRABAJADOR:	Edwin Paez						

OBSERVACIONES:

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En la ciudad de Villavicencio, siendo las 10:00 am horas del día 10 de diciembre del 2025, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, se procede a la conformación del Comité de Convivencia Laboral del consorcio Rancho y Comedor Cantón militar

1. Objetivo

Constituir formalmente el Comité de Convivencia Laboral, con el fin de promover la sana convivencia, prevenir conductas de acoso laboral, mediar en situaciones de conflicto y fomentar un ambiente de trabajo armónico.

2. Integrantes del Comité

Se designan como miembros del Comité de Convivencia Laboral a los siguientes colaboradores:

Nombre completo	Cargo	Rol (Principal/Suplente)	Firma
Juan Camilo	R/ Legal	R/ Legal	
mateo Rabido.	Ing. Residente de apoyo	secretario suplente.	Mateo Rabid
Edwin Paez	trabajador.	Principal	Edwin Paez

3. Compromisos del Comité

- Reunirse de manera ordinaria mínimo cada tres (3) meses y extraordinaria cuando sea necesario.
- Promover actividades de sensibilización y prevención en temas de convivencia laboral. - Atender las quejas o solicitudes relacionadas con presuntas conductas de acoso laboral.
- Mantener la confidencialidad de la información recibida y tramitada.

REPRESENTANTE LEGAL

Edwin Paez

TRABAJADOR ASISTENTE

POLÍTICA DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

La Gerencia del proyecto "Remodelación de las instalaciones del Rancho y Comedor de Tropa del Cantón Militar de Apiay del BISER20 BR y DIV4, en el municipio de Villavicencio – Meta" expresa su compromiso con la protección de la seguridad y la salud de todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas que participan en el desarrollo de las actividades del proyecto.

Con el propósito de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y situaciones que puedan afectar la integridad de las personas o las instalaciones, se implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual permite establecer acciones orientadas a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, así como la aplicación de controles que contribuyan a la ejecución segura de las actividades propias del proceso de remodelación.

La organización garantiza el cumplimiento de la legislación colombiana vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los requisitos legales aplicables al sector de la construcción y demás normas que regulan el desarrollo del proyecto.

De igual manera, la dirección del proyecto promoverá condiciones de trabajo seguras y saludables mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros, necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante todas las fases de la obra.

Esta política será divulgada, comunicada y aplicada a todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas vinculados al proyecto, garantizando su conocimiento y cumplimiento.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

* Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante la ejecución de las actividades del proyecto.

* Identificar los peligros presentes en las actividades de obra civil, evaluar y valorar los riesgos y establecer medidas de control que permitan reducir o eliminar los riesgos prioritarios.

* Proteger la integridad física de los trabajadores, contratistas y demás personas que se encuentren dentro del área de trabajo.

* Promover prácticas responsables que contribuyan a la protección del medio ambiente y al uso adecuado de los recursos naturales durante el desarrollo de la obra.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



JUAN CAMILO POSADA VARELA
Representante Legal

Villavicencio, 1 de diciembre de 2025
