CONTRATO DE OBRA No 980 - 2025

OBRAS DE RECUPERACION, DE REHABILITACION Y ESTABILIZACION PUENTES PEATONALES SAN JOSE

BITACORA DE OBRA #1

ING. JOSE HERMIDES CASILIMAS
Res. INTERVENTORIA


ING. Miguel Angel Salas C.
DIR CONTRATISTA

Diego Gonzalez.
ING. DIEGO GONZALEZ
ASESOR INTERVENTORIA

ING. Victor Hurtado M.
RESIDENTE CONTRATISTA

ING JOSE WILLIAM VELEZ.
CARDER

PEREIRA - RISARALDA
2026

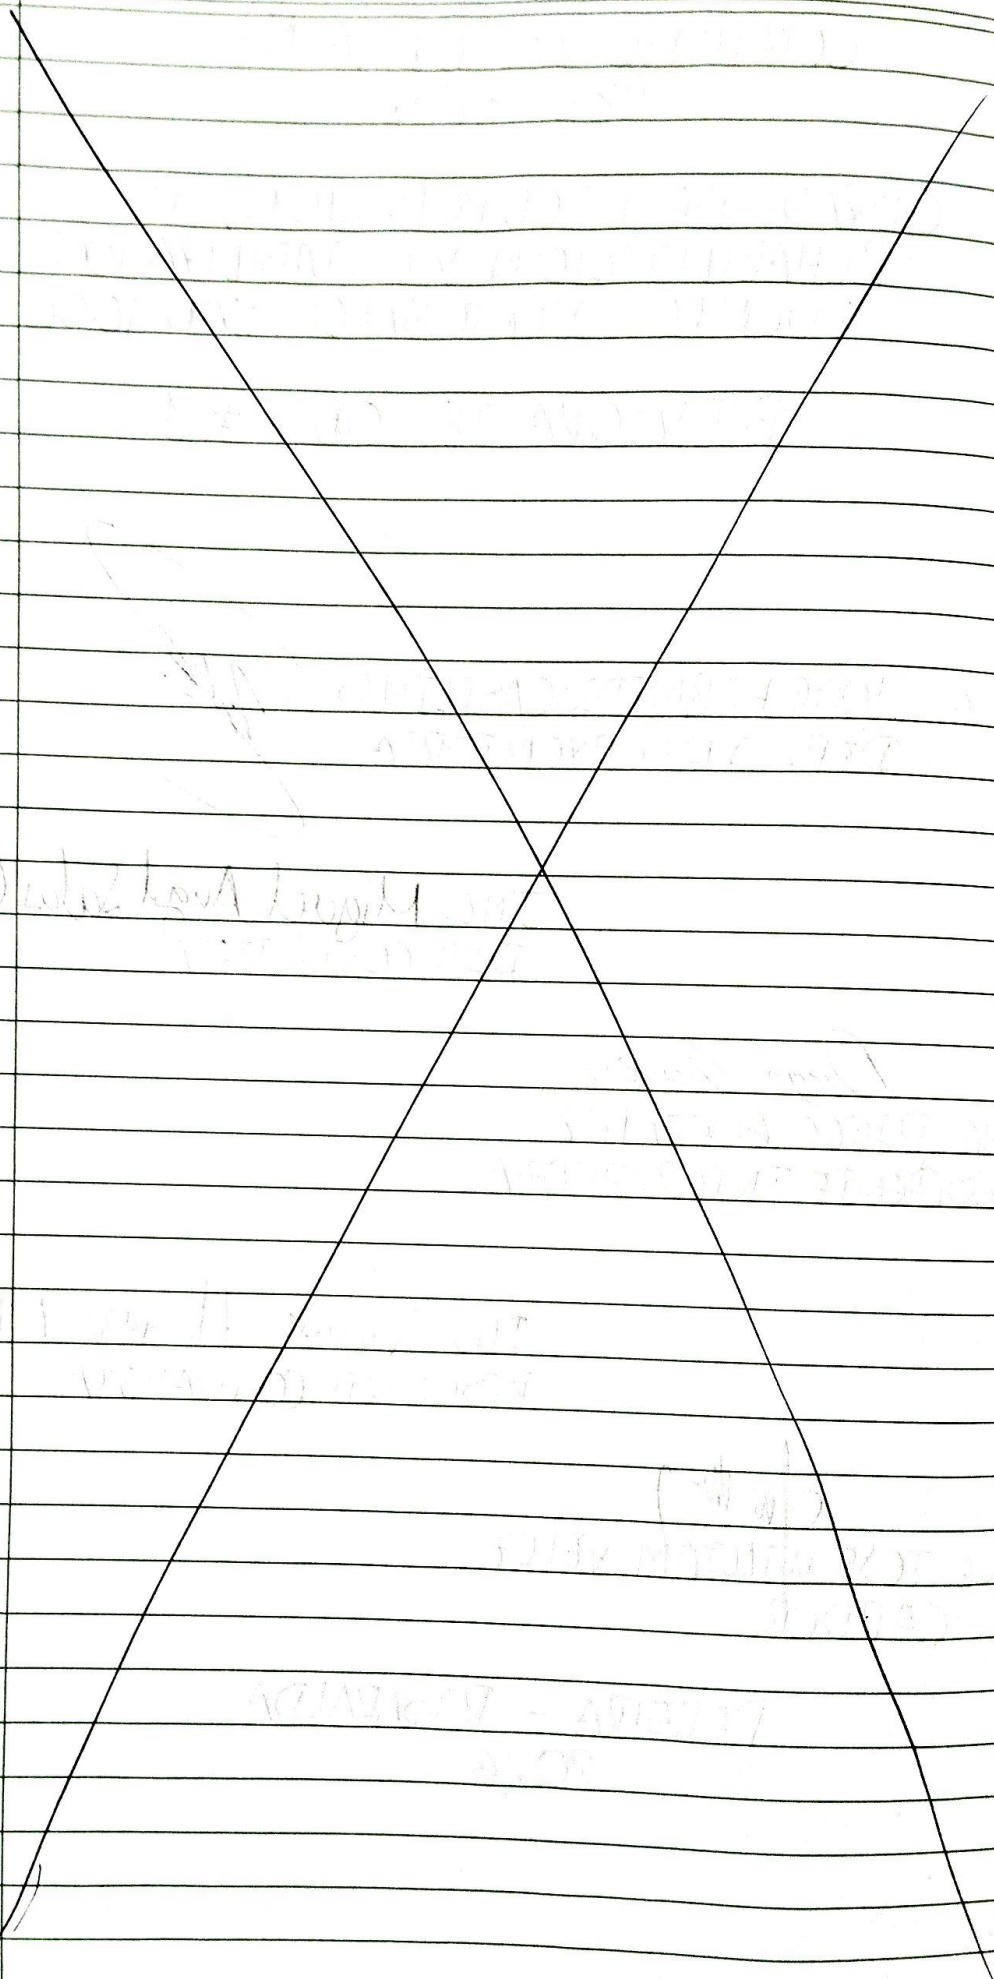

Martes 07 de Abril de 2026
Se firma acta de inicio para el contrato No 980 del 26 de Noviembre de 2025 contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8637902 cuyo objeto de contrato "Ejecutar obras de recuperación, rehabilitación y estabilización de infraestructura ecológica y urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigación del riesgo.
CONTRATANTE: Corporación autónoma regional de Risaralda - CARDER
CONTRATISTA: Consorcio Puente San Jose.
PLAZO INICIAL: 3 meses.
Fecha Inicio: Hoy, Abril 07 de 2026
Fecha Fin : Julio 06 de 2026
Bitacora de Obra Puente peatonal Rio OTUN y Puente San Jose.

Miercoles 08 de Abril de 2026
- se presentan lluvias intensas en la mañana hasta las 8:00 AM, desencadenado crecida de los Rios OTUN y San Jose.
- se realiza localización y replanteo con coordenadas y cotas. de las zapatas de soporte para los ejes 1, 2, 3 y 4 puentes OTUN y San Jose.
- se realiza reunion virtual en el que intervienen la Ing Alejandra Coral por parte de la Carder, Ing Gustavo Restrepo, diseñador estructural de concreto, Ing Mateo Franco, diseñador estructura metalica, Ing Jose H Casilimas, por parte de interventoria, Ing Victor Hurtado e Ing Miguel Soto por parte del consorcio constructor, con el fin de discutir y definir la implantación de la

Cimentación de los pilotes perforados sobre el río OTUN y sobre el río San Jorge, la Ing Alejandra Coral define la altura o cota de terminado de concreto de las zapatas para el puente OTUN, un (1) metro por encima de la cota del terreno / adoquín existente dando esto la 1519.23 y para la cimentación del puente sobre el río San Jorge se define la cota 63 cms por encima de la cota de la placa de la estructura existente quedando en la 1520.38, con estas definición se hace entrega de la información al director Ing Nuteq Franco para dibujar la estructura metálica.

Jueves 16 de Abril de 2026.
Se realiza visita y revisión de las estructuras y/o Viviendas que se encuentran en las cercanías del área donde se ejecutaran los trabajos, esto por parte de la profesional social Alba Valencia y el ingeniero Miguel Sabas.

Viernes 17 de Abril de 2026
Se inicia labores de Cerramiento provisional en la zapata costado Izq puente río Otun.
De igual forma se hace la instalación de la señalización Vertical o PMT para la seguridad Vial de la obra.

Sabado 18 de Abril de 2026
Continuan con la instalación de la señalización Vertical de PMT
Se inicia con el retiro del Adoquín que se encuentra en la plazoleta costado Izq del río Otun

Domingo 19 de Abril de 2026.
- No se plagica Actividades.

Lunes 20 de Abril de 2026.
- Continua el retiro/demolición del adoquín del costado izquierdo rio otun.
se empieza con la construcción de trincho costado izquierdo y derecho rio otún, esto se realiza con guadua.

Martes 21 de Abril de 2026
- se termina la construcción de trincho con guadua costado derecho del rio OTÚN, para controlar la caida de material al rio
- se termina la demolición/retiro del adoquinado costado izquierdo rio otún
- se realiza visita con la profesional Ambiental Victoria Hurtado, para determinar los individuos arboreos y/o sea para Poda o corte
se realiza revisión de la estructura metalica y de cimentación del muelon (andenes) aledaños a la plaza este de ingreso a los Baños publicos, evidenciado un deterioro considerable en la estructura metalica y en la madera plastica ademas de que en algunos sitios la cimentación se encuentra en el Aire

Miercoles 22 de Abril de 2026
se inicia con la excavación de la zapata costado izquierda rio otún

- Se realiza demolición de Viga / Sardinel en concreto para poder hacer la excavación de la cimentación

Jueves 23 de Abril de 2026

- Se continua con la demolición de la Viga / Sardinel
- Se continua con la excavación de la Zapata costado Izquierdo del río OTUN
- Se evidencia campo la necesidad de Mover el poste electrico que se encuentra al costado derecho del río OTUN, ya que se encuentra muy cerca de la zapata del puente peatonal Sobre el río otun
- Se hace reunión con la señora Teresita Agudelo Propietaria del local que se encuentra entre los dos puentes colgante y que podria verse afectada / Perjudicada por los trabajos a desarrollar en esta area de la obra.

Viernes 24 de Abril de 2026.

- Se termina con la demolición de la Viga / Sardinel que conformaba el adoquin en la plazoleta costado Izquierdo río otun.
- Se hace retiro manual de la gravilla / Arenon que cubria el adoquin un espesor de 0.15 cms
- Se realiza chequeo de excavación de la Zapata Izquierda río Otun y aún le falta 0.50 cm de profundidad de excavación

Sabado 25 de Abril de 2026.
- No se realizan actividades

Domingo 26 de Abril de 2026.
- No se realizan actividades

Lunes 27 de Abril de 2026.
- Continua excavación de la cimentación zapata soporte eje 1 costado izquierdo rio otún
- Se realiza comité de obra en donde se da instrucción por parte de la calder para reubicar el kiosco de la señora teresa antes de iniciar excavaciones en el costado derecho del rio otún
- Se realiza descapote y limpieza del costado derecho quebrada san jose donde se construira la cimentación eje A

Martes 28 de Abril de 2026.
- termina excavación de la cimentación costado izquierdo rio otun.
- Se realiza retiro y reubicación de cerramiento en alambre de puas con una longitud aproximada de 20 mts.
- Se realiza roseria, descapote y limpieza donde se va a reubicar la caseta de la señora Teresita, este predio presenta un desnivel de 1.0 mts aproximadamente.
- Se empieza excavación costado derecho pate quebrada san jose, para llegar a nivel de excavación cajon.

Miercoles 29 de Abril 2026
- Se retira adoquin en la ampliación del cerramiento de la plataforma, costado Izquierdo Puente sobre el río otún.
- Continua excavación costado derecho quebrada San Jose para llegar a nivel de excavación de caissons.

Jueves 30 de Abril 2026.
- Inicia construcción cuneta a recubrir de la rampa Tercsita.
- Continua excavación costado derecho quebrada San Jose para llegar a nivel de excavación de caissons.
- Inician con colocación de costales de fibra para proteger la plataforma de caissons del río San Jose.

Viernes 01 de Mayo 2026.
- Dia festivo

Sabado 02 de Mayo 2026
- No se labora.

Domingo 03 de Mayo 2026
- Dia festivo
