INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026
-ABRIL DE 2026

UNION TEMPORAL SAN DIEGO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

CONTRATO DE OBRA No. 1381 DE 2025


Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026
-ABRIL DE 2026

Imagen 1.UBICACION FRENTES DE OBRA Lote 2

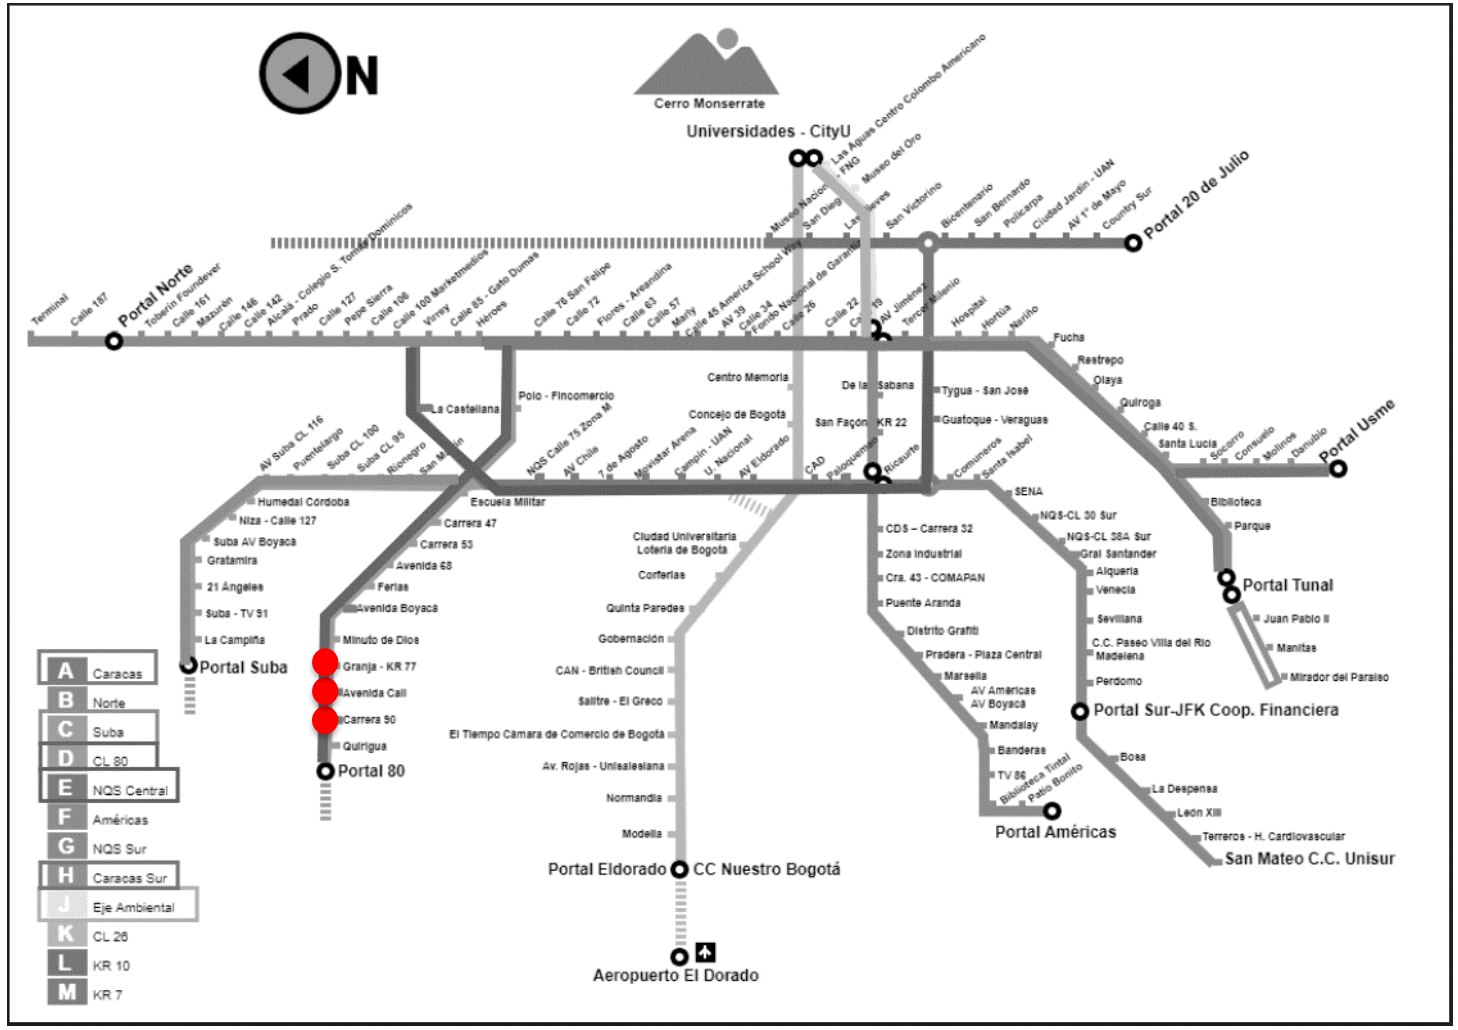

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026 -ABRIL DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.

OBC - 02	1381-L2-049	CALLE 80 - D	ESTACION AVENIDA CALI	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	100%

TABLA DE CANTIDADES		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
257,05	257,05	100 %

ANTES



DURANTE



DESPUES



Se realiza el desmonte de la cubierta existente y se instala una nueva cubierta en Aluzinc a dos aguas suministrando e instalando caballetes, flanches laterales y flanche terminación de fachada frontal y posterior en el vagón 2

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026 -ABRIL DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.


OBC - 02	1381-L2-050	CALLE 80 - D	ESTACION CARRERA 90	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	100%

TABLA DE CANTIDADES		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
257,29	257,29	100 %

ANTES



DURANTE

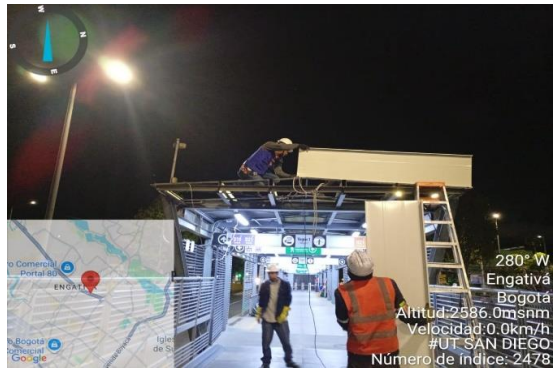

DESPUES



Se realiza el desmonte de la cubierta existente y se instala una nueva cubierta en Aluzinc a dos aguas suministrando e instalando caballetes, flanches laterales y flanche terminación de fachada frontal y posterior del vagón 1.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026 -ABRIL DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.


OBC - 02	1381-L2-051	CALLE 80 - D	ESTACION GRANJA – CARRERA 77	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	100%

TABLA DE CANTIDADES		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
908,83	908,83	100 %


ANTES



DURANTE

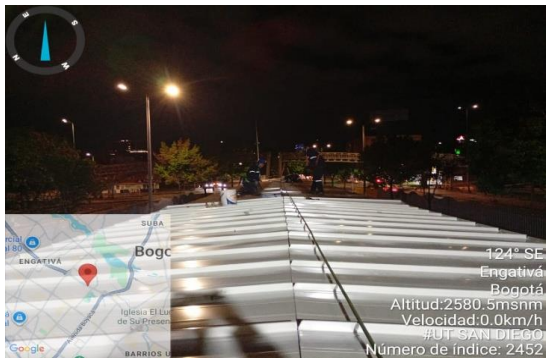

DESPUES

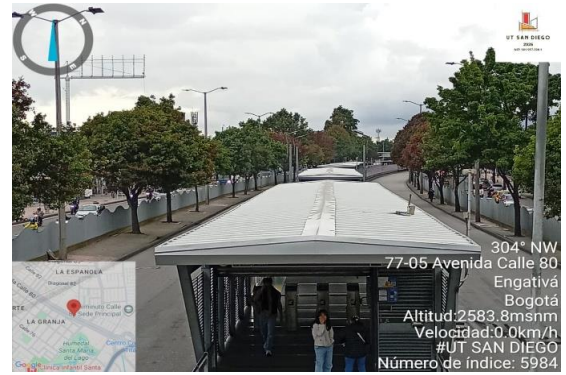

Se realiza el desmonte de la cubierta existente y se instala una nueva cubierta en Aluzinc a dos aguas suministrando e instalando caballetes, flanches laterales y flanche terminación de fachada frontal y posterior del vagones 1 , 2 , 3 , 4

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE MARZO 2026 -ABRIL DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.

MET-02	**1381-L2-052**	**NQS CENTRAL -E**	**ESTACION CALLE 72**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES	**EN EJECUCION**

TABLA DE CANTIDADES		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
EN EJECUCION	EN EJECUCION	10%

ANTES

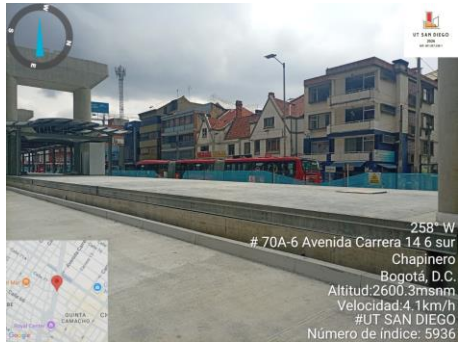

Se encuentra en proceso de compra y fabricación de elementos correspondientes a la transición entre los vagones A y B..

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026 -ABRIL DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.

MET-11	1381-L2-053	NQS CENTRAL -E	ESTACION CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADADE VAGONES ETAPA 2	EN ENECUCIÓN

TABLA DE CANTIDADES		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
EN EJECUCION	EN EJECUCION	10%

ANTES



En la Estación se encuentra en proceso de compra y fabricación de elementos del cerramiento de los vagones A y B.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026 -ABRIL DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.

MET-03	1381-L2-054	NQS CENTRAL -E	ESTACION UNIVERSIDAD NACIONAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	EN EJECUCION

TABLAS DE CANTIDADES		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
EN EJECUCION	EN EJECUCION	30%

ANTES



DURANTE





Se implementa PMT , se inicia la instalación del cerramiento tipo onda en el costado oriental de la Estación Universidad Nacional.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026 -ABRIL DE 2026

COMPONENTE DE CALIDAD









FICHA TECNICA CUBIERTA









TRABAJOS CONSTRUCCION EN TALLER

Se realiza revisión de los materiales suministrados aprobadas para la instalación de la cubierta cumpliendo con las especificaciones técnicas


INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE MARZO 2026
-ABRIL DE 2026

COMPONENTE SST

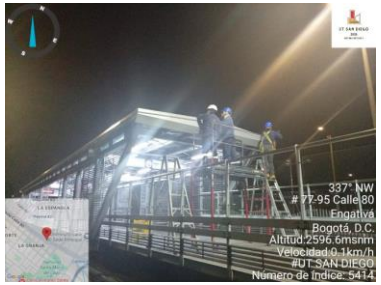




VERIFICACION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y PLANILLAS

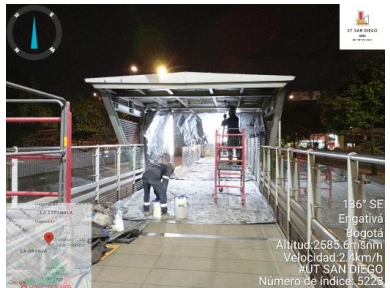

DEMARCACION Y PROTECCION ESPACIOS DE TRABAJO EN OBRA



SEÑALIZACION ESPACIOS DE TRABAJO EN OBRA

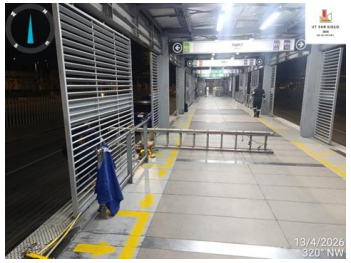



ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Se realizaron los respectivos cerramientos y la señalización de obra. Cada punto de trabajo contó con su respectivo extintor y camilla, el personal dispuso de la dotación completa, en cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026
-ABRIL DE 2026

COMPONENTE AMBIENTAL






KIT DE DERAMES Y CAMILLA




RESPEL

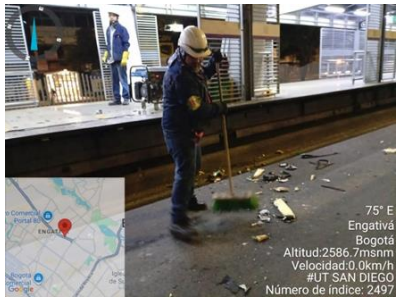



ASEO DE OBRA

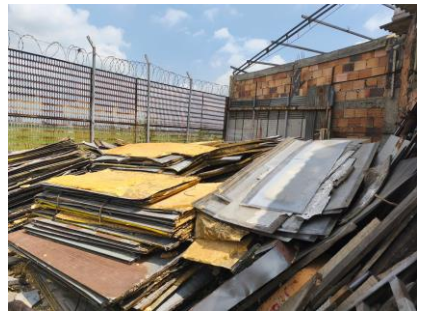

PUNTOS DE ACOPIO

Las actividades se ejecutaron cumpliendo normativas ambientales y de gestión. Se garantizó la correcta identificación y manejo de residuos peligrosos y de construcción, con disposición en sitios autorizados. El manejo de sustancias químicas cumplió con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) .

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Marzo de 2026 al 20 de Abril del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE MARZO 2026
-ABRIL DE 2026

CONCLUSION

- Las actividades realizadas corresponden al proceso de construcción de las ordenes de trabajos autorizadas y correspondientes a los lineamientos dados por interventoría y Transmilenio. En el periodo de Marzo de 2026 – Abril de 2026.
- Se encuentra ajustando los trabajos de acuerdo a las condiciones existentes en obra para los cuales se presentan las actividades ejecutadas.
- Todos los trabajos tienen aval por parte de interventoría cumpliendo con los parámetros establecidos en el contrato.
- Se verifica la alineación, nivelación e instalación en los elementos estructurales.
- Los materiales cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas
- Se realiza la instalación de todos los elementos de fijación para minimizar riesgos por efectos climáticos.
- La pendiente cumple con las necesidades de la obra y con las especificaciones dadas; de igual manera se garantiza el drenaje de las aguas lluvias.
