	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 8 de mayo de 2026	SEMANA No.	55	DEL	1-may-26	AL	7-may-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipios de Caparrapí, Puerto Salgar, Alban, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Beltrán, Bituima, Pulí, San Juan de Rioseco, Guayabal de Síquima, Vianí.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	Contrato ICCU-221 de 2025	**CONTRATO No.:**	Contrato de obra ICCU-141 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	10 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION PRORROGA1	30 de junio de 2026	**FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION PRORROGA1**	30 de junio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	447 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	447 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	393 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	393 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 28.220.954.599
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 28.220.954.599
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 28.220.954.599
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 8.466.286.380
SUPERVISOR:	ESTEFANIA HERNANDEZ VARGAS	**GESTOR OBRA:**	ESTEFANIA HERNANDEZ VARGAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

OBSERVACIONES

Mediante oficio ICCU-221-517 esta interventoría, emite concepto de aprobación a la **Programación de Obra Versión 7**, la cual incorpora 10 ítems no previstos (NP), asociados a actividades de obra y de señalización preventiva de los corredores viales.
Con base en lo anterior, se entienden como el cronograma vigente para efectos de seguimiento, control y medición de avance del contrato. Este aplica a partir del presente informe semanal 50-51

El presente informe consolida la información correspondiente a dos semanas, en razón a que durante la Semana Santa, periodo correspondiente al Informe Semanal No. 50, no se ejecutaron actividades de obra en los días festivos. En consecuencia, y con el fin de mantener la secuencia y numeración establecida, se integró su contenido al Informe Semanal No. 51, conservando la numeración de ambas semanas en un solo documento.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Magdalena Bajo

Tramo No 2 Puerto Salgar

Construcción de cunetas y ventanas con material estabilizado (formula modificada cemento 5%) entre el K1+150 al K1+250 total a la fecha 1250 ml construcción de ventanas para evacuación de aguas.

Gualivá

Tramo No 4 Quebrada Negra

Continúan las actividades de limpieza de alcantarillas y rocería de zonas laterales entre el K2+500 tramo 1

Tramo No 5 San Francisco

Limpieza de zonas laterales, se reporta que a la fecha no se da inicio de obras significativas para avance general de obra en el frente intervenido, la interventoría en visitas técnicas solo evidencia 2 trabajadores en el frente de obra.

Tramo No 6 Sasaima

Se termina la construcción de las 4 alcantarillas programadas y terminan con los llenos respectivos del muro de contención en el K4+520.

Tramo No 7 Beltrán

Terminan obras hidráulicas y de contención, pendiente subsanar observaciones realzadas en campo por la interventoría e iniciar actividad de estabilización de la rasante.

Magdalena Centro

Tramo No 8 Bituima

Construcción de la alcantarilla en el K8+900 encole y descole.

Tramo No 9 Pulí

Colocación de la capa doble riego con un avance en el K2+670 segunda capa.

Tramo No 10 San Juan de Rioseco

Continúa las actividades de limpieza de alcantarillas y rocería de zonas laterales entre el K1+930 al K4+980.

Tramo No 11 Guayabal de Síquima

Continúa las actividades de rocería y limpieza de alcantarillas entre el K0+600 al K1+600

Tramo No 12 Vianí

Continúa la estabilización de la rasante con químico no convencional SoilBinder y cemento al 3% entre el K3+000 al K3+250, se presentan muchas lluvias en el frente de trabajo lo cual genera atrasos en los avances de obra por clima lluvioso.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	Caracterización y ejecución	10-abr-25	30-jun-26	447	10-abr-25	30-jun-26	447	0	0
	Topografía	10-abr-25	24-may-25	45	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Ensayos de laboratorio	10-abr-25	24-ago-25	137	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Informes de suelos y pavimentos	10-abr-25	31-ago-25	144	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Ejecución de obra	26-jul-25	30-jun-26	340	28-jul-25		ejecución	-2	ejecución
	Explanación y excavaciones	26-jul-25	18-oct-25	85	11-ago-25		ejecución	-16	ejecución
	Estructura de pavimento	27-oct-25	20-dic-25	55	30-oct-25		ejecución	-3	ejecución
	De acuerdo a la ruta critica las actividades implican un atraso en el contrato son: Topografía y ensayos de laboratorio.								

Plazo del proyecto: 447 días

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 8 de mayo de 2026	SEMANA No.	55	DEL	1-may-26	AL	7-may-26

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	38,71%	37,24%	-1,47%
Durante el periodo	4,17%	0,09%	-4,08%
Acumulado Actual	42,88%	37,32%	-5,56%

AVANCE CARACTERIZACION

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	90,55%	88,80%	-1,75%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	90,55%	88,80%	-1,75%


AVANCE OBRA

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	33,81%	32,08%	-1,73%
Durante el periodo	4,58%	0,10%	-4,48%
Acumulado Actual	38,39%	32,18%	-6,21%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
447 días	393,00	54	-24,85

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

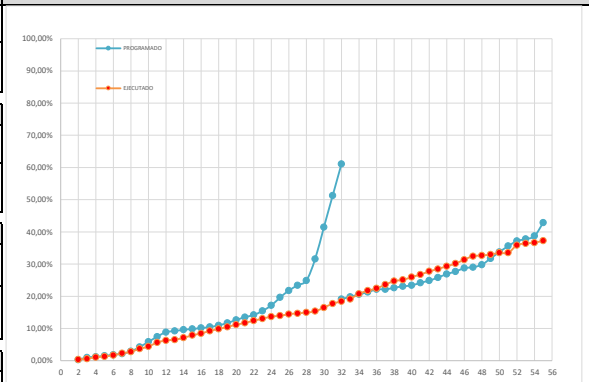

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.924.552.907	$ 10.508.488.047	96%
Durante el periodo	$ 1.177.484.921	$ 24.860.972	2%
Acumulado Actual	$ 12.102.037.829	$ 10.533.349.020	87%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-13%	-$	1.568.688.809

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 7.358.662.242	$ 7.091.761.246	
Durante el periodo	$ 1.107.624.138	$ -	
Acumulado Actual	$ 8.466.286.380	$ 7.091.761.246	

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

1.El 5 de mayo de 2026, la Interventoría remite oficio ICCU-221-549, Solicitando la gestión de los RCD del Tramo 08 Bituima
2.Seguimiento ambiental en obra:
Tramo 3 Albán
En la obra el Contratista realiza la demarcación de la obra
Se realiza manejo del material de construcción en acopio.
Tramo 4 Quebrada Negra
Se realiza manejo del material generado por las actividades de limpieza de obras de drenaje.
Tramo 5 San Francisco
Se realiza el manejo de material generado por las actividades de limpieza
Tramo 6 – Sasaima
Se realiza demarcación de las áreas de intervención de la obra.
Se realiza mantenimiento a la demarcación del acopio de materiales.

Tramo 7 Beltrán
Se realiza manejo de residuos sólidos ordinarios, recolectándolos en las canecas del punto ecológico
Se mantiene la demarcación al acopio de materiales de construcción y RCD
Se realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de obra
Tramo 8 Bituima
El Contratista de obra realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de trabajo.
Se realiza demarcación del acopio temporal de materiales.
Tramo 10 San Juan de Rio Seco
El Contratista de obra realiza el manejo del material generado por las actividades de limpieza de las obras de drenaje.
Se realiza manejo del material generado por las actividades de rocería.
Tramo 11 Guayabal
El Contratista de obra realiza manejo de los residuos generados por las actividades de limpieza.
Tramo 12 Viani
El Contratista realiza manejo del material generado por las actividades de obra
El Contratista realizó actividades de orden y aseo.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Se realizó seguimiento a la atención al usuario en el punto SAU para los tramos

Se realizó seguimiento en los tramos quebrada negra y Guayabal de Síquima para la búsqueda de personal.

Se verificaron los puntos satélite de información ubicados en cada uno de los tramos los cuales están actualizados.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 8 de mayo de 2026	SEMANA No.	55	DEL	1-may-26	AL	7-may-26

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Gestión en los tramos de: Puerto Salgar, Quebradanegra, Dan Francisco, Sasaima, Beltrán, Bituima, Puli , San Juan y Vianí

REPORTE DE PERSONAL EN OBRA

Viernes, 01 de MAYO de 2026		Sabado, 02 de MAYO de 2026		Lunes, 04 de MAYO de 2026		Martes, 05 de MAYO de 2026		Miercoles, 06 de MAYO de 2026		Jueves, 07 de MAYO de 2026	
Operativos	45	Operativos	NA	Operativos	44	Operativos	44	Operativos	44	Operativos	46
Administrativos	9	Administrativos	NA	Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9
Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	NA	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10
Ingresos	0	Ingresos	NA	Ingresos	0	Ingresos	0	Ingresos	2	Ingresos	0
Retiros	9	Retiros	NA	Retiros	1	Retiros	0	Retiros	0	Retiros	0
Subcontratado	7	Inactivos	NA	Inactivos	7	Inactivos	7	Inactivos	7	Inactivos	7
Total	80	Total	NA	Total	71	Total	70	Total	72	Total	72

Se remite requerimiento de entrega de planillas de seguridad social del mes de abril de 2026 al contratista, mediante el comunicado ICCU-221-545 del 4 de mayo de 2026.
Se remite solicitud de entrega del informe mensual SST, del mes de abril de 2026 al contratista, mediante el comunicado ICCU-221-546 del 4 de mayo de 2026.
Para la semana del 1 al 7 de mayo de 2026, hay un total de 82 trabajadores activos de los cuales 70 promedio son operativos y 19 administrativos (9 en campo y 10 en Bogotá), se presentaron novedades de 10 retiros y 2 ingresos de personal, durante el transcurso de la semana no se presentan casos de accidentes de trabajo por parte del contratista.
Por parte de la interventoría se presenta reporte de un total de 22 trabajadores vinculados al contrato, adicionalmente a la fecha, no se han presentado casos de accidentes de trabajo.

REPORTE DE NOVEDADES E INCIDENTES / OBSERVACIONES

No se han presentado casos de accidentes de trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El seguimiento de calidad para las obras de construcción de alcantarillas, muros de contención, limpieza de alcantarillas, rocería y estabilización de la rasante en vías terciarias se realiza de acuerdo con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS y a los lineamientos de interventoría aplicados por el ICCU, garantizando el cumplimiento de los criterios técnicos, estructurales, hidráulicos y ambientales. Este seguimiento se apoya en un Plan de Inspección y Ensayos que permite verificar, de manera sistemática, la calidad de los materiales, los procesos constructivos y la correcta ejecución de cada actividad antes de su aceptación.

Para las alcantarillas y muros de contención, el control de calidad se enfoca en la verificación del diseño, alineación, cotas, pendientes y dimensiones, así como en la correcta ejecución de cimentaciones y drenajes. Se realizan ensayos de materiales (suelos, concretos y acero de refuerzo) donde aplique por tipo de obra, para controlar la compactación de rellenos y confirmar que las estructuras cumplan con las tolerancias y resistencias mínimas exigidas por el INVIAS, asegurando su estabilidad estructural y adecuado funcionamiento hidráulico.

En cuanto a la limpieza de alcantarillas y la rocería, el seguimiento de calidad se garantiza con la remoción total de sedimentos, residuos y vegetación que afecten el libre flujo del agua y la correcta ejecución de las obras. Estas actividades se ejecutan bajo criterios de manejo ambiental, dejando las áreas intervenidas en condiciones óptimas para la operación del drenaje y la posterior estabilización de la vía, con soporte documental mediante registros fotográficos.

Para la estabilización de la rasante con químico no convencional más cemento al 3 %, el control de calidad incluye los ensayos previos de caracterización del suelo, verificación de la dosificación y homogeneidad de la mezcla, control de la humedad y compactación según las especificaciones del proyecto, y ensayos de resistencia que confirmen la mejora de las propiedades mecánicas del suelo. El seguimiento adecuado de estas actividades asegura una rasante estable, durable y conforme a las normas vigentes, contribuyendo a la vida útil y desempeño estructural de la vía terciaria.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

La interventoría, en el seguimiento a la programación presentada por el contratista y a las visitas técnicas realizadas en obra, evidencia bajo rendimiento en la construcción de cunetas en el tramo de puerto Salgar por lo que se requiere al contratista mejorar estos rendimientos en obra a la fecha continúan los bajos rendimientos en esta actividad una vez que dan inicio a las actividades de cunetas en el tramo de Puli.

Igualmente, con el fin de continuar el control, seguimiento y aseguramiento de la calidad de las obras, la interventoría solicita que el contratista presente y mantenga actualizada una programación semanal detallada, en la cual se identifiquen claramente los frentes activos, actividades a ejecutar, personal asignado, rendimientos esperados y metas de avance. Esta programación deberá ser socializada y validada con la interventoría, constituyéndose en una herramienta fundamental para la toma de decisiones, el control del avance físico y la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad exigidos contractualmente.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La interventoría reconoce una mejora progresiva en la calidad de los trabajos terminados en los diferentes frentes de obra; no obstante, reitera que es responsabilidad directa del contratista, a través de sus residentes de obra, velar de manera permanente porque las formaletas, moldes y demás elementos utilizados en el vaciado de concretos cumplan con un estándar de alta calidad, garantizando estabilidad, alineación, hermeticidad y adecuada resistencia durante el proceso de fundida.

El adecuado estado y correcta instalación de las formaletas es un proceso determinante para garantizar acabados homogéneos, dimensiones conforme a diseño, superficies sin segregaciones ni vacíos, y una correcta conformación de aristas y juntas. En este sentido, la interventoría enfatiza que previo a cada vaciado de concreto se debe verificar la limpieza, nivelación, rigidez y ajuste de las formaletas, así como la correcta ubicación del acero de refuerzo y de los elementos embebidos, con el fin de prevenir reprocesos y garantizar la durabilidad y calidad estructural de las obras ejecutadas.

Igualmente, se recuerda al contratista que el control de calidad no se limita al resultado final, sino que debe integrarse a todo el proceso constructivo, siendo indispensable la supervisión técnica continua por parte de los residentes, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las normas vigentes y las buenas prácticas de ingeniería en cada uno de los frentes de trabajo.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Velar por los correctos acabados de las obras hidráulicas y muros de contención en todos los tramos al igual que buenas prácticas ingenieriles en los procesos constructivos.	CONTRATISTA	INMEDIATO
Revisar formaletas ya onduladas para hacer su respectivo cambio.		
Velar porque la apertura de nuevos frentes de trabajo cumplan con el PMT		
Disponer en sitios autorizados los RCD provenientes de las excavaciones y demoliciones generales de obra.		
Contratación de nuevo personal para los frentes activos y los que se vayan a iniciar previo a la entrega de dotación completa a los trabajadores que vayan a iniciar actividades de obra.		

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 8 de mayo de 2026	SEMANA No.	55	DEL	1-may-26	AL	7-may-26

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

sin obras no previstas en la semana 55

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Como interventoría, y de acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades de rocería, limpieza de alcantarillas existentes, conformación de la rasante y procesos previos de estabilización, se evidencia que los frentes de obra cuentan con las condiciones técnicas mínimas para dar continuidad a la ejecución del proyecto, en concordancia con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS y los lineamientos aplicables del ICCU. Los trabajos ejecutados han permitido liberar las zonas de intervención, mejorar las condiciones de drenaje superficial y preparar la subrasante para la construcción de obras hidráulicas.

En este sentido, y considerando la importancia de garantizar la funcionalidad hidráulica y la estabilidad de la vía, esta interventoría solicita dar inicio a la construcción de las alcantarillas proyectadas en los tramos correspondientes a los municipios de Sasaima y Bituima, primero para cumplir con la programación aprobada y segundo priorizar aquellos puntos críticos identificados en campo. Dichas actividades deberán ejecutarse conforme a los diseños aprobados, asegurando el control dimensional, la correcta alineación y pendiente, así como la calidad de los materiales y la compactación de rellenos, de acuerdo con la normativa vigente del INVIAS.

Se recalca que el inicio de estas obras deberá estar acompañado de un control de calidad permanente, incluyendo registros en bitácora, ensayos de materiales y verificaciones previas al cierre de cada frente de trabajo. La correcta y oportuna construcción de las alcantarillas es importante para la durabilidad de la estabilización de la rasante y para el adecuado manejo de las aguas, mitigando riesgos de erosión, socavación y deterioro prematuro de la vía en los tramos intervenidos.

Se da apertura de otros dos frentes de trabajo (Guayabal de Síquima) con ello se tienen 10 frentes activos. Lo cual permite avanzar en la ejecución general de obra, pero se le recuerda al contratista la importancia de estar pendiente de las fechas de inicio y fin de cada actividad acorde a la programación presentada ya que algunas actividades presentan atrasos en las fechas de inicio o fin.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

TRAMO VIAL No. 12 - VIANÍ CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



Fecha: DEL 2 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026	Se hace seguimiento a las actividades de estabilización de la rasante con químico no convencional relación 750 ml/m3 y cemento al 3% por volumen K3+200, con ello se pretende mejorar significativamente la resistencia del material de rasante.

TRAMO # 8 - BITUIMA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



Fecha: DEL 2 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en el tramo BITUIMA en las abscisa K9+170 con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO VIAL No. 2 - PUERTO SALGAR CONSTRUCCIÓN CUNETAS ZONA LATERAL



Fecha: DEL 2 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS en el tramo PUERTO SALGAR en las abscisa K1+400 LADO DERECHO, con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO VIAL No. 9 - PULÍ CONSTRUCCIÓN CUNETAS ZONA LATERAL



Fecha: DEL 2 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS en el tramo PUERTO SALGAR en las abscisa K0+000 - K0+200 LADO DERECHO, con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	**FECHA**	viernes, 8 de mayo de 2026	**SEMANA No.**	**55**	DEL	**1-may-26**	AL	**7-may-26**

TRAMO VIAL No. 9 - PULÍ CAPA DOBLE RIEGO






Fecha: DEL 2 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de colocación capa doble riego K2+600

TRAMO VIAL No. 10 - TRAMO DE SAN JUAN DE RIO SECO - ROCERÍA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS







Fecha: DEL 2 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de ROCERÍA Y LIMPIEZA DE ALCATARILLAS en el tramo de QUEBRADA NEGRA en las abscisa k4+520, con ello se pretende mejorar significativamente las zonas laterales de la vía y brindar mejor visibilidad a los actores viales.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

CUADRO DE INVERSION

Semana	Periodo		Costo Prorroga 1	Costo acumulado	% Programado	% Prog. Acum.	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	% Eject. Acum.	Avance/Atraso
1	10/4/2025	24/4/2025	$ 16.868.250,00	$ 16.868.250,00	0,06%	0,06%	$ 91.439.797,00	$ 91.439.797,00	0,32%	0,32%	0,26%
2	25/4/2025	1/5/2025	$ 68.449.370,01	$ 85.317.620,01	0,24%	0,30%	$ 81.159.080,00	$ 172.598.877,00	0,29%	0,61%	0,31%
3	2/5/2025	8/5/2025	$ 191.161.301,70	$ 276.478.921,71	0,68%	0,98%	$ 127.185.537,00	$ 299.784.414,00	0,45%	1,06%	0,08%
4	9/5/2025	15/5/2025	$ 63.125.743,41	$ 339.604.665,12	0,22%	1,20%	$ 71.817.843,00	$ 371.602.257,00	0,25%	1,32%	0,11%
5	16/5/2025	22/5/2025	$ 82.294.717,24	$ 421.899.382,36	0,29%	1,49%	$ 103.759.840,00	$ 475.362.097,00	0,37%	1,68%	0,19%
6	23/5/2025	29/5/2025	$ 101.343.461,40	$ 523.242.843,76	0,36%	1,85%	$ 167.233.472,00	$ 642.595.569,00	0,59%	2,28%	0,42%
7	30/5/2025	5/6/2025	$ 89.414.402,25	$ 612.657.246,01	0,32%	2,17%	$ 140.511.071,00	$ 783.106.640,00	0,50%	2,77%	0,60%
8	6/6/2025	12/6/2025	$ 204.167.602,60	$ 816.824.848,61	0,72%	2,89%	$ 261.452.674,00	$ 1.044.559.314,00	0,93%	3,70%	0,81%
9	13/6/2025	19/6/2025	$ 384.922.388,00	$ 1.201.747.236,61	1,36%	4,26%	$ 190.646.493,00	$ 1.235.205.807,00	0,68%	4,38%	0,12%
10	20/6/2025	26/6/2025	$ 448.579.069,60	$ 1.650.326.306,21	1,59%	5,85%	$ 364.396.781,00	$ 1.599.602.588,00	1,29%	5,67%	-0,18%
11	27/6/2025	3/7/2025	$ 459.489.054,00	$ 2.109.815.360,21	1,63%	7,48%	$ 175.955.572,00	$ 1.775.558.160,00	0,62%	6,29%	-1,18%
12	4/7/2025	10/7/2025	$ 393.108.861,80	$ 2.502.924.222,01	1,39%	8,87%	$ 64.787.310,00	$ 1.840.345.470,00	0,23%	6,52%	-2,35%
13	11/7/2025	17/7/2025	$ 95.606.262,36	$ 2.613.605.379,21	0,39%	9,26%	$ 161.933.333,33	$ 2.002.278.803,33	0,57%	7,10%	-2,17%
14	18/7/2025	24/7/2025	$ 110.681.157,20	$ 2.681.335.670,25	0,24%	9,50%	$ 221.879.026,67	$ 2.224.157.830,00	0,79%	7,88%	-1,62%
15	25/7/2025	31/7/2025	$ 67.730.291,04	$ 2.765.998.534,05	0,30%	9,80%	$ 167.151.410,24	$ 2.391.309.240,24	0,59%	8,47%	-1,33%
16	1/8/2025	7/8/2025	$ 84.662.863,80	$ 2.850.661.397,85	0,30%	10,10%	$ 213.671.312,72	$ 2.604.980.552,96	0,76%	9,23%	-0,87%
17	8/8/2025	14/8/2025	$ 86.918.043,89	$ 2.937.579.441,74	0,31%	10,41%	$ 176.002.745,70	$ 2.780.983.298,66	0,62%	9,85%	-0,55%
18	15/8/2025	21/8/2025	$ 149.431.743,90	$ 3.087.011.185,64	0,53%	10,94%	$ 173.032.639,80	$ 2.954.015.938,46	0,61%	10,47%	-0,47%
19	22/8/2025	28/8/2025	$ 201.840.043,00	$ 3.288.851.228,64	0,72%	11,65%	$ 203.012.304,48	$ 3.157.028.242,94	0,72%	11,19%	-0,47%
20	29/8/2025	4/9/2025	$ 269.707.194,30	$ 3.558.558.422,94	0,96%	12,61%	$ 150.237.157,00	$ 3.307.265.399,94	0,53%	11,72%	-0,89%
21	5/9/2025	11/9/2025	$ 246.173.261,80	$ 3.804.731.684,74	0,87%	13,48%	$ 204.936.373,01	$ 3.512.201.772,95	0,73%	12,45%	-1,04%
22	12/9/2025	18/9/2025	$ 193.053.246,90	$ 3.997.784.931,64	0,68%	14,17%	$ 160.045.700,36	$ 3.672.247.473,31	0,57%	13,01%	-1,15%
23	19/9/2025	25/9/2025	$ 357.637.844,90	$ 4.355.422.776,54	1,27%	15,43%	$ 192.513.940,91	$ 3.864.761.414,22	0,68%	13,69%	-1,74%
24	26/9/2025	2/10/2025	$ 473.856.126,20	$ 4.829.278.902,74	1,68%	17,11%	$ 69.018.337,10	$ 3.933.779.751,32	0,24%	13,94%	-3,17%
25	3/10/2025	9/10/2025	$ 699.857.151,20	$ 5.529.136.053,94	2,48%	19,59%	$ 143.100.230,36	$ 4.076.879.981,67	0,51%	14,45%	-5,15%
26	10/10/2025	16/10/2025	$ 602.671.319,90	$ 6.131.807.373,84	2,14%	21,73%	$ 70.185.829,64	$ 4.147.065.811,32	0,25%	14,69%	-7,03%
27	17/10/2025	23/10/2025	$ 465.564.507,40	$ 6.597.371.881,24	1,65%	23,38%	$ 72.608.062,60	$ 4.219.673.873,92	0,26%	14,95%	-8,43%
28	24/10/2025	30/10/2025	$ 413.777.200,20	$ 7.011.149.081,44	1,47%	24,84%	$ 109.641.713,36	$ 4.329.315.587,27	0,39%	15,34%	-9,50%
29	31/10/2025	6/11/2025	$ 1.885.899.453,00	$ 8.897.048.534,44	6,68%	31,53%	$ 327.495.481,74	$ 4.656.811.069,02	1,16%	16,50%	-15,03%
30	7/11/2025	13/11/2025	$ 2.803.528.856,00	$ 11.700.577.390,44	9,93%	41,46%	$ 337.699.228,90	$ 4.994.510.297,92	1,20%	17,70%	-23,76%
31	14/11/2025	20/11/2025	$ 2.767.011.783,00	$ 14.467.589.173,44	9,80%	51,27%	$ 208.617.682,49	$ 5.203.127.980,41	0,74%	18,44%	-32,83%
32	21/11/2025	27/11/2025	$ 2.761.779.440,00	$ 17.229.368.613,44	9,79%	61,05%	$ 187.790.939,87	$ 5.390.918.920,28	0,67%	19,10%	-41,95%
Reprogramacion de obra de acuerdo a la prorroga no.1											

Semana	Periodo		Costo Prorroga 1	Costo acumulado	% Programado	% Prog. Acum.	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	% Eject. Acum.	Avance/Atraso
33	28/11/2025	4/12/2025	$ 208.841.471,90	$ 5.599.760.392,18	0,74%	19,84%	$ 468.296.372,77	$ 5.859.215.293,05	1,66%	20,76%	0,92%
34	5/12/2025	11/12/2025	$ 215.609.758,32	$ 5.815.370.150,50	0,76%	20,61%	$ 272.991.495,58	$ 6.132.206.788,62	0,97%	21,73%	1,12%
35	12/12/2025	18/12/2025	$ 192.356.787,14	$ 6.007.726.937,64	0,68%	21,29%	$ 209.046.355,70	$ 6.341.253.144,32	0,74%	22,47%	1,18%
36	19/12/2025	25/12/2025	$ 243.724.112,09	$ 6.251.451.049,73	0,86%	22,15%	$ 318.983.485,78	$ 6.660.236.630,11	1,13%	23,60%	1,45%
37	26/12/2025	1/1/2026	$ -	$ 6.251.451.049,73	0,00%	22,15%	$ 324.152.822,62	$ 6.984.389.452,73	1,15%	24,75%	2,60%
38	2/1/2026	8/1/2026	$ 135.511.631,63	$ 6.386.962.681,36	0,48%	22,63%	$ 94.582.720,82	$ 7.078.972.173,55	0,34%	25,08%	2,45%
39	9/1/2026	15/1/2026	$ 135.626.494,97	$ 6.522.589.176,33	0,48%	23,11%	$ 254.099.984,49	$ 7.333.072.158,03	0,90%	25,98%	2,87%
40	16/1/2026	22/1/2026	$ 73.709.185,19	$ 6.596.298.361,52	0,26%	23,37%	$ 215.549.921,95	$ 7.548.622.079,99	0,76%	26,75%	3,37%
41	23/1/2026	29/1/2026	$ 235.403.863,69	$ 6.831.702.225,21	0,83%	24,21%	$ 274.665.074,76	$ 7.823.287.154,75	0,97%	27,72%	3,51%
42	30/1/2026	5/2/2026	$ 182.299.169,51	$ 7.014.001.394,72	0,65%	24,85%	$ 216.841.751,08	$ 8.040.128.905,84	0,77%	28,49%	3,64%
43	6/2/2026	12/2/2026	$ 278.665.526,53	$ 7.292.666.921,25	0,99%	25,84%	$ 242.803.600,00	$ 8.282.932.505,84	0,86%	29,35%	3,51%
44	13/2/2026	19/2/2026	$ 298.105.984,59	$ 7.590.772.905,84	1,06%	26,90%	$ 232.252.064,64	$ 8.515.184.570,48	0,82%	30,17%	3,28%
45	20/2/2026	26/2/2026	$ 224.174.524,49	$ 7.814.947.430,33	0,79%	27,69%	$ 338.506.694,54	$ 8.853.691.265,02	1,20%	31,37%	3,68%
46	27/2/2026	5/3/2026	$ 294.849.650,77	$ 8.109.797.081,10	1,04%	28,74%	$ 306.891.010,11	$ 9.160.582.275,13	1,09%	32,46%	3,72%
47	6/3/2026	12/3/2026	$ 84.791.068,43	$ 8.194.588.149,53	0,30%	29,04%	$ 61.739.747,46	$ 9.222.322.022,59	0,22%	32,68%	3,64%
48	13/3/2026	19/3/2026	$ 217.098.782,78	$ 8.411.686.932,31	0,77%	29,81%	$ 79.731.352,59	$ 9.302.053.375,18	0,28%	32,96%	3,15%
49	20/3/2026	26/3/2026	$ 551.465.363,70	$ 8.963.152.296,01	1,95%	31,76%	$ 147.852.714,37	$ 9.449.906.089,55	0,52%	33,49%	1,72%
50	27/3/2026	2/4/2026	$ 564.111.304,90	$ 9.527.263.600,91	2,00%	33,76%	$ -	$ 9.449.906.089,55	0,00%	33,49%	-0,27%
51	3/4/2026	9/4/2026	$ 516.217.665,22	$ 10.043.481.266,13	1,83%	35,59%	$ 674.335.151,23	$ 10.124.241.240,79	2,39%	35,87%	0,29%
52	10/4/2026	16/4/2026	$ 445.993.519,23	$ 10.489.474.785,36	1,58%	37,17%	$ 149.353.300,45	$ 10.273.594.541,24	0,53%	36,40%	-0,76%
53	17/4/2026	23/4/2026	$ 168.318.493,01	$ 10.657.793.278,37	0,60%	37,77%	$ 71.713.577,73	$ 10.345.308.118,97	0,25%	36,66%	-1,11%
54	24/4/2026	30/4/2026	$ 266.759.629,06	$ 10.924.552.907,43	0,95%	38,71%	$ 163.179.928,46	$ 10.508.488.047,43	0,58%	37,24%	-1,47%
55	1/5/2026	7/5/2026	$ 1.177.484.921,29	$ 12.102.037.828,72	4,17%	42,88%	$ 24.860.972,09	$ 10.533.349.019,51	0,09%	37,32%	-5,56%
56	8/5/2026	14/5/2026	$ 1.791.076.488,91	$ 13.893.114.317,63	6,35%	49,23%					
57	15/5/2026	21/5/2026	$ 2.001.970.807,87	$ 15.895.085.125,50	7,09%	56,32%					
58	22/5/2026	28/5/2026	$ 1.951.889.870,71	$ 17.846.974.996,21	6,92%	63,24%					
59	29/5/2026	4/6/2026	$ 2.116.271.984,50	$ 19.963.246.980,71	7,50%	70,74%					
60	5/6/2026	11/6/2026	$ 2.290.511.135,64	$ 22.253.758.116,35	8,12%	78,86%					
61	12/6/2026	18/6/2026	$ 2.513.792.052,05	$ 24.767.550.168,40	8,91%	87,76%					
62	19/6/2026	25/6/2026	$ 1.300.603.051,26	$ 26.068.153.219,66	4,61%	92,37%					
63	26/6/2026	30/6/2026	$ 2.152.801.379,28	$ 28.220.954.598,94	7,63%	100,00%					
			$ 28.220.954.598,94								

CUADRO SEGUIMIENTO DE OBRA POR PROVINCIA

		MAG CENTRO			GUIALIVA			BAJO MAG				S55		
ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL		MAG CENTRO	GUIALIVA	BAJO MAG
PRELIMINARES				**$ 192.378.600,00**			**$ 183.358.000,00**			**$ 167.582.000,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	106877,00	$ 1.800,00	$ 192.378.600,00	91679,00	$ 2.000,00	$ 183.358.000,00	83791,00	$ 2.000,00	$ 167.582.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA				**$ 203.110.000,00**			**$ 179.413.000,00**			**$ 113.588.000,00**		**$ 563.400,00**	**$ -**	**$ -**
AFIRMADO	M3	345	$ 90.000,00	$ 31.050.000,00	336	$ 115.000,00	$ 38.640.000,00	131	$ 200.000,00	$ 26.200.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	245	$ 225.000,00	$ 55.125.000,00	175	$ 255.000,00	$ 44.625.000,00	87	$ 225.000,00	$ 19.575.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	140	$ 90.000,00	$ 12.600.000,00	100	$ 85.000,00	$ 8.500.000,00	50	$ 90.000,00	$ 4.500.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	761	$ 75.000,00	$ 57.075.000,00	615	$ 78.000,00	$ 47.970.000,00	433	$ 75.000,00	$ 32.475.000,00	CANT	3,84	0	0
											$	$ 288.000,00	$ -	$ -
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1390	$ 34.000,00	$ 47.260.000,00	1167	$ 34.000,00	$ 39.678.000,00	907	$ 34.000,00	$ 30.838.000,00	CANT	8,1	0	0
											$	$ 275.400,00	$ -	$ -
MANTENIMIENTO RASANTE				**$ 8.034.762.500,00**			**$ 5.181.768.000,00**			**$ 4.931.491.000,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	2341	$ 260.000,00	$ 608.660.000,00	1896	$ 260.000,00	$ 492.960.000,00	1342	$ 265.000,00	$ 355.630.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	35109	$ 31.000,00	$ 1.088.379.000,00	28440	$ 31.000,00	$ 881.640.000,00	20128	$ 35.000,00	$ 704.480.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
ALCANTARILLAS				**$ 2.075.227.500,00**			**$ 1.638.073.600,00**			**$ 1.101.892.000,00**		**$ 7.671.020,00**	**$ 550.000,00**	**$ -**
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	150	$ 850.000,00	$ 127.500.000,00	107	$ 1.000.000,00	$ 107.000.000,00	54	$ 1.100.000,00	$ 59.400.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	94	$ 1.080.000,00	$ 101.520.000,00	67	$ 1.100.000,00	$ 73.700.000,00	34	$ 1.300.000,00	$ 44.200.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	139	$ 610.000,00	$ 84.790.000,00	99	$ 630.000,00	$ 62.370.000,00	50	$ 800.000,00	$ 40.000.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	29459	$ 9.500,00	$ 279.860.500,00	21042	$ 9.300,00	$ 195.690.600,00	10521	$ 11.000,00	$ 115.731.000,00	CANT	578,66	0	0
											$	$ 5.497.270,00	$ -	$ -
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	369	$ 90.000,00	$ 33.210.000,00	263	$ 135.000,00	$ 35.505.000,00	132	$ 228.000,00	$ 30.096.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	140	$ 1.000.000,00	$ 140.000.000,00	100	$ 1.020.000,00	$ 102.000.000,00	50	$ 1.105.000,00	$ 55.250.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	29880	$ 42.000,00	$ 1.254.960.000,00	24204	$ 42.000,00	$ 1.016.568.000,00	17130	$ 42.000,00	$ 719.460.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	20	$ 965.000,00	$ 19.300.000,00	16	$ 965.000,00	$ 15.440.000,00	11	$ 955.000,00	$ 10.505.000,00	CANT	0,75	0	0
											$	$ 723.750,00	$ -	$ -
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	29	$ 290.000,00	$ 8.410.000,00	20	$ 275.000,00	$ 5.500.000,00	10	$ 295.000,00	$ 2.950.000,00	CANT	5	2	0
											$	$ 1.450.000,00	550000	$ -
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100	$ 3.170,00	$ 25.677.000,00	8100	$ 3.000,00	$ 24.300.000,00	8100	$ 3.000,00	$ 24.300.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
MUROS				**$ 218.476.000,00**			**$ 214.267.000,00**			**$ 230.125.000,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	57	$ 930.000,00	$ 53.010.000,00	53	$ 1.000.000,00	$ 53.000.000,00	49	$ 1.000.000,00	$ 49.000.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -

		MAG CENTRO			GUIALIVA			BAJO MAG				S55		
ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL		MAG CENTRO	GUIALIVA	BAJO MAG
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	57	$ 1.050.000,00	$ 59.850.000,00	53	$ 1.100.000,00	$ 58.300.000,00	49	$ 1.250.000,00	$ 61.250.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	10	$ 600.000,00	$ 6.000.000,00	9	$ 630.000,00	$ 5.670.000,00	8	$ 800.000,00	$ 6.400.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	158	$ 92.000,00	$ 14.536.000,00	145	$ 140.000,00	$ 20.300.000,00	135	$ 215.000,00	$ 29.025.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	10	$ 125.000,00	$ 1.250.000,00	9	$ 200.000,00	$ 1.800.000,00	8	$ 290.000,00	$ 2.320.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	139	$ 16.000,00	$ 2.224.000,00	128	$ 16.000,00	$ 2.048.000,00	119	$ 15.000,00	$ 1.785.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	82	$ 54.000,00	$ 4.428.000,00	75	$ 54.000,00	$ 4.050.000,00	70	$ 58.000,00	$ 4.060.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8124	$ 9.500,00	$ 77.178.000,00	7430	$ 9.300,00	$ 69.099.000,00	6935	$ 11.000,00	$ 76.285.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
ITEMS NO PREVISTOS												**$ -**	**$ -**	**$ 13.680.000,00**
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO			$ 57.000,00									0	0	240
												$ -	$ -	$ 13.680.000,00
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE			$ 1.674,00									0	0	0
												$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN POLIETILENO DIAMETRO 36"			$ 1.151.523,00									0	0	0
												$ -	$ -	$ -
TOTAL X PROVINCIA				**$ 10.723.954.600,00**			**$ 7.396.879.600,00**			**$ 6.544.678.000,00**		**$ 8.234.420,00**	**$ 550.000,00**	**$ 13.680.000,00**
CARACTERIZACIÓN	$ 2.502.924.222,00													
PMT	$ 333.650.000,00											$ 256.194,13	$ 24.808,77	$ 697.411,24
PAGA	$ 526.868.177,00											$ 404.557,28	$ 39.175,64	$ 974.405,03
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	$ 192.000.000,00													
TOTAL OBRA	**$ 28.220.954.599,00**											**$ 24.860.972,09**		

REPORTE DE LLUVIAS

	PROYECTO: LOTE 4: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	

CONTRATO No.: ICCU-141 de 2025	**PERIODO:** DEL 01 AL 07 MAYO DEL 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI

CONTROL DE LLUVIAS PROVINCIA DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA - MAYO 2026

PROVINCIA	MUNICIPIO	FECHA	HORARIO		CANTIDAD HORAS LLUVIA	OBSERVACION
			INICIAL	FINAL		
BAJO MAGDALENA	CAPARRAPI					
		TOTAL HORAS LLUVIAS CAPARRAPI			0:00:00	
	PUERTO SALGAR				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS PTO SALGAR			0:00:00	
TOTAL LLUVIAS BAJO MAGDALENA					0:00:00	
GUALIVA	ALBAN	4/5/2026	2:30 p.m.	3:30 p.m.	01:00:00	Luvia Moderada
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS ALBAN			1:00:00	
	QUEBRADA-NEGRA				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS QUEBRADANEGRA			0:00:00	
	SAN FRANCISCO				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS SAN FRANCISCO			0:00:00	
	SASAIMA				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS SASAIMA			0:00:00	
TOTAL LLUVIAS GUALIVA					1:00:00	
MAGDALENA CENTRO	BELTRAN				00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS BELTRAN			0:00:00	
	BITUIMA				00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS BITUIMA			0:00:00	
	PULI				00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS PULI			0:00:00	
	SAN JUAN DE RIOSECO	4/5/2026	11:00 a.m.	12:00 p.m.	01:00:00	Luvia Moderada
		TOTAL HORAS LLUVIAS SAN JUAN DE RIOSECO			1:00:00	
	GUAYABAL DE SIQUIMA	4/5/2026	2:30 p.m.	4:30 p.m.	02:00:00	Luvia Moderada
		TOTAL HORAS LLUVIAS GUAYABAL			2:00:00	
	VIANI	4:00 p.m.	2:30 p.m.	3:00 p.m.	00:30:00	Lluvia ligera
		4:00 p.m.	4:00 p.m.	5:00 p.m.	01:00:00	Luvia Moderada
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS VIANI			0:30:00	
TOTAL LLUVIAS MAGDALENA CENTRO					3:30:00	
TOTAL LLUVIAS TRAMOS CONTRATO No.: ICCU-141 de 2025					4:30:00	

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
NOMBRE : ANIBAL CASTRO

RESIDENTE INTERVENTORIA
NOMBRE : ALIDA GUERRA MONTAÑEZ
