	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 22 de mayo de 2026	SEMANA No.	57	DEL	15-may-26	AL	21-may-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipios de Caparrapí, Puerto Salgar, Alban, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Beltrán, Bituima, Pulí, San Juan de Rioseco, Guayabal de Síquima, Vianí.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	Contrato ICCU-221 de 2025	**CONTRATO No.:**	Contrato de obra ICCU-141 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	10 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION PRORROGA1	30 de junio de 2026	**FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION PRORROGA1**	30 de junio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	447 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	447 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	407 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	407 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 28.220.954.599
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 28.220.954.599
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 28.220.954.599
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 8.466.286.380
SUPERVISOR:	ESTEFANIA HERNANDEZ VARGAS	**GESTOR OBRA:**	ESTEFANIA HERNANDEZ VARGAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

OBSERVACIONES

Mediante oficio ICCU-221-517 esta interventoría, emite concepto de aprobación a la **Programación de Obra Versión 7**, la cual incorpora 10 ítems no previstos (NP), asociados a actividades de obra y de señalización preventiva de los corredores viales.
Con base en lo anterior, se entienden como el cronograma vigente para efectos de seguimiento, control y medición de avance del contrato. Este aplica a partir del presente informe semanal 50-51

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Magdalena Bajo

Tramo No 1 CAPARRAPI

Continúa la construcción de alcantarilla en el K0+450, mediante armado de aceros de refuerzo y hormigonado de la placa de piso del encole y descole

Tramo No 2 Puerto Salgar

Construcción de cunetas y ventanas con material estabilizado (formula modificada cemento 5%) entre el K1+510 - K1+910 total a la fecha 16210 ml construcción de ventanas para evacuación de aguas.

Gualivá

Tramo No 3 Albán

Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

Tramo No 4 Quebrada Negra

Excavación mecánica para construcción de la cimentación superficial del muro de contención en el K0+920
Limpieza de alcantarillas en el K3+170

Tramo No 5 San Francisco

Continúa la excavación mecánica para la construcción de la cimentación superficial del muro de contención en el K1+720
Llega material pétreo para concreto (grava y arena de rio)

Tramo No 6 Sasaima

Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

Tramo No 7 Beltrán

Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

Magdalena Centro

Tramo No 8 Bituima

Construcción de la alcantarilla en el K9+630 encole y descole.

Tramo No 9 Pulí

Colocación de la capa doble riego con un avance en el K3+520 segunda capa.
Construcción de cunetas entre el K1+230 al K1+530 lado derecho

Tramo No 10 San Juan de Rioseco

Termina actividad de rocería de zonas laterales y continúa limpieza de alcantarillas K4+340 y K6+990

Tramo No 11 Guayabal de Síquima

Construcción de alcantarilla K0+090 y K0+830 mediante actividad de excavación mecánica y manual armado de aceros de refuerzo para encole y descole y el hormigonado de las placas de piso.

Tramo No 12 Vianí

Adecuación de cunetas, a la fecha la fresadora en reparación y no a llegado otro equipo para continuar con la estabilización de la rasante. (llegó el motor al frente de obra y esta en proceso de montaje)

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	Caracterización y ejecución	10-abr-25	30-jun-26	447	10-abr-25	30-jun-26	447	0	0
	Topografía	10-abr-25	24-may-25	45	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Ensayos de laboratorio	10-abr-25	24-ago-25	137	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Informes de suelos y pavimentos	10-abr-25	31-ago-25	144	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Ejecución de obra	26-jul-25	30-jun-26	340	28-jul-25		ejecución	-2	ejecución
	Explanación y excavaciones	26-jul-25	18-oct-25	85	11-ago-25		ejecución	-16	ejecución
	Estructura de pavimento	27-oct-25	20-dic-25	55	30-oct-25		ejecución	-3	ejecución
	De acuerdo a la ruta crítica las actividades implican un atraso en el contrato son: Topografía y ensayos de laboratorio.								

Plazo del proyecto: 447 días

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 22 de mayo de 2026	SEMANA No.	57	DEL	15-may-26	AL	21-may-26

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	49,23%	37,66%	-11,57%
Durante el periodo	7,09%	0,27%	-6,83%
Acumulado Actual	56,32%	37,93%	-18,40%

AVANCE CARACTERIZACION

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	90,55%	88,80%	-1,75%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	90,55%	88,80%	-1,75%


AVANCE OBRA

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	45,35%	32,55%	-12,80%
Durante el periodo	7,78%	0,29%	-7,49%
Acumulado Actual	53,13%	32,84%	-20,29%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
447 días	407,00	40	-82,23

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

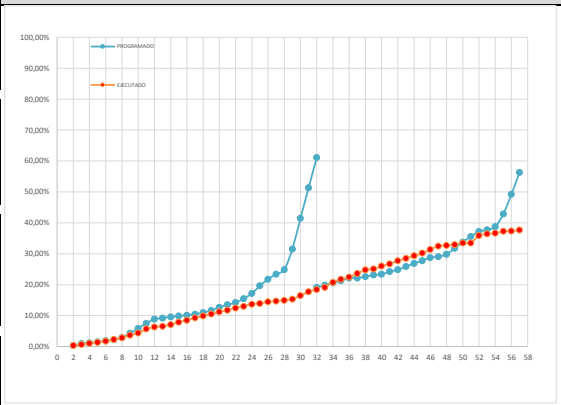

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 13.893.114.318	$ 10.628.352.407	77%
Durante el periodo	$ 2.001.970.808	$ 75.414.160	4%
Acumulado Actual	$ 15.895.085.126	$ 10.703.766.567	67%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-33%	-$	5.191.318.559

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 7.358.662.242	$ 7.091.761.246	
Durante el periodo	$ 1.107.624.138	$ 1.374.025.133	
Acumulado Actual	$ 8.466.286.380	$ 8.465.786.379	

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

1.El 14 de mayo de 2026, la Interventoría remite al Contratista de obra oficio ICCU-221-557 dando respuesta al comunicado ICCU-141-436 en relación con la revisión del informe ambiental No 13 V1, remitiendo observaciones.
2.El 14 de mayo de 2026, el Contratista de obra remite oficio ICCU-141-450 dando respuesta al comunicado de Interventoría ICCU-221-557 adjuntando el informe ambiental No 13 V2
3.El 14 de mayo de 2026, la Interventoría remite al Contratista de obra oficio ICCU-221-562 dando respuesta al comunicado ICCU-141-450 en relación con el informe ambiental No 13 V2, dando concepto de aprobación.
4.El 15 de mayo de 2026, el Contratista de obra, remite oficio ICCU-141-451 dando respuesta al oficio ICCU-221-549 presentando la gestión adelantada con el manejo de los RCD en el Tramo 08 Bituima.
5.El 16 de mayo de 2026, la Interventoría remite oficio ICCU-221-564 dando respuesta al comunicado ICCU-141-451 en relación con la gestión de los RCD del Tramo 08 Bituima, solicitando información de complemento.
6.La Interventoría elabora y remite el informe mensual ambiental de Interventoría No 13 al ICCU.
7.Seguimiento ambiental en obra:

Tramo 2 Puerto Salgar
Se realiza seguimiento a las actividades de estabilización, se realiza recolección de residuos.

Tramo 3 Albán
En la obra el Contratista realiza la demarcación de la obra
Se realiza manejo del material de construcción en acopio.

Tramo 4 Quebrada Negra
Se realiza manejo del material generado por las actividades de limpieza de obras de drenaje.
Se ubicó acopio temporal de materiales de construcción y se realizó la demarcación correspondiente.

Tramo 5 San Francisco
Se realiza el manejo de material generado por las actividades de limpieza

Tramo 6 – Sasaima
Se realiza demarcación de las áreas de intervención de la obra.
Se realiza mantenimiento a la demarcación del acopio de materiales.
Se realiza manejo de materiales de construcción.

Tramo 7 Beltrán
Se realiza manejo de residuos sólidos ordinarios, recolectándolos en las canecas del punto ecológico
Se mantiene la demarcación al acopio de materiales de construcción y RCD
Se realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de obra

Tramo 8 Bituima
El Contratista de obra realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de trabajo.
Se realiza demarcación del acopio temporal de materiales y acopio de RCD.
El Contratista de obra realiza retiro de RCD.

Tramo 10 San Juan de Rio Seco
El Contratista de obra realiza el manejo del material generado por las actividades de limpieza de las obras de drenaje.
Se realiza manejo del material generado por las actividades de rocería.
Se instala señalización de aproximación

Tramo 11 Guayabal
El Contratista de obra realiza manejo de los residuos generados por las actividades de limpieza.
El Contratista de obra, ubica punto de acopio temporal de materiales.

Tramo 12 Viani
El Contratista realiza manejo del material generado por las actividades de obra
El Contratista realizó actividades de orden y aseo.
El Contratista de obra, realiza manejo de los materiales de construcción en acopio.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 11 de mayo de 2026 se solicito al contratista la elaboración y envío de la convocatoria y presentación para la reunión a realizar en San Juan de Rioseco programada para el 27 de mayo de 2026. Por lo que se revisó y aprobó el volante de convocatoria para la reunión en mención.

Se revisó y aprobó el volante informativo para el cierre en el tramo de Bituima

Se revisó y firmo el acta PAGA de los meses marzo y abril.

Se revisó y aprobó el informe mensual social del mes de abril de 2026, mediante la comunicación ICCU-221-561 del 14 de mayo de 2026.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 22 de mayo de 2026	SEMANA No.	57	DEL	15-may-26	AL	21-may-26

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Gestión en los tramos de: Puerto Salgar, Quebradanegra, Dan Francisco, Sasaima, Beltrán, Bituima, Pulí , San Juan y Viani

REPORTE DE PERSONAL EN OBRA

Viernes, 15 de MAYO de 2026		Sabado, 16 de MAYO de 2026		Lunes, 18 de MAYO de 2026		Martes, 19 de MAYO de 2026		Miercoles, 20 de MAYO de 2026		Jueves, 21 de MAYO de 2026	
Operativos	53	Operativos	53	Operativos	57	Operativos	57	Operativos	57	Operativos	57
Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9
Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10
Ingresos	0	Ingresos	4	Ingresos	0	Ingresos	0	Ingresos	0	Ingresos	0
Retiros	0	Retiros	0	Retiros	0	Retiros	0	Retiros	0	Retiros	0
Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0
Subcontratado	7	Subcontratado	7	Subcontratado	7	Subcontratado	7	Subcontratado	7	Subcontratado	7
Total	79	Total	83	Total	83	Total	83	Total	83	Total	83

Se remite respuesta a comunicado ICCU-141-449 del 14 de mayo de 2026 – Aprobación de informe SST 13 del 1 al 30 de abril de 2026- contratista, mediante el comunicado ICCU-221-563 del 15 de mayo de 2026.
Para la semana del 15 al 21 de mayo de 2026, hay un total de 83 trabajadores activos de los cuales 60 promedio son operativos y 19 administrativos (9 en campo y 10 en Bogotá), se presentó 4 novedad de ingreso y 0 retiros de personal, durante el transcurso de la semana no se presentan casos de accidentes de trabajo por parte del contratista.
Por parte de la interventoría se presenta reporte de un total de 22 trabajadores vinculados al contrato, adicionalmente a la fecha, no se han presentado casos de accidentes de trabajo.

REPORTE DE NOVEDADES E INCIDENTES / OBSERVACIONES

No se han presentado casos de accidentes de trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El seguimiento de calidad para las obras de construcción de alcantarillas, muros de contención, limpieza de alcantarillas, rocería y estabilización de la rasante en vías terciarias se realiza de acuerdo con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS y a los lineamientos de interventoría aplicados por el ICCU, garantizando el cumplimiento de los criterios técnicos, estructurales, hidráulicos y ambientales. Este seguimiento se apoya en un Plan de Inspección y Ensayos que permite verificar, de manera sistemática, la calidad de los materiales, los procesos constructivos y la correcta ejecución de cada actividad antes de su aceptación.

Para las alcantarillas y muros de contención, el control de calidad se enfoca en la verificación del diseño, alineación, cotas, pendientes y dimensiones, así como en la correcta ejecución de cimentaciones y drenajes. Se realizan ensayos de materiales (suelos, concretos y acero de refuerzo) donde aplique por tipo de obra, para controlar la compactación de rellenos y confirmar que las estructuras cumplan con las tolerancias y resistencias mínimas exigidas por el INVIAS, asegurando su estabilidad estructural y adecuado funcionamiento hidráulico.

En cuanto a la limpieza de alcantarillas y la rocería, el seguimiento de calidad se garantiza con la remoción total de sedimentos, residuos y vegetación que afecten el libre flujo del agua y la correcta ejecución de las obras. Estas actividades se ejecutan bajo criterios de manejo ambiental, dejando las áreas intervenidas en condiciones óptimas para la operación del drenaje y la posterior estabilización de la vía, con soporte documental mediante registros fotográficos.

Para la estabilización de la rasante con químico no convencional más cemento al 3 %, el control de calidad incluye los ensayos previos de caracterización del suelo, verificación de la dosificación y homogeneidad de la mezcla, control de la humedad y compactación según las especificaciones del proyecto, y ensayos de resistencia que confirmen la mejora de las propiedades mecánicas del suelo. El seguimiento adecuado de estas actividades asegura una rasante estable, durable y conforme a las normas vigentes, contribuyendo a la vida útil y desempeño estructural de la vía terciaria.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

La interventoría, en el seguimiento a la programación presentada por el contratista y a las visitas técnicas realizadas en obra, evidencia bajo rendimiento en la construcción de cunetas en el tramo de puerto Salgar por lo que se requiere al contratista mejorar estos rendimientos en obra a la fecha continúan los bajos rendimientos en esta actividad una vez que dan inicio a las actividades de cunetas en el tramo de Pulí.

Igualmente, con el fin de continuar el control, seguimiento y aseguramiento de la calidad de las obras, la interventoría solicita que el contratista presente y mantenga actualizada una programación semanal detallada, en la cual se identifiquen claramente los frentes activos, actividades a ejecutar, personal asignado, rendimientos esperados y metas de avance. Esta programación deberá ser socializada y validada con la interventoría, constituyéndose en una herramienta fundamental para la toma de decisiones, el control del avance físico y la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad exigidos contractualmente.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La interventoría reconoce una mejora progresiva en la calidad de los trabajos terminados en los diferentes frentes de obra; no obstante, reitera que es responsabilidad directa del contratista, a través de sus residentes de obra, velar de manera permanente porque las formaletas, moldes y demás elementos utilizados en el vaciado de concretos cumplan con un estándar de alta calidad, garantizando estabilidad, alineación, hermeticidad y adecuada resistencia durante el proceso de fundida.

El adecuado estado y correcta instalación de las formaletas es un proceso determinante para garantizar acabados homogéneos, dimensiones conforme a diseño, superficies sin segregaciones ni vacíos, y una correcta conformación de aristas y juntas. En este sentido, la interventoría enfatiza que previo a cada vaciado de concreto se debe verificar la limpieza, nivelación, rigidez y ajuste de las formaletas, así como la correcta ubicación del acero de refuerzo y de los elementos embebidos, con el fin de prevenir reprocesos y garantizar la durabilidad y calidad estructural de las obras ejecutadas.

Igualmente, se recuerda al contratista que el control de calidad no se limita al resultado final, sino que debe integrarse a todo el proceso constructivo, siendo indispensable la supervisión técnica continua por parte de los residentes, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las normas vigentes y las buenas prácticas de ingeniería en cada uno de los frentes de trabajo.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Velar por los correctos acabados de las obras hidráulicas y muros de contención en todos los tramos al igual que buenas prácticas ingenieriles en los procesos constructivos.	CONTRATISTA	INMEDIATO
Instalación de vallas informativas en los tramos de: Guayabal, San Juan de Río Seco, San francisco, Queda negra y Caparrapí		
Revisar formaletas ya onduladas para hacer su respectivo cambio.		
Velar porque la apertura de nuevos frentes de trabajo cumplan con el PMT		
Disponer en sitios autorizados los RCD provenientes de las excavaciones y demoliciones generales de obra.		
Contratación de nuevo personal para los frentes activos y los que se vayan a iniciar previo a la entrega de dotación completa a los trabajadores que vayan a iniciar actividades de obra.		

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 22 de mayo de 2026	SEMANA No.	57	DEL	15-may-26	AL	21-may-26

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

De acuerdo a visita de obra en el tramo de Vianí se observa flujos de agua subterránea en las zonas laterales de la vía que requieren manejo de aguas con filtro en las abscisas: K02+485 a K02+620 (135 m costado izquierdo) K02+480 a K02+530, (50 m costado derecho) K02+995 a K03+085 (90 m) costado izquierdo igualmente en el 1. Del K3+310 al K3+530 CD Long 120 ml 2. Del K3+480 al K3+490 C.D log 10 ml, Del K3+600 al K3+660 C.I Long 60 ml. A pesar que no se presentado lluvias en el tramo, se evidencia la presencia continua corrientes leves de agua que afectan directamente los tramos de estabilización intervenidos.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Como interventoría, y de acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades de rocería, limpieza de alcantarillas existentes, conformación de la rasante y procesos previos de estabilización, se evidencia que los frentes de obra cuentan con las condiciones técnicas mínimas para dar continuidad a la ejecución del proyecto, en concordancia con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS y los lineamientos aplicables del ICCU. Los trabajos ejecutados han permitido liberar las zonas de intervención, mejorar las condiciones de drenaje superficial y preparar la subrasante para la construcción de obras hidráulicas.

En este sentido, y considerando la importancia de garantizar la funcionalidad hidráulica y la estabilidad de la vía, esta interventoría solicita dar inicio a la construcción de las alcantarillas proyectadas en los tramos correspondientes a los municipios de Sasaima y Bituima, primero para cumplir con la programación aprobada y segundo priorizar aquellos puntos críticos identificados en campo. Dichas actividades deberán ejecutarse conforme a los diseños aprobados, asegurando el control dimensional, la correcta alineación y pendiente, así como la calidad de los materiales y la compactación de rellenos, de acuerdo con la normativa vigente del INVIAS.

Se recalca que el inicio de estas obras deberá estar acompañado de un control de calidad permanente, incluyendo registros en bitácora, ensayos de materiales y verificaciones previas al cierre de cada frente de trabajo. La correcta y oportuna construcción de las alcantarillas es importante para la durabilidad de la estabilización de la rasante y para el adecuado manejo de las aguas, mitigando riesgos de erosión, socavación y deterioro prematuro de la vía en los tramos intervenidos.

Se da apertura de otro frente de trabajo (Caparrapí) con ello se tienen 12 frentes activos aunque algunos están en espera de inicio de la actividad de estabilización de la rasante. Lo cual permite avanzar en la ejecución general de obra, pero se le recuerda al contratista la importancia de estar pendiente de las fechas de inicio y fin de cada actividad acorde a la programación presentada ya que algunas actividades presentan atrasos en las fechas de inicio o fin.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

TRAMO VIAL No. 12 - VIANÍ CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



Fecha: DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en el tramo CAPARRAPI en las abscisa K0+450 con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO # 8 - BITUIMA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



Fecha: DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en el tramo BITUIMA en las abscisa K11+630 con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO # 11 - GUAYABAL DE SIQUIMA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



Fecha: DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en el tramo GUAYABAL DE SIQUIMA en las abscisa K0+090 Y K0+830 con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO VIAL No. 2 - PUERTO SALGAR CONSTRUCCIÓN CUNETAS ZONA LATERAL



Fecha: DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS en el tramo PUERTO SALGAR en las abscisa K1+990 LADO DERECHO, con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO VIAL No. 9 - PULÍ CONSTRUCCIÓN CUNETAS ZONA LATERAL

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 22 de mayo de 2026	SEMANA No.	57	DEL	15-may-26	AL	21-may-26

TRAMO VIAL No. 9 - PULI CONSTRUCCION CUNETAS ZONA LATERAL







Fecha: DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS en el tramo PUERTO SALGAR en las abscisa K1+440 - K1+500 LADO DERECHO, con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO VIAL No. 9 - PULÍ COLOCACIÓN CAPA DOBLE RIEGO







Fecha: DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de COLOCACIÓN CAPA DOBLE RIEGO en el tramo PULÍ en la abscisa K3+050 PRIMERA CAPA, con ello se pretende mejorar significativamente la resistencia al deslizamiento entre las llantas del vehículo y la superficie de rasante de la vía estabilizada.

TRAMO VIAL No. 5 - SAN FRANCISCO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN







Fecha: DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN en el tramo SAN FRANCISCO en las abscisa K1+720 LADO DERECHO, con ello se pretende retener los movimientos horizontales de tierra en el sector intervenido.

TRAMO VIAL No. 10 - TRAMO DE SAN JUAN DE RIO SECO - ROCERÍA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS








Fecha: DEL 9 DE MAYO AL 14 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de ROCERÍA Y LIMPIEZA DE ALCATARILLAS en el tramo de QUEBRADA NEGRA en las abscisa k4+920, con ello se pretende mejorar significativamente las zonas laterales de la vía y brindar mejor visibilidad a los actores viales.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

CUADRO DE INVERSION

Semana	Periodo		Costo Prorroga 1	Costo acumulado	% Programado	% Prog. Acum.	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	% Eject. Acum.	Avance/Atraso
1	10/4/2025	24/4/2025	$ 16.868.250,00	$ 16.868.250,00	0,06%	0,06%	$ 91.439.797,00	$ 91.439.797,00	0,32%	0,32%	0,26%
2	25/4/2025	1/5/2025	$ 68.449.370,01	$ 85.317.620,01	0,24%	0,30%	$ 81.159.080,00	$ 172.598.877,00	0,29%	0,61%	0,31%
3	2/5/2025	8/5/2025	$ 191.161.301,70	$ 276.478.921,71	0,68%	0,98%	$ 127.185.537,00	$ 299.784.414,00	0,45%	1,06%	0,08%
4	9/5/2025	15/5/2025	$ 63.125.743,41	$ 339.604.665,12	0,22%	1,20%	$ 71.817.843,00	$ 371.602.257,00	0,25%	1,32%	0,11%
5	16/5/2025	22/5/2025	$ 82.294.717,24	$ 421.899.382,36	0,29%	1,49%	$ 103.759.840,00	$ 475.362.097,00	0,37%	1,68%	0,19%
6	23/5/2025	29/5/2025	$ 101.343.461,40	$ 523.242.843,76	0,36%	1,85%	$ 167.233.472,00	$ 642.595.569,00	0,59%	2,28%	0,42%
7	30/5/2025	5/6/2025	$ 89.414.402,25	$ 612.657.246,01	0,32%	2,17%	$ 140.511.071,00	$ 783.106.640,00	0,50%	2,77%	0,60%
8	6/6/2025	12/6/2025	$ 204.167.602,60	$ 816.824.848,61	0,72%	2,89%	$ 261.452.674,00	$ 1.044.559.314,00	0,93%	3,70%	0,81%
9	13/6/2025	19/6/2025	$ 384.922.388,00	$ 1.201.747.236,61	1,36%	4,26%	$ 190.646.493,00	$ 1.235.205.807,00	0,68%	4,38%	0,12%
10	20/6/2025	26/6/2025	$ 448.579.069,60	$ 1.650.326.306,21	1,59%	5,85%	$ 364.396.781,00	$ 1.599.602.588,00	1,29%	5,67%	-0,18%
11	27/6/2025	3/7/2025	$ 459.489.054,00	$ 2.109.815.360,21	1,63%	7,48%	$ 175.955.572,00	$ 1.775.558.160,00	0,62%	6,29%	-1,18%
12	4/7/2025	10/7/2025	$ 393.108.861,80	$ 2.502.924.222,01	1,39%	8,87%	$ 64.787.310,00	$ 1.840.345.470,00	0,23%	6,52%	-2,35%
13	11/7/2025	17/7/2025	$ 95.606.262,36	$ 2.613.605.379,21	0,39%	9,26%	$ 161.933.333,33	$ 2.002.278.803,33	0,57%	7,10%	-2,17%
14	18/7/2025	24/7/2025	$ 110.681.157,20	$ 2.681.335.670,25	0,24%	9,50%	$ 221.879.026,67	$ 2.224.157.830,00	0,79%	7,88%	-1,62%
15	25/7/2025	31/7/2025	$ 67.730.291,04	$ 2.765.998.534,05	0,30%	9,80%	$ 167.151.410,24	$ 2.391.309.240,24	0,59%	8,47%	-1,33%
16	1/8/2025	7/8/2025	$ 84.662.863,80	$ 2.850.661.397,85	0,30%	10,10%	$ 213.671.312,72	$ 2.604.980.552,96	0,76%	9,23%	-0,87%
17	8/8/2025	14/8/2025	$ 86.918.043,89	$ 2.937.579.441,74	0,31%	10,41%	$ 176.002.745,70	$ 2.780.983.298,66	0,62%	9,85%	-0,55%
18	15/8/2025	21/8/2025	$ 149.431.743,90	$ 3.087.011.185,64	0,53%	10,94%	$ 173.032.639,80	$ 2.954.015.938,46	0,61%	10,47%	-0,47%
19	22/8/2025	28/8/2025	$ 201.840.043,00	$ 3.288.851.228,64	0,72%	11,65%	$ 203.012.304,48	$ 3.157.028.242,94	0,72%	11,19%	-0,47%
20	29/8/2025	4/9/2025	$ 269.707.194,30	$ 3.558.558.422,94	0,96%	12,61%	$ 150.237.157,00	$ 3.307.265.399,94	0,53%	11,72%	-0,89%
21	5/9/2025	11/9/2025	$ 246.173.261,80	$ 3.804.731.684,74	0,87%	13,48%	$ 204.936.373,01	$ 3.512.201.772,95	0,73%	12,45%	-1,04%
22	12/9/2025	18/9/2025	$ 193.053.246,90	$ 3.997.784.931,64	0,68%	14,17%	$ 160.045.700,36	$ 3.672.247.473,31	0,57%	13,01%	-1,15%
23	19/9/2025	25/9/2025	$ 357.637.844,90	$ 4.355.422.776,54	1,27%	15,43%	$ 192.513.940,91	$ 3.864.761.414,22	0,68%	13,69%	-1,74%
24	26/9/2025	2/10/2025	$ 473.856.126,20	$ 4.829.278.902,74	1,68%	17,11%	$ 69.018.337,10	$ 3.933.779.751,32	0,24%	13,94%	-3,17%
25	3/10/2025	9/10/2025	$ 699.857.151,20	$ 5.529.136.053,94	2,48%	19,59%	$ 143.100.230,36	$ 4.076.879.981,67	0,51%	14,45%	-5,15%
26	10/10/2025	16/10/2025	$ 602.671.319,90	$ 6.131.807.373,84	2,14%	21,73%	$ 70.185.829,64	$ 4.147.065.811,32	0,25%	14,69%	-7,03%
27	17/10/2025	23/10/2025	$ 465.564.507,40	$ 6.597.371.881,24	1,65%	23,38%	$ 72.608.062,60	$ 4.219.673.873,92	0,26%	14,95%	-8,43%
28	24/10/2025	30/10/2025	$ 413.777.200,20	$ 7.011.149.081,44	1,47%	24,84%	$ 109.641.713,36	$ 4.329.315.587,27	0,39%	15,34%	-9,50%
29	31/10/2025	6/11/2025	$ 1.885.899.453,00	$ 8.897.048.534,44	6,68%	31,53%	$ 327.495.481,74	$ 4.656.811.069,02	1,16%	16,50%	-15,03%
30	7/11/2025	13/11/2025	$ 2.803.528.856,00	$ 11.700.577.390,44	9,93%	41,46%	$ 337.699.228,90	$ 4.994.510.297,92	1,20%	17,70%	-23,76%
31	14/11/2025	20/11/2025	$ 2.767.011.783,00	$ 14.467.589.173,44	9,80%	51,27%	$ 208.617.682,49	$ 5.203.127.980,41	0,74%	18,44%	-32,83%
32	21/11/2025	27/11/2025	$ 2.761.779.440,00	$ 17.229.368.613,44	9,79%	61,05%	$ 187.790.939,87	$ 5.390.918.920,28	0,67%	19,10%	-41,95%
Reprogramacion de obra de acuerdo a la prorroga no.1											
33	28/11/2025	4/12/2025	$ 208.841.471,90	$ 5.599.760.392,18	0,74%	19,84%	$ 468.296.372,77	$ 5.859.215.293,05	1,66%	20,76%	0,92%
34	5/12/2025	11/12/2025	$ 215.609.758,32	$ 5.815.370.150,50	0,76%	20,61%	$ 272.991.495,58	$ 6.132.206.788,62	0,97%	21,73%	1,12%
35	12/12/2025	18/12/2025	$ 192.356.787,14	$ 6.007.726.937,64	0,68%	21,29%	$ 209.046.355,70	$ 6.341.253.144,32	0,74%	22,47%	1,18%

Semana	Periodo		Costo Prorroga 1	Costo acumulado	% Programado	% Prog. Acum.	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	% Eject. Acum.	Avance/Atraso
36	19/12/2025	25/12/2025	$ 243.724.112,09	$ 6.251.451.049,73	0,86%	22,15%	$ 318.983.485,78	$ 6.660.236.630,11	1,13%	23,60%	1,45%
37	26/12/2025	1/1/2026	$ -	$ 6.251.451.049,73	0,00%	22,15%	$ 324.152.822,62	$ 6.984.389.452,73	1,15%	24,75%	2,60%
38	2/1/2026	8/1/2026	$ 135.511.631,63	$ 6.386.962.681,36	0,48%	22,63%	$ 94.582.720,82	$ 7.078.972.173,55	0,34%	25,08%	2,45%
39	9/1/2026	15/1/2026	$ 135.626.494,97	$ 6.522.589.176,33	0,48%	23,11%	$ 254.099.984,49	$ 7.333.072.158,03	0,90%	25,98%	2,87%
40	16/1/2026	22/1/2026	$ 73.709.185,19	$ 6.596.298.361,52	0,26%	23,37%	$ 215.549.921,95	$ 7.548.622.079,99	0,76%	26,75%	3,37%
41	23/1/2026	29/1/2026	$ 235.403.863,69	$ 6.831.702.225,21	0,83%	24,21%	$ 274.665.074,76	$ 7.823.287.154,75	0,97%	27,72%	3,51%
42	30/1/2026	5/2/2026	$ 182.299.169,51	$ 7.014.001.394,72	0,65%	24,85%	$ 216.841.751,08	$ 8.040.128.905,84	0,77%	28,49%	3,64%
43	6/2/2026	12/2/2026	$ 278.665.526,53	$ 7.292.666.921,25	0,99%	25,84%	$ 242.803.600,00	$ 8.282.932.505,84	0,86%	29,35%	3,51%
44	13/2/2026	19/2/2026	$ 298.105.984,59	$ 7.590.772.905,84	1,06%	26,90%	$ 232.252.064,64	$ 8.515.184.570,48	0,82%	30,17%	3,28%
45	20/2/2026	26/2/2026	$ 224.174.524,49	$ 7.814.947.430,33	0,79%	27,69%	$ 338.506.694,54	$ 8.853.691.265,02	1,20%	31,37%	3,68%
46	27/2/2026	5/3/2026	$ 294.849.650,77	$ 8.109.797.081,10	1,04%	28,74%	$ 306.891.010,11	$ 9.160.582.275,13	1,09%	32,46%	3,72%
47	6/3/2026	12/3/2026	$ 84.791.068,43	$ 8.194.588.149,53	0,30%	29,04%	$ 61.739.747,46	$ 9.222.322.022,59	0,22%	32,68%	3,64%
48	13/3/2026	19/3/2026	$ 217.098.782,78	$ 8.411.686.932,31	0,77%	29,81%	$ 79.731.352,59	$ 9.302.053.375,18	0,28%	32,96%	3,15%
49	20/3/2026	26/3/2026	$ 551.465.363,70	$ 8.963.152.296,01	1,95%	31,76%	$ 147.852.714,37	$ 9.449.906.089,55	0,52%	33,49%	1,72%
50	27/3/2026	2/4/2026	$ 564.111.304,90	$ 9.527.263.600,91	2,00%	33,76%	$ -	$ 9.449.906.089,55	0,00%	33,49%	-0,27%
51	3/4/2026	9/4/2026	$ 516.217.665,22	$ 10.043.481.266,13	1,83%	35,59%	$ 674.335.151,23	$ 10.124.241.240,79	2,39%	35,87%	0,29%
52	10/4/2026	16/4/2026	$ 445.993.519,23	$ 10.489.474.785,36	1,58%	37,17%	$ 149.353.300,45	$ 10.273.594.541,24	0,53%	36,40%	-0,76%
53	17/4/2026	23/4/2026	$ 168.318.493,01	$ 10.657.793.278,37	0,60%	37,77%	$ 71.713.577,73	$ 10.345.308.118,97	0,25%	36,66%	-1,11%
54	24/4/2026	30/4/2026	$ 266.759.629,06	$ 10.924.552.907,43	0,95%	38,71%	$ 163.179.928,46	$ 10.508.488.047,43	0,58%	37,24%	-1,47%
55	1/5/2026	7/5/2026	$ 1.177.484.921,29	$ 12.102.037.828,72	4,17%	42,88%	$ 24.860.972,09	$ 10.533.349.019,51	0,09%	37,32%	-5,56%
56	8/5/2026	14/5/2026	$ 1.791.076.488,91	$ 13.893.114.317,63	6,35%	49,23%	$ 95.003.387,53	$ 10.628.352.407,04	0,34%	37,66%	-11,57%
57	15/5/2026	21/5/2026	$ 2.001.970.807,87	$ 15.895.085.125,50	7,09%	56,32%	$ 75.414.159,71	$ 10.703.766.566,75	0,27%	37,93%	-18,40%
58	22/5/2026	28/5/2026	$ 1.951.889.870,71	$ 17.846.974.996,21	6,92%	63,24%					
59	29/5/2026	4/6/2026	$ 2.116.271.984,50	$ 19.963.246.980,71	7,50%	70,74%					
60	5/6/2026	11/6/2026	$ 2.290.511.135,64	$ 22.253.758.116,35	8,12%	78,86%					
61	12/6/2026	18/6/2026	$ 2.513.792.052,05	$ 24.767.550.168,40	8,91%	87,76%					
62	19/6/2026	25/6/2026	$ 1.300.603.051,26	$ 26.068.153.219,66	4,61%	92,37%					
63	26/6/2026	30/6/2026	$ 2.152.801.379,28	$ 28.220.954.598,94	7,63%	100,00%					

CUADRO SEGUIMIENTO DE OBRA POR PROVINCIA

		MAG CENTRO			GUIALIVA			BAJO MAG				S57		
ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL		MAG CENTRO	GUIALIVA	BAJO MAG
PRELIMINARES				**$ 192.378.600,00**			**$ 183.358.000,00**			**$ 167.582.000,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	106877,00	$ 1.800,00	$ 192.378.600,00	91679,00	$ 2.000,00	$ 183.358.000,00	83791,00	$ 2.000,00	$ 167.582.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA				**$ 203.110.000,00**			**$ 179.413.000,00**			**$ 113.588.000,00**		**$ 8.916.600,00**	**$ 3.312.960,00**	**$ 1.417.500,00**
AFIRMADO	M3	345	$ 90.000,00	$ 31.050.000,00	336	$ 115.000,00	$ 38.640.000,00	131	$ 200.000,00	$ 26.200.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	245	$ 225.000,00	$ 55.125.000,00	175	$ 255.000,00	$ 44.625.000,00	87	$ 225.000,00	$ 19.575.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	140	$ 90.000,00	$ 12.600.000,00	100	$ 85.000,00	$ 8.500.000,00	50	$ 90.000,00	$ 4.500.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	761	$ 75.000,00	$ 57.075.000,00	615	$ 78.000,00	$ 47.970.000,00	433	$ 75.000,00	$ 32.475.000,00	CANT	82,44	0	18,9
											$	$ 6.183.000,00	$ -	$ 1.417.500,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1390	$ 34.000,00	$ 47.260.000,00	1167	$ 34.000,00	$ 39.678.000,00	907	$ 34.000,00	$ 30.838.000,00	CANT	80,4	97,44	0
											$	$ 2.733.600,00	$ 3.312.960,00	$ -
MANTENIMIENTO RASANTE				**$ 8.034.762.500,00**			**$ 5.181.768.000,00**			**$ 4.931.491.000,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	2341	$ 260.000,00	$ 608.660.000,00	1896	$ 260.000,00	$ 492.960.000,00	1342	$ 265.000,00	$ 355.630.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	35109	$ 31.000,00	$ 1.088.379.000,00	28440	$ 31.000,00	$ 881.640.000,00	20128	$ 35.000,00	$ 704.480.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
ALCANTARILLAS				**$ 2.075.227.500,00**			**$ 1.638.073.600,00**			**$ 1.101.892.000,00**		**$ 32.290.600,00**	**$ 1.022.850,00**	**$ -**
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	150	$ 850.000,00	$ 127.500.000,00	107	$ 1.000.000,00	$ 107.000.000,00	54	$ 1.100.000,00	$ 59.400.000,00	CANT	0,81	0	0
											$	$ 688.500,00	$ -	$ -
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	94	$ 1.080.000,00	$ 101.520.000,00	67	$ 1.100.000,00	$ 73.700.000,00	34	$ 1.300.000,00	$ 44.200.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	139	$ 610.000,00	$ 84.790.000,00	99	$ 630.000,00	$ 62.370.000,00	50	$ 800.000,00	$ 40.000.000,00	CANT	5,91	0	0
											$	$ 3.605.100,00	$ -	$ -
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	29459	$ 9.500,00	$ 279.860.500,00	21042	$ 9.300,00	$ 195.690.600,00	10521	$ 11.000,00	$ 115.731.000,00	CANT	686	0	0
											$	$ 6.517.000,00	$ -	$ -
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	369	$ 90.000,00	$ 33.210.000,00	263	$ 135.000,00	$ 35.505.000,00	132	$ 228.000,00	$ 30.096.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	140	$ 1.000.000,00	$ 140.000.000,00	100	$ 1.020.000,00	$ 102.000.000,00	50	$ 1.105.000,00	$ 55.250.000,00	CANT	18	0	0
											$	$ 18.000.000,00	$ -	$ -
CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	29880	$ 42.000,00	$ 1.254.960.000,00	24204	$ 42.000,00	$ 1.016.568.000,00	17130	$ 42.000,00	$ 719.460.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	20	$ 965.000,00	$ 19.300.000,00	16	$ 965.000,00	$ 15.440.000,00	11	$ 955.000,00	$ 10.505.000,00	CANT	0	0,49	0
											$	$ -	$ 472.850,00	$ -
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	29	$ 290.000,00	$ 8.410.000,00	20	$ 275.000,00	$ 5.500.000,00	10	$ 295.000,00	$ 2.950.000,00	CANT	12	2	0
											$	$ 3.480.000,00	$ 550.000,00	$ -
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA	M2	8100	$ 3.170,00	$ 25.677.000,00	8100	$ 3.000,00	$ 24.300.000,00	8100	$ 3.000,00	$ 24.300.000,00	CANT	0	0	0

		MAG CENTRO			GUIALIVA			BAJO MAG				S57		
ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL		MAG CENTRO	GUIALIVA	BAJO MAG
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100	$ 3.170,00	$ 25.677.000,00	8100	$ 3.000,00	$ 24.300.000,00	8100	$ 3.000,00	$ 24.300.000,00	$	$ -	$ -	$ -
MUROS				**$ 218.476.000,00**			**$ 214.267.000,00**			**$ 230.125.000,00**		**$ 7.770.240,00**	**$ 2.646.000,00**	**$ -**
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	57	$ 930.000,00	$ 53.010.000,00	53	$ 1.000.000,00	$ 53.000.000,00	49	$ 1.000.000,00	$ 49.000.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	57	$ 1.050.000,00	$ 59.850.000,00	53	$ 1.100.000,00	$ 58.300.000,00	49	$ 1.250.000,00	$ 61.250.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	10	$ 600.000,00	$ 6.000.000,00	9	$ 630.000,00	$ 5.670.000,00	8	$ 800.000,00	$ 6.400.000,00	CANT	0	4,2	0
											$	$ -	$ 2.646.000,00	$ -
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	158	$ 92.000,00	$ 14.536.000,00	145	$ 140.000,00	$ 20.300.000,00	135	$ 215.000,00	$ 29.025.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	10	$ 125.000,00	$ 1.250.000,00	9	$ 200.000,00	$ 1.800.000,00	8	$ 290.000,00	$ 2.320.000,00	CANT	27,36	0	0
											$	$ 3.420.000,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	139	$ 16.000,00	$ 2.224.000,00	128	$ 16.000,00	$ 2.048.000,00	119	$ 15.000,00	$ 1.785.000,00	CANT	15,39	0	0
											$	$ 246.240,00	$ -	$ -
TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	82	$ 54.000,00	$ 4.428.000,00	75	$ 54.000,00	$ 4.050.000,00	70	$ 58.000,00	$ 4.060.000,00	CANT	76	0	0
											$	$ 4.104.000,00	$ -	$ -
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8124	$ 9.500,00	$ 77.178.000,00	7430	$ 9.300,00	$ 69.099.000,00	6935	$ 11.000,00	$ 76.285.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
ITEMS NO PREVISTOS												**$ 7.410.000,00**	**$ -**	**$ 4.560.000,00**
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO			$ 57.000,00									130	0	80
												$ 7.410.000,00	$ -	$ 4.560.000,00
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE			$ 1.674,00									0	0	0
												$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN POLIETILENO DIAMETRO 36"			$ 1.151.523,00									0	0	0
												$ -	$ -	$ -
TOTAL X PROVINCIA				**$ 10.723.954.600,00**			**$ 7.396.879.600,00**			**$ 6.544.678.000,00**		**$ 56.387.440,00**	**$ 6.981.810,00**	**$ 5.977.500,00**
CARACTERIZACIÓN	$ 2.502.924.222,00													
PMT	$ 333.650.000,00											$ 1.754.359,29	$ 314.927,51	$ 304.735,06
PAGA	$ 526.868.177,00											$ 2.770.316,44	$ 497.303,42	$ 425.767,99
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	$ 192.000.000,00													
TOTAL OBRA	**$ 28.220.954.599,00**											**$ 75.414.159,71**		

REPORTE DE LLUVIAS

	PROYECTO: LOTE 4: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	

CONTRATO No.: ICCU-141 de 2025	**PERIODO:** DEL 15 AL 21 MAYO DEL 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI

CONTROL DE LLUVIAS PROVINCIA DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA - MAYO 2026

PROVINCIA	MUNICIPIO	FECHA	HORARIO		CANTIDAD HORAS LLUVIA	OBSERVACION
			INICIAL	FINAL		
BAJO MAGDALENA	CAPARRAPI					
		TOTAL HORAS LLUVIAS CAPARRAPI			0:00:00	
	PUERTO SALGAR				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS PTO SALGAR			0:00:00	
TOTAL LLUVIAS BAJO MAGDALENA					0:00:00	
GUALIVA	ALBAN				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS ALBAN			0:00:00	
	QUEBRADA-NEGRA				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS QUEBRADANEGRA			0:00:00	
	SAN FRANCISCO				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS SAN FRANCISCO			0:00:00	
	SASAIMA				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS SASAIMA			0:00:00	
TOTAL LLUVIAS GUALIVA					0:00:00	
MAGDALENA CENTRO	BELTRAN				00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS BELTRAN			0:00:00	
	BITUIMA				00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS BITUIMA			0:00:00	
	PULI				00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS PULI			0:00:00	
	SAN JUAN DE RIOSECO				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS SAN JUAN DE RIOSECO			0:00:00	
	GUAYABAL DE SIQUIMA				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS GUAYABAL			0:00:00	
	VIANI	8/5/2026	2:30 p.m.	5:00 p.m.	02:30:00	Luvia Fuerte
		9/5/2026	12:30 p.m.	3:00 p.m.	02:30:00	Luvia Moderada
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS VIANI			2:30:00	
TOTAL LLUVIAS MAGDALENA CENTRO					2:30:00	
TOTAL LLUVIAS TRAMOS CONTRATO No.: ICCU-141 de 2025					2:30:00	

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
NOMBRE : ANIBAL CASTRO

RESIDENTE INTERVENTORIA
NOMBRE : ALIDA GUERRA MONTAÑEZ
