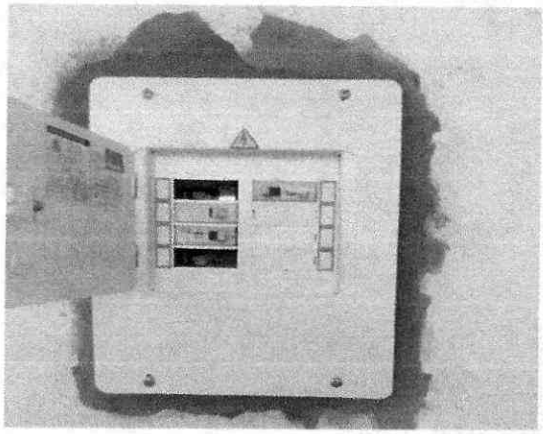
AREA COMUN

ITEMS	*ACTIVIDAD*	*CANTIDAD*	
1,4,1	*PRELIMINARES*	*EJECUTADO*	*%*
	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	*1 UND*	*100*
			
	OBSERVACIONES		
	SE INTALA TABLERO ELECTRICO.		

ITEMS	*ACTIVIDAD*	*CANTIDAD*	
1,4,2	*PRELIMINARES*	*EJECUTADO*	*%*
	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	*12,80 ML*	*100*
			
	OBSERVACIONES		
	SE REALIZAN LOS CORTES DE CONCRETO PARA LA PARTE DEL CARCAMO.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,4,3SE	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	0,24 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	SE DEMUELE EL PAIMENTO DEN LA ZONA DONDE VA IR EL CARCAMO.		


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,4,4	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	1,08 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	SE REALIZA LA EXCAVACION PARA EL CARCAMO		


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,4,5	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	1,30 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	SE FUNDE CARCAMO EN CONCRETO		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,4,6	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	43,05 KG	100
			
	OBSERVACIONES		
	SE INSTALA MALLA ELECTRO SOLDADA		


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,4,7	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SUMIDERO EN CONCRETO 0.40X0.40	15 UND	100

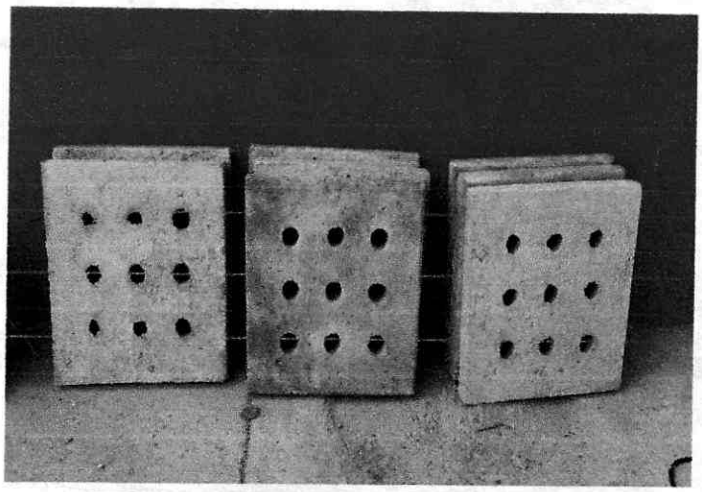


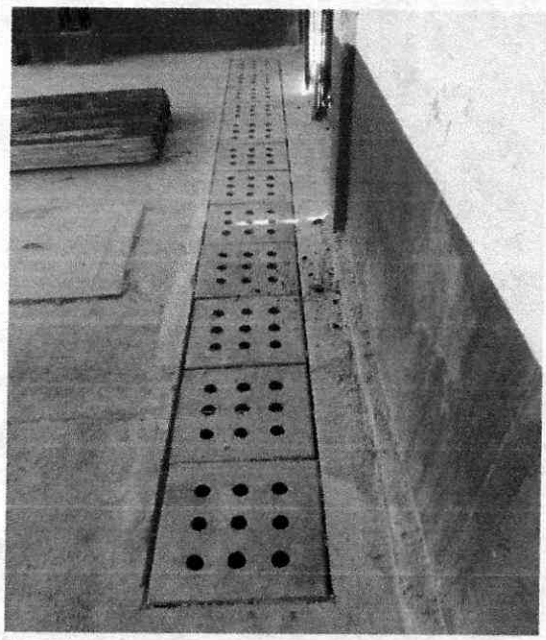

OBSERVACIONES
SE REALIZA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE RAJILLA DEL CARCAMO


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

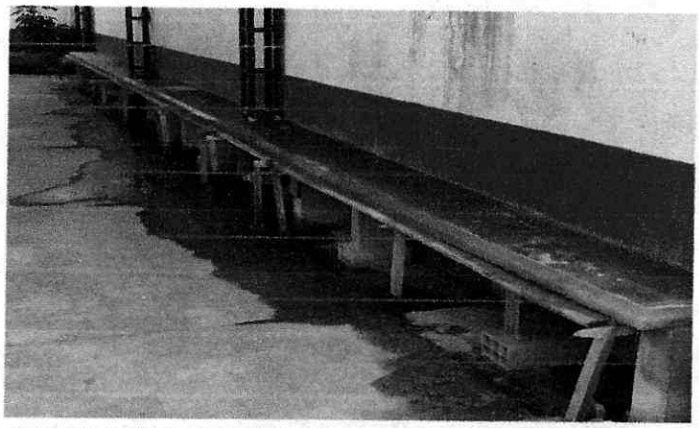ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,4,10	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7MPa(3000PSI)MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0,45 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	SE FUNDE PLACA PARA BANCA EN LA PARTE DE LA CUBIERTA DE LA ZONA COMUN.		

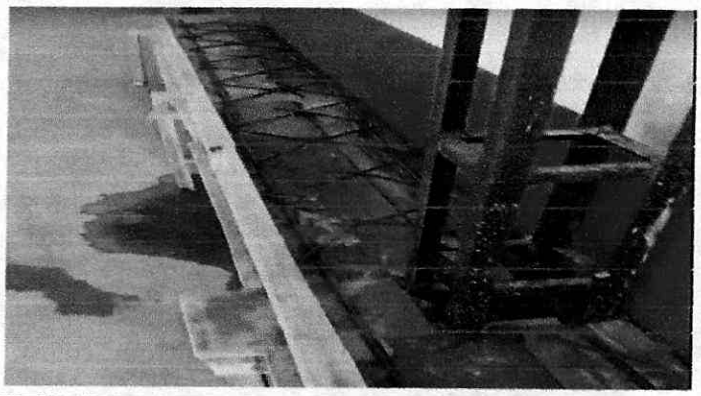ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,4,11	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200KG/CM2,G60)INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	59,40 KG	100
			
	OBSERVACIONES		
	SE COLOCA ACERO DE REFUERZO EN LA BANCA DE LA ZONA COMUN.		


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.5.1	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	9 M2	100

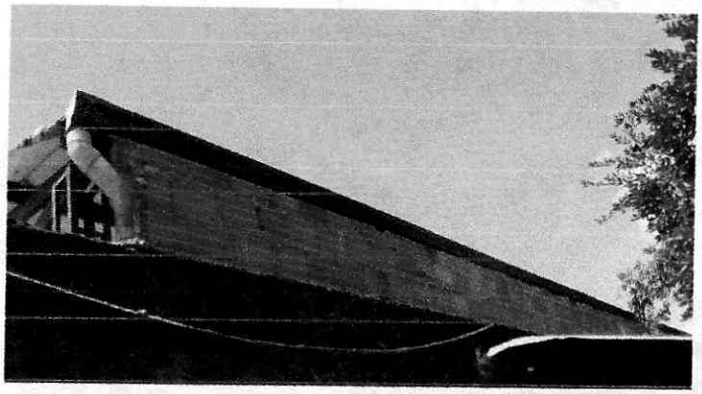

OBSERVACIONES
SE LEVANTA MURO EN BLOQUE EN LA ZONA LA CUBIERTA DE LA ZONA COMUN.


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.5.2	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTROY APLICACIÓN	18 M2	100

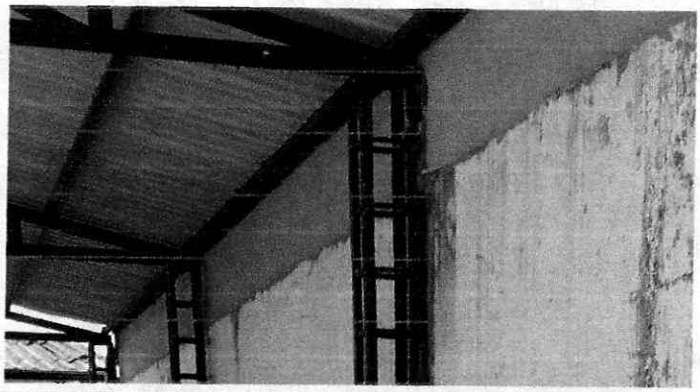


OBSERVACIONES
SE PAÑETA POR AMBOS COSTADOS EL MURO QUE SE LEVANTO EN LA PARTE DE LA CUBIERTA DE LA ZONA COMUN.


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEGRIA VIVIR
CUBIERTA METALICA

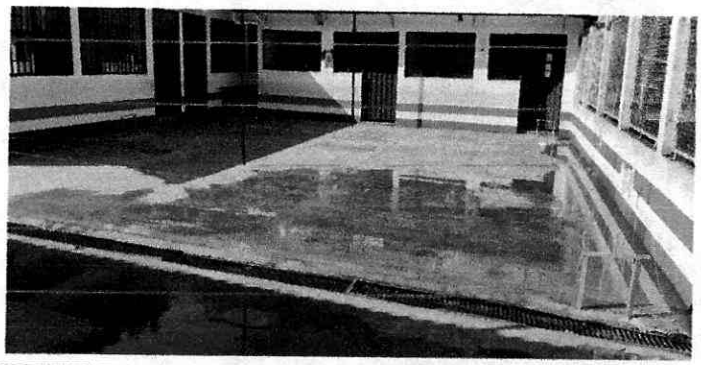ITEMS	*ACTIVIDAD*	*CANTIDAD*	
2.1.1	*PRELIMINARES*	*EJECUTADO*	*%*
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	*81 M2*	*100*
			
	OBSERVACIONES		
	SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO DONDE SE VA A INTALAR LA CUBIERTA		

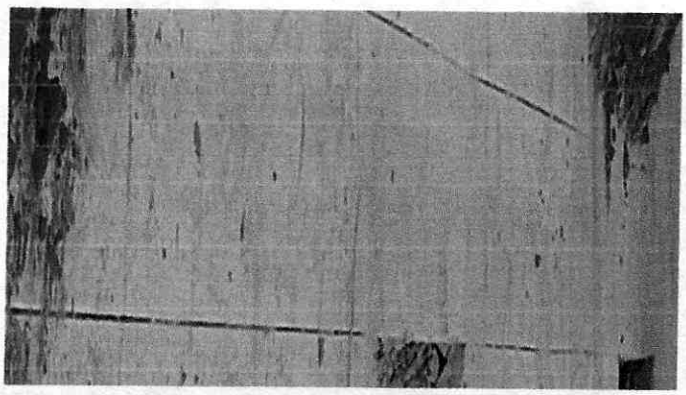ITEMS	*ACTIVIDAD*	*CANTIDAD*	
2.1.2	*PRELIMINARES*	*EJECUTADO*	*%*
	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	*83,80 ML*	*100*
			
	OBSERVACIONES		
	SE REALIZAN CORTES DE CONCRETO DE LIMITANDO DONDE VAN HA IR LAS VIGAS Y ZAPATAS		


~~NIT: 892099325-6~~
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

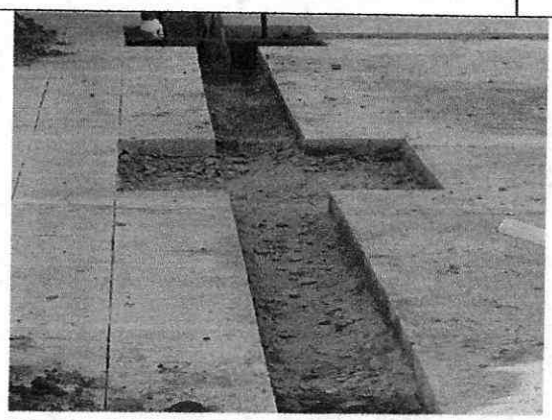
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1.3	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	2,25 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	SE REALIZA DEMOLICION DE PAIMENTO DONDE VAN LAS VIGAS Y ZAPATAS		

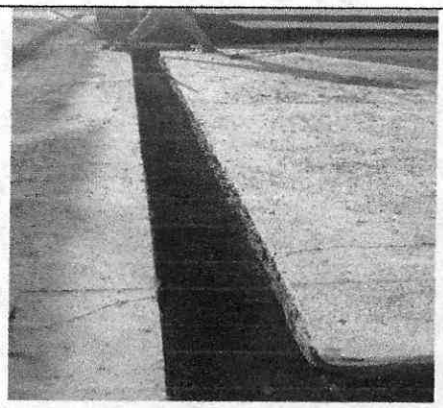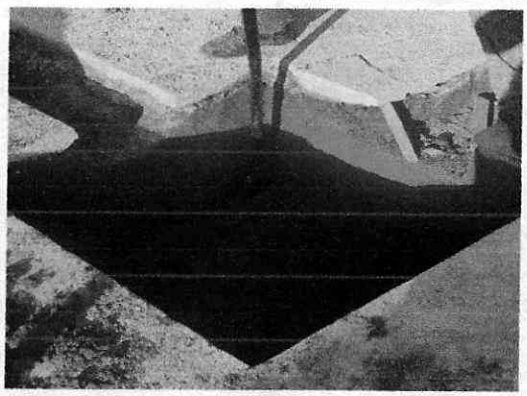ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1.4	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	9,89 M3	100
	 		
	OBSERVACIONES		
	SE REALIZAN LAS EXCAVACIONES PARA VIGAS Y ZAPATAS.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1.5	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	1,51 M3	100

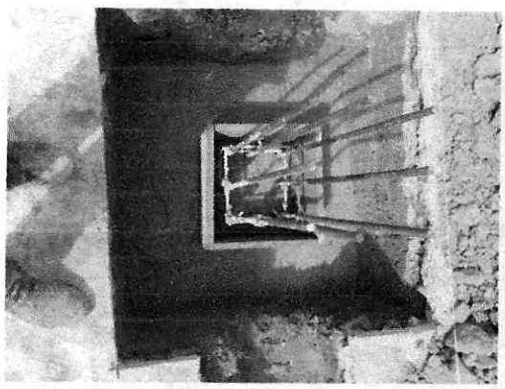

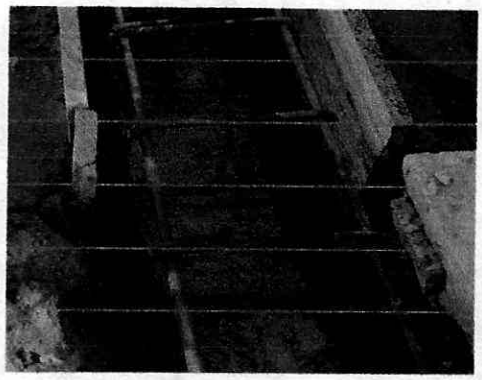


OBSERVACIONES
SE APLICA CONCRETO PARA SOLADO EN VIGAS Y ZAPATAS


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1.6	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1,80 M3	100

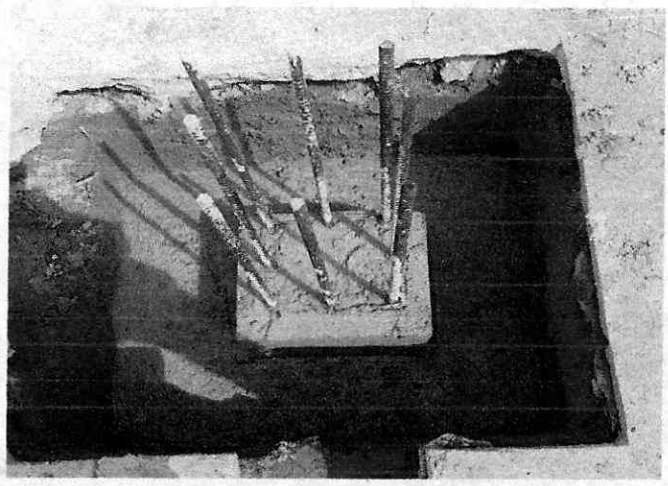

OBSERVACIONES
SE FUNDEN ZAPATAS Y PEDESTALES


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

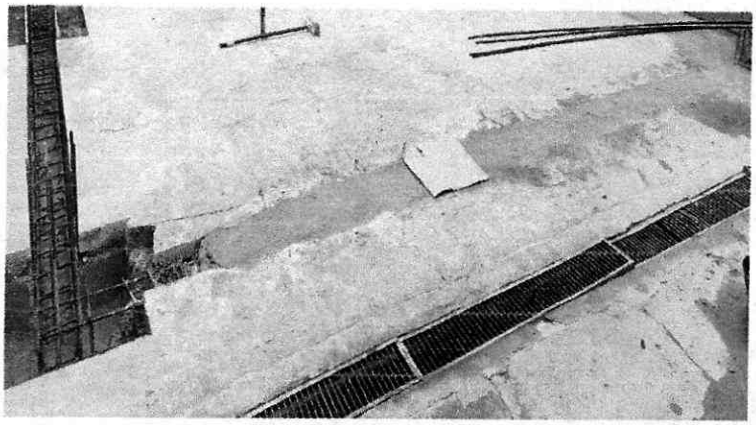
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1.7	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2,69 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	SE FUNDEN VIGAS DE CIMENTACION		

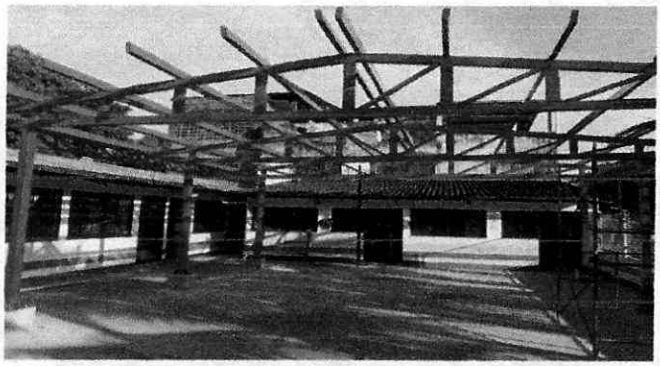ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1.8	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1268,74 KG	100
			
	OBSERVACIONES		
	SE INTALA CUBIERTA METALICA		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1.9	*PRELIMINARES*	*EJECUTADO*	*%*
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	*361,95 KG*	*100*

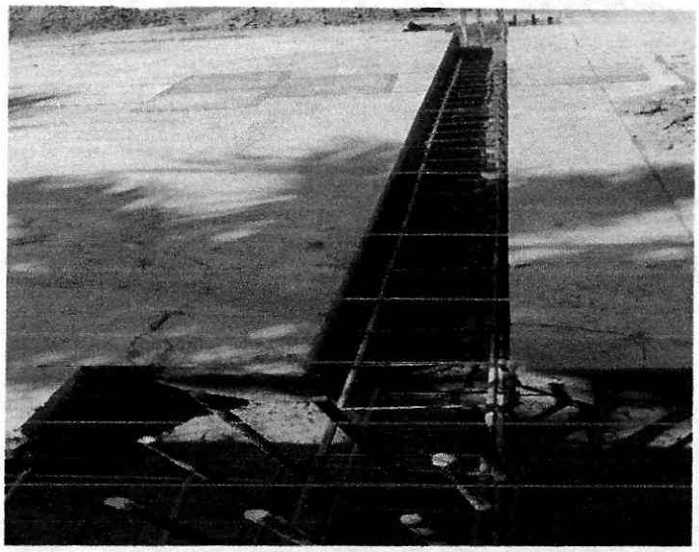

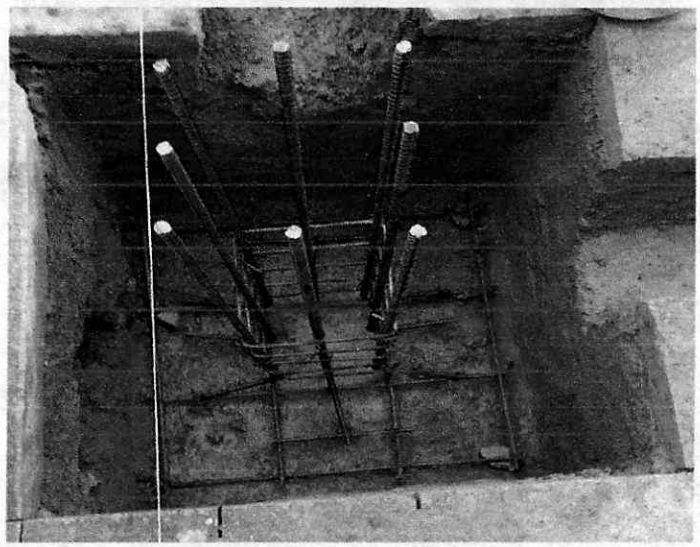


OBSERVACIONES

SE REALIZA EL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS Y COLUMNAS.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1.10	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	103,02 M2	100



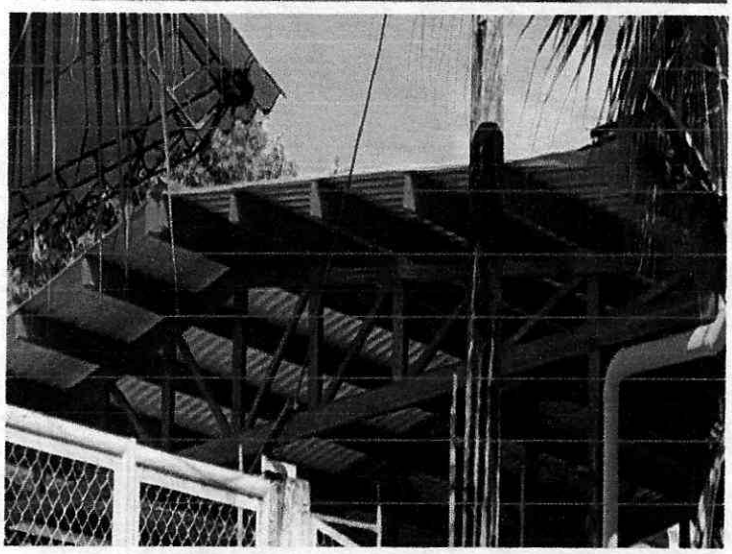

OBSERVACIONES
SE INTALA CUBIERTA ARQUITECTONICA EN LA ESTRUCTURA NUEVA DE ALEGRIA VIVIR.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co
