1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	97,50	100%
1.3.3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	1,50	100%
1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	15,00	100%
	ÍTEMS NO PREVISTOS			
NP 1.3.5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	51,04	100%
NP 1.3.7	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	51,04	100%
NP 1.3.9	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	100%
1.4	**AREA COMUN**			
1.4.1	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	100%
1.4.2	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	ML	12,80	100%
1.4.3	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,24	100%
1.4.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,08	100%
1.4.5	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,30	100%
1.4.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	43,05	100%
1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SUMIDERO EN CONCRETO 0.40X0.40	UND	15,00	100%
1.4.10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7MPa(3000PSI)MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,45	100%
1.4.11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200KG/CM2,G60)INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	59,40	100%
1.5	**ZONA CUBIERTA**			
1.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	9,00	100%
1.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTROY APLICACIÓN	M2	18,00	100%
	ÍTEMS NO PREVISTOS			
1.6	**BLOQUE C**			
NP 1.6.1	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYETRAS LADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	138,32	100%
NP 1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	138,32	100%

NP 1.6.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	15,20	100%
NP 1.6.4	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,70	100%
NP 1.6.5	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	9,00	100%
NP 1.6.6	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	68,60	100%
NP 1.6.7	RASPADO DE PINTURA	M2	80,66	100%
NP 1.6.8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	68,60	100%

Se realiza el cobro del 38.72% de la siguiente actividad contratada.

NP 1.3.6	RASPADO DE PINTURA	M2	47,00	38.72%

No se realiza el cobro de las actividades correspondientes a los siguientes ítems, debido al porcentaje que se debe dejar para la liquidación del contrato.

NP 1.1.8	RASPADO DE PINTURA	M2	140.23	0%
NP 1.1.10	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	172.08	0%
NP 1.3.8	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	191.69	0%
NP 1.6.9	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	355.49	0%

5.3.2 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALEGRIA DE VIVIR

Se realizó el 100% de las siguientes actividades contratadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% EJECUTADO
2	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEGRIA VIVIR (FACTOR ZONA 1.10)**			
2.1	**CUBIERTA METALICA**			
2.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	81,00	100%
2.1.2	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	ML	83,80	100%
2.1.3	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	2,25	100%
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,89	100%
2.1.5	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,51	100%

2.1.6	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,80	100%
2.1.7	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,69	100%
2.1.8	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1.558,93	100%
2.1.9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	361,95	100%
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	103,02	100%
2.1.11	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	20,00	100%
2.1.12	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15,60	100%
2.1.13	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	163,61	100%
2.1.14	PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD	UND	24,00	100%
2.1.15	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	12,00	100%


Quedando un saldo a favor del municipio de $ 1.056,00 pesos M/CTE.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO


INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE LA UNION

BLOQUE A

ACTIVIDAD	CANTIDAD
DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	105,46

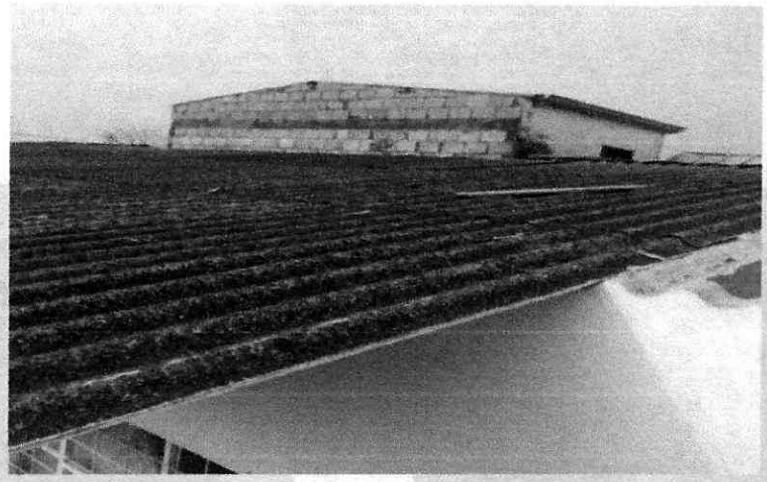


ACTIVIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	108,86

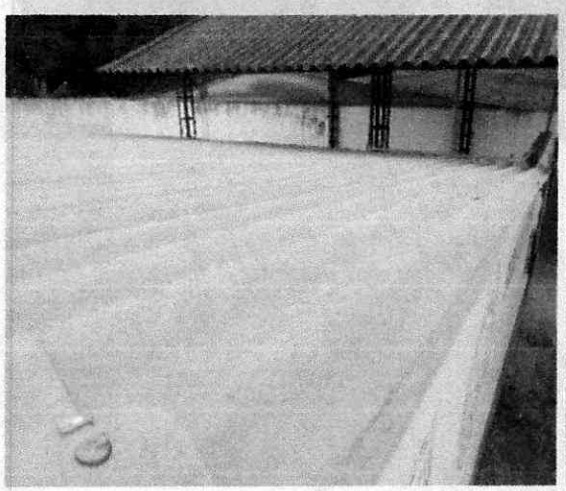



SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
901.539.430 - 7

ACTIVIDAD	CANTIDAD
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	16,50M2

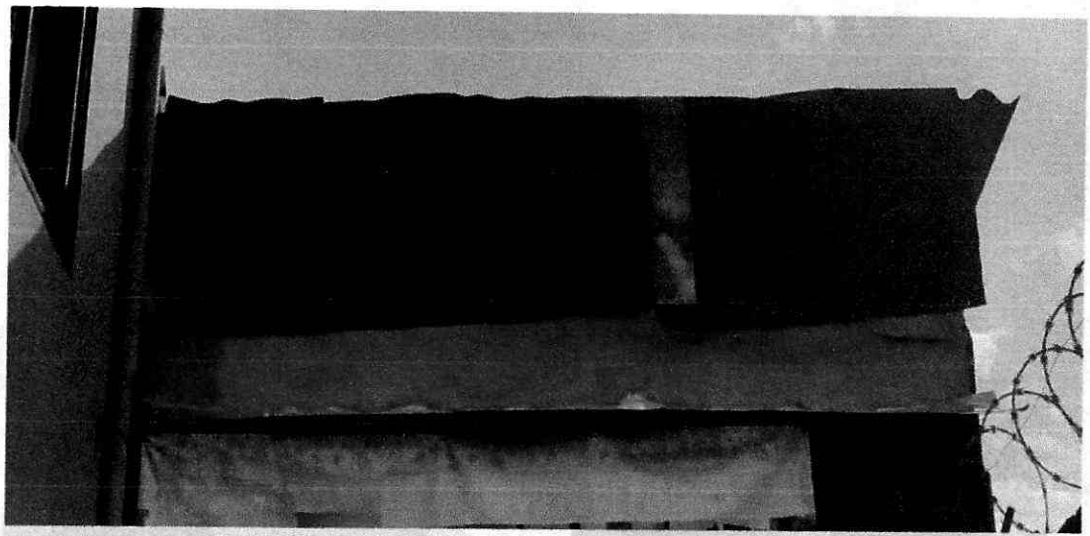

ACTIVIDAD	CANTIDAD
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	17.10 ML




Sjisuministrossas@gmail.com

Km 14 Via Acacias Vda Las Mercedes Finca Los Naranjitos

313 212 5961


SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
901.539.430 - 7

ACTIVIDAD	CANTIDAD
BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10 ML

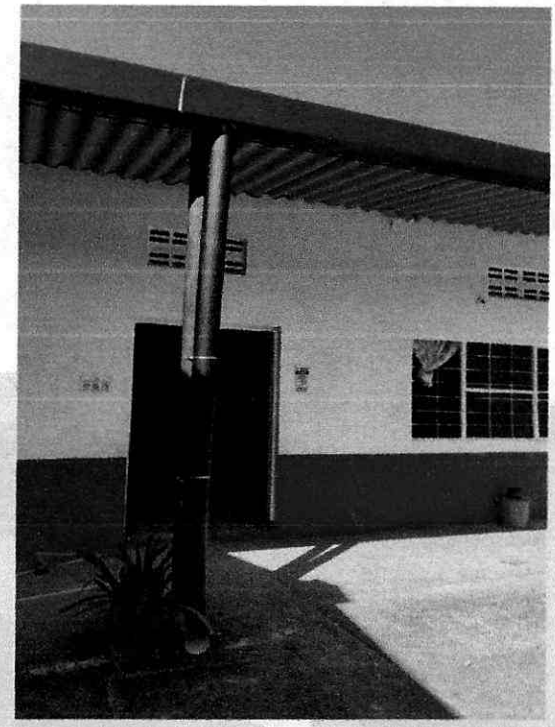

ITEM NO PREVISTOS

ACTIVIDAD	CANTIDAD
ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	6 UND

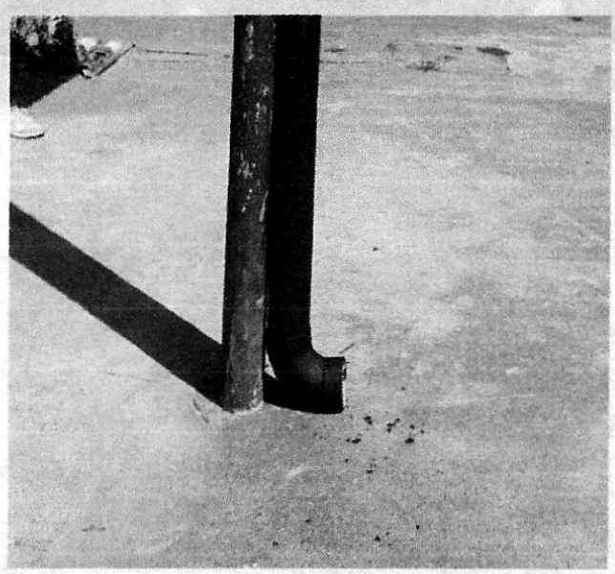


Sjisuministrossas@gmail.com

Km 14 Via Acacias Vda Las Mercedes Finca Los Naranjitos


313 212 5961

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
901.539.430 - 7

ACTIVIDAD	CANTIDAD
DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	66M2

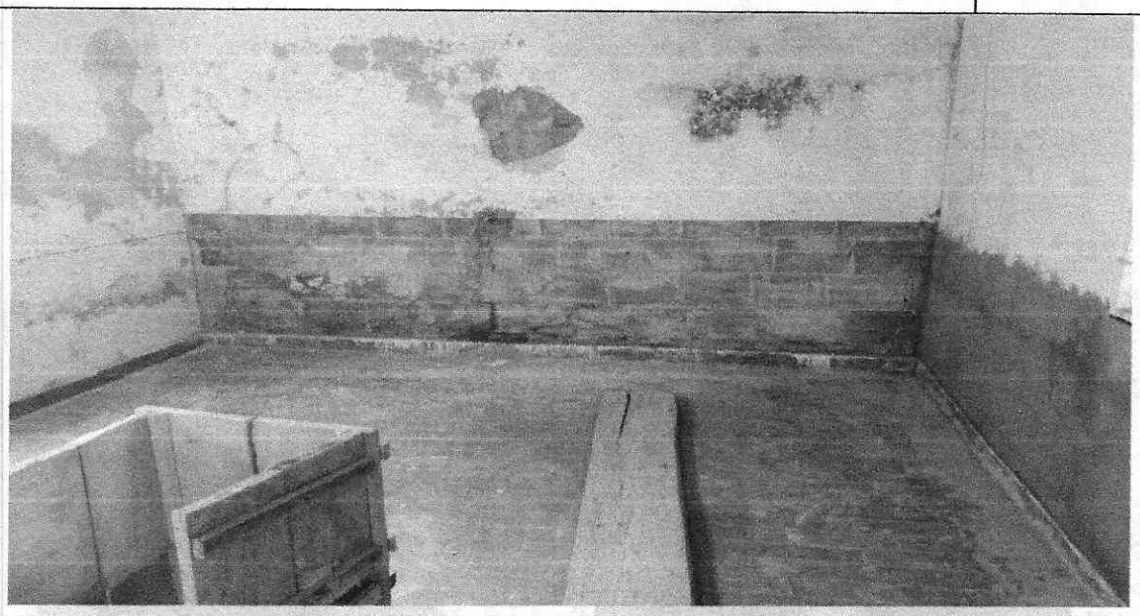

ACTIVIDAD	CANTIDAD
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	66M2

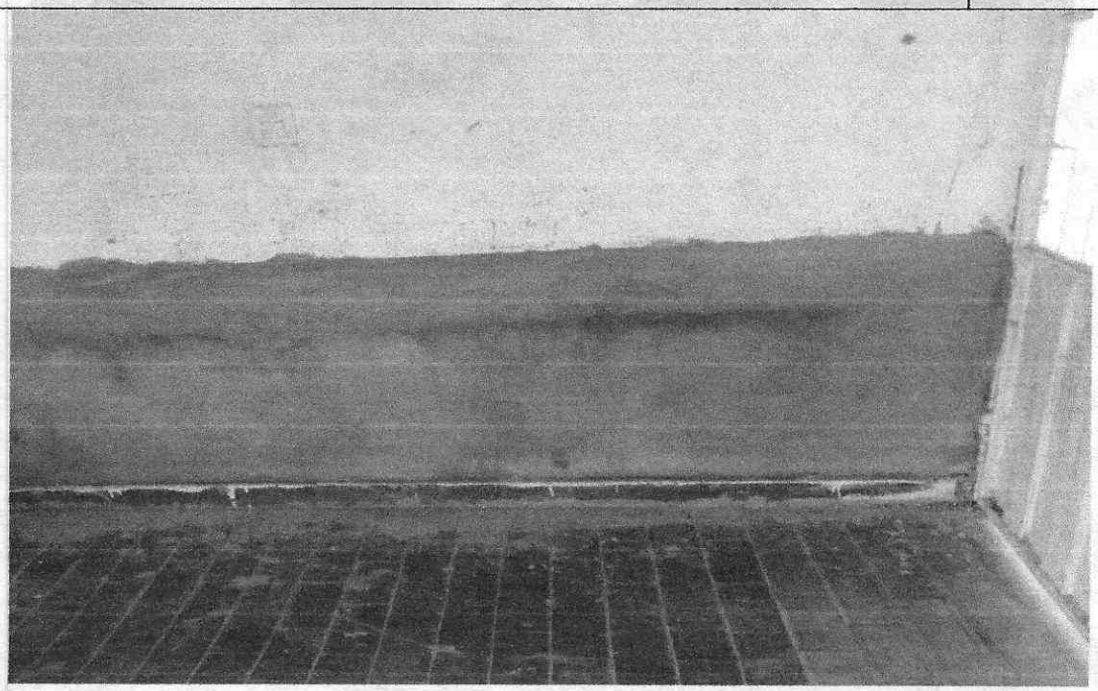

Sjisuministrossas@gmail.com

Km 14 Via Acacias Vda Las Mercedes Finca Los Naranjitos

313 212 5961

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
901.539.430 - 7

ZONA DE BAÑOS

ACTIVIDAD	CANTIDAD
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	7,20 M2





Sjisuministrossas@gmail.com

Km 14 Via Acacias Vda Las Mercedes Finca Los Naranjitos

313 212 5961

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
901.539.430 - 7

ACTIVIDAD	CANTIDAD
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTROY APLICACIÓN	14,40 M2





Sjisuministrossas@gmail.com


Km 14 Via Acacias Vda Las Mercedes Finca Los Naranjitos

313 212 5961

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
901.539.430 - 7

BLOQUE B

ACTIVIDAD	CANTIDAD
DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYETRAS LADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	***93 M2***

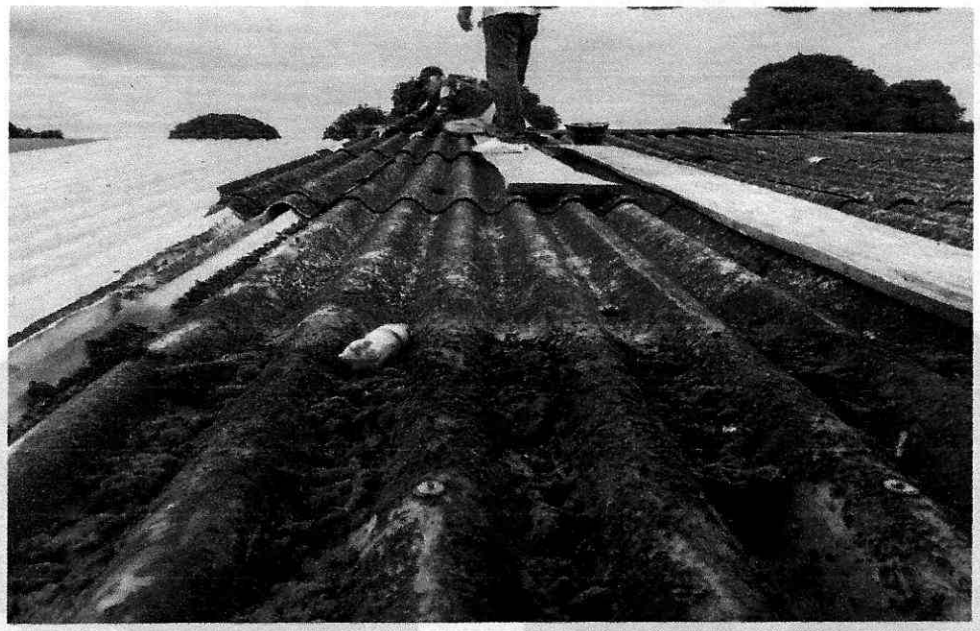

ACTIVIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÒN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	***97,50 M2***



Sjisuministrossas@gmail.com

Km 14 Via Acacias Vda Las Mercedes Finca Los Naranjitos

313 212 5961

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
901.539.430 - 7

ACTIVIDAD	CANTIDAD
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	1,5 M2



ACTIVIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	15 ML



Sjisuministrossas@gmail.com


Km 14 Via Acacias Vda Las Mercedes Finca Los Naranjitos

313 212 5961

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
901.539.430 - 7

ITEM NO PREVISTOS

ACTIVIDAD	CANTIDAD
DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	51,04M2

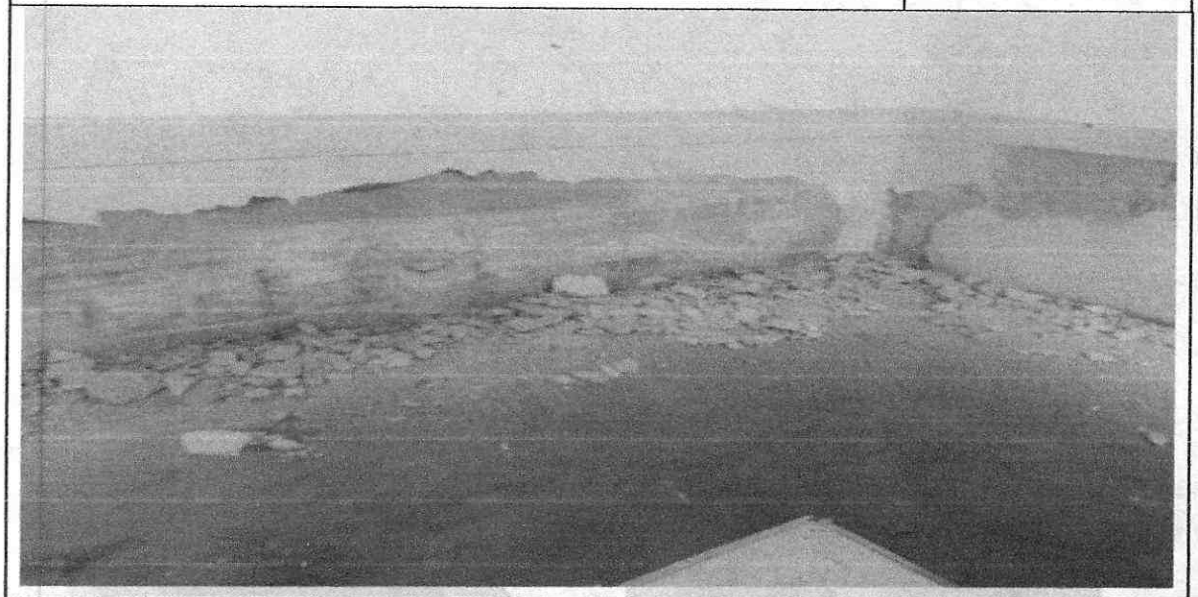

ACTIVIDAD	CANTIDAD
RASPADO DE PINTURA	47 M2




Sjisuministrossas@gmail.com

Km 14 Via Acacias Vda Las Mercedes Finca Los Naranjitos


313 212 5961

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
901.539.430 - 7

ACTIVIDAD	CANTIDAD
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	51,04M2

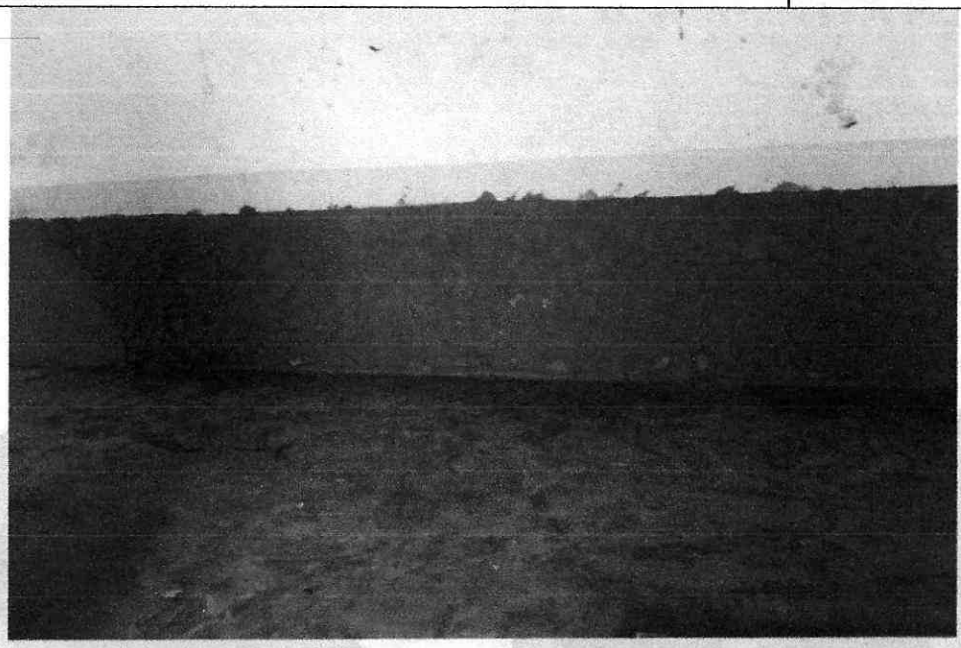

ACTIVIDAD	CANTIDAD
TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 UND

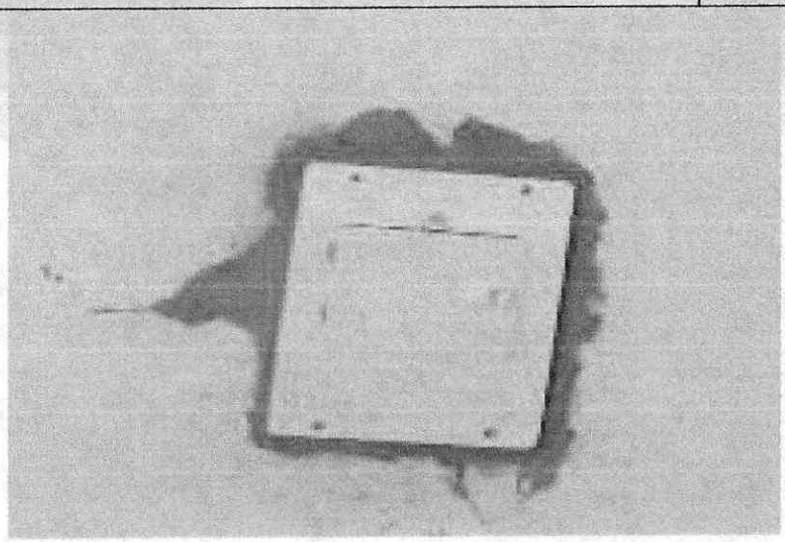

Sjisuministrossas@gmail.com

Km 14 Via Acacias Vda Las Mercedes Finca Los Naranjitos

313 212 5961
