
CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO BOG-1166-2026

10. Apoyar el seguimiento a la utilización de los espacios institucionales, identificando necesidades de reorganización, redistribución o adecuación física.

Se realizo seguimiento técnico en los siguientes proyectos:
Se realizó seguimiento al proyecto de construcción de la ESAP en la sede de Villavicencio, generando análisis de la documentación que reposa en la Entidad, se analizaron los estados reales de la obra y se plantean soluciones o alternativas posibles para culminar el proyecto en compañía del Contratista.

El 3 de marzo se radicó respuesta a la solicitud de adición remitida por el CONSORCIO CONSTRUVILLAVICENCIO contratista del contrato BOG-426-2024 cuyo objeto es REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO META.

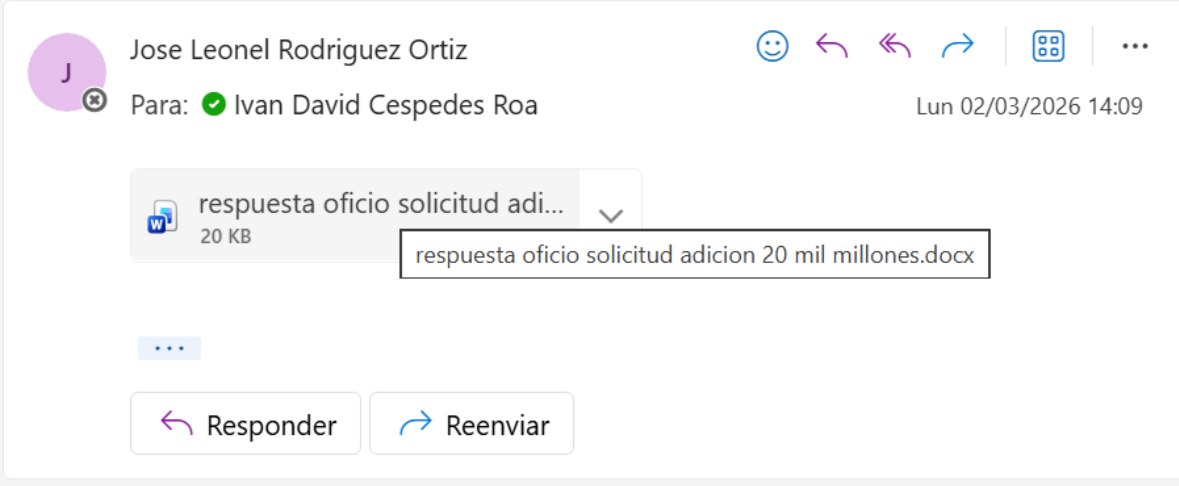

Este oficio está dirigido a la empresa de interventoría del contrato de obra, el Consorcio Interconstrucción 2023 fechado el pasado 23 de febrero de 2026 mediante oficio identificado con la identificación CV-262302-001. Al respecto antes de explicar el contenido del oficio remitido por la empresa contratista, se hace claridad que, al ser dirigido a la firma Interventora, esta interventoría aún no se manifiesta su posición sobre el contenido del oficio.

El contratista solicita de manera tacita una adición presupuestal por valor de VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($20.133.456.285,13) y una prórroga al contrato de obra por un término de nueve (9) meses (hasta 31 de diciembre del 2.026).
