CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S	*CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS* *Nit. 901.322.889 - 0*

INFORME CONTRATISTA

INFORME No	1	**FECHA**	14	de	Mayo	de	2026
PERIODO DEL	8	de	Abril		de	2026	
AL	9	de	Mayo		de	2026	


INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO	ALQUILER DE MOTONIVELADORA Y VIBRO COMPACTADOR PARA APOYAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ				
No. Contrato	MSE-MC-011-2026	**Fecha Inicio**	08/04/2026	**Fecha Terminación inicial**	22/05/2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS	**Identificación**	901.322.889-0
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR			
Nombre del Supervisor	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	**Identificación**	

LOCALIZACION
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO -DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

AVANCE DE EJECUCION

% DE AVANCE	100%	**TIEMPO TRANSCURRIDO**	81,82%



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD:	**SERVICIO DE ALQUILER MOTONIVELADORA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL**			
CONTRATADO:	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
	HORA	180	254.000,00	45.720.000,00
EJECUTADO		180		45.720.000,00

RELACION TRABAJO					
DIA	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS/DÍA	ACTIVIDAD
MIÉRCOLES	08/04/2026	28594,1	28604,5	10,4	CUENTEO Y PERFILADO DE VIAS, EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO
JUEVES	09/04/2026	28604,5	28612,7	8,2	
VIERNES	10/04/2026	28612,7	28617,5	4,8	
SÁBADO	11/04/2026	28617,5	28624,4	6,9	
DOMINGO	12/04/2026	28624,4	28633,1	8,7	
LUNES	13/04/2026	28633,1	28639,8	6,7	
MARTES	14/04/2026	28639,8	28649	9,2	
MIÉRCOLES	15/04/2026	28649	28658,1	9,1	
JUEVES	16/04/2026	28658,1	28663,8	5,7	
VIERNES	17/04/2026	28663,8	28668,4	4,6	
SÁBADO	18/04/2026				
DOMINGO	19/04/2026				
LUNES	20/04/2026	28668,4	28678,2	9,8	
MARTES	21/04/2026	28678,2	28683,7	5,5	

INFORME CONTRATISTA

MIÉRCOLES	22/04/2026	28683,7	28691,9	8,2	CUENTEO Y PERFILADO DE VIAS, EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO
JUEVES	23/04/2026	28691,9	28701,1	9,2	
VIERNES	24/04/2026	28702,5	28711,2	8,7	
SÁBADO	25/04/2026	28711,2	28717,5	6,3	
DOMINGO	26/04/2026	28717,5	28724,9	7,4	
LUNES	27/04/2026	28724,9	28724,9	0,0	
MARTES	28/04/2026	28725,3	28732,6	7,3	
MIÉRCOLES	29/04/2026	28732,6	28738	5,4	
JUEVES	30/04/2026	28738	28747,7	9,7	
VIERNES	01/05/2026				
SÁBADO	02/05/2026				
DOMINGO	03/05/2026				
LUNES	04/05/2026	28752,6	28760	7,4	
MARTES	05/05/2026	28760	28765,2	5,2	
MIÉRCOLES	06/05/2026	28765,2	28771,5	6,3	
JUEVES	07/05/2026	28771,5	28775,1	3,6	
VIERNES	08/05/2026	28775,1	28779,1	4,0	
SÁBADO	09/05/2026	28779,1	28779,1	0,0	
DOMINGO	10/05/2026	28779,1	28781	1,9	
TOTAL EJECUTADO				**180,0**	

REGISTRO FOTOGRAFICO









INFORME CONTRATISTA














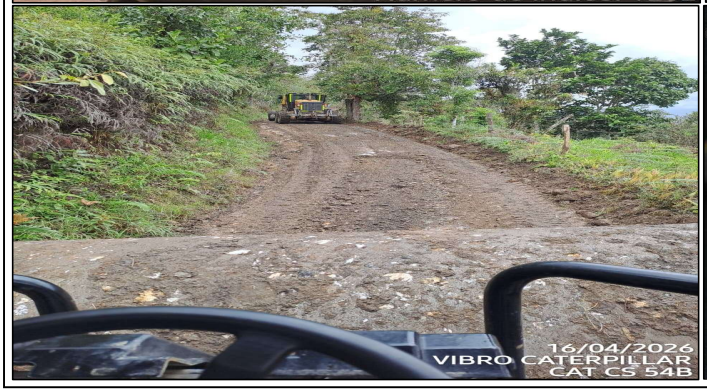



INFORME CONTRATISTA

















CUBIK	*CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS* *Nit. 901.322.889 - 0*

INFORME CONTRATISTA

ACTIVIDAD:	SERVICIO DE ALQUILER VIBROCOMPACTADOR PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL			
CONTRATADO:	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	HORA	68	193.500,00	13.158.000,00
EJECUTADO		68		13.158.000,00

RELACION TRABAJO					
DIA	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS/DÍA	ACTIVIDAD
LUNES	13/04/2026	7328	7337,8	9,8	COMPACTACIÓN DE RASANTE Y MATERIAL DE AFIRMADO
MARTES	14/04/2026	7337,8	7347,2	9,4	
MIÉRCOLES	15/04/2026	7347,2	7351,2	4	
JUEVES	16/04/2026	7351,2	7354,4	3,2	
VIERNES	17/04/2026				
SÁBADO	18/04/2026				
DOMINGO	19/04/2026				
LUNES	20/04/2026	7356	7363,3	7,3	
MARTES	21/04/2026	7363,3	7369,1	5,8	
MIÉRCOLES	22/04/2026	7369,1	7376,8	7,7	
JUEVES	23/04/2026	7376,8	7382,8	6	
VIERNES	24/04/2026	7382,8	7392,4	9,6	
SÁBADO	25/04/2026	7392,4	7398	5,6	
TOTAL EJECUTADO				**68**	

REGISTRO FOTOGRAFICO














INFORME CONTRATISTA



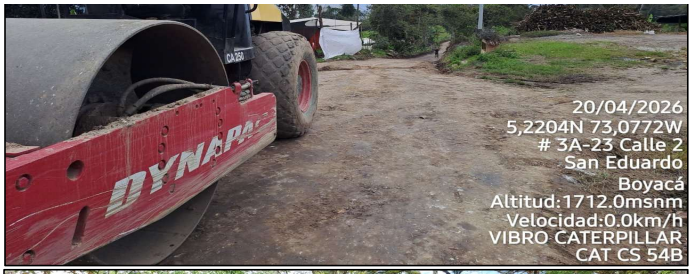













CUBIK	*CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS* *Nit. 901.322.889 - 0*

INFORME CONTRATISTA













OBSERVACIONES

FIRMA		Contratista
	VoBo	
NOMBRE		**PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA**
		R.L. CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS

Documentos o Folios Anexos : factura, seguridad social
