
Id		Modo de tarea	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% planeado
1			**1**	**CONTRATO 2026-03-050 - PLAZA DE MERCADO COMUNA SANJOSÉ**	**228,25 días**	**mié 8/04/26**	**jue 11/03/27**	**16%**	**13%**
2	✓		2	INICIO	0 días	mié 8/04/26	mié 8/04/26	100%	100%
3	✓		**3**	**Plan de trabajo**	**16 días**	**mié 8/04/26**	**mié 29/04/26**	**100%**	**100%**
7			**7**	**Levantamiento Topográfico**	**40 días**	**mié 15/04/2**	**vie 12/06/26**	**80%**	**60%**
12			**12**	**Verificación de norma urbana y disponibilidad de redes y servicios públicos**	**30 días**	**mié 8/04/26**	**jue 21/05/26**	**69%**	**97%**
19			**19**	**Exploración del subsuelo**	**54 días**	**mié 22/04/2**	**lun 13/07/26**	**76%**	**35%**
24			**24**	**Diseño arquitectónico**	**85 días**	**mié 8/04/26**	**jue 13/08/26**	**34%**	**34%**
37			**37**	**Diseño de urbanismo**	**85 días**	**mié 8/04/26**	**jue 13/08/26**	**34%**	**34%**
50			**50**	**Diseño bioclimático**	**39 días**	**mar 23/06/2**	**jue 20/08/26**	**0%**	**0%**
54			**54**	**Diseño estructural**	**67 días**	**vie 15/05/26**	**mié 26/08/26**	**3%**	**4%**
67			**67**	**Diseño de redes hidrosanitarias**	**38 días**	**mar 23/06/2**	**mié 19/08/26**	**0%**	**0%**
71			**71**	**Diseño de redes electricas**	**38 días**	**mar 23/06/2**	**mié 19/08/26**	**0%**	**0%**
75			**75**	**Diseño de cableado estructurado**	**38 días**	**mar 23/06/2**	**mié 19/08/26**	**0%**	**0%**
79			**79**	**Diseño de redes especiales (HVAC, Gas, CCTV)**	**38 días**	**mar 23/06/2**	**mié 19/08/26**	**0%**	**0%**
92			**92**	**Estudio ambiental**	**38 días**	**mar 23/06/2**	**mié 19/08/26**	**0%**	**0%**
96			**96**	**Plan de manejo de transito**	**31 días**	**mar 7/07/26**	**vie 21/08/26**	**0%**	**0%**
100			**100**	**Presupuesto detallado y especificaciones tecnicas**	**47 días**	**mar 23/06/2**	**mar 1/09/26**	**0%**	**0%**
109			**109**	**Modelo BIM (Totalidad de planos y documentos)**	**91 días**	**mié 8/04/26**	**lun 24/08/26**	**32%**	**32%**
114			**114**	**Tramite ante Curaduría urbana**	**128 días**	**mié 1/07/26**	**jue 7/01/27**	**0%**	**0%**
117			**117**	**Tramite ante ante Empresa prestadora de servicios publicos de Redes hidrosanitarias**	**41 días**	**jue 7/01/27**	**vie 5/03/27**	**0%**	**0%**
120			**120**	**Tramite ante ante Empresa prestadira de servicios publicos de Redes eléctricas**	**41 días**	**jue 7/01/27**	**vie 5/03/27**	**0%**	**0%**
123			**123**	**Tramite ante ante Empresa prestadira de servicios publicos de Redes de gas**	**41 días**	**jue 7/01/27**	**vie 5/03/27**	**0%**	**0%**
126			**126**	**Gestion documental**	**139 días**	**vie 14/08/26**	**jue 4/03/27**	**0%**	**0%**
130			**130**	**Entrega final del proyecto tramites, licencias, estudios y diseños**	**4 días**	**vie 5/03/27**	**jue 11/03/27**	**0%**	**0%**
133			133	FIN	0 días	jue 11/03/27	jue 11/03/27	0%	0%

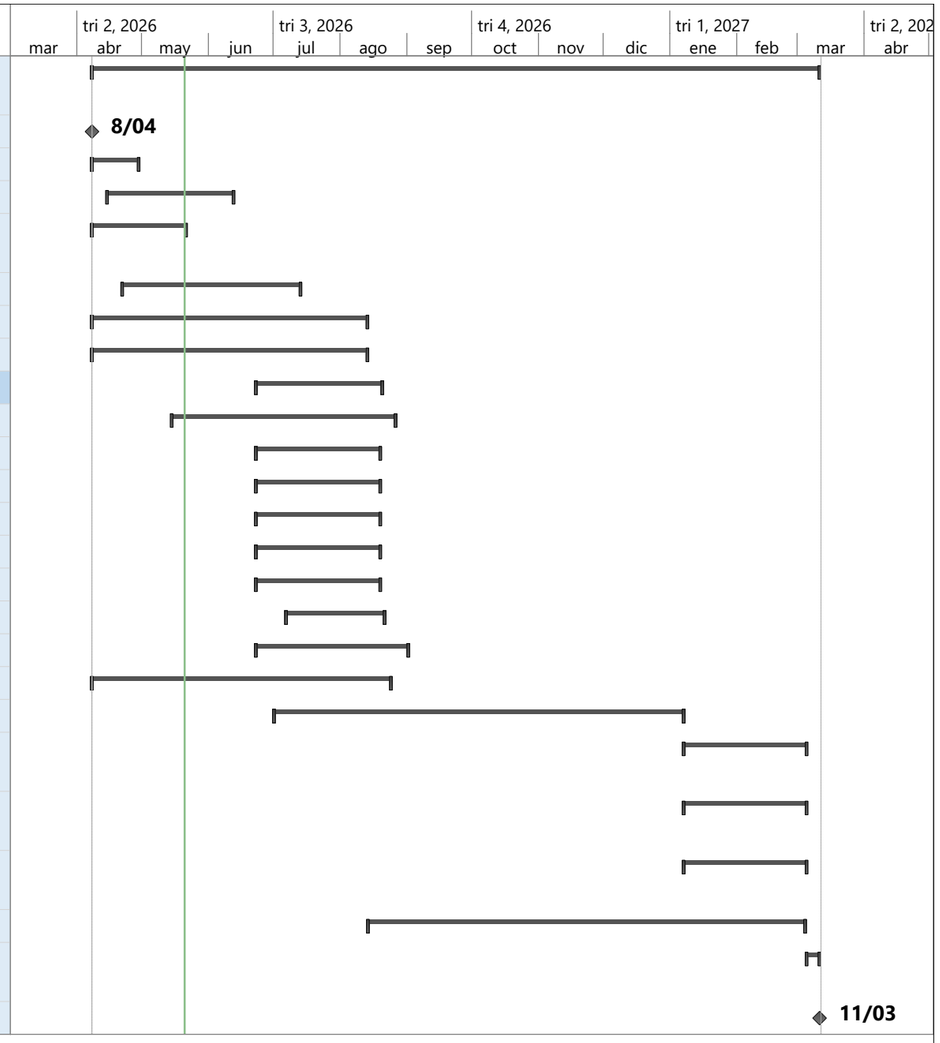

Proyecto: INFI-SCN-001-2026-P
Fecha: jue 21/05/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
