INFORME SUPERVISOR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:
"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°114 – 16/06/2025

CONTRATISTA: HCL CONSTRUCCION COLOMBIA SAS

INFORME DE COBRO ACTA N°7
PERIODO 15/03/2026 AL 09/05/2026

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22 DE MAYO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

- Contrato de Obra No. 114 DE 2022

Contrato de No.:	114 – 16/06/2025
OBJETO:	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
VALOR INICIAL OBRA:	$2.818.077.627,00
VALOR ADICIÓN:	$1.400.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO;	$4.218.007.627,00
CONTRATISTA	HCL CONSTRUCCION COLOMBIA SAS Nit: 901.953.669-4 R/L EDGAR CUADROS LAGUADO
CONTRATANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR	CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO
FECHA DE INICIO:	24/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/12/2025
FECHA DE SUSPENSION	23/12/2025
FECHA DE REINICIO	28/01/2026
FECHA DE PRORROGA EN PLAZO	04/02/2026
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1	19/02/2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	18/07/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	HASTA 18 DE JULIO DE 2026
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	N/A

- **Pólizas contrato de Prestación N° 114 de 2025.**

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO					
GARANTÍAS	**NOMBRE DEL ASEGURADOR**	**N° DE POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMINETO	Seguros del Estado S. A	94-44-101197682	16/06/ 2025	30/06/ 2026	$563.615. 525,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONE SOCIALES	Seguros del Estado S. A		16/06/ 2025	30/12/ 2028	$281.807. 762,70
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Seguros del Estado S. A	96-40-101070337	16/06/ 2025	30/12/ 2025	$569.400. 000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	Seguros del Estado S. A		16/06/ 2025	30/12/ 2025	$569.400. 000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Seguros del Estado S. A		16/06/ 2025	30/12/ 2025	$569.400. 000,00
ACTUALIZACION DE POLIZAS POR CESION DEL CONTRATO					
CUMPLIMINETO	Seguros del Estado S. A	94-44-101200481	20/10/ 2025	30/06/ 2026	$187.838.004,15
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONE SOCIALES	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	30/12/ 2028	$93.919.022,08
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Seguros del Estado S. A	96-40-101071578	20/10/2025	30/12/ 2025	$569.400. 000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	30/12/ 2025	$569.400. 000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	30/12/ 2025	$569.400. 000,00

ACTUALIZACION DE POLIZAS POR SUSPENSION Y REINICIO					
CUMPLIMINETO	Seguros del Estado S. A	94-44-101200481	20/10/ 2025	04/08/ 2026	$187.838.004,15
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONE SOCIALES	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	30/12/ 2028	$93.919.022,08
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Seguros del Estado S. A	96-40-101071578	20/10/2025	04/02/ 2026	$569.400. 000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	04/02/ 2026	$569.400. 000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	04/02/ 2026	$569.400. 000,00
ACTUALIZACION DE POLIZAS POR ADICCION EN TIEMPO					
CUMPLIMINETO	Seguros del Estado S. A	94-44-101200481	20/10/ 2025	19/08/ 2026	$187.838.004,15
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONE SOCIALES	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	19/02/ 20239	$93.919.022,08
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Seguros del Estado S. A	96-40-101071578	20/10/2025	19/02/ 2026	$569.400. 000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	19/02/ 2026	$569.400. 000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	19/02/ 2026	$569.400. 000,00
ACTUALIZACION DE POLIZAS POR ADICCION EN VALOR Y TIEMPO					
CUMPLIMINETO	Seguros del Estado S. A	94-44-101200481	20/10/ 2025	19/01/ 2027	$467.838.044,95
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONE SOCIALES	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	19/02/ 2029	$233.919.022,48

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Seguros del Estado S. A	96-40-101071578	20/10/2025	19/07/ 2026	$700.362.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	19/07/ 2026	$700.362. 000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Seguros del Estado S. A		20/10/2025	19/07/ 2026	$700.362. 000,00

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente informe técnico de supervisión se suscribe en el marco del Contrato de Prestación de Servicios N° 114-16-06-2025, celebrado entre la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y el contratista asignado. El objeto principal de dicha obligación contractual consiste en el alquiler de maquinaria pesada, volquetas y vehículos de carga, destinados de manera específica a la intervención, mantenimiento y rehabilitación de la red vial rural del municipio.

El proyecto se fundamenta en el fortalecimiento de la infraestructura vial para garantizar la tranziitabilidad y conectividad de los sectores rurales, priorizando la atención de los puntos críticos en los Corregimientos 1, 2 y 3. La ejecución de las actividades de mantenimiento se ha sectorizado bajo el siguiente esquema de intervención territorial:

Cobertura Geográfica por Corregimientos

A continuación, se detallan los frentes de trabajo y rutas estratégicas definidas dentro del plan de acción:

CORREGIMIENTO	SECTORES Y RUTAS DE INTERVENCIÓN
CORREGIMIENTO 1	San Ignacio – La Sabana – El Pantano; La Esmeralda – El Aburrido; San Pedro Alto – San Pedro Bajo (Miramar San Luis); San Cayetano – Vijagual; Angelinos – Santa Rita (vía San Cayetano); Nogal 1 y 2 – Gracia de Dios – El Plan; Angelinos – Bosconia; Bonanza – Villa Carmelo – Villa Luz.

CORREGIMIENTO	SECTORES Y RUTAS DE INTERVENCIÓN
CORREGIMIENTO 2	Veredas: Magueyes, Capilla Alta, Santos Altos, Cuchilla Alta, Monserrate Alta, Boloquí Bajo y Boloquí Alto. Sector Monserrate parte baja (vía Palbas de la Y del Embalse hacia Capilla Baja). Conectividad desde Puente Tona hacia Rosa Blanca, Chitota y Santos Bajos (vía Carabineros).
CORREGIMIENTO 3	Eje principal de El Porvenir a Miradores de la UIS; Pedregal (sectores Dos Sierras y Ancestros); Retiro Chiquito y Retiro Grande (vía principal y sector Acueducto); Gualilo San José – Piñares – León; Malaña Oriental – Gualilo Alto; Santa Bárbara UDES – San Joaquín; Conectividad vía principal a Cúcuta – Miramanga – Tres Balcones; Gualilo Bajo (vía Acueducto) – Malaña parte alta.

En concordancia con las rutas de intervención socializadas, se le solicita al contratista garantizar la disponibilidad permanente de la maquinaria amarilla y equipos de transporte necesarios para la ejecución simultánea de los servicios. Para tal fin, el contratista deberá disponer de **tres (3) frentes de trabajo independientes**, asignados de manera específica a cada uno de los corregimientos del municipio de Bucaramanga, conforme a la siguiente distribución técnica:

Equipo Requerido (Por Frente de Trabajo)	Corregimiento 1	Corregimiento 2	Corregimiento 3
Motoniveladora	1	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1	1
Vibro compactador autopropulsado	1	1	1
Minicargador	1	1	1
Volqueta	1	1	1

Nota: La suficiencia del equipo será verificada en sitio por la supervisión para asegurar el cumplimiento de los rendimientos programados en cada zona.

2. CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y/O PERSONAL SALARIOS.

En el presente informe de supervisión se relacionan y verifican las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 15 DE MARZO Y EL 09 DE MAYO DE 2026, conforme a la información reportada por el contratista en su informe de avance.

Como soporte de lo anterior, se anexan las planillas de control, actas e informes de ejecución correspondientes, mediante los cuales se sustentan las cantidades ejecutadas por la empresa HCL CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S., las cuales fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte de la supervisión del contrato.

Los valores de ejecución consignados en el presente documento corresponden a valores causados de acuerdo con el avance físico del contrato; no obstante, dichos valores podrán ser objeto de ajustes o variaciones en los posteriores cortes de obra, de conformidad con los resultados de las mediciones finales, conciliaciones técnicas y revisiones administrativas que se realicen.

Para el período evaluado, el contrato presenta un avance físico ejecutado del 0.66%, alcanzando un avance acumulado del 80.71 %, de acuerdo con el seguimiento realizado por la supervisión y los reportes técnicos presentados por el contratista.

Las cantidades totales ejecutadas y verificadas se encuentran debidamente discriminadas en el Acta de Recibo Parcial, así como en sus respectivos anexos técnicos y administrativos, los cuales hacen parte integral del presente informe y constituyen el soporte para los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

En consecuencia, la supervisión deja constancia de que la información aquí relacionada se encuentra soportada documentalmente y ha sido revisada conforme a las obligaciones contractuales, sin perjuicio de las verificaciones adicionales que puedan adelantarse en etapas posteriores del proceso contractual.

CORREGIMIENTO 1

FECHA	CORREGIMIENTO	MAQUINA	HORAS	DIAS	UBICACIONES	OBSERVACIONES
16/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		EL ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
16/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,3		SAN PEDRO BAJO	ATENCION EMERGENCIA
16/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
16/03/2026	CORREGIMIENTO 2	MINICARGADOR	8,0		CHITOTA	ATENCION EMERGENCIA
16/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	EL ABURRIDO	CARGANDO MATERIAL
16/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	LA SABANA	CARGANDO MATERIAL
17/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		EL ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
17/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	8,5		SAN PEDRO BAJO	ATENCION EMERGENCIA
17/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		EL NOGAL	CONFORMANDO VIAS
17/03/2026	CORREGIMIENTO 2	MINICARGADOR	7,0		CHITOTA	ATENCION EMERGENCIA
17/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	EL ABURRIDO	CARGANDO MATERIAL
17/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	LA SABANA	CARGANDO MATERIAL
18/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	3,0		SANTA RITA	ATENCION EMERGENCIA
18/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,2		SAN PEDRO BAJO	ATENCION EMERGENCIA
18/03/2026	CORREGIMIENTO 2	MINICARGADOR	7,0		ROSA BLANCA	ATENCION EMERGENCIA
18/03/2026	CORREGIMIENTO 1	CAMIONETA		1	BOLARQUI	RECORRIDO DE OBRA
19/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	10,0		SANTA RITA	ATENCION EMERGENCIA
19/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	8,0		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
19/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
19/03/2026	CORREGIMIENTO 2	MINICARGADOR	7,0		ROSA BLANCA	ATENCION EMERGENCIA
19/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SANTA RITA	CARGANDO MATERIAL
19/03/2026	CORREGIMIENTO 1	CAMIONETA		1	ABURRIDO	RECORRIDO DE OBRA
20/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		SANTA RITA	ATENCION EMERGENCIA
20/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
20/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
20/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SANTA RITA	CARGANDO MATERIAL
20/03/2026	CORREGIMIENTO 2	CAMIONETA		1	LOS SANTOS	RECORRIDO DE OBRA
21/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		SANTA RITA	ATENCION EMERGENCIA

21/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
21/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	2,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
21/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SANTA RITA	CARGANDO MATERIAL
21/03/2026	CORREGIMIENTO 1	CAMIONETA		1	NOGAL	RECORRIDO DE OBRA
24/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	10,0		SANTA RITA	ATENCION EMERGENCIA
24/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	8,0		SAN IGNACIO	ATENCION EMERGENCIA
24/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
24/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SANTA RITA	CARGANDO MATERIAL
25/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		SANTA RITA	ATENCION EMERGENCIA
25/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	8,0		SAN IGNACIO	ATENCION EMERGENCIA
25/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
25/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SANTA RITA	CARGANDO MATERIAL
26/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		SAN IGNACIO	ATENCION EMERGENCIA
26/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
26/03/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	10,0		EL PABLON	ATENCION EMERGENCIA
26/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	NOGAL	CARGANDO MATERIAL
27/03/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,0		NOGAL	ATENCION EMERGENCIA
27/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
27/03/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	8,5		EL PABLON	ATENCION EMERGENCIA
27/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	NOGAL	CARGANDO MATERIAL
28/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		SAN PEDRO	ATENCION DE EMERGENCIA
28/03/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,0		NOGAL	ATENCION EMERGENCIA
28/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
28/03/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	5,0		EL PABLON	ATENCION EMERGENCIA
28/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	NOGAL	CARGANDO MATERIAL
28/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN PEDRO	CARGANDO MATERIAL
30/03/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,0		NOGAL	ATENCION EMERGENCIA
30/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
30/03/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	9,0		EL PABLON	ATENCION EMERGENCIA
30/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	NOGAL	CARGANDO MATERIAL
30/03/2026	CORREGIMIENTO 1	CAMIONETA		1	BOLARQUI	RECORRIDO DE OBRA
31/03/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,0		NOGAL	ATENCION EMERGENCIA
31/03/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS

31/03/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	6,5		EL PABLON	ATENCION EMERGENCIA
31/03/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	NOGAL	CARGANDO MATERIAL
1/04/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,0		NOGAL	ATENCION EMERGENCIA
1/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
1/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	7,0		EL PABLON	ATENCION EMERGENCIA
1/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	NOGAL	CARGANDO MATERIAL
6/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		EL ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
6/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
6/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
6/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	NOGAL	CARGANDO MATERIAL
6/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	EL ABURRIDO	CARGANDO MATERIAL
7/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		EL ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
7/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
7/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
7/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	NOGAL	CARGANDO MATERIAL
7/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	EL ABURRIDO	CARGANDO MATERIAL
8/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		EL ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
8/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
8/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	6,0		NOGAL	CONFORMANDO VIAS
8/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	NOGAL	CARGANDO MATERIAL
8/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	EL ABURRIDO	CARGANDO MATERIAL
8/04/2026	CORREGIMIENTO 1	CAMIONETA		1	MIRAMAR	RECORRIDO DE OBRA
9/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	8,0		EL ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
9/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
9/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	EL ABURRIDO	CARGANDO MATERIAL
10/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		EL ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
10/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
10/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	EL ABURRIDO	CARGANDO MATERIAL
10/04/2026	CORREGIMIENTO 1	CAMIONETA		1	EL ABURRIDO	RECORRIDO DE OBRA
11/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	8,0		EL ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
11/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
11/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	EL ABURRIDO	CARGANDO MATERIAL
13/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		MIRAMAR	CONFORMANDO VIAS

13/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
13/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	MIRAMAR	CARGANDO MATERIAL
14/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		MIRAMAR	CONFORMANDO VIAS
14/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
14/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1	MIRAMAR	CARGANDO MATERIAL
15/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		MIRAMAR	CONFORMANDO VIAS
15/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
15/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	MIRAMAR	CARGANDO MATERIAL
18/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	5,0		MIRAMAR	CONFORMMANDO VIAS
18/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	MIRAMAR	CARGANDO MATERIAL
18/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		LA SABANA	CONFORMMANDO VIAS
20/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	7,0		MIRAMAR	CONFORMANDO VIAS
20/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	MIRAMAR	CARGANDO MATERIAL
20/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	8,5		LA SABANA	CONFORMMANDO VIAS
21/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		MIRAMAR	CONFORMANDO VIAS
21/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	MIRAMAR	CARGANDO MATERIAL
21/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
21/04/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	6,0		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
21/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
21/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	5,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
21/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		LA SABANA	CONFORMMANDO VIAS
22/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
22/04/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,9		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
22/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
22/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	5,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
22/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		LA ESMERALDA	CONFORMANDO VIAS
23/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
23/04/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	8,6		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
23/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
23/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	6,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
23/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		LA ESMERALDA	CONFORMANDO VIAS
24/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
24/04/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,0		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA

24/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
24/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	8,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
24/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		LA ESMERALDA	CONFORMANDO VIAS
25/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
25/04/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,7		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
25/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
25/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	5,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
25/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	8,0		ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
27/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
27/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
27/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	7,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
27/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		LA ESMERALDA	CONFORMANDO VIAS
28/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
28/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	6,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
28/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	8,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
28/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		EL NOGAL	CONFORMANDO VIAS
29/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
29/04/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	7,0		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
29/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	6,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
29/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	8,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
29/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		EL NOGAL	CONFORMANDO VIAS
30/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
30/04/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,5		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
30/04/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
30/04/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	7,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
30/04/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	8,0		ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
2/05/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
2/05/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	5,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS
2/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	5,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
2/05/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
4/05/2026	CORREGIMIENTO 1	VOLQUETA		1,0	SAN IGNACIO	CARGANDO MATERIAL
4/05/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,5		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
4/05/2026	CORREGIMIENTO 1	VIBROCOMPACTADOR	6,0		SAN IGNACIO	COMPACTANDO VIAS

4/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	8,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
4/05/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
5/05/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	10,0		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
5/05/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	6,0		ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
5/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	7,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
5/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	5,0		ABURRIDO	
6/05/2026	CORREGIMIENTO 1	PAJARITA	9,0		ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
6/05/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,8		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
6/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	8,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
6/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	6,0		ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
7/05/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	9,5		LA SABANA	ATENCION EMERGENCIA
7/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	8,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
7/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	6,0		ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
8/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	8,0		SAN IGNACIO	CONFORMANDO VIAS
8/05/2026	CORREGIMIENTO 1	MINICARGADOR	6,0		ABURRIDO	CONFORMANDO VIAS
8/05/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	8,5		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS
9/05/2026	CORREGIMIENTO 1	RETRO 320	4,4		LA SABANA	CONFORMANDO VIAS

- **EJECUCION FINANCIERA CORREGIMIENTO 1**

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°_07 (PERIODO: DEL 15/03/2026 AL 09/05/2026)	
						CORREGIMIENTO 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
A	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS						
1	Motoniveladora - potencia 140kw	Tarifa-Hora	1	$ 269.087,00	$ 269.087,00		$ -
2	Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw	Tarifa-Hora	1	$ 204.788,00	$ 204.788,00	452,50	$ 92.666.570,00
3	Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn	Tarifa-Hora	1	$ 204.045,00	$ 204.045,00	74,00	$ 15.099.330,00
4	Vibro compactador autropulsado de rodillo de 10 t	Tarifa-Hora	1	$ 215.938,00	$ 215.938,00		$ -
5	Vibrocpmactador autropulsado de rodillo de3tn	Tarifa-Hora	1	$ 133.428,00	$ 133.428,00		$ -
6	minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible	Tarifa-Hora	1	133.632,00	$ 133.632,00	172,00	$ 22.984.704,00
7	Retroexcavadora 320-potencia 117kw	Tarifa-Hora	1	$ 276.892,00	$ 276.892,00	156,40	$ 43.305.908,80
8	volqueta de 6m3	Dia	1	936.000,00	$ 936.000,00	42,00	$ 39.312.000,00
9	camioneta pick up4x4 doble cabina	Dia	1	$ 357.172,00	$ 357.172,00	6,00	$ 2.143.032,00
10	camabaja transporte de maquinaria amarilla-capacidad mínima de 25 ton	Dia	1	$ 2.445.567,00	$ 2.445.567,00		$ -
11	planchón transporte maquinaria amarilla-capacidad mínima 12ton	Dia	1	$ 1.776.567,00	$ 1.776.567,00		$ -
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 6.953.116,00**		**$ 215.511.544,80**
IVA 19%					$ 1.321.092,04		$ 40.947.193,51
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 8.274.208,04**		**$ 256.458.738,31**

- **CORREGIMIENTO 2**

FECHA	CORREGIMIENTO	MAQUINA	HORAS	DIAS	UBICACIONES	OBSERVACIONES
16/03/2026	CORREGIMIENTO 2	MINICARGADOR	8,0		CHITOTA	ATENCION EMERGENCIA
17/03/2026	CORREGIMIENTO 2	MINICARGADOR	7,0		CHITOTA	ATENCION EMERGENCIA
18/03/2026	CORREGIMIENTO 2	MINICARGADOR	7,0		ROSA BLANCA	ATENCION EMERGENCIA
19/03/2026	CORREGIMIENTO 2	MINICARGADOR	7,0		ROSA BLANCA	ATENCION EMERGENCIA
20/03/2026	CORREGIMIENTO 2	CAMIONETA		1	LOS SANTOS	RECORRIDO DE OBRA
26/03/2026	CORREGIMIENTO 2	PAJARITA	7,0		LOS SANTOS	ATENCION EMERGENCIA
26/03/2026	CORREGIMIENTO 2	VOLQUETA		1,0	LOS SANTOS	CARGANDO MATERIAL
26/03/2026	CORREGIMIENTO 2	CAMIONETA		1	CAPILLA ALTA	RECORRIDO DE OBRA
27/03/2026	CORREGIMIENTO 2	PAJARITA	6,0		LOS SANTOS	CONFORMANDO VIAS
27/03/2026	CORREGIMIENTO 2	VOLQUETA		1,0	LOS SANTOS	CARGANDO MATERIAL
30/03/2026	CORREGIMIENTO 2	PAJARITA	9,0		LOS SANTOS	CONFORMANDO VIAS
30/03/2026	CORREGIMIENTO 2	VOLQUETA		1,0	LOS SANTOS	CARGANDO MATERIAL
31/03/2026	CORREGIMIENTO 2	PAJARITA	6,0		LOS SANTOS	CONFORMANDO VIAS
31/03/2026	CORREGIMIENTO 2	VIBROCOMPACTADOR	5,0		LOS SANTOS	CONFORMANDO VIAS
31/03/2026	CORREGIMIENTO 2	VOLQUETA		1,0	LOS SANTOS	CARGANDO MATERIAL
1/04/2026	CORREGIMIENTO 2	PAJARITA	8,0		LOS SANTOS	CONFORMANDO VIAS
1/04/2026	CORREGIMIENTO 2	VIBROCOMPACTADOR	5,0		LOS SANTOS	CONFORMANDO VIAS
1/04/2026	CORREGIMIENTO 2	VOLQUETA		1,0	LOS SANTOS	CARGANDO MATERIAL
7/05/2026	CORREGIMIENTO 2	PAJARITA	5,5		CAPILLA ALTA	CONFORMANDO VIAS
7/05/2026	CORREGIMIENTO 2	MOTONIVELADORA	9,0		CAPILLA ALTA	CONFORMANDO VIAS
8/05/2026	CORREGIMIENTO 2	PAJARITA	6,0		CAPILLA ALTA	CONFORMANDO VIAS
8/05/2026	CORREGIMIENTO 2	MOTONIVELADORA	4,7		CAPILLA ALTA	CONFORMANDO VIAS

- **EJECUCION FINANCIERA CORREGIMIENTO 2**

CONDICCIONES GENERALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°_07 (PERIODO: DEL 15/03/2026 AL 09/05/2026)	
						CORREGIMIENTO 2	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
A	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS						
1	Motoniveladora - potencia 140kw	Tarifa-Hora	1	$ 269.087,00	$ 269.087,00	13,70	$ 3.686.491,90
2	Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw	Tarifa-Hora	1	$ 204.788,00	$ 204.788,00	47,50	$ 9.727.430,00
3	Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn	Tarifa-Hora	1	$ 204.045,00	$ 204.045,00	10,00	$ 2.040.450,00
4	Vibro compactador autropulsado de rodillo de 10 t	Tarifa-Hora	1	$ 215.938,00	$ 215.938,00		$ -
5	Vibrocpmactador autropulsado de rodillo de3tn	Tarifa-Hora	1	$ 133.428,00	$ 133.428,00		$ -
6	minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible	Tarifa-Hora	1	133.632,00	$ 133.632,00	29,00	$ 3.875.328,00
7	Retroexcavadora 320-potencia 117kw	Tarifa-Hora	1	$ 276.892,00	$ 276.892,00	0,00	$ -
8	volqueta de 6m3	Dia	1	936.000,00	$ 936.000,00	5,00	$ 4.680.000,00
9	camioneta pick up4x4 doble cabina	Dia	1	$ 357.172,00	$ 357.172,00	2,00	$ 714.344,00
10	camabaja transporte de maquinaria amarilla-capacidad mínima de 25 ton	Dia	1	$ 2.445.567,00	$ 2.445.567,00		$ -
11	planchón transporte maquinaria amarilla-capacidad mínima 12ton	Dia	1	$ 1.776.567,00	$ 1.776.567,00		$ -
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 6.953.116,00**		**$ 24.724.043,90**
IVA 19%					$ 1.321.092,04		$ 4.697.568,34
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 8.274.208,04**		**$ 29.421.612,24**

- **CORREGIMIENTO 3**

FECHA	CORREGIMIENTO	MAQUINA	HORAS	DIAS	UBICACIONES	OBSERVACIONES
24/04/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	8,8		RETIRO GRANDE	CONFORMANDO VIAS
25/04/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	4,9		RETIRO GRANDE	CONFORMANDO VIAS
27/04/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	9,1		RETIRO GRANDE	CONFORMANDO VIAS
28/04/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	9,8		RETIRO GRANDE	CONFORMANDO VIAS
29/04/2026	CORREGIMIENTO 3	MOTONIVELADORA	7,0		SANTA BARBARA	CONFORMANDO VIAS
29/04/2026	CORREGIMIENTO 3	VIBROCOMPACTADOR	2,8		SANTA BARBARA	COMPACTANDO VIAS
29/04/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	9,1		RETIRO GRANDE	CONFORMANDO VIAS
30/04/2026	CORREGIMIENTO 3	VOLQUETA		1,0	PEDREGAL	LIMPIEZA DE VIA
30/04/2026	CORREGIMIENTO 3	MOTONIVELADORA	6,0		SANTA BARBARA	CONFORMANDO VIAS
30/04/2026	CORREGIMIENTO 3	VIBROCOMPACTADOR	4,7		SANTA BARBARA	COMPACTANDO VIAS
30/04/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	9,4		RETIRO GRANDE	CONFORMANDO VIAS
4/05/2026	CORREGIMIENTO 3	MOTONIVELADORA	3,0		PEDRREGAL	CONFORMANDO VIAS
4/05/2026	CORREGIMIENTO 3	VIBROCOMPACTADOR	2,1		PEDRREGAL	CONFORMANDO VIAS
4/05/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	7,1		SAN JOSE	CONFORMANCION VIAS
5/05/2026	CORREGIMIENTO 3	MOTONIVELADORA	8,0		PEDRREGAL	CONFORMANDO VIAS
5/05/2026	CORREGIMIENTO 3	VIBROCOMPACTADOR	6,1		PEDRREGAL	CONFORMANDO VIAS
5/05/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	3,4		SAN JOSE	CONFORMANCION VIAS
6/05/2026	CORREGIMIENTO 3	MOTONIVELADORA	6,0		PEDRREGAL	CONFORMANDO VIAS
6/05/2026	CORREGIMIENTO 3	VIBROCOMPACTADOR	5,0		PEDRREGAL	CONFORMANDO VIAS
6/05/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	4,7		SAN JOSE	CONFORMANCION VIAS
7/05/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	7,1		SAN JOSE	CONFORMANCION VIAS
8/05/2026	CORREGIMIENTO 3	VIBROCOMPACTADOR	4,6		RETIRO CHIQUITO	COMPACTANDO VIAS
8/05/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	6,6		SAN JOSE	CONFORMANCION VIAS
8/05/2026	CORREGIMIENTO 3	MOTONIVELADORA	5,0		RETIRO CHIQUITO	CONFORMANDO VIAS
9/05/2026	CORREGIMIENTO 3	VIBROCOMPACTADOR	4,2		RETIRO CHIQUITO	COMPACTANDO VIAS
9/05/2026	CORREGIMIENTO 3	PAJARITA	5,9		SAN JOSE	CONFORMANCION VIAS
9/05/2026	CORREGIMIENTO 3	MOTONIVELADORA	5,0		RETIRO CHIQUITO	CONFORMANDO VIAS

- **EJECUCICION FINANCIERA CORREGIMIENTO 3**

CONDICCIONES GENERALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°_07 (PERIODO: DEL 15/03/2026 AL 09/05/2026) CORREGIMIENTO 3	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
A	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS						
1	Motoniveladora - potencia 140kw	Tarifa-Hora	1	$ 269.087,00	$ 269.087,00	40,00	$ 10.763.480,00
2	Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw	Tarifa-Hora	1	$ 204.788,00	$ 204.788,00	85,90	$ 17.591.289,20
3	Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn	Tarifa-Hora	1	$ 204.045,00	$ 204.045,00	29,50	$ 6.019.327,50
4	Vibro compactador autropulsado de rodillo de 10 t	Tarifa-Hora	1	$ 215.938,00	$ 215.938,00		$ -
5	Vibrocpmactador autropulsado de rodillo de3tn	Tarifa-Hora	1	$ 133.428,00	$ 133.428,00		$ -
6	minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible	Tarifa-Hora	1	133.632,00	$ 133.632,00		$ -
7	Retroexcavadora 320-potencia 117kw	Tarifa-Hora	1	$ 276.892,00	$ 276.892,00		$ -
8	volqueta de 6m3	Dia	1	936.000,00	$ 936.000,00	1,00	$ 936.000,00
9	camioneta pick up4x4 doble cabina	Dia	1	$ 357.172,00	$ 357.172,00		$ -
10	camabaja transporte de maquinaria amarilla-capacidad mínima de 25 ton	Dia	1	$ 2.445.567,00	$ 2.445.567,00		$ -
11	planchón transporte maquinaria amarilla-capacidad mínima 12ton	Dia	1	$ 1.776.567,00	$ 1.776.567,00		$ -
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 6.953.116,00**		**$ 35.310.096,70**
IVA 19%					$ 1.321.092,04		$ 6.708.918,37
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 8.274.208,04**		**$ 42.019.015,07**

- **EJECUCION FINANCIERA ACOMULADA**

CONDICCIONES GENERALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°_06 (PERIODO: DEL 15/03/2026 AL 09/05/2026)	
						CANT ACUMULADAS CORREGIMIENTO 1,2 Y 3	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
A	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS						
1	Motoniveladora - potencia 140kw	Tarifa-Hora	1	$ 269.087,00	$ 269.087,00	53,70	$ 14.449.971,90
2	Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw	Tarifa-Hora	1	$ 204.788,00	$ 204.788,00	585,90	$ 119.985.289,20
3	Vibrocompactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn	Tarifa-Hora	1	$ 204.045,00	$ 204.045,00	113,50	$ 23.159.107,50
4	Vibro compactador autropulsado de rodillo de 10 t	Tarifa-Hora	1	$ 215.938,00	$ 215.938,00	0,00	$ -
5	Vibrocpmactador autropulsado de rodillo de3tn	Tarifa-Hora	1	$ 133.428,00	$ 133.428,00	0,00	$ -
6	minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible	Tarifa-Hora	1	133.632,00	$ 133.632,00	201,00	$ 26.860.032,00
7	Retroexcavadora 320-potencia 117kw	Tarifa-Hora	1	$ 276.892,00	$ 276.892,00	156,40	$ 43.305.908,80
8	volqueta de 6m3	Dia	1	936.000,00	$ 936.000,00	48,00	$ 44.928.000,00
9	camioneta pick up4x4 doble cabina	Dia	1	$ 357.172,00	$ 357.172,00	8,00	$ 2.857.376,00
10	camabaja transporte de maquinaria amarilla-capacidad mínima de 25 ton	Dia	1	$ 2.445.567,00	$ 2.445.567,00	0,00	$ -
11	Planchón transporte maquinaria amarilla-capacidad mínima 12ton	Dia	1	$ 1.776.567,00	$ 1.776.567,00	0,00	$ -
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 6.953.116,00**		**$ 275.545.685,40**
IVA 19%					$ 1.321.092,04		$ 52.353.680,23
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 8.274.208,04**		**$ 327.899.365,626**

3. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

1 Control financiero del contrato

En desarrollo de las funciones de supervisión, se realizó la verificación integral de la existencia, vigencia y validez de la documentación contractual exigida, incluyendo, entre otros, los documentos legales, administrativos, técnicos y financieros requeridos para la correcta ejecución del contrato. Así mismo, se efectuó la revisión detallada de los informes de avance, actas, planillas, soportes de ejecución y demás documentación presentada por el contratista, constatando su coherencia con las obligaciones contractuales y los términos establecidos en los documentos del proceso de contratación.

De manera complementaria, la supervisión llevó a cabo el seguimiento, control y verificación financiera del contrato, conforme a las condiciones pactadas y a los procedimientos administrativos definidos, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los recursos, el cumplimiento de los plazos contractuales y la observancia de los criterios de calidad, oportunidad y alcance previstos.

Como resultado de dicho seguimiento, se validaron los valores causados de acuerdo con el avance físico del contrato, dejando constancia de que estos se encuentran debidamente soportados y sujetos a los ajustes que puedan derivarse de revisiones posteriores, conciliaciones técnicas o cierres financieros.

A continuación, se presenta el cuadro resumen en el cual se relacionan las actas de pago tramitadas y canceladas al contratista, conforme a las certificaciones de avance, verificaciones realizadas y aprobaciones emitidas por la supervisión, constituyéndose este como soporte para los trámites administrativos y financieros correspondientes.

CUENTA	PERIODO	VALOR	PAGO ACUMULADO
PAGO PARCIAL 1	24/06/2025 AL 16/08/2025	$ 876.246.833,56	
PAGO PARCIAL 2	17/08/2025 AL 18/10/2025	$ 1.002.640.572,69	
PAGO PARCIAL 3	21/10/2025 AL 15/11/2025	$535.657.207,93	
PAGO PARCIAL 4	16 /11/2025 AL 29/11/2025	$263.449.404.379	
PAGO PARCIAL 5	30/11/2025 AL 13/12/2025	$130.999.322,160	
PAGO PARCIAL 6	27/01/2026 AL 14/03/2026	$267.315.944,41	
PAGO PARCIAL 7	15/03/2026 AL 09/05/2026	$327.899.365,626	$3.404.208.650,75
SALDO POR EJECUTAR			$813.868.976,255
SUMAS IGUALES		$4.218.077.627,00	$4.218.007,627,00

2

3 Exigencias al contratista para el desarrollo efectivo de sus funciones.

Se realizo la verificación de los documentos entregados por el contratista en el plazo pendiente por cobrar: 15/03/2026 al 09/05/2026, en lo que respecta al pago de seguridad social del personal entregados por el contratista. Se realizó la entrega por parte del contratista los soportes diarios, semanales y mensuales que verifican el cumplimiento de las cantidades reportadas.
4 Atención de consultas y reclamos realizados por la supervisión
Se subsanaron cada una de las solicitudes por parte de la supervisión con el fin de hacer el acompañamiento técnico y financiero.
5 Imposición de órdenes, instrucciones e indicaciones a la supervisión
Con el fin de garantizar una funcionalidad total del contrato, se solicitó la entrega de actas de satisfacción debidamente firmadas por los presidentes de las veredas intervenidas como soporte de las actividades realizadas.
6 Estudio y recomendaciones para cambios sustanciales del contrato.
No existen observaciones ya que se subsanaron todas las consideraciones descritas.
7 Seguimiento a la calidad de los servicios del contratista y aprobación de informes.
Se realizaron comités con el fin de verificar y realizar seguimiento a las labores del contratista. Se evidencia que el contratista ha cumplido con sus labores contractuales.
8 Verificación de disponibilidad de recurso técnico y humano del contratista
Se verifica el cumplimiento del personal utilizado por el contratista durante el periodo que corresponde desde el 15/03/2026 al 09/05/2026 Equipo de contratista

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	PENSIÓN	ARL	CAJA	SALUD
JHON EDWAR CHAPARRO ORTIZ	1.095.925.282	OPERADOR	PORVENIR	SURA	COMFENALCO	NUEVA EPS
EDUIN MIGUEL COLMENARES	1.099.546.664	OPERADOR	PROTECCION	SURA	COMFENALCO	FAMISANAR
EUDES MARTINEZ GOMEZ	91.260.175	OPERADOR	COLPENSIONES	SURA	COMFENALCO	NUEVA EPS
BLAS ANTONIO SALINAS TAPIA	1.051.358.683	OPERADOR	PROTECCION	SURA	COMFENALCO	SANITAS
NESTOR FABIAN PINZON RIVERA	1.098.687.774	OPERADOR	PROTECCION	SURA	COMFENALCO	NUEVA EPS
JOSE ANGEL RUEDA RUEDA	13.742.037	OPERADOR	PORVENIR	POSITIVA	COMFENALCO	SALUD MIA
PABLO HELI SALAZAR CORTES	91.477.338	OPERADOR	COLFONDOS	SURA	COMFENALCO	SANITAS
JEAN CARLOS GARCIA GOMEZ	1.098.737.465	OPERADOR	PORVENIR	SURA	COMFENALCO	SANITAS
JHONATHAN ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES	1.095.832.459	CONDUCTOR	COLPENSIONES	SURA	COMFENALCO	NUEVA EPS

ANTONIO QUINTERO HINESTROZA	13.716.955	CONDUCTOR	COLFONDOS	SURA	COMFENALCO	NUEVA EPS
CARLOS IVAN TOLOZA LARROTTA	1.101.691.637	CONDUCTOR	PORVENIR	SURA	COMFENALCO	COOSALUD
JORGE ELIECER GARCIA HERNANDEZ	91.344.155	CONDUCTOR	PROTECCION	SURA	COMFENALCO	SALUD TOTAL
ORLANDO JAIMES BASTO	91.288.107	CONDUCTOR	PORVENIR	SURA	COMFENALCO	SALUD TOTAL
HERNAN DARIO LAGUADO GONZALEZ	1.007.747.074	CONDUCTOR	PORVENIR	SURA	COMFENALCO	NUEVA EPS
FABIO ENRIQUE PEREZ AYALA	1.098.633.209	OPERADOR	PORVENIR	COLMENA	CAJASAN	NUEVA EPS
CRISTIAN HUMBERTO RUEDA RUEDA	1.101.200.633	OPERADOR	PORVENIR	COLMENA	CAJASAN	FAMISANAR
OSCAR AUGUSTO CUADROS	91.518.246	JEFE MANTENIMIENTO	PROTECCION	SURA	COMFENALCO	NUEVA EPS
EDGAR CUADROS LAGUADO	91.487.138	CONTRATISTA	COLPENSIONES	SURA	COMFENALCO	SURA

9 Actas Proyectadas del contrato

A la fecha se han diligenciado las siguientes actas:

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	VALOR
Valor inicial del contrato	24/06/2025		$2.818.077.627,00
Valor Adicional			$1.400.000.000,00
Valor Acta de pago parcial No 1	19/09/2025	$ 876.246.833,56	
valor Acta de pago parcial No 2 PRESENTE ACTA)	20/10/2025	$1.002.640.572,69	
Valor Acta de pago parcial No 3	05-12-2025	$535.657.207,93	
Valor Acta de pago parcial No 4	17-12-2025	$263.449.404,379	
Valor Acta de pago parcial No 5	10-02-2026	$130.999.322,160	
Valor Acta de pago parcial No 6	07-03-2026	$267.315.944,41	
Valor acta de pago parcial N°7	22-05-2026	$327.899.365,626	
PENDIENTE POR EJECUTAR		$813.868.976.255	
Sumas iguales		$ 4.218.077.627,00	$ 4.218.077.627,00

10 Entrega de Informe semanal del contratista

El CONTRATISTA ha presentado los informes en los formatos de calidad de la entidad y propios, en ellos incluye, el Avance físico y financiero del contrato, las principales Actividades ejecutadas en obra, el control sobre los Aspectos de técnicos, financieros, temas HSEQ, principales novedades y registros fotográficos.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Tras el riguroso seguimiento técnico a la ejecución del Contrato N°114-16-06-2025, y tras procesar el comportamiento operativo de la maquinaria en los tres corregimientos de Bucaramanga, se concluye lo siguiente:

- La supervisión realizó el control diario y sistemático de las actividades del contrato a través de los formatos de bitácora. Se verificó de manera oportuna el estado de los componentes críticos de operación, tales como el control de horómetros (inicio y fin), las horas efectivamente laboradas y los días de servicio de la maquinaria asignada
- Se constató la correcta distribución geográfica de la maquinaria, manteniendo una trazabilidad detallada de las intervenciones a nivel de veredas y corregimientos, garantizando así que los recursos e insumos se destinaran exclusivamente a las zonas de influencia priorizadas en el objeto contractual.
- Con base en el seguimiento de campo y las bitácoras consolidadas, se concluye que el contratista ha garantizado la disponibilidad, idoneidad y el rendimiento óptimo de la maquinaria, los equipos y el personal técnico/profesional asignado, cumpliendo de manera satisfactoria con el objeto del contrato.
- Existe una correlación adecuada y coherente entre el avance físico de las obras (medido en horas-máquina y volúmenes ejecutados en veredas y corregimientos) y el avance financiero registrado en las actas de pago parciales, demostrando una ejecución proporcional y transparente de los recursos.
- Ante el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas requeridas, el diligenciamiento oportuno de los soportes de control y el avance general de las actividades dentro de los plazos establecidos, esta supervisión emite concepto favorable respecto a la ejecución contractual del periodo evaluado..

ING CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ
Municipio de Bucaramanga
Supervisor.

Proyecto: Ing. Ivonne Vanessa Landazabal Valbuena CPS 351 SI
Reviso: Ing Diego Raul Villaveces Suarez Cps 244 SI

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 1ANTES DE LA INTERVENCION PEDREGAL-C3

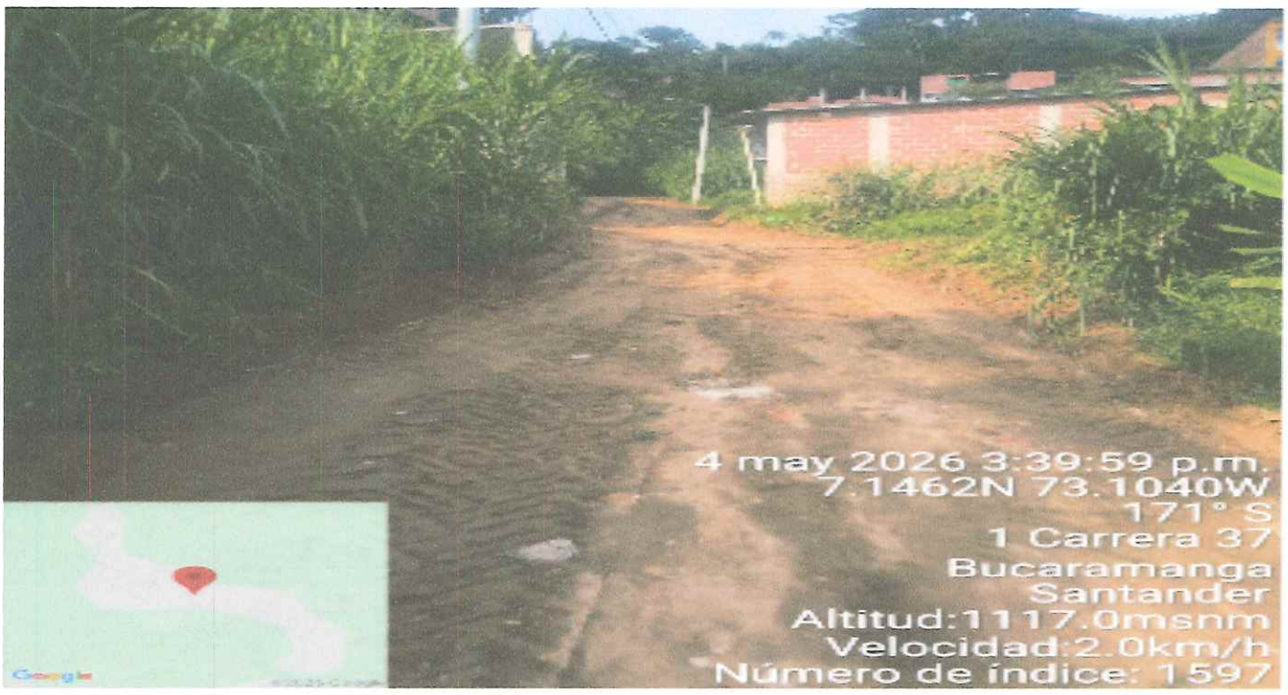


Ilustración 2DESPUES DE LA INTERVENCION PEDREGAL -C3

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 4 ANTES DE LA INTERVENCION -EL ABURRIDO



Ilustración 6 DESPUES DE LA INTERVENCION ABURRIDO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 7ANTES DE LA INTERVENCION CAPILLA ALTA-C2



Ilustración 9 DESPUES DE LA INTERVENCION CAPILLA ALTA-C2
