
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADRMINISTRATIVO

Conveniante Ejecutor	**MUNICIPIO DE JARDIN - ANTIOQUIA**
No. de Convenio	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2476 DE 2025**
Objeto:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN – ANTIOQUIA**
PLAZO	**El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de doce (12) meses con la prorroga contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de dic. de 2026.**
	Fecha de Inicio: 31/ 10/ 2025 Fecha de Terminación: 28/10/2026

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA DE TERMINACIÓN	MEDIO DE VERIFIACIÓN
1	**ETAPA PRECONTRACTUAL INTERNA DEL CONVENIO.**				
1.1	Suscripción del convenio entre Municipio y Gobernación.	23/10/2025	1	23/10/2025	25AS122C2476
1.2	Expedición de pólizas por parte del Municipio.	29/10/2025	1	29/10/2025	530-47-994000041610
1.3	Aprobación de pólizas por parte de la Gobernación.	31/10/2025	1	31/10/2025	APROBACIÓN GARANTIAS SC
1.4	Firma de Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo.	31/10/2025	1	31/10/2025	ACTA DE INICIO
1.5	Designación de Supervisión por parte del Municipio.	31/10/2025	1	31/10/2025	RAD ALC 100-16-05-264
1.6	Apertura de Cuenta en el IDEA	02/12/2025	1	02/12/2025	Cuenta 200001373
	ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (OBRA PUBLICA)				
1.7	Expedición de CDP	29/01/2026	1	30/01/2026	Certificado de disponibilidad presupuestal
1.8	Elaboración de estudios previos	30/01/2026	1	31/01/2026	Documento de estudios previos
1.9	Apertura proceso de selección del contratista	10/02/2026	10	20/02/2026	Documento de inivtación
1.10	Recepción de oferta	21/02/2026	1	21/02/2026	Carta de presentación de la oferta
1.11	Evalucaión de oferta	22/02/2026	1	22/02/2026	Documneto informe de evaluación
1.12	Subsanaciones	23/02/2026	2	24/02/2026	Correos electronicos
1.13	Adjudicación y Suscripción del CONTRATO DE OBRA DERIVADO	25/02/2026	1	25/02/2026	Notificaión de aceptación de la oferta y contrato
1.14	Expedicion del registro presupuestal RP	26/02/2026	2	27/02/2026	Certificado de registro presupuestal
1.15	Expedición de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO	28/02/2026	1	28/02/2026	Pólizas
1.16	Aprobación de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO POR EL MUNICIPIO.	01/03/2026	1	01/03/2026	Auto aprobatorio de pólizas
2	**ETAPA CONTRACTUAL - INTERNA DEL CONVENIO.**				
2.1	**Solicitud de Interventoría al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	02/03/2026	1	02/03/2026	
2.2	**Aprobación de Interventoría por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	29/04/2026	1	29/04/2026	Of. con Rad. 2026030106500
	ETAPA CONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (OBRA PUBLICA)				
2.3	SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA)	11/05/2026	1	11/05/2026	Acta de inicio
2.4	Ejecución de obra	11/05/2026	90	11/08/2026	Informes de seguimiento
2.5	Ejecución de Contrato de Interventoría	11/05/2026	120	11/09/2026	Informes de seguimiento
2.6	Suscripción del Acta de Terminación	11/08/2026	1	11/08/2026	Acta de terminación
2.7	Suscripción del Acta de recibo del Contrato de Obra	12/08/2026	30	11/09/2026	Acta de recibo
3	**ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONVENIO.**				
	ETAPA POS CONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (OBRA PUBLICA)				
3.1	Pagos Contraliquidación y Entrega de Expedientes Contractuales Completos del Derivado y Convenio	12/09/2026	45	27/10/2026	Expediente contractual
3.2	Suscripción acta de liquidación contrato derivado	11/09/2026	1	11/09/2026	Acta de liquidación

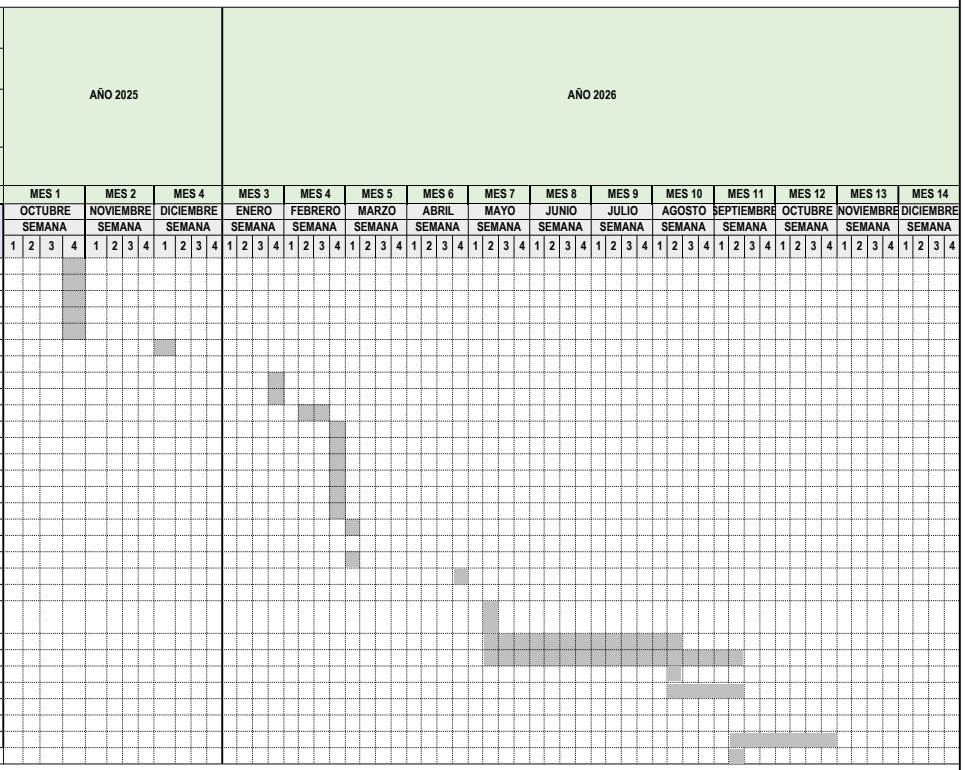

Nota 1: El plazo estimado de ejecución de la obra es de tres (3) meses. En caso de requerirse una prórroga, el contratista deberá solicitarla formalmente a la interventoría y al Departamento de Antioquia, adjuntando la justificación técnica, jurídica y financiera correspondiente, la cual será objeto de evaluación y aprobación por parte de la supervisión y ordenadores del gasto conforme a lo establecido en el convenio.

Alex Oñate

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
CC. 1.152.467.811
Cargo: SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO JARDIN - NIT 890982294-0

NATALIA NAVARRO E

Vo.Bo Natalia Navarro Echeverri
CC. 1.036.931.527
Cargo: Directora Acceso a la Justicia - SSJP

Vo.Bo. VICTOR AGUDELO
Cargo: Apoyo Tecnico - SSJP

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADRMINISTRATIVO

Conveniante Ejecutor	MUNICIPIO DE JARDIN - ANTIOQUIA
No. de Convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2476 DE 2025
Objeto:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE JARDIN – ANTIOQUIA
PLAZO	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder eltreinta y uno (31) de diciembre de 2026.
	Fecha de Inicio: 31/ 10/ 2025 Fecha de Terminación: 30/05/2026

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA DE TERMINACIÓN	COSTO DIRECTO	AU		TOTAL	AÑO 2026											
						31.36%	5%		MES 4				MES 5				MES 6			
									MARZO				ABRIL				MAYO			
									SEMANA				SEMANA				SEMANA			
									$ 1	$ 2	$ 3	$ 4	$ 1	$ 2	$ 3	$ 4	$ 1	$ 2	$ 3	$ 4
1	ETAPA PRECONTRACTUAL INTERNA DEL CONVENIO.																			
2	ETAPA CONTRACTUAL - INTERNA DEL CONVENIO.																			
3	EJECUCIÓN DE LA OBRA	06/03/2026	60	05/05/2026	$ 273,697,463	$ 85,831,524	$ 13,684,873	$ 380,803,861												
3.1	COLISEO DEL CAFÉ	06/03/2026		05/05/2026	**$ 136,393,417**	**$ 42,772,976**	$ 6,819,671	**$ 189,781,064**												
3.1.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	06/05/2026		05/05/2026	**$ 3,795,000**			$ 3,795,000	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667			
3.1.4	DESMONTE DE TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA METALICA ENTRE 20-40M DE ALTURA.	06/03/2026	17	23/03/2026	$ 29,075,316	$ 9,118,019	$ 1,453,766	$ 39,647,101	$ 13,215,700	$ 13,215,700	$ 13,215,700									
3.1.5	RETIRO DE CANOAS	24/03/2026	2	26/03/2026	$ 302,512	$ 94,868	$ 15,126	$ 412,506			$ 206,253	$ 206,253								
3.1.6	RETIRO DE BAJANTES Y/O TUBERÍAS EXPUESTAS EN MAL ESTADO.	24/03/2026	2	26/03/2026	$ 222,244	$ 69,696	$ 11,112	$ 303,052				$ 303,052								
3.1.7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA UPVC DE 2.5MM DE ESPESOR, O SU EQUIVALENTE. TERMOACÚSTICA. INCLUYE TORNILLO AUTORROSCANTE, TRASLAPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	27/03/2026	15	11/04/2026	$ 64,023,336	$ 20,077,718	$ 3,201,167	$ 87,302,221				$ 29,100,740	$ 29,100,740	$ 29,100,740						
3.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANOAS EN LÀMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 LONG. DESARROLLO 60 CM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE, COLOR A DEFINIR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	12/04/2026	7	19/04/2026	$ 2,438,072	$ 764,579	$ 121,904	$ 3,324,555						$ 1,662,278	$ 1,662,278					
3.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE DOBLE DE 3" Y/O 4" EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	12/04/2026	7	19/04/2026	$ 475,360	$ 149,073	$ 23,768	$ 648,201						$ 324,100	$ 324,100					
3.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA DE PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS, BOCAS, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	12/04/2026	7	19/04/2026	$ 1,937,190	$ 607,503	$ 96,860	$ 2,641,553						$ 1,320,776	$ 1,320,776					
3.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3MM PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	20/04/2026	4	24/04/2026	$ 19,713,297	$ 6,182,090	$ 985,665	$ 26,881,052							$ 13,440,526	$ 13,440,526				
3.1.12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 300W, PARA AREAS DEPORTIVAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	25/04/2026	5	30/04/2026	$ 18,206,090	$ 5,709,430	$ 910,305	$ 24,825,825								$ 24,825,825				
3.1.13	LIMPIEZA DE OBRA	01/05/2026	2	03/05/2026													$ 0			
3.1.14	RECIBO DE OBRA	04/05/2026	1	05/05/2026													$ 0			
3.2	ESTADIO CITARÁ	06/03/2026	60	05/05/2026	**$ 137,304,046**	$ 43,058,549	**$ 6,865,202**	**$ 191,022,797**												
3.2.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	06/03/2026		05/05/2026	**$ 3,795,000**			$ 3,795,000	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667	$ 421,667			
3.2.2	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO, PLACA O ANDÉN DE CUALQUIER RESISTENCIA, INCLUYE CORTES CON PULIDORA O CORTADORA DE PISO.	06/03/2026	4	10/03/2026	**$ 18,165**	$ 5,697	$ 908	$ 24,770	$ 12,385	$ 12,385										
3.2.3	CONSTRUCCIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PISOS EN DOSIFICACIÓN 1:4, INCLUYE SEPARACIONES PERIMETRALES Y DILATACIONES.	11/03/2026	4	15/03/2026	$ 41,803	$ 13,109	$ 2,090	$ 57,003		$ 28,501	$ 28,501									
3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA COLOR A DEFINIR EN FORMATO MÁXIMO 60*60, INCLUYE MATERIAL DE PEGA, SEPARADORES, NIVELADORES Y EMBOQUILLADO DE JUNTAS.	16/03/2026	7	23/03/2026	$ 51,703	$ 16,214	$ 2,585	$ 70,502			$ 35,251	$ 35,251								
3.2.5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE USO EXTERNO DE 1000W Y 150000LM, PARA AREAS DEPORTIVAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	24/03/2026	29	22/04/2026	$ 136,875,888	$ 42,924,278	$ 6,843,794	$ 186,643,961				$ 37,328,792	$ 37,328,792	$ 37,328,792	$ 37,328,792	$ 37,328,792				
3.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES DE 4" PVC SANITARIA. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN (CODOS, UNIONES, YEES, TEES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	23/04/2026	4	27/04/2026	$ 316,487	$ 99,250	$ 15,824	$ 431,562								$ 431,562				
3.2.7	LIMPIEZA DE OBRA	28/04/2026	5	03/05/2026												$ 0	$ 0			
3.2.8	RECIBO DE OBRA	04/05/2026	1	05/05/2026													$ 0			
4	TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN				$ 380,803,861				$ 14,071,419	$ 14,099,920	$ 14,329,039	$ 67,817,422	$ 67,272,866	$ 70,580,020	$ 54,919,806	$ 76,870,038	$ 843,333	$ 0	$ 0	$ 0

Nota 1: El plazo estimado de ejecución de la obra es de dos (2) meses. En caso de requerirse una prórroga, el contratista deberá solicitarla formalmente a la interventoría y al Departamento de Antioquia, adjuntando la justificación técnica, jurídica y financiera correspondiente, la cual será objeto de evaluación y aprobación por parte de la supervisión y ordenadores del gasto conforme a lo establecido en el convenio.

Alex Oñate

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
CC. 1.152.467.811
Cargo: SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO JARDIN - NIT 890982294-0

NATALIA NAVARRO E

Vo.Bo Natalia Navarro Echeverri
CC. 1.036.931.527
Cargo: Directora Acceso a la Justicia - SSJP

Vo.Bo. VICTOR AGUDELO
Cargo: Apoyo Tecnico - SSJP
