INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

CONSORCIO CAMINOS IP

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ICCU – CTO 258 DE 2025

OBJETO

CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU – CTO 258 DE 2025

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA No. 11

PERIODO

20 DE MARZO DE 2026 AL 20 DE ABRIL DE 2026

BOGOTÁ D.C, ABRIL DE 2026

Contrato de Consultoría No. ICCU – CTO 258 DE 2025

Contratista: **CONSORCIO CAMINOS IP**

Contrato de Interventoría No.

Interventoría: **Consorcio Litoral MC -Interventoría**

Objeto Contrato de Obra:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS

INFORME MENSUAL No. 11

MES O PERIODO: 11

ICCU_493_CX_F3_TR_VI_NAP_INM_11

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual		2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introducción		4
2	Descripción del proyecto		5
2.1	Localización		5
3	Información Contrato de Consultoría.		9
3.1	Actividades ejecutadas en el mes		10
3.2	Informe semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	13

3.3	Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	14
3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato Consultoría		16
3.5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	18
3.6	Seguimiento al Plan de Calidad		18
3.6.1	Seguimiento Programa		19
4	Información contrato de interventoría		20
5	Conclusiones y recomendaciones		22
6	Anexos		24
6.1	Correspondencia		24

Firma: _____

Nombre: **Santiago Páez Talero**

DIRECTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Tarjeta Profesional: 2520240972CND

Original: Informe mensual de Consultoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

1 Introducción

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) llevó a cabo el proceso de contratación No. ICCU–CM-044 de 2024 para la realización de estudios y diseños de corredores viales en el departamento de Cundinamarca. Como resultado de la evaluación de las ofertas, el ICCU adjudicó el contrato de Consultoría por medio de la resolución No. 125 de 2025, correspondiente a los corredores contemplados al Lote 2 al Consorcio CAMINOS IP.

El objeto del contrato es la ejecución de estudios y diseños para la vía desde el casco urbano de Madrid hasta la inspección Puente Piedra, la vía desde la inspección La Magdalena hasta el casco urbano del municipio de Quebradanegra y la vía desde el casco urbano de Cáqueza al sector Placitas. La duración del contrato será de ocho meses.

El Consorcio CAMINOS IP está conformado por Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A. (60%) y Pavimentos y Geotecnia S.A.S. (40%), quienes asumirán la responsabilidad de desarrollar los estudios en los términos y condiciones definidos por el ICCU. Esta adjudicación garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos exigidos, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura vial en Cundinamarca.

En este contexto, los Estudios y Diseños a desarrollar a nivel de Fase III, se adelantarán de conformidad con lo estipulado en los Términos de Referencia, en el Anexo Técnico, así como en todos los demás documentos que forman parte del proceso licitatorio y de los escritos que hacen parte integral del Contrato, así como en los manuales y guías de diseño elaborados y/o adoptados por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

El presente documento corresponde al Informe Mensual No. 11 del periodo del 20 de marzo al 20 de abril de 2026, documento que presenta el seguimiento a las actividades ejecutadas por la Consultoría en el periodo indicado.

2 Descripción del proyecto

El 20 de mayo de 2025 se formalizó el acta de inicio del presente contrato. Según el cronograma de trabajo y el contrato de Consultoría, con un plazo de ocho (8) meses y/o al 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Con el fin de dar la respectiva ejecución del contrato de Consultoría, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) celebró el contrato ICCU - 258 de 2025 (CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS) – lote 2 con la firma CONSORCIO CAMINOS IP.

2.1 Localización

2.1.1 Corredor Vial Madrid – Puente Piedra.


El corredor vial entre el municipio de Madrid y la inspección de Puente Piedra es una ruta clave en el departamento de Cundinamarca, que conecta el municipio de Madrid con la zona rural de Puente Piedra, facilitando el transporte tanto de pasajeros como de carga. Esta vía, de aproximadamente 13.0 kilómetros de longitud, atraviesa un paisaje predominantemente agrícola, con cultivos de flores, papa y hortalizas, que son la base económica de la región. Su importancia radica en su rol como enlace entre la Sabana de Occidente y Bogotá, permitiendo el flujo de productos locales hacia los mercados urbanos.

La vía presenta una mezcla de tramos pavimentados y en afirmado. En épocas de lluvia, algunos sectores pueden deteriorarse, afectando la movilidad, especialmente en zonas rurales donde el tránsito de maquinaria agrícola es frecuente. A pesar de esto, el corredor es fundamental para el transporte público, con servicios de busetas y colectivos que cubren la ruta, así como para el tráfico de camiones que transportan mercancías desde las fincas y empresas floricultoras de la zona.

En los últimos años, se han llevado a cabo proyectos de mantenimiento y mejoramiento por parte de la Gobernación de Cundinamarca y las administraciones locales, buscando optimizar la conectividad y seguridad vial. Sin embargo, el desarrollo de esta vía es crucial para impulsar la

economía regional y garantizar una movilidad eficiente para los habitantes y comerciantes de la zona.

Ilustración 1. Localización General – Corredor vial Madrid hacia Puente Piedra

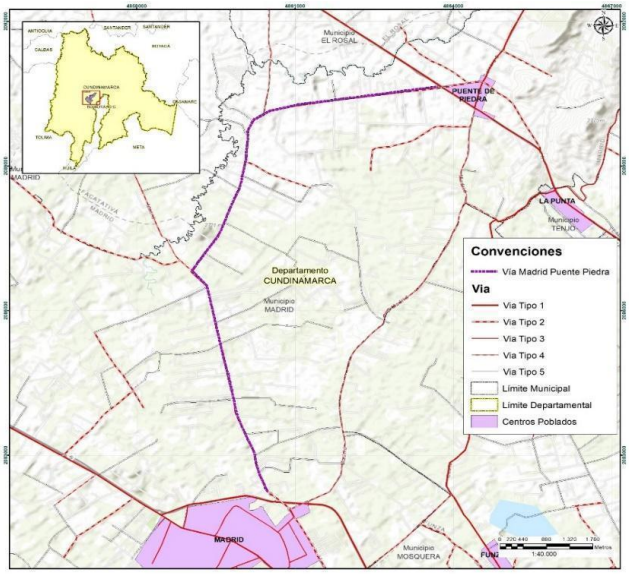

Fuente: Elaboración Propia.


2.1.2 Corredor Vial Magdalena – Quebradanegra.

El corredor vial entre la Inspección de La Magdalena y el municipio de Quebradanegra constituye una importante ruta de conexión en el occidente de Cundinamarca, atravesando un territorio de topografía quebrada característico de la región del Tequendama. Esta vía, de aproximadamente 5.2 kilómetros de longitud, facilita el transporte de pasajeros y productos agrícolas entre zonas rurales y urbanas. Su trazado serpenteante discurre por paisajes de bosque andino y áreas de cultivo, donde predominan actividades como la caficultura, la producción de plátano y la ganadería de pequeña escala.

La infraestructura vial presenta condiciones variables a lo largo de su recorrido, la geomorfología montañosa del área exige mantenimiento constante para prevenir derrumbes y garantizar la transitabilidad, particularmente en zonas de pendientes pronunciadas. El corredor es vital para las comunidades aledañas, siendo utilizado principalmente por transporte público informal (jeeps y camperos) que movilizan a los habitantes de veredas dispersas hacia el centro municipal de Quebradanegra.

Desde la perspectiva socioeconómica, esta vía reviste gran importancia para el desarrollo local al constituir el principal eje de conexión para el comercio de productos agropecuarios y el acceso a servicios básicos. No obstante, presenta desafíos significativos en materia de seguridad vial e infraestructura, especialmente durante épocas de lluvias cuando aumentan los riesgos de deslizamientos. Su mejoramiento representaría un avance crucial para dinamizar la economía rural y potencializar el turismo ecológico en la región, aprovechando los atractivos naturales como cascadas y senderos que caracterizan este territorio montañoso de Cundinamarca.

Ilustración 2. Localización General – Corredor vial La Magdalena hacia Quebradanegra

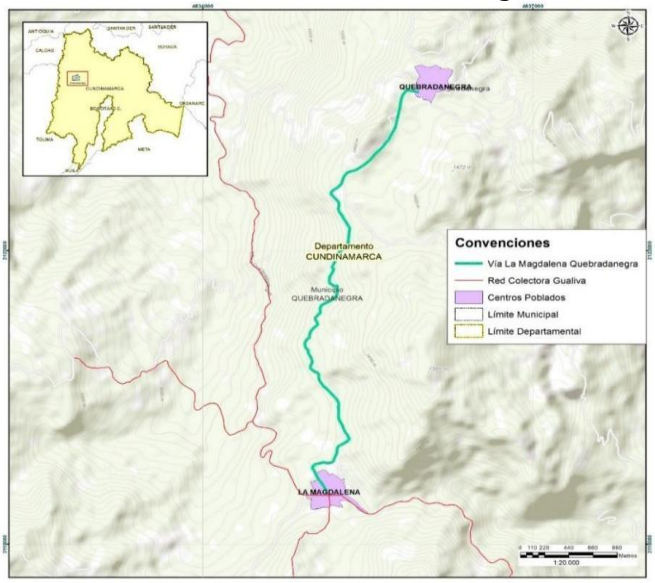

Fuente: Elaboración Propia.


2.1.3 Corredor Vial Cáqueza – Placitas.

El corredor vial de 2 kilómetros que conecta el casco urbano de Cáqueza con la vía principal nacional constituye un enlace estratégico para la movilidad y desarrollo del municipio. Aunque de corta extensión, esta ruta cumple una función vital al integrar la zona urbana con la red nacional de carreteras, facilitando el flujo de pasajeros, mercancías y el acceso a servicios esenciales. El trayecto atraviesa un entorno periurbano caracterizado por la transición entre áreas residenciales, pequeños comercios y zonas de cultivo, reflejando la dinámica socioeconómica propia de municipios intermedios en la región.

La vía presenta características adecuadas para su función, una topografía con pendientes fuertes. El tráfico vehicular es moderado, con predominio de transporte público (busetas y camperos), vehículos particulares y motocicletas que utilizan este corredor como principal conexión con la red vial nacional.

La importancia socioeconómica de este corredor desproporcionada a su corta longitud, ya que funciona como eje articulador del comercio local, permitiendo el transporte eficiente de productos agrícolas y manufacturados hacia los mercados regionales. Además, facilita el acceso de la población a servicios fundamentales como salud y educación. Las intervenciones para proponer garantizarán la funcionalidad permanente de este enlace vial estratégico que, pese a sus solo 2 kilómetros de extensión, representa la principal conexión de Cáqueza con el sistema vial nacional y el desarrollo regional.

Ilustración 3. Localización General – Corredor vial Cáqueza hacia sector Placitas

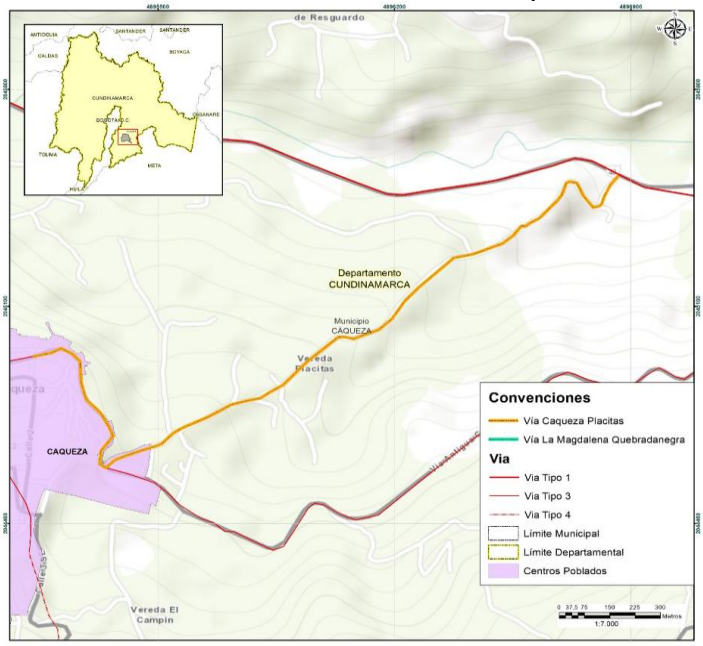

Fuente: Elaboración Propia.

3 Información Contrato de Consultoría.

A continuación, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría.

Tabla 1. Información Contrato Consultoría

Tipo de Contrato:	Consultoría
Contrato:	ICCU – CTO 258 DE 2025
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS
Contratista	CONSORCIO CAMINOS IP
NIT	901.917.475-1
Supervisor	LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
Apoyo a Supervisión	JHON WILLIAM ARDILA BACCA
Plazo de ejecución:	8 meses y/o 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	20 de mayo de 2025
Fecha de terminación:	20 de abril de 2026
Valor del contrato:	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 2.430.458.478,00)

Fuente: Elaboración Propia.

3.1 Actividades ejecutadas en el mes

- A continuación, se relaciona el estado de entregas y aval de todos los volúmenes que se han realizado hasta el momento en los tres frentes de estudio.

Tabla 2. Seguimientos las entregas y aval por volúmenes

METAS FÍSICAS CONSORCIO CAMINOS IP		VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA	VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA
VOLUMEN I	**Estudio de Transporte**	Avalado oficio CLM.287.25-062 del 06-nov a V3 entregada mediante cod 3504.	Avalado oficio CLM.287.25-075 del 26-nov a V2 entregada mediante cod 3757.	Avalado oficio CLM.287.25-075 del 26-nov a V2 entregada mediante cod 3757.
VOLUMEN II	**Estudio de Topografía se entregó 14 de octubre (Catastro redes)**	Aprobado oficio CLM.287.25-115 del 19-feb a V1 entregada el 03-feb mediante cod 0275.	Aprobado oficio CLM.287.25-114 del 19-feb a V1 entregada el 03-feb mediante cod 0276.	Aprobado oficio CLM.287.25-113 del 19-feb a V1 entregada el 10-feb mediante cod 0350.
	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial y plan de manejo de tránsito	Aprobación con observaciones oficio CLM.287.25.221 a V2 entregada el 09-abr mediante cod 1028.	Aprobación con observaciones oficio CLM.287.25.222 a V2 entregada el 09-abr mediante cod 1026.	Aprobación con observaciones oficio CLM.287.25.223 a V2 entregada el 09-abr mediante cod 1027.
VOLUMEN III	**Geología para ingeniería**	Aprobado oficio CLM.287.25-184 a V3 entregada mediante cod 0536.	Aprobado oficio CLM.287.25.119 del 19-feb a V3 entregada el 04-feb mediante cod 0287.	Aprobado oficio CLM.287.25.120 del 19-feb a V3 entregada el 05-feb mediante cod 0311.
VOLUMEN IV	**Estudios de suelos para el diseño de fundaciones y otras estructuras de**	Aprobado oficio CLM.287.25.123 del 19-feb a V3 entregada el	Aprobado oficio CLM.287.25.131 del 19-feb a V2	Aprobado oficio CLM.287.25.132 del 19-feb a V1

METAS FÍSICAS CONSORCIO CAMINOS IP		VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA	VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA
	contención	31-dic mediante cod 4288.	entregada el 29-dic mediante cod 4267.	entregada el 30-dic mediante cod 4268.
VOLUMEN V	**Estudio de estabilidad y estabilización de taludes**	Aprobado oficio CLM.287.25.123 del 19-feb a V3 entregada el 31-dic mediante cod 4289.	Aprobado oficio CLM.287.25.131 del 19-feb a V2 entregada el 29-dic mediante cod 4267.	Aprobado oficio CLM.287.25.132 del 19-feb a V1 entregada el 30-dic mediante cod 4268.
VOLUMEN VI	**Estudio geotécnico y diseño de pavimento**	Aprobado oficio CLM.287.25-117 del 19-feb a V4 entregada mediante cod 3856.	Aprobado oficio CLM.287.25-116 del 19-feb a V3 entregada mediante cod 0381.	Aprobado oficio CLM.287.25-150 del 25-feb a V2 entregada el 23-feb mediante cod 0480.
VOLUMEN VII	**Estudio de fuentes de materiales**	Avalado oficio CLM.287.25-057 del 30-oct a V1 entregada mediante cod 3386.	Avalado oficio CLM.287.25-066 del 13-nov a V1 entregada mediante cod 3561.	Aval parcial oficio CLM.287.25-133 a V1 entregada el 19-feb mediante cod 0430.
VOLUMEN VIII	**Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación**	Aprobado oficio CLM.287.25.192 a V2 entregada el 19-mar mediante cod 0809.	Aprobación oficio CLM.287.25-227 a V3 entregada el 13-abr mediante cod 1060.	Aprobación oficio CLM.287.25-226 a V3 entregada el 13-abr mediante cod 1062.
VOLUMEN IX	**Estudios y diseños de estructuras**	Aprobación oficio CLM.287.25.231 a V3 entregada el 09-abr mediante cod 1034.	Aprobación oficio CLM.287.25.230 a V2 entregada el 13-abr mediante cod 1067.	Aprobación oficio CLM.287.25.229 a V1 entregada el 01-abr mediante cod 0960.
VOLUMEN X	**Estudio de gestión ambiental y social del proyecto o estudio de**	Aprobado oficio CLM.287.25.204 a V2 entregada el 06-abr	Aprobado oficio CLM.287.25-189 a V2 entregada el 20-	Aprobado oficio CLM.287.25.205 a V2 entregada el 06-abr

METAS FÍSICAS CONSORCIO CAMINOS IP		VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA	VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA
	diagnóstico ambiental	mediante cod 0951.	mar mediante cod 0821.	mediante cod 0967.
VOLUMEN XI	**Gestión predial**	Aprobado oficio CLM.287.25.233 a V3 entregada el 06-abr mediante cod 1096.	Aprobado oficio CLM.287.25-216 a V2 entregada el 01-abr mediante cod 0955.	Aprobado oficio CLM.287.25.232 a V3 entregada el 01-abr mediante cod 1097.
VOLUMEN XII	**Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones**	Enviada V2 el 16-abr mediante cod 1099.	Enviada V1 el 15-abr mediante cod 1083.	Enviada V1 el 17-abr mediante cod 1103.
VOLUMEN XIII	**Informe final ejecutivo**	Enviada V1 el 16-abr mediante cod 1100.	Enviada V1 el 16-abr mediante cod 1098.	Enviada V1 el 16-abr mediante cod 1101.

Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo con lo presentado en la tabla 2, el corredor vial Cáqueza – sector Plácitas, el corredor Madrid – inspección Puente Piedra y el corredor Quebradanegra cuentan con aval de la interventoría para el Volumen I – Estudio de Transporte. Adicionalmente, los corredores de Cáqueza y Madrid cuentan con aval para el Volumen VII – Estudio de fuentes de materiales, mientras que el corredor de Quebradanegra dispone de un aval parcial para este mismo volumen.

Durante el periodo analizado, para el corredor vial de Cáqueza se evidencia la entrega del Volumen II – Estudio de Topografía. Así mismo, se realizó la entrega de la versión 3 del Volumen III – Geología para ingeniería. Los Volúmenes IV y V, correspondientes a los Estudios de suelos para el diseño de fundaciones y otras estructuras de contención y al Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, cuentan con aprobación de la versión 3. De igual manera, el Volumen VI – Estudio geotécnico y diseño de pavimento fue aprobado en su versión 4. Durante este periodo también se efectuó la entrega de la versión 1 del Volumen VIII – Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, se recibieron observaciones a la versión 1 del Volumen IX – Estudios y

diseños de estructuras, se entregó la versión 1 del Volumen X – Estudio de gestión ambiental y social (PAGA) y se recibieron observaciones a la versión 1 del Volumen XI – Gestión predial.

Para el corredor vial de Madrid, se cuenta con la aprobación del Volumen II – Estudio de Topografía en su versión 1. Así mismo, el Volumen III – Geología para ingeniería se encuentra aprobado en su versión 3. Los Volúmenes IV y V, correspondientes a los Estudios de suelos para el diseño de fundaciones y otras estructuras de contención y al Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, fueron aprobados en su versión 2, y el Volumen VI – Estudio geotécnico y diseño de pavimento cuenta con aprobación en su versión 3. Durante el periodo se realizó además la entrega de la versión 1 del Volumen VIII – Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación y de la versión 1 del Volumen IX – Estudios y diseños de estructuras, así como la entrega de la versión 1 del Volumen X – Estudio de gestión ambiental y social (PAGA). Finalmente, para el Volumen XI – Gestión predial se recibieron observaciones a la versión 1.

El corredor vial de Quebradanegra, se registra la aprobación del Volumen II – Estudio de Topografía en su versión 1 y la aprobación de la versión 3 del Volumen III – Geología para ingeniería. Los Volúmenes IV y V, correspondientes a los Estudios de suelos para el diseño de fundaciones y otras estructuras de contención y al Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, se encuentran aprobados en su versión 1. Para el Volumen VI – Estudio geotécnico y diseño de pavimento se evidencia la atención de observaciones a la versión 1. Así mismo, se realizó la entrega de la versión 1 del Volumen VIII – Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, mientras que el Volumen IX – Estudios y diseños de estructuras no presenta entregas durante el periodo analizado. Por su parte, el Volumen X – Estudio de gestión ambiental y social (PAGA) cuenta con observaciones a la versión 1, y el Volumen XI – Gestión predial se encuentra entregado en su versión 1.

En relación con el Estudio de trazado y diseño geométrico, el Estudio de señalización y seguridad vial y el Plan de manejo de tránsito, para los corredores viales de Cáqueza, Madrid y Quebradanegra se presenta una situación equivalente, en la cual la interventoría, mediante los oficios CLM.287.25-106, CLM.287.25-107 y CLM.287.25-108, respectivamente, solicitó el 6 de febrero la actualización de los planos con el fin de emitir el aval correspondiente; sin embargo, de acuerdo con lo indicado en la tabla, no es posible remitir los planos definitivos de este volumen hasta tanto se cuente con los estudios y diseños aprobados de todas las especialidades, encontrándose actualmente este componente en versión 2 para los tres corredores.

Para el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril, se destaca la remisión a la interventoría de los volúmenes firmados correspondientes a Geología para ingeniería (Volumen III), Estudios de suelos para fundaciones y estructuras de contención (Volumen IV), Estabilidad y estabilización de taludes (Volumen V) y Estudio geotécnico y diseño de pavimento (Volumen VI), en sus respectivas versiones aprobadas para los tres corredores viales. Así mismo, se efectuó la entrega y atención de observaciones del Volumen VIII – Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, obteniéndose aprobación

de las versiones correspondientes para los corredores de Cáqueza, Madrid y Quebradanegra mediante los oficios CLM.287.25-228, CLM.287.25-227 y CLM.287.25-226, respectivamente.

De igual manera, se adelantó la atención de observaciones y actualización del Volumen IX – Estudios y diseños de estructuras, obteniéndose aprobación de las versiones correspondientes para los tres corredores viales mediante los oficios CLM.287.25-231, CLM.287.25-230 y CLM.287.25-229. En el componente ambiental correspondiente al Volumen X – Estudio de gestión ambiental y social (PAGA), se realizó la atención de observaciones y entrega de las versiones ajustadas, obteniéndose aprobación para los corredores de Cáqueza, Madrid y Quebradanegra mediante los oficios CLM.287.25-204, CLM.287.25-189 y CLM.287.25-205.

Por otra parte, se realizó la actualización y entrega de los componentes asociados al Volumen XI – Gestión predial, obteniéndose aprobación para los corredores de Cáqueza y Quebradanegra mediante los oficios CLM.287.25-233 y CLM.287.25-232, mientras que para el corredor de Madrid se encuentra en trámite de revisión bajo oficio CLM.287.25-216. Finalmente, durante el periodo se efectuó la entrega de los Volúmenes XII – Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto y XIII – Informe final ejecutivo para los tres corredores, consolidando así el avance en la actualización y ajuste de los diferentes componentes técnicos del proyecto.
.

3.2 Informe semanal

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se anexan a este informe mensual de consultoría los informes semanales de interventoría correspondientes al período evaluado. Estos documentos reflejan el seguimiento periódico realizado al desarrollo y cumplimiento de las actividades propias del contrato de consultoría, de acuerdo con el alcance, cronograma y obligaciones establecidos. En ellos se consigna la verificación del avance de los productos, la revisión de los entregables, así como las observaciones técnicas y recomendaciones orientadas a garantizar la adecuada ejecución del contrato.

3.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

En el presente informe mensual de consultoría se presenta la relación del personal vinculado durante el periodo objeto de reporte, como parte del seguimiento administrativo del contrato y

del control de las obligaciones asociadas a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. En informes mensuales anteriores se remitieron a la Interventoría las hojas de vida de los profesionales vinculados, mediante los comunicados No. 2025-493-ICU-1402, 2025-493-ICU-1661, 2025-493-ICU-1706 y 2025-493-ICU-2000. Considerando la dinámica propia de la ejecución contractual y la incorporación de personal adicional durante el periodo, se actualiza la información correspondiente e incorpora la tabla del Formato MS-GC-FR-013 "Herramienta Base Revisión Cálculo de Seguridad Social", debidamente diligenciada, como soporte del control realizado.

Tabla 5. Personal de Consultoría

CARGO	PROFESIONAL
Director del proyecto	Santiago Páez
Especialista en pavimentos	Miguel Alfredo García Fajardo
Especialista en tránsito y transporte	Fabian Tafur Sánchez
Especialista en seguridad vial	Dayana Alexander Betancourt
Especialista en geotecnia	Luis Francisco Montes Buriticá
Especialista en diseño geométrico	Fabio Ernesto Villamil Páez
Especialista en BIM 1	José Joaquín Cortes
Especialista en BIM 2	Andrés Villamil
Especialista en estructuras 1	Raúl Enrique Lozano Mora
Especialista en estructuras 2	Jorge Iván Arias
Especialista ambiental	Milena García Pastor
Geólogo 1	Justo Pastor Padilla Acosta
Geólogo 2	Pedro Joaquín Perilla
Profesional gestor social 1	Diana Milena Hurtado
Profesional gestor social 2	Carolina Gómez
Profesional de costos y presupuestos	Jorge Iván Arias
Profesional de costos y presupuestos	Katherin Urrego Espejo

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero residente - apoyo consultoría	Daniel Steven León
Ingeniero residente - apoyo consultoría	Daniela Sofia Montes Rivera
Ingeniero residente - apoyo consultoría	José Emerson parra
Ingeniero residente - apoyo consultoría	Valentina Hoyos Soto
Ingeniero residente - apoyo consultoría	Manuela Pardo Miranda
Abogado	Leidy Morales
Dibujante	José Fernando Penagos Ángel
Dibujante	Juan Carlos Castilla Méndez
Dibujante	Carolina Guarín
Dibujante	Camila Serrano
Aforadores	Danilo Campo
Secretaria	Gloria Muñoz
Secretaria	Janeth Casallas

Fuente: Elaboración Propia.

3.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato Consultoría

La forma de pago establecida contemplaba un anticipo, en donde el CONSORCIO CAMINOS IP tomó la decisión de desistir del mismo, A continuación, se relaciona la forma de pago.

Tabla 6. Distribución Actas de Pago Consultoría

No. De Pago	Valor (IVA Incluido)	%Avance Contrato	Producto entregado y aprobado
Primer pago	$ 364.568.772,00	15%	PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO
Segundo pago	$ 364.568.772,00	15%	Ejecución del 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo
Tercer pago	$ 486.091.695,00	20%	Ejecución del restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo
Cuarto pago	**$ 972.183.391,00**	**40%**	El 40% de cada volumen se pagará en pagos parciales por volúmenes independientes una vez, entregado y aprobado cada volumen por la interventoría y la supervisión.
Quinto pago	$ 243.045.848,00	10%	Una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría
Total	**$ 2.430.458.478,00**	**100%**	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 7. Detalle Financiero Consultoría

Descripción	Valor ($)	%

Valor del Contrato (IVA incluido):	$ 2.430.458.478,00	100,00%
Valor facturado:	$ 1.215.229.239,000	50,00%
Valor facturado pagado:	$ 729.137.544,0	30,00%
Saldo por facturar:	$ 486.091.695,6	20,00%

No. Pago	**Concepto**	**Valor Facturado**	**Valor Acumulado**	**% Ejec. Acumulado**
1	Primer pago (mayo-junio).	$ 364.568.772,00	$ 364.568.772,00	15,00%
2	Segundo pago (junio- octubre)	$ 364.568.772,00	$ 729.137.544,00	30,00%
3	Tercer pago (octubre-noviembre)	$ 486.091.695,6	$ 1.215.229.239,000	50%
	Total	**$** $1.215.229.239,000		

Fuente: Elaboración Propia.

3.5 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se presentan las pólizas contractuales y las garantías asociadas al contrato de consultoría, las cuales respaldan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aseguran la vigencia y cobertura exigidas por la Entidad.

Tabla 8. Información Pólizas de Cumplimiento Consultoría

Póliza		**Amparo**	**Vigencia**		
			Desde	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	310 47 994000015 204	Cumplimiento del contrato	25/03/2025	19/09/2026	$ 243.045.847.8
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	25/03/2025	19/03/2029	$ 486.091.695,6
		Calidad del Servicio	19/03/2026	19/03/2031	$ 729.137.543,4

Fuente: Elaboración Propia.

3.6 Seguimiento al Plan de Calidad

A continuación, se relacionan los indicadores de gestión del contrato.

Tabla 9. Indicadores de Calidad

Indicador	**Fórmula**	**Periodicidad de medición**	**Resultado**	**Detalle**
Nivel de cumplimiento de obligaciones pactadas	(50 Obligaciones Cubiertas / Total 50 Obligaciones) x 100	Mensual	100%	Se consideran en total 50 obligaciones teniendo en cuenta las 20 generales detalladas en cláusula 9 del contrato y las 30 específicas detalladas en la cláusula 10.

Indicador	Fórmula	Periodicidad de medición	Resultado	Detalle
				Con corte al 19 de enero de 2026 no se han presentado desviaciones en las obligaciones contractuales
Nivel de cumplimiento de los trece volúmenes pactados	(30 Volúmenes aprobados / Total Volúmenes al corte) x 100	Incremental (Avance según cronograma)	76.92%	En este undécimo mes del contrato se avanza con el desarrollo de los volúmenes de cada una de las vías del lote 2. Se culminan los trabajos de campo de los diferentes volúmenes.
Valoración de la supervisión del contrato	Resultado encuesta de satisfacción	Trimestral	100%	Esta medición se realiza de manera trimestral, se está a la espera de la valoración correspondiente.
Cumplimiento de ejecución presupuestal	Valor pagado / Valor programado	Mensual	81%	En este undécimo mes del contrato se realizaron los trámites para el Acta de Costos Consultoría _CAMINOS_IP por un valor de $1,963,963,142.00, en este momento se está proyectando el Acta de Costos Consultoría No.4 para presentación a la interventoría y entidad contratante.
Nivel de Cubrimiento del cronograma de actividades	(Actividades finalizadas al corte / Actividades vencidas al corte) x 1000	Mensual	100%	En este undécimo mes del contrato se terminaron las actividades de campo para los componentes de estudio correspondientes y el procesamiento de la información.

Fuente: Elaboración Propia.

3.6.1 Seguimiento Programa

Como parte del seguimiento a la programación del proyecto, se anexa al presente informe el cronograma general de ejecución, elaborado en Project. Dicho cronograma constituye la programación base del contrato e integra la secuencia y duración de las actividades previstas, sirviendo como referencia para el control y seguimiento del avance durante el desarrollo del proyecto.

El cronograma de trabajo (pdf y mpp), corresponde a una tercera versión, toda vez que, se recibieron observaciones por parte de la Interventoría por medio del comunicado CLM.287.25-007 del 16 de junio de 2025 y recomendaciones mediante el oficio No. CLM.287.25-012 del 15 de julio de 2025, con respuesta por parte del Consorcio Caminos IP mediante el comunicado 2025-493-ICU-2086 del 17 de julio en donde se entregaron los cronogramas actualizados para cada tramo de estudio, en este momento teniendo en cuenta las fechas de los trabajos de campo y las próximas entregas de los diferentes volúmenes de estudio y por solicitud de la interventoría en el comité del 18 de septiembre se proyectó una reprogramación de las fechas de entrega.

Se deja constancia de que el 2 de febrero de 2026 se realizó la entrega de los cronogramas ajustados, posteriores a la solicitud de prórroga, mediante el comunicado 2026-493-ICU-0257. Dadas las emergencias presentadas en el tramo de Quebradanegra, se solicita nuevamente una prórroga en tiempo por 1 mes del 20 de febrero al 19 de abril, para el cual se realiza el ajuste y entrega de los cronogramas mediante el oficio 2026-493-ICU-0743 el día 16 de marzo de 2026.

4 Información contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 287 de 2025

Datos generales del Contrato

Tabla 10. Información Contrato Interventoría

Tipo de Contrato:	Interventoría
Contrato:	ICCU – CTO 287 DE 2025
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CORREDORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1 INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA

	INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA), LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS.
Contratista	Consorcio Litoral MC
NIT	901.935.455-9
Supervisor	LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
Plazo de ejecución:	8 meses y/o 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	21 de mayo de 2025
Fecha de terminación:	20 de abril de 2026
Valor del contrato:	MIL VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 1.027.469.324,00)

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 11. Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE PROYECTO	Paula Fernanda Morales Sánchez
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Fredy Alexander Poveda Zamora
ESPECIALISTA DE TRÁNSITO	Giovanni Enrique Melo Zapata
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL	Giovanni Enrique Melo Zapata
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	José Alberto Rondón
ESPECIALISTA EN BIM	Milton Carabuena
ESPECIALISTA FORESTAL	Juan Mora
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Alejandra Ramírez

CARGO	PROFESIONAL
ESPECIALISTA HIDRÁULICA	Gherses Nevardo León Correal
ESPECIALISTA SOCIAL	Luisa Palma
INGENIERO DE APOYO 1	Andrea Galeano
INGENIERO DE APOYO 2	Juan León
PROFESIONAL CATASTRAL	Rolando Reyes
TOPOGRÁFICO	Jorge Rodríguez
SECRETARIA	María Paula Romero

5 Conclusiones y recomendaciones

- Los corredores viales de Cáqueza y Madrid cuentan con aval de la interventoría para los Volúmenes I – Estudio de Transporte y VII – Estudio de fuentes de materiales, mientras que el corredor de Quebradanegra dispone de aval para el Volumen I y aval parcial para el Volumen VII – Estudio de fuentes de materiales.
- Durante el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril de 2026, se evidenció un avance significativo en la consolidación de los estudios y diseños definitivos para los tres corredores, especialmente en la atención de observaciones y obtención de aprobaciones de los Volúmenes VIII – Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, IX – Estudios y diseños de estructuras, X – Estudio de gestión ambiental y social (PAGA) y XI – Gestión predial.
- El corredor vial de Cáqueza presenta el mayor nivel de avance técnico y administrativo, al contar con aprobación de los Volúmenes II al XI, incluyendo aprobaciones recientes de los componentes hidrológico, estructural, ambiental y predial, así como la entrega de los Volúmenes XII – Presupuesto y XIII – Informe final ejecutivo, evidenciando un estado avanzado de consolidación de los estudios y diseños.
- El corredor vial de Madrid registra un nivel de avance alto, con aprobación de los estudios base y complementarios entre los Volúmenes II y XI, incluyendo la atención de observaciones de los componentes hidrológico, estructural, ambiental y predial durante el periodo evaluado; adicionalmente, se efectuó la entrega de los Volúmenes XII y XIII para revisión por parte de la interventoría.

- El corredor vial de Quebradanegra presenta un avance técnico progresivo, evidenciado en la aprobación de los Volúmenes VIII, IX, X y XI durante el periodo evaluado, así como en la consolidación de las versiones ajustadas de los estudios complementarios; no obstante, algunos componentes aún se encuentran en versiones iniciales frente a los demás corredores.
- En relación con el Estudio de trazado y diseño geométrico, el Estudio de señalización y seguridad vial y el Plan de manejo de tránsito, para los tres corredores se evidencia avance en la atención de observaciones y actualización de planos, obteniéndose aprobación con observaciones de forma mediante los oficios CLM.287.25.221, CLM.287.25.222 y CLM.287.25.223; sin embargo, la emisión del aval definitivo continúa sujeta a la aprobación integral de las demás especialidades técnicas del proyecto.
- Durante el periodo evaluado se efectuó igualmente la entrega de los Volúmenes XII – Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto y XIII – Informe final ejecutivo para los tres corredores viales, permitiendo consolidar el cierre progresivo de los componentes técnicos requeridos dentro de la etapa de estudios y diseños definitivos.

Anexos

5.1 Correspondencia

A continuación, se relacionan los comunicados remitidos y recibidos en el período del presente informe.

Tabla 12. Comunicados Enviados.

FECHA	No. COMUNICACIÓN	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20/03/2026	2026-493-ICU-0815	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen XI Gestión Predial Quebradanegra V1
20/03/2026	2026-493-ICU-0821	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen X Ambiental y Social V2 Madrid – Puente Piedra
24/03/2026	2026-493-ICU-0850	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen XII Cantidades de Obra Cáqueza V1
24/03/2026	2026-493-ICU-0851	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen VIII Hidrología Hidráulica y Socavación Quebradanegra V2
24/03/2026	2026-493-ICU-0852	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen VIII Hidrología Hidráulica y Socavación Madrid V2
25/03/2026	2026-493-ICU-0869	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Informe mensual No. 10
26/03/2026	2026-493-ICU-0880	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen I Transporte V3 Cáqueza
26/03/2026	2026-493-ICU-0881	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen I Transporte V2 Madrid
26/03/2026	2026-493-ICU-0882	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen I Transporte V2 Quebradanegra
26/03/2026	2026-493-ICU-0889	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Diseño Geométrico Cáqueza V2
27/03/2026	2026-493-ICU-0899	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Topografía Cáqueza V1
27/03/2026	2026-493-ICU-0900	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Topografía Madrid V1
27/03/2026	2026-493-ICU-0901	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Topografía Quebradanegra V1
01/04/2026	2026-493-ICU-0955	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Diagnóstico de gestión predial V2 Madrid
01/04/2026	2026-493-ICU-0956	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Atención de observaciones y entrega Gestión Predial Cáqueza V2

FECHA	No. COMUNICACIÓN	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
01/04/2026	2026-493-ICU-0959	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Atención de observaciones y entrega Gestión Predial Quebradanegra V2
01/04/2026	2026-493-ICU-0960	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen IX Estructuras Quebradanegra
06/04/2026	2026-493-ICU-0951	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen X Ambiental y Social V2 Cáqueza
06/04/2026	2026-493-ICU-0967	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Respuesta CLM 287-25-101 Volumen X Ambiental y Social Quebradanegra
07/04/2026	2026-493-ICU-0991	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Acta No. 04 periodo nov 2025 – marzo 2026
08/04/2026	2026-493-ICU-0992	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Atención de observaciones señalización Cáqueza Volumen II
08/04/2026	2026-493-ICU-0993	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Atención de observaciones señalización Madrid Volumen II
08/04/2026	2026-493-ICU-0994	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Atención de observaciones señalización Quebradanegra Volumen II
08/04/2026	2026-493-ICU-1017	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen VIII Hidrología Hidráulica y Socavación Cáqueza V3
09/04/2026	2026-493-ICU-1026	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Diseño Geométrico Madrid V2 firmado
09/04/2026	2026-493-ICU-1027	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Diseño Geométrico Quebradanegra V2 firmado
09/04/2026	2026-493-ICU-1028	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Diseño Geométrico Cáqueza V2 firmado
09/04/2026	2026-493-ICU-1034	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Atención de observaciones y entrega Volumen IX Estructuras V3 Cáqueza

FECHA	No. COMUNICACIÓN	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
13/04/2026	2026-493-ICU-1060	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen VIII Hidrología Madrid V3
13/04/2026	2026-493-ICU-1062	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen VIII Hidrología Quebradanegra V3
13/04/2026	2026-493-ICU-1067	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen IX Estructuras Madrid V2
16/04/2026	2026-493-ICU-1096	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Diagnóstico Predial V3 Cáqueza
16/04/2026	2026-493-ICU-1097	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Diagnóstico Predial V3 Quebradanegra
16/04/2026	2026-493-ICU-1098	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Informe Final Ejecutivo Madrid V1
16/04/2026	2026-493-ICU-1100	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Informe Final Ejecutivo Cáqueza V1
16/04/2026	2026-493-ICU-1101	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Informe Final Ejecutivo Quebradanegra V1
17/04/2026	2026-493-ICU-0973	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen IV Fundaciones ajuste sitio crítico
17/04/2026	2026-493-ICU-0974	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen V Taludes ajuste sitio crítico
17/04/2026	2026-493-ICU-1105	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Quebradanegra V2 (observaciones)
17/04/2026	2026-493-ICU-1106	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Madrid V2 (observaciones)
17/04/2026	2026-493-ICU-1108	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen II Cáqueza V2 (observaciones)
17/04/2026	2026-493-ICU-1121	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Acta No. 04 ajustada
17/04/2026	2026-493-ICU-1144	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega global del proyecto
17/04/2026	2026-493-ICU-1145	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Modelos BIM
17/04/2026	2026-493-ICU-1146	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen X Ambiental y Social V3
20/04/2026	2026-493-ICU-1083	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen XII Cantidades de Obra Madrid V1

FECHA	No. COMUNICACIÓN	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20/04/2026	2026-493-ICU-1099	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Atención de observaciones Volumen XII Cáqueza V2
20/04/2026	2026-493-ICU-1103	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega Volumen XII Cantidades de Obra Quebradanegra V1

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 13. Comunicados Recibidos 20 de marzo al 20 de abril

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20/04/2026	CLM.287.25-233	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen XI Gestión Predial – Cáqueza (Oficio 183-2026-493-ICU-1096)
20/04/2026	CLM.287.25-232	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen XI Gestión Predial – Quebradanegra (Oficio 184-2026-493-ICU-1097)
20/04/2026	CLM.287.25-231	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aval técnico Volumen IX Estructuras – Cáqueza (Oficio 178-2026-493-ICU-1034)
20/04/2026	CLM.287.25-230	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aval técnico Volumen IX Estructuras – Madrid (Oficio 181-2026-493-ICU-1067)
20/04/2026	CLM.287.25-229	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aval condicionado Volumen IX Estructuras – Quebradanegra (Oficio 165-2026-493-ICU-0960)
20/04/2026	CLM.287.25-228	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen VIII Hidrología, Hidráulica y Socavación – Cáqueza (Oficio 174-2026-493-ICU-1017)
20/04/2026	CLM.287.25-227	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen VIII Hidrología, Hidráulica y Socavación – Madrid (Oficio 179-2026-493-ICU-1060)

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20/04/2026	CLM.287.25-226	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen VIII Hidrología, Hidráulica y Socavación – Quebradanegra (Oficio 180-2026-493-ICU-1062)
15/04/2026	CLM.287.25-223	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación parcial Volumen III Diseño Geométrico – Quebradanegra (Oficio 176-2026-493-ICU-1027)
15/04/2026	CLM.287.25-222	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación parcial Volumen III Diseño Geométrico – Madrid (Oficio 175-2026-493-ICU-1026)
15/04/2026	CLM.287.25-221	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación parcial Volumen III Diseño Geométrico – Cáqueza (Oficio 177-2026-493-ICU-1028)
13/04/2026	CLM.287.25-218	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Observaciones Acta de Pago No. 4 (Oficio 181-2026-493-ICU-1067)
10/04/2026	CLM.287.25-216	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen XI Gestión Predial – Madrid (Oficio 162-2026-493-ICU-0955)
09/04/2026	CLM.287.25-213	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aval Estudio Señalización – Cáqueza (Oficio 171-2026-493-ICU-0992)
09/04/2026	CLM.287.25-212	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aval Estudio Señalización – Madrid (Oficio 172-2026-493-ICU-0993)
09/04/2026	CLM.287.25-211	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aval Estudio Señalización – Quebradanegra (Oficio 173-2026-493-ICU-0994)
08/04/2026	CLM.287.25-210	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Solicitud Plan de Contingencia de Volúmenes – Quebradanegra
08/04/2026	CLM.287.25-209	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Solicitud Plan de Contingencia de Volúmenes – Madrid

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
08/04/2026	CLM.287.25-208	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Solicitud Plan de Contingencia de Volúmenes – Cáqueza
06/04/2026	CLM.287.25-205	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen X Estudio Ambiental y Social – Quebradanegra (Oficio 166-2026-493-ICU-0967)
06/04/2026	CLM.287.25-204	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen X Estudio Ambiental y Social – Cáqueza (Oficio 160-2026-493-ICU-0951)
31/03/2026	CLM.287.25-198	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Observaciones Volumen XII Presupuesto (APU) – Cáqueza (Oficio 149-2026-493-ICU-0850)
31/03/2026	CLM.287.25-194	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Observaciones Volumen VIII Hidrología – Madrid (Oficio 151-2026-493-ICU-0852)
30/03/2026	CLM.287.25-193	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Observaciones Volumen VIII Hidrología – Quebradanegra (Oficio 150-2026-493-ICU-0851)
30/03/2026	CLM.287.25-192	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen VIII Hidrología – Cáqueza (Oficio 146-2026-493-ICU-0809)
26/03/2026	CLM.287.25-184	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aprobación Volumen III Geología – Cáqueza (Oficio 153-2025-493-ICU-3504)
26/03/2026	CLM.287.25-183	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aval parcial Estudio Señalización – Quebradanegra (Oficio 142-2026-493-ICU-0746)
26/03/2026	CLM.287.25-182	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aval parcial Estudio Señalización – Cáqueza (Oficio 143-2026-493-ICU-0747)
26/03/2026	CLM.287.25-181	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Aval parcial Estudio Señalización – Madrid (Oficio 144-2026-493-ICU-0748)

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
24/03/2026	CLM.287.25-176	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Observaciones Volumen XI Gestión Predial – Quebradanegra (Oficio 147-2026-493-ICU-0815)
20/03/2026	CLM.287.25-175	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Consorcio Caminos IP	Observaciones Volumen XI Gestión Predial – Cáqueza (Oficio 141-2026-493-ICU-0703)

Fuente: Elaboración Propia.

CONSORCIO CAMINOS IP

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante legal SANTIAGO PÁEZ TALERO, identificado con C.C. 79.339.188 de Bogotá del **CONSORCIO CAMINOS IP** identificado con NIT No. 901.661.497-0, certifico que la mencionada sociedad no ha tenido obligaciones laborales por concepto de pago de salarios y/o nómina de todos sus empleados, hasta la fecha.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los 14 días del mes de abril de 2026, con destino al Instituto de Concesiones de Cundinamarca, Contrato No. ICCU-CTO-258 DE 2025, cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CORREDORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **LOTE 2.** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CAQUEZA AL SECTOR PLACITAS.

Dado en Bogotá, a los 14 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,

SANTIAGO PÁEZ TALERO
Cc 79.339.188 de Bogotá
Representante legal
Consorcio CAMINOS IP

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Yo, SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con el documento de identidad No. 79339188 expedida en Bogotá, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica CONSORCIO CAMINOS IP y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.
3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
4. Autorizo a INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los catorce (14) días del mes de Abril, del año 2026, en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,



SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C 79339188 de Bogotá
Representante legal
Nit. 901.917.475-5

Bogotá D.C., Abril 14 de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **SANTIAGO PÁEZ TALERO**, identificado con C.C. No. 79.339.188 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A.**, identificada con Nit **800.097.991 - 2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **MONICA PATRICIA BULLA MILA**, identificado con C.C. No. 52.736.283 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 122106-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, de **INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A.**, identificada con Nit **800.097.991 - 2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá,** me permito auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal
INCOPLAN S.A.
C.C. No. 79.339.188 de Bogotá

MONICA PATRICIA BULLA
C.C. 52.736.283 de Bogotá
T.P. 122106 – T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B262E01E63286E04

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA PATRICIA BULLA MILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52736283 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122106-T



MONICA PATRICIA
BULLA MILA
C.C. 52736283
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132054

FIRMA DEL TITULAR 42363

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52736283
BULLA MILA
APELLIDOS
MONICA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-SEP-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-SEP-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-1500115-47096661-F-0052736283-20020302
05582 02060B 02 101504745

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Yo, SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con el documento de identidad No. 79339188 expedida en Bogotá, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION SA – INCOPLAN SA y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.
3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
4. Autorizo a INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los catorce (14) días del mes de Abril, del año 2026, en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,



SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C 79339188 de Bogotá
Representante legal
Nit. 800.097.991-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **LUIS FRANCISCO MONTES**, identificado con C.C. No. 17.416.594 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS**., identificada con **NIT 900.135.636-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **MAGDALENA MOLINA GÓMEZ**, identificado con C.C. No 37.245.305 de CUCUTA y con Tarjeta Profesional No. 66223-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Publica de **PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS**., identificada con **NIT 900.135.636-9**, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Pavimentos y Geotecnia S.AS , no está obligada a tener **REVISOR FISCAL**

Se expide en Bogotá, a los 14 días del mes de abril 2026

LUIS FRANCISCO MONTES B
Representante Legal
PAVIMENTOS Y GEOTECNIA S.A.S
900.135.636-9

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Yo, **LUIS FRANCISCO MONTES**, identificado con C.C. No. 17.416.594 de Bogotá, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica **PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS** y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.
3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
4. Autorizo a INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que
declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los Dieciocho (14) días del mes de abril, del año 2026, en la ciudad de Bogotá.
Atentamente,

LUIS FRANCISCO MONTES B
Representante Legal
PAVIMENTOS Y GEOTECNIA S.A.S
900.135.636-9

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	31/3/2026		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	45
Semana:	del miércoles, 25 de marzo de 2026	al	martes, 31 de marzo de 2026			
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**					
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**					
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	**100.00%**	
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Ejecutado:**	**92.94%**	
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0					
Vigencia fiscal 2024:	N/A			**Vigencia futura:**		
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478					
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25	
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	315	140.00%	**Días Faltantes:** -90
Facturación Acumulada:	**$** -	**0%**	**N° de Facturas:**	0		**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**93%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU -Caqueza	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**97%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aforos de Trafico	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	6/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/7/2025	6/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	6/8/2025	12/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	12/8/2025	15/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	15/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	18/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**99.3%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Topografia y Red Geodesica	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/7/2025	19/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	19/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	19/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	25/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	95%	
Aprobación Volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	95%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	

Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	14/7/2025	29/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/7/2025	21/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	21/8/2025	21/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	21/8/2025	27/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	27/8/2025	3/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	6/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	15/9/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	15/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	15/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	27/8/2025	3/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	28/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	10/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	13/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	22/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	

Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	22/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**96%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	19/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	19/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	19/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	25/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	80%	
aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	70%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**95%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	5/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	80%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	70%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**88%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	30/7/2025	4/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	4/8/2025	19/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	50%	
En la semana comprendida entre el 4 de marzo y el 10 de marzo de 2026 se realizó la Entrega Volumen III Geología	1/9/2025	4/9/2025	100%	50%	
aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	50%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**94%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	19/7/2025	5/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	5/8/2025	20/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	60%	

aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	60%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**90%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	70%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	70%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	70%	
Durante la semana comprendida entre el 4 de marzo y el 10 de marzo de 2026 se trabajó en los pendientes	4/9/2025	4/9/2025	100%	60%	


ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana comprendida entre el 25 de marzo y el 31 de marzo de 2026 se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con cada una de las especialidades para la consolidación del modelo BIM, garantizando la integración adecuada de la información. De igual manera, el área de topografía adelantó la revisión de los documentos y entregables remitidos por la interventoría, aplicando las listas de chequeo correspondientes para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

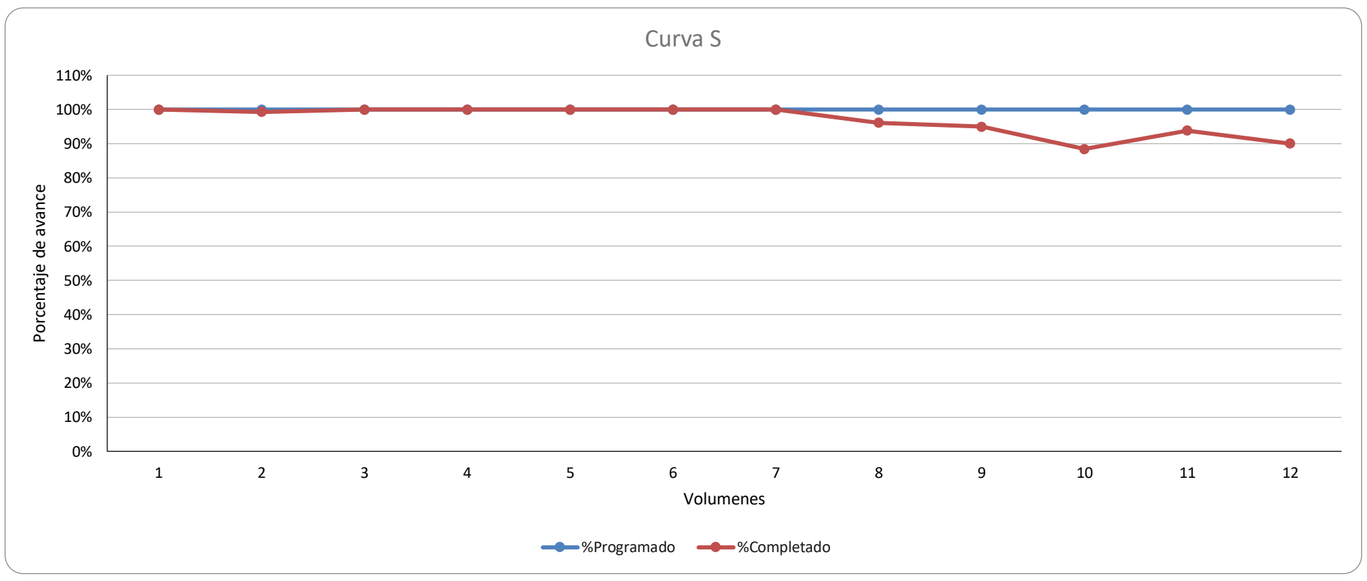

ANALISIS

RIESGOS

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	Supervisor ICCU	Control de proyectos
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP / SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha: 31/3/2026	Fecha: 31/3/2026	Fecha: 31/3/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	31/3/2026			**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	45
Semana:	del	miércoles, 25 de marzo de 2026	al	martes, 31 de marzo de 2026			
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**						
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**						
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478						
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478				**Avance Programado:**	**99.99%**	
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0				**Avance Ejecutado:**	**92.94%**	
Vigencia fiscal 2024:	N/A						
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**			
Fecha Acta de Inicio:	9-jun-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25		
Duración Contrato (Días):	205			**Días Transcurridos:**	295	143.90%	**Días Faltantes:** -90
Facturación Acumulada:	**$** -	**0%**		**N° de Facturas:**	0		**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**9/6/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**93%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**92%**	Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: aforo de trafico	4/8/2025	15/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	15/8/2025	8/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	16/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	19/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Visitas de campo K0	28/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica	4/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	14/8/2025	4/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	16/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	19/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	94%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	

Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Visitas de campo K0	28/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos	4/8/2025	14/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	15/8/2025	8/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Campaña geotecnica	7/8/2025	11/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	11/9/2025	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programacion de trabajos de campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	7/8/2025	30/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	30/8/2025	15/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programación trabajos de campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	2/8/2025	17/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	17/09/25	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programa de trabajo de campo	5/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	15/8/2025	30/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	17/09/25	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**95%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	11/8/2025	25/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	90%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	80%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	70%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**84%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	11/8/2025	7/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	60%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	50%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	50%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	50%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**73%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Inventario en Campo e Inventario Forestal	15/8/2025	23/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	23/8/2025	14/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	30%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	30%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	30%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	30%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	30%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**94%**	
En la semana comprendida entre el 4 de marzo y el 10 de marzo de 2026 se realizó la Entrega Volumen III Geología	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	

Atención de Observaciones - Consultoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio	8/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	25/8/2025	27/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	60%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	60%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**60%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	60%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	11/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	19/8/2025	21/10/2025	100%	95%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	20%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	20%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	20%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	20%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	20%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	20%	


ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana comprendida entre el 25 de marzo y el 31 de marzo de 2026 se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con cada una de las especialidades para la consolidación del modelo BIM, garantizando la integración adecuada de la información. De igual manera, el área de topografía adelantó la revisión de los documentos y entregables remitidos por la interventoría, aplicando las listas de chequeo correspondientes para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

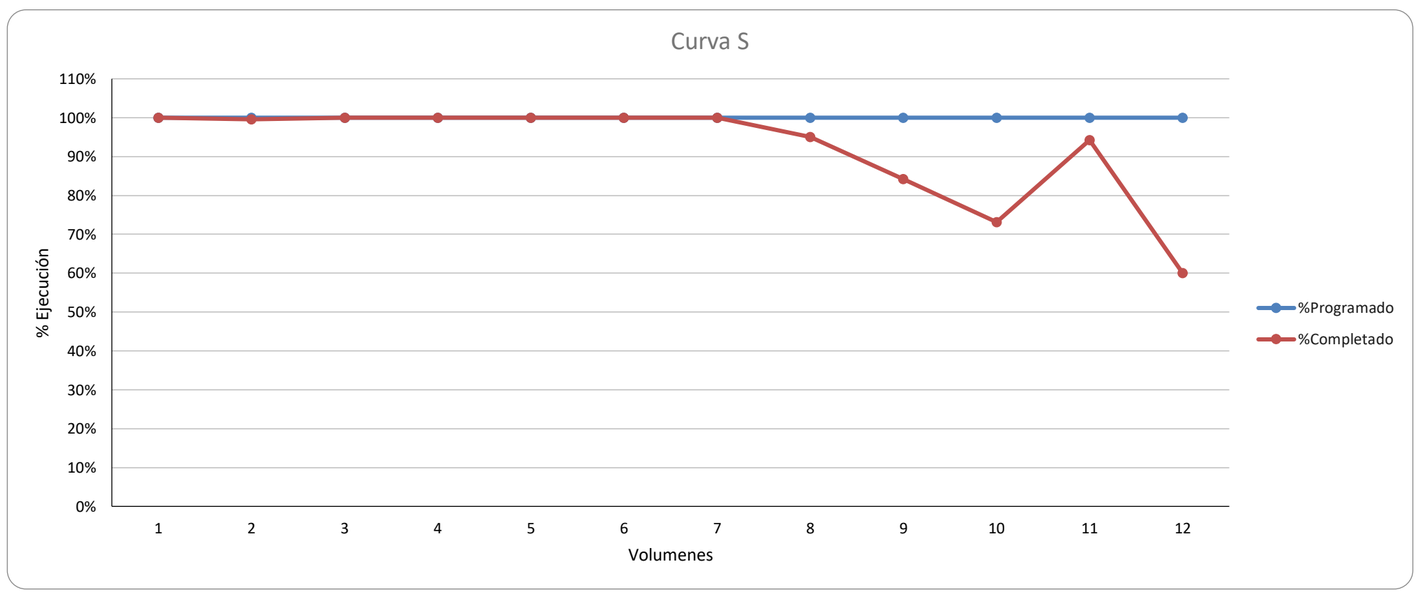

ANALISIS

RIESGOS

SEGUIMIENTO

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	N.A	

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	N.A	N.A

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría		Supervisor ICCU		Control de proyectos	
Nombre:	CONSORCIO LITORAL MC	Nombre:	Jhon Ardila	Nombre:	CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha:	31/3/2026	Fecha:	31/3/2026	Fecha:	31/3/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 31/3/2026 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 45

Semana: del miércoles, 25 de marzo de 2026 al martes, 31 de marzo de 2026

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Presupuesto Asignado con IVA: $ 2,430,458,478
Presupuesto Programado: $ 2,430,458,478
Presupuesto Real Ejecutado: $ 0

Avance Programado: 99.99%
Avance Ejecutado: 92.94%

Vigencia fiscal 2024: N/A
Vigencia fiscal 2025: $ 2,430,458,478

Vigencia futura:

Fecha Acta de Inicio: 20-may-25

Fecha de Terminación: 31-dic-25

Duración Contrato (Días): 225

Días Transcurridos: 315 140.00% **Días Faltantes:** -90

Facturación Acumulada: $ - 0%

N° de Facturas: 0 **% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**93%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**92%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Aforo de campo	14/7/2025	25/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	25/7/2025	16/8/2025	100%	100%	
Entrega Volumen	16/8/2025	16/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	16/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	22/8/2025	26/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	26/8/2025	29/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	29/8/2025	2/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	2/9/2025	2/9/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Topografia y Red Geodesica	14/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/7/2025	20/9/2025	100%	100%	
Entrega Volumen	16/8/2025	16/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	16/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	22/8/2025	26/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	26/8/2025	29/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	29/8/2025	2/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	2/9/2025	2/9/2025	100%	94%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	25/8/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	25/8/2025	25/8/2025	100%	100%	

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/8/2025	10/10/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	16/10/2025	20/10/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	5/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	5/8/2025	28/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	16/10/2025	20/10/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/8/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**92%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	80%	

Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	80%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	80%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	80%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	80%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**95%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	25/8/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	25/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	70%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	70%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**58%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	11/9/2025	100%	40%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	60%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	60%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	0%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	0%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	0%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	0%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**94%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/7/2025	6/10/2025	100%	70%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**93%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal	19/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	13/10/2025	100%	60%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**77%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	14/7/2025	22/7/2025	100%	20%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	22/9/2025	100%	20%	

ACTIVIDADES REALIZADAS


En la semana comprendida entre el 25 de marzo y el 31 de marzo de 2026 se realizó la Entrega Volumen III Geología para la vía desde la inspección la Magdalena hasta el casco Urbano del municipio de Quebradanegra. Adicionalmente, se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

0.60

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

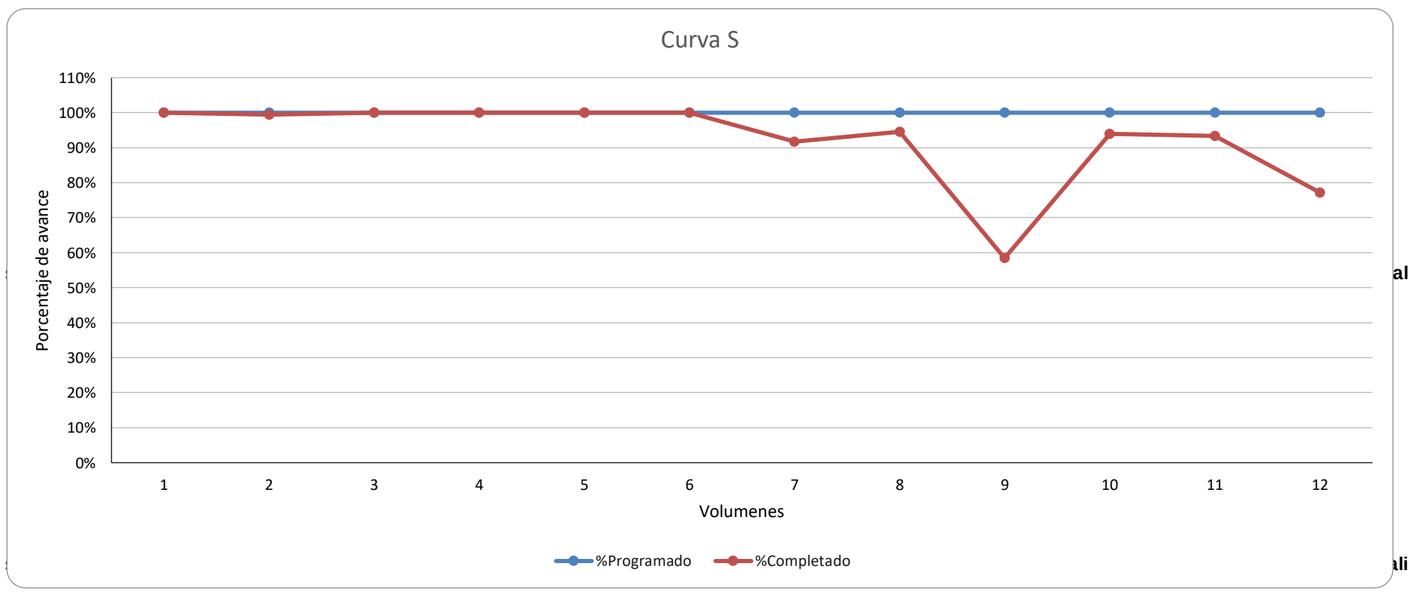

ANALISIS

Durante la **alizac**

Durante la **alizaci**

RIESGOS

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	N.A	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	N.A	N.A

LECCIONES APRENDIDAS

Nombre:	CONSORCIO LITORAL MC	
Fecha:	31/3/2026	

Nombre:	Jhon Ardila	
Fecha:	31/3/2026	

Nombre:	CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PÁEZ TALERO	
Fecha:	31/3/2026	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	7/4/2026		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	46
Semana:	del miércoles, 1 de abril de 2026	al	martes, 7 de abril de 2026			
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**					
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**					
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	**100.00%**	
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Ejecutado:**	**94.11%**	
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0					
Vigencia fiscal 2024:	N/A			**Vigencia futura:**		
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478					
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25	
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	322	143.11%	**Días Faltantes:** -97
Facturación Acumulada:	**$ -**	**0%**	**N° de Facturas:**	0		**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**94%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU -Caqueza	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**98%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aforos de Trafico	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	6/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/7/2025	6/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	6/8/2025	12/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	12/8/2025	15/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	15/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	18/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**99.3%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Topografia y Red Geodesica	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/7/2025	19/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	19/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	19/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	25/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	95%	
Aprobación Volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	95%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	

Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	14/7/2025	29/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/7/2025	21/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	21/8/2025	21/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	21/8/2025	27/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	27/8/2025	3/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	6/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	15/9/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	15/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	15/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	27/8/2025	3/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	28/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	10/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	13/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	22/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	

Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	22/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**96%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	19/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	19/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	19/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	25/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	80%	
aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	70%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**95%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	5/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	80%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	70%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**92%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	30/7/2025	4/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	4/8/2025	19/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	50%	
aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	50%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**97%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	19/7/2025	5/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	5/8/2025	20/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	

aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	60%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**90%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	70%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	70%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	70%	
Durante la semana comprendida entre el 4 de marzo y el 10 de marzo de 2026 se trabajó en los pendientes	4/9/2025	4/9/2025	100%	60%	


ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana comprendida entre el 1 de abril y el 7 de abril de 2026 se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con cada una de las especialidades para la consolidación del modelo BIM, garantizando la integración adecuada de la información. De igual manera, el área de topografía adelantó la revisión de los documentos y entregables remitidos por la interventoría, aplicando las listas de chequeo correspondientes para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

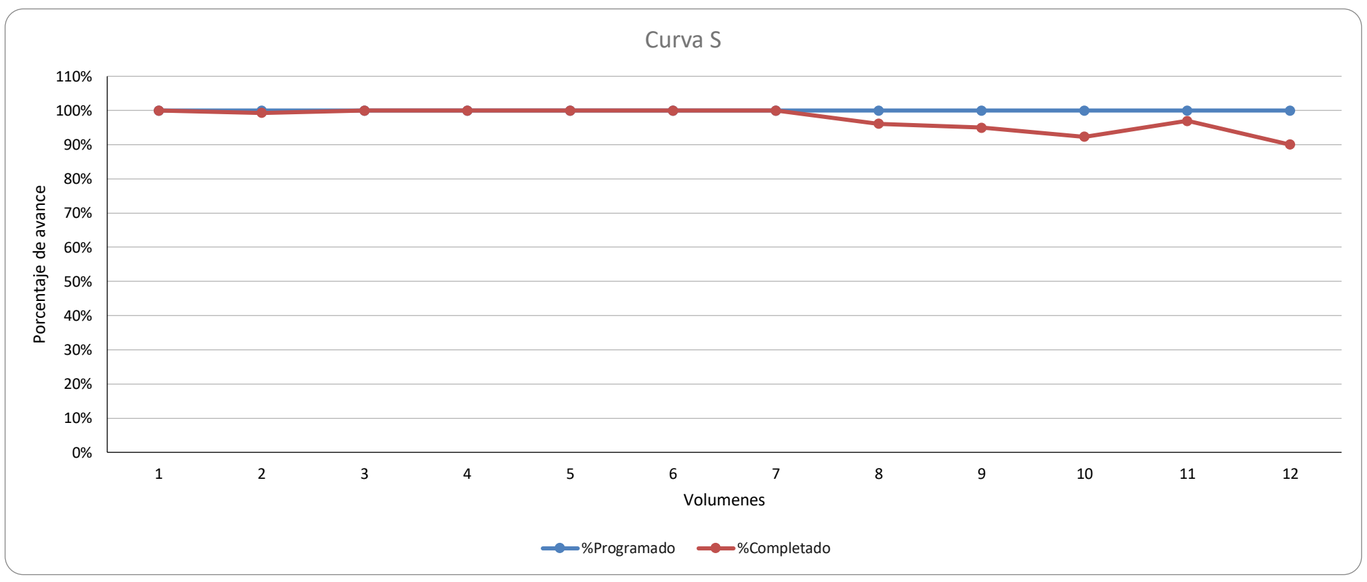

ANALISIS

RIESGOS

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	Supervisor ICCU	Control de proyectos
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP / SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha: 7/4/2026	Fecha: 7/4/2026	Fecha: 7/4/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	7/4/2026			**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	46
Semana:	del miércoles, 1 de abril de 2026		al martes, 7 de abril de 2026				
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**						
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**						
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478						
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	**99.99%**		
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	**94.11%**		
Vigencia fiscal 2024:	N/A						
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**			
Fecha Acta de Inicio:	9-jun-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25		
Duración Contrato (Días):	205			**Días Transcurridos:**	302	147.32%	**Días Faltantes:** -97
Facturación Acumulada:	**$** -	**0%**		**N° de Facturas:**	0		**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**9/6/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**94%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**92%**	Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: aforo de trafico	4/8/2025	15/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	15/8/2025	8/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	16/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	19/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Visitas de campo K0	28/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica	4/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	14/8/2025	4/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	16/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	19/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	94%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	

Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Visitas de campo K0	28/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos	4/8/2025	14/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	15/8/2025	8/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Campaña geotecnica	7/8/2025	11/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	11/9/2025	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programacion de trabajos de campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	7/8/2025	30/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	30/8/2025	15/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programación trabajos de campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	2/8/2025	17/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	17/09/25	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programa de trabajo de campo	5/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	15/8/2025	30/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	17/09/25	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**95%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	11/8/2025	25/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	90%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	80%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	70%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**84%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	11/8/2025	7/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	60%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	50%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	50%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	50%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**73%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Inventario en Campo e Inventario Forestal	15/8/2025	23/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	23/8/2025	14/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	30%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	30%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	30%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	30%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	30%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**97%**	
En la semana comprendida entre el 4 de marzo y el 10 de marzo de 2026 se realizó la Entrega Volumen III Geología	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	

Atención de Observaciones - Consultoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio	8/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	25/8/2025	27/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	60%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**60%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	60%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	11/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	19/8/2025	21/10/2025	100%	95%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	20%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	20%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	20%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	20%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	20%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	20%	


ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana comprendida entre el 1 de abril y el 7 de abril de 2026 se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con cada una de las especialidades para la consolidación del modelo BIM, garantizando la integración adecuada de la información. De igual manera, el área de topografía adelantó la revisión de los documentos y entregables remitidos por la interventoría, aplicando las listas de chequeo correspondientes para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

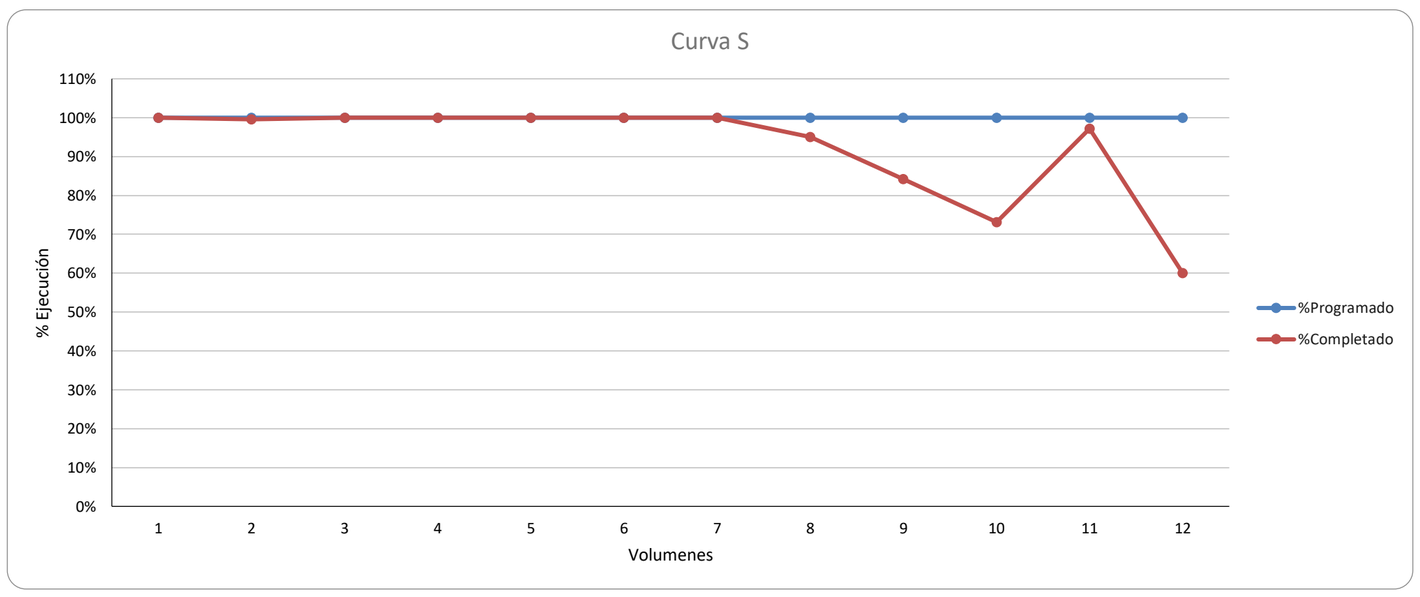

ANALISIS

RIESGOS

SEGUIMIENTO

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	N.A	

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	N.A	N.A

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría		Supervisor ICCU		Control de proyectos	
Nombre:	CONSORCIO LITORAL MC	Nombre:	Jhon Ardila	Nombre:	CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha:	7/4/2026	Fecha:	7/4/2026	Fecha:	7/4/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	7/4/2026		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:** 46
Semana:	del miércoles, 1 de abril de 2026	al	martes, 7 de abril de 2026		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	**99.99%**
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Ejecutado:**	**94.11%**
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0				
Vigencia fiscal 2024:	N/A		**Vigencia futura:**		
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478				
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25		**Fecha de Terminación:**	31-dic-25	
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	322 143.11%	**Días Faltantes:** -97
Facturación Acumulada:	**$ - 0%**		**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**94%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**95%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Aforo de campo	14/7/2025	25/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	25/7/2025	16/8/2025	100%	100%	
Entrega Volumen	16/8/2025	16/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	16/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	22/8/2025	26/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	26/8/2025	29/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	29/8/2025	2/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	2/9/2025	2/9/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Topografia y Red Geodesica	14/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/7/2025	20/9/2025	100%	100%	
Entrega Volumen	16/8/2025	16/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	16/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	22/8/2025	26/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	26/8/2025	29/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	29/8/2025	2/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	2/9/2025	2/9/2025	100%	94%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	25/8/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	25/8/2025	25/8/2025	100%	100%	

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/8/2025	10/10/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	16/10/2025	20/10/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	5/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	5/8/2025	28/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	16/10/2025	20/10/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/8/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**92%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	80%	

Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	80%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	80%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	80%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	80%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**95%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	25/8/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	25/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	70%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	70%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**83%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	80%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	50%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	50%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	50%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	50%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**96%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/7/2025	6/10/2025	100%	80%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**97%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal	19/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	13/10/2025	100%	80%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**77%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	14/7/2025	22/7/2025	100%	20%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	22/9/2025	100%	20%	

ACTIVIDADES REALIZADAS


En la semana comprendida entre el 1 de abril y el 7 de abril de 2026 se realizó la Entrega Volumen III Geología para la vía desde la inspección la Magdalena hasta el casco Urbano del municipio de Quebradanegra. Adicionalmente, se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

0.60

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

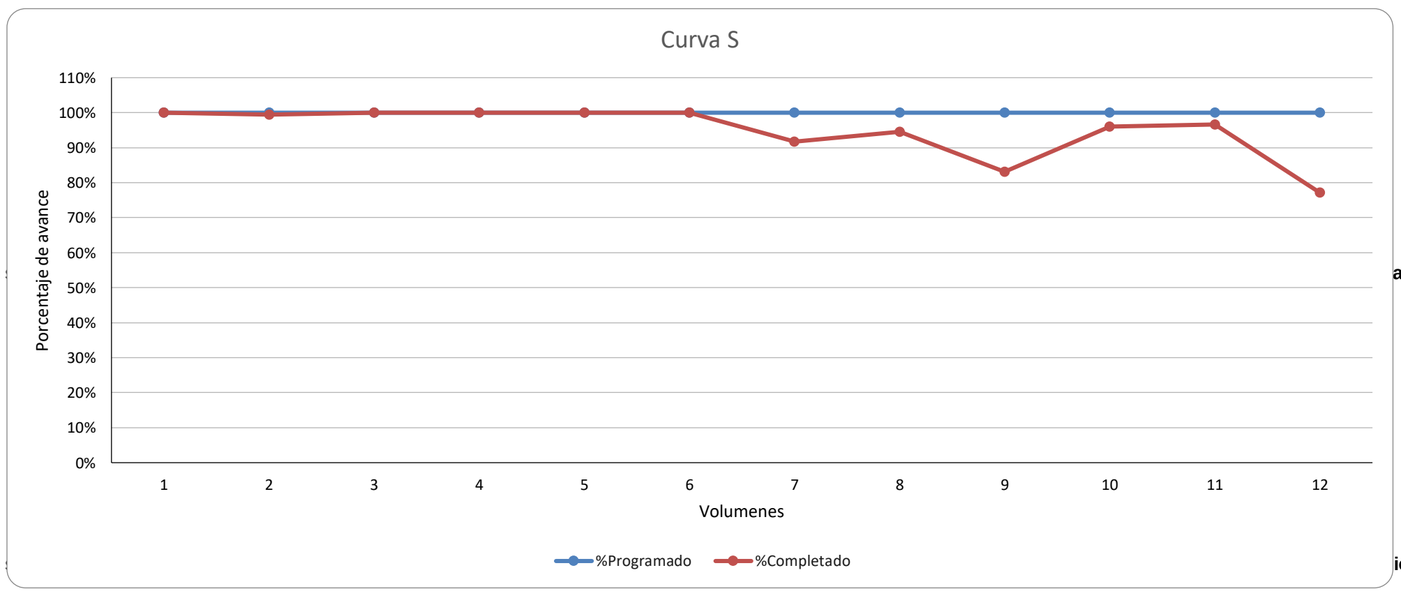

ANALISIS

Durante la **alizac**

Durante la **ión y**

RIESGOS

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	N.A	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	N.A	N.A

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	Supervisor ICCU	Control de proyectos
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha: 7/4/2026	Fecha: 7/4/2026	Fecha: 7/4/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	14/4/2026		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	47
Semana:	del miércoles, 8 de abril de 2026	al	martes, 14 de abril de 2026			
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**					
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**					
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	**100.00%**	
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Ejecutado:**	**95.03%**	
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0					
Vigencia fiscal 2024:	N/A			**Vigencia futura:**		
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478					
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25	
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	329	146.22%	**Días Faltantes:** -104
Facturación Acumulada:	**$ -**	**0%**	**N° de Facturas:**	0		**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**95%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU -Caqueza	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**98%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aforos de Trafico	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	6/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/7/2025	6/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	6/8/2025	12/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	12/8/2025	15/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	15/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	18/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**99.6%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Topografia y Red Geodesica	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/7/2025	19/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	19/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	19/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	25/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	97%	
Aprobación Volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	97%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	

Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	14/7/2025	29/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/7/2025	21/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	21/8/2025	21/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	21/8/2025	27/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	27/8/2025	3/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	6/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	15/9/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	15/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	15/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	27/8/2025	3/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	28/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	10/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	13/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	22/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	

Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	22/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**98%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	19/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	19/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	19/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	25/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	90%	
aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	90%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**98%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	5/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	90%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	90%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**92%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	30/7/2025	4/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	4/8/2025	19/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	50%	
aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	50%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**97%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	19/7/2025	5/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	5/8/2025	20/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	

aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	60%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**90%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	70%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	70%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	70%	
Durante la semana comprendida entre el 4 de marzo y el 10 de marzo de 2026 se trabajó en los pendientes	4/9/2025	4/9/2025	100%	60%	


ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana comprendida entre el 8 de abril y el 14 de abril de 2026 se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con cada una de las especialidades para la consolidación del modelo BIM, garantizando la integración adecuada de la información. De igual manera, el área de topografía adelantó la revisión de los documentos y entregables remitidos por la interventoría, aplicando las listas de chequeo correspondientes para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

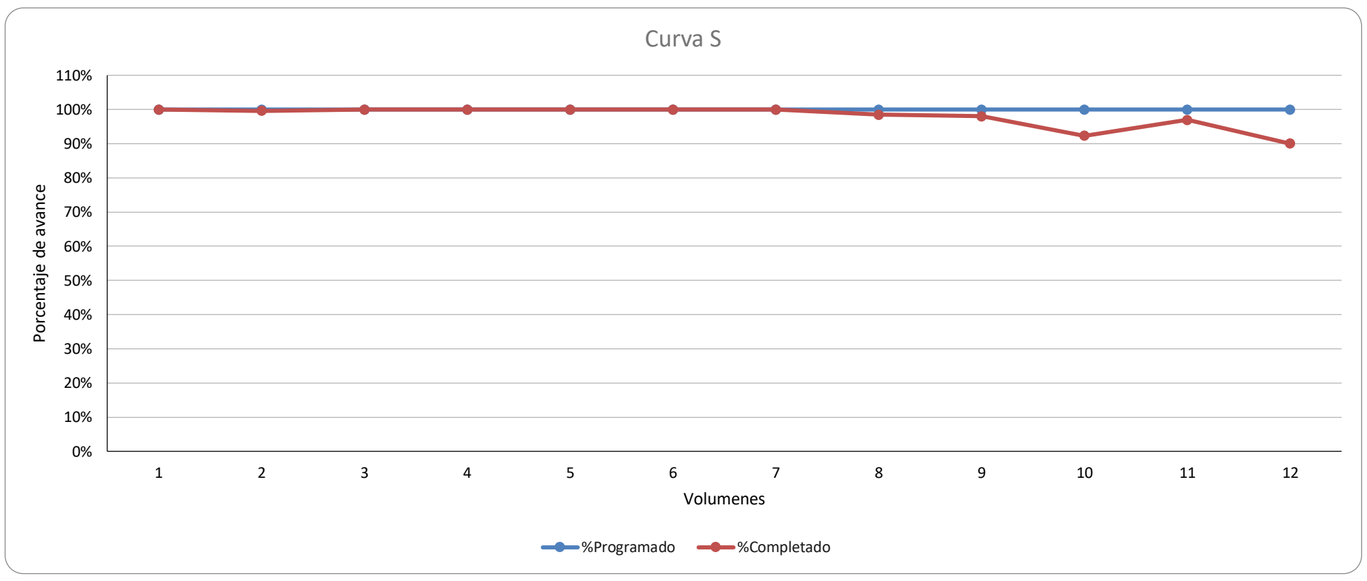

ANALISIS

RIESGOS

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	Supervisor ICCU	Control de proyectos
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP / SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha: 14/4/2026	Fecha: 14/4/2026	Fecha: 14/4/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	14/4/2026			**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	47
Semana:	del	miércoles, 8 de abril de 2026	al	martes, 14 de abril de 2026			
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**						
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**						
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478						
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478				**Avance Programado:**	**99.99%**	
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0				**Avance Ejecutado:**	**95.03%**	
Vigencia fiscal 2024:	N/A						
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**			
Fecha Acta de Inicio:	9-jun-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25		
Duración Contrato (Días):	205			**Días Transcurridos:**	309	150.73%	**Días Faltantes:** -104
Facturación Acumulada:	**$** -	**0%**		**N° de Facturas:**	0		**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**9/6/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**95%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**95%**	Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: aforo de trafico	4/8/2025	15/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	15/8/2025	8/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	16/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	19/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Visitas de campo K0	28/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica	4/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	14/8/2025	4/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	16/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	19/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	97%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	

Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Visitas de campo K0	28/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos	4/8/2025	14/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	15/8/2025	8/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Campaña geotecnica	7/8/2025	11/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	11/9/2025	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programacion de trabajos de campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	7/8/2025	30/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	30/8/2025	15/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programación trabajos de campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	2/8/2025	17/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	17/09/25	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programa de trabajo de campo	5/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	15/8/2025	30/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	17/09/25	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**98%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	11/8/2025	25/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	90%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	90%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	90%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	90%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**95%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	11/8/2025	7/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	90%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	90%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	90%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	70%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**85%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Inventario en Campo e Inventario Forestal	15/8/2025	23/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	23/8/2025	14/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	60%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	60%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	60%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	60%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	60%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**97%**	
En la semana comprendida entre el 4 de marzo y el 10 de marzo de 2026 se realizó la Entrega Volumen III Geología	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	

Atención de Observaciones - Consultoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio	8/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	25/8/2025	27/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	60%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**60%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	60%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	11/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	19/8/2025	21/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	20%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	20%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	20%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	20%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	20%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	20%	


ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana comprendida entre el 8 de abril y el 14 de abril de 2026 se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con cada una de las especialidades para la consolidación del modelo BIM, garantizando la integración adecuada de la información. De igual manera, el área de topografía adelantó la revisión de los documentos y entregables remitidos por la interventoría, aplicando las listas de chequeo correspondientes para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

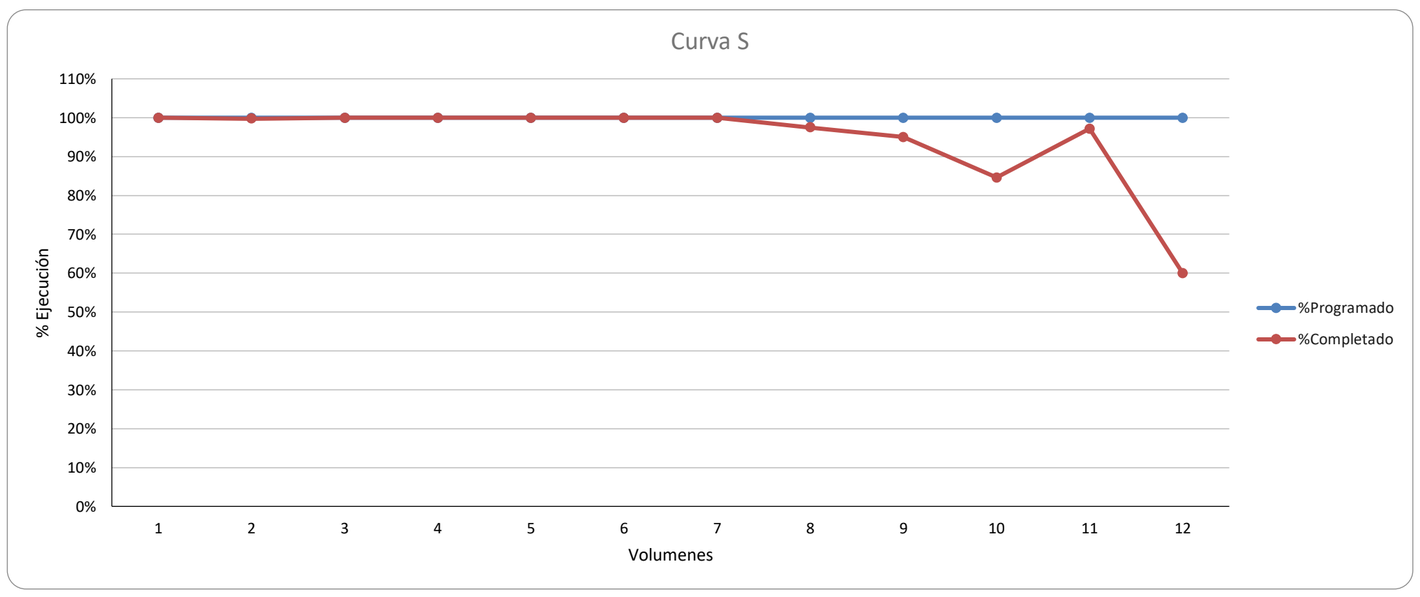

ANALISIS

RIESGOS

SEGUIMIENTO

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	N.A	

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	N.A	N.A

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría		Supervisor ICCU		Control de proyectos	
Nombre:	CONSORCIO LITORAL MC	Nombre:	Jhon Ardila	Nombre:	CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha:	14/4/2026	Fecha:	14/4/2026	Fecha:	14/4/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 14/4/2026 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 47

Semana: del miércoles, 8 de abril de 2026 al martes, 14 de abril de 2026

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0
Vigencia fiscal 2024:	N/A
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25
Duración Contrato (Días):	225
Facturación Acumulada:	$ - 0%

Avance Programado: 99.99%
Avance Ejecutado: 95.03%

Vigencia futura:

Fecha de Terminación: 31-dic-25

Días Transcurridos: 329 146.22% **Días Faltantes:** -104

N° de Facturas: 0 **% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**95%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**95%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Aforo de campo	14/7/2025	25/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	25/7/2025	16/8/2025	100%	100%	
Entrega Volumen	16/8/2025	16/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	16/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	22/8/2025	26/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	26/8/2025	29/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	29/8/2025	2/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	2/9/2025	2/9/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Topografia y Red Geodesica	14/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/7/2025	20/9/2025	100%	100%	
Entrega Volumen	16/8/2025	16/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	16/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	22/8/2025	26/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	26/8/2025	29/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	29/8/2025	2/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	2/9/2025	2/9/2025	100%	97%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	25/8/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	25/8/2025	25/8/2025	100%	100%	

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/8/2025	10/10/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	16/10/2025	20/10/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	5/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	5/8/2025	28/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	16/10/2025	20/10/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/8/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**92%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	80%	

Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	80%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	80%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	80%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	80%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**98%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	25/8/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	25/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	90%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	90%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**83%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	80%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	50%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	50%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	50%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	50%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**96%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/7/2025	6/10/2025	100%	80%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**97%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal	19/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	13/10/2025	100%	80%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**77%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	14/7/2025	22/7/2025	100%	20%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	22/9/2025	100%	20%	

ACTIVIDADES REALIZADAS


En la semana comprendida entre el 8 de abril y el 14 de abril de 2026 se realizó la Entrega Volumen III Geología para la vía desde la inspección la Magdalena hasta el casco Urbano del municipio de Quebradanegra. Adicionalmente, se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

0.60

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

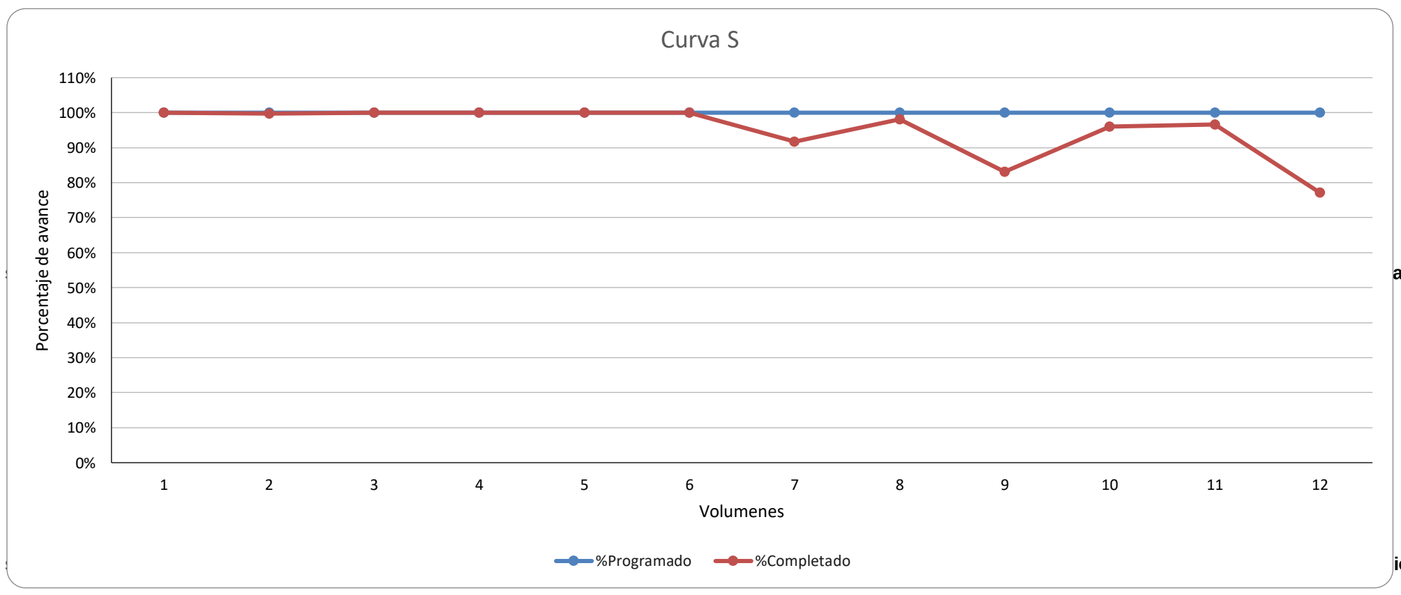

ANALISIS

Durante la **alizac**

Durante la **ión y**

RIESGOS

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	N.A	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	N.A	N.A

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría		Supervisor ICCU		Control de proyectos	
Nombre:	CONSORCIO LITORAL MC	Nombre:	Jhon Ardila	Nombre:	CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha:	14/4/2026	Fecha:	14/4/2026	Fecha:	14/4/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	14/4/2026		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	48
Semana:	del miércoles, 15 de abril de 2026	al	lunes, 20 de abril de 2026			
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**					
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**					
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	**100.00%**	
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Ejecutado:**	**98.77%**	
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0					
Vigencia fiscal 2024:	N/A			**Vigencia futura:**		
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478					
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25	
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	329	146.22%	**Días Faltantes:** -104
Facturación Acumulada:	**$** -	**0%**	**N° de Facturas:**	0		**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**99%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU -Caqueza	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**100%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aforos de Trafico	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	6/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/7/2025	6/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	6/8/2025	12/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	12/8/2025	15/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	15/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	18/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**100.0%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Topografia y Red Geodesica	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/7/2025	19/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	19/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	19/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	25/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	

Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	14/7/2025	29/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/7/2025	21/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	21/8/2025	21/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	21/8/2025	27/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	27/8/2025	3/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	6/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	15/9/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	15/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	15/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	27/8/2025	3/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	28/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	10/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	13/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	22/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	

Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	22/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Aprobacion de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	19/8/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	19/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	19/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	25/8/2025	28/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	5/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	30/7/2025	4/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	4/8/2025	19/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	19/7/2025	5/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	5/8/2025	20/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	

aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**99%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	5/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	15/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	28/8/2025	1/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/9/2025	4/9/2025	100%	100%	
aprobación del volumen	4/9/2025	4/9/2025	100%	90%	


ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana comprendida entre el 15 de abril y el 20 de abril de 2026 se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con cada una de las especialidades para la consolidación del modelo BIM, garantizando la integración adecuada de la información. De igual manera, el área de topografía adelantó la revisión de los documentos y entregables remitidos por la interventoría, aplicando las listas de chequeo correspondientes para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

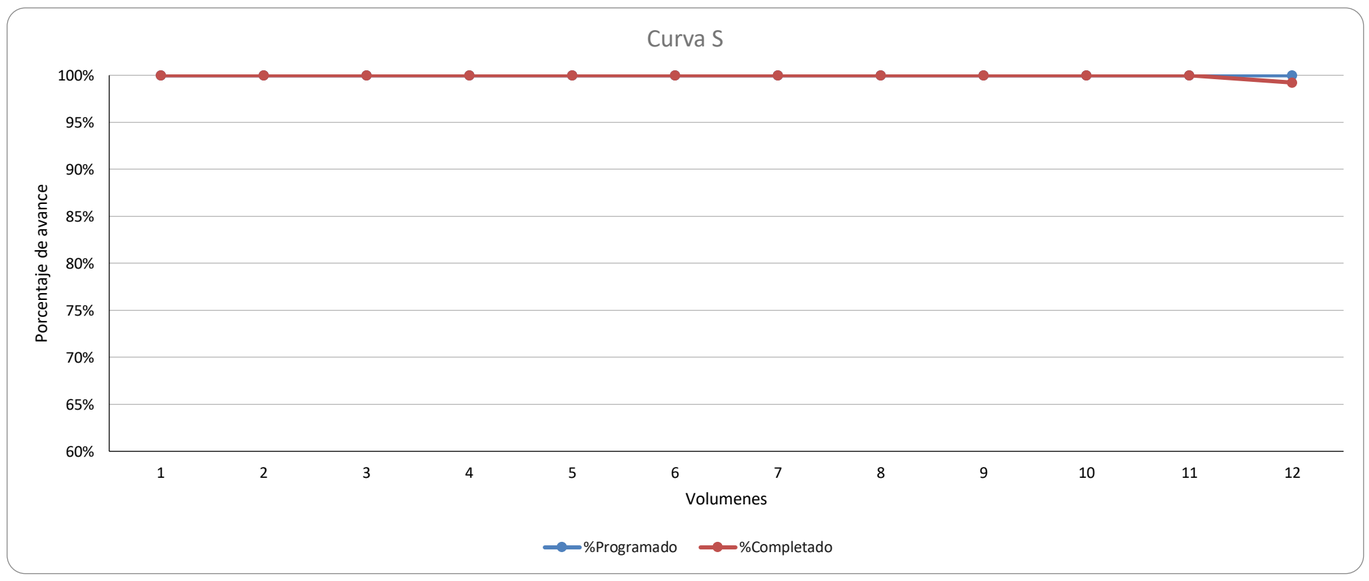

ANALISIS

RIESGOS

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	Supervisor ICCU	Control de proyectos
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP / SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha: 14/4/2026	Fecha: 14/4/2026	Fecha: 14/4/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	14/4/2026			**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	48
Semana:	del	miércoles, 15 de abril de 2026	al	lunes, 20 de abril de 2026			
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**						
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**						
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478						
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478				**Avance Programado:**	**99.99%**	
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0				**Avance Ejecutado:**	**98.77%**	
Vigencia fiscal 2024:	N/A						
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**			
Fecha Acta de Inicio:	9-jun-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25		
Duración Contrato (Días):	205			**Días Transcurridos:**	309	150.73%	**Días Faltantes:** -104
Facturación Acumulada:	**$** -	**0%**		**N° de Facturas:**	0		**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**9/6/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**99%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**100%**	Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: aforo de trafico	4/8/2025	15/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	15/8/2025	8/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	16/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	19/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Visitas de campo K0	28/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica	4/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	14/8/2025	4/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	16/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	19/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	

Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Visitas de campo K0	28/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos	4/8/2025	14/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	15/8/2025	8/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Campaña geotecnica	7/8/2025	11/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	11/9/2025	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programacion de trabajos de campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	7/8/2025	30/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	30/8/2025	15/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programación trabajos de campo	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	2/8/2025	17/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	17/09/25	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Programa de trabajo de campo	5/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	15/8/2025	30/9/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen I	17/09/25	3/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	11/8/2025	25/9/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	11/8/2025	7/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/8/2025	11/8/2025	100%	100%	
Inventario en Campo e Inventario Forestal	15/8/2025	23/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	23/8/2025	14/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**100%**	
En la semana comprendida entre el 4 de marzo y el 10 de marzo de 2026 se realizó la Entrega Volumen III Geología	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	

Atención de Observaciones - Consultoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio	8/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Desarrollo del volumen l	25/8/2025	27/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**97%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	60%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	11/8/2025	19/8/2025	100%	100%	
Desarrollo Volumen	19/8/2025	21/10/2025	100%	100%	
entrega de volumen	8/9/2025	8/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	8/9/2025	13/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	13/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	17/9/2025	20/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	20/9/2025	23/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	23/9/2025	23/9/2025	100%	98%	


ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana comprendida entre el 15 de abril y el 20 de abril de 2026 se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con cada una de las especialidades para la consolidación del modelo BIM, garantizando la integración adecuada de la información. De igual manera, el área de topografía adelantó la revisión de los documentos y entregables remitidos por la interventoría, aplicando las listas de chequeo correspondientes para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

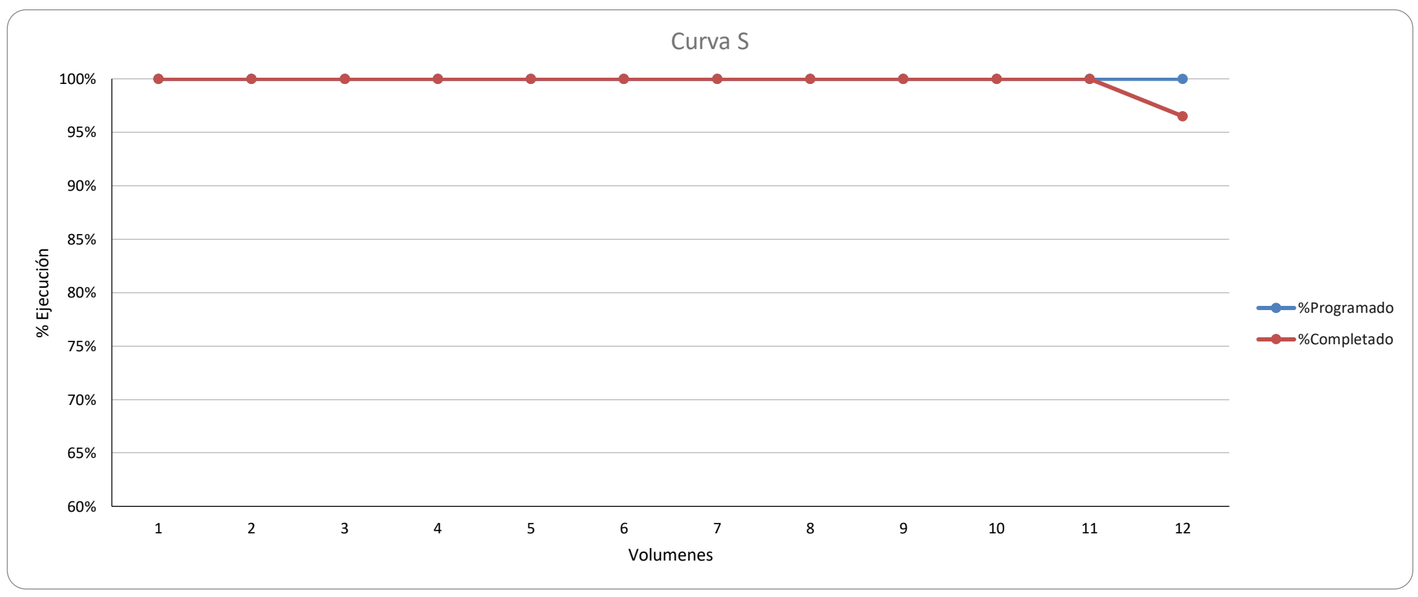

ANALISIS

RIESGOS

SEGUIMIENTO

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	N.A	

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	N.A	N.A

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría		Supervisor ICCU		Control de proyectos	
Nombre:	CONSORCIO LITORAL MC	Nombre:	Jhon Ardila	Nombre:	CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha:	14/4/2026	Fecha:	14/4/2026	Fecha:	14/4/2026

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	14/4/2026		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:** 48
Semana:	del miércoles, 15 de abril de 2026	al	lunes, 20 de abril de 2026		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	**99.99%**
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Ejecutado:**	**98.77%**
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0				
Vigencia fiscal 2024:	N/A		**Vigencia futura:**		
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478				
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25		**Fecha de Terminación:**	31-dic-25	
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	329 146.22%	**Días Faltantes:** -104
Facturación Acumulada:	**$ - 0%**		**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**99%**	
Acta de Inicio	20/5/2025	20/5/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/5/2025**	**31/12/2025**	**100%**	**100%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Aforo de campo	14/7/2025	25/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	25/7/2025	16/8/2025	100%	100%	
Entrega Volumen	16/8/2025	16/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	16/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	22/8/2025	26/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	26/8/2025	29/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	29/8/2025	2/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	2/9/2025	2/9/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/6/2025**	**21/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Topografia y Red Geodesica	14/7/2025	30/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/7/2025	20/9/2025	100%	100%	
Entrega Volumen	16/8/2025	16/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	16/8/2025	22/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	22/8/2025	26/8/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	26/8/2025	29/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	29/8/2025	2/9/2025	100%	100%	
Aprobación Volumen	2/9/2025	2/9/2025	100%	100%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/6/2025**	**23/9/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	25/8/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	25/8/2025	25/8/2025	100%	100%	

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/6/2025**	**20/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/8/2025	10/10/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	16/10/2025	20/10/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/6/2025**	**31/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	5/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	5/8/2025	28/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	16/10/2025	20/10/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	28/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/8/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/6/2025**	**3/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/7/2025	28/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	10/10/2025	16/10/2025	100%	100%	

Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/6/2025**	**11/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	25/8/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	25/8/2025	25/8/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	30/8/2025	3/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/6/2025**	**23/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	11/9/2025	100%	100%	
Entrega de Volumen	11/9/2025	11/9/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/8/2025	30/8/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	11/9/2025	17/9/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	3/9/2025	6/9/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	6/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Aprobacion del volumen	10/9/2025	10/9/2025	100%	100%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/6/2025**	**30/10/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/7/2025	6/10/2025	100%	100%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/6/2025**	**12/11/2025**	**100%**	**100%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal	19/7/2025	11/8/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/8/2025	13/10/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/6/2025**	**6/11/2025**	**100%**	**99%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/6/2025	14/7/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/6/2025	1/7/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/7/2025	4/7/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/7/2025	8/7/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/7/2025	14/7/2025	100%	100%	
Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	14/7/2025	22/7/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/7/2025	22/9/2025	100%	90%	

ACTIVIDADES REALIZADAS


En la semana comprendida entre el 15 de abril y el 20 de abril de 2026 se realizó la Entrega Volumen III Geología para la vía desde la inspección la Magdalena hasta el casco Urbano del municipio de Quebradanegra. Adicionalmente, se trabajó en los pendientes correspondientes a cada especialidad, avanzando en la actualización y ajuste de los insumos técnicos requeridos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Avanzar conforme a las actividades programadas en el cronograma, enfocándose en revisar y atender las observaciones emitidas por la interventoría, desarrollar y ajustar los diferentes volúmenes técnicos, completar los trabajos de campo y consolidar la información pendiente por entregar, garantizando el cumplimiento de los hitos establecidos y la calidad de los productos requeridos.

0.60

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

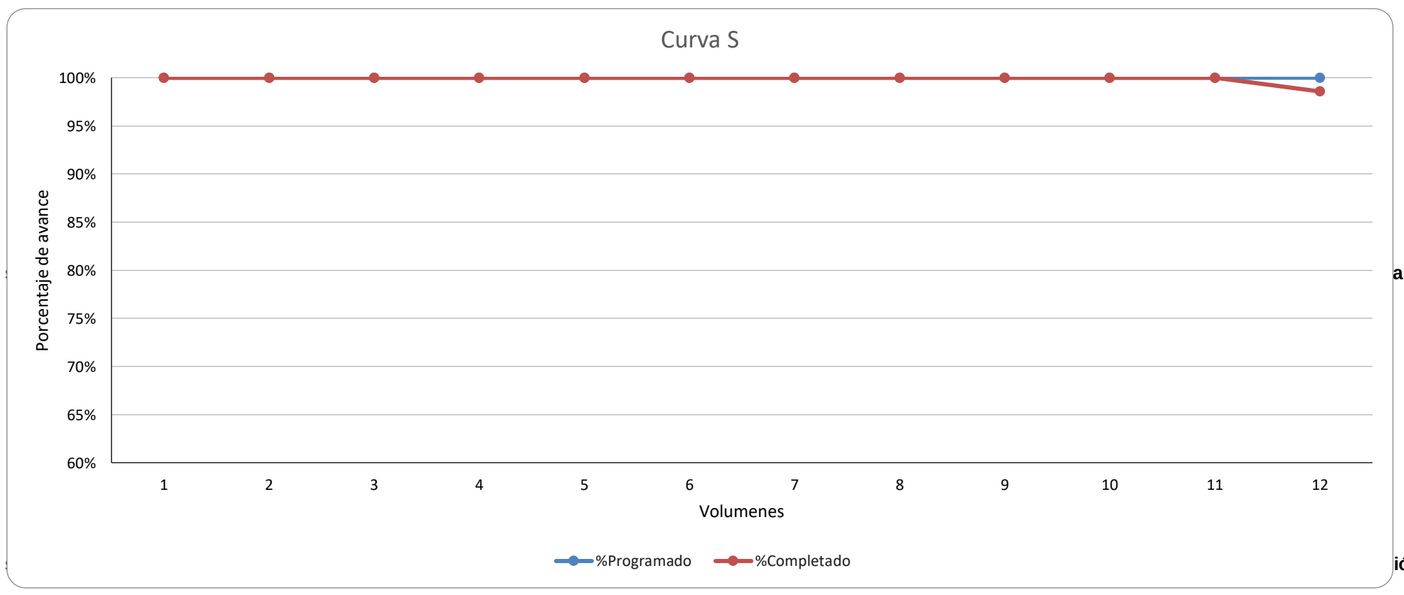

ANALISIS

Durante la **alizac**

Durante la **ión y**

RIESGOS

	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	N.A	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	N.A	N.A

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	Supervisor ICCU	Control de proyectos
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PÁEZ TALERO
Fecha: 14/4/2026	Fecha: 14/4/2026	Fecha: 14/4/2026
