

Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1	1	**Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias**	**155 días**		**9/12/25**	**8/07/26**		
2	2	AJUSTES TECNICOS PREBALANCE	16 días		9/12/25	30/12/25		
3	3	Desmonte de puestos de trabajo existente de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1	20 días	75.00	22/12/25	20/01/26		4FC-1 día;8;20FC+2 días
4	4	Demolición de muros en bloque de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	12 días	226.540	19/01/26	3/02/26	3FC-1 día	52CC+6 días;85CC;50FC+6 días
5	5	Demolición de escaleras de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	10 días	4.83	10/03/26	24/03/26	6CC+16 días	7FC+5 días
6	6	Demolición de enchape en piso existentes de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1	22 días	898.77	18/02/26	18/03/26	10	5CC+16 días;19FC-10 días;85;86FC+2 días;89;30;142;9;56;57; días;52
7	7	Adecuación placa aérea zona escaleras de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997	15 días	9.88	31/03/26	21/04/26	5FC+5 días	
8	8	Desmonte de zócalos de madera de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	10 días	377.45	20/01/26	2/02/26	3	10CC+5 días;117;142

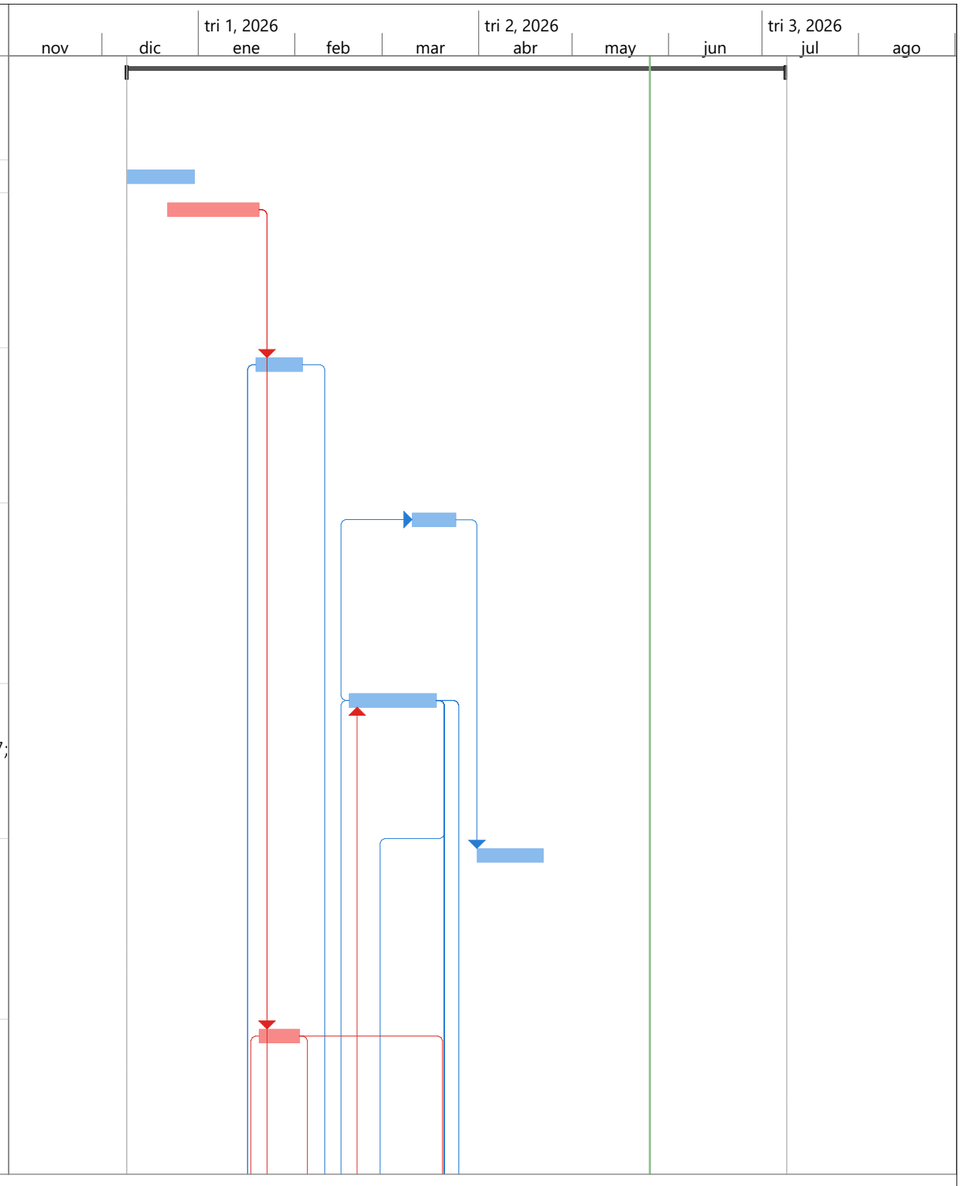

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
9	9	Pañetado y estucado de zonas intervenidas de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de	52 días	30.00	18/03/26	1/06/26	6	
10	10	Desmonte de cielo Razo existente de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	18 días	935.45	26/01/26	18/02/26	8CC+5 días	6;114FC-5 días;115;116;118;120;1 días;49FC+20 días;11FC+37 días;52
11	11	Suministro e instalación de nuevo cielo Raso en lamina en Drywall de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 16	51 días	871.71	10/04/26	19/06/26	10FC+37 días	14CC+15 días;122FC-15 días;67FC-17 días;69CC+15 días;72FC-19 días;91CC+10 días
12	~~12~~	~~Suministro e instalación de descolgado o plafón en Drywall a zona de atención especializada de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
13	~~13~~	~~Alistado de piso en mortero de nivelación e= 2cm de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
14	14	Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante tráfico pesado de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (seg	33 días	345.36	29/04/26	16/06/26	11CC+15 días	15FC-9 días;73CC+12 días;18FC+2 días;22FC-5 días;92
15	15	Suministro e instalación de guarda escobas para piso de porcelanato antideslizante tráfico pesado de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y	15 días	160.900	3/06/26	23/06/26	14FC-9 días	92;16;127FC-30 días

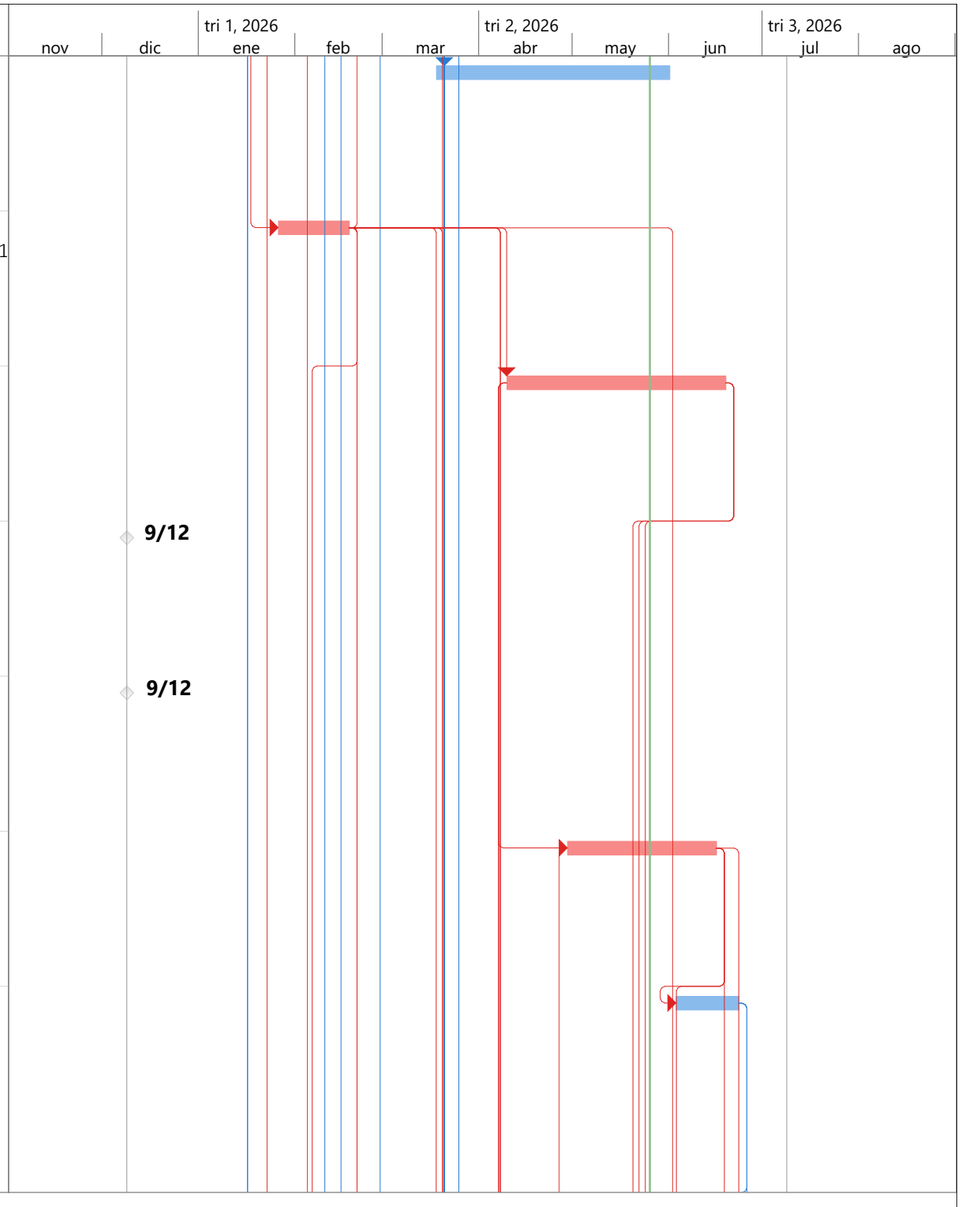

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
16	16	Suministro e instalación de paneles divisorios de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 41	5 días	5.00	23/06/26	1/07/26	15	
17	~~17~~	~~Suministro e instalación de escritorio tipo L de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
18	18	Suministro e instalación de escritorio 120x60x73 de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley	10 días	38.00	18/06/26	2/07/26	14FC+2 días	37;79FC+2 días;80FC+2 días;38FC+2 días;77CC+5 días;83FC-15 días;138CC+3 días;139CC+3
19	19	Desmonte y demolición de bardillas de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	12 días	8.98	5/03/26	20/03/26	6FC-10 días	142
20	20	Desmonte de vidrios existentes de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	110 días	67.03	22/01/26	20/06/26	3FC+2 días	142CC+5 días
21	~~21~~	~~Suministro de sofa para la atención al ciudadano de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
22	22	Cambio de herrajes puerta de vidrio de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	18 días	1.00	8/06/26	3/07/26	14FC-5 días	

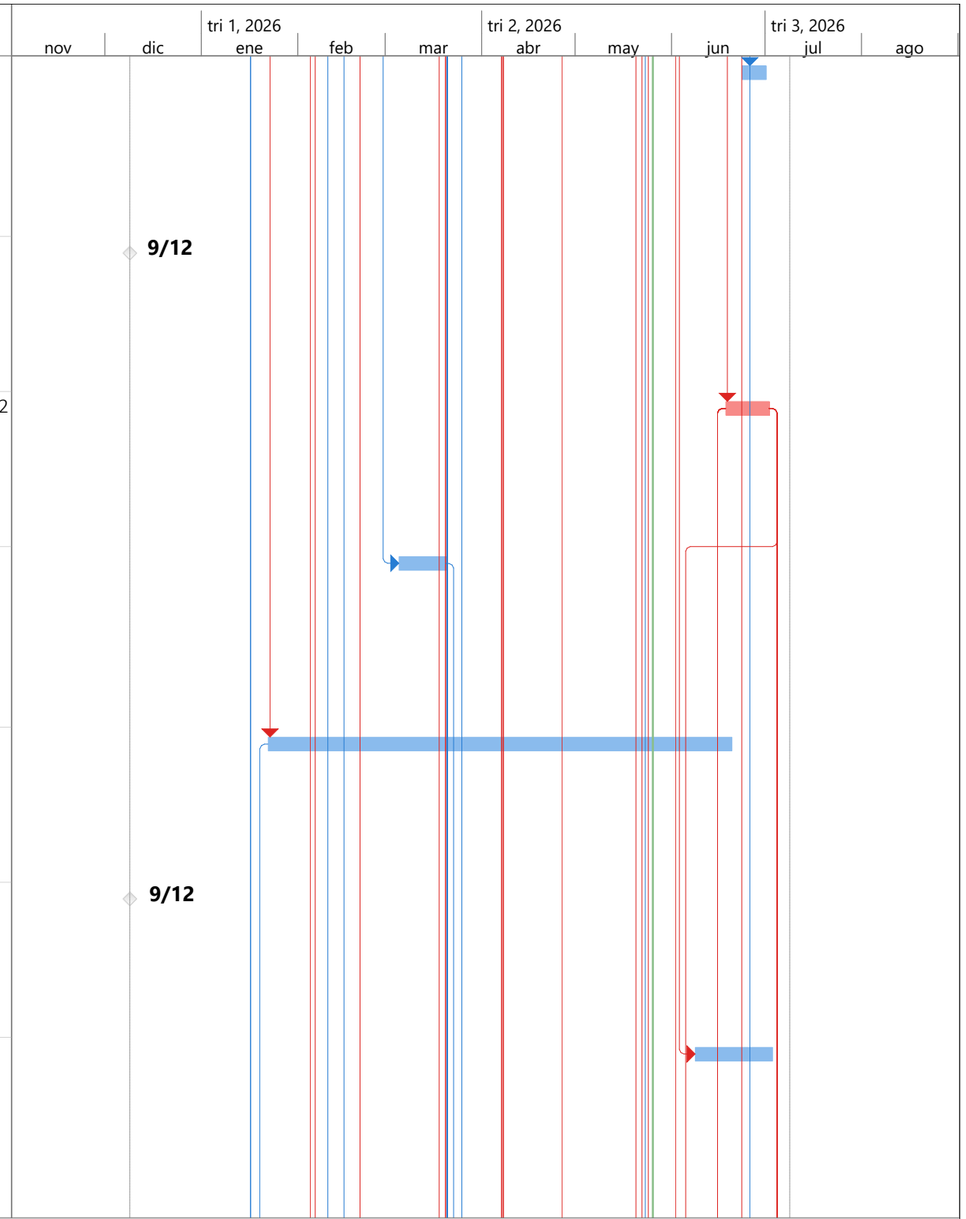

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
23	23	Adecuación de terraza por filtración de aguas lluvias -> Preparación de la superficie de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás eroga	8 días	78.05	8/01/26	19/01/26		24FC+2 días
24	24	Adecuación de terraza por filtración de aguas lluvias -> Reparación de sifones sin cambio de Sifa de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y	5 días	4.00	22/01/26	28/01/26	23FC+2 días	26FC+61 días
25	~~25~~	~~Adecuación de terraza por filtración de aguas lluvias -> Reparación de sifones con cambio de Sifa de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
26	26	Adecuación de terraza por filtración de aguas lluvias -> Impermeabilización con Poliuria de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás er	10 días	78.05	20/04/26	4/05/26	24FC+61 días	28FC+7 días
27	~~27~~	~~Adecuación de terraza por filtración de aguas lluvias -> Protección con rayos UV de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogacione~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
28	28	Adecuación de terraza por filtración de aguas lluvias -> Suministro e instalación de tableta gres para terraza de la entidad para evitar filtraciones de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, e	13 días	78.05	14/05/26	1/06/26	26FC+7 días	29
29	29	Adecuación de terraza por filtración de aguas lluvias -> Suministro e Instalación de baranda metálica perimetral para terraza superior de la entidad para evitar riesgos de caídas de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, inc	5 días	25.80	1/06/26	8/06/26	28	

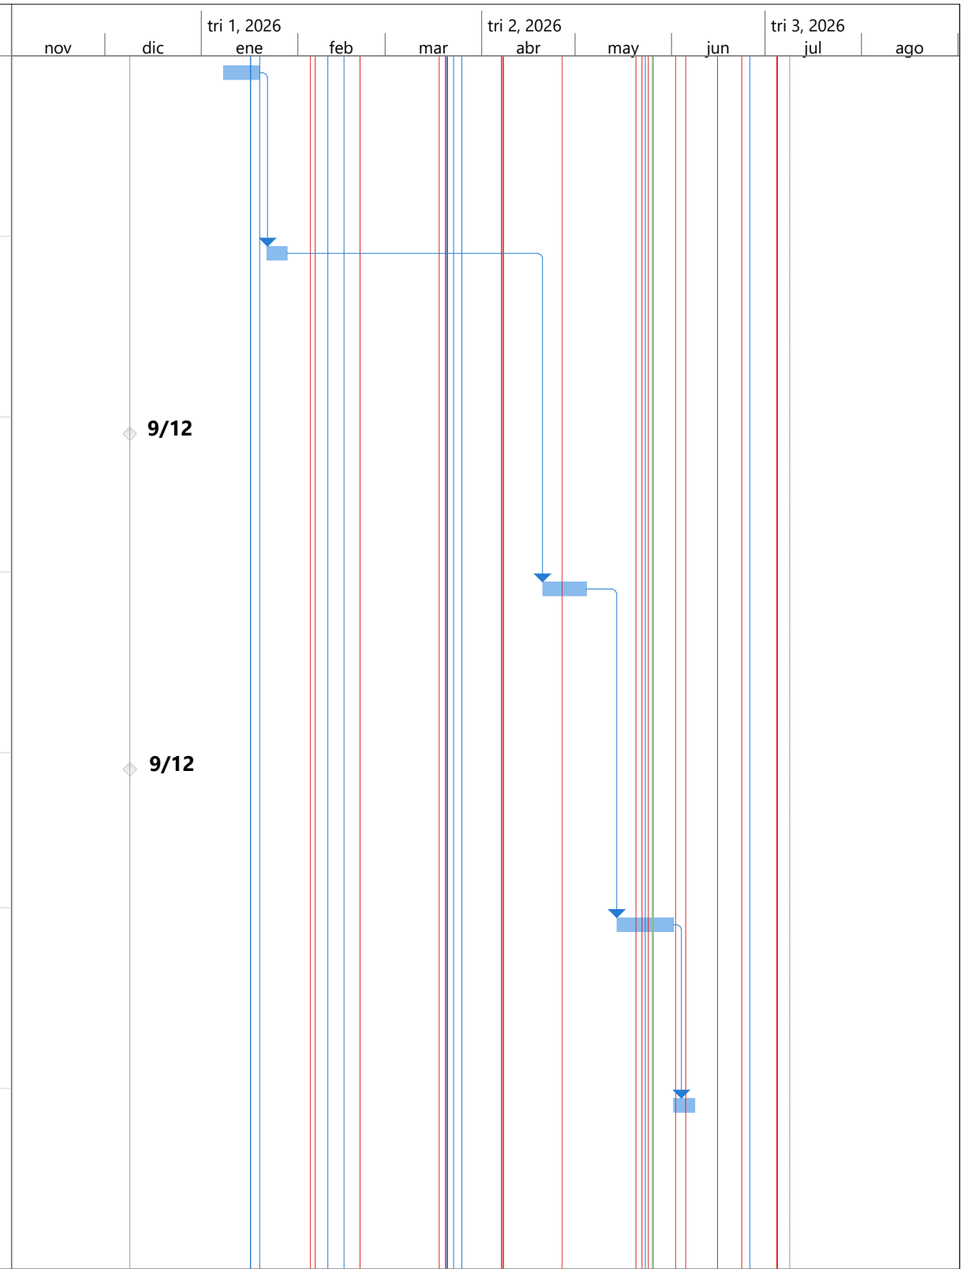

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
30	30	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Localización general y replanteo de redes de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás eroga	16 días	1.00	18/03/26	10/04/26	6	
31	~~31~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de canaleta con división en hierro cold rolled pintura electrostática 10 x 5 cm de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, eq~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
32	~~32~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de troquel para datos en hierro cold rolled pintura electrostática 10 cm de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
33	~~33~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de troquel doble para toma levitón en hierro cold rolled pintura electrostática 10 cm de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramient~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
34	~~34~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de troquel sencillo para toma leviton en hierro cold rolled pintura electrostática 10 cms de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herram~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
35	35	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de toma eléctrica con polo a tierra aislado grado hospitalario color naranja de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equip	45 días	73.00	27/04/26	30/06/26	42CC;43CC;106CC	
36	36	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de toma eléctrica con polo a tierra color marfil de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impu	45 días	102.00	27/04/26	30/06/26	42CC;43CC;106CC	131CC;132CC;133CC

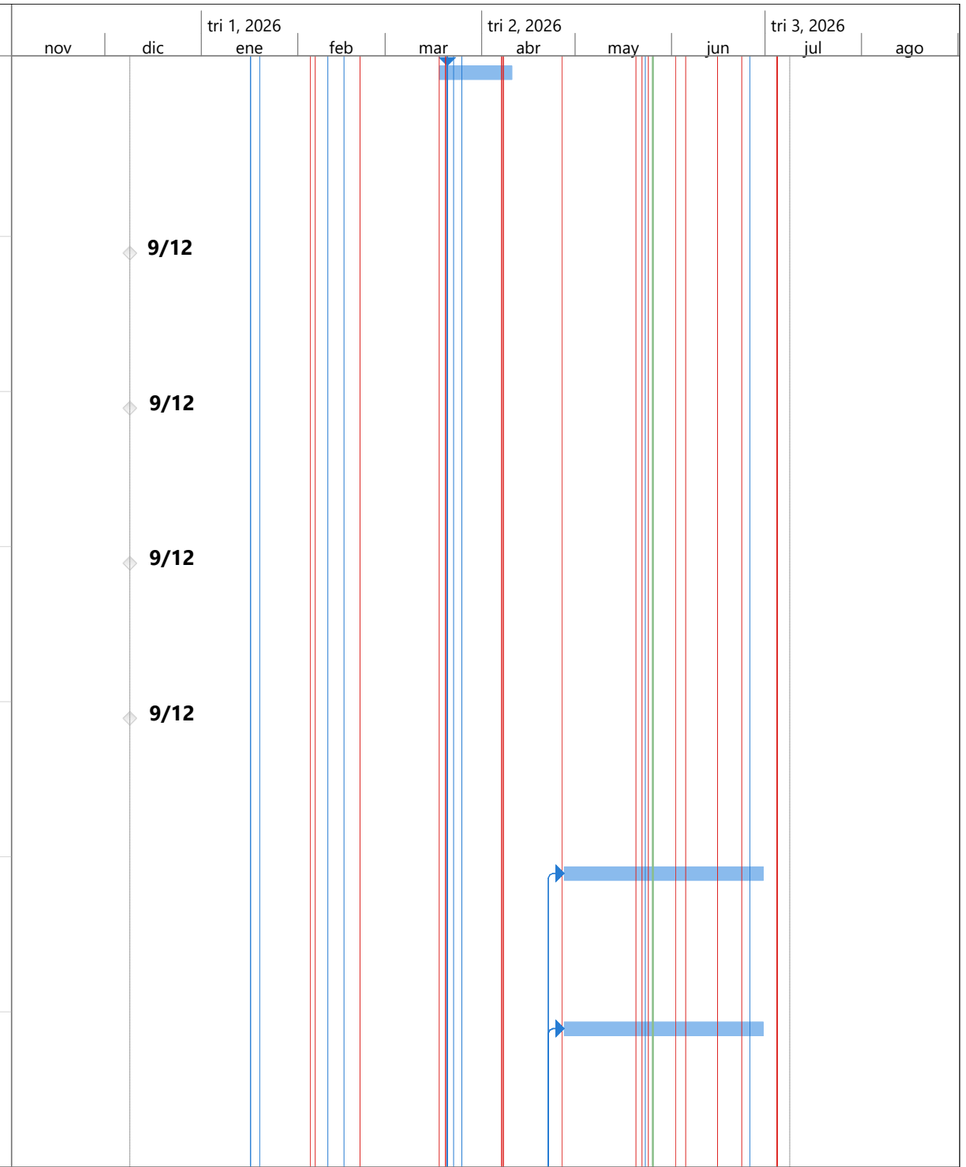

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
37	37	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de face-plate doble de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás er	4 días	86.00	2/07/26	7/07/26	18	100CC
38	38	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de face-plate sencillo de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás	2 días	3.00	4/07/26	7/07/26	18FC+2 días	101CC
39	39	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de jack r-45 color azul de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demá	6 días	39.00	12/06/26	22/06/26	44CC+1 día	
40	40	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de jack r-45 color rojo de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demá	6 días	9.00	12/06/26	22/06/26	44CC+1 día	
41	41	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de cable UTP categoría 6A 100 % cobre certificado de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, imp	8 días	7,869.60	10/06/26	22/06/26	127FC-5 días	44FC-7 días
42	42	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de cable 3 x 12 cobre trenzado libre de halógenos (rojo, blanco, verde) de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y	45 días	585.07	27/04/26	30/06/26	48	36CC;35CC;99CC
43	43	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de cable 3 x 12 cobre trenzado libre de halógenos (azul, blanco, verde) de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y	45 días	107.00	27/04/26	30/06/26	48	106CC;36CC;35CC;99CC

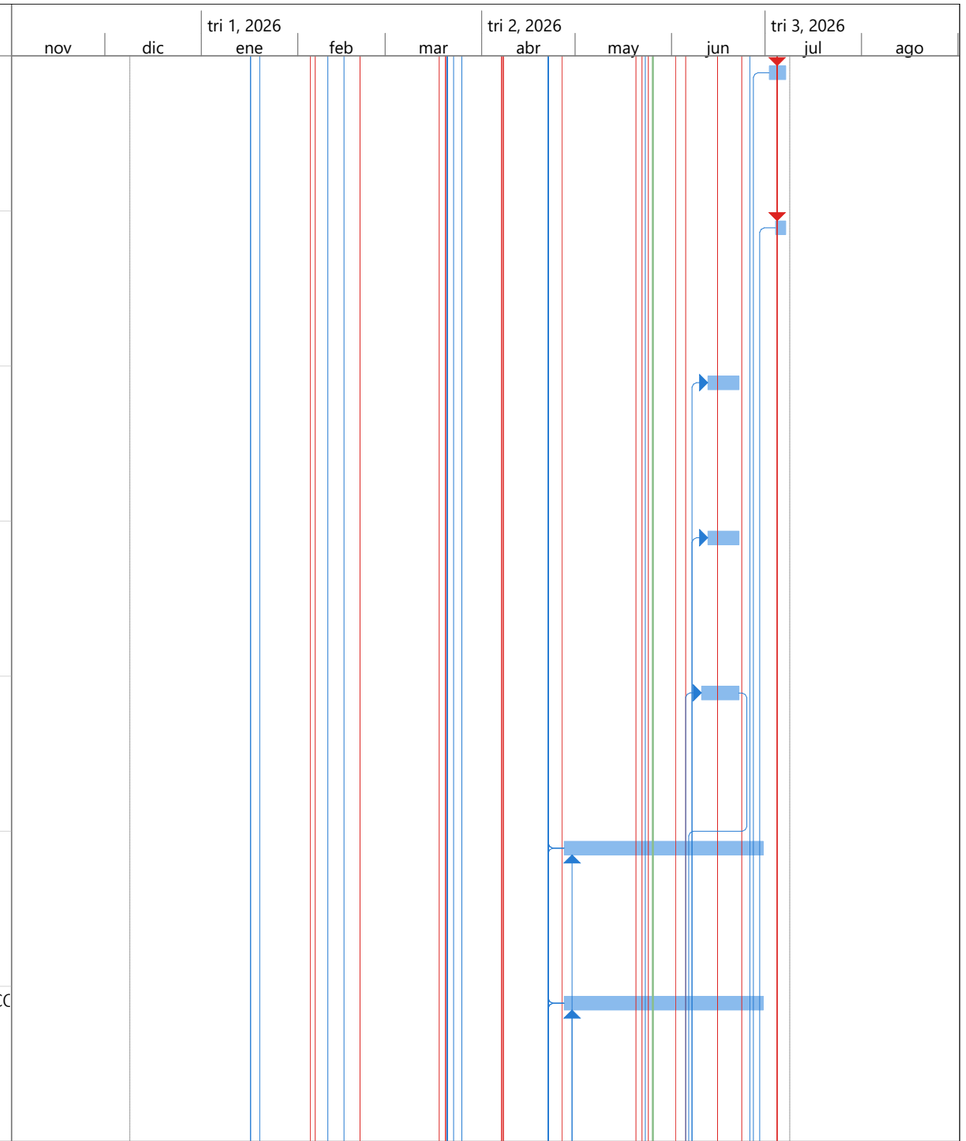

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
44	44	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de patch panel 24 puertos categoría 6a herraje modular de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA	5 días	9.00	11/06/26	19/06/26	41FC-7 días	107CC;40CC+1 día;39CC+1 día;51;112
45	45	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico con puerta de 24 circuitos certificado de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y ma~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
46	46	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de breaker enchufable monopolar 20 amperios de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos	2 días	20.00	18/06/26	20/06/26	145	108CC+10 días
47	47	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de bandeja porta cable tipo malla cablofil 150 x 55 de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, i~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
48	48	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de tubo EMT 1" de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaci	15 días	40.00	8/04/26	27/04/26	10FC+20 días;115;119;121	42;43
49	49	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de tubo EMT 3/4" de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás eroga	30 días	106.00	8/04/26	20/05/26	10FC+20 días;115;119;121	111
50	50	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de rack de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (s	3 días	1.00	10/02/26	13/02/26	4FC+6 días	

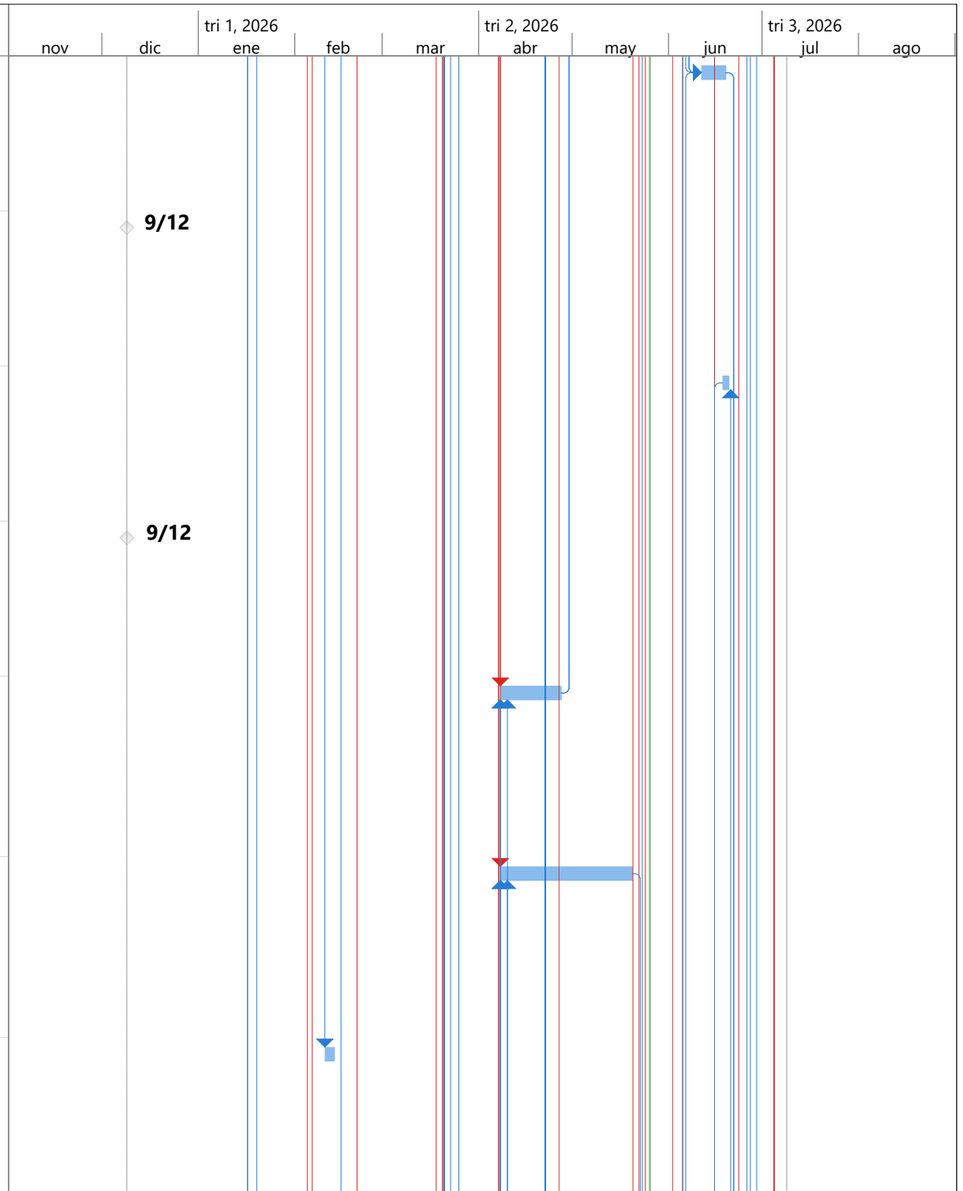

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
51	51	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de patch cord categoría 6a de 2m de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampill	3 días	189.00	19/06/26	23/06/26	44	
52	52	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Ampliación de cuarto de comunicación de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogacione	60 días	1.00	18/03/26	10/06/26	4CC+6 días;6;10	
53	~~53~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de lampara led aro colgante de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
54	~~54~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de panel led 120x30 de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás er~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
55	~~55~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de panel led redondo de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás e~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
56	56	Adecuacion de biblioteca -> Desmonte y Reubicación de estante 1,3x4,7 m, de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Le	60 días	3.00	25/03/26	18/06/26	6;115;116;118	
57	57	Adecuacion de biblioteca -> Desmonte y Reubicación de estantes 1,3x3,50 m de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y L	60 días	3.00	25/03/26	18/06/26	6;115;116;118	

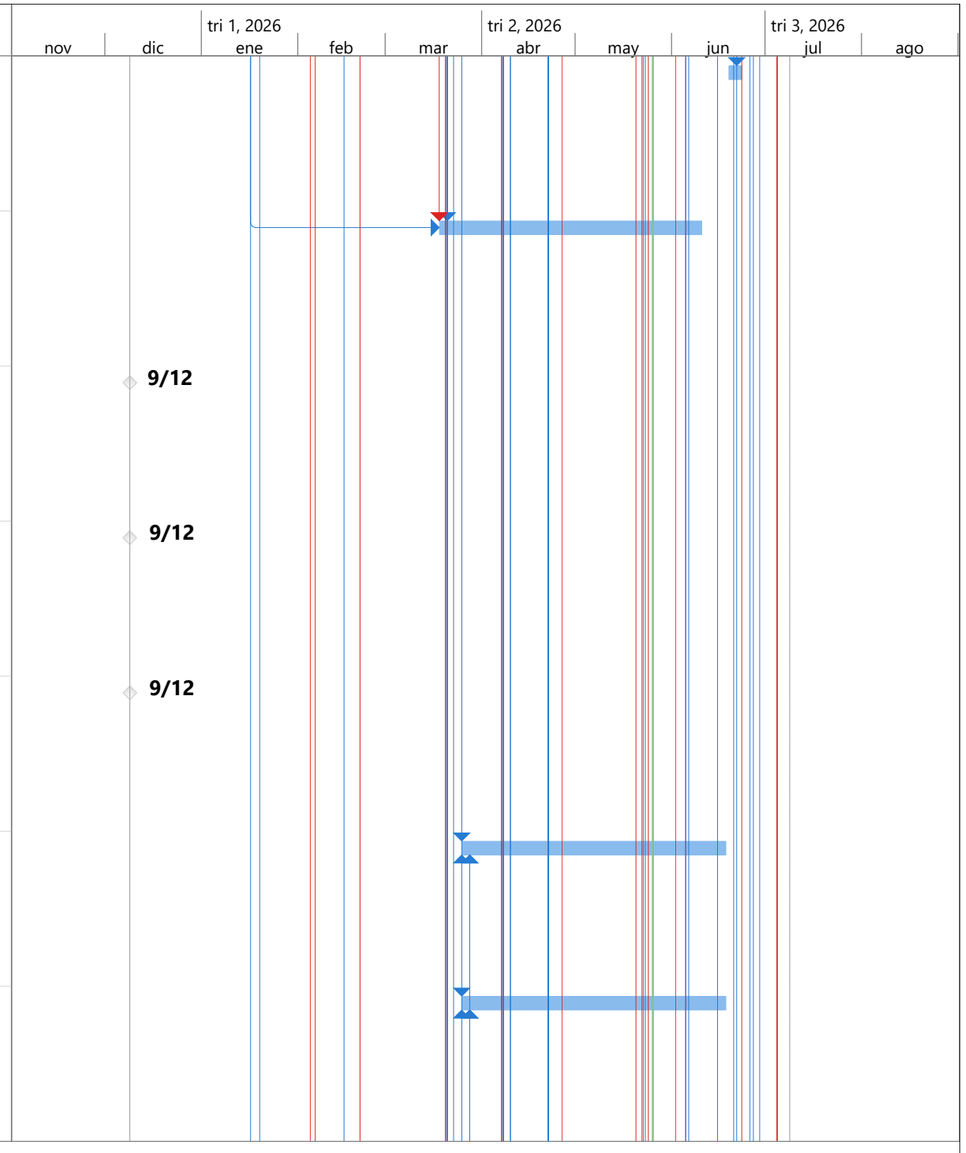

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
58	58	Adecuacion de biblioteca -> Desmonte y Reubicación de estantes 0,41x0,95 m de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y	60 días	8.00	25/03/26	18/06/26	6;115;116;118	59FC-13 días
59	59	Adecuacion de biblioteca -> Mantenimiento de estantes de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	15 días	7.00	1/06/26	20/06/26	58FC-13 días	
60	60	Adecuacion de biblioteca -> Desmonte de alfombra de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	2 días	196.34	26/02/26	2/03/26	6CC+7 días	68FC+1 día;61
61	61	Adecuacion de biblioteca -> Suministro e instalación de piso SPC de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de	12 días	230.00	14/05/26	1/06/26	142FC+13 días;60	62FC+4 días;137FC+10 días
62	62	Adecuacion de biblioteca -> Suministro e instalación de guarda escobas de piso SPC de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de	4 días	110.00	5/06/26	10/06/26	61FC+4 días	
63	~~63~~	~~Adecuacion de biblioteca -> Tratamiento de madera de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
64	~~64~~	~~Adecuacion de biblioteca -> Suministro e instalación de divisiones de vidrio insonorizadas de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		

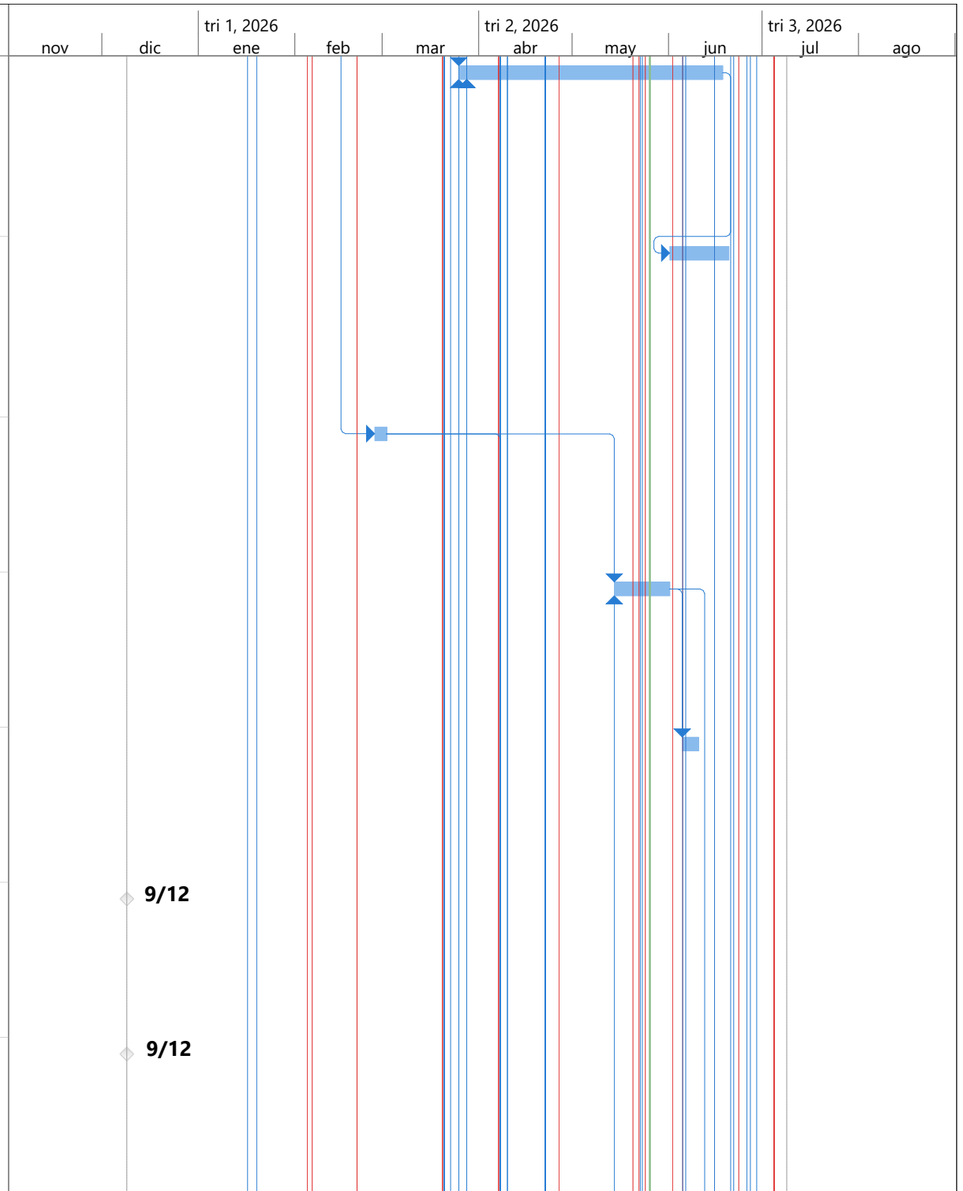

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
65	65	~~Adecuacion de biblioteca -> Suministro e instalación de mueble para recepción de biblioteca de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Le~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
66	66	Adecuacion de biblioteca -> Suministro e instalación de películas de protección de rayos UV de vidrio de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones	5 días	10.00	12/06/26	20/06/26	137FC-10 días	
67	67	Adecuacion de biblioteca -> Suministro e instalación de rejillas de ventilación de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 20	22 días	22.00	27/05/26	25/06/26	11FC-17 días	
68	68	Adecuacion de biblioteca -> Reubicación de puerta de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	8 días	1.00	8/04/26	17/04/26	60FC+1 día;118;119;120;12	
69	69	Adecuacion de biblioteca -> Suministro e instalación de panel led de 60x60 de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y	40 días	172.00	29/04/26	24/06/26	11CC+15 días	
70	70	~~Adecuacion de biblioteca -> Reparación carpintería metálica de ventanearía de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
71	71	Adecuacion de zona de ingreso -> Divisiones de vidrio con película opalizada incluye puertas abatibles de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogacione	16 días	20.25	10/06/26	3/07/26	73	

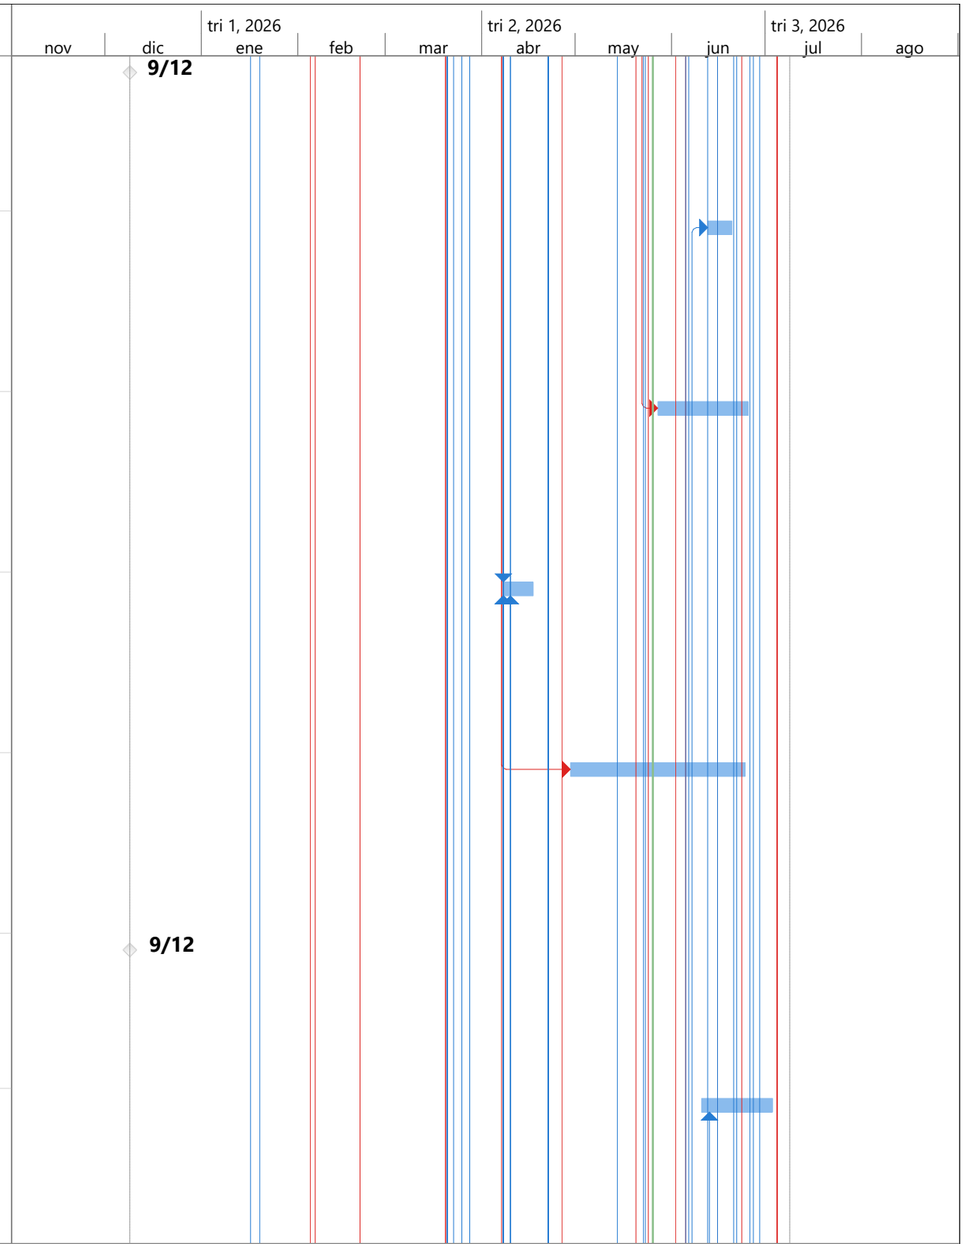

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
72	72	Construcción de muro en lámina de Drywall de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de	10 días	21.06	25/05/26	6/06/26	11FC-19 días	
73	73	Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante tráfico pesado de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (seg	18 días	350	19/05/26	10/06/26	14CC+12 días	74FC+9 días;76;123CC;71;75FC-días
74	74	Suministro e instalación de guarda escobas para piso de porcelanato antideslizante tráfico pesado de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y	8 días	160.90	23/06/26	4/07/26	73FC+9 días	123CC+3 días
75	75	Suministro e instalación de puerta de vidrio de seguridad de 10 mm ancho .90cms de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones	26 días	6.00	1/06/26	6/07/26	73FC-8 días	
76	76	Aplicación de pintura tipo vinilo para interiores de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley	15 días	552.42	10/06/26	2/07/26	73	81FC-2 días;82FC-5 días;127FC-25 días
77	77	Suministro e instalación de escritorio 120x60x73 de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley	8 días	40	24/06/26	6/07/26	18CC+5 días	
78	~~78~~	~~Suministro e instalación de escritorio en arco para atención al ciudadano de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (segú~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		

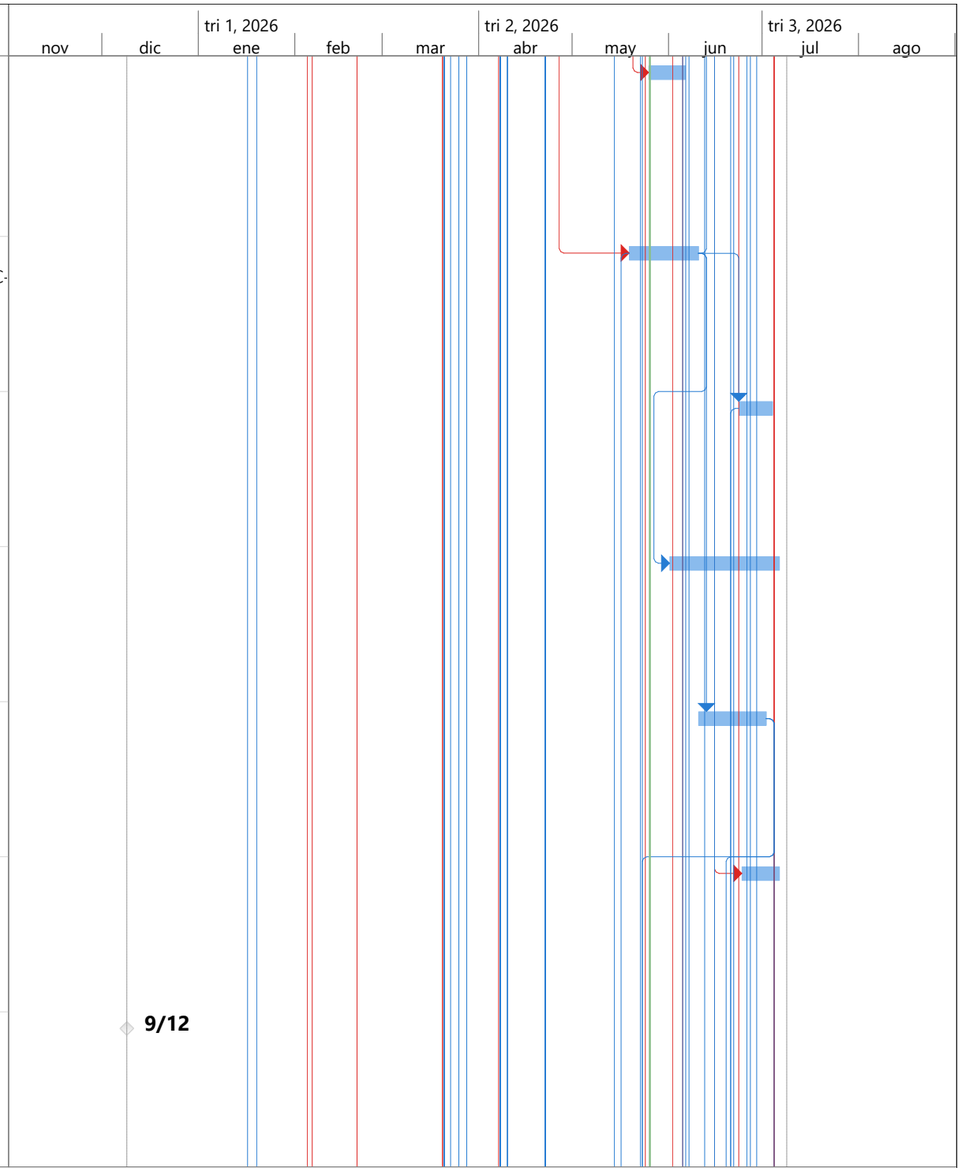

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
79	79	Suministro de silla ergonómicas para oficina de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418	2 días	104.00	4/07/26	7/07/26	18FC+2 días	
80	80	Suministro de sillas para atención al ciudadano de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 4	2 días	8.00	4/07/26	7/07/26	18FC+2 días	
81	81	Suministro e instalación de cortinas de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)	6 días	166.09	30/06/26	7/07/26	76FC-2 días	
82	82	Señalética para personas en condición de discapacidad de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y	8 días	1.00	24/06/26	6/07/26	76FC-5 días	
83	83	Suministro e instalación de divisiones de vidrio de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley	18 días	75.00	10/06/26	6/07/26	18FC-15 días	92CC+7 días
84	84	Desmonte y Reubicación de archivos de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	30 días	1.00	20/02/26	1/04/26	113	
85	85	Demolición de muroS en bloque de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	14 días	63	18/03/26	8/04/26	6;4CC	

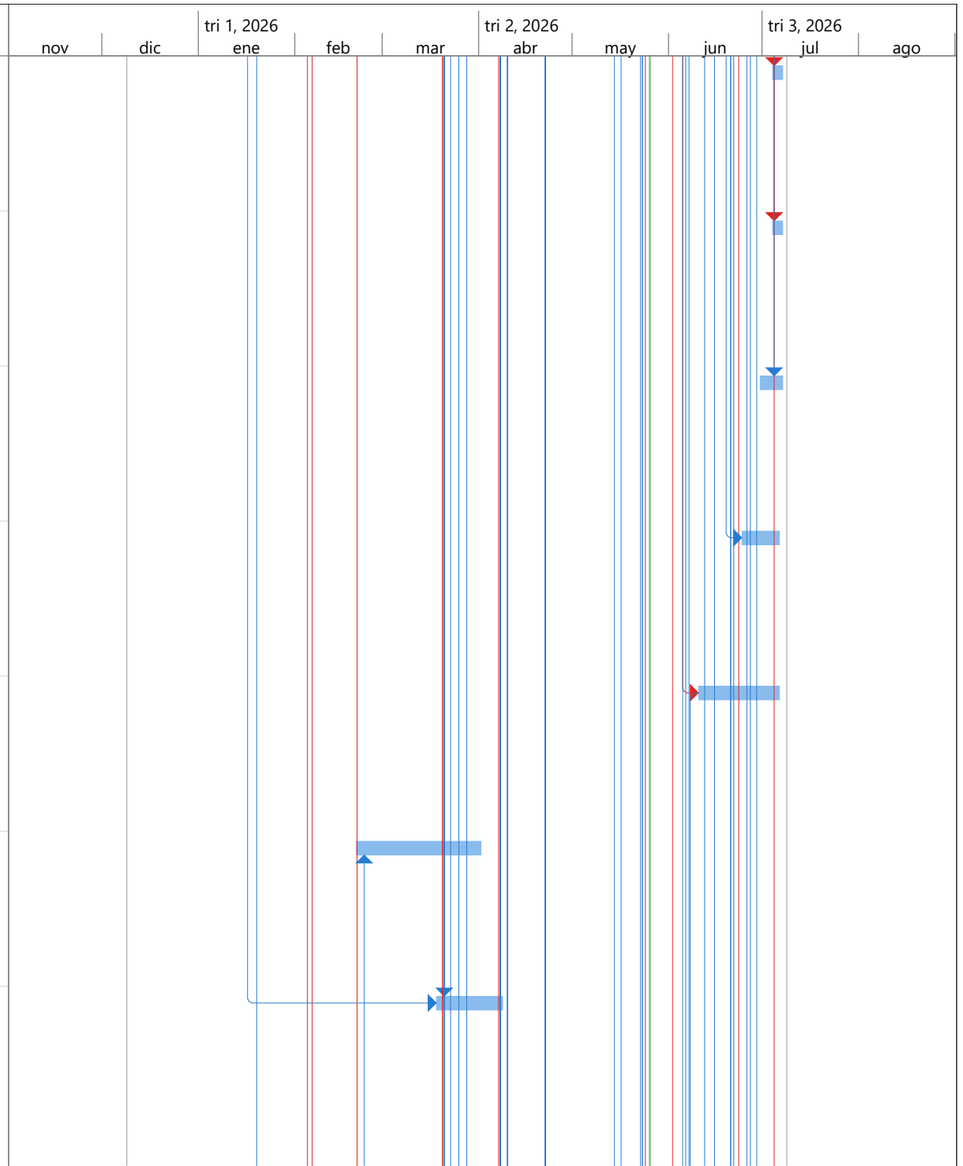

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
86	86	Demolición de muro en drywall o superboard de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de	10 días	47.42	20/03/26	6/04/26	6FC+2 días	87FC-4 días
87	87	Demolición de caja fuerte tipo banco de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)	20 días	1.00	30/03/26	27/04/26	86FC-4 días	88CC+8 días
88	88	Desmonte de puerta de caja fuerte tipo banco de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418	6 días	1.00	10/04/26	18/04/26	87CC+8 días	
89	89	Desmonte de puertas de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).	8 días	12.00	18/03/26	30/03/26	6	
90	~~90~~	~~Mantenimiento de cielo Razo en lamina coldroller de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
91	91	Reubicación de sistema de Sensores de aspiración del sistema contraincendios de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (s	51 días	1.00	23/04/26	3/07/26	11CC+10 días	
92	92	Suministro e instalación de mesa de juntas de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de	2 días	1.00	23/06/26	25/06/26	14;15;83CC+7 días	

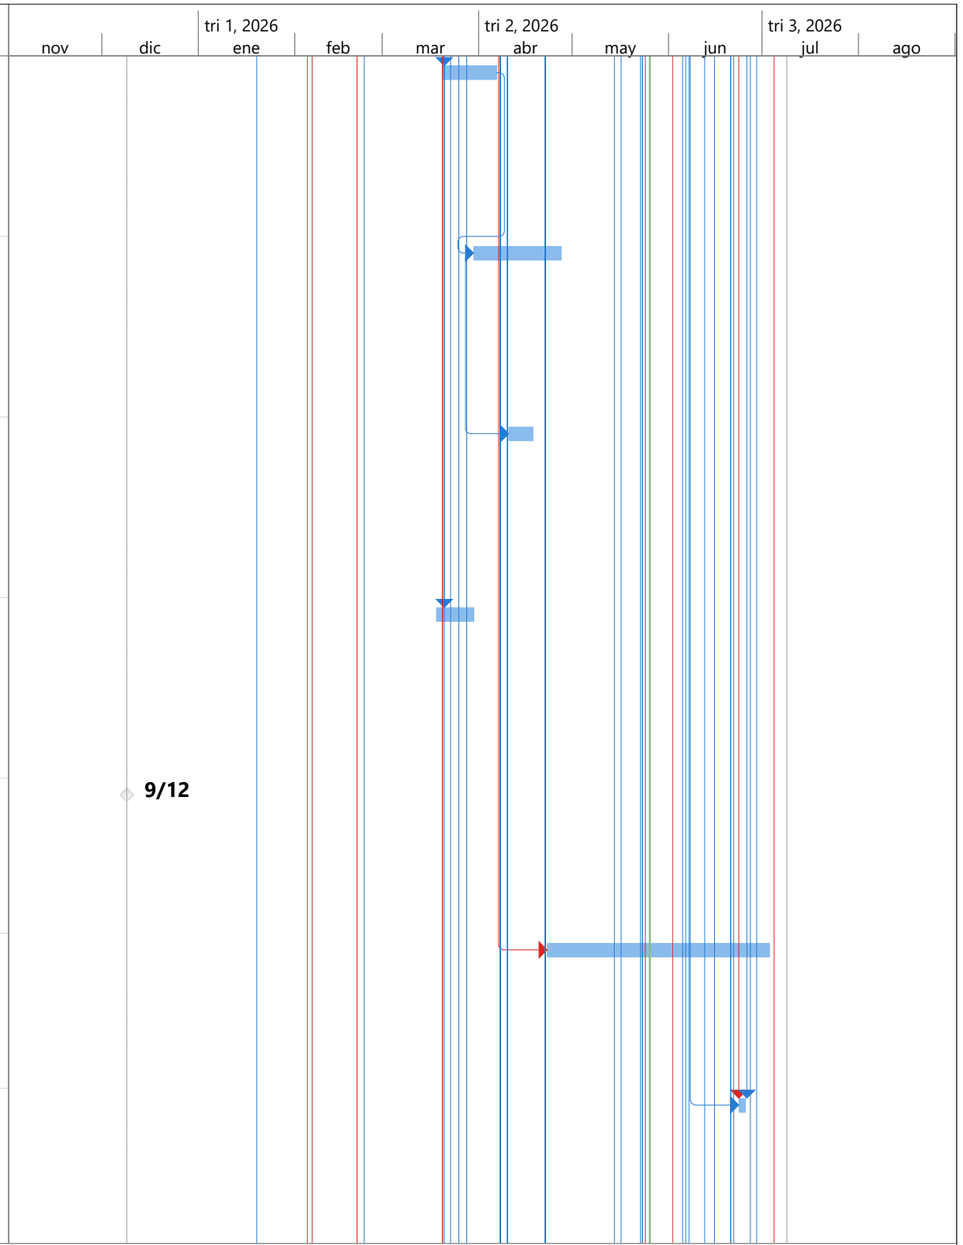

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
93	93	~~Mantenimiento de pisos en tableta de granito de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
94	94	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de canaleta con división en hierro cold rolled pintura electrostática 10 x 5 cm de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, eq~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
95	95	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de troquel para datos en hierro cold rolled pintura electrostática 10 cm de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
96	96	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de troquel doble para toma levitón en hierro cold rolled pintura electrostática 10 cm de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramient~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
97	97	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de troquel sencillo para toma leviton en hierro cold rolled pintura electrostática 10 cms de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herram~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
98	98	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de toma eléctrica con polo a tierra aislado grado hospitalario color naranja de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equip~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
99	99	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de toma eléctrica con polo a tierra color marfil de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impu	45 días	102.00	27/04/26	30/06/26	42CC;43CC;106CC	

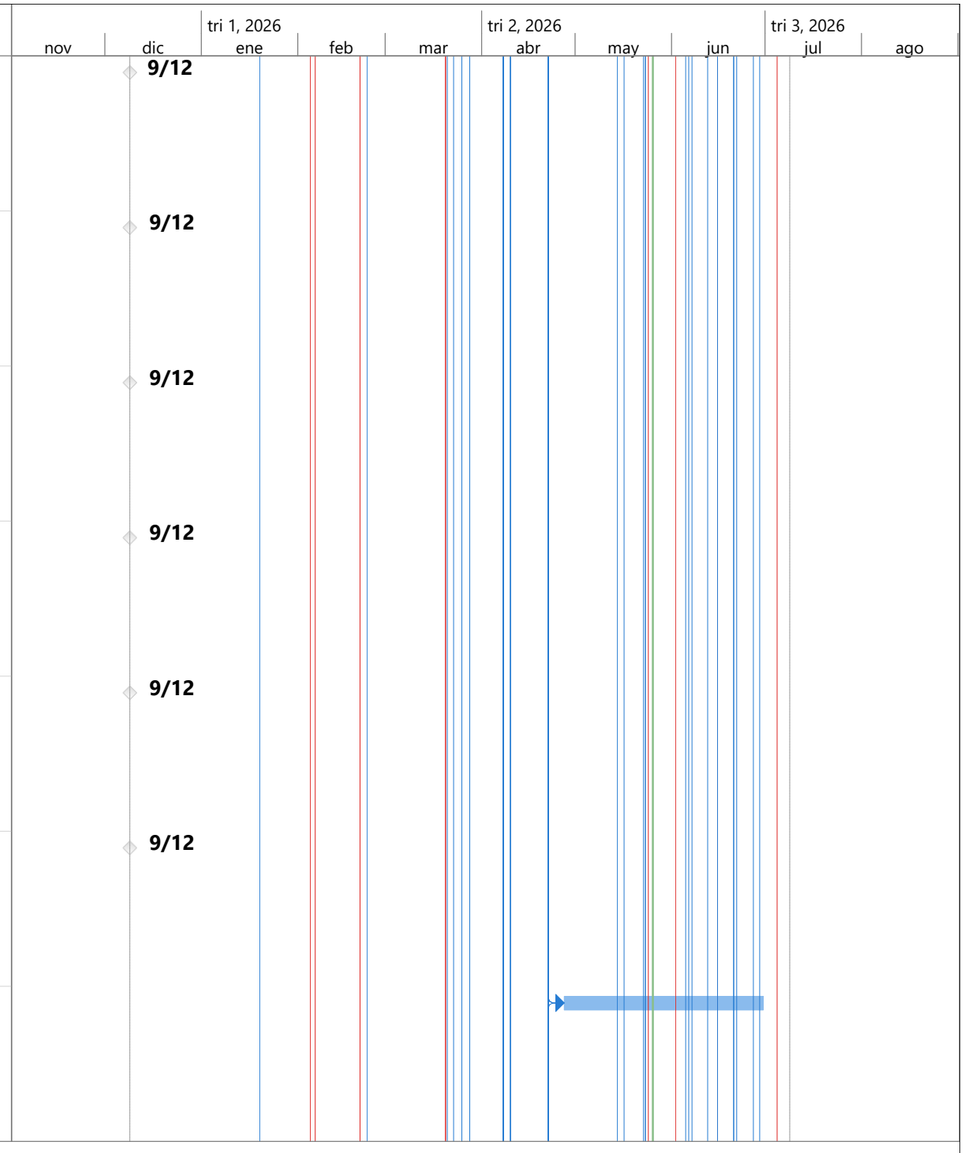

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
100	100	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de face-plate doble de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás er	2 días	41.00	2/07/26	4/07/26	37CC	
101	101	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de face-plate sencillo de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás	1 día	6.00	4/07/26	6/07/26	38CC	
102	~~102~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de jack r 45 color azul de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demá~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
103	~~103~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de jack r 45 color rojo de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demá~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
104	~~104~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de cable UTP categoría 6A 100 % cobre certificado de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, imp~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
105	~~105~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de cable 3 x 12 cobre trenzado libre de halógenos (rojo, blanco, verde) de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
106	106	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de cable 3 x 12 cobre trenzado libre de halógenos (azul, blanco, verde) de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y	45 días	478.07	27/04/26	30/06/26	43CC	36CC;35CC;99CC

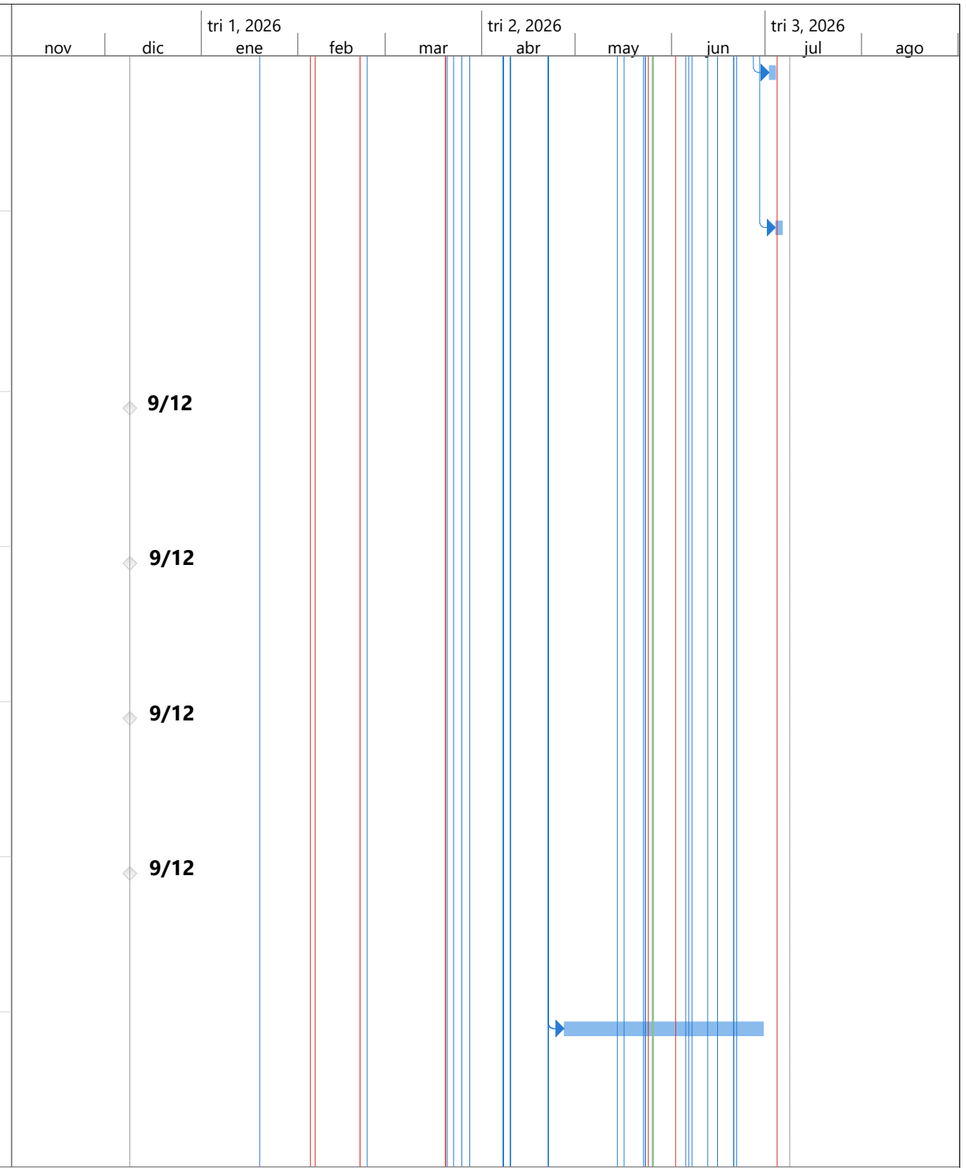

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
107	107	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de patch panel 24 puertos categoría 6a herraje modular de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA	1 día	1.00	11/06/26	12/06/26	44CC	
108	108	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de breaker enchufable monopolar 20 amperios de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos	2 días	42.00	2/07/26	4/07/26	46CC+10 días	
109	~~109~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de bandeja porta cable tipo malla cablofil 150 x 55 de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, i~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
110	~~110~~	~~Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de tubo EMT 1" de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaci~~	~~0 días~~	~~.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		~~146~~
111	111	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de tubo EMT 3/4" de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás eroga	10 días	434.00	20/05/26	2/06/26	49	146
112	112	Instalaciones eléctricas, de datos y voz -> Suministro e instalación de patch cord categoría 6a de 2m de conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampill	3 días	88.00	19/06/26	23/06/26	44	
113	113	Desmonte y retiro de ductos de sótano en Almacén 1-S y depósito 2-S (2.00 x 0.50 m)	2 días	13.83	19/02/26	20/02/26		84
114	114	Desmonte y retiro de tubería de red eléctrica antigua	1 día	969.49	11/02/26	12/02/26	10FC-5 días	
115	115	Demolición de piso de alistado hasta 4 cm	27 días	1,644.15	18/02/26	25/03/26	10	119;48;49;56;57;58
116	116	Demolición de guardaescobas	27 días	468.29	18/02/26	25/03/26	10	56;57;58
117	117	Retiro y trasiego de cortinas	5 días	141.23	2/02/26	7/02/26	8	

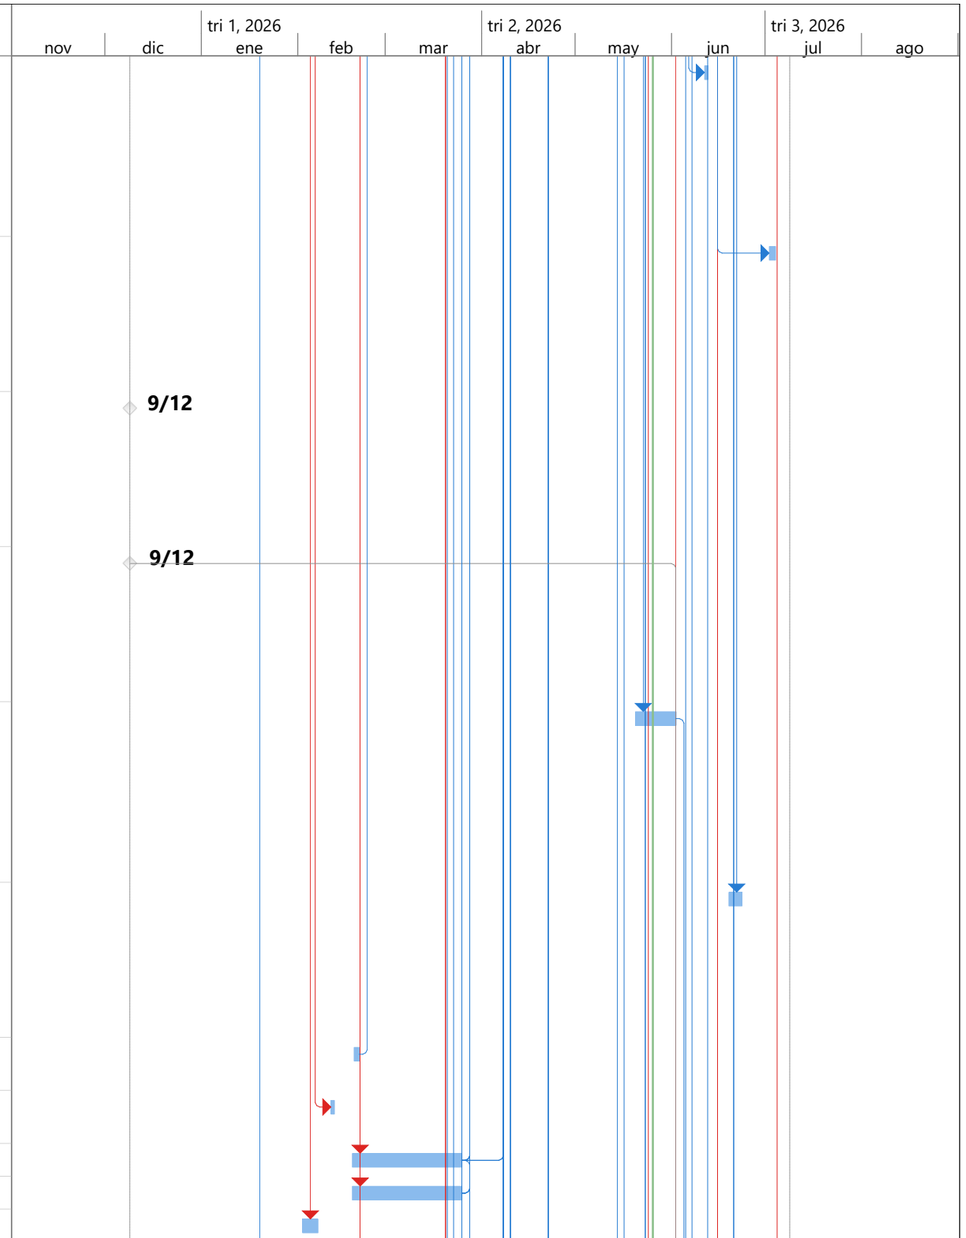

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
118	118	Retiro y disposición de muebles (1.24x0.90x0.40) bajo mesón en biblioteca	1 día	7.00	18/02/26	19/02/26	10	68;56;57;58
119	119	Alistados de hasta 4 cm	8 días	762.94	25/03/26	7/04/26	115	127;48;49;68
120	120	Desmonte, retiro y disposición superficie madera en biblioteca	1 día	5.11	18/02/26	19/02/26	10	68
121	121	Desmonte piso laminado	1 día	31.12	24/01/26	26/01/26		48;49;68
122	122	Suministro e instalación de marco para luminaria de 60x60	20 días	172.00	29/05/26	25/06/26	11FC-15 días	
123	123	Suministro e instalación de canaleta con división en hierro cold rolled pintura electrostática 12 x 5 cm	5 días	253.00	26/06/26	4/07/26	74CC+3 días;73CC	124CC;125CC;126CC;12
124	124	Suministro e instalación de troquel para datos en hierro cold rolled pintura electrostática 12 cm	5 días	30.00	26/06/26	4/07/26	123CC	
125	125	Suministro e instalación de troquel doble para toma levitón en hierro cold rolled pintura electrostática 12 cm	5 días	30.00	26/06/26	4/07/26	123CC	
126	126	Suministro e instalación de troquel sencillo para toma leviton en hierro cold rolled pintura electrostática 12 cms	5 días	9.00	26/06/26	4/07/26	123CC	
127	127	Suministro e instalación de bandeja porta cable tipo malla cablofil 300 x 54	15 días	162.50	28/05/26	18/06/26	119;15FC-30 días;76FC-25 días	136CC+20 días;144FC-5
128	~~128~~	~~Suministro e instalación de luminaria de emergencia bala 1,2 W~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
129	129	Suministro e instalación de cable 2*10+12 cobre libre de halógenos	5 días	977.80	26/06/26	4/07/26	123CC	
130	130	Suministro e instalación de cable 2*8+10 cobre libre de halógenos	5 días	1522.32	26/06/26	4/07/26	123CC	
131	131	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en tuberia EMT 3/4" hats 4m.	10 días	30.00	27/04/26	12/05/26	36CC	
132	132	Suministro e instalación de salida para interruptor doble en tuberia EMT 3/4" hats 4m.	10 días	10.00	27/04/26	12/05/26	36CC	
133	133	Suministro e instalación de salida para luminarias en tuberia EMT 3/4"hats 4m.	20 días	148.00	27/04/26	26/05/26	36CC	146
134	~~134~~	~~Suministro e instalación de salida para luminarias emergencia en tuberia EMT 3/4" hats 4m.~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		~~146~~
135	135	Suministro e instalación de breaker enchufable monopolar 30 amperios	4 días	15.00	24/06/26	1/07/26	145FC+5 días	
136	136	Suministro e instalación de tubo EMT 1 1/4"	4 días	90.00	24/06/26	1/07/26	127CC+20 días	
137	137	Suministro e instalación tablero de madera industrial para biblioteca de melamina de 15 mm de espesor, con bordes enchapados en madecanto rígido. Colores de Línea.	10 días	5.11	12/06/26	26/06/26	61FC+10 días	66FC-10 días

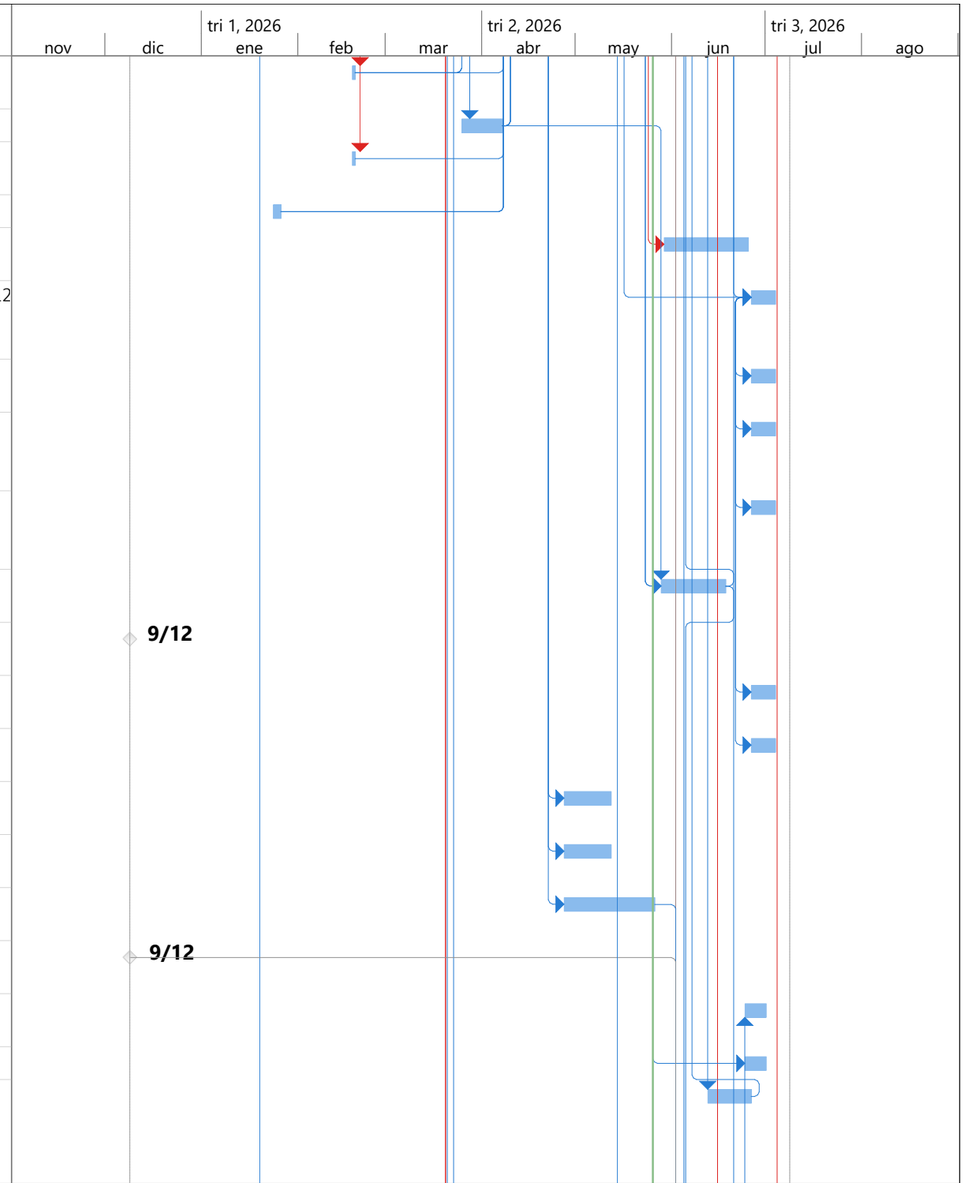

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
138	138	Suministro e instalación de escritorio en arco para atención al ciudadano Dimensión Aproximada.1.20 m de largo × 0.60 m de ancho × 1.00 - 0.75 m de alto. Estructura de panel frontal tipo mostrador en melanina 15mm RH y laminados de alta presión Superficie	10 días	9.00	22/06/26	6/07/26	18CC+3 días	
139	139	Suministro e instalación de mueble para recepción de biblioteca Dimensión Aproximada.2.80 m de largo × 2.20 m de ancho × 1.00 - 0.75 m de alto. Estructura de panel frontal en melanina 15mm RH y laminados de alta presión Superficie: Compuesta por tablero d	10 días	1.00	22/06/26	6/07/26	18CC+3 días	
140	140	Suministro e instalación de escritorio tipo L Dimensión Aproximada: 0,73 mts de alto x 1.50 de ancho x 1,50 de largo Conformado por una superficie principal de 1,50 x 0,60 y una superficie retorno de 0,90 x 0,60 Superficie: Compuesta por tablero de madera	10 días	8.00	22/06/26	6/07/26	18CC+3 días	
141	141	Suministro e Instalacion de escritorio con superficie compuesta en tablero de madera industrial melamina 30 mm de espesor con dimensiones aproximadas 1,50mt de largo x 0,60 mt de ancho x 0,73 mt de alto. Colores de linea, CAJONERIA : 37 cms de frente × 4	10 días	30.00	22/06/26	6/07/26	18CC+3 días	
142	142	Mortero cementicio de nivelación de hasta 20 mm	25 días	220.00	20/03/26	24/04/26	6;8;10;19;20CC+5 días	61FC+13 días
143	~~143~~	~~Patch cord de categoría 6A de 1.50 m~~	~~0 días~~	~~0.00~~	~~9/12/25~~	~~9/12/25~~		
144	144	Cable desnudo #6	10 días	450.00	10/06/26	24/06/26	127FC-5 días	
145	145	Tablero Enchufable Trifase 42Circ, incluye puerta y espacio para totalizador	5 días	1.00	10/06/26	18/06/26	127CC+10 días	46;135FC+5 días
146	146	Suministro e instalación de cable 12F+12N+12T de cobre libre de halógenos para iluminación	10 días	99.86	2/06/26	16/06/26	10;110;111;133;134	
147	147	Suministro e instalación de vidrios templados de 6mm, elaborado en vidrio templado incoloro de 0.60 x 0.40 - con película opalizada - incluye sus respectivos herrajes de soporte metálicos bordes pulidos con película frost, en escritorios 60x40	6 días	108.00	26/06/26	6/07/26	18CC+7 días	
148	148	Suministro e instalación de vidrios templados de 6mm, , elaborado en vidrio templado incoloro de 0.60 x 0.40 - con película opalizada - incluye sus respectivos herrajes de soporte metálicos bordes pulidos con película frost, en escritorios 120x40	6 días	39.00	26/06/26	6/07/26	18CC+7 días	

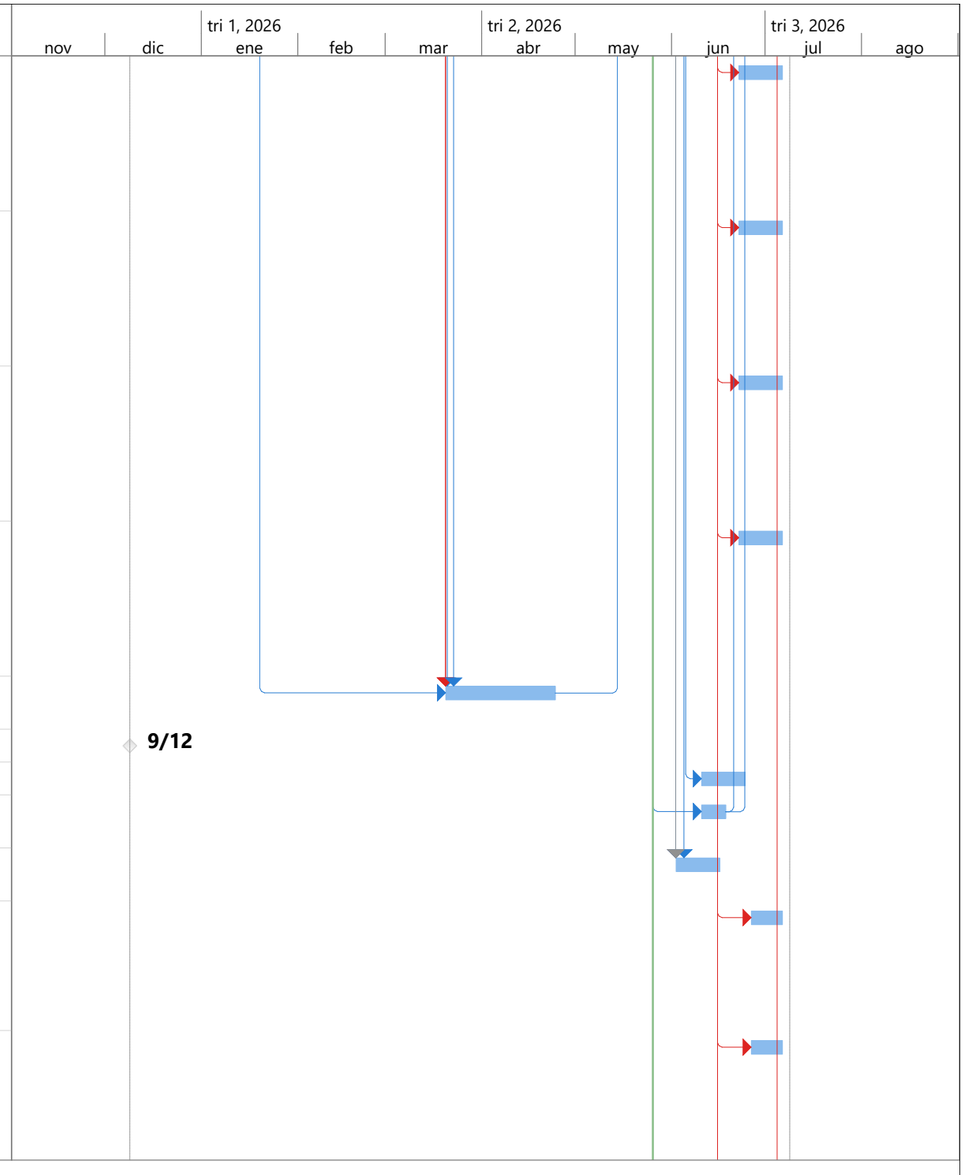

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

Id	Id	Nombre de tarea	Duración	CANTIDAD	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
149	149	Suministro e instalación de vidrios templados de 6mm, , elaborado en vidrio templado incoloro de 0.60 x 0.40 - con película opalizada - incluye sus respectivos herrajes de soporte metálicos bordes pulidos con película frost, en escritorios 150x40	6 días	15.00	26/06/26	6/07/26	18CC+7 días	
150	150	Tapas para escritorios tipo faldón en islas, superficie compuesta en tablero de madera industrial melamina 15 mm de espesor. Dimensiones corresponden al vacío de la estructura de los puestos de trabajo sobre la cual se instalarán, altura aproximada de 55	6 días	40.00	26/06/26	6/07/26	18CC+7 días	
151	151	Aseo General	3 días	1	4/07/26	8/07/26	18FC+2 días	

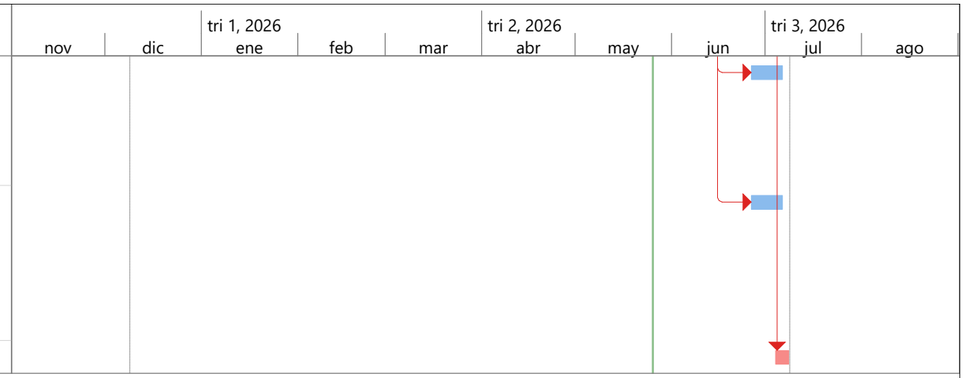

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: 26/05/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	
