PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901985277
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 N 43B 60	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0101 - CON PQ PRIMAVERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6013798338	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	199906869

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														FSP																							
	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
36	CC 1152189477	GIL RAMIREZ NELSON ESTEBAN	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 5.000.000	4429001	$ 348.000	30	$ 5.000.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1152449445	PUERTA OCAMPO JULIANA	DEPEND		$ 4.729.500	FIJO			SI																			230201-PROTECCION	30	$ 4.729.500	$ 756.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 756.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.729.500	$ 189.200	$ 0	$ 189.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 4.729.500	4429001	$ 329.200	30	$ 4.729.500	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 189.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 1214717465	USUGA GRACIANO JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 2.649.096	FIJO			SI										16-18									230201-PROTECCION	3	$ 307.567	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 49.300	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 307.567	$ 0	$ 0	$ 0	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 307.567		$ 0	3	$ 307.567	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 1214717465	USUGA GRACIANO JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 2.649.096	FIJO			SI										01-15									230201-PROTECCION	27	$ 2.799.614	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 2.799.614	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	27	$ 2.799.614	4429001	$ 194.900	27	$ 2.799.614	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 1214720343	DEOSSA RESTREPO JHONATAN	DEPEND		$ 3.564.992	FIJO			SI																			230201-PROTECCION	30	$ 3.564.992	$ 570.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 570.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.564.992	$ 142.600	$ 0	$ 142.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 3.564.992	4429001	$ 248.200	30	$ 3.564.992	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 142.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 1216718448	VEGUANTE PALMERA IVAN DARIO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI										01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.245.455	$ 359.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 359.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.245.455	$ 89.900	$ 0	$ 89.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.245.455	4429001	$ 156.300	30	$ 2.245.455	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 89.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 1216728159	ALVAREZ AQUDELO MAICOL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																		230201-PROTECCION	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	4	$ 233.454	4429001	$ 16.300	4	$ 233.454	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 14468725	GARAY MENDEZ MARIO MATEO	DEPEND		$ 9.994.500	FIJO			SI		05																	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.664.084	$ 266.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.300	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 1.664.084	$ 66.600	$ 0	$ 66.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	5	$ 1.664.084	4429001	$ 116.900	5	$ 2.967.618	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 118.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 15516793	DIAZ DIAZ DIEGO ALONSO	DEPEND		$ 7.357.000	FIJO			SI		13																	25-14 COLPENSIONES	13	$ 3.188.034	$ 510.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 510.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 3.188.034	$ 127.600	$ 0	$ 127.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	13	$ 3.188.034	4429001	$ 221.900	13	$ 3.852.207	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 154.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 21460423	LONDOÑO OSORNO ADRIANA MARIA	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI	11																		25-14 COLPENSIONES	20	$ 2.266.667	$ 362.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 362.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	20	$ 2.266.667	$ 90.700	$ 0	$ 90.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	20	$ 2.266.667	4429001	$ 167.800	20	$ 2.266.667	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 21469502	DUQUE HINCAPIE CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																		230201-PROTECCION	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	4	$ 233.454	4429001	$ 16.300	4	$ 233.454	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 32180624	TAMAYO GOEZ LAURA MARIA	DEPEND		$ 8.933.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.933.500	$ 1.429.400	$ 44.700	$ 44.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.518.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 8.933.500	$ 357.400	$ 0	$ 357.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 8.933.500	4429001	$ 621.800	30	$ 8.933.500	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 357.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 32241719	ORTEGA MEJIA CAROLINA MARIA	DEPEND		$ 6.500.000	FIJO			SI	11																		230301-PORVENIR	20	$ 4.333.334	$ 693.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 693.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	20	$ 4.333.334	$ 173.400	$ 0	$ 173.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	20	$ 4.333.334	4429001	$ 301.700	20	$ 4.333.334	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 32282374	MANEGAS CASTAÑEDA LUZ MABEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.021.997	$ 323.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 323.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.021.997	$ 80.900	$ 0	$ 80.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.021.997	4429001	$ 140.800	30	$ 2.021.997	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 3408107	VERGARA BOLIVAR ARNEY DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.269.212	$ 363.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 363.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.269.212	$ 90.800	$ 0	$ 90.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.269.212	4429001	$ 158.000	30	$ 2.269.212	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901985277
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 N 43B 60	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0101 - CON PQ PRIMAVERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6013798338	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			199906869

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN									SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
51	CC 43277893	CASTRO SALAZAR ANA SOFIA	DEPEND		$ 3.564.992	FIJO			SI	11																		231001-COLFONDOS	28	$ 2.376.662	$ 380.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 2.376.662	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	28	$ 2.376.662	4429001	$ 165.500	28	$ 2.376.662	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 43758753	MEJIA BOLIVAR LIGIA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.922.513	$ 307.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.922.513	$ 77.000	$ 0	$ 77.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.922.513	4429001	$ 133.900	30	$ 1.922.513	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 43668820	CARDONA LOPEZ DIANA MARCELA	DEPEND		$ 12.181.320	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 12.181.320	$ 1.949.100	$ 61.000	$ 61.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.071.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 12.181.320	$ 467.300	$ 0	$ 467.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 12.181.320	4429001	$ 847.900	30	$ 12.181.320	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 487.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 43678503	FLOREZ MOLINA DIANA CRISTINA	DEPEND		$ 5.618.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	27	$ 5.056.200	$ 809.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 809.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 5.056.200	$ 202.300	$ 0	$ 202.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	27	$ 5.056.200	4429001	$ 352.000	27	$ 5.056.200	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 202.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 43678503	FLOREZ MOLINA DIANA CRISTINA	DEPEND		$ 5.618.000	FIJO			SI														20-21				230201-PROTECCION	2	$ 374.534	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 374.534	$ 15.000	$ 0	$ 15.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	2	$ 374.534	4429001	$ 0	2	$ 374.534	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 43678503	FLOREZ MOLINA DIANA CRISTINA	DEPEND		$ 5.618.000	FIJO			SI														L-18-19				230201-PROTECCION	1	$ 187.267	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 187.267	$ 7.500	$ 0	$ 7.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 187.267	4429001	$ 0	1	$ 187.267	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 43675563	FUERTES CALDERA MARIA ANGELICA	DEPEND		$ 3.564.992	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	28	$ 3.327.326	$ 532.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 532.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 3.327.326	$ 133.100	$ 0	$ 133.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	28	$ 3.327.326	4429001	$ 231.600	28	$ 3.327.326	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 133.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 43675563	FUERTES CALDERA MARIA ANGELICA	DEPEND		$ 3.564.992	FIJO			SI													26-27					25-14 COLPENSIONES	2	$ 158.445	$ 25.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 25.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 158.445	$ 6.400	$ 0	$ 6.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	2	$ 158.445	4429001	$ 0	2	$ 158.445	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	CC 71267265	ISAZA VELASQUEZ LUIS ARBEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.927.488	$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.927.488	$ 77.100	$ 0	$ 77.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.927.488	4429001	$ 134.200	30	$ 1.927.488	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 71260538	URAN DEPINA JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 3.200.000	4429001	$ 222.800	30	$ 3.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 71282236	RUEDA MONTOYA JOHN JAVLEY	DEPEND		$ 5.044.800	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 5.044.800	$ 807.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 807.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.044.800	$ 201.800	$ 0	$ 201.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 5.044.800	4429001	$ 351.200	30	$ 5.044.800	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 201.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	CC 71375600	RESTREPO AGUIRRE JUAN CARLOS	DEPEND		$ 5.904.518	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.904.518	$ 944.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 944.800	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 5.904.518	$ 236.200	$ 0	$ 236.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 5.904.518	4429001	$ 411.000	30	$ 5.904.518	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 236.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 71615975	AGUIAR ARENAS HERNAN GILBERTO	DEPEND	PENSVEJ ACT	$ 5.044.800	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.044.800	$ 201.800	$ 0	$ 201.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 5.044.800	4429001	$ 351.200	30	$ 5.044.800	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 201.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901985277
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 N 43B 60	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0101 - CON PQ PRIMAVERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6013798338**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		199906869	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																													PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																															FSP			APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
64	CC 71627993	MARIN GIRALDO JUAN BAUTISTA	DEPEND	PENSVEJ ACT	$ 5.044.800	FIJO			SI																																																	
65	CC 71714427	ECHAVARRIA ROJAS JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.218.661	FIJO			SI												16-17						230301-PORVENIR	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	2	$ 116.727	4429001	$ 0	2	$ 77.819	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 71714427	ECHAVARRIA ROJAS JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.218.661	FIJO			SI												03-03						230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 58.364	4429001	$ 0	1	$ 38.910	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 71714427	ECHAVARRIA ROJAS JUAN CARLOS	DEPEND		$ 2.218.661	FIJO			SI										05-30							230301-PORVENIR	27	$ 2.545.787	$ 407.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 407.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 2.545.787	$ 101.900	$ 0	$ 101.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	27	$ 2.545.787	4429001	$ 177.200	27	$ 2.545.787	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 71715842	BUILES ESCUDERO JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	09																	230301-PORVENIR	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	22	$ 1.283.997	4429001	$ 69.400	22	$ 1.283.997	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	CC 71729578	SANCHEZ AMUA PEDRO JULIO	DEPEND		$ 5.904.518	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.904.518	$ 944.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 944.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.904.518	$ 236.200	$ 0	$ 236.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 5.904.518	4429001	$ 411.000	30	$ 5.904.518	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 236.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 71750100	MILLA GOMEZ CESAR ALIGUSTO	DEPEND		$ 3.678.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.678.500	$ 588.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 588.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.678.500	$ 147.200	$ 0	$ 147.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 3.678.500	4429001	$ 256.100	30	$ 3.678.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 147.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
71	CC 71752628	RIVAS JOSE DAVID	DEPEND		$ 2.417.300	FIJO			SI												16-17						25-14 COLPENSIONES	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	2	$ 116.727	4429001	$ 0	2	$ 77.819	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
72	CC 71752628	RIVAS JOSE DAVID	DEPEND		$ 2.417.300	FIJO			SI										01-30							25-14 COLPENSIONES	26	$ 2.632.477	$ 421.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 421.200	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 2.632.477	$ 105.300	$ 0	$ 105.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	26	$ 2.632.477	4429001	$ 183.300	26	$ 2.632.477	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 105.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
73	CC 71669879	VALENCIA BANQUETH YUBER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30							230201-PROTECCION	30	$ 1.997.623	$ 319.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.997.623	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.997.623	4429001	$ 139.100	30	$ 1.997.623	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
74	CC 77000077	SIMANCA GARCIA WOSVALDO ENRIQUE	DEPEND		$ 2.207.100	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.699.057	$ 431.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 431.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.699.057	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.699.057	4429001	$ 187.900	30	$ 2.699.057	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
75	CC 79502689	LONDOÑO VALENCIA OCTAVIO DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30							25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.041.893	$ 326.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 2.041.893	$ 81.700	$ 0	$ 81.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.041.893	4429001	$ 142.200	30	$ 2.041.893	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 81.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
76	CC 8026692	MURILLO LOZANO MIGUEL ANTONIO	DEPEND		$ 5.518.000	FIJO			SI	11																	230301-PORVENIR	20	$ 3.745.334	$ 599.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 599.300	EPS005-SANITAS S.A	20	$ 3.745.334	$ 149.900	$ 0	$ 149.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	20	$ 3.745.334	4429001	$ 260.700	20	$ 3.745.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 149.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
77	CC 8060794	HERRERA LONDOÑO VICTOR DANIEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.104.071	$ 336.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.104.071	$ 84.200	$ 0	$ 84.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.104.071	4429001	$ 146.500	30	$ 2.104.071	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 84.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
aSOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901985277
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 N 43B 60	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0101 - CON PQ PRIMAVERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6013798338	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	199906869

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811046293
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONINTEL S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 NRO 43 B 50 OFICINA 401	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	9901 - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6010188873**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			198722436

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.076.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.076.300	$ 0	$ 1.076.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.522.400	$ 0	$ 0	$ 78.900	$ 78.900	$ 0	$ 0	$ 2.680.200	$ 0	$ 2.680.200
SUBTOTALES:										**$ 3.756.500**	**$ 0**	**$ 3.756.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 899.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 899.700	$ 0	$ 0	$ 899.700
SUBTOTALES:													**$ 899.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 899.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.565.500	$ 1.565.500	$ 0	$ 0	$ 1.565.500	
SUBTOTALES:									**$ 1.565.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.565.500**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 899.700	$ 0	$ 899.700
SUBTOTALES:			**$ 899.700**	**$ 0**	**$ 899.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110552546	MEJIA RINZON CRISTIAN FELIPE	DEPEND		$ 6.726.400	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 6.726.400	$ 1.076.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.076.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 6.726.400	$ 269.100	$ 0	$ 269.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 6.726.400	4411101	$ 468.200	30	$ 6.726.400	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 269.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 99529893	GIRALDO SALAZAR JOHN JAIRO	DEPEND		$ 15.765.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 15.765.000	$ 2.522.400	$ 78.900	$ 78.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.680.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 15.765.000	$ 630.600	$ 0	$ 630.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 15.765.000	4411101	$ 1.097.300	30	$ 15.765.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 630.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.121.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811046293
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONINTEL S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 NRO 43 B 50 OFICINA 401	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	9901 - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6013930023**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			198697830

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 2.589.700	$ 0	$ 0	$ 81.000	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 2.751.700	$ 0	$ 2.751.700
SUBTOTALES:										**$ 2.751.700**	**$ 0**	**$ 2.751.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.023.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.023.200	$ 0	$ 0	$ 2.023.200
SUBTOTALES:													**$ 2.023.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.023.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.126.600	$ 1.126.600	$ 0	$ 0	$ 1.126.600
SUBTOTALES:									**$ 1.126.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.126.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 647.500	$ 0	$ 647.500
SUBTOTALES:			**$ 647.500**	**$ 0**	**$ 647.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 485.600	$ 0	$ 485.600
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 323.800	$ 0	$ 323.800
SUBTOTALES:			**$ 809.400**	**$ 0**	**$ 809.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1026563121	DUQUE RAMIREZ JOSE ALEJANDRO	DEPEND		23.122.000	$INTEGRAL		NO																	230201-PROTECCION	30	16.185.400	$ 2.589.700	$ 81.000	$ 81.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.751.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	16.185.400	$ 2.023.200	$ 0	$ 2.023.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	16.185.400	4111101	1.126.600	30	16.185.400	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 647.500	$ 323.800	$ 485.600	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.358.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901985277
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 N 43B 60	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0101 - CON PQ PRIMAVERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6010212286**	TIPO DE PLANILLA:			Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			199977475

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 490.200	$ 490.200	$ 0	$ 0	$ 490.200
SUBTOTALES:									**$ 490.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 490.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1017168006	GARCIA MOYA ENRIQUE ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.080.000			NO																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	30	$ 2.080.000	4429001	$ 144.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1017215427	MARTINEZ RIOS ALEJANDRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.920.000			NO																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	30	$ 1.920.000	4429001	$ 133.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 8125761	CUBILLOS ORTIZ JORGE EDWIN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.259.440			NO	R-03																			28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	28	$ 3.041.211	4411101	$ 211.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 490.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DUQUE RAMIREZ JOSE ALEJANDRO	**No. Producto**	38121005902
No. Identificación	16286321	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$13,178,739.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200FP
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004NLYU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONINTEL S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811046293
Generado por: Yesica Arango Castañeda

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MEJIA PINZON CRISTIAN	**No. Producto**	07915550414
No. Identificación	1110552546	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	28
No. Producto Origen/Recaudador	470039397	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,094,144.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	470A3212607200FZ
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004NLYU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONINTEL S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811046293
Generado por: Yesica Arango Castañeda

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GIRALDO SALAZAR JOHN JAIRO	**No. Producto**	10172517412
No. Identificación	98529883	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	19
No. Producto Origen/Recaudador	470039397	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$6,504,699.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	470A3212607200FQ
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004NLYU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FUERTES CALDERA MARIA ANGELICA	**No. Producto**	26830320481
No. Identificación	43975563	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	11
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,639,896.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200ES
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RUA ARIAS RUBY ALEJANDRA	**No. Producto**	00183070711
No. Identificación	1128283908	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	27
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,175,340.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200F7
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ORREGO GARCIA ANDRES FELIPE	**No. Producto**	27762527800
No. Identificación	1017197909	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	22
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,185,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200F3
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONINTEL S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811046293
Generado por: diana gomez zuluaga

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MURILLO LOZANO MIGUEL ANTONIO	**No. Producto**	634002695
No. Identificación	8026692	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$690,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	423F042260720001
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIAZ DIAZ DIEGO ALONSO	**No. Producto**	55338360052
No. Identificación	15516793	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,347,435.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EL
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARAY MENDEZ MARIO MATEO	**No. Producto**	5862047046
No. Identificación	14465725	**Entidad Financiera**	DAVIbank S.A.
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,697,624.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EK
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FLOREZ MOLINA DIANA CRISTINA	**No. Producto**	54280868968
No. Identificación	43878503	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,208,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200ER
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FORERO GARCIA JORGE HERNAN	**No. Producto**	05919474124
No. Identificación	10289220	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,760,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EJ
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SANCHEZ AVILA PEDRO JULIO	**No. Producto**	10280825499
No. Identificación	71729578	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	17
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,716,079.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EY
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BORDA FORONDA LEIDY JOHANA	**No. Producto**	09770568045
No. Identificación	1033649778	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	24
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,034,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200F4
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PEREZ PEREZ ANA MARCELA	**No. Producto**	0550392800034010
No. Identificación	1128278862	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	26
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,933,840.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200F6
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTRO SALAZAR ANA SOFIA	**No. Producto**	37750634436
No. Identificación	43277893	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	8
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$546,631.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EP
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MORENO RENTERIA SINDY MARCELA	**No. Producto**	00986189009
No. Identificación	1017185533	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	21
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,639,896.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200F2
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ORTEGA MEJIA CAROLINA MARIA	**No. Producto**	23064334441
No. Identificación	32241719	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	7
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$996,667.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EO
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JUAN ESTEBAN ACEVEDO HENAO	**No. Producto**	406170332
No. Identificación	1020451245	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	23
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,339,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	423F042260720002
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DEOSSA RESTREPO JHONATAN	**No. Producto**	3146967673
No. Identificación	1214720343	**Entidad Financiera**	NEQUI
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	30
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,639,896.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200FA
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIANA MARCELA CARDONA LOPEZ	**No. Producto**	2991826117
No. Identificación	43868820	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$5,216,546.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EQ
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	NAVARRO SARMIENTO MARCOS ALEJA	**No. Producto**	09113520083
No. Identificación	1067902874	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	25
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$675,419.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200F5
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TAMAYO GOEZ LAURA MARIA	**No. Producto**	10873119975
No. Identificación	32180624	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,958,216.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EN
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RESTREPO AGUIRRE JUAN CARLOS	**No. Producto**	10873079961
No. Identificación	71375600	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	14
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,716,079.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EV
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **diana gomez zuluaga**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/13	2026/03/13

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LONDOÑO OSORNO ADRIANA MARIA	**No. Producto**	31100024929
No. Identificación	21450423	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	5
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$562,849.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A3212607200EM
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCL004KAXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONINTEL S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811046293
Generado por: Yesica Arango Castañeda

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DUQUE RAMIREZ JOSE ALEJANDRO	**No. Producto**	38121005902
No. Identificación	16286321	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$7,178,739.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A321260890014
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004K4DU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PEREZ PEREZ ANA MARCELA	**No. Producto**	0550392800034010
No. Identificación	1128278862	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	25
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,761,909.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001R
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BORDA FORONDA LEIDY JOHANA	**No. Producto**	09770568045
No. Identificación	1033649778	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	23
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,034,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001P
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JUAN ESTEBAN ACEVEDO HENAO	**No. Producto**	406170332
No. Identificación	1020451245	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	22
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,339,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	423F042260890002
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DEOSSA RESTREPO JHONATAN	**No. Producto**	3146967673
No. Identificación	1214720343	**Entidad Financiera**	NEQUI
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	29
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,639,896.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001V
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	NAVARRO SARMIENTO MARCOS ALEJA	**No. Producto**	09113520083
No. Identificación	1067902874	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	24
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,688,548.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001Q
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BENITEZ MANCO LUIS ALEJANDRO	**No. Producto**	29878162801
No. Identificación	98765105	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	18
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,180,667.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001L
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FORERO GARCIA JORGE HERNAN	**No. Producto**	05919474124
No. Identificación	10289220	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,760,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A321260890015
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTRO SALAZAR ANA SOFIA	**No. Producto**	37750634436
No. Identificación	43277893	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,639,896.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A321260890019
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LONDOÑO OSORNO ADRIANA MARIA	**No. Producto**	31100024929
No. Identificación	21450423	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,688,548.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A321260890016
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TAMAYO GOEZ LAURA MARIA	**No. Producto**	10873119975
No. Identificación	32180624	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,958,216.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A321260890017
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FUERTES CALDERA MARIA ANGELICA	**No. Producto**	26830320481
No. Identificación	43975563	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,566,998.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001C
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RUA ARIAS RUBY ALEJANDRA	**No. Producto**	00183070711
No. Identificación	1128283908	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	26
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,175,340.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001S
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SANCHEZ AVILA PEDRO JULIO	**No. Producto**	10280825499
No. Identificación	71729578	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	15
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,716,079.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A321260890011
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FLOREZ MOLINA DIANA CRISTINA	**No. Producto**	54280868968
No. Identificación	43878503	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	8
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,208,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001B
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIANA MARCELA CARDONA LOPEZ	**No. Producto**	2991826117
No. Identificación	43868820	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	7
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$5,216,546.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001A
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RESTREPO AGUIRRE JUAN CARLOS	**No. Producto**	10873079961
No. Identificación	71375600	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	12
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,716,079.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001F
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ORREGO GARCIA ANDRES FELIPE	**No. Producto**	27762527800
No. Identificación	1017197909	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	21
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,412,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001O
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ORTEGA MEJIA CAROLINA MARIA	**No. Producto**	23064334441
No. Identificación	32241719	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	5
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,990,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A321260890018
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MORENO RENTERIA SINDY MARCELA	**No. Producto**	00986189009
No. Identificación	1017185533	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	20
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,639,896.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	423A32126089001N
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CONINTEL S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **811046293**
Generado por: **Yesica Arango Castañeda**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/03/30	2026/03/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MURILLO LOZANO MIGUEL ANTONIO	**No. Producto**	634002695
No. Identificación	8026692	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	423828946	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,070,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	423F042260890001
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCZ004KE2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONINTEL S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811046293
Generado por: Yesica Arango Castañeda

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GIRALDO SALAZAR JOHN JAIRO	**Nro. Producto Destino**	10172517412
Nro. Identificación	98529883	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	19
Nro. Producto Origen/Recaudador	470039397	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$6,504,699.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	470A32126089000M
Estado	EXT	**Información Adicional**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OCZ004K4DU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CONINTEL S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811046293
Generado por: Yesica Arango Castañeda

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MEJIA PINZON CRISTIAN	**Nro. Producto Destino**	07915550414
Nro. Identificación	1110552546	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	28
Nro. Producto Origen/Recaudador	470039397	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/03/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/27	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$3,094,144.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	470A32126089000V
Estado	EXT	**Información Adicional**	NOMINA 30
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/30
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OCZ004K4DU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Yesica Arango Castañeda

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901985277
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 N 43B 50	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0101 - CON PQ PRIMAVERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013798338**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			199906669

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	24	$ 10.774.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	21	$ 11.599.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	9	$ 4.917.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	$ 8.000.600
		SUBTOTAL:	73	**$ 35.292.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3	$ 528.700
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4	$ 258.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 1.619.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 1.277.100
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 35.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	33	$ 5.390.300
		SUBTOTAL:	75	**$ 9.109.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	75	$ 9.141.400
		SUBTOTAL:	75	**$ 9.141.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	75	$ 15.710.200
		SUBTOTAL:	75	**$ 15.710.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 69.253.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 69.253.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811046293
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONINTEL S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 NRO 43 B 50 OFICINA	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	9901 - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6010188873**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		198722436

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.680.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.076.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 3.756.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 899.700
		SUBTOTAL:	2	**$ 899.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 899.700
		SUBTOTAL:	2	**$ 899.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	2	$ 1.565.500
		SUBTOTAL:	2	**$ 1.565.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.121.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.121.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811046293
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONINTEL S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 NRO 43 B 50 OFICINA	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	9901 - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013930023**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		198697630

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 2.751.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.751.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 2.023.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.023.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 647.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 647.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 1.126.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.126.600**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 323.800
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 485.600
		SUBTOTAL:		**$ 809.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.358.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.358.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901985277
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 N 43B 50	TELÉFONO:	2662377
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0101 - CON PQ PRIMAVERA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6010212286**	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		199977475

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 490.200
		SUBTOTAL:	3	**$ 490.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 490.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 490.200**

Planilla Pagada

REVISIÓN PARAFISCALES

CONTRATO No IA 947
CONTRATISTA CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN"

DESDE 01-03-26 **31-03-26**

No	CARGO DESEMPEÑADO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	SALARIO MES AU	DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	DIAS LABORADOS	SALARIO DIA	IBC	IBC PLANILLA	CUMPLE SI / NO	DCTO X IBC	DIAS AUSENCIA	FACTOR SALARIAL	DCTO X AUSENCIA	DCTO TOTAL
1	COORDINADOR PROYECTO	JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ	$ 11,925,000	100%	20-10-25		30	$ 397,500	$ 11,925,000	$ 16,185,400	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
2	DIRECTOR URBANISMO	DIANA MARCELA CARDONA LOPEZ	$ 7,950,000	100%	20-10-25		30	$ 265,000	$ 7,950,000	$ 12,161,320	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
3	DIRECTOR TÉCNICO	JUAN ESTEBAN ACEVEDO HENAO	$ 7,950,000	100%	20-10-25	18/12/2025						$ -	-		$ -	$ -
3	DIRECTOR TÉCNICO	JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR	$ 7,950,000	100%	19-12-25		30	$ 265,000	$ 7,950,000	$ 15,765,000	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
4	PROGRAMADOR DE OBRA Y CONTROL PRESUPUESTAL	CLAUDIA PATRICIA VASQUEZ MARTINEZ	$ 7,950,000	100%	20-10-25	15/11/2025								1.45	$ -	$ -
4	PROGRAMADOR DE OBRA Y CONTROL PRESUPUESTAL	MATEO MARIO MENDEZ GARAY	$ 5,618,000	100%	06-11-25	1/03/2026	1	$ 187,267	$ 187,267	$ 1,664,084	CUMPLE		-	1.45	$ -	$ -
5	PROFESIONAL BIM	CRISTIAN FELIPE MEJIA PINZON	$ 5,618,000	100%	20-10-25		30	$ 187,267	$ 5,618,000	$ 8,726,400	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
6	RESIDENTE OBRA (EDIFICACIONES)	JUAN FERNANDO ANDRADE GOMEZ	$ 5,618,000	100%	20-10-25				$ -			$ -	-	1.45	$ -	$ -
6	RESIDENTE OBRA (EDIFICACIONES)	JUAN ESTEBAN ACEVEDO HENAO	$ 5,618,000	100%	19-12-25		30	$ 187,267	$ 5,618,000	$ 7,950,000	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
7	RESIDENTE OBRA (URBANISMO)	NELSON ANDRES ESCOBAR TUBERQUIA	$ 5,618,000	100%	20-10-25	30/11/2025								1.45	$ -	$ -
7	RESIDENTE OBRA (URBANISMO)	PEDRO JULIO SANCHEZ AVILA	$ 5,618,000	100%	01-12-25		30	$ 187,267	$ 5,618,000	$ 5,904,518	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
8	PROFESIONAL AREA AMBIENTAL	JUAN CARLOS RESTREPO AGUIRRE	$ 5,618,000	100%	20-10-25		30	$ 187,267	$ 5,618,000	$ 5,904,518	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
9	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DANIELA JIMENEZ VELEZ	$ 5,618,000	100%	20-10-25	7/01/2026						$ -	-	1.45	$ -	$ -
9	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	KELLYS LEANDRA ALVAREZ PEREZ	$ 5,618,000	100%	07-02-26	18/02/2026						$ -		1.45	$ -	$ -
9	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ERIKA MARIA BERMUDEZ GARCIA	$ 5,618,000	100%	15-01-26	6/02/2026								1.45	$ -	$ -
9	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DIANA CRISTINA FLOREZ MOLINA	$ 5,618,000	100%	19-02-26		30	$ 187,267	$ 5,618,000	$ 5,618,001	CUMPLE	$ -	3.00	1.45	$ 814,610	$ 814,610
10	PROFESIONAL AREA SOCIAL	RUBY ALEJANDRA RUA ARIAS	$ 5,618,000	100%	20-10-25		30	$ 187,267	$ 5,618,000	$ 5,618,000	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
11	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES	LEIDY JOHANA BORDA FORONDA	$ 3,392,000	100%	20-10-25		30	$ 113,067	$ 3,392,000	$ 4,422,608	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
12	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES	SINDY MARCELA MORENO RENTERIA	$ 3,392,000	100%	20-10-25		30	$ 113,067	$ 3,392,000	$ 3,564,992	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
13	TECNOLOGO EN AREA AMBIENTAL	ANA MARCELA PEREZ PEREZ	$ 3,392,000	100%	20-10-25		30	$ 113,067	$ 3,392,000	$ 4,017,157	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
14	TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VANESSA LORENA CHAVERRA CHAVERRA	$ 3,392,000	100%	20-10-25	24/10/2025						$ -	-		$ -	$ -
14	TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	JHONATAN DEOSSA RESTREPO	$ 3,392,000	100%	05-11-25		30	$ 113,067	$ 3,392,000	$ 3,564,992	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
15	TECNOLOGO EN AREA SOCIAL	MARIA ANGELICA FUERTES CALDERA	$ 3,392,000	100%	20-10-25		30	$ 113,067	$ 3,392,000	$ 3,485,771	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
16	INGENIERO HIDROSANITARIO	DIEGO ALONSO DÍAZ DÍAZ	$ 5,618,000	100%	01-12-25		11	$ 187,267	$ 2,059,933	$ 3,188,034	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
16	INGENIERO HIDROSANITARIO	CAROLINA MARIA ORTEGA MEJIA	$ 5,618,000	100%	11-03-26		20	$ 187,267	$ 3,745,333	$ 4,333,334	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
17	INGENIERO HIDRAULICO	ENRIQUE ALEXIS GARCIA MOYA	$ 5,618,000	50%	15-12-25		30	$ 93,633	$ 2,809,000	$ 2,860,000	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
18	INGENIERO GEOTECNISTA	ALEJANDRA MARTINEZ RIOS	$ 5,618,000	50%	01-11-25		30	$ 93,633	$ 2,809,000	$ 1,920,000	CUMPLE		-	1.45	$ -	$ -
19	INGENIERO ELECTRICISTA	JORGE HERNAN FORERO GARCIA	$ 5,618,000	100%	16-02-26		30	$ 187,267	$ 5,618,000	$ 6,000,000	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
20	INGENIERO ESTRUCTURAL	JORGE EDWIN CUBILLO ORTIZ	$ 5,618,000	100%	03-03-26		28	$ 187,267	$ 5,243,467	$ 3,258,440	CUMPLE			1.45	$ -	$ -
21	INGENIERO MECANICO		$ 5,618,000	50%	20-02-26		30	$ 93,633	$ 2,809,000		NO CUMPLE	$ 2,809,000	30.00	1.45	$ 4,073,050	$ 4,073,050
	JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO															
1	DIRECTORA TECNICA	LAURA MARIA TAMAYO GOEZ	$ 7,950,000.00	100%	09-03-26		22	$ 265,000	$ 5,830,000	$ 8,933,500	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
2	INGENIERO TECNICO ADMINISTRATIVO	MIGUEL ANTONIO MURILLO LOZANO	$ 5,618,000.00	100%	11-03-26		20	$ 187,267	$ 3,745,333	$ 3,745,334	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
3	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES	LUIS ALEJANDRO BENITEZ MANCO	$ 3,392,000.00	100%	24-03-26		7	$ 113,067	$ 791,467	$ 1,283,334	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
4	TECNOLOGO SST	MARCOS ALEJANDRO NAVARRO SARMIENTO	$ 3,392,000.00	100%	10-03-26		21	$ 113,067	$ 2,374,400	$ 2,380,000	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
5	TECNOLOGO SST	ADRIANA MARIA LONDOÑO OSORNO	$ 3,392,000.00	100%	11-03-26		20	$ 113,067	$ 2,261,333	$ 2,266,667	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
6	AUXILIAR SOCIAL	ANA SOFIA CASTRO SALAZAR	$ 3,392,000.00	100%	11-03-26		20	$ 113,067	$ 2,261,333	$ 2,376,662	CUMPLE	$ -	-	1.45	$ -	$ -
												$ 2,809,000.00	$ -			$ 4,887,660.00

INTERVENTORIA
CONSORCIO TRACON 77

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE


Capítulo	1.3.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	1.3.1	EXCAVACIONES	**UNIDAD DE MEDIDA**	m3
Ítem:	1.3.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**1969**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 4							**53,18**
ACTA 5							**3388,26**
ACTA 6							**-19,78**
Descuento volumen de concreto encontrado en excavaciones que se pagará en item de demoliciones 4.2.2.1	m3	0,82	0,82	1,30	-1,00		-0,87
	m3	1,72	1,50	1,28	-1,00		-3,30
	m3	0,85	0,85	1,45	-1,00		-1,05
	m3	1,70	1,60	0,75	-1,00		-2,04
	m3	0,82	0,83	1,35	-1,00		-0,92
	m3	1,80	1,60	0,60	-1,00		-1,73
	m3	0,30	0,30	2,20	-1,00		-0,20
	m3	0,30	0,30	2,40	-1,00		-0,22
	m3	0,30	0,30	2,40	-1,00		-0,22
	m3	0,40	0,30	4,00	-1,00		-0,48
	m3	0,30	0,30	2,10	-1,00		-0,19
	m3	0,30	0,30	1,20	-1,00		-0,11
	m3	1,34	0,85	0,85	-1,00		-0,97
	m3	1,00	1,00	1,00	-1,00		-1,00
	m3	1,00	1,00	0,85	-1,00		-0,85

REGISTRO FOTOGRÁFICO





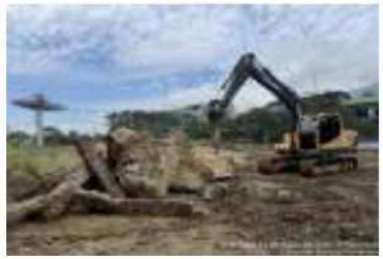



Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	1.3.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	1.3.1	EXCAVACIONES	**UNIDAD DE MEDIDA**	m3
Ítem:	1.3.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**1969**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total	
	m3	1,10	1,20	1,20	-1,00		-1,58	
	m3	1,00	0,85	1,00	-1,00		-0,85	
	m3	1,80	1,60	0,30	-1,00		-0,86	
	m3	1,00	0,90	0,90	-2,00		-1,62	
	m3	0,90	0,90	0,90	-1,00		-0,73	
Total							**-19,78**	
Total Acumulado en actas							**3.421,66**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	1.3.2	LLENOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	m2
Ítem:	1.3.2.3	Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**678**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Area	Total
ACTA 5							**353,30**
ACTA 6							**21,24**
Tanque Norte Técnico Coworking	m2	5,90	3,60				21,24
Total							**21,24**
Total Acumulado en actas							**374,54**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	'CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	896

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
ACTA 4							**81601,50**
ACTA 6							**71035,87**
Muro 1 1							
TRAMO 1 - M1	kg	#4	0,994	1,55	24,00		36,98
TRAMO 1 - M2	kg	#3	0,560	1,50	24,00		20,16
TRAMO 1 - M3	kg	#3	0,560	4,52	26,00		65,81
TRAMO 1 - M4	kg	#4	0,994	1,60	24,00		38,17
TRAMO 1 - M5	kg	#3	0,560	1,50	24,00		20,16
TRAMO 1 - M6	kg	#4	0,994	1,36	24,00		32,44
TRAMO 2 - M1	kg	#4	0,994	2,05	31,00		63,17
TRAMO 2 - M2	kg	#3	0,560	2,00	31,00		34,72
TRAMO 2 - M3	kg	#3	0,560	5,85	33,00		108,11
TRAMO 2 - M4	kg	#4	0,994	2,10	31,00		64,71
TRAMO 2 - M5	kg	#3	0,560	2,00	31,00		34,72
TRAMO 2 - M6	kg	#4	0,994	1,26	31,00		38,83
TRAMO 3 - M1	kg	#4	0,994	2,55	31,00		78,58
TRAMO 3 - M2	kg	#3	0,560	2,50	31,00		43,40
TRAMO 3 - M3	kg	#3	0,560	5,85	39,00		127,76
TRAMO 3 - M4	kg	#4	0,994	2,55	31,00		78,58
TRAMO 3 - M5	kg	#3	0,560	2,45	31,00		42,53
TRAMO 3 - M6	kg	#4	0,994	1,56	31,00		48,07
TRAMO 4 - M1	kg	#4	0,994	3,05	21,00		63,67
TRAMO 4 - M2	kg	#3	0,560	3,00	21,00		35,28
TRAMO 4 - M3	kg	#3	0,560	5,85	48,00		157,25
TRAMO 4 - M4	kg	#4	0,994	2,90	40,00		115,30
TRAMO 4 - M5	kg	#3	0,560	2,80	40,00		62,72
TRAMO 4 - M6	kg	#4	0,994	1,66	31,00		51,15
TRAMO 4 - M7	kg	#4	0,994	1,60	21,00		33,40
TRAMO 5 - M1	kg	#4	0,994	4,05	26,00		104,67
TRAMO 5 - M2	kg	#4	0,994	4,05	26,00		104,67
TRAMO 5 - M3	kg	#4	0,994	5,85	58,00		337,26
TRAMO 5 - M4	kg	#4	0,994	3,45	50,00		171,47
TRAMO 5 - M5	kg	#4	0,994	3,45	26,00		89,16
TRAMO 5 - M6	kg	#4	0,994	2,26	50,00		112,32
TRAMO 5 - M7	kg	#4	0,994	2,10	26,00		54,27
TRAMO 6 - M1	kg	#5	1,552	5,10	56,00		443,25
TRAMO 6 - M2	kg	#4	0,994	5,05	56,00		281,10
TRAMO 6 - M3	kg	#4	0,994	12,00	81,00		966,17
TRAMO 6 - M4	kg	#5	1,552	4,35	111,00		749,38
TRAMO 6 - M5	kg	#4	0,994	4,25	56,00		236,57
TRAMO 6 - M6	kg	#4	0,994	2,36	111,00		260,39
TRAMO 6 - M7	kg	#5	1,552	2,60	56,00		225,97
Gradas Teatrino Sur							
Grada 9 - M1 - Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,07	15,00	4,00	63,81

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	896

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
Grada 9 - M2- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,03	15,00	4,00	34,61
Grada 9 - M3- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	3,51	22,00	4,00	172,97
Grada 9 - M4- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,50	15,00	4,00	89,46
Grada 9 - M5- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,40	15,00	4,00	47,04
Grada 9 - M6- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	0,91	15,00	4,00	54,27
Grada 9 - M1 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,07	6,00	1,00	6,38
Grada 9 - M2 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,03	6,00	1,00	3,46
Grada 9 - M3 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,39	22,00	1,00	17,12
Grada 9 - M4 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,50	6,00	1,00	8,95
Grada 9 - M5 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,40	6,00	1,00	4,70
Grada 9 - M6 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	0,91	6,00	1,00	5,43
Grada 13 - M1- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,07	15,00	4,00	63,81
Grada 13 - M2- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,03	15,00	4,00	34,61
Grada 13 - M3- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	3,51	22,00	4,00	172,97
Grada 13 - M4- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,50	15,00	4,00	89,46
Grada 13 - M5- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,40	15,00	4,00	47,04
Grada 13 - M6- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	0,91	15,00	4,00	54,27
Grada 13 - M1 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,07	6,00	1,00	6,38
Grada 13 - M2 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,03	6,00	1,00	3,46
Grada 13 - M3 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,39	22,00	1,00	17,12
Grada 13 - M4 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,50	6,00	1,00	8,95
Grada 13 - M5 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,40	6,00	1,00	4,70
Grada 13 - M6 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	0,91	6,00	1,00	5,43
Grada 12 - M1- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,07	15,00	4,00	63,81
Grada 12 - M2- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,03	15,00	4,00	34,61
Grada 12 - M3- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	3,51	22,00	4,00	172,97
Grada 12 - M4- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,50	15,00	4,00	89,46
Grada 12 - M5- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,40	15,00	4,00	47,04
Grada 12 - M6- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	0,91	15,00	4,00	54,27
Grada 12 - M1 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,07	6,00	1,00	6,38
Grada 12 - M2 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,03	6,00	1,00	3,46
Grada 12 - M3 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,39	22,00	1,00	17,12
Grada 12 - M4 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,50	6,00	1,00	8,95
Grada 12 - M5 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,40	6,00	1,00	4,70
Grada 12 - M6 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	0,91	6,00	1,00	5,43
Muro de contención M2							
Tramo 1 - M1	kg	#6	2,235	6,38	16,00		228,15
Tramo 1 - M2	kg	#4	0,994	6,28	16,00		99,88
Tramo 1 - M3	kg	#4	0,994	2,98	98,00		290,29
Tramo 1 - M4	kg	#6	2,235	5,40	31,00		374,14
Tramo 1 - M5	kg	#4	0,994	5,20	16,00		82,70
Tramo 1 - M6	kg	#5	1,552	2,45	31,00		117,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	896

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
Tramo 1 - M7	kg	#6	2,235	2,65	16,00		94,76
Tramo 2 - M1	kg	#6	2,235	6,71	18,00		269,94
Tramo 2 - M2	kg	#4	0,994	6,61	18,00		118,27
Tramo 2 - M3	kg	#4	0,994	3,22	101,00		323,27
Tramo 2 - M4	kg	#6	2,235	5,40	34,00		410,35
Tramo 2 - M5	kg	#4	0,994	5,20	18,00		93,04
Tramo 2 - M6	kg	#5	1,552	2,50	18,00		69,84
Tramo 2 - M7	kg	#6	2,235	2,65	18,00		106,61
Tramo 3 - M1	kg	#5	1,552	6,66	28,00		289,42
Tramo 3 - M2	kg	#4	0,994	6,61	28,00		183,97
Tramo 3 - M3	kg	#4	0,994	6,35	92,00		580,69
Tramo 3 - M4	kg	#5	1,552	4,35	54,00		364,56
Tramo 3 - M5	kg	#4	0,994	4,25	28,00		118,29
Tramo 3 - M6	kg	#4	0,994	2,4	54,00		126,14
Tramo 3 - M7	kg	#5	1,552	2,6	28,00		112,12
Tramo 4							
Longitudinal Llave	kg	#3	0,560	3,85	10,00		21,56
Estribos Llave	kg	#4	0,994	2,22	32,00		70,61
Longitudinal Zapata Inferior	kg	#4	0,994	3,45	17,00		58,30
Longitudinal Zapata Superior	kg	#4	0,994	3,45	33,00		113,17
Transversal Zapata Inferior	kg	#4	0,994	3,85	11,00		42,10
Transversal Zapata Superior	kg	#4	0,994	3,85	11,00		42,10
Vástago Longitudinal	kg	#4	0,994	6,53	17,00		110,34
Vástago Longitudinal	kg	#4	0,994	6,53	17,00		110,34
Vástago Longitudinal	kg	#4	0,994	2,10	17,00		35,49
Vástago Transversal	kg	#4	0,994	4,35	21,00		90,80
Vástago Transversal	kg	#4	0,994	4,35	21,00		90,80
Tramo 5							
Longitudinal Llave	kg	#3	0,560	3,85	10,00		21,56
Estribos Llave	kg	#4	0,994	2,22	32,00		70,61
Longitudinal Zapata Inferior	kg	#4	0,994	3,45	17,00		58,30
Longitudinal Zapata Superior	kg	#4	0,994	3,45	33,00		113,17
Transversal Zapata Inferior	kg	#4	0,994	3,85	11,00		42,10
Transversal Zapata Superior	kg	#4	0,994	3,85	11,00		42,10
Vástago Longitudinal	kg	#4	0,994	6,53	17,00		110,34
Vástago Longitudinal	kg	#4	0,994	6,53	17,00		110,34
Vástago Longitudinal	kg	#4	0,994	2,10	17,00		35,49
Vástago Transversal	kg	#4	0,994	4,35	21,00		90,80
Vástago Transversal	kg	#4	0,994	4,35	21,00		90,80
Tramo 6							
Longitudinal Llave	kg	#3	0,560	2,75	6,00		9,24
Estribos Llave	kg	#4	0,994	1,32	16,00		20,99

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026


URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	836

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
Longitudinal Zapata Inferior	kg	#3	0,560	2,10	16,00		18,82
Longitudinal Zapata Superior	kg	#4	0,994	2,10	16,00		33,40
Transversal Zapata Inferior	kg	#3	0,560	2,75	7,00		10,78
Transversal Zapata Superior	kg	#3	0,560	2,75	7,00		10,78
Vástago Longitudinal	kg	#4	0,994	6,38	16,00		101,47
Vástago Longitudinal	kg	#3	0,560	6,38	16,00		57,16
Vástago Transversal	kg	#3	0,560	2,90	21,00		34,10
Vástago Transversal	kg	#3	0,560	2,90	21,00		34,10
Edificio CELA							
Losa Inferior							
Longitudinal	kg	#5	1,552	4,35	62,00	2,00	837,15
Longitudinal	kg	#5	1,552	2,53	8,00	2,00	62,70
Longitudinal	kg	#4	0,994	6,83	17,00	2,00	230,66
Longitudinal	kg	#4	0,994	12,00	9,00	2,00	214,70
Longitudinal	kg	#4	0,994	9,00	8,00	2,00	143,14
Losa Superior							
Longitudinal	kg	#4	0,994	3,40	61,00	2,00	412,31
Longitudinal	kg	#4	0,994	1,90	7,00	2,00	26,44
Longitudinal	kg	#3	0,560	9,00	7,00	2,00	70,56
Longitudinal	kg	#3	0,560	12,00	8,00	2,00	107,52
Longitudinal	kg	#3	0,560	9,00	10,00	2,00	100,80
Muro Puerta							
Longitudinal	kg	#3	0,560	6,35	61,00	2,00	433,83
Longitudinal	kg	#3	0,560	12,00	13,00	2,00	174,72
Longitudinal	kg	#3	0,560	9,00	12,00	2,00	120,96
Longitudinal	kg	#3	0,560	4,70	25,00	2,00	131,60
Longitudinal	kg	#3	0,560	1,05	6,00	2,00	7,06
Muro Ventana							
Longitudinal	kg	#3	0,560	5,95	69,00	2,00	459,82
Longitudinal	kg	#3	0,560	12,00	12,00	2,00	161,28
Longitudinal	kg	#3	0,560	9,00	11,00	2,00	110,88
Longitudinal	kg	#3	0,560	6,55	23,00	2,00	168,73
Muro Posterior							
Longitudinal	kg	#3	0,560	5,99	16,00	2,00	107,39
Longitudinal	kg	#3	0,560	4,75	22,00	2,00	117,04
Muro Central							
Longitudinal	kg	#3	0,560	5,99	14,00	2,00	93,97
Longitudinal	kg	#3	0,560	3,40	22,00	2,00	83,78
Matera							
Longitudinal	kg	#3	0,560	1,35	134,00	1,00	101,30
Longitudinal	kg	#3	0,560	0,85	67,00	1,00	31,89

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	836

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
Longitudinal	kg	#3	0,560	12,00	8,00	1,00	53,76
Longitudinal	kg	#3	0,560	9,00	7,00	1,00	35,28
Longitudinal	kg	#3	0,560	5,00	8,00	1,00	22,40
Longitudinal	kg	#3	0,560	8,00	7,00	1,00	31,36
Edificio Cultural Módulo 1							
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V1	kg	#6	2,235	7,80	3,00		52,30
Longitudinal	kg	#6	2,235	9,10	3,00		61,02
Longitudinal	kg	#6	2,235	11,15	3,00		74,76
Longitudinal	kg	#6	2,235	8,35	3,00		55,99
Longitudinal	kg	#4	0,994	3,50	1,00		3,48
Longitudinal	kg	#6	2,235	3,00	1,00		6,71
Longitudinal	kg	#6	2,235	3,50	1,00		7,82
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,55	3,00		50,62
Longitudinal	kg	#8	3,973	4,00	1,00		15,89
Longitudinal	kg	#6	2,235	8,45	3,00		56,66
Longitudinal	kg	#3	0,560	1,70	163,00		155,18
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V2							
Longitudinal	kg	#6	2,235	12,00	3,00		80,46
Longitudinal	kg	#6	2,235	8,70	3,00		58,33
Longitudinal	kg	#6	2,235	11,10	3,00		74,43
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,90	3,00		46,26
Longitudinal	kg	#6	2,235	2,55	1,00		5,70
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,50	3,00		50,29
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,50	3,00		50,29
Longitudinal	kg	#4	0,994	3,50	1,00		3,48
Longitudinal	kg	#5	1,552	4,00	1,00		6,21
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,90	3,00		52,97
Longitudinal	kg	#8	3,973	4,00	1,00		15,89
Longitudinal	kg	#3	0,560	1,70	190,00		180,88
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V3							
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,10	3,00		47,61
Longitudinal	kg	#7	3,042	4,30	3,00		39,24
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,75	3,00		45,26
Longitudinal	kg	#7	3,042	10,05	3,00		91,72
Longitudinal	kg	#5	1,552	4,00	1,00		6,21
Longitudinal	kg	#4	0,994	4,30	1,00		4,27
Estribos	kg	#3	0,560	1,70	79,00		75,21
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V4							
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,70	3,00		44,92
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,00	3,00		46,94
Longitudinal	kg	#7	3,042	4,20	3,00		38,33
Longitudinal	kg	#7	3,042	9,75	3,00		88,98
Longitudinal	kg	#5	1,552	4,00	2,00		12,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Consorcio Parque Primavera	'CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	836

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
Longitudinal	kg	#6	2,235	3,80	2,00		16,99
Longitudinal	kg	#6	2,235	4,00	2,00		17,88
Estribos	kg	#3	0,560	1,70	80,00		76,16
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V5							
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,70	3,00		44,92
Longitudinal	kg	#7	3,042	7,00	3,00		63,88
Longitudinal	kg	#6	2,235	4,20	3,00		28,16
Longitudinal	kg	#7	3,042	9,75	3,00		88,98
Longitudinal	kg	#7	3,042	4,00	2,00		24,34
Longitudinal	kg	#7	3,042	3,80	2,00		23,12
Longitudinal	kg	#7	3,042	4,00	2,00		24,34
Estribos	kg	#3	0,560	1,70	84,00		79,97
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V6							
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,65	3,00		44,59
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,80	3,00		45,59
Longitudinal	kg	#7	3,042	4,15	3,00		37,87
Longitudinal	kg	#7	3,042	9,80	3,00		89,43
Longitudinal	kg	#6	2,235	3,60	2,00		16,09
Longitudinal	kg	#6	2,235	3,60	2,00		16,09
Longitudinal	kg	#5	1,552	4,05	2,00		12,57
Estribos	kg	#3	0,560	1,70	80,00		76,16
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V7							
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,00	3,00		46,94
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,80	3,00		45,59
Longitudinal	kg	#7	3,042	4,35	3,00		39,70
Longitudinal	kg	#7	3,042	9,60	3,00		87,61
Longitudinal	kg	#4	0,994	4,00	1,00		3,98
Longitudinal	kg	#4	0,994	4,00	1,00		3,98
Estribos	kg	#3	0,560	1,70	79,00		75,21
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V8							
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,10	3,00		47,61
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,95	3,00		46,60
Longitudinal	kg	#7	3,042	4,25	3,00		38,79
Longitudinal	kg	#7	3,042	9,75	3,00		88,98
Longitudinal	kg	#7	3,042	3,40	1,00		10,34
Longitudinal	kg	#7	3,042	3,40	1,00		10,34
Longitudinal	kg	#4	0,994	4,20	1,00		4,17
Estribos	kg	#3	0,560	1,70	83,00		79,02
NERVIOS DE CUBIERTA LONGITUNIDAL							
Longitudinal Superior	kg	#6	2,235	28,93	10,00		646,59
Longitudinal Inferior	kg	#6	2,235	28,93	10,00		646,59
Estribos	kg	#3	0,560	1,42	625,00		497,00
NERVIOS DE CUBIERTA TRANSVERSAL							
Longitudinal Superior	kg	#6	2,235	14,27	2,00		63,79
Longitudinal Inferior	kg	#6	2,235	14,27	2,00		63,79
Estribos	kg	#3	0,560	1,42	63,00		50,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	836


Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
ELEMENTO LOSA CUBIERTA							
Longitudinal Superior	kg	#4	0,994	28,54	62,00		1758,99
Longitudinal Inferior	kg	#4	0,994	28,54	62,00		1758,99
Transversal Superior	kg	#4	0,994	12,05	179,00		2144,01
Transversal Inferior	kg	#4	0,994	12,05	179,00		2144,01
ELEMENTO LOSA CONTRAPISO							
Longitudinal	kg	#2	0,250	27,03	82,00		554,04
Transversal	kg	#2	0,250	11,90	171,00		508,73
ELEMENTO COLUMNAS MURO							
Longitudinal	kg	#4	0,994	6,00	50,00		298,20
Estribos	kg	#4	0,994	5,36	31,00		165,16
Ganchos	kg	#4	0,994	0,39	124,00		48,07
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V1							
Longitudinal	kg	#6	2,235	8,95	3,00	2,00	120,02
Longitudinal	kg	#6	2,235	11,50	3,00	2,00	154,22
Longitudinal	kg	#6	2,235	9,20	3,00	2,00	123,37
Longitudinal	kg	#6	2,235	9,60	3,00	2,00	128,74
Longitudinal	kg	#6	2,235	11,40	3,00	2,00	152,87
Longitudinal	kg	#7	3,042	4,00	1,00	2,00	24,34
Longitudinal	kg	#6	2,235	8,15	3,00	2,00	109,29
Longitudinal	kg	#7	3,042	4,00	1,00	2,00	24,34
Estribos	kg	#3	0,560	1,82	179,00	2,00	364,87
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V2							
Longitudinal	kg	#6	2,235	8,40	3,00		56,32
Longitudinal	kg	#6	2,235	5,25	3,00		35,20
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,00	3,00		40,23
Longitudinal	kg	#6	2,235	3,15	3,00		21,12
Estribos	kg	#3	0,560	1,82	66,00		67,27
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V3							
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,85	3,00		52,63
Longitudinal	kg	#7	3,042	5,70	3,00		52,02
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,15	3,00		41,24
Longitudinal	kg	#7	3,042	8,25	3,00		75,29
Longitudinal	kg	#7	3,042	5,20	2,00		31,64
Estribos	kg	#3	0,560	1,82	73,00		74,40
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V4							
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,00	3,00		46,94
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,80	3,00		45,59
Longitudinal	kg	#7	3,042	3,90	3,00		35,59
Longitudinal	kg	#7	3,042	10,10	3,00		92,17
Longitudinal	kg	#7	3,042	3,50	4,00		42,59
Longitudinal	kg	#6	2,235	3,00	1,00		6,71
Estribos	kg	#3	0,560	1,82	85,00		86,63
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V5							
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,70	3,00		51,63
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,05	3,00		40,57
Longitudinal	kg	#7	3,042	5,60	3,00		51,11
Longitudinal	kg	#7	3,042	8,30	3,00		75,75
Longitudinal	kg	#6	2,235	3,00	1,00		6,71
Estribos	kg	#3	0,560	1,82	85,00		86,63
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V6							
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,90	3,00		52,97
Longitudinal	kg	#6	2,235	5,95	3,00		39,89
Longitudinal	kg	#7	3,042	5,70	3,00		52,02
Longitudinal	kg	#7	3,042	8,25	3,00		75,29
Estribos	kg	#3	0,560	1,82	82,00		83,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	836

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V7							
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,70	3,00		51,63
Longitudinal	kg	#6	2,235	6,05	3,00		40,57
Longitudinal	kg	#7	3,042	5,45	3,00		49,74
Longitudinal	kg	#7	3,042	8,15	3,00		74,38
Longitudinal	kg	#6	2,235	3,50	1,00		7,82
Estribos	kg	#3	0,560	1,82	87,00		88,67
ELEMENTO VIGA CUBIERTA V8							
Longitudinal	kg	#6	2,235	5,90	3,00		39,56
Longitudinal	kg	#6	2,235	7,90	3,00		52,97
Longitudinal	kg	#7	3,042	8,15	3,00		74,38
Longitudinal	kg	#7	3,042	5,80	3,00		52,93
Estribos	kg	#3	0,560	1,82	75,00		76,44
NERVIOS DE CUBIERTA LONGITUNIDAL							
Longitudinal Superior	kg	#6	2,235	30,43	10,00		680,11
Longitudinal Inferior	kg	#6	2,235	29,45	10,00		658,21
Estribos	kg	#3	0,560	1,42	672,00		534,37
ELEMENTO LOSA CUBIERTA							
Longitudinal Superior	kg	#6	2,235	20,80	2,00		92,98
Longitudinal Inferior	kg	#6	2,235	20,80	2,00		92,98
Estribos	kg	#3	0,560	1,42	104,00		82,70
ELEMENTO LOSA CUBIERTA							
Longitudinal Superior	kg	#4	0,994	28,15	62,00		1734,83
Longitudinal Inferior	kg	#4	0,994	28,15	62,00		1734,83
Transversal Superior	kg	#4	0,994	11,95	136,00		1615,45
Transversal Inferio	kg	#4	0,994	11,95	136,00		1615,45
ELEMENTO LOSA CONTRAPISO							
Longitudinal	kg	#2	0,250	27,55	82,00		564,78
Transversal	kg	#2	0,250	11,95	180,00		537,75
TRANSICIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN VIGAS							
Viga Cimentacion CLT Eje A	kg	#4	0,994	2,71	150,00		404,66
Viga Cimentacion CLT Eje B	kg	#4	0,994	2,71	150,00		404,66
Viga Cimentación CLT 7	kg	#4	0,994	2,71	52,00		140,28
Viga Cimentación CLT 8	kg	#4	0,994	4,09	40,00		162,54
Viga Cimentación CLT 9	kg	#4	0,994	4,09	40,00		162,54
Viga Cimentación CLT 10	kg	#4	0,994	4,09	40,00		162,54
Viga Cimentación CLT 11	kg	#4	0,994	4,09	40,00		162,54
Viga Cimentación CLT 12	kg	#4	0,994	2,71	40,00		107,91
ELEMENTO DADOS 1.5 x 1.5 INTERNOS							
Longitudinal	kg	#4	0,994	4,59	13,00	5,00	296,43
Transversal	kg	#4	0,994	3,21	13,00	5,00	207,66
ELEMENTO DADOS 1.5 x 1.5 EXTERNOS							
Longitudinal	kg	#4	0,994	3,21	13,00	2,00	83,06
Transversal	kg	#4	0,994	3,21	13,00	2,00	83,06
ELEMENTO DADOS 3.0 m							
Longitudinal	kg	#4	0,994	4,71	13,00	2,00	121,73
Transversal	kg	#4	0,994	3,21	25,00	2,00	159,74

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	836

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
ELEMENTO DADOS 3.0 m							
Longitudinal	kg	#4	0,994	3,20	13,00	3,00	124,05
Transversal	kg	#4	0,994	4,71	25,00	3,00	351,13
ACERO TEMPERATURA VIGAS DE CIMENTACIÓN							
Longitudinales Viga A	kg	#4	0,994	28,70	4,00		114,11
Longitudinales Viga B	kg	#4	0,994	28,70	4,00		114,11
Longitudinales Viga Eje 7	kg	#4	0,994	9,20	4,00		36,58
Longitudinales Viga Eje 8	kg	#4	0,994	9,20	4,00		36,58
Longitudinales Viga Eje 9	kg	#4	0,994	9,20	4,00		36,58
Longitudinales Viga Eje 10	kg	#4	0,994	9,20	4,00		36,58
Longitudinales Viga Eje 11	kg	#4	0,994	9,20	4,00		36,58
Longitudinales Viga Eje 12	kg	#4	0,994	9,20	4,00		36,58
Longitudinales Viga B'	kg	#4	0,994	13,85	4,00		55,07
Dados para prueba de carga ubicados en Z1 B5-2-5; A5-2-5 y C4-1-4	kg	#4	0,994	0,40	24,00	3,00	28,63
Dados para prueba de carga en carabobo ubicados pasarela Z2	kg	#4	0,994	0,40	24,00		9,54
Dados eje PC-A´ (Módulo 4 ejes 15, 16, 17 y 18) y (Módulo 5 ejes 19, 20, 21 y 22)							
Longitudinales	kg	#4	0,994	2,54	36,00	8,00	727,13
Longitudinales	kg	#5	1,552	2,90	26,00	8,00	936,17
Longitudinales	kg	#5	1,552	5,26	4,00	8,00	261,23
Estribos	kg	#4	0,994	2,10	52,00	8,00	868,36
Dado PC-A´-20 (Ajuste dados por micropilotes) Módulo 5-Longitudinales	kg	#5	1,552	3,30	26,00	1,00	133,16
Dado PC-A´-21 (Ajuste dados por micropilotes) Módulo 5							
Estribos	kg	#4	0,994	1,00	36,00	1,00	35,78
Longitudinales	kg	#5	1,552	2,90	36,00	1,00	162,03
Longitudinales	kg	#4	0,994	2,90	6,00	1,00	17,30
Dado PC-A´-21 (Ajuste dados por micropilotes) Módulo 5							
Longitudinales	kg	#4	0,994	3,04	8,00	8,00	193,39
Estribos	kg	#4	0,994	1,66	12,00	8,00	158,40
Longitudinales	kg	#4	0,994	2,00	8,00	8,00	127,23
Vigas eje PC-A´ (ejes 19 al 22) Módulo 5							
Longitudinales	kg	#8	3,973	2,10	6,00	2,00	100,12
Longitudinales	kg	#8	3,973	3,70	6,00	2,00	176,40
Longitudinales	kg	#8	3,973	4,90	6,00	3,00	350,42
Estribos	kg	#3	0,560	1,32	18,00	3,00	39,92
Vigas eje PC-C´ (ejes 19 al 22) Módulo 5							
Longitudinales	kg	#5	1,552	1,35	4,00	2,00	16,76
Longitudinales	kg	#5	1,552	1,70	4,00	2,00	21,11

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	836

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
Longitudinales	kg	#5	1,552	4,90	6,00	3,00	136,89
Estribos	kg	#3	0,560	1,25	22,00	3,00	46,20
Vigas eje PC-A´- C´ (ejes 19, 20, 21 y 22) Módulo 5							
Longitudinales	kg	#8	3,973	4,10	6,00	4,00	390,94
Longitudinales	kg	#5	1,552	3,95	4,00	2,00	49,04
Estribos	kg	#3	0,560	1,48	8,00	4,00	26,52
Vigas eje PC-A´ (ejes 15 al 19) Módulo 4							
Longitudinales	kg	#8	3,973	2,10	6,00	2,00	100,12
Longitudinales	kg	#8	3,973	3,70	6,00	2,00	176,40
Longitudinales	kg	#8	3,973	4,90	6,00	3,00	350,42
Estribos	kg	#3	0,560	1,32	18,00	3,00	39,92
Vigas eje PC-C´ (ejes 15 al 19) Módulo 4							
Longitudinales	kg	#5	1,552	1,35	4,00	2,00	16,76
Longitudinales	kg	#5	1,552	1,70	4,00	2,00	21,11
Longitudinales	kg	#5	1,552	4,90	6,00	3,00	136,89
Estribos	kg	#3	0,560	1,25	22,00	3,00	46,20
Vigas eje PC-A´- C´ (ejes 15 al 19) Módulo 4							
Longitudinales	kg	#8	3,973	4,10	6,00	4,00	390,94
Longitudinales	kg	#5	1,552	3,95	2,00	4,00	49,04
Estribos	kg	#3	0,560	1,48	8,00	4,00	26,52
Dados de prueba de carga ubicados en PC-C´-2; C´-7; C´-8; C´-13	kg	#4	0,994	0,40	24,00	4,00	38,17
Losa Alcorque entre ejes 17 y 18 Módulo 4							
Longitudinales	kg	#4	0,994	3,05	46,00	1,00	139,46
Longitudinales	kg	#4	0,994	4,20	40,00	1,00	166,99
Longitudinales	kg	#4	0,994	5,20	46,00	1,00	237,76
Losa Alcorque entre ejes 19 y 20 Módulo 5							
Longitudinales	kg	#4	0,994	3,05	46,00	1,00	139,46
Longitudinales	kg	#4	0,994	4,20	40,00	1,00	166,99
Longitudinales	kg	#4	0,994	5,20	46,00	1,00	237,76
Columnas módulo 5 Eje PC-A´(19 a 22) - Longitudinales	kg	#6	2,235	5,86	14,00	4,00	733,44
Columnas módulo 5 Eje PC-C´(19 a 22) -	kg	#6	2,235	5,93	14,00	4,00	742,20
Columnas módulo 4 Eje PC-A´(15 a 18) -	kg	#6	2,235	5,95	14,00	4,00	744,70
Columnas módulo 4 Eje PC-C´(15 a 18) -	kg	#6	2,235	6,04	14,00	4,00	755,97
Dados para prueba de carga en PN3 MP1	kg	#4	0,994	0,40	24,00		9,54
Muros de teatrino							
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M1 - Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,07	15,00	44,00	701,96
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M2- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,03	15,00	44,00	380,69
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M3- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	3,51	22,00	44,00	2902,70
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M4- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,50	15,00	44,00	984,06
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M5- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,40	15,00	44,00	517,44
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M6- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	0,91	15,00	44,00	597,00
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M1 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,07	6,00	11,00	70,20
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M2 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,03	6,00	11,00	38,07
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M3 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,39	22,00	11,00	188,37
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M4 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,50	6,00	11,00	98,41
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M5- Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,40	6,00	11,00	51,74
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M6 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	0,91	6,00	11,00	59,70
Galería Aquecell							
Longitudinales	kg	#4	0,994	12,00	30,00		357,84

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	1.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.3.3	ACARREOS VARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	1.3.3.2	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia entre 50 y 100 m.	CANTIDAD CONTRACTUAL	836

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total	
Transversales	kg	#4	0,994	9,42	9,00		84,27	
Transversales	kg	#4	0,994	9,40	9,00		84,09	
Transversales	kg	#4	0,994	9,01	9,00		80,60	
Transversales	kg	#4	0,994	9,01	9,00		80,60	
Longitudinales	kg	#4	0,994	9,00	4,00		35,78	
Longitudinales	kg	#4	0,994	8,13	60,00		484,87	
Longitudinales	kg	#4	0,994	8,10	60,00		483,08	
Longitudinales	kg	#4	0,994	7,40	2,00		14,71	
Transversales	kg	#4	0,994	7,08	7,00		49,26	
Transversales	kg	#4	0,994	6,99	89,00		618,38	
Transversales	kg	#4	0,994	6,95	7,00		48,36	
Transversales	kg	#4	0,994	6,74	7,00		46,90	
Transversales	kg	#4	0,994	6,65	36,00		237,96	
Transversales	kg	#4	0,994	6,55	7,00		45,57	
Transversales	kg	#4	0,994	6,51	13,00		84,12	
Transversales	kg	#4	0,994	6,25	36,00		223,65	
Transversales	kg	#4	0,994	6,19	89,00		547,60	
Longitudinales	kg	#4	0,994	6,00	4,00		23,86	
Transversales	kg	#4	0,994	5,71	13,00		73,78	
Transversales	kg	#4	0,994	4,53	7,00		31,52	
Transversales	kg	#4	0,994	4,47	7,00		31,10	
Transversales	kg	#4	0,994	4,15	7,00		28,88	
Transversales	kg	#4	0,994	4,06	7,00		28,25	
Transversales	kg	#4	0,994	3,44	104,00		355,61	
Transversales	kg	#4	0,994	3,10	2,00		6,16	
Transversales	kg	#4	0,994	3,07	18,00		54,93	
Transversales	kg	#4	0,994	3,06	18,00		54,75	
Transversales	kg	#4	0,994	3,06	104,00		316,33	
Transversales	kg	#4	0,994	2,97	18,00		53,14	
Longitudinales	kg	#4	0,994	2,80	72,00		200,39	
Longitudinales	kg	#4	0,994	2,20	12,00		26,24	
Longitudinales	kg	#4	0,994	2,20	144,00		314,90	
Longitudinales	kg	#4	0,994	1,70	100,00		168,98	
Total							**71.035,87**	
Total Acumulado en actas							**152.637,36**	

Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra


FECHA DE CORTE	25/03/2026


URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	1.4.0	CONCRETOS	ACTA	6
Sub-Capítulo	1.4.5	TANQUES	UNIDAD DE MEDIDA	m
Ítem:	1.4.5.3	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.	CANTIDAD CONTRACTUAL	44

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							18,60
Tanque Norte Técnico Coworking	m	5,90					5,90
Tanque Norte Técnico Coworking	m	5,90					5,90
Tanque Norte Técnico Coworking	m	3,40					3,40
Tanque Norte Técnico Coworking	m	3,40					3,40
Total							**18,60**
Total Acumulado en actas							**18,60**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	1.11.0	REDES ELÉCTRICAS	**ACTA**	6
Sub-Capítulo	1.11.1	REDES ELÉCTRICAS INTERNAS (AGUAS ABAJO DEL MEDIDOR)	**UNIDAD DE MEDIDA**	1.11.1.1
Ítem:	1.11.1.1	Sumiistro, transporte e instalación de acometida en cable encauchetado 3X14 AWG, en cobre, HFFR-75ºC. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcioramiento según RETIE.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**10**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							**6,00**
Para cámaras de monitoreo		6,00					6,00
Total							**6,00**
Total Acumulado en actas							**6,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	2.13.1	SISTEMA VRF	ACTA	6
Sub-Capítulo	2.13.1.1	EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	m
Ítem:	2.13.1.1.5	Stl. de acometida en cable encauchetado 3X12, cobre, HFFR-75°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	CANTIDAD CONTRACTUAL	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							20,00
Para cámaras de monitoreo en mástiles	m	5,00			4,00		20,00
Total							**20,00**
Total Acumulado en actas							**20,00**

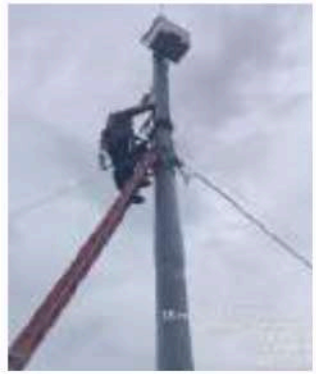

Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.2.1	RETIROS	UNIDAD DE MEDIDA	m
Ítem:	4.2.1.6	RETIRO CERRAMIENTO EN SUPERBOARD Y ESTRUCTURA METÁLICA. Incluye desmonte, cargue, ademas, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	CANTIDAD CONTRACTUAL	416

Área/ lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							87,50
Paralelo a Carabobo llegada al puente sur del metro	m	87,50					87,50
Total							**87,50**
Total Acumulado en actas							**87,50**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE: 25/03/2026

UNIDAD MOTONA NORTE

Capitulo	4.2.0	RETIROS Y DEMOLICIONES	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.2.2	DEMOLICIONES	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Item	4.2.2.1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas; compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	CANTIDAD CONTRACTUAL	410

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt(h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							19,78
Tecnico - Coworking							
Costado Box El Técnico							
Pedestal	m3	0,82	0,82	1,30			0,87
Zapata	m3	1,72	1,50	1,28			3,30
Pedestal	m3	0,85	0,85	1,45			1,05
Zapata	m3	1,70	1,60	0,75			2,04
Pedestal	m3	0,82	0,83	1,35			0,92
Zapata	m3	1,80	1,60	0,60			1,73
Viga 1	m3	0,30	0,30	2,20			0,20
Viga 2	m3	0,30	0,30	2,40			0,22
Viga 3	m3	0,30	0,30	2,40			0,22
Viga 4	m3	0,40	0,30	4,00			0,48
Viga 5	m3	0,30	0,30	2,10			0,19
Viga 6	m3	0,30	0,30	1,20			0,11
Costado Comercial Norte							
Pedestal	m3	1,34	0,85	0,85			0,97
Zapata	m3	1,00	1,00	1,00			1,00
Pedestal	m3	1,00	1,00	0,85			0,85
Zapata	m3	1,10	1,20	1,20			1,58
Pedestal	m3	1,00	0,85	1,00			0,85
Dado	m3	1,80	1,60	0,30			0,86
	m3	1,00	0,90	0,90	2,00		1,62
	m3	0,90	0,90	0,90			0,73
Total							19,78
Total Acumulado en actas							19,78

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACO II 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra


FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.4.0	CONCRETOS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	4.4.1	MUROS DE CONCRETO	**UNIDAD DE MEDIDA**	m2
Ítem:	4.4.1.2	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**1.652**


Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 3							**397,80**
ACTA 4							**587,13**
ACTA 5							**495,61**
ACTA 6							**221,73**
Módulo 3 Carabobo							
Dados PC-A' (11, 12, 13, 14)	m2	2,10	1,80		4,00		15,12
Dados PC-C' (11, 12, 13, 14)	m2	1,10	1,10		4,00		4,84
Vigas eje A' (11-14)	m2	3,35	0,50		3,00		5,03
Vigas eje C' (11-14)	m2	4,35	0,50		3,00		6,53
Vigas entre eje A' y C'	m2	1,45	0,50		4,00		2,90
Losa alcorque 12,13,14	m2	3,10	3,00		2,00		18,60
B(7-2), B(7-3), C(8-2)	m2	1,10	1,10		3,00		3,63
B(8-2), B(7-3), C(8-2)	m2	1,10	1,10		3,00		3,63
Teatrino Sur							
Gradas 5 y 16	m2	16,50	1,60		2,00		52,80
Módulo 5 Carabobo							
Dados PC-A' (19,20,21,22)	m2	2,10	1,80		4,00		15,12
Dados PC-C' (19,20,21,22)	m2	1,10	1,10		4,00		4,84
Vigas eje A' (19,20)	m2	3,35	0,50		3,00		5,03
Vigas eje C' (19,22)	m2	4,35	0,50		3,00		6,53
Losa alcorque (19-20)	m2	3,10	3,00		1,00		9,30
Módulo 4 Carabobo							
Dados PC-A' (15,16,17,18)	m2	2,10	1,80		4,00		15,12
Dados PC-C' (15,16,17,18)	m2	1,10	1,10		4,00		4,84
Vigas eje A' (15-18)	m2	3,35	0,50		3,00		5,03
Vigas eje C' (15-18)	m2	4,35	0,50		3,00		6,53
Losa alcorque (17-18)	m2	3,10	3,00		1,00		9,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO

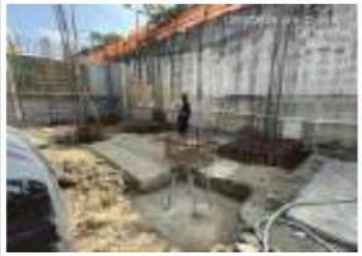







Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.4.0	CONCRETOS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	4.4.1	MUROS DE CONCRETO	**UNIDAD DE MEDIDA**	m2
Ítem:	4.4.1.2	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**1.652**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
Módulo 5 Carabobo							
Vigas eje A'-C' M5	m2	1,45	0,50		4,00		2,90
Vigas entre ejes A'-C' M4	m2	1,45	0,50		4,00		2,90
Tanque Norte Técnico Coworking	m2	5,90	3,60				21,24
Total							**221,73**
Total Acumulado en actas							**1.702,27**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.6.0	PISOS (SEGÚN DISEÑO DE PAVIMENTOS)	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.6.1	PISO EN ROYAL VETA PEATONAL	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem:	4.6.1.3	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	CANTIDAD CONTRACTUAL	481

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Área	Total
ACTA 6							708,36
Cultural Modulo 1							
Placa Contrapiso	m3	24,83	10,25	0,22			55,99
Descuento Area de Pedestales							
Pedestal 40 x 70	m3	0,40	0,70	0,22	-1,00		-0,06
Pedestal 40 x 70	m3	0,40	0,70	0,22	-1,00		-0,06
Pedestal 1.10 x 1.10	m3	1,10	1,10	0,22	-1,00		-0,27
Pedestal 1.10 x 1.10	m3	1,10	1,10	0,22	-1,00		-0,27
Pedestal 60 x 70	m3	0,60	1,00	0,22	-1,00		-0,13
Pedestal 60 x 70	m3	0,60	1,00	0,22	-1,00		-0,13
Pedestal 60 x 1.0	m3	0,60	1,00	0,22	-1,00		-0,13
Pedestal 60 x 1.0	m3	0,60	1,00	0,22	-1,00		-0,13
Pedestal 60 x 1.0	m3	0,60	1,00	0,22	-1,00		-0,13
Pedestal 60 x 1.0	m3	0,60	1,00	0,22	-1,00		-0,13
Pedestal 1.15 x 1.5	m3	1,15	1,50	0,22	-1,00		-0,38
Pedestal 1.10 x 1.10	m3	1,10	1,10	0,22	-1,00		-0,27
Cultural Modulo 2							
Placa Contrapiso	m3	27,11	10,25	0,22			61,13
Descuento Area de Pedestales							
Pedestal 40x40	m3	0,40	0,40	0,22	-1,00		-0,04
Pedestal 2.6 x 35	m3	2,60	0,35	0,22	-2,00		-0,40
Pedestal 1.10x1.10	m3	1,10	1,10	0,22	-1,00		-0,27
Pedestal 40 x 70	m3	0,40	0,70	0,22	-1,00		-0,06
Pedestal 50 x 90	m3	0,50	0,90	0,22	-2,00		-0,20
Pedestal 60 x 70	m3	0,60	0,70	0,22	-6,00		-0,55
Pedestal 70 x 70	m3	0,70	0,70	0,22	-1,00		-0,11
Cultural Modulo 3							
Placa Contrapiso	m3	33,70	10,25	0,22			75,99
Descuento Area de Pedestales							
Pedestal 1.10x1.10	m3	1,10	1,10	0,22	-2,00		-0,53
Pedestal 0.6 x 1.00	m3	0,60	1,00	0,22	-1,00		-0,13
Pedestal 1.10x1.10	m3	1,10	1,10	0,22	-2,00		-0,53
Pedestal 0.6 x 1.00	m3	0,60	1,00	0,22	-4,00		-0,53
Pedestal 90 x 90	m3	0,90	0,90	0,22	-2,00		-0,36

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.6.0	PISOS (SEGÚN DISEÑO DE PAVIMENTOS)	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.6.1	PISO EN ROYAL VETA PEATONAL	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem:	4.6.1.3	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	CANTIDAD CONTRACTUAL	481

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Área	Total
Pedestal 60 x 70	m3	0,60	0,70	0,22	-2,00		-0,18
Pedestal 70 x 70	m3	0,70	0,70	0,22	-1,00		-0,11
Pedestal 40 x 40	m3	0,40	0,40	0,22	-1,00		-0,04
Pedestal 2.6 x 35	m3	2,60	0,35	0,22	-1,00		-0,20
Pasarela Cultural 2 - 3							
Patio CLT 2-3	m3	15,75	10,25	0,32			51,66
Tanque Norte Técnico Coworking	m3	5,90	3,80	0,50			10,62
Edificio Técnico	m3			1,30		353,30	459,29
Total							**708,36**
Total Acumulado en actas							**709,36**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio ParquePrimavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	15/03/2026


URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.8.0	REDES ALCANTARILLADO/RESIDUALES/LLUVIAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.8.3	LLENOS	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Item:	4.8.3.1	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	CANTIDAD CONTRACTUAL	550

Área/Lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol	Total
ACTA 3							5,67
ACTA 5							636,30
ACTA 6							446,67
Gradas Teatrino Sur	m3	16,90	1,50	0,80	14,00		221,76
Lleno para urbanismo Zona 2 |VOLUMEN CON TOPOGRAFIA|	m3				861,21	861,21
Pagado en acta anterior	m3				-1,00	636,30	-636,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Consorcio ParquePrimavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	15/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.8.0	REDES ALCANTARILLADO/RESIDUALES/LLUVIAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.8.3	LLENOS	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Item:	4.8.3.1	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	CANTIDAD CONTRACTUAL	550

Área/Lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol	Total

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE


Capítulo	4.11.0	PASARELAS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	4.11.0	PASARELAS ZONA 1	**UNIDAD DE MEDIDA**	m3
Ítem:	4.11.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m^3., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**45**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 2							**38,48**
ACTA 4							**1154,26**
ACTA 5							**25,01**
ACTA 6							**45,44**
Módulo 5							
Dados eje PC'-A' (19, 20, 21 Y 22)	m3	2,35	2,00	0,40	4,00		7,52
Dados eje PC'-C' (19, 20, 21 Y 22)	m3	1,35	1,35	0,40	4,00		2,92
Vigas cimentación eje PC-A' (19-22)	m3	3,35	0,40	0,05	3,00		0,20
Vigas cimentación eje PC-C' (19-22)	m3	4,35	0,40	0,05	3,00		0,26
Vigas cimentación eje PC-A'-C' (19-22)	m3	0,42	0,40	0,05	4,00		0,03
Módulo 4							
Dados eje PC'-A' (15,16,17 y 18)	m3	2,35	2,00	0,40	4,00		7,52
Dados eje PC'-C' (15,16,17 y 18)	m3	1,35	1,35	0,40	4,00		2,92
Vigas cimentación eje PC-A' (15-18)	m3	3,35	0,40	0,05			0,07
Vigas cimentación eje PC-C' (15-18)	m3	4,35	0,40	0,05			0,09
Vigas cimentación eje PC-A' C' (15-18)	m3	0,42	0,40	0,05	4,00		0,03
Módulo 3							
Dados eje PC-A' (11,12,13,14)	m3	2,35	2,00	0,40	4,00		7,52
Dados eje PC-C' (11,12,13,14)	m3	1,35	1,35	0,40	4,00		2,92
Vigas cimentación eje PC-A' (11-14)	m3	3,35	0,40	0,05			0,07
Vigas cimentación eje PC-C' (11-14)	m3	4,35	0,40	0,05			0,09
Vigas cimentación eje PC-A'-C' (11-14)	m3	0,42	0,40	0,05	4,00		0,03
Módulo 2							
Dados eje PC-A' (7, 8, 9 y 10)	m3	2,35	2,00	0,40	4,00		7,52
Dados eje PC-C' (7, 8, 9 y 10)	m3	1,35	1,35	0,40	4,00		2,92
Vigas cimentación eje PC-A' (7-10)	m3	3,35	0,40	0,05			0,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.11.0	PASARELAS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	4.11.0	PASARELAS ZONA 1	**UNIDAD DE MEDIDA**	m3
Ítem:	4.11.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m^3., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**45**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total	
Vigas cimentación eje PC-C' (7-10)	m3	4,35	0,40	0,05			0,09	
Vigas cimentación eje PC-A' C' (7-10)	m3	0,42	0,40	0,05	4,00		0,03	
Dados por ajuste de pilote								
Dado PC-A'-20 (1,70x2,50)	m3	0,35	2,00	0,40	4,00		1,12	
Dado PC-A'-21 (2,05x2,05)	m3	2,35	0,40	0,40	4,00		1,50	
Total							**45,44**	
Total Acumulado en actas							**1.263,19**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.11.1	PASARELAS ZONA 1	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem:	4.11.1.5	Construcción de DADOS DE FUNDACIÓN en concreto PREMEZCLADO de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	39

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							0,38
Zona 1 Dados de prueba B5-2-5; A5-2-5 y C4-1-4	m3	0,50	0,50	0,50	3,00		0,38
Total							**0,38**
Total Acumulado en actas							**0,38**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

VO.BO. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.11.1	PASARELAS ZONA 1	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	4.11.1.8	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	CANTIDAD CONTRACTUAL	13.437

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
ACTA 6							28,63
Dados para prueba de carga ubicados en Z1 B5-2-5; A5-2-5 y C4-1-4	kg	#4	0,99	0,40	24,00	3	28,63
Total							**28,63**
Total Acumulado en actas							**28,63**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.11.2	PASARELAS ZONA 2	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem:	4.11.2.5	Construcción de DADOS DE FUNDACIÓN en concreto PREMEZCLADO de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, proteccion y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	4

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							0,13
Dados prueba de carga en Z2	m3	0,50	0,50	0,50	1,00		0,13
Total							**0,13**
Total Acumulado en actas							**0,13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.11.2	PASARELAS ZONA 2	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	4.11.2.8	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	CANTIDAD CONTRACTUAL	1529

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
ACTA 6							9,54
Dados para prueba de carga en carabobo ubicados pasarela Z2	kg	#4	0,994	0,40	24,00		9,54
Total							**9,54**
Total Acumulado en actas							**9,54**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capitulo	4.11.0	PASARELAS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	4.11.5	PASARELA CARABOBO	**UNIDAD DE MEDIDA**	m3
Ítem:	4.11.5.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m^3., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**532**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 2							2079,75
ACTA 3							486,94
ACTA 4							23,49
ACTA 5							1869,79
ACTA 6							131,77
Pasarela Z3 Tomada por topografía						131,77	131,77
Total							131,77
Total Acumulado en actas							4591,74

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.11.5	PASARELA CARABOBO	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem:	4.11.5.6	Construcción de DADOS DE FUNDACIÓN en concreto PREMEZCLADO de 28 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	34


Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							27,23
Pasarela Carabobo - Dados de prueba de carga ubicados en PC-C'-2; C'-7; C'-8, C'-13	m3	0,50	0,50	0,50	4,00		0,50
Modulo 5							
Dados Eje PC-A' [19, 20, 21 y 22]	m3	2,05	1,70	0,70	4,00		9,76
Dados Eje PC-C' [19, 20, 21 y 22]	m3	1,05	1,05	0,70	4,00		3,09
Dado PC-A'-20 [1.70x2.50]	m3	0,45	1,70	0,70			0,54
Dado PC-A'-21 [2.05x2.05]	m3	0,35	2,05	0,70			0,50
Modulo 4							
Dados Eje PC-A' [15, 16, 17 y 18]	m3	2,05	1,70	0,70	4,00		9,76
Dados Eje PC-C' [15, 16, 17 y 18]	m3	1,05	1,05	0,70	4,00		3,09

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MODULO 5



MODULO 4







Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.11.5	PASARELA CARABOBO	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem:	4.11.5.6	Construcción de DADOS DE FUNDACIÓN en concreto PREMEZCLADO de 28 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	34

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h	Cant	Vol.	Total	
Total							**27,23**	
Total Acumulado en actas							**27,23**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.11.5	PASARELA CARABOBO	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem:	4.11.5.8	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN, ZAPATAS Y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto Premezclado de 28 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	34


Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							9,46
Modulo 5							
Viga cimentación Eje PC-A' (19-22)	m3	3,70	0,40	0,40	3		1,78
Viga cimentación Eje PC-C' (19-22)	m3	4,35	0,40	0,40	3		2,09
Viga cimentación Eje PC-A'-C (19 a 22)	m3	1,45	0,40	0,40	4		0,93
Descuento Viga PC-A-20 (1.70x2.50)	m3	0,45	0,40	0,40	-1		-0,07
Descuento Viga PC-A-21 (2.05x2.05)	m3	0,35	0,40	0,40	-1		-0,06
Modulo 4							
Viga cimentación Eje PC-A' (15-18)	m3	3,70	0,40	0,40	3		1,78
Viga cimentación Eje PC-C' (15-18)	m3	4,35	0,40	0,40	3		2,09
Viga cimentación Eje PC-A'-C' (15 a 18)	m3	1,45	0,40	0,40	4		0,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MODULO 5

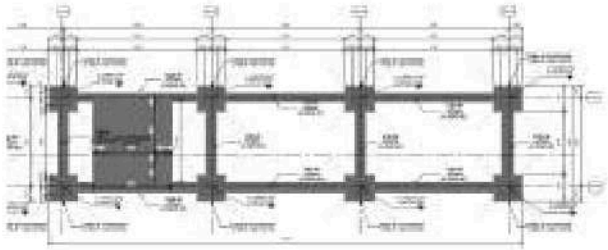

MODULO 4

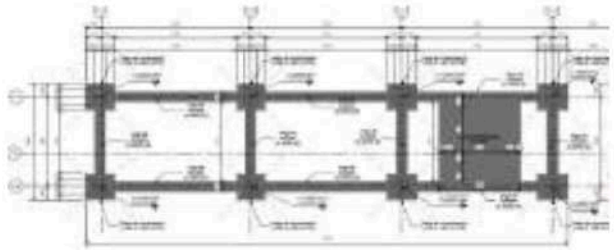


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.11.5	PASARELA CARABOBO	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem:	4.11.5.8	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN, ZAPATAS Y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto Premezclado de 28 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	34

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total	
Total							**9,46**	
Total Acumulado en actas							**9,46**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026


URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.11.5	PASARELA CARABOBO	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	4.11.5.13	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	CANTIDAD CONTRACTUAL	20.412


Área/lugar/elemento	Und.	Varilla Nº	Peso (Kg)	Long.	Cant.	Nº elementos	Total
ACTA 6							10431,73
Dados eje PC-A´ (Módulo 4 ejes 15, 16, 17 y 18) y (Módulo 5 ejes 19, 20, 21 y 22)							
Longitudinales	kg	#4	0,994	2,54	36,00	8,00	727,13
Longitudinales	kg	#5	1,552	2,90	26,00	8,00	936,17
Longitudinales	kg	#5	1,552	5,26	4,00	8,00	261,23
Estribos	kg	#4	0,994	2,10	52,00	8,00	868,36
Dado PC-A´-20 (Ajuste dados por micropilotes) Módulo 5-Longitudinales	kg	#5	1,552	3,30	26,00	1,00	133,16
Dado PC-A´-21 (Ajuste dados por micropilotes) Módulo 5							
Estribos	kg	#4	0,994	1,00	36,00	1,00	35,78
Longitudinales	kg	#5	1,552	2,90	36,00	1,00	162,03
Longitudinales	kg	#4	0,994	2,90	6,00	1,00	17,30
Dado PC-A´-21 (Ajuste dados por micropilotes) Módulo 5							
Longitudinales	kg	#4	0,994	3,04	8,00	8,00	193,39
Estribos	kg	#4	0,994	1,66	12,00	8,00	158,40
Longitudinales	kg	#4	0,994	2,00	8,00	8,00	127,23
Vigas eje PC-A´ (ejes 19 al 22) Módulo 5							
Longitudinales	kg	#8	3,973	2,10	6,00	2,00	100,12
Longitudinales	kg	#8	3,973	3,70	6,00	2,00	176,40
Longitudinales	kg	#8	3,973	4,90	6,00	3,00	350,42
Estribos	kg	#3	0,560	1,32	18,00	3,00	39,92
Vigas eje PC-C´ (ejes 19 al 22) Módulo 5							
Longitudinales	kg	#5	1,552	1,35	4,00	2,00	16,76
Longitudinales	kg	#5	1,552	1,70	4,00	2,00	21,11
Longitudinales	kg	#5	1,552	4,90	6,00	3,00	136,89
Estribos	kg	#3	0,560	1,25	22,00	3,00	46,20
Vigas eje PC-A´- C´ (ejes 19, 20, 21 y 22) Módulo 5							
Longitudinales	kg	#8	3,973	4,10	6,00	4,00	390,94
Longitudinales	kg	#5	1,552	3,95	4,00	2,00	49,04
Estribos	kg	#3	0,560	1,48	8,00	4,00	26,52
Vigas eje PC-A´ (ejes 15 al 19) Módulo 4							
Longitudinales	kg	#8	3,973	2,10	6,00	2,00	100,12
Longitudinales	kg	#8	3,973	3,70	6,00	2,00	176,40
Longitudinales	kg	#8	3,973	4,90	6,00	3,00	350,42
Estribos	kg	#3	0,560	1,32	18,00	3,00	39,92
Vigas eje PC-C´ (ejes 15 al 19) Módulo 4							
Longitudinales	kg	#5	1,552	1,35	4,00	2,00	16,76

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MODULO 5



MODULO 4



Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026



URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.11.5	PASARELA CARABOBO	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	4.11.5.13	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	CANTIDAD CONTRACTUAL	20.412

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla Nº	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
Longitudinales	kg	#5	1,552	1,70	4,00	2,00	21,11
Longitudinales	kg	#5	1,552	4,90	6,00	3,00	136,89
Estribos	kg	#3	0,560	1,25	22,00	3,00	46,20
Vigas eje PC-A´- C´ (ejes 15 al 19) Módulo 4							
Longitudinales	kg	#8	3,973	4,10	6,00	4,00	390,94
Longitudinales	kg	#5	1,552	3,95	2,00	4,00	49,04
Estribos	kg	#3	0,560	1,48	8,00	4,00	26,52
Dados de prueba de carga ubicados en PC-C´-2; C´-7; C´-8; C´-13	kg	#4	0,994	0,40	24,00	4,00	38,17
Losa Alcorque entre ejes 17 y 18 Módulo 4							
Longitudinales	kg	#4	0,994	3,05	46,00	1,00	139,46
Longitudinales	kg	#4	0,994	4,20	40,00	1,00	166,99
Longitudinales	kg	#4	0,994	5,20	46,00	1,00	237,76
Losa Alcorque entre ejes 19 y 20 Módulo 5							
Longitudinales	kg	#4	0,994	3,05	46,00	1,00	139,46
Longitudinales	kg	#4	0,994	4,20	40,00	1,00	166,99
Longitudinales	kg	#4	0,994	5,20	46,00	1,00	237,76
Columnas módulo 5 Eje PC-A´(19 a 22) - Longitudinales	kg	#6	2,235	5,86	14,00	4,00	733,44
Columnas módulo 5 Eje PC-C´(19 a 22) - Longitudinales	kg	#6	2,235	5,93	14,00	4,00	742,20
Columnas módulo 4 Eje PC-A´(15 a 18) - Longitudinales	kg	#6	2,235	5,95	14,00	4,00	744,70
Columnas módulo 4 Eje PC-C´(15 a 18) - Longitudinales	kg	#6	2,235	6,04	14,00	4,00	755,97

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.11.5	PASARELA CARABOBO	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	4.11.5.13	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=420 Mpa-60000 PSI corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	CANTIDAD CONTRACTUAL	20.412

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	long.	Cant.	No elementos	Total	

Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.11.7	PASARELAS PN2, PN3, PN4	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem	4.11.7.5	Construcción de DADOS DE FUNDACIÓN en concreto PREMEZCLADO de 28 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	7

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							0,13
Dados de prueba de carga en PN3 MP1	m3	0,50	0,50	0,50	1,00		0,13
Total							**0,13**
Total Acumulado en actas							**0,13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.11.0	PASARELAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.11.7	PASARELAS PN2, PN3, PN4	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem	4.11.7.7	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	CANTIDAD CONTRACTUAL	2.300

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
ACTA 6							9,54
Dados para prueba de carga en PN3 MP1	kg	#4	0,994	0,40	24,00		9,54
Total							**9,54**
Total Acumulado en actas							**9,54**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capitulo	4.12.0	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE URBANISMO (GRADAS, RAMPAS, GRADERÍA, ESCALERAS, TERRACEO)	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	4.12.2	GRADA SUR (E.E.U.)	**UNIDAD DE MEDIDA**	m3
Ítem:	4.12.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, boles de roca de volumen inferior a 0.35 m^3., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**165**

Área /lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 4							**3458,85**
ACTA 6							**729,79**
Teatrino sur, excavación para muros de contención	m3	15,50	1,95	1,6	14,00		720,72
Excavación de llaves de la 1 a la 16 Teatrino sur	m3	15,20	0,20	0,20	14,00		9,07
Total							**729,79**
Total Acumulado en actas							**4.188,64**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.12.0	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE URBANISMO (GRADAS, RAMPAS, GRADERÍA, ESCALERAS, TERRACEO)	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.12.2	GRADA SUR (E.E.U.)	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Ítem:	4.12.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m^3, el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	CANTIDAD CONTRACTUAL	31

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							9,66
Muro 1,1							
Tramo 1	m3	4,67	0,25	0,30			0,35
Tramo 2 y3	m3	6,00	0,25	0,30	2		0,90
Tramo 4	m3	6,00	0,30	0,40			0,72
Tramo 5	m3	6,00	0,40	0,50			1,20
Tramo 6	m3	10,20	0,40	0,50			2,04
Muro 2							
Tramo 1	m3	3,12	0,50	0,40			0,62
Tramo 2	m3	3,38	0,50	0,40			0,68
Tramo 3	m3	6,50	0,50	0,40			1,30
Tramo 4	m3	4,05	0,50	0,40			0,81
Tramo 5	m3	4,05	0,50	0,40			0,81
Tramo 6	m3	3,00	0,30	0,25			0,23
Total							**9,66**
Total Acumulado en actas							**9,66**





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026


URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.12.0	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE URBANISMO (GRADAS, RAMPAS, GRADERÍA, ESCALERAS, TERRACEO)	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.12.2	GRADA SUR (E.E.U.)	UNIDAD DE MEDIDA	m
Ítem:	4.12.2.4	Suministro, transporte e instalación de FILTRO con tubería PVC perforada con un diámetro de 100mm. (4"), con una sección de 0.30 de ancho x h:0.6 m. Incluye geotextil NT1600, granulometría de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	CANTIDAD CONTRACTUAL	112

Área/Lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							231,00
Graderías Teatrino sur	m	16,50			14,00		231,00
Total							**231,00**
Total Acumulado en actas							**231,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.12.0	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE URBANISMO (GRADAS, RAMPAS, GRADERÍA, ESCALERAS, TERRACEO)	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.12.2	GRADA SUR (E.E.U.)	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	4.12.2.7	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	CANTIDAD CONTRACTUAL	11.028

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
ACTA 5							3994,12
ACTA 6							3120,86
Muros de teatrino							
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M1 - Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,07	15,00	44,00	701,96
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M2- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,03	15,00	44,00	380,69
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M3- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	3,51	22,00	44,00	1902,70
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M4- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	1,50	15,00	44,00	984,06
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M5- Tramo 3.66	kg	#3	0,560	1,40	15,00	44,00	517,44
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M6- Tramo 3.66	kg	#4	0,994	0,91	15,00	44,00	597,00
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M1 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,07	6,00	11,00	70,20
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M2 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,03	6,00	11,00	38,07
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M3 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,39	22,00	11,00	188,37
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M4 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	1,50	6,00	11,00	98,41
Grada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M5 - Tramo 1,53	kg	#3	0,560	1,40	6,00	11,00	51,74
Grada1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 - M6 - Tramo 1,53	kg	#4	0,994	0,91	6,00	11,00	59,70
Muro 1.1							
TRAMO 1 - M1	kg	#4	0,994	1,55	24,00	-1,00	-36,98
TRAMO 1 - M2	kg	#3	0,560	1,50	24,00	-1,00	-20,16
TRAMO 1 - M3	kg	#3	0,560	4,52	26,00	-1,00	-65,81
TRAMO 1 - M4	kg	#4	0,994	1,60	24,00	-1,00	-38,17
TRAMO 1 - M5	kg	#3	0,560	1,50	24,00	-1,00	-20,16
TRAMO 1 - M6	kg	#4	0,994	1,36	24,00	-1,00	-32,44
TRAMO 2 - M1	kg	#4	0,994	2,05	31,00	-1,00	-63,17
TRAMO 2 - M2	kg	#3	0,560	2,00	31,00	-1,00	-34,72
TRAMO 2 - M3	kg	#3	0,560	5,85	33,00	-1,00	-108,11
TRAMO 2 - M4	kg	#4	0,994	2,10	31,00	-1,00	-64,71
TRAMO 2 - M5	kg	#3	0,560	2,00	31,00	-1,00	-34,72
TRAMO 2 - M6	kg	#4	0,994	1,26	31,00	-1,00	-38,83
TRAMO 3 - M1	kg	#4	0,994	2,55	31,00	-1,00	-78,58
TRAMO 3 - M2	kg	#3	0,560	2,50	31,00	-1,00	-43,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.12.0	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE URBANISMO (GRADAS, RAMPAS, GRADERÍA, ESCALERAS, TERRACEO)	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.12.2	GRADA SUR (E.E.U.)	UNIDAD DE MEDIDA	kg
Ítem:	4.12.2.7	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY=420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	CANTIDAD CONTRACTUAL	11.028

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
TRAMO 3 - M3	kg	#3	0,560	5,85	39,00	-1,00	-127,76
TRAMO 3 - M4	kg	#4	0,994	2,55	31,00	-1,00	-78,58
TRAMO 3 - M5	kg	#3	0,560	2,45	31,00	-1,00	-42,53
TRAMO 3 - M6	kg	#4	0,994	1,56	31,00	-1,00	-48,07
TRAMO 4 - M1	kg	#4	0,994	3,05	21,00	-1,00	-63,67
TRAMO 4 - M2	kg	#3	0,560	3,00	21,00	-1,00	-35,28
TRAMO 4 - M3	kg	#3	0,560	5,85	48,00	-1,00	-157,25
TRAMO 4 - M4	kg	#4	0,994	2,90	40,00	-1,00	-115,30
TRAMO 4 - M5	kg	#3	0,560	2,80	40,00	-1,00	-62,72
TRAMO 4 - M6	kg	#4	0,994	1,66	31,00	-1,00	-51,15
TRAMO 4 - M7	kg	#4	0,994	1,60	21,00	-1,00	-33,40
TRAMO 5 - M1	kg	#4	0,994	4,05	26,00	-1,00	-104,67
TRAMO 5 - M2	kg	#4	0,994	4,05	26,00	-1,00	-104,67
TRAMO 5 - M3	kg	#4	0,994	5,85	58,00	-1,00	-337,26
TRAMO 5 - M4	kg	#4	0,994	3,45	50,00	-1,00	-171,47
TRAMO 5 - M5	kg	#4	0,994	3,45	26,00	-1,00	-89,16
TRAMO 5 - M6	kg	#4	0,994	2,26	50,00	-1,00	-112,32
TRAMO 5 - M7	kg	#4	0,994	2,10	26,00	-1,00	-54,27
Total							**3.120,86**
Total Acumulado en actas							**7.114,98**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

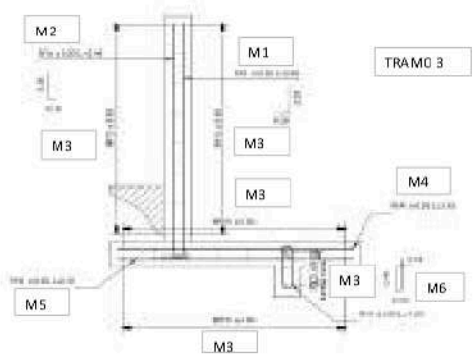

Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capitulo	4.13.0	MUROS DE CONTENCIÓN	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	4.13.1	MUROS DE CONTENCIÓN DE M1, M2, M3	**UNIDAD DE MEDIDA**	m
Ítem:	4.13.1.5	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**137**

Área/lugar/elemento	Und	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 4							**27,34**
ACTA 5							**24,00**
ACTA 6							**119,80**
Gradas SUR							
Graderia Sur 1 -Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20
Graderia Sur 2 -Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20
Graderia Sur 3-Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20
Graderia Sur 4-Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20
Graderia Sur 5-Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20
Graderia Sur 6-Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20
Graderia Sur 7-Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20
Graderia Sur 8-Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20
Graderia Sur 10-Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20
Graderia Sur 11-Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80
	m	0,80			4,00		3,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capitulo	4.13.0	MUROS DE CONTENCIÓN	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	4.13.1	MUROS DE CONTENCIÓN DE M1, M2, M3	**UNIDAD DE MEDIDA**	m
Ítem:	4.13.1.5	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**137**

Graderia Sur 14-Teatrino sur - Zapata, Muro	m	1,20			4,00		4,80	
	m	0,80			4,00		3,20	
Muro de Contencion M2								
Tramos 1 - 2								
Cinta PCV Zapata	m	4,95					4,95	
Cinta PCV Vastago	m	5,45					5,45	
Tramos 2 - 3								
Cinta PCV Zapata	m	3,90					3,90	
Cinta PCV Vastago	m	6,20					6,20	
Muro de Contencion M 1,1								
Tramos 1 - 2	m	1,00					1,00	
Tramos 2 - 3	m	1,70					1,70	
Tramos 3 - 4	m	2,20					2,20	
Tramos 4 - 5	m	2,70					2,70	
Tramos 5 - 6	m	3,70					3,70	
Total							**119,80**	
Total Acumulado en actas							**171,14**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.13.0	MUROS DE CONTENCIÓN	**ACTA**	6
Sub-Capítulo	4.13.1	MUROS DE CONTENCIÓN DE M1, M2, M3	**UNIDAD DE MEDIDA**	kg
Ítem:	4.13.1.6	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, trarsporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	29.806

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total
ACTA 4							**6356,36**
ACTA 6							**5632,32**
Muro 1.1							
TRAMO 1 - M1	kg	#4	0,994	1,55	24,00		36,98
TRAMO 1 - M2	kg	#3	0,560	1,50	24,00		20,16
TRAMO 1 - M3	kg	#3	0,560	4,52	26,00		65,81
TRAMO 1 - M4	kg	#4	0,994	1,60	24,00		38,17
TRAMO 1 - M5	kg	#3	0,560	1,50	24,00		20,16
TRAMO 1 - M6	kg	#4	0,994	1,36	24,00		32,44
TRAMO 2 - M1	kg	#4	0,994	2,05	31,00		63,17
TRAMO 2 - M2	kg	#3	0,560	2,00	31,00		34,72
TRAMO 2 - M3	kg	#3	0,560	5,85	33,00		108,11
TRAMO 2 - M4	kg	#4	0,994	2,10	31,00		64,71
TRAMO 2 - M5	kg	#3	0,560	2,00	31,00		34,72
TRAMO 2 - M6	kg	#4	0,994	1,26	31,00		38,83
TRAMO 3 - M1	kg	#4	0,994	2,55	31,00		78,58
TRAMO 3 - M2	kg	#3	0,560	2,50	31,00		43,40
TRAMO 3 - M3	kg	#3	0,560	5,85	39,00		127,76
TRAMO 3 - M4	kg	#4	0,994	2,55	31,00		78,58
TRAMO 3 - M5	kg	#3	0,560	2,45	31,00		42,53
TRAMO 3 - M6	kg	#4	0,994	1,56	31,00		48,07
TRAMO 4 - M1	kg	#4	0,994	3,05	21,00		63,67
TRAMO 4 - M2	kg	#3	0,560	3,00	21,00		35,28
TRAMO 4 - M3	kg	#3	0,560	5,85	48,00		157,25
TRAMO 4 - M4	kg	#4	0,994	2,90	40,00		115,30
TRAMO 4 - M5	kg	#3	0,560	2,80	40,00		62,72
TRAMO 4 - M6	kg	#4	0,994	1,66	31,00		51,15
TRAMO 4 - M7	kg	#4	0,994	1,60	21,00		33,40
TRAMO 5 - M1	kg	#4	0,994	4,05	26,00		104,67
TRAMO 5 - M2	kg	#4	0,994	4,05	26,00		104,67
TRAMO 5 - M3	kg	#4	0,994	5,85	58,00		337,26
TRAMO 5 - M4	kg	#4	0,994	3,45	50,00		171,47
TRAMO 5 - M5	kg	#4	0,994	3,45	26,00		89,16
TRAMO 5 - M6	kg	#4	0,994	2,26	50,00		112,32
TRAMO 5 - M7	kg	#4	0,994	2,10	26,00		54,27
TRAMO 6 - M1	kg	#5	1,552	5,10	56,00		443,25
TRAMO 6 - M2	kg	#4	0,994	5,05	56,00		281,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.13.0	MUROS DE CONTENCIÓN	**ACTA**	6
Sub-Capítulo	4.13.1	MUROS DE CONTENCIÓN DE M1, M2, M3	**UNIDAD DE MEDIDA**	kg
Ítem:	4.13.1.6	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, trarsporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	29.806

Área/lugar/elemento	Und.	Varilla No	Peso (Kg)	Long.	Cant.	No elementos	Total	
TRAMO 6 - M3	kg	#4	0,994	12,00	81,00		966,17	
TRAMO 6 - M4	kg	#5	1,552	4,35	111,00		749,38	
TRAMO 6 - M5	kg	#4	0,994	4,25	56,00		236,57	
TRAMO 6 - M6	kg	#4	0,994	2,36	111,00		260,39	
TRAMO 6 - M7	kg	#5	1,552	2,60	56,00		225,97	
Total							**5.632,32**	
Total Acumulado en actas							**11.988,68**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

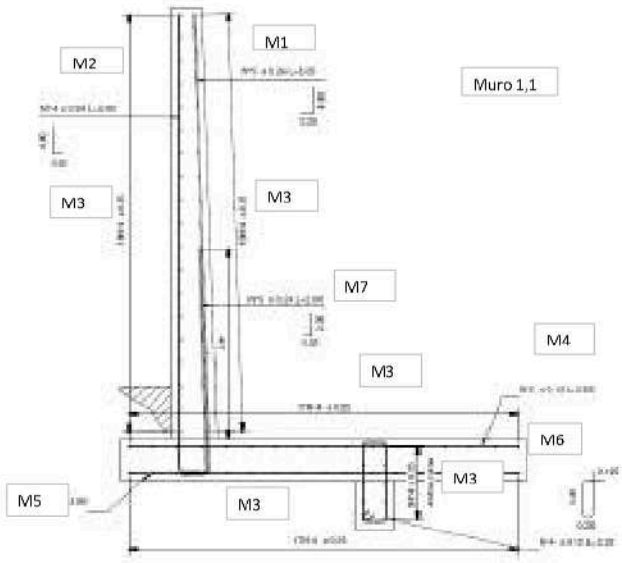

Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez


Vo.Bo. CONSORCIOTRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026


URBANISMO ZONA NORTE				
Capítulo	4.13.0	MUROS DE CONTENCIÓN	ACTA	6
Sub-Capitulo	4.13.1	MUROS DE CONTENCIÓN DE M1, M2, M3	UNIDAD DE MEDIDA	un
Ítem:	4.13.1.7	Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 5/8", induye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 5/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 12 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem.	CANTIDAD CONTRACTUAL	375

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							236,00
Anclaje para dovelas de mampostería de Módulo 3	un				236,00		236,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

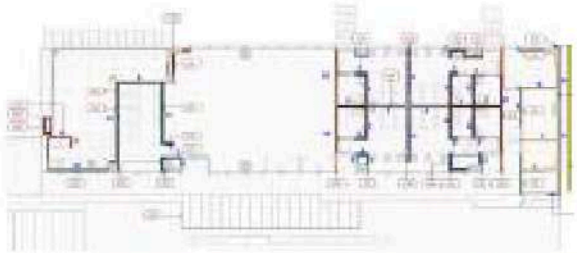





Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	4.13.0	MUROS DE CONTENCIÓN	ACTA	6
Sub-Capítulo	4.13.1	MUROS DE CONTENCIÓN DE M1, M2, M3	UNIDAD DE MEDIDA	un
Ítem:	4.13.1.7	Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 5/8", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 5/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 12 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem.	CANTIDAD CONTRACTUAL	375

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total	
Total							**236,00**	
Total Acumulado en actas							**236,00**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	OE	OBRAS EXTRAS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo			**UNIDAD DE MEDIDA**	m
Ítem:	OE-008	Suministro e instalación de tubo en acero SCH 40 – Gr. 50 diámetro exterior 88.9 mm (3.5") y espesor 5.49 mm (7/32") para encamisado de micropilote. Incluye corte, soldadura con electrodo E7018 de 1/8" e instalacion (junto con los elementos y equipos requeridos para su correcta fijación).	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**50.40**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 4							**291,60**
ACTA 5							**486,00**
ACTA 6							**604,80**
Pasarela Carabobo							
Modulo A2	m	3,60			3,00		10,80
Modulo A3	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A4	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A5	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A6	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A7	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A8	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A9	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A10	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A11	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A12	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A13	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A14	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A15	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A16	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A17	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A18	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A19	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A20	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A21	m	3,60			6,00		21,60
Modulo A22	m	3,60			6,00		21,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA NORTE

Capítulo	OE	OBRAS EXTRAS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo			**UNIDAD DE MEDIDA**	m
Ítem:	OE-008	Suministro e instalación de tubo en acero SCH 40 – Gr. 50 diámetro exterior 88.9 mm (3.5") y espesor 5.49 mm (7/32") para encamisado de micropilote. Incluye corte, soldadura con electrodo E7018 de 1/8" e instalacion (junto con los elementos y equipos requeridos para su correcta fijación).	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**50.40**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
Pasarela zona 3							
Z3 A2 1-2	m	3,60			3,00		10,80
Z3 B2 1-2	m	3,60			5,00		18,00
Z3 B2 2-2	m	3,60			3,00		10,80
Z3 A3 1-3	m	3,60			3,00		10,80
Z3 B3 1-3	m	3,60			3,00		10,80
Z3 A3 2-3	m	3,60			3,00		10,80
Z3 B3 2-3	m	3,60			3,00		10,80
A15 (1-15)	m	3,60			3,00		10,80
Pasarela zona 1							
B15 (1-15)	m	3,60			3,00		10,80
B15 (2-15)	m	3,60			3,00		10,80
Pasarela PN-4							
PN4-1	m	3,60			4,00		14,40
PN4-2	m	3,60			4,00		14,40
PN4-4	m	3,60			5,00		18,00
Total							604,80
Total Acumulado en actas							1.382,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO

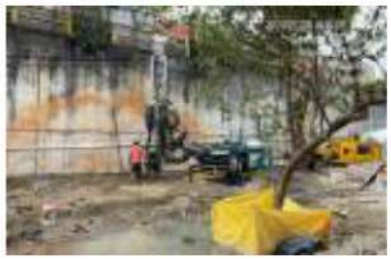




Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA SUR				
Capítulo	OE	OBRAS EXTRAS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo			**UNIDAD DE MEDIDA**	m2
Ítem:	OE-011	Rocería y limpieza, Incluye cargue, disposición, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, entre una altura de vegetación de 0,50m y 3,0 m, la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**14.000**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Area	Total
ACTA 6							**4329,98**
Lote remanente Norte Tomado con topografia	m2					4329,98	4329,98

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA SUR				
Capítulo	OE	OBRAS EXTRAS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo			**UNIDAD DE MEDIDA**	m2
Ítem:	OE-011	Rocería y limpieza, Incluye cargue, disposición, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, entre una altura de vegetación de 0,50m y 3,0 m, la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**14.000**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Area	Total	

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA SUR

Capítulo	OE	OBRAS EXTRAS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo			**UNIDAD DE MEDIDA**	m2
Ítem:	OE-011	Rocería y limpieza, Incluye cargue, disposición, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, entre una altura de vegetación de 0,50m y 3,0 m, la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**14.000**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Area	Total
Total							**4.329,98**
Total Acumulado en actas							**4.329,98**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Juan Esteban A.

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Juan Esteban Acevedo

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026

URBANISMO ZONA SUR

Capítulo	OE	OBRAS EXTRAS	**ACTA**	6
Sub-Capitulo			**UNIDAD DE MEDIDA**	m2
Ítem:	OE-016	Suministro, transporte, colocación y fijación de plástico negro calibre 3.5 para la protección provisional de taludes, con el fin de prevenir el deterioro de la estabilidad del terreno. Incluye extendido del plástico conforme a la geometría del terreno, traslapos necesarios, fijación mediante estacas en madera y alambre. No incluye reposición o cambio del plástico por deterioro posteior a su instalación.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**2.500**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							**192,00**
Protección de taludes en excavacion muros teatrino	m2	40,00		4,80			192,00
Total							**192,00**
Total Acumulado en actas							**192,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

Juan Esteban A.

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Juan Esteban Acevedo

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL

Capítulo	3.2.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.2.2	LLENOS	UNIDAD DE MEDIDA	m3
Item:	3.2.2.1	LLENOS NO ESTRUCTURALES CON SUBBASE SIN PROCESAR, COMPACTADA MECANICAMENTE ENTRE 0-2 M	CANTIDADCONTRACTUAL	1

Área/Lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 2							**1355,17**
ACTA 3							**244,18**
ACTA 5							**-1599,35**
ACTA 6							**38,97**
Pasarela Cultural 2 - 3							
Patio CLT 2-3	m3	15,75	10,25	0,30			48,43
Viga Cimentacion CLT Eje 1 A-B	m3	4,41	1,00	0,30	-1,00		-1,32
Viga Cimentacion CLT Eje 1 B-C	m3	4,47	1,00	0,30	-1,00		-1,34
Viga Cimentacion CLT Eje 1 C-D	m3	4,43	1,00	0,30	-1,00		-1,33
Viga Cimentacion CLT Eje 2 A-B	m3	3,47	1,00	0,30	-1,00		-1,04
Viga Cimentacion CLT Eje 2 B-C	m3	3,47	1,00	0,30	-1,00		-1,04
Viga Cimentacion CLT Eje 2 C-D	m3	3,47	1,00	0,30	-1,00		-1,04
Viga Transversal Eje A	m3	0,50	1,00	0,30	-1,00		-0,15
Viga Transversal Eje B	m3	2,29	1,00	0,30	-1,00		-0,69
Viga Transversal Eje C	m3	2,29	1,00	0,30	-1,00		-0,69
Viga Transversal Eje D	m3	0,50	1,00	0,30	-1,00		-0,15
Dados Ubicados en el Eje 1	m3	1,50	1,50	0,30	-1,00		-0,68
						Total	**38,97**
						Total Acumulado en actas	**38,97**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PUE-PCLT-PLATA NIVEL 1





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez


Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.3.1	MÓDULO 1	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.3.1.2	ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.3.1.2.2	Construcción de LOSA DE CONTRAPISO en concreto Premezclado de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	231

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							244,99
Cultural Modulo 1							
Placa Contrapiso	m2	24,83	10,25				254,51
Descuento Area de Pedestales							
Pedestal 40 x 70	m2	0,40	0,70		-1,00		-0,28
Pedestal 40 x 70	m2	0,40	0,70		-1,00		-0,28
Pedestal 1.10 x 1.10	m2	1,10	1,10		-1,00		-1,21
Pedestal 1.10 x 1.10	m2	1,10	1,10		-1,00		-1,21
Pedestal 60 x 70	m2	0,60	1,00		-1,00		-0,60
Pedestal 60 x 70	m2	0,60	1,00		-1,00		-0,60
Pedestal 60 x 1.0	m2	0,60	1,00		-1,00		-0,60
Pedestal 60 x 1.0	m2	0,60	1,00		-1,00		-0,60
Pedestal 60 x 1.0	m2	0,60	1,00		-1,00		-0,60
Pedestal 60 x 1.0	m2	0,60	1,00		-1,00		-0,60
Pedestal 1.15 x 1.5	m2	1,15	1,50		-1,00		-1,73
Pedestal 1.10 x 1.10	m2	1,10	1,10		-1,00		-1,21

REGISTRO FOTOGRÁFICO

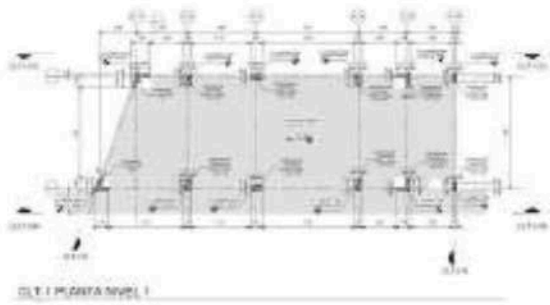

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.3.1	MÓDULO 1	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.3.1.2	ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.3.1.2.2	Construcción de LOSA DE CONTRAPISO en concreto Premezclado de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	231

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total	
Total							**244,99**	
Total Acumulado en actas							**244,99**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez


Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.3.2	MÓDULO 2	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.3.2.2	ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.3.2.2.2	Construcción de LOSA DE CONTRAPISO en concreto Premezclado de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	268

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							270,50
Cultural Modulo 2							
Placa Contrapiso	m2	27,11	10,25				277,88
Descuento Area de Pedestales							
Pedestal 40x40	m2	0,40	0,40		-1,00		-0,16
Pedestal 2.6 x 35	m2	2,60	0,35		-2,00		-1,82
Pedestal 1.10x1.10	m2	1,10	1,10		-1,00		-1,21
Pedestal 40 x 70	m2	0,40	0,70		-1,00		-0,28
Pedestal 50 x 90	m2	0,50	0,90		-2,00		-0,90
Pedestal 60 x 70	m2	0,60	0,70		-6,00		-2,52
Pedestal 70 x 70	m2	0,70	0,70		-1,00		-0,49

REGISTRO FOTOGRÁFICO

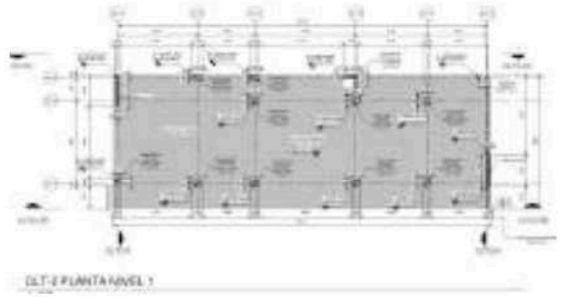


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.3.2	MÓDULO 2	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.3.2.2	ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.3.2.2.2	Construcción de LOSA DE CONTRAPISO en concreto Premezclado de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	268

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h	Cant	Vol.	Total
Total							270,50
Total Acumulado en actas							270,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL

Capítulo	3.3.3	MÓDULO 3	**ACTA**	6
Sub-Capítulo	3.3.3.1	FUNDACIONES	**UNIDAD DE MEDIDA**	m3
Ítem:	3.3.3.1.2	Construcción de PEDESTALES en concreto PREMEZCLADO de 28 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**4**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 4							**3,80**
ACTA 6							**0,84**
Pedestales Puente Pas CLT 2-3	m3	0,50	0,50	0,42	8,00		0,84
Total							**0,84**
Total Acumulado en actas							**4,64**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA Pedro Sánchez


Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026


EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.3.3	MÓDULO 3	ACTA	6
Sub-Capítulo	3.3.3.2	ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.3.3.2.2	Construcción de LOSA DE CONTRAPISO en concreto Premezclado de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	350

Área/Lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							333,91
Cultural Modulo 3							
Placa Contra piso	m2	33,80	10,23				345,77
Descuento Area de Pedestales							
Pedestal 1.10x1.10	m2	1,10	1,10		-2,00		-2,42
Pedestal 0.6 x 1.00	m2	0,60	1,00		-1,00		-0,60
Pedestal 1.10x1.10	m2	1,10	1,10		-2,00		-2,42
Pedestal 0.6 x 1.00	m2	0,60	1,00		-4,00		-2,40
Pedestal 90 x 90	m2	0,90	0,90		-2,00		-1,62
Pedestal 60 x 70	m2	0,60	0,70		-2,00		-0,84
Pedestal 70 x 70	m2	0,70	0,70		-1,00		-0,49
Pedestal 40 x 40	m2	0,40	0,40		-1,00		-0,16
Pedestal 2.6 x 35	m2	2,60	0,35		-1,00		-0,91

REGISTRO FOTOGRÁFICO

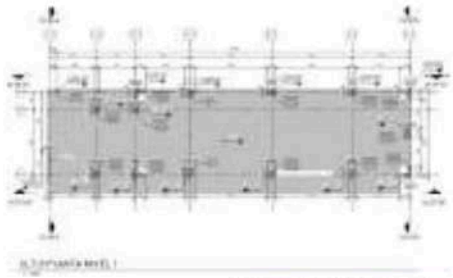






Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.3.3	MÓDULO 3	ACTA	6
Sub-Capítulo	3.3.3.2	ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.3.3.2.2	Construcción de LOSA DE CONTRAPISO en concreto Premezclado de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	CANTIDAD CONTRACTUAL	350

Área/Lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total	
Total							**333,91**	
Total Acumulado en actas							**333,91**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL

Capítulo	3.5.0	MAMPOSTERIA	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	3.5.1	MURO EN BLOQUE	**UNIDAD DE MEDIDA**	m2
Ítem:	3.5.1.1	Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 10x20x40 cm. ESPESOR DE 10. resistencia 8 Mpa 3P NO ESTRUCTURAL. Para alturas hasta 3.50m. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena) espesor max=0.01 m, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34).	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**360**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							**56,54**
Módulo 3							
Muro Eje 18 Dovelas 22	m2	8,78		4,40			38,63
Machón Baño PMR Eje 18 Dov 2	m2	0,85		4,40			3,74
Machón Baño PMR Eje 18 Dov 3	m2	0,85		4,40			3,74
Machón Local Comercial Eje 13 Dov 4	m2	1,66		4,40			7,30
Machón Local Comercial Eje 13 Dov 3	m2	0,71		4,40			3,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL

Capítulo	3.5.0	MAMPOSTERIA	**ACTA**	6
Sub-Capitulo	3.5.1	MURO EN BLOQUE	**UNIDAD DE MEDIDA**	m2
Ítem:	3.5.1.1	Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 10x20x40 cm. ESPESOR DE 10. resistencia 8 Mpa 3P NO ESTRUCTURAL. Para alturas hasta 3.50m. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena) espesor max=0.01 m, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34).	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**360**

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total	
Total							**56,54**	
Total Acumulado en actas							**56,54**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026


EDIFICIO CULTURAL

Capítulo	3.5.0	MAMPOSTERIA	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.5.1	MURO EN BLOQUE	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.5.1.2	Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. ESPESOR DE 15. resistencia 8 Mpa 3P NO ESTRUCTURAL. Para alturas hasta 3.50m. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena) espesor max=0.01 m, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34).	CANTIDAD CONTRACTUAL	891

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							87,96
Módulo 3							
Muro Eje A Local Comercial Dovelas 10	m2	4,0		4,40			17,60
Muro Eje 14 Local Comercial Dovelas 13	m2	5,75		4,40			25,30
Muro Eje 15 Local Comercial Dovelas 8	m2	3,35		4,40			14,74
Muro Eje B'' Local Comercial Dovelas 8	m2	4,30		4,40			18,92
Machón Buitrón Comercial Dovelas 2	m2	0,55		4,40			2,42
Machón Buitrón Comercial Dovelas 2	m2	0,70		4,40			3,08
Machón Buitrón Comercial Dovelas 0	m2	1,34		4,40			5,90

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra


FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL

Capítulo	3.5.0	MAMPOSTERIA	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.5.1	MURO EN BLOQUE	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.5.1.2	Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. ESPESOR DE 15. resistencia 8 Mpa 3P NO ESTRUCTURAL. Para alturas hasta 3.50m. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena) espesor max=0.01 m, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34).	CANTIDAD CONTRACTUAL	891

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total	
Total							**87,96**	
Total Acumulado en actas							**87,96**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez


Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona


Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.5.0	MAMPOSTERIA	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.5.1	MURO EN BLOQUE	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.5.1.3	Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 20x20x40 cm. ESPESOR DE 20. resistencia 10 Mpa. Incluye el suministro y transporte del bloque, mortero de pega 1:5 espesor max=0.01 m, trabas, remates de enrases. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34).	CANTIDAD CONTRACTUAL	2

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							12,98
Módulo 3							
Muro Baños 5	m2	2,63		2,40			6,31
Muro Baños 6	m2	2,78		2,40			6,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.5.0	MAMPOSTERIA	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.5.1	MURO EN BLOQUE	UNIDAD DE MEDIDA	m2
Ítem:	3.5.1.3	Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 20x20x40 cm. ESPESOR DE 20. resistencia 10 Mpa. Incluye el suministro y transporte del bloque, mortero de pega 1:5 espesor max=0.01 m, trabas, remates de enrases. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34).	CANTIDAD CONTRACTUAL	2

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
Total							**12,98**
Total Acumulado en actas							**12,98**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera

"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Memorias de revisión cantidades de obra

FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL

Capítulo	3.11.0	REDES ELÉCTRICAS	ACTA	6
Sub-Capítulo	3.11.1	REDES ELÉCTRICAS (AGUAS ABAJO DEL MEDIDOR)	UNIDAD DE MEDIDA	un
Ítem	3.11.1.13	Sti. de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 15 - 50 Amp, tipo SWD, ICC=10 KA,120/240V no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.	CANTIDAD CONTRACTUAL	46

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							1,00
Tablero oficinas para cámaras de monitoreo	un				1,00		1,00
Total							**1,00**
Total Acumulado en actas							**1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026


EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.12.0	REDES HIDROSANITARIAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.12.1	INTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS	UNIDAD DE MEDIDA	un
Ítem:	3.12.1.7	Suministro, transporte e instalación de válvula de Válvula de bola H2OFF 1/2" - soldada. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	CANTIDAD CONTRACTUAL	15


Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							11,00
Edificio Cultural- Modulo 3 entre ejes 17 y 19	un				5,00		5,00
Edificio Cultural- Modulo 3 entre ejes 13 y 15	un				3,00		3,00
Edificio Cultural- Modulo 2	un				3,00		3,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.12.0	REDES HIDROSANITARIAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.12.1	INTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS	UNIDAD DE MEDIDA	un
Ítem:	3.12.1.7	Suministro, transporte e instalación de válvula de Válvula de bola H2OFF 1/2" - soldada. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	CANTIDAD CONTRACTUAL	15

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
Total							**11,00**
Total Acumulado en actas							**11,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.12.0	REDES HIDROSANITARIAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.12.1	INTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS	UNIDAD DE MEDIDA	un
Ítem:	3.12.1.9	Suministro, transporte e instalación de Válvula de bola H2OFF 1 1/2" - soldada. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	CANTIDAD CONTRACTUAL	7

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							5,00
Edificio Cultural - Módulo 3. Entre ejes 17 y 19	un				4,00		4,00
Edificio Cultural - Módulo 3. Entre ejes 13 y 15	un				1,00		1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.12.0	REDES HIDROSANITARIAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.12.1	INTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS	UNIDAD DE MEDIDA	un
Ítem:	3.12.1.9	Suministro, transporte e instalación de Válvula de bola H2OFF 1 1/2" - soldada. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	CANTIDAD CONTRACTUAL	7

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
Total							**5,00**
Total Acumulado en actas							**5,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez


Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	**Memorias de revisión cantidades de obra**	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.12.0	REDES HIDROSANITARIAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.12.1	INTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS	UNIDAD DE MEDIDA	un
Ítem:	3.12.1.11	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1 1/2"con tuberia RDE 21, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	CANTIDAD CONTRACTUAL	8

Área/Lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 6							12,00
Edificio Cultural Módulo 3. Entre ejes 17 y 19	un				10,00		10,00
Edificio Cultural Módulo 3. Entre ejes 13 y 15	un				2,00		2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL				
Capítulo	3.12.0	REDES HIDROSANITARIAS	ACTA	6
Sub-Capitulo	3.12.1	INTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS	UNIDAD DE MEDIDA	un
Ítem:	3.12.1.11	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1 1/2"con tuberia RDE 21, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	CANTIDAD CONTRACTUAL	8

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total	
Total							**12,00**	
Total Acumulado en actas							**12,00**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Pedro Sánchez

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona

Consorcio Parque Primavera	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"	Memorias de revisión cantidades de obra	
		FECHA DE CORTE	25/03/2026

EDIFICIO CULTURAL

Capítulo	3.12.0	REDES HIDROSANITARIAS	**ACTA**	6
Sub-Capítulo	3.12.2	INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS INTERNAS	**UNIDAD DE MEDIDA**	m
Ítem:	3.12.2.4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 2" para REVENTILACIONES verticales y horizontales (bajantes y colectores), incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo los accesorios reducidos y fijaciones que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	66

Área/lugar/elemento	Und.	long. (m)	Ancho (m)	Alt (h)	Cant	Vol.	Total
ACTA 3							**20,40**
ACTA 6							**11,80**
Módulo 3 - Entre ejes 13-14-15	m	3,90			2,00		7,80
Módulo 2 - Entre ejes 10-11-12	m	4,00					4,00
Total							**11,80**
Total Acumulado en actas							**32,20**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA
Diego Díaz Díaz

Vo.Bo. CONSORCIO TRACON 77
Juan Diego Cardona
