CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

OFICIO REMISORIO

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

Bogotá D. C. 02 de MARZO 2026

SEÑORES
INTERVENTORÍA
CONSORCIO AEROPUERTO SB
LOTE 2 - AEROPUERTO PITALITO, FLORENCIA Y PUERTO ASIS
Bogotá D.C.

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN CONTRATO NO. 24001291 H4 - Lote 2

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2".

ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA PARCIAL #9 NOVIEMBRE 2025

Respetada interventoría,

Mediante la presente me permito enviar los formatos requeridos para el acta No. 9 del Consorcio Alfa de acuerdo con:

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN.				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR	X			
FACTURA ELECTRÓNICA SE ENVÍA A SIIF NACIÓN CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	X			FACTURA 072
ACTA RESUMEN PARCIAL	X			
LIQUIDACIÓN IVA	X			
ACTA EXCEL PRESUPUESTO DE COSTOS	X			
CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X			
CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA POR INTERVENTORÍA EN OBRA		X		Para emisión de interventoría
CERTIFICACIÓN DEL USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORÍA EN OBRA		X		Para emisión de interventoría

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

CERTIFICACIÓN DE LOS APORTES A PARAFISCALES X LA INTERVENTORÍA EN OBRA		X		Para emisión de interventoría
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CUENTAS DE OBRA CON FOTOCOPIAS DE CEDULA, TARJETA PROFESIONAL, CERTIFICACIÓN DE JUNTA DE CONTADORES DE REVISOR FISCAL O CONTADOR, SI LO EXPIDE ALGUNO DE ESTOS PROFESIONALES	X			
FOTOCOPIAS DE LAS PLANILLAS DE PAGOS PARAFISCALES DEL PERIODO FACTURADO	X			
CERTIFICACIÓN BANCARIA	X			
CERTIFICACIÓN RUT DIAN	X			
CERTIFICACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD CUANDO HAY ANTICIPO	X			
DOCUMENTOS DE ACUERDO A LO QUE DICE EL CONTRATO				
ANEXO MEMORIAS O INFORMES SEGÚN EL CASO AL FINAL DE LOS DOCUMENTOS O PDF APARTE.	X			Anexo de memorias en PDF aparte
PARA LA PRIMERA Y ULTIMA CUENTA (ACTA DE RECIBO FINAL) ANEXAR CONTRATO, ACTA DE INICIO, CDP, RP, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES QUE SE PRESENTEN EN EL CONTRATO			X	
SI ES ACTA DE RECIBO FINAL SE REQUIERE ANEXAR EL FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL CON APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y PÓLIZAS ACTUALIZADAS.			X	
INFORME MENSUAL Y SUS ANEXOS (BITÁCORA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, ESTADO DE AVANCE DE OBRA, INFORME SEMANAL, PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS, ETC.	X			
PARA LA PRIMERA CUENTA: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANTENIMIENTO APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN			X	

Se presenta el siguiente link para acceso a la información:

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

- Documentos Acta de cobro parcial #9
https://drive.google.com/drive/folders/1K3c65cwN2zmkMgXS0JDXJou5Aszyh8MA?usp=drive_link

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente.

OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ALFA

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

FACTURA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09





CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0
CL 151 18 A 34 OF 406
Tel: 5498600
Bogotá - Colombia
viasycanales@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVCA 72

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 4251000
Dirección	Avenida El Dorado # 103 - 15 - Bogotá D.C.	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 11:08
Expedición	08/05/2026, 11:37
Vencimiento	23/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 9 AEROPUERTOS :DEL01 DE NOV DEL 2025 AL 30 DE NOV 2025, CUYO OBJETO ESREALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITOHUILA, IBAGUE TOLIMA , PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLOREMCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 2	1.00	29,131,305.00	29,131,305.00
2	ADMINISTRACION 25%	1.00	7,282,826.00	7,282,826.00
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	582,626.00	582,626.00
4	UTILIDAD 2%	1.00	582,626.00	693,324.94
5	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	1.00	18,040,400.00	18,040,400.00

Total items: 5

Valor en Letras: Treinta y seis millones setecientos ochenta y dos mil ciento diecisiete pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Total Bruto	55,619,783.00
IVA 19%	110,698.94
Copago / Anticipo	18,948,364.00
Total a Pagar	36,782,117.94

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 36,782,117.94

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092469033 aprobado en 20250427 prefijo FVCA desde el número 51 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 2090d2bf56ad9f9c49b2d2c68d5aca7de629db5a7401097b87f2d00fcbebab06fffcfe33e06f1741f8721cb03bd6f2e5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

ACTA RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: 24001291 H4 LOTE 2** **OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2** **AEROPUERTO: PITATALITO, FLORENCIA Y PUERTO ASIS.** **PLAZO INICIAL: 20 MESES SIN EXCEDER 31 JULIO DE 2026** **FECHA DE INICIACIÓN:** 23/01/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/07/2026 **PLAZO FINAL: 20 MESES SIN EXCEDER 31 JULIO DE 2026**	**VALOR INICIAL:** **$ 6.788.000.000,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 6.788.000.000,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09** **CONTRATISTA: CONSORCIO ALFA** **INTERVENTOR: CONSORCIO AEROPUERTOS SB** **SUPERVISOR: JUANITA VILLAMIZAR DURAN**

El día 30 de Noviembre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en los Aeropuertos Pitalito, Florencia y puerto Asís, el Ingeniero GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI, en representación del contratista CONSORCIO ALFA y el ingeniero PAOLO MAFIOLI PUCHE , en representación de la Interventoría CONSORCIO AEROPUERTOS SB, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		$ 6.788.000.000,00
2.Valor modificación No.1		$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 6.788.000.000,00
4. Valor pagado del anticipo %	20,15%	$ 1.367.860.723,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 5.420.139.277,00
6. Valor presente acta		$ 55.730.481,94
7. Valor amortizado en la presente acta	34,00%	$ 18.948.364,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7-7.1)		$ 36.782.117,94
8.1. Acumulado Valor retenido por informacion laboral pendiente		$ 26.878.464,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 751.074.602,38
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ 400.763.702,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 2.155.717.443,32
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 4.632.282.556,68
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		$ 948.148.657,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**18,19%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	Mantenimiento	36.782.117,94
TOTAL			36.782.117,94
AMORTIZACIÓN			
	C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	Mantenimiento	18.948.364,00

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI
CONSORCIO ALFA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
CONSORCIO AEROPUERTOS SB
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORÍA

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

LIQUIDACIÓN IVA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

TIPO DE ACTA PARCIAL: ACTA PARCIAL No. 09

CONTRATO No. 24001291 H4 LOTE 2

CONTRATISTA: CONSORCIO ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO AEROPUERTOS SB

SUPERVISOR: JUANITA VILLAMIZAR DURAN

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 6.788.000.000,00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		29,00%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$ 6.788.000.000,00	$ 29.131.305,00	$ 5.262.015.504	$ (5.232.884.199)
UTILIDAD (Costo Directo x 2% estimado Utilidad)		$ 582.626,00	$ 263.100.775,00	$ (262.518.149)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 110.698,94	$ 49.989.147,00	$ (49.878.448)
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		$ -		
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		$ -		
TOTAL IVA		$ 110.698,94	49.989.147,00	$ (49.878.448)

GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI
CONSORCIO ALFA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
CONSORCIO AEROPUERTOS SB
DIRECTOR DE OBRA
INTEVENTORÍA

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

ACTA EXCEL COSTOS DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 09

				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				DEL 01-11-2025 AL 30-11-2025	2/03/2026
CONTRATO:	24001291 H4 LOTE 2	OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALFA	R/L:	GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	R/L:	PAOLO MAFIOLI PUCHE	23/01/2025	31/07/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No.9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 6.788.000.000,00	$ 6.486.063.749,00	$ 1.178.716.769,38	$ 55.730.481,94	$ 1.234.447.252,32	$ 5.553.552.747,68	81,81%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE CONTADOR PITALITO																
17	**LOCALIZACIÓN**				**$ 85.415.000,00**		**85.415.000**		**76.873.500**		**-**		**76.873.500**		**8.541.500**	
17.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	55.000	$ 1.553,00	$ 85.415.000,00	55.000,00	$ 85.415.000,00	49.500,00	$ 76.873.500,00		$ -	49.500,00	$ 76.873.500,00	5.500,00	$ 8.541.500,00	10,00%
18	**ROCERÍA**				**$ 343.180.000,00**		**343.180.000**		**85.600.000**		**-**		**85.600.000,00**		**$ 257.580.000,00**	
18.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN.)	M2	2.430.000	$ 106,00	$ 257.580.000,00	2.430.000,00	$ 257.580.000,00	0,00	$ -			-	$ -	2.430.000,00	$ 257.580.000,00	100,00%
18.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	800.000	$ 107,00	$ 85.600.000,00	800.000,00	$ 85.600.000,00	800.000,00	$ 85.600.000,00		$ -	800.000,00	$ 85.600.000,00	-	$ -	0,00%
19	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 335.788.550,00**		**335.788.550**		**185.171.104**		**26.218.576**		**211.389.680**		**$ 124.398.870,00**	
19.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	8.400	$ 26.672,00	$ 224.044.800,00	8.400,00	$ 224.044.800,00	6.929,09	$ 184.812.688,00	983,00	$ 26.218.576,00	7.912,09	$ 211.031.264,00	487,91	$ 13.013.536,00	5,81%
19.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	100	$ 59.736,00	$ 5.973.600,00	100,00	$ 5.973.600,00	6,00	$ 358.416,00		$ -	6,00	$ 358.416,00	94,00	$ 5.615.184,00	94,00%
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	25	$ 2.949.186,00	$ 73.729.650,00	25,00	$ 73.729.650,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 73.729.650,00	100,00%
19.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL	M2	500	$ 64.081,00	$ 32.040.500,00	500,00	$ 32.040.500,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	500,00	$ 32.040.500,00	100,00%
20	**PAVIMENTOS**				**$ 983.690.943,00**		**983.690.943**		**3.515.369**		**-**		**3.515.369**		**$ 980.175.574,00**	
20.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	860	$ 83.575,00	$ 71.874.500,00	860,00	$ 71.874.500,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	860,00	$ 71.874.500,00	100,00%
20.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	250	$ 5.447,00	$ 1.361.750,00	250,00	$ 1.361.750,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	250,00	$ 1.361.750,00	100,00%
20.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	500	$ 3.672,00	$ 1.836.000,00	500,00	$ 1.836.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	500,00	$ 1.836.000,00	100,00%
20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	500	$ 1.504.622,00	$ 752.311.000,00	500,00	$ 752.311.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	500,00	$ 752.311.000,00	100,00%
20.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	3	$ 6.060.981,00	$ 18.182.943,00	3,00	$ 18.182.943,00	0,58	$ 3.515.369,00		$ -	0,58	$ 3.515.369,00	2,42	$ 14.667.574,00	80,67%
20.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.000	$ 7.169,00	$ 7.169.000,00	1.000,00	$ 7.169.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.000,00	$ 7.169.000,00	100,00%
20.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20	$ 975.164,00	$ 19.503.280,00	20,00	$ 19.503.280,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 19.503.280,00	100,00%
20.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10	$ 1.174.386,00	$ 11.743.860,00	10,00	$ 11.743.860,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 11.743.860,00	100,00%
20.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10	$ 1.397.452,00	$ 13.974.520,00	10,00	$ 13.974.520,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 13.974.520,00	100,00%
20.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	360	$ 147.622,00	$ 53.143.920,00	360,00	$ 53.143.920,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	360,00	$ 53.143.920,00	100,00%
20.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	2.670	$ 3.791,00	$ 10.121.970,00	2.670,00	$ 10.121.970,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2.670,00	$ 10.121.970,00	100,00%
20.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	600	$ 37.447,00	$ 22.468.200,00	600,00	$ 22.468.200,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	600,00	$ 22.468.200,00	100,00%
21	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**				**$ 107.918.550,00**		**107.918.550**		**-**		**-**		**-**		**$ 107.918.550,00**	
21.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	7.000	$ 8.691,00	$ 60.837.000,00	7.000,00	$ 60.837.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	7.000,00	$ 60.837.000,00	100,00%
21.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	800	$ 58.309,00	$ 46.647.200,00	800,00	$ 46.647.200,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	800,00	$ 46.647.200,00	100,00%
21.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	10	$ 43.435,00	$ 434.350,00	10,00	$ 434.350,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 434.350,00	100,00%
22	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**				**$ 77.832.000,00**		**77.832.000**		**75.770.160**		**-**		**75.770.160**		**$ 2.061.840,00**	
22.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	2.000	$ 31.656,00	$ 63.312.000,00	2.000,00	$ 63.312.000,00	2.000,00	$ 63.312.000,00		$ -	2.000,00	$ 63.312.000,00	-	$ -	0,00%
22.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	40.000	$ 363,00	$ 14.520.000,00	40.000,00	$ 14.520.000,00	34.320,00	$ 12.458.160,00		$ -	34.320,00	$ 12.458.160,00	5.680,00	$ 2.061.840,00	14,20%
23	**CERRAMIENTO**				**$ 59.536.520,00**		**59.536.520**		**5.154.708**		**-**		**5.154.708**		**$ 54.381.812,00**	
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	200	$ 90.704,00	$ 18.140.800,00	200,00	$ 18.140.800,00	56,83	$ 5.154.708,00		$ -	56,83	$ 5.154.708,00	143,17	$ 12.986.092,00	71,59%
23.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10	$ 26.565,00	$ 265.650,00	10,00	$ 265.650,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 265.650,00	100,00%
23.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0.20 M. LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	10	$ 742.982,00	$ 7.429.820,00	10,00	$ 7.429.820,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 7.429.820,00	100,00%
23.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO , INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS	ML	50	$ 565.363,00	$ 28.268.150,00	50,00	$ 28.268.150,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 28.268.150,00	100,00%
23.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	ML	300	$ 18.107,00	$ 5.432.100,00	300,00	$ 5.432.100,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	300,00	$ 5.432.100,00	100,00%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE TRES DE MAYO PUERTO ASIS																
24	**LOCALIZACIÓN**				**$ 66.779.000,00**		**66.779.000**		**60.101.100**		**-**		**60.101.100**		**$ 6.677.900,00**	
24.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	43.000	$ 1.553,00	$ 66.779.000,00	43.000,00	$ 66.779.000,00	38.700,00	$ 60.101.100,00		$ -	38.700,00	$ 60.101.100,00	4.300,00	$ 6.677.900,00	10,00%
25	**ROCERÍA**				**$ 214.620.000,00**		**214.620.000**		**53.500.000**		**-**		**53.500.000**		**$ 161.120.000,00**	
25.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).	M2	1.520.000	$ 106,00	$ 161.120.000,00	1.520.000,00	$ 161.120.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.520.000,00	$ 161.120.000,00	100,00%
25.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	500.000	$ 107,00	$ 53.500.000,00	500.000,00	$ 53.500.000,00	500.000,00	$ 53.500.000,00		$ -	500.000,00	$ 53.500.000,00	-	$ -	0,00%
26	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 325.119.750,00**		**325.119.750**		**83.853.437**		**179.208**		**84.032.645**		**$ 241.087.105,00**	
26.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	8.000	$ 26.672,00	$ 213.376.000,00	8.000,00	$ 213.376.000,00	3.112,52	$ 83.017.133,00		$ -	3.112,52	$ 83.017.133,00	4.887,48	$ 130.358.867,00	61,09%
26.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	100	$ 59.736,00	$ 5.973.600,00	100,00	$ 5.973.600,00	14,00	$ 836.304,00	3,00	$ 179.208,00	17,00	$ 1.015.512,00	83,00	$ 4.958.088,00	83,00%
26.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	25	$ 2.949.186,00	$ 73.729.650,00	25,00	$ 73.729.650,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 73.729.650,00	100,00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

26.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) + SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL	M2	500	$	64.081,00	$	32.040.500,00	500,00	$	32.040.500,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	500,00	$	32.040.500,00	100,00%
27	**PAVIMENTOS**					**$**	**1.142.731.802,00**			**1.142.731.802**			**-**			**-**		**-**		**$**	**1.142.731.802,00**	
27.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	950	$	83.575,00	$	79.396.250,00	950,00	$	79.396.250,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	950,00	$	79.396.250,00	100,00%
27.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	250	$	5.447,00	$	1.361.750,00	250,00	$	1.361.750,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	250,00	$	1.361.750,00	100,00%
27.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	500	$	3.672,00	$	1.836.000,00	500,00	$	1.836.000,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	500,00	$	1.836.000,00	100,00%
27.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	580	$	1.504.622,00	$	872.680.760,00	580,00	$	872.680.760,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	580,00	$	872.680.760,00	100,00%
27.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	3	$	6.060.981,00	$	18.182.943,00	3,00	$	18.182.943,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	3,00	$	18.182.943,00	100,00%
27.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.918	$	7.169,00	$	13.748.079,00	1.917,71	$	13.748.079,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	1.917,71	$	13.748.079,00	100,00%
27.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20	$	975.164,00	$	19.503.280,00	20,00	$	19.503.280,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	20,00	$	19.503.280,00	100,00%
27.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10	$	1.174.386,00	$	11.743.860,00	10,00	$	11.743.860,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	10,00	$	11.743.860,00	100,00%
27.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	20	$	1.397.452,00	$	27.949.040,00	20,00	$	27.949.040,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	20,00	$	27.949.040,00	100,00%
27.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	370	$	147.622,00	$	54.620.140,00	370,00	$	54.620.140,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	370,00	$	54.620.140,00	100,00%
27.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.100	$	3.791,00	$	11.752.100,00	3.100,00	$	11.752.100,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	3.100,00	$	11.752.100,00	100,00%
27.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	800	$	37.447,00	$	29.957.600,00	800,00	$	29.957.600,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	800,00	$	29.957.600,00	100,00%
28	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**					**$**	**121.354.175,00**			**121.354.175**			**-**			**-**		**-**		**$**	**121.354.175,00**	
28.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	7.900	$	8.691,00	$	68.658.900,00	7.900,00	$	68.658.900,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	7.900,00	$	68.658.900,00	100,00%
28.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	900	$	58.309,00	$	52.478.100,00	900,00	$	52.478.100,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	900,00	$	52.478.100,00	100,00%
28.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	5	$	43.435,00	$	217.175,00	5,00	$	217.175,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	5,00	$	217.175,00	100,00%
29	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**					**$**	**78.195.000,00**			**78.195.000**			**77.251.200**			**-**		**77.251.200**		**$**	**943.800,00**	
29.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	2.000	$	31.656,00	$	63.312.000,00	2.000,00	$	63.312.000,00	2.000,00	$	63.312.000,00		$	-	2.000,00	$	63.312.000,00	-	$	-	0,00%
29.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	41.000	$	363,00	$	14.883.000,00	41.000,00	$	14.883.000,00	38.400,00	$	13.939.200,00		$	-	38.400,00	$	13.939.200,00	2.600,00	$	943.800,00	6,34%
30	**CERRAMIENTO**					**$**	**59.536.520,00**			**59.536.520**			**8.939.786**			**-**		**8.939.786**		**$**	**50.596.734,00**	
30.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	200	$	90.704,00	$	18.140.800,00	200,00	$	18.140.800,00	98,56	$	8.939.786,00		$	-	98,56	$	8.939.786,00	101,44	$	9.201.014,00	50,72%
30.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10	$	26.565,00	$	265.650,00	10,00	$	265.650,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	10,00	$	265.650,00	100,00%
30.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0.20 M. LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	10	$	742.982,00	$	7.429.820,00	10,00	$	7.429.820,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	10,00	$	7.429.820,00	100,00%
30.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO. TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO , INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS	ML	50	$	565.363,00	$	28.268.150,00	50,00	$	28.268.150,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	50,00	$	28.268.150,00	100,00%
30.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS.	ML	300	$	18.107,00	$	5.432.100,00	300,00	$	5.432.100,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	300,00	$	5.432.100,00	100,00%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES FLORENCIA																						
31	**LOCALIZACIÓN**					**$**	**111.816.000,00**			**111.816.000**			**100.634.400**		**$**	**11.181.600**		**111.816.000**		**$**	**-**	
31.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	72.000	$	1.553,00	$	111.816.000,00	72.000,00	$	111.816.000,00	64.800,00	$	100.634.400,00	7.200,00	$	11.181.600,00	72.000,00	$	111.816.000,00	-	$	-	0,00%
32	**ROCERÍA**					**$**	**229.500.000,00**			**229.500.000**			**57.780.000**			**-**		**57.780.000**		**$**	**171.720.000,00**	
32.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).	M2	1.620.000	$	106,00	$	171.720.000,00	1.620.000,00	$	171.720.000,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	1.620.000,00	$	171.720.000,00	100,00%
32.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	540.000	$	107,00	$	57.780.000,00	540.000,00	$	57.780.000,00	540.000,00	$	57.780.000,00		$	-	540.000,00	$	57.780.000,00	-	$	-	0,00%
33	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**					**$**	**559.876.920,00**			**559.876.920**			**151.787.196**			**-**		**151.787.196**		**$**	**408.089.724,00**	
33.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	11.690	$	26.764,00	$	312.871.160,00	11.690,00	$	312.871.160,00	5.649,00	$	151.189.836,00		$	-	5.649,00	$	151.189.836,00	6.041,00	$	161.681.324,00	51,68%
33.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	100	$	59.736,00	$	5.973.600,00	100,00	$	5.973.600,00	10,00	$	597.360,00		$	-	10,00	$	597.360,00	90,00	$	5.376.240,00	90,00%
33.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	60	$	2.949.186,00	$	176.951.160,00	60,00	$	176.951.160,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	60,00	$	176.951.160,00	100,00%
33.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) + SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL	M2	1.000	$	64.081,00	$	64.081.000,00	1.000,00	$	64.081.000,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	1.000,00	$	64.081.000,00	100,00%
34	**PAVIMENTOS**					**$**	**1.228.000.956,00**			**1.228.000.956**			**-**			**-**		**-**		**$**	**1.228.000.956,00**	
34.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	1.090	$	83.575,00	$	91.096.750,00	1.090,00	$	91.096.750,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	1.090,00	$	91.096.750,00	100,00%
34.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	250	$	5.447,00	$	1.361.750,00	250,00	$	1.361.750,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	250,00	$	1.361.750,00	100,00%
34.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	500	$	3.672,00	$	1.836.000,00	500,00	$	1.836.000,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	500,00	$	1.836.000,00	100,00%
34.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	640	$	1.504.622,00	$	962.958.080,00	640,00	$	962.958.080,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	640,00	$	962.958.080,00	100,00%
34.5	SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO TIPO MDF-19 O SIMILAR PARA PARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE ILUMINACIÓN, CORTE, IMPRIMACIÓN, DEMOLICIÓN Y RETIRO.	M3	3	$	6.060.982,00	$	18.182.946,00	3,00	$	18.182.946,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	3,00	$	18.182.946,00	100,00%
34.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.000	$	7.169,00	$	7.169.000,00	1.000,00	$	7.169.000,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	1.000,00	$	7.169.000,00	100,00%
34.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10	$	975.164,00	$	9.751.640,00	10,00	$	9.751.640,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	10,00	$	9.751.640,00	100,00%
34.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	5	$	1.174.386,00	$	5.871.930,00	5,00	$	5.871.930,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	5,00	$	5.871.930,00	100,00%
34.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	5	$	1.397.452,00	$	6.987.260,00	5,00	$	6.987.260,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	5,00	$	6.987.260,00	100,00%
34.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	450	$	147.622,00	$	66.429.900,00	450,00	$	66.429.900,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	450,00	$	66.429.900,00	100,00%
34.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	4.000	$	3.791,00	$	15.164.000,00	4.000,00	$	15.164.000,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	4.000,00	$	15.164.000,00	100,00%
34.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	1.100	$	37.447,00	$	41.191.700,00	1.100,00	$	41.191.700,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	1.100,00	$	41.191.700,00	100,00%
35	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**					**$**	**158.022.425,00**			**158.022.425**			**-**			**-**		**-**		**$**	**158.022.425,00**	
35.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	9.100	$	8.691,00	$	79.088.100,00	9.100,00	$	79.088.100,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	9.100,00	$	79.088.100,00	100,00%
35.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	1.350	$	58.309,00	$	78.717.150,00	1.350,00	$	78.717.150,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	1.350,00	$	78.717.150,00	100,00%
35.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	5	$	43.435,00	$	217.175,00	5,00	$	217.175,00	0,00	$	-		$	-	-	$	-	5,00	$	217.175,00	100,00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

36	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**				**$ 118.563.000,00**		**118.563.000**		**114.570.000**		**-**		**114.570.000**		**$ 3.993.000,00**	
36.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	3.000	$ 31.656,00	$ 94.968.000,00	3.000,00	$ 94.968.000,00	3.000,00	$ 94.968.000,00		$ -	3.000,00	$ 94.968.000,00	-	$ -	0,00%
36.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	65.000	$ 363,00	$ 23.595.000,00	65.000,00	$ 23.595.000,00	54.000,00	$ 19.602.000,00		$ -	54.000,00	$ 19.602.000,00	11.000,00	$ 3.993.000,00	16,92%
37	**CERRAMIENTO**				**$ 59.536.520,00**		**59.536.520**		**19.017.908**		**-**		**19.017.908**		**$ 40.518.612,00**	
37.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	200	$ 90.704,00	$ 18.140.800,00	200,00	$ 18.140.800,00	209,67	$ 19.017.908,00		$ -	209,67	$ 19.017.908,00	- 9,67	$ (877.108,00)	-4,84%
37.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10	$ 26.565,00	$ 265.650,00	10,00	$ 265.650,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 265.650,00	100,00%
37.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0.20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	10	$ 742.982,00	$ 7.429.820,00	10,00	$ 7.429.820,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 7.429.820,00	100,00%
37.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES-PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS...	ML	50	$ 565.363,00	$ 28.268.150,00	50,00	$ 28.268.150,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 28.268.150,00	100,00%
37.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	ML	300	$ 18.107,00	$ 5.432.100,00	300,00	$ 5.432.100,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	300,00	$ 5.432.100,00	100,00%
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO) + AIU				**$ 6.467.013.631,00**		**$ 6.467.013.631,00**		**$ 1.159.519.868,00**		**$ 37.579.383,00**		**$ 1.197.099.252,00**		**$ 5.269.914.379,00**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				**$ 6.467.013.631,00**		**$ 6.467.013.631,00**		**$ 1.159.519.868,00**		**$ 37.579.383,000**		**$ 1.197.099.252,000**		**$ 5.269.914.379,00**	
	ADMINISTRACIÓN			25%	$ 1.253.297.215,00		$ 1.253.297.215,00		$ 224.713.153,00		$ 7.282.826,00		$ 231.995.979,00		$ 1.021.301.236,00	
	IMPREVISTOS			2%	$ 100.263.777,00		$ 100.263.777,00		$ 17.977.052,00		$ 582.626,00		$ 18.559.678,00		$ 81.704.099,00	
	UTILIDAD			2%	$ 100.263.777,00		$ 100.263.777,00		$ 17.977.052,00		$ 582.626,00		$ 18.559.678,00		$ 81.704.099,00	
	VALOR TOTAL AIU			29%	$ 1.453.824.770,00		$ 1.453.824.770,00		$ 260.667.257,00		$ 8.448.078,00		$ 269.115.336,00		$ 1.184.709.434,00	
	IVA			19%	**$ 19.050.118,00**		$ 19.050.118,00		$ 3.415.640,38		$ 110.698,94		$ 3.526.339,32		$ 15.523.778,68	
	A. SUBTOTAL OBRAS + AIU + IVA Sobre la Utilidad				**$ 6.486.063.749,00**		**$ 6.486.063.749,00**		**$ 1.162.935.508,38**		**$ 37.690.081,94**		**$ 1.200.625.591,32**		**$ 5.285.438.157,68**	81,49%
38	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PITALITO**														**$ -**	
38.1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.**	**BMA**	**1**	**$ 100.645.417**	$ 100.645.417,00	1,00	$ 100.645.417,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 100.645.417,00	100,00%
39	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PUERTO ASÍS**														**$ -**	
39.1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.**	**BMA**	**1**	**$ 100.645.417**	$ 100.645.417,00	1,00	$ 100.645.417,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 100.645.417,00	100,00%
40	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO FLORENCIA**														**$ -**	
40,1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.**	**BMA**	**1**	**$ 100.645.417**	$ 100.645.417,00	1,00	$ 100.645.417,00	0,156800059232106	$ 15.781.261,00	0,179247108688516	$ 18.040.400,00	0,336047701009575	$ 33.821.661,00	0,663952298990425	$ 66.823.756,00	66,40%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 301.936.251,00**				**$ 15.781.261,00**		**$ 18.040.400,00**		**$ 33.821.661,00**		**$ 268.114.590,00**	88,80%
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (en caso de aplicar componente)			**N/A**												
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS			**N/A**												
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 6.788.000.000,00**	100,00%	**$ 6.788.000.000,00**	17,36%	**$ 1.178.716.769,38**	0,82%	**$ 55.730.481,94**	18,19%	**$ 1.234.447.252,32**		**$ 5.553.552.747,68**	81,81%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 6.788.000.000**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 6.788.000.000
VALOR DE ANTICIPO	20,15%	$ 1.367.860.723
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		$ 1.178.716.769
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 400.763.702
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		**$ 55.730.482**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	34,00%	$ 18.948.364
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		**$ 36.782.118**
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 1.234.447.252
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 419.712.066
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 5.580.431.212
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 948.148.657

VALOR TOTAL EN LETRAS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

NOMBRE: GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

NOMBRE: OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

NOMBRE: PAOLO MAFIOLI PUCHE
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

NOMBRE: JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

35.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	1.350	$ 58.309,00	$ 78.717.150,00	1.350,00	$ 78.717.150,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.350,00	$ 78.717.150,00	100,00%
35.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	5	$ 43.435,00	$ 217.175,00	5,00	$ 217.175,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 217.175,00	100,00%
36	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**				**$ 118.563.000,00**		**118.563.000**		**114.570.000**		**-**		**114.570.000**		**$ 3.993.000,00**	
36.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	3.000	$ 31.656,00	$ 94.968.000,00	3.000,00	$ 94.968.000,00	3.000,00	$ 94.968.000,00		$ -	3.000,00	$ 94.968.000,00	-	$ -	0,00%
36.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	65.000	$ 363,00	$ 23.595.000,00	65.000,00	$ 23.595.000,00	54.000,00	$ 19.602.000,00		$ -	54.000,00	$ 19.602.000,00	11.000,00	$ 3.993.000,00	16,92%
37	**CERRAMIENTO**				**$ 59.536.520,00**		**59.536.520**		**19.017.908**		**-**		**19.017.908**		**$ 40.518.612,00**	
37.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	200	$ 90.704,00	$ 18.140.800,00	200,00	$ 18.140.800,00	209,67	$ 19.017.908,00		$ -	209,67	$ 19.017.908,00	- 9,67	$ (877.108,00)	-4,84%
37.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10	$ 26.565,00	$ 265.650,00	10,00	$ 265.650,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 265.650,00	100,00%
37.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	10	$ 742.982,00	$ 7.429.820,00	10,00	$ 7.429.820,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 7.429.820,00	100,00%
37.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS	ML	50	$ 565.363,00	$ 28.268.150,00	50,00	$ 28.268.150,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 28.268.150,00	100,00%
37.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS.	ML	300	$ 18.107,00	$ 5.432.100,00	300,00	$ 5.432.100,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	300,00	$ 5.432.100,00	100,00%
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO) + AIU				**$ 6.467.013.631,00**		**$ 6.467.013.631,00**		**$ 1.159.519.868,00**		**$ 37.579.384,00**		**$ 1.197.099.252,00**		**$ 5.269.914.379,00**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				**$ 6.467.013.631,00**		**$ 6.467.013.631,00**		**$ 1.159.519.868,000**		**$ 37.579.384,000**		**$ 1.197.099.252,000**		**$ 5.269.914.379,00**	
	ADMINISTRACIÓN			25%	$ 1.253.297.215,00		$ 1.253.297.215,00		$ 224.713.153,00		$ 7.282.826,00		$ 231.995.979,00		$ 1.021.301.236,00	
	IMPREVISTOS			2%	$ 100.263.777,00		$ 100.263.777,00		$ 17.977.052,00		$ 582.626,00		$ 18.559.678,00		$ 81.704.099,00	
	UTILIDAD			2%	$ 100.263.777,00		$ 100.263.777,00		$ 17.977.052,00		$ 582.626,00		$ 18.559.678,00		$ 81.704.099,00	
	VALOR TOTAL AIU			29%	$ 1.453.824.770,00		$ 1.453.824.770,00		$ 260.667.257,00		$ 8.448.079,00		$ 269.115.336,00		$ 1.184.709.434,00	
	IVA			19%	**$ 19.050.118,00**		$ 19.050.118,00		$ 3.415.640,38		$ 110.698,94		$ 3.526.339,32		$ 15.523.778,68	
	A. SUBTOTAL OBRAS + AIU + IVA Sobre la Utilidad				**$ 6.486.063.749,00**		**$ 6.486.063.749,00**		**$ 1.162.935.508,38**		**$ 37.690.082,94**		**$ 1.200.625.591,32**		**$ 5.285.438.157,68**	81,49%
38	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PITALITO**														**$ -**	
38.1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.**	**BMA**	1	**$ 100.645.417**	$ 100.645.417,00	1,00	$ 100.645.417,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 100.645.417,00	100,00%
39	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PUERTO ASÍS**														**$ -**	
39.1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.**	**BMA**	1	**$ 100.645.417**	$ 100.645.417,00	1,00	$ 100.645.417,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 100.645.417,00	100,00%
40	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO FLORENCIA**														**$ -**	
40,1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.**	**BMA**	1	**$ 100.645.417**	$ 100.645.417,00	1,00	$ 100.645.417,00	0,156800059232106	$ 15.781.261,00	0,179247108688516	$ 18.040.400,00	0,336047701009575	$ 33.821.661,00	0,663952298990425	$ 66.823.756,00	66,40%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 301.936.251,00**				**$ 15.781.261,00**		**$ 18.040.400,00**		**$ 33.821.661,00**		**$ 268.114.590,00**	88,80%
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (en caso de aplicar componente)			**N/A**												
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS			**N/A**												
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 6.788.000.000,00**	100,00%	**$ 6.788.000.000,00**	17,36%	**$ 1.178.716.769,38**	0,82%	**$ 55.730.482,94**	18,19%	**$ 1.234.447.252,32**		**$ 5.553.552.747,68**	81,81%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 6.788.000.000**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 6.788.000.000
VALOR DE ANTICIPO	20,15%	$ 1.367.860.723
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		$ 1.178.716.769
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 400.763.702
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		**$ 55.730.483**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	34,00%	$ 18.948.364
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		**$ 36.782.119**
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 1.234.447.252
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 419.712.066
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 5.580.431.212
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 948.148.657

VALOR TOTAL EN LETRAS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

NOMBRE: GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI	**NOMBRE: OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA**	**NOMBRE: PAOLO MAFIOLI PUCHE**	**NOMBRE: JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA**
REPRESENTANTE LEGAL	**DIRECTOR DE OBRA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**	**INTERVENTOR**	**INTERVENTOR**

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE

Yo, **PAOLO MAFIOLI PUCHE**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.188.895 de Bogotá D.C., actuando en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO AEROPUERTOS SB, identificado con NIT 901.901.166-9, integrado por las sociedades SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (NIT 800.252.997-0) y BETMAF S.A.S. (NIT 900.224.669-3), conforme consta en el contrato de interventoría No. 24001325 H3 de 2024 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, por medio del presente confiero **poder especial, amplio y suficiente** al señor **JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.956.346, quien se desempeña como **Director del Consorcio AEROPUERTOS SB**, para que en mi nombre y representación adelante todas las actuaciones necesarias ante la AEROCIVIL, o ante cualquier entidad pública o privada, relacionadas con la ejecución del mencionado contrato.
Este poder le faculta, entre otras, para:

1. Representar al Consorcio en reuniones, diligencias, audiencias y demás actividades contractuales.
2. Firmar actas de inicio, actas parciales, actas de recibo, APU´S, tramite del anticipo de obra, comunicaciones contractuales y demás documentos requeridos para la ejecución del contrato.
3. Presentar informes, atender requerimientos de supervisión o interventoría, y realizar gestiones administrativas necesarias para la debida ejecución contractual.
4. Solicitar, tramitar y firmar documentación relacionada con pagos, certificaciones, informes y demás documentos contractuales o de soporte.

Este poder se otorga conforme a lo establecido en el contrato y bajo el marco normativo de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y complementarias de la contratación estatal en Colombia.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de marzo de 2025

PAOLO MAFIOLI PUCHE
Representante Legal
CONSORCIO AEROPUERTOS SB
C.C. No. 1.010.188.895 de Bogotá

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB
C.C No 79.956.346 DE Bogotá

NOTARIA 18 BOGOTA D.C.

44
843
J.A.M.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 35843

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría dieciocho (18) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: PAOLO MAFIOLI PUCHE, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1010188895 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

35843-1



--------- Firma autógrafa ---------

9cc8bc0522
31/03/2025 15:41:54

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

JOSE MIGUEL ROBAYO PIÑEROS
Notario (18) del Círculo de Bogotá D.C.
Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 9cc8bc0522, 31/03/2025 15:51:37

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 35844

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría dieciocho (18) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0079956346 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

35844-1



658aa7a07c

31/03/2025 15:43:59

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
José Miguel Robayo Piñeros
18
NOTARIO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

JOSE MIGUEL ROBAYO PIÑEROS
Notario (18) del Círculo de Bogotá D.C.
Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 658aa7a07c, 31/03/2025 15:51:38

NOTARIO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

CERTIFICACIÓN VALOR DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

CERTIFICADO DE DESGLOSE DE VALORES ASOCIADOS A CADA AEROPUERTO AL CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2 – AEROPUERTOS DE PITALITO, PUERTO ASIS Y FLORENCIA

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos contractuales y garantizar la trazabilidad financiera y técnica del Contrato de Obra No. 24001291 H4 – Lote 2, que contempla intervenciones en los aeropuertos de Pitalito, Puerto Asís y Florencia, se expide el presente Certificado de Desglose de Valores, en el cual se detallan los montos asignados a cada una de las terminales aéreas mencionadas.

Este desglose tiene como propósito establecer con precisión la distribución de los recursos del contrato, facilitando la adecuada planeación, ejecución, control y seguimiento de las actividades en cada aeropuerto. Asimismo, contribuye a una gestión administrativa y presupuestal transparente, acorde con las exigencias de la Entidad contratante.

Los valores aquí consignados corresponden al Acta de Recibo Parcial No. 9, que comprende el periodo del 01 de Noviembre de 2025 al 30 de Noviembre de 2025

AEROPUERTO	COSTO DIRECTO + AIU ACTA #9	IVA	COSTO TOTAL	SALDO HASTA ACTA ANTERIOR ASOCIADO AL AEROPUERTO COSTO DIRECTO (SIN BOLSA DE MONTO AGOTABLE)	IVA	COSTO TOTAL	SALDO DESPUES DE ACTA #9
PITALITO	$ 26.218.576,00	$ 77.232,98	$ 26.295.808,98	$ 1.561.276.723,00	$ 4.599.109,44	$ 1.565.875.832,44	$ 1.539.580.023,46
PUERTO ASIS	$ 179.207,00	$ 527,98	$ 179.734,98	$ 1.724.690.724,00	$ 5.080.482,44	$ 1.729.771.206,44	$ 1.729.591.471,46
FLORENCIA	$ 11.181.600,00	$ 32.937,98	$ 11.214.537,98	$ 2.021.526.317,00	$ 5.954.884,74	$ 2.027.481.201,74	$ 2.016.266.663,76
SUB TOTAL	**$ 37.579.383,00**	**$ 110.698,94**	**$ 37.690.081,94**	**$ 5.307.493.764,00**	**$ 15.634.476,62**	**$ 5.323.128.240,62**	**$ 5.285.438.158,68**

AEROPUERTO	BOLSA DE MONTO AGOTABLE ACTA #9	IVA	COSTO TOTAL	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	IVA	COSTO TOTAL	SALDO DESPUES DE ACTA #9
PITALITO	$ 0,00	N/A	$ 0,00	$ 100.645.417,00	N/A	$ 100.645.417,00	$ 100.645.417,00
PUERTO ASIS	$ 0,00	N/A	$ 0,00	$ 100.645.417,00	N/A	$ 100.645.417,00	$ 100.645.417,00
FLORENCIA	$ 18.040.400,00	N/A	$ 18.040.400,00	$ 84.864.156,00	N/A	$ 84.864.156,00	$ 66.823.756,00
SUB TOTAL	**$ 18.040.400,00**	**$ 0,00**	**$ 18.040.400,00**	**$ 286.154.990,00**	**$ 0,00**	**$ 286.154.990,00**	**$ 268.114.590,00**

VALOR DEL ACTA #9	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DEL ACTA #8	SALDO DEL CONTRATO DESPUÉS DEL ACTA #9
$ 55.730.481,94	**$ 5.609.283.230,62**	**$ 5.553.552.748,68**

AEROPUERTO	DESCUENTO DEL ANTICIPO EN EL ACTA #9			VALOR DEL ANCITCIPO ASOCIADO A CADA AEROPUERTO SEGÚN CDP 89624 DESPUES DEL ACTA #8			SALDO POR AMORTIZAR DESPUES DE ACTA #9
PITALITO	% AMORTIZACION	34,00%	$ 8.940.575,00	% DE PESO SOBRE EL CONTRATO	24,34%	$ 185.535.605,00	$ 176.595.030,00
PUERTO ASIS	% AMORTIZACION	34,00%	$ 61.110,00	% DE PESO SOBRE EL CONTRATO	43,72%	$ 501.403.207,00	$ 501.342.097,00
FLORENCIA	% AMORTIZACION	34,00%	$ 9.946.679,00	% DE PESO SOBRE EL CONTRATO	31,94%	$ 280.158.210,00	$ 270.211.531,00
SUB TOTAL			**$ 18.948.364,00**			**$ 967.097.022,00**	**$ 948.148.658,00**

Coordialmente

OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ALFA

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD **08** / MMMM **Mayo** / AAAA **2026**

Información del Beneficiario de Pago

Nombre del beneficiario de pago: **CONSORCIO ALFA**

NIT/CC No.: **901707929-0**

Información Contractual

De acuerdo con el tipo de contrato que selecione, debe anexar los documentos establecidos en el instructivo "DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGOS (APOY-2.0-16-002)"

Tipo de Contrato: OBRA

Contrato No.: 24001291 H4 LOTE 2

Fecha de suscripción: DD / MM / AAAA 23/ene/2025

Fecha Modificatorio 1: DD / MM / AAAA 09/dic/2025
Fecha Modificatorio 2:
Fecha Modificatorio 3:
Fecha Modificatorio 4:
Fecha Modificatorio 5:

Fecha de terminación: DD / MM / AAAA 31/jul/2026

En caso de existir adiciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden la modificación del contrato.

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Total a Pagar en la Presente Cuenta
$ 6.788.000.000,00	$ 6.788.000.000,00	$ 2.118.935.325,38	$ 4.669.064.674,62	$ 36.782.117,94

DETALLE EJECUCIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

Relacione todos los Registros Presupuestales relacionados con el contrato en ejecución

Vigencia Registro Presupuestal / RP	No. Registro Presupuestal / RP	Fecha Registro Presupuestal / RP	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Reserva Presupuestal	89624	09/may/2024	$ 1.367.860.723,00	$ 1.367.860.723,00	$ 1.367.860.723,00	$ -
Reserva Presupuestal	3525	14/ene/2025	$ 3.476.337.202,00	$ 3.476.337.202,00	$ 751.074.602,38	$ 2.725.262.599,62
Vigencia Actual	58626	26/ene/2026	$ 1.943.802.075,00	$ 1.943.802.075,00	$ -	$ 1.943.802.075,00
			$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -

Información para pago

Número de Pago o Acta: **9**

Periodo de Pago: Desde DD / MM / AAAA 01/nov/2025 Hasta DD / MM / AAAA 30/nov/2025

ANTICIPO / AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 1.367.860.723,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 400.763.702,00
Amortización presente pago	$ 18.948.364,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 948.148.657,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No

¿Se requiere endosar el pago? No

NIT Fiducia /Beneficiario Endoso

Razón Social Fiducia /Beneficiario Endoso

NOTA: En caso de requerir endosar el pago se debe ajuntar el "FORMATO AUTORIZACIÓN CESION DE PAGO -DERECHOS ECONÓMICOS (APOY-2.0-12-015)"

Tipo cuenta bancaria: Corriente

Cuenta bancaria No.: 263867426

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente

Detalle Afectación Presupuestal por Compromiso Presupuestal

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Reserva Presupuestal	3525	$ 36.782.117,94

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1	3112	C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	$ 12.260.705,98
2	3113	C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	$ 12.260.705,98
3	3116	C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	$ 12.260.705,98
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Relación Facturas Electrónicas, Notas Débito o Notas Crédito

Las facturas electrónicas deben encontrarse aprobadas en el aplicativo SIIF Validador de Facturación Electrónica VFE para proceder al pago de las mismas

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
1	Factura Electrónica	72	08/may/2026	$ 36.782.117,94
2				$ -
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
20				$ -
21				$ -
22				$ -
23				$ -
24				$ -
			Total Facturas	$ 36.782.117,94

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

OBSERVACIONES

Firma:		Firma:	
Nombre:	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA	Nombre:	
Cargo:	DIRECTOR INTERVENTORIA	Cargo:	
Dependencia:	INTERVENTORIA - CONSORCIO AEROPUERTOS SB	Dependencia:	

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CERTIFICACIÓN DE FACTURA

La Interventoría del Contrato de Obra No. 240001291 H4 de 2023– *"*REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 2*"*. Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y el **CONSORCIO ALFA**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de obra **No. 09**, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025**, recibe a satisfacción debido a que cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula octava – Forma de pago, por valor de $ 36.782.118,94 M/CTE.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra **No. 09** del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los cuatro (24) días del mes de abril de 2026.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CERTIFICACIÓN DE BUEN USO Y MANEJO DEL ANTICIPO

La Interventoría del Contrato de Obra No. 240001291 H4 de 2023– *"*REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 2*"*. Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **CONSORCIO ALFA**, hace constar que, para el periodo comprendido entre el **01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025**, ha cumplido con el buen manejo y uso del anticipo del contrato de acuerdo con el siguiente plan de inversión.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Transporte y alquiler de maquinaria	50.000.000,00	3,66%
2	Compra de equipos y repuestos	17.860.723,00	1,31%
3	Compra de materiales	600.000.000,00	43,86%
4	Contratacion subcontratistas	500.000.000,00	36,55%
5	Nomina y aportes	200.000.000,00	14,62%
	TOTAL	1.367.860.723,00	**100,00%**

A fecha de corte del acta parcial No. 09, 30 de noviembre de 2025, se han reportado los siguientes desembolsos acumulados:

FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM PLAN ANTICIPO	DESCRIPCIÓN
10/04/2025	1	CONSORCIO ALFA	$ 6.498.333	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
10/04/2025	1	JUAN SEBASTIÁN VILLAMIL DUARTE	$ 1.900.680	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	INFORMES PLAN DE GERENCIA
10/04/2025	1	MILEIDY LASSO GUEVARA	$ 58.800.000	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	ANTICIPO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS, CANALES Y ARBOLADO
10/04/2025	1	IE INTER ELÉCTRICAS SAS	$ 15.303.314	3. COMPRA DE MATERIALES	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA
10/04/2025	1	CONSORCIO ALFA	$ 10.347.000	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025
10/04/2025	1	MILEIDY LASSO GUEVARA	$ 20.000.000	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	ABONO ACTA #1 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS, CANALES Y ARBOLADO
10/04/2025	1	MILEIDY LASSO GUEVARA	$ 14.533.800	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	ABONO #3 COBRO ACTA #1 ROCERÍA
10/04/2025	1	JG INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	$ 8.925.000	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	CONCEPTO TÉCNICO INTERVENCIONES AEROPUERTOS

FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM PLAN ANTICIPO	DESCRIPCIÓN
21/04/2025	2	ANDREA CAROLINA ALFARO GALLO	$ 31.875.000	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	ANTICIPO #1 SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA POSICIONAMIENTOS Y LEVANTAMIENTOS GENERALES DE PRESICIÓN DE LOS AEROPUERTOS
21/04/2025	2	JORGE ENRIQUE ALEMAN CIFUENTES	$ 1.500.000	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LOS AEROPUERTOS
5/6/2025	3	CONSORCIO ALFA	$ 3.290.438	3. COMPRA DE MATERIALES	REEMBOLSO POR COMPRA DE ASFALTO LISTO, MEZCLA GRUESA Y MEDIANA, Y EMULSIÓN ASFÁLTICA (ROKASFALTOS)
5/6/2025	3	CONSORCIO ALFA	$ 13.399.000	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
5/6/2025	3	CONSORCIO ALFA	$ 13.399.000	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025
27/5/2025	3	GERMAN MUÑOZ MILLAN	$ 14.058.219	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CADA AEROPUERTO
30/5/2025	3	JUAN SEBASTIÁN VILLAMIL DUARTE	$ 5.702.040	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ASESORÍA GERENCIAL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2025
4/6/2025	3	GEOSENSE SAS	$ 45.815.000	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	ANTICIPO PARA SERVICIO DE MEDICIÓN DEL COEFICINETE DE RAZONAMIENTO CON EQUIPO SKIDDOMETER
24/5/2025	3	YONIER LEONARDO RAMOS ROA	$ 1.866.600	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CADENERO DE OBRA DEL 12 AL 31 DE MAYO DE 2025
24/6/2025	4	MILEIDY LASSO GUEVARA	$ 64.156.680	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	ANTICIPO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS, CANALES Y ARBOLADO
24/6/2025	4	WATERBLASTNG	$ 140.973.440	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	ANTICIPO DEL 50% ANTES DE IVA POR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO, SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PLATAFORMA, PISTA, CALLES DE RODAJE PARA LOS AEROPUERTOS
9/7/2025	5	AIRAVATA SAS	$ 10.710.000	3. COMPRA DE MATERIALES	ANTICIPO 50% SUMINISTRO DE BALIZAS PARA EL AEROPUERTO DE FLORENCIA – OFERTA AIRAVATA AIR-CTZ-0020 DEL 18 JUNIO 2025
9/7/2025	5	CONSORCIO ALFA	$ 15.878.189	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
9/7/2025	5	CONSORCIO ALFA	$ 2.706.644	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
9/7/2025	5	CONSORCIO ALFA	$ 4.461.400	5. NOMINA Y APORTES	SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
26/8/2025	6	MILEIDY LASSO GUEVARA	$ 58.948.161	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS, CANALES Y ARBOLADO - JUNIO
26/8/2025	6	CONSORCIO ALFA	$ 3.000.000	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA JORGE ALEMAN AL MES DE JUNIO DE 2025
26/8/2025	6	CONSORCIO ALFA	$ 5.600.000	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA JOINER AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2025

FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM PLAN ANTICIPO	DESCRIPCIÓN
26/9/2025	7	CONSORCIO ALFA	$ 13.399.000	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA JOINER AL MES DE JULIO DE 2025
26/9/2025	7	CONSORCIO ALFA	$ 4.461.400	5. NOMINA Y APORTES	REEMBOLSO POR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025
26/9/2025	7	CONSORCIO ALFA	$ 14.361.890	5. NOMINA Y APORTES	REEMBOLSO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
26/9/2025	7	CONSORCIO ALFA	$ 30.000.000	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	REEMBOLSO POR PAGO A PROVEEDOR DEL 21 DE AGOSTO DE 2025-ROCERÍA
26/9/2025	8	MILEIDY LASSO GUEVARA	$ 9.843.370	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	MILEIDY LASSO GUEVARA 1-31 JULIO
26/9/2025	8	JUAN SEBASTIÁN VILLAMIL DUARTE	$ 4.861.530	5. NOMINA Y APORTES	SERVICIO DE ASESORÍA PMP ERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2025
26/9/2025	8	GEOSENSE SAS	$ 19.635.000	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	CORTE DE OBRA #1 REDESCONTAMINACIÓN Y POSTDESCONTAMINACIÓN (MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE RAZONAMIENTO EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025
7/10/2025	9	MILEIDY LASSO GUEVARA	$ 42.633.415	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	MILEIDY LASSO GUEVARA 1-30 AGSTO
7/10/2025	9	CONSORCIO ALFA	$ 19.670.816	5. NOMINA Y APORTES	NÓMINA JOINER AL MES DE AGOSTO DE 2025
22/10/2025	10	CONSORCIO ALFA	$ 4.659.500	5. NOMINA Y APORTES	REEMBOLSO POR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2025
22/10/2025	10	CONSORCIO ALFA	$ 6.285.900	5. NOMINA Y APORTES	REEMBOLSO POR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
18/11/2025	11	MILEIDY LASSO GUEVARA	$ 35.743.450	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	MILEIDY LASSO GUEVARA 1-30 SEPTIEMBRE
18/11/2025	11	CONSORCIO ALFA	$ 40.000.000	4. SUBCONTRATISTAS CONTRATACIÓN	REEMBOLSO POR PAGO MILEIDY LASSO ACTA 7 SEPTIEMBRE DE 2025
18/11/2025	11	JUAN SEBASTIÁN VILLAMIL DUARTE	$ 3.781.190	5. NOMINA Y APORTES	SERVICIO DE ASESORÍA GERENCIAL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
18/11/2025	11	CONSORCIO ALFA	$ 21.725.636	5. NOMINA Y APORTES	REEMBOLSO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025
TOTAL			**$ 884.331.435**		

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Interventoría del Contrato de Obra No. 240001291 H4 de 2023– *"*REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 2*"*. Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y el **CONSORCIO ALFA**, hace constar que revisados los soportes del Acta Parcial de obra No. 09, presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025**, y conforme a la certificación expedida por el representante GUILLERMO ANDRES GALÁN ECHEVERRY, y el revisor fiscal, NELLY ESPERANZA MARTINEZ LÓPEZ, cumplió con la establecido en la Ley 789 de 200, y en su artículo 50, y el la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Los suscritos, **Guillermo Andrés Galán Echeverri**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.784.164 de Bogotá D.C., en condición de **Representante Legal** y **Nelly Esperanza Martínez López** identificada con cédula de ciudadanía 51.611.736 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 78826-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en condición de **contador**, certificamos **BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que el **CONSORCIO ALFA** identificado con NIT **901.707.929-0**, ha realizado el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados durante los últimos **SEIS (6) meses**, contados a partir del mes anterior a la fecha de suscripción de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Adicionalmente certificamos que; a la fecha de suscripción de la presente certificación, el **CONSORCIO ALFA** identificada con NIT **901.707.929-0**, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos **SEIS (6) meses**, contados a partir del mes anterior a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dada en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de noviembre de 2025.

Guillermo Andrés Galán Echeverri
C.C. 79.784.164 de Bogotá D. C.
Representante legal

Nelly Esperanza Martínez López
c.c. 51.611.736 de Bogotá D.C..
Contador

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3896494

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79784164, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-085188 desde el 15 de Marzo de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2313.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

25202085188CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **15/03/2001**

GUILLERMO ANDRES
GALAN ECHEVERRI
C.C. 79784164
ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERIA JULIO GARAVITO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CEDULA DE CIUDADANIA

GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1AA7949385F0ZAZ3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELLY ESPERANZA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51611736 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78826-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



78826-T

NELLY ESPERANZA
MARTINEZ LOPEZ
C.C. 51611736
RES. INSCRIPCION 64 DEL 10/05/2001
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

372378 88010

230302/0822

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.611.736

MARTINEZ LOPEZ

APELLIDOS

NELLY ESPERANZA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ABR-1959

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

06-DIC-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00005201-F-0051611736-20080401 0000128804A 1 1160000059

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

PLANILLAS DE PAGO
PARAFISCALES CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901707929
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ALFA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CL 151 18 A 34 OF 406	TELÉFONO:	5498600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7998451439**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1996079867		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 4.282.100	$ 0	$ 0	$ 30.000	$ 30.000	$ 2.700	$ 200	$ 4.342.100	$ 2.900	$ 4.345.000
230301	230301-PORVENIR	21	$ 7.241.700	$ 0	$ 0	$ 32.500	$ 32.500	$ 4.600	$ 200	$ 7.306.700	$ 4.800	$ 7.311.500
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 481.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 481.700	$ 400	$ 482.100
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.452.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 1.452.300	$ 1.000	$ 1.453.300
SUBTOTALES:										**$ 13.582.800**	**$ 9.100**	**$ 13.591.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 47.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 47.000	$ 100	$ 0	$ 47.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 77.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 77.400	$ 100	$ 0	$ 77.500
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 406.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 406.000	$ 300	$ 0	$ 406.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 203.400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 203.400	$ 200	$ 0	$ 203.600
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 120.000	$ 100	$ 0	$ 120.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 613.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 613.500	$ 400	$ 0	$ 613.900
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 63.100	$ 100	$ 0	$ 63.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.200.800	$ 0	$ 800	$ 0	$ 1.200.800	$ 800	$ 0	$ 1.201.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 679.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 679.500	$ 500	$ 0	$ 680.000
SUBTOTALES:													**$ 3.410.700**	**$ 2.600**	**$ 0**	**$ 3.413.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	38		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.791.800	$ 5.791.800	$ 3.700	$ 0	$ 5.795.500
SUBTOTALES:									**$ 5.791.800**	**$ 3.700**	**$ 0**	**$ 5.795.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	13	$ 1.337.800	$ 900	$ 1.338.700
CCF13	CCF13-COMFACA	2	$ 200.000	$ 200	$ 200.200
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	$ 240.000	$ 200	$ 240.200
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 559.600	$ 400	$ 560.000
CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	17	$ 1.287.300	$ 900	$ 1.288.200
SUBTOTALES:			**$ 3.624.700**	**$ 2.600**	**$ 3.627.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
																									PENSIÓN									SALUD								ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901707929
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ALFA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CL 151 18 A 34 OF 406	TELÉFONO:	5498600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7998451439**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1996079867		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
7	CC 1012464210	JAIME ROMERO JHON DEIVID	DEPEND		$ 1.788.400	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.788.400	$ 286.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 286.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.788.400	$ 71.600	$ 0	$ 71.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.788.400		$ 124.500	30	$ 1.788.400	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 71.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1070923201	GOMEZ CAMARGO JHON JAIRO	DEPEND		$ 5.084.760	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.084.760	$ 813.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 813.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 5.084.760	$ 203.400	$ 0	$ 203.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.084.760		$ 353.900	30	$ 5.084.760	CCF35-CCF DE NARINO	$ 203.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1071550533	TORRES GARAY MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.529.176	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.529.176	$ 404.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 404.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.529.176	$ 101.200	$ 0	$ 101.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.529.176		$ 176.100	30	$ 2.529.176	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 101.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1083868569	ARTUNDUAGA TORRES ANGELA MARCELA	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.000		$ 222.800	30	$ 3.200.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1083892269	MUÑOZ CRUZ FABIAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1085284361	MOLINA GOMEZ WILMER ALEJANDRO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	ESSC18 - EMSSANA R S.A.S.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1086330645	PINTA CHAVES LUIS MIGUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		14							01-14								230301-PORVENIR	14	$ 758.445	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 758.445	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14	$ 758.445		$ 52.800	14	$ 1.434.608	CCF35-CCF DE NARINO	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1086331753	LOPEZ VASQUEZ TANIA GABRIELA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI										09-10							25-14 COLPENSIONES	2	$ 120.000	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 19.200	ESSC18 - EMSSANA R S.A.S.	2	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 120.000		$ 0	2	$ 120.000	CCF35-CCF DE NARINO	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1086331753	LOPEZ VASQUEZ TANIA GABRIELA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI									11-30								25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.889.864	$ 302.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 302.400	ESSC18 - EMSSANA R S.A.S.	28	$ 1.889.864	$ 75.600	$ 0	$ 75.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.889.864		$ 131.600	28	$ 1.889.864	CCF35-CCF DE NARINO	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1086332191	HIGIDIO ROMERO DIEGO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.537.865	$ 246.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.100	ESSC18 - EMSSANA R S.A.S.	30	$ 1.537.865	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.537.865		$ 107.100	30	$ 1.537.865	CCF35-CCF DE NARINO	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1094937939	DIAZ ACEVEDO LEYDI JOHANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.577.173	$ 252.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.577.173	$ 63.100	$ 0	$ 63.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.577.173		$ 109.800	30	$ 1.577.173	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1094977295	VALENCIA ORREGO JEAN SANTIAGO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.800.000		$ 121.800	30	$ 2.800.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1096032586	GRISALES RODRIGUEZ ANGELA JENNIFER	DEPEND		$ 2.700.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.700.000		$ 188.000	30	$ 2.700.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1097725979	AMAYA HENAO MARYURI ANDREA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200	30	$ 2.200.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1097730541	MARIN LOAIZA LUIS ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1104703416	ARIAS AYALA JUAN PAULO	DEPEND		$ 6.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 6.500.000	$ 1.040.000	$ 32.500	$ 32.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.105.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 260.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 6.500.000		$ 452.400	30	$ 6.500.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1117544994	RAMOS ROA YONIER LEONARDO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.800.000		$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF13-COMFACA	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1117548625	MUÑOZ BOCANEGRA ANYELA TATIANA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200	30	$ 2.200.000	CCF13-COMFACA	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901707929
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ALFA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CL 151 18 A 34 OF 406	TELÉFONO:	5498600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7998451439**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1996079867

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
25	CC 1121507213	MEJIA RAMOS JAIRO GEOVANNY	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1123327086	GUEVARA BUITRON AILEEN PAOLA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.750.000		$ 121.800	30	$ 1.750.000	CCF35-CCF DE NARINO	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 12751649	PEÑA VELASCO JUAN PABLO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF35-CCF DE NARINO	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 12983501	CALVACHE CALVACHE LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24															230301-PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS005-SANITAS S.A.	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 1.138.800		$ 79.300	24	$ 1.820.894	CCF35-CCF DE NARINO	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 37087444	FIGUEROA APRAEZ BEATRIZ EUGENIA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.900.000		$ 82.700	30	$ 1.900.000	CCF35-CCF DE NARINO	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 41952858	TORRES OROZCO MARIA GISELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.577.173	$ 252.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.400	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.577.173	$ 63.100	$ 0	$ 63.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.577.173		$ 109.800	30	$ 1.577.173	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 42158340	CASTRO TURRIAGO DIANA MARCELA	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.000.000	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.020.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 240.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 6.000.000		$ 417.600	30	$ 6.000.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 5205071	SANTACRUZ DAZA EINAR ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		15							01-15								230201-PROTECCION	15	$ 807.998	$ 129.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 129.300	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 807.998	$ 32.400	$ 0	$ 32.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 807.998		$ 56.300	15	$ 1.308.200	CCF35-CCF DE NARINO	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 5205334	DE LA CRUZ PINTA SAUL FRANCISCO	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI									01-20								230301-PORVENIR	29	$ 2.202.295	$ 352.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.400	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.202.295	$ 88.100	$ 0	$ 88.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	29	$ 2.202.295		$ 153.300	29	$ 2.202.295	CCF35-CCF DE NARINO	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 5205334	DE LA CRUZ PINTA SAUL FRANCISCO	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI										21-21							230301-PORVENIR	1	$ 70.000	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 11.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 70.000		$ 0	1	$ 70.000	CCF35-CCF DE NARINO	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 7538404	GIRALDO GARCIA FERNEY	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 93389747	ORTEGON CAICEDO LUIS FRANCISCO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 9733605	GUAPACHA CARDONA JOSE EVELIO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.800.000		$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 9736148	CHAUCANES LOPEZ JOHN EDWIN	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.800.000		$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 98379247	PINTA BOLAÑOS CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24							01-12								231001-COLFONDOS	23	$ 1.174.010	$ 187.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 187.900	NUEVA EPS CM	23	$ 1.174.010	$ 47.000	$ 0	$ 47.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	23	$ 1.174.010		$ 81.800	23	$ 1.202.384	CCF35-CCF DE NARINO	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 98379247	PINTA BOLAÑOS CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										13-13							231001-COLFONDOS	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	NUEVA EPS CM	1	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 47.450		$ 0	1	$ 624.917	CCF35-CCF DE NARINO	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 98387202	INSANDARA LOPEZ LUIS HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24							01-24								230301-PORVENIR	24	$ 1.256.724	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.100	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	24	$ 1.256.724	$ 50.300	$ 0	$ 50.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 1.256.724		$ 87.500	24	$ 1.571.080	CCF35-CCF DE NARINO	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 98389433	PINTA HIGIDIO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24							01-24								25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.223.725	$ 195.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 195.800	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	24	$ 1.223.725	$ 49.000	$ 0	$ 49.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 1.223.725		$ 85.200	24	$ 1.741.721	CCF35-CCF DE NARINO	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 98390488	BOLAÑOS PINTA JOSE GUILLERMO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI		07							01-07								230301-PORVENIR	7	$ 514.315	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 82.300	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	7	$ 514.315	$ 20.600	$ 0	$ 20.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 514.315		$ 35.800	7	$ 873.204	CCF35-CCF DE NARINO	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901707929
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ALFA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CL 151 18 A 34 OF 406	TELÉFONO:	5498600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7998451439**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1996079867		

TOTAL PAGADO:	$ 26.428.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-09, 10:19:27 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077615640

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 09/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OCTAVIO MORALES AYALA		
Documento	CC79455505	**Dirección**	TORRE NUCLEO OFICINA 901
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3154987207
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79455505	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.779.000	$ 1.152.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.779.000	$ 847.400	6,960	$ 6.779.000	$ 471.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.471.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.779.000	$ 6.779.000	$ 6.779.000	$ 0	$ 1.152.500	$ 847.400	$ 471.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.471.800	$ 11.100	$ 2.482.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022388950		ALFARO GALLO ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr116b#77b-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7912384	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1923469977	9494666881	I	2025/12/12	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$533,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	1022388950	ALFARO ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022388950		ALFARO GALLO ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr116b#77b-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7912384	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1923469977	9494666881	I	2025/12/12	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$533,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$533,400	$0	$0	$533,400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901105420
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805	TELÉFONO:	4091821
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JGINGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7997212775**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2048483178		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 911.200**	**$ 0**	**$ 911.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 356.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 356.000
SUBTOTALES:													**$ 712.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 712.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 312.200	$ 312.200	$ 0	$ 0	$ 312.200
SUBTOTALES:									**$ 312.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 312.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 197.800	$ 0	$ 197.800
SUBTOTALES:			**$ 197.800**	**$ 0**	**$ 197.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 148.400	$ 0	$ 148.400
SUBTOTALES:			**$ 148.400**	**$ 0**	**$ 148.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																								PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1014265356	ROJAS CASALLAS MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.120.000	FIJO			NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	901105420	$ 99.100	30	$ 1.120.000	CCF24-COMPENSAR	$ 44.800	$ 0	$ 33.600	$ 0	$ 0
2	CC 1072716435	VENEGAS SANCHEZ SARA LUCIA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	901105420	$ 99.100	30	$ 1.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 48.000	$ 0	$ 36.000	$ 0	$ 0
3	CC 39657454	YAYA VERGEL FABIOLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 80727921	GONZALEZ CASTIBLANCO ORLANDO JAVIER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	901105420	$ 99.100	30	$ 1.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 48.000	$ 0	$ 36.000	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 2.281.600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	4515995	JOHN EDISON GONZALEZ MARTINEZ	TORRE 3 APT 902 SENDEROS DE LA PRADERA	3143500	gaudigo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		RISARALDA	DOSQUEBRADAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	18/11/2025	91508242	$812.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	812.700	812.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	4515995	JOHN EDISON GONZALEZ MARTINEZ	TORRE 3 APT 902 SENDEROS DE LA PRADERA	3143500	gaudigo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		RISARALDA	DOSQUEBRADAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-11	I	18/11/2025	91508242	$812.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornudo**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	4515995	GONZALEZ MARTINEZ JOHN EDISON	59	0			N																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS002	2.800.000	350.000	14-25	2.800.000	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088310400	0	LASSO GUEVARA MILEIDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ 6 CS 22 VILLA LA PAZ	PEREIRA-RISARALDA	3152846692	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1977146372	9495933941	E	2025/12/02	2025/12/03	BANCOLOMBIA	1	$7,020,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$3,748,550	$600,000			$3,748,550	$150,100			$3,460,350	$138,500			$3,748,550		$261,300		$0	$0		$1,149,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$3,748,550	$600,000			$3,748,550	$150,100			$3,460,350	$138,500			$3,748,550		$261,300		$0	$0		$1,149,900
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (6 Afiliados)																							$3,748,550	$600,000			$3,748,550	$150,100			$3,460,350	$138,500			$3,748,550		$261,300		$0	$0		$1,149,900
1	CC	18600266	BUSTAMANTE MESIAS	X																	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF44	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
2	CC	1088337010	LASSO DUVAN	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF44	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
3	CC	1088352321	LASSO EDILVER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$430,300
4	CC	83182062	LASSO NELSON																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	9915130	MARULANDA CARLOS	X																	25-14	6	$284,700	$45,600	ESSC62	6	$284,700	$11,400	CCF44	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$87,300
6	CC	1147951266	SANCHEZ JOSE	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF44	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PITALITO (10 Afiliados)																							$7,544,550	$1,207,400			$7,544,550	$302,100			$7,544,550	$302,100			$7,544,550		$525,700		$0	$0		$2,337,300
Centro de Trabajo: AEROPUERTOS (10 Afiliados)																							$7,544,550	$1,207,400			$7,544,550	$302,100			$7,544,550	$302,100			$7,544,550		$525,700		$0	$0		$2,337,300
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (10 Afiliados)																							$7,544,550	$1,207,400			$7,544,550	$302,100			$7,544,550	$302,100			$7,544,550		$525,700		$0	$0		$2,337,300
7	CC	1083866511	BADILLO JOSE		X																231001	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
8	CC	10302876	BUESAQUILLO ROVINSON	X																	230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
9	CC	1113592033	BUITRAGO JOSE	X																	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$0	$0	Si	$382,100
10	CC	94287121	CORRALES SAIR	X																	230301	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF32	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
11	CC	1083904423	FIGUEROA CRISTIAN	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
12	CC	1077853952	GONZALEZ ADOLFO	X																	25-14	13	$616,850	$98,700	EPS041	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
13	CC	1083887153	ORTIZ JORGE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1083909425	OTAYA CRISTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1004083195	OTAYA JUAN	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
16	CC	1083923403	SUAZA LEONARDO	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FLORENCIA (7 Afiliados)																							$6,263,400	$1,002,500			$6,263,400	$250,800			$6,263,400	$250,800			$6,263,400		$436,300		$0	$0		$1,940,400

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088310400	0	LASSO GUEVARA MILEIDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ 6 CS 22 VILLA LA PAZ	PEREIRA-RISARALDA	3152846692	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1977146372	9495933941	E	2025/12/02	2025/12/03	BANCOLOMBIA	1	$7,020,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$3,630,100	$2,400	$0	$3,632,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$151,900	$100	$0	$152,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$949,300	$600	$0	$949,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,521,300	$1,600	$0	$2,522,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,600	$100	$0	$7,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,580,300	$1,000	$0	$1,581,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$1,580,300	$1,000	$0	$1,581,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$896,600	$700	$0	$897,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	$250,800	$200	$0	$251,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$302,100	$200	$0	$302,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	$205,200	$200	$0	$205,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	$138,500	$100	$0	$138,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				29	$908,200	$1,000	$0	$909,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$317,300	$200	$0	$317,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$100	$0	$57,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$13,300	$100	$0	$13,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$190,000	$200	$0	$190,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$60,800	$100	$0	$60,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$201,400	$200	$0	$201,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$68,400	$100	$0	$68,500
TOTAL				**29**	**$7,015,200**	**$5,100**	**$0**	**$7,020,300**

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que CONSORCIO ALFA con documento NIT 901707929, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JORGE ENRIQUE ALEMAN CIFUENTES con documento CC 79388230, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6010174597	Tipo de Planilla	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2025
Fecha Pago	2026/03/04	Número de Autorización	113062626

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7 - SEGUROS BOLIVAR SA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79388230	0	JORGE ENRIQUE ALEMAN CIFUENTES	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CLL 8 N 9 10		3212323232			NOTIENE@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	36571532	I	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	427.400	21.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36571532	2025-12-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79388230	ALEMAN CIFUENTES JORGE ENRIQUE	1.423.500																	0			30	30	0	0	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	405.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79388230	0	JORGE ENRIQUE ALEMAN CIFUENTES	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CLL 8 N 9 10		3212323232			NOTIENE@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	36571532	I	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	427.400	21.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36571532	2025-12-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	12.100	0	239.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	12.100	0	239.900
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	9.500	0	187.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	9.500	0	187.500
Gran Total					405.800	0	21.600	0	427.400

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que CONSORCIO ALFA con documento NIT 901707929, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARCO TULIO BEDOYA SANCHEZ con documento CC 10090121, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6010174597	Tipo de Planilla	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2025
Fecha Pago	2026/03/04	Número de Autorización	113062626

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7 - SEGUROS BOLIVAR SA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10090121	0	MARCO TULIO BEDOYA SANCHEZ	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CLL 8 N 9 10		3165656565			NOTIENE@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	36572067	I	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	428.500	22.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36572067	2025-12-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 10090121	BEDOYA SANCHEZ MARCO TULIO	1.423.500																	0			30	30	0	0	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	405.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10090121	0	MARCO TULIO BEDOYA SANCHEZ	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CLL 8 N 9 10		3165656565			NOTIENE@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	36572067	I	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	428.500	22.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36572067	2025-12-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	12.700	0	240.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	12.700	0	240.500
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	10.000	0	188.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	178.000	0	10.000	0	188.000
Gran Total					405.800	0	22.700	0	428.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901707929
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ALFA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CL 151 18 A 34 OF 406	TELÉFONO:	5498600
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6012519151**	TIPO DE PLANILLA:			Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			101				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			155780998

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 6.300	$ 0	$ 105.400
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 6.300**	**$ 0**	**$ 105.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP											
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1030589105	BELTRAN ESPITIA ANGIE PAMELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 105.400

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030589105	ANGIE PAMELA BELTRAN ESPITIA	Carrera 71 54-64	3057847825	pamelabeltran711@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67859932	18/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	$0	$532.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	106	14.600	0	233.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	106	18.700	0	298.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	106	0	0	0
ICBF				
0	106	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	233.500
Pensión	1	280.200	298.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	532.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030589105	ANGIE PAMELA BELTRAN ESPITIA	Carrera 71 54-64	3057847825	pamelabeltran711@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67859932	18/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	$0	$532.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1030589105	BELTRAN ESPITIA ANGIE PAMELA	3	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

CERTIFICACIÓN BANCARIA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICACION

Nos permitimos informar que los señores **CONSORCIO ALFA** Identificados con Nit **901.707.929-0** mantienen vínculos comerciales con nuestra Entidad a través de la cuenta Corriente No. **263867426** en la oficina Calle 100, aperturada el 8 de mayo de 2023.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **CONSORCIO ALFA** es ser "Cliente del **BANCO DE OCCIDENTE.**

Dirigimos esta constancia a **CONSORCIO ALFA**, el 08 de marzo de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C.

Melisa Mangones Sánchez
Secretaria de Relación Banca Empresarial

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

RUT CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128598032

(415)7707212489984(8020) 000014112859803 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 7 9 2 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ALFA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 151 18 A 34 OF 406

42. Correo electrónico contabconsorcios@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 4 9 8 6 0 0	3 1 0 2 6 9 4 6 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 3 0 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128598032

(415)7707212489984(8020) **000014112859803 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 7 9 2 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 3 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 3 0 7	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 3 0 7	
81. Hasta	2 0 2 9 0 7 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141128598032

(415)7707212489984(8020) **000014112859803 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 7 9 2 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 7 8 4 1 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALAN	ECHEVERRI	GUILLERMO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 4 5 5 5 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORALES	AYALA	OCTAVIO	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 6 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 4 5 1 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALAN	ECHEVERRI	DIEGO	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128598032

(415)7707212489984(8020) **000014112859803 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 7 9 2 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 7 0 2 4 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VIAS Y CANALES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 5	2 0 2 3 0 3 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 5 5 5 0 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MORALES	AYALA	OCTAVIO	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 3 0 3 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

CERTIFICACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CERTIFICACIÓN

Nos permitimos informar que la cuenta **AHORROS No. 263-87498-4** a nombre de **PA 319298 CONSORCIO ALFA** NIT **830.054.076-2** se encuentra saldada desde el 24 de marzo del 2026.

Expedimos esta constancia a **AVAL FIDUCIARIA SA.**, hoy 24 de marzo del 2026.

Cordialmente,

Paula Andrea Villarruel Muñoz
Auxiliar Mesa de Control
Gerencia SOA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Banco de Occidente | Del lado de los que hacen.
Grupo AVAL

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

FO-DGNF-319298

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2026

Doctor
GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRY
Representante Legal
VIAS Y CANALES S.A.S
Calle 151 # 18ª - 34 OF 406
Bogotá

Doctor
OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO
Carrera 13 # Calle 112 - 5 TO 1 APTO 1102 CONJ MUKAVA DEL VIENTO
Pereira, Risaralda

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Av. El dorado 103-15
Bogotá

REFERENCIA: **ENVÍO RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA.**

Apreciados Doctores,

En cumplimiento de lo pactado en el contrato fiduciario y conforme a lo establecido en la Circular Básica Jurídica 006 de 2025 de la Superintendencia Financiera de Colombia, nos permitimos remitir la Rendición Final de Cuentas del fideicomiso de la referencia, correspondiente al período comprendido entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Agradecemos que, una vez revisado el documento, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación o remisión mediante correo electrónico del mismo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO

1.1 Periodo que Cobija la Rendición: Del 29 de enero de 2025 al 20 de marzo de 2026
1.2 Nombre del Contrato: CONSORCIO ALFA
1.3 Código del Contrato (Interno/Superfinanciera): 319298/ 123768
1.4 Fecha de Firma del Contrato: Mediante documento privado de fecha 29 de enero de 2025. **Vigencia o Duración:** Tiene una duración igual a la necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el PATRIMONIO AUTÓNOMO correspondientes al ANTICIPO[1].
1.5 Fecha de vencimiento registrada en la Superfinanciera: 29 de enero de 2026.
1.6 Tipo de Contrato: Fiducia Mercantil.

1.7 Tipo/Subtipo de Negocio Fiduciario:

Tipo: (3) Fiducia de Administración
Subtipo: (1) Fiducia de Administración y Pagos

1.8 Estado Actual: En liquidación.

1.9 Responsables del Negocio:

Maria Catalina Orjuela Buitrago
Especialista Gestión de Negocios
morjuela@avalfiduciaria.com
601 7550340 ext 72797

Andres Felipe Garcia Bejarano
Coordinador Gestión Negocios
agarcia@avalfiduciaria.com
601 7550340 ext. 72854

Hancy Pilar Coronado Ramirez
Directora de Negocios Especiales
hcoronado@avalfiduciaria.com
601 7550340 ext. 72790

Julian García Suarez
Vicepresidente de Gestión de Operaciones
jgarcias@avalfiduciaria.com
601 7550340 ext. 811

[1] Es la suma de dinero que la ENTIDAD ESTATAL gira al PATRIMONIO AUTÓNOMO destinada a cubrir los costos determinados en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO para la ejecución del objeto del CONTRATO ESTATAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

2. PARTES DEL CONTRATO

2.1 Fideicomitente (s)

Nombre	Identificación	Representante Legal	Porcentaje Participación	Dirección	Teléfono
VIAS Y CANALES S.A.S	830.070.241	GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRY	75%	CL 151 # 18 A 34 OF 406	5498600
OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA	79.455.505	ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO	25%	KR 13 # 112 - 5 TO 1 APTO 1102 CONJ MUKAVA DEL VIENTO	3218004080

2.2 Beneficiarios

Es beneficiario del Fideicomiso el Fideicomitente, en cuyo nombre se realizan los pagos a los terceros y giros a su favor, o de los excedentes que resulten a su favor a la terminación del contrato.

Nombre	Identificación	Representante Legal	Porcentaje Participación	Dirección	Teléfono
VIAS Y CANALES S.A.S	830.070.241	GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRY	75%	CL 151 # 18 A 34 OF 406	5498600
OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA	79.455.505	ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO	25%	KR 13 # 112 - 5 TO 1 APTO 1102 CONJ MUKAVA DEL VIENTO	3218004080

Es beneficiario del Fideicomiso la Entidad Estatal, en el evento que la Fiduciaria deba transferirle los remanentes de los recursos del Patrimonio Autónomo, o cuando esta comunique a la Fiduciaria la ocurrencia de la declaratoria de terminación anticipada o unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del contrato estatal.

Nombre	Tipo Documento	Número Documento	Porcentaje de Participación	Dirección	Ciudad	Teléfono
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL	Nit	899.999.059	100%	Av. Eldorado 103-15	Bogotá	601 425 1000 601 518 5214

2.3 Fiduciaria: Aval Fiduciaria S.A.

3. REGISTRO DE CESIONES

Durante el periodo objeto de la presente rendición final de cuentas, la Aval Fiduciaria S.A. no fue notificada por parte del fideicomitente, sobre cesiones.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

4. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

4.1 Objeto: Constituir una Fiducia mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos que constituyen el anticipo.

4.2 Finalidad: Es (a) La transferencia por parte del fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de ANTICIPO, a título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la ENTIDAD ESTATAL a la FIDUCIARIA; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato estatal y en el contrato de fiducia mercantil; (c) la realización de los PAGOS ordenados por el FIDEICOMITENTE con la aprobación del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del contrato estatal, siempre y cuando tales pagos correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo y (d) la transferencia a la ENTIDAD ESTATAL por parte de la FIDUCIARIA de los recursos entregados por concepto de ANTICIPO así como sus remanentes cuando la ENTIDAD ESTATAL le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada del contrato estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del contrato estatal.

4.3 Otrosíes: durante el periodo objeto de la presente rendición final de cuentas, no se presentaron modificaciones al Contrato de Fiducia Mercantil.

5. BIENES FIDEICOMITIDOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS MISMOS

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 5.1 del contrato de fiducia, los bienes Fideicomitidos son:

1. La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del CONTRATO ESTATAL que la ENTIDAD ESTATAL gira por cuenta del FIDEICOMITENTE al PATRIMONIO AUTÓNOMO.

2. Los recursos adicionales que el FIDEICOMITENTE reciba como ANTICIPO, cuando se modifique el CONTRATO ESTATAL o se firme un contrato adicional.

3. Los demás recursos que aporte el FIDEICOMITENTE para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.

4. Los rendimientos que generen los recursos aportados por EL FIDEICOMITENTE cuando a ello hubiere lugar

5. Los rendimientos que se generen por la administración de los recursos del ANTICIPO, solo en aquellos eventos en los cuales se establezca por parte de la ENTIDAD ESTATAL que no deban ser devueltos a esta.

5.1. Recursos

Cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, Aval Fiduciaria S.A. procedió a la cancelación de las cuentas asociadas al fideicomiso así:

- Cuenta de ahorros No. 263874984, del Banco de Occidente S.A. el 17 de marzo de 2026, por valor de $ 230.345,04 y $ 8.008,82 el 20 de marzo de 2026, los cuales fueron consignados en la cuenta de

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

corriente No. 263867426 de BANCO DE OCCIDENTE, cuyo titular es CONSORCIO ALFA identificado con NIT. 901.707.929, de acuerdo con la instrucción recibida por parte del Fideicomitente.

5.2. Tasas de los productos (Efectiva Anual)

Producto	Número	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26
Cuenta de Ahorros	263874984	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

5.3. Bienes Inmuebles: No Aplica.

5.4. Bienes Muebles: No Aplica.

5.5 Otras Información Relevante de los Bienes (Inmuebles/Muebles)

5.5.1 Fecha Del Último Avalúo O Estudio Técnico Practicado Al Bien: No Aplica.

5.5.2 Estado De Los Impuestos: No Aplica.

5.5.3 Estado de las pólizas: No Aplica.

5.5.4 Fecha De La Última Visita: No Aplica.

5.5.5 Estado actual de los bienes distintos a recursos dinerarios:

- **Gravámenes, Limitaciones, u otro que afecte los bienes fideicomitidos:** No Aplica
- **Proceso Judicial y/o medida Cautelar:** No Aplica

6. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Tipo Aporte	Aportes en Dinero	Patrimonio
Cuenta Contable	35050501001	3
abr-25	$ 1.367.860.723,00	$ 1.367.860.723,00
may-25	-	$ 1.231.552.596,00
jun-25	-	$ 855.895.779,00
jul-25	-	$ 822.139.546,00
ago-25	-	$ 754.591.385,00
sep-25	-	$ 754.591.385,00
oct-25	-	$ 584.779.564,00
nov-25	-	$ 483.529.288,00
dic-25	-	$ 483.529.288,00
ene-26	$395.748,21	$ 461.944.496,61
feb-26	$1.846.601,00	$ 273.261,00
mar-26	-	$ 0,00
Total	**$ 1.370.103.072,21**	**-**

Cifras en Pesos MCTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria
PRI Principles for Responsible Investment
icontec ISO 9001 SC2779-1
Great Place To Work. Certificado

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

En la cuenta contable de aportes se registran los recursos recibidos por concepto del anticipo, así como los aportes efectuados directamente por el fideicomitente para cubrir los gastos bancarios y/o fondo de revisoría fiscal.

6.1 Comportamiento, Estado y/o Cumplimiento de la entrega de los Bienes Fideicomitidos y/o Ingreso Esperado:

Recursos o ingreso esperado pactado a recibir en el contrato	Recursos recibidos a la fecha de esta rendición	Cumplimiento
1.367.860.723,00	1.367.860.723,00	100%

Cifras en Pesos MCTE

7. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS

Durante la vigencia del contrato de fiducia, se efectuaron pagos por valor $ 1.367.860.723,00, con cargo a los recursos objeto del anticipo, lo cuales fueron instruidos por parte del Fideicomitente y aprobados por el Interventor[2], acorde con el plan de inversión del anticipo informado.
Ver Anexo No. 2 – Relación de Pagos

7.1 Fuentes y usos:

Fuentes: Son los recursos a favor del Fideicomitente, provenientes de la Entidad Estatal, recibidos por concepto del anticipo del contrato No. 02905 del 16 de diciembre de 2024.

Usos: Realizar los pagos que instruya el Fideicomitente de acuerdo con el plan de manejo del anticipo aprobado por el interventor y/o supervisor y la Entidad Publica Contratante hasta la concurrencia de los recursos fideicomitidos, se debe girar los rendimientos a la Entidad Estatal.

Número de pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo:

Periodo	Número de pagos	Valor ($)	Formas de pago
abr-25	-	-	-
may-25	3	$ 136.308.127,00	ACH
jun-25	11	$ 375.656.817,00	ACH
jul-25	2	$ 33.756.233,00	ACH
ago-25	3	$ 67.548.161,00	ACH
sep-25	-	-	-
oct-25	7	$ 169.811.821,00	ACH
nov-25	4	$ 101.250.275,95	ACH
dic-25	-	-	-
ene-26	1	$ 21.879.000,00	ACH

[2] Es la persona natural o jurídica a través de la cual la ENTIDAD ESTATAL vigila la correcta ejecución del CONTRATO ESTATAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

Periodo	Número de pagos	Valor ($)	Formas de pago
feb-26	2	$ 461.650.288,00	ACH
mar-26	-	-	-
TOTAL	**33**	**$ 1.367.860.722,95**	

Cifras en Pesos MCTE

8. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

Rendimientos

Mes	Cuenta Ahorros
ene-25	$ 0,00
feb-25	$ 0,00
mar-25	$ 0,00
abr-25	$ 82.448,79
may-25	$ 109.869,71
jun-25	$ 91.511,98
jul-25	$ 71.927,10
ago-25	$ 69.347,16
sep-25	$ 62.073,39
oct-25	$ 52.612,55
nov-25	$ 45.324,83
dic-25	$ 41.095,88
ene-26	$ 39.656,98
feb-26	$ 11.935,48
mar-26	$ 1,20
TOTAL	**$ 677.805,05**

Cifras en Pesos MCTE

9. GASTOS

Gastos Bancarios:

Mes	Valor
ene-25	$ 0,00
feb-25	$ 0,00
mar-25	$ 0,00
abr-25	$ 0,00
may-25	$ 31.892,00
jun-25	$ 99.484,00
jul-25	$ 15.946,00
ago-25	$ 34.748,00
sep-25	$ 6.545,00
oct-25	$ 63.784,00
nov-25	$ 39.865,00
dic-25	$ 6.902,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria
PRI Principles for Responsible Investment
icontec ISO 9001 SC2779-1
Great Place To Work. Certificado

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

Mes	Valor
ene-26	$ 13.804,00
feb-26	$ 20.706,00
mar-26	$ 13.804,00
Total	**$ 347.480,00**

Cifras en Pesos MCTE

Gastos a los Movimientos Financieros GMF:

Mes	Valor
ene-25	$ 0,00
feb-25	$ 0,00
mar-25	$ 0,00
abr-25	$ 0,00
may-25	$ 545.689,87
jun-25	$ 1.503.464,65
jul-25	$ 135.454,76
ago-25	$ 270.619,33
sep-25	$ 303,57
oct-25	$ 679.750,74
nov-25	$ 405.371,01
dic-25	$ 208,91
ene-26	$ 87.735,60
feb-26	$ 1.846.842,61
mar-26	$ 1.104,34
Total	**$ 5.476.545,39**

Cifras en Pesos MCTE

10. CUENTAS POR COBRAR

A la fecha de corte de la presente rendición, no existen cuentas por cobrar.

11. CUENTAS POR PAGAR

A la fecha de corte de la presente rendición, no existen cuentas por pagar.

12. VALOR COMISIÓN FIDUCIARIA Y ESTADO

Para determinar el valor de la remuneración a favor de LA FIDUCIARIA, se aplicarán las siguientes reglas:

Una vez ingresen los recursos del ANTICIPO a las cuentas de EL FIDEICOMISO, la remuneración del contrato será asumida por LA FIDUCIARIA y SUS VINCULADAS en los términos de los acuerdos celebrados por éstas.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

La remuneración cubre la realización de hasta quince (15) Desembolsos o Reembolsos mensuales a nivel nacional. Por cada DESEMBOLSO o REEMBOLSO adicional al mes, LA FIDUCIARIA tendrá derecho a percibir TREINTA MIL PESOS MÁS IVA ($30.000+ IVA).

Durante la liquidación del FIDEICOMISO, la remuneración del contrato será asumida por LA FIDUCIARIA y SUS VINCULADAS en los términos de los acuerdos celebrados por éstas.

En aquellos casos en los cuales no se transfieran los recursos provenientes del ANTICIPO pactado en el CONTRATO ESTATAL, LA FIDUCIARIA cobrará por una sola vez una suma equivalente a UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (1 SMMLV) más IVA, que corresponde al valor de la remuneración por concepto de liquidación a favor de LA FIDUCIARIA.

Las comisiones arriba descritas generan IVA y serán pagadas dentro de los primero cinco (5) días del mes siguiente a su causación. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, esta comisión no podrá ser descontada de los recursos administrados en el fideicomiso

Fecha de Ingreso de Recursos: 09 de abil de 2025

Durante el periodo de la presente rendición final de cuentas, se realizó la causación de las siguientes comisiones:

Periodo	No. Factura	Monto Comisión fiduciaria causada	Monto Comisión fiduciaria pagada	Saldo (s)	Estado
De Abril de 2025 a marzo de 2026				-	No se generó cobro por este concepto
Total		-	-	-	

13. DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

13.1 Actividades Administrativas Operativas:

Actividad	SI	NO	N/A
Apertura Cuenta Bancaria	X		
Inversión Recursos en FIC		X	
Envío Informes Mensuales	X		
Envío Rendición Semestral de Cuentas	X		
Gestión Cobro Comisiones Fiduciarias			X
Se realizaron pagos	X		
Control Plan de Inversión de Anticipo	X		
Giro de Rendimientos Financieros	X		
Cancelación Cuentas Bancarias	X		
Cancelación FIC		X	
Solicitud Actualización Sarlaft	X		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria
PRI Principles for Responsible Investment
icontec ISO 9001 SC2779-1
Great Place To Work. Certificado

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

13.2 Estado de las Obligaciones a cargo de la Fiduciaria

Obligación Fiduciaria	Estado actual	Observaciones
1. Recibir de la ENTIDAD ESTATAL por cuenta de EL FIDEICOMITENTE, las sumas correspondientes al ANTICIPO y notificar sobre el ingreso de tales dineros a la cuenta abierta a nombre del FIDEICOMISO dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir del momento en que tenga conocimiento de tal situación. PARÁGRAFO: Si el valor consignado a la cuenta del Patrimonio Autónomo por parte de la ENTIDAD ESTATAL es inferior al valor establecido en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO por efectos de retenciones o contribuciones descontadas, LA FIDUCIARIA aplicará para cada rubro el porcentaje previsto en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, respecto al valor total recibido. Para tal efecto, LA FIDUCIARIA, notificará de este hecho al FIDEICOMITENTE y controlará que los DESEMBOLSOS y/ REEMBOLSOS no excedan los porcentajes establecidos por rubro	Cumplida	
2. Manejar la liquidez de los recursos del FIDEICOMISO en las condiciones establecidas en el numeral 6.2 del Capítulo VI.	Cumplida	
3. Efectuar los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS ordenados por el AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, exclusivamente con base en lo establecido en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN del ANTICIPO, de conformidad con el procedimiento detallado por el numeral 6.1 del presente contrato y el INSTRUCTIVO OPERATIVO.	Cumplida	
4. Entregar a la ENTIDAD ESTATAL los recursos aportados por concepto de ANTICIPO, así como sus excedentes, cuando esta notifique a la FIDUCIARIA el acto administrativo debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada del CONTRATO ESTATAL, la caducidad administrativa, o la nulidad del CONTRATO ESTATAL. En este caso, el FIDEICOMITENTE autoriza irrevocablemente a la FIDUCIARIA mediante la firma del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL a entregar los recursos excedentes del ANTICIPO a la ENTIDAD ESTATAL.	No se presentó esta situación	
5. No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones	Cumplida	
6. Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de ANTICIPO contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE, así como las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano. Su ejercicio está supeditado a la información que sobre los hechos que los hagan exigibles le suministre EL FIDEICOMITENTE, quien es por lo tanto responsable de los perjuicios que se causen por tales omisiones, salvo en el caso en que LA FIDUCIARIA los conozca primero que EL FIDEICOMITENTE.	Cumplida	
7. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. En estos casos el Superintendente citará previamente a la FIDUCIARIA y FIDEICOMITENTE.	No se presentó esta situación	
8. Llevar el informe financiero con fines de supervisión del FIDEICOMISO de forma separada y discriminada de los otros negocios fiduciarios, de tal manera que EL FIDEICOMITENTE pueda verificar en cualquier momento la correcta ejecución del contrato.	Cumplida	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria
PRI Principles for Responsible Investment
icontec ISO 9001 SC2779-1
Great Place To Work. Certificado

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

Obligación Fiduciaria	Estado actual	Observaciones
9. Rendir cuentas de su gestión al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD ESTATAL, de conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 del Capítulo X del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.	Cumplida	
10. Enviar mensualmente al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD ESTATAL un informe financiero con fines de supervisión de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, debiendo presentar: la situación financiera del FIDEICOMISO, relación de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS efectuados con los recursos del FIDEICOMISO, copia de los extractos bancarios y/o de extractos de los recursos del FIDEICOMISO administrados en los Fondos de Inversión Colectiva, ejecución del PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Este informe se deberá remitir a los correos electrónicos registrados en el presente Contrato y/o en las direcciones de correo electrónico autorizadas por el FIDEICOMITENTE. Igualmente será remitida al(os) citado(s) correo(s) electrónico(s), cualquier tipo de información relacionada con el desarrollo del presente Contrato.	Cumplida	
11. Efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la cual se ejecuten la totalidad de recursos que hayan sido trasferidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO, la rendición final de cuentas, sin requerir instrucción del fideicomitente.	En trámite	Con la aceptación por parte del fideicomitente de la presente rendición final de cuentas, se procederá con la liquidación del fideicomiso.
12. Registrar los rendimientos financieros originados por la administración de los recursos provenientes del ANTICIPO, así como los correspondientes a los dineros aportados por EL FIDEICOMITENTE como parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO, en caso de que los mismos no deban ser consignados a la ENTIDAD ESTATAL.	No se presentó esta situación	
13. Girar un cheque de gerencia a nombre de la ENTIDAD ESTATAL, en caso de que la misma no suministre los datos de la cuenta bancaria para la devolución de los rendimientos y/o excedentes a que hubiere lugar, en el caso que se presente algún error en la cuenta registrada en el presente contrato.	No se presentó esta situación	
14. Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de conformidad con lo establecido en las reglas adicionales contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO.	Cumplida	

13.3 Pólizas del Negocio Fiduciario establecidas en el Contrato:

13.3.1 A cargo de la Fiduciaria: No aplica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria
PRI Principles for Responsible Investment
icontec ISO 9001 SC2779-1
Great Place To Work. Certificado

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

13.3.2 A cargo de Fideicomitente:

No. Póliza	Aseguradora	Tipo de cobertura (cumplimiento, salarios, global bancaria, etc.)	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
85309	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2.036.400.000,00	23/01/2025	26/02/2027
	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1.367.860.723,00	23/01/2025	26/02/2027
	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2.036.400.000,00	23/01/2025	26/08/2029
	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1.357.600.000,00	26/08/2026	26/08/2028

13.4 Estado actual de las Obligaciones del Fideicomitente:

Obligación Fideicomitente	Estado actual	
1. Notificar a la ENTIDAD ESTATAL la celebración del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL y solicitar que los recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la FIDUCIARIA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1 del Capítulo V del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. El FIDEICOMITENTE no puede recibir suma alguna de dinero por concepto de ANTICIPO de la ENTIDAD ESTATAL.	Cumplida	
2. Remitir por escrito a la FIDUCIARIA el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN del ANTICIPO firmado por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL	Cumplida	
3. Informar a LA FIDUCIARIA y obtener el diligenciamiento del FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO suministrado por ésta, de las firmas autorizadas para la ordenación de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS por parte del FIDEICOMITENTE, junto con el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR de EL CONTRATO ESTATAL.	Cumplida	
4. Enviar a la FIDUCIARIA las órdenes de DESEMBOLSOS o REEMBOLSOS junto con la aprobación del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, de acuerdo con lo establecido en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, cumpliendo siempre con las especificaciones detalladas en el numeral 6.1 del capítulo VI del presente Contrato	Cumplida	
5. Custodiar bajo su exclusiva responsabilidad todos los documentos que soportan la realización de cada orden de DESEMBOLSO o REEMBOLSO que le sea instruida a LA FIDUCIARIA por este a través del DESIGNADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES	Cumplida	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria
PRI Principles for Responsible Investment
icontec ISO 9001 SC2779-1
Great Place To Work. Certificado

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

Obligación Fideicomitente	Estado actual	
Dicha obligación se entenderá cumplida por parte del FIDEICOMITENTE cada vez que a través del AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES le instruya a la FIDUCIARIA ordenes de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO. Adicionalmente EL FIDEICOMITENTE se obliga a suministrar a la autoridad administrativa, de auditoría, de control y/o judicial que requiera documentos específicos relacionados con órdenes de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, los soportes que sean requeridos por estas para tales fines.		
6. Efectuar todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya lugar, de cada uno de los DESEMBOLSOS que se registren y sean atendidos con los RECURSOS del ANTICIPO, razón por la cual es EL FIDEICOMITENTE el responsable ante la DIAN y ante las autoridades fiscales por dichas retenciones y por la expedición de los certificados correspondientes a las mismas.	Cumplida	
7. Allegar a LA FIDUCIARIA en cada orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO una certificación suscrita por el representante legal del FIDEICOMITENTE o del representante del consorcio o unión temporal, según aplique, en la que conste que está cumpliendo con las obligaciones de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones, cuando se den las condiciones previstas en el numeral 6.1. del capítulo VI del presente contrato, así como que ha realizado el abono en cuenta de la obligación a su cargo correspondiente al DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO solicitado.	Cumplida	
8. Informar a la FIDUCIARIA quién es la persona que debe actuar como INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y entregar los documentos que soporten dicha calidad.	Cumplida	
9. Informar a la FIDUCIARIA cada vez que se dé el cambio del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y/o el cambio de las firmas registradas en el FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO, con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles contados a partir del momento en el cual se deba radicar en LA FIDUCIARIA la respectiva orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO y entregar los documentos que acrediten el cambio y que ameriten la actualización del FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO.	No se presentó esta situación	
10. Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de su ocurrencia, las modificaciones de los datos de correo electrónico, dirección, domicilio, teléfonos, razón social, representación legal, y cualquier circunstancia que modifique la información reportada en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera (Circular Básica Jurídica) y todas aquellas que la aclaren, modifiquen o adicionen.	No se presentó esta situación	
11. Informar a la FIDUCIARIA las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, terminación anticipada y reinicios del CONTRATO ESTATAL.	Cumplida	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

PRI Principles for Responsible Investment
icontec ISO 9001 SC2779-1
Great Place To Work. Certificado

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

Obligación Fideicomitente	Estado actual	
En el evento que el CONTRATO ESTATAL se encuentre suspendido, el FIDEICOMITENTE se abstendrá de solicitar DESEMBOLSOS o REEMBOLSOS a menos que el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL haya aprobado una orden de DESEMBOLSO y /o REEMBOLSO correspondiente a una fecha anterior a la suspensión del CONTRATO ESTATAL.		
12. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual ingresen los recursos del ANTICIPO o por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha en que se deba realizar el primer DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO (lo que primero ocurra), entregar los siguientes documentos y recursos a LA FIDUCIARIA, con el fin que ésta pueda dar inicio a la ejecución del presente contrato: 1. Copia del PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, aprobado por EL INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, según corresponda, debidamente firmado. 2. Copia del contrato de interventoría y/o acta de designación del SUPERVISOR y copia de sus documentos de identidad. 3.FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO firmado por el AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES y por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL.	Cumplida	
13. Aportar directamente los recursos para el pago de la comisión fiduciaria cuando a ello haya lugar, conforme al inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, así como los costos y gastos del FIDEICOMISO. La obligación por parte del FIDEICOMITENTE de proceder al pago de la remuneración a favor de LA FIDUCIARIA no será cumplida por este, cuando la remuneración pactada en el presente contrato sea asumida en su totalidad por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los acuerdos celebrados por éstas, de conformidad con lo establecido en el Literal E del capítulo Introductorio del presente contrato. En caso de llegar a pactarse en el Literal E del Capítulo Introductorio del presente contrato, que parte de la remuneración que perciba LA FIDUCIARIA sea pagada por parte del FIDEICOMITENTE, éste deberá aportar directamente los recursos a su cargo a que hubiere lugar.	No aplica	
14. Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré con espacios en blanco con carta de instrucciones, como garantía del pago de las comisiones fiduciarias y demás costos y gastos que por virtud de este contrato se obliga a pagar a su favor. La presente obligación no será cumplida por EL FIDEICOMITENTE, cuando la remuneración de este contrato sea asumida en su totalidad por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los acuerdos celebrados por éstas, de conformidad con lo establecido en el Literal E del capítulo Introductorio del presente contrato.	No aplica	
15. Dar aviso inmediato a LA FIDUCIARIA sobre cualquier circunstancia de la que tenga conocimiento, que pueda afectar la propiedad y el ejercicio de la posesión quieta y pacífica de los bienes administrados, tales como: (a) medidas administrativas o	No se presentó esta situación	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

PRI Principles for Responsible Investment
icontec ISO 9001 SC2779-1
Great Place To Work. Certificado

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

Obligación Fideicomitente	Estado actual	
precautelares de cualquier orden que afecten de manera significativa su funcionamiento. (b) decisiones, debidamente ejecutoriadas, proferidas por terceros que puedan afectar la titularidad y existencia de los bienes administrados, o la validez o eficacia del presente contrato.		
16. Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de conformidad con lo establecido en las reglas adicionales contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO.	Cumplida	

13.5 Comunicaciones relevantes remitidas/recibidas durante el periodo

Fecha	Asunto	Remitente	Estado actual	Observaciones
Mensual	Informes	Fiduciaria de Occidente S.A. / Aval fiduciaria.	No requiere trámite	
16/05/2025	Autorización suministro información por correo	Consorcio Alfa	No requiere trámite	
21/07/2025	Rendición semestral de cuentas del periodo comprendido entre julio a diciembre de 2025,	Fiduciaria de Occidente S.A.	No Requiere trámite	
3/12/2025	Plazos para la radicación de órdenes de pago e instrucciones de giro vigencia 2025	Fiduciaria de Occidente S.A.	No requiere trámite	

14. DISPONIBLE (PARTIDAS CONCILIATORIAS)

14.1 Partidas Conciliatorias: No se presentan partidas conciliatorias.

14.2 Cheques Pendientes de Cobro: No se presentan cheques pendientes de cobro.

15. RELACIÓN PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

15.1 Quejas y Reclamos: Durante el periodo objeto de la presente rendición final de cuentas no se registraron quejas y reclamos.

15.2 Procesos: Durante el periodo de la presente rendición final de cuentas, la Fiduciaria no fue notificada de ningún proceso jurídico a favor/o en contra del negocio.

16. INFORMACIÓN SEGÚN TIPOLOGIAS

NEGOCIOS ANTICIPOS LEY 1474: Los recursos recibidos del anticipo desembolsados por la Entidad Pública Contratante correspondieron a la suma de **$ 1.367.860.723,00** los cuales fueron consignados en el 09 de abril de 2025 en la cuenta No. 263-87498-4 a nombre de PA 319298 CONSORCIO ALFA Nit. 830.054.076 y ejecutados de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte del fideicomitente y autorizados por el interventor.
Para más información ver Anexo No. 4 – PMA Detallado

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

17. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL -COMITES

El contrato Fiduciario no prevé realización de comités fiduciarios.

18. TERCEROS VINCULADOS

Durante el periodo objeto de la presente rendición final de cuentas, no se vincularon terceros que aporten recursos al Patrimonio Autónomo.

19. ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL NEGOCIO

Cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, Aval Fiduciaria S.A. procedió a adelantar las actividades necesarias para la terminación y liquidación del Fideicomiso, así:

Requisitos de liquidación	Estado Actual	Observaciones
Comisiones fiduciarias al día.	Cumplida	Ver detalle en el ítem No.12 de la presente rendición.
Cuentas canceladas y/o FIC	Cumplida	Ver detalle en el ítem No.5.1 de la presente rendición.
Cumplimiento Plan de Inversión del Anticipo	Ejecutado	Con corte al mes febrero de 2026 fueron ejecutados en su totalidad los recursos del anticipo.
Informe Financiero en ceros.	Cumplida	Con corte al mes marzo de 2026 se deja Informe Financiero.
Giro de rendimientos a la Entidad Estatal y/o Fideicomitente.	Cumplida	Trasladados a la cuenta bancaria informada por el cliente.
Restitución de recursos excedentes del Fondo de Revisoría Fiscal al Fideicomitente.	Cumplida	Ver detalle en el ítem No.5.1 de la presente rendición.
Restitución de recursos excedentes del Anticipo a la Entidad Estatal.	No Aplica	

A continuación, presentamos el Estado general de los recursos administrados, cuyo saldo se refleja en ceros:

Informe Financiero	Valor total
Aportes	
Aporte Entidad Contratante	1.367.860.723,00
Aportes Fideicomitente Revisoria Fiscal	-
Aportes Fideicomitente Gastos Bancarios	6.082.378,00
Valor Total	**1.373.943.101,00**
Ingresos	
Rendimientos Cuenta de Ahorros	677.805,05
Rendimientos Fic Occitesoros	-
Valor Total	**677.805,05**
Valor Total Disponible	**1.374.620.906,05**
Pagos	**Valor**
Pagos Efectuados	(1.367.860.722,95)
Pago de comision fiduciaria	-
Pago de revisoría fiscal	-
Gastos bancarios	(347.480,00)
Retencion por utilidad	-
GMF (4 por mil)	(5.476.545,39)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

PRI Principles for Responsible Investment
icontec ISO 9001 SC2779-1
Great Place To Work. Certificado

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

Informe Financiero	Valor total
Valor Total	**(1.373.684.748,34)**
Devolución Rendimientos - Remanentes Entidad Estatal	
Devolución Rendimientos Entidad Estatal	(677.803,85)
Devolución Excedentes Fideicomitente	(258.353,86)
Valor Total Pagos	(1.374.620.906,05)
Saldo Fideicomiso	**-**

Una vez aprobada la rendición final de cuentas, se procederá con la Liquidación automática del contrato.

20. OTROS ASPECTOS E INFORMACIÓN RELEVANTE

20.1 Información SARLAFT

Para Aval Fiduciaria S.A. como para las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la prevención y el control del lavado de activos es uno de los deberes más importantes, por esta razón Aval Fiduciaria S.A. tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para lo cual es muy importante tener actualizada la información de nuestros fideicomitentes y beneficiarios de contratos fiduciarios.

De acuerdo con lo anterior, nos permitimos informar el estado de la actualización de la información del Fideicomitente (s) y/o Beneficiario del contrato Fiduciario.

Nombre	Tipo de vinculación	Fecha de última actualización	Estado actual	Observaciones
VIAS Y CANALES SAS	Fideicomitente	Ene-25	Desactualizada	
OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA	Fideicomitente	Ene-25	Desactualizada	

Para más información, por favor consulte la cartilla SARLAFT en nuestra página de internet www.avalfiduciaria.com, en servicio y experiencia al cliente la sección Defensor al Consumidor Financiero y haciendo clic en Educación al Consumidor Financiero.

20.2 Gestión de Riesgo Operativo

Aval Fiduciaria S.A. cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operativo que le permite monitorear la evaluación de los riesgos de los procesos asociados a la administración de los negocios fiduciarios.

20.3 Unidad de Atención Al Consumidor Financiero

Con el fin de identificar situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la debida atención, principio de trato justo, respeto y servicio hacia los Consumidores Financieros, Aval Fiduciaria S.A. cuenta con diferentes medios de contacto para que los mismos puedan acceder a ella a fin de presentar una PQRS (petición, queja, reclamo o solicitud). Tales medios de contacto son:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

- Formulario PQRS: al cual se puede acceder a través de la página web: www.avalfiduciaria.com
- Línea gratuita Nacional de atención al Consumidor Financiero: 01 8000 189799
- Línea directa de atención al Consumidor Financiero Bogotá (601) 6108164
- Correspondencia escrita o presencial, que puede ser radicada en cualquier oficina de Aval Fiduciaria o XXXXX a nivel nacional, dentro de los horarios de atención.

De igual manera, los Consumidores Financieros podrán interponer sus inconformidades o solicitudes a cualquiera de las siguientes instancias, las cuales atenderán dentro del alcance que señale la normatividad vigente:

- Defensor del Consumidor Financiero: Se recomienda consultar el alcance de las funciones del Defensor, información que se encuentra disponible en la página web: www.avalfiduciaria.com
- Superintendencia Financiera de Colombia: Recibe cualquier petición del consumidor financiero.
- AMV (Autorregulador del mercado de valores de Colombia): Esta entidad tiene alcance con respecto a los siguientes productos: Fondos de Inversión Colectiva (FIC), Fondos de Capital Privado (FCP) y Portafolios Individuales de Inversión.

20.4 Defensor Del Consumidor Financiero

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora BERTHA MARÍA GARCÍA MEZA y su suplente es la doctora CAMILO ALEJANDRO CARREÑO BARRENECHE. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas:

- defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com

También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 10 No.97ª - 13 Oficina 502 Bogotá - Teléfono 601 6108164 o a cualquier oficina de Aval fiduciaria en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 6:00 p.m., jornada continua

20.5 Revisor Fiscal

Aval Fiduciaria S.A. informa que nuestro Revisor Fiscal es Jeimy Julieth Aldana Chaparro y el Revisor Fiscal Suplente es Hovana Catherine Capera Valbuena. Si evidencia diferencias en la información reportada en la presente rendición, favor comunicarla al e-mail: colombia@kpmg.com de la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. de la Sociedad Fiduciaria.

20.6 Fondos de Inversión Colectiva - FIC

En cumplimiento a la Circular Externa 031 de agosto de 2004 que reordena el Capítulo XXI de la Circular Externa 100 de 1995 y sustituida por la Circular 006 de 2025 de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fiduciaria está efectuando el cálculo del Valor en Riesgo (Ver) sobre las inversiones de su fideicomiso según la metodología indicada por la Superintendencia Financiera cuyos resultados son transmitidos mensualmente a ese ente de control".

20.7 Código de Ética y Conducta

Aval Fiduciaria S.A cuenta con un Código de Ética y Conducta a través del cual se trazan las pautas generales de comportamiento que deben mantener sus Empleados y Directivos, de manera que sus actuaciones se

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

ajusten a los principios y valores corporativos, las obligaciones asumidas en virtud de la relación laboral y el comportamiento ético indispensable para asegurar la transparencia en las relaciones internas, con terceros y con la sociedad. Así las cosas, los Directivos y Empleados de Aval Fiduciaria S.A. deben conducir los negocios, atender los procedimientos y ejercer sus funciones, con lealtad, claridad, transparencia, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento para la creación de valores en busca del bienestar social, ajustando su conducta de manera que a través de ella se actúe en condiciones éticas de responsabilidad, carácter e idoneidad profesional, primando el interés general sobre el interés particular.

Asimismo, Aval Fiducuaria S.A. está comprometida con una política de cero tolerancia frente al fraude y la corrupción en cualquiera de sus modalidades, razón por la cual adoptó unas Políticas anti-fraude y anti-corrupción aplicables a todos sus Empleados y Directivos, entidades vinculadas y, en ciertas circunstancias, a sus Proveedores y Clientes, las cuales están basadas en los más altos estándares éticos contenidos en regulaciones nacionales e internacionales[1] como mecanismo para prevenir detectar, investigar y corregir eventos de fraude y la corrupción, promover la transparencia en la gestión de la administración, disuadir las conductas indebidas, incentivar nuestro compromiso contra el fraude y la corrupción y fortalecer la confianza de las relaciones entre Aval Fiduciaria S.A. con sus Empleados, Directivos, Clientes, Proveedores, Prestadores de Red, Outsourcing, Usuarios, Beneficiarios Finales y en general, con el público en general, garantizando un adecuado desempeño de todas sus actuaciones.

Consulte el Código de Ética y Conducta en nuestra página de Internet www.avalfiduciaria.com, Sección nuestra empresa /Quiénes Somos / Código de Ética y Conducta.

Los reportes se pueden realizar a través de:

La página de internet de la Fiduciaria https://www. avalfiduciaria.com/linea-etica

[1] Diseñada bajo el marco de referencia de control interno establecido por el Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission.

20.8 Seguridad de la Información

Aval Fiduciaria S.A. en cumplimiento de lo previsto en el Circular Básica Jurídica 006 de 2025 de la Superintendencia Financiera de Colombia, ha implementado un sistema de seguridad para transmisión de datos y/o información confidencial a sus clientes.

Es importante señalar que, en cumplimiento de lo dispuesto en la circular antes mencionadas, la Fiduciaria deberá abstenerse de suministrar información de los negocios administrados vía telefónica o por correo electrónico, cuando no se cuente con las autorizaciones correspondientes.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

Con el fin de poder atender vía correo electrónico los requerimientos de información inherentes a la administración del negocio al fideicomitente y/o interventor y/o supervisor, éstos deben registrar ante la Fiduciaria las direcciones de correo a las cuales deberá enviarse la información solicitada.

Igualmente el Fideicomitente y/o Constituyente se compromete a actualizar ante la Fiduciaria cualquier cambio y/o de modificaciones de personas autorizadas, dirección de correo electrónico o cualquier otra información relevante para el normal desarrollo y ejecución del negocio fiduciario.

21. REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN DE RETENCIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO POR PARTE DEL(LOS) FIDEICOMITENTE(S)

Con la aceptación de la presente rendición de cuentas por parte **DEL(LOS) FIDEICOMITENTE(S)** a través de cualquier medio escrito, deberá entenderse que éste(os) declara(n) que realizó(realizaron) la presentación y pago de todas las retenciones carácter tributario a que hubo lugar, con ocasión de los DESEMBOLSOS, según este término ha sido definido en el contrato de fiducia.

22. ANEXOS

ANEXO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. Para información del fideicomitente y fines pertinentes, en éste anexo se presenta la información financiera del negocio fiduciario, los cuales reflejan su comportamiento financiero y todas las operaciones efectuadas con corte a marzo de 2026, y permiten identificar el estado de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos y gastos.
ANEXO 2. RELACIÓN DE PAGOS
ANEXO 3. EXTRACTOS CUENTAS BANCARIAS Y/0 EXTRACTOS DE FIC'S Y FICHA TECNICA DE LOS FIC.
ANEXO 4. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO – PMA

23. EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL(LOS) FIDEICOMITENTE(S) DE LA PRESENTE RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS:

De conformidad con lo establecido en el numeral 12.1 del contrato de fiducia mercantil constitutivo del patrimonio autónomo denominado "319298 CONSORCIO ALFA ", suscrito de común acuerdo entre el (los) fideicomitente(s) y Aval Fiduciaria S.A., la aceptación de la presente rendición final de cuentas por parte de éste(os) a través de cualquier medio escrito, tendrá los siguientes efectos:

a) Confirmar la declaración contenida en la presente rendición final de cuentas, conforme a la cual EL FIDEICOMITENTE realizó la presentación y pago de todas las retenciones carácter tributario a que hubo lugar, con ocasión de los DESEMBOLSOS.
b) Confirmar la declaración mutua de paz y salvo entre las partes, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, contenida en la rendición final de cuentas.

c) Terminar extrajudicialmente litigios pendientes o precaver litigios eventuales con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, las Partes acuerdan que, una vez aceptada la rendición final de cuentas por parte de EL FIDEICOMITENTE, el documento en el que conste la misma, junto con la manifestación escrita de aceptación frente a su contenido por parte de EL FIDEICOMITENTE, constituirá transacción sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, con efectos de cosa juzgada al tenor

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION DE ANTICIPOS - CIRCULAR EXTERNA 006 DE 2025 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 319298 CONSORCIO ALFA

de lo dispuesto en los artículos 2469, 2483 y siguientes del Código Civil, y demás normas concordantes y pertinentes

d) Si EL FIDEICOMITENTE no aprueba la rendición final de cuentas o no sea posible localizarlo, LA FIDUCIARIA dejará constancia escrita de este hecho.

Omar Andrés Torres Daza
Firmado digitalmente por Omar Andrés Torres Daza
Fecha: 2026.03.27 10:07:59 -05'00'

OMAR ANDRES TORRES DAZA
REPRESENTANTE LEGAL
AVAL FIDUCIARIA ASSET MANAGEMENT

Hancy Pilar Coronado Ramirez
Firmado digitalmente por Hancy Pilar Coronado Ramirez
Fecha: 2026.03.26 18:59:19 -05'00'

HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
DIRECTORA DE NEGOCIOS ESPECIALES AVAL
FIDUCIARIA ASSET MANAGEMENT

Elaboró: Maria Catalina Orjuela Buitrago
Revisó: Andrés Felipe García Bejarano

Andres Felipe Garcia Bejarano
Firmado digitalmente por Andres Felipe Garcia Bejarano

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800140887
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO4984	*****4984

Período
2026/03/01 - 2026/03/27

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$285,196.48	$1.20	$285,197.68	$0.00

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/20	CARGO POR OTROS CONCEPTOS SIN GMF	M222984	$8.008,82	$0,00
2026/03/17	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A508989	$5.800,00	$0,00
2026/03/17	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A513350	$250.345,04	$0,00
2026/03/17	IVA COBRADO	A509147	$1.102,00	$0,00
2026/03/17	GMF	0000000	$1.028,99	$0,00
2026/03/17	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,07
2026/03/16	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,07
2026/03/16	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,07
2026/03/16	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,07
2026/03/13	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,07
2026/03/12	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,07

Estado Cuentas Pagadas
319298 FID 319298 CONSORCIO ALFA

Periodo Desde 01/04/2025 hasta 31/12/2025

Vigencia : 2025

									DESCUENTOS					
Nit	Descripción	Recu	OrPa	V.doc	TpDo	NroDoc	Vr. Bruto	Iva	Rete Fuente	Rete Iva	Rete ICA	Otros	Reintegros	Vr. Neto
1022388950	ALFARO GALLO ANDREA CAROLINA		5				31,875,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31,875,000.00
1088310400	LASSO GUEVARA MILEIDY		3				14,533,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,533,800.00
1088310400	LASSO GUEVARA MILEIDY		7				39,621,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39,621,400.00
1088310400	LASSO GUEVARA MILEIDY		15				64,156,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	64,156,680.00
1088310400	LASSO GUEVARA MILEIDY		23				58,948,161.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	58,948,161.00
1088310400	LASSO GUEVARA MILEIDY		25				9,843,370.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,843,370.00
1088310400	LASSO GUEVARA MILEIDY		34				35,743,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,743,450.00
1090481882	VILLAMIL DUARTE JUAN SEBASTIAN		12				5,702,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,702,040.00
1090481882	VILLAMIL DUARTE JUAN SEBASTIAN		26				4,861,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,861,530.00
1090481882	VILLAMIL DUARTE JUAN SEBASTIAN		36				3,781,190.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,781,190.00
1117544994	RAMOS ROA YONIER LEONARDO		13				1,866,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,600.00
1117544994	RAMOS ROA YONIER LEONARDO		22				5,600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
12229097	MUÑOZ MILLAN GERMAN		11				14,058,219.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,058,219.00
319298	CONSORCIO ALFA		30				42,633,415.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	42,633,415.00
79388230	ALEMAN CIFUENTES JORGE ENRIQUE		6				1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
79388230	ALEMAN CIFUENTES JORGE ENRIQUE		21				3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		1				82,448.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	82,448.79
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		8				109,869.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	109,869.71
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		17				91,511.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91,511.98
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		20				71,927.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	71,927.10
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		24				69,347.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	69,347.16
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		29				62,073.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	62,073.39
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		33				52,612.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	52,612.55
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		38				45,324.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	45,324.83
900291838	AIRAVATA SAS		18				10,710,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,710,000.00
900392689	GEOSENSE S.A.S.		14				45,815,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	45,815,000.00
900392689	GEOSENSE S.A.S.		27				19,635,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,635,000.00
900886294	WATERBLASTING SAS		16				140,973,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	140,973,440.00
901105420	JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONS		4				8,925,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,925,000.00
901707929	CONSORCIO ALFA		2				112,849,327.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	112,849,327.00
901707929	CONSORCIO ALFA		9				3,290,438.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,290,438.00
901707929	CONSORCIO ALFA		10				26,798,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	26,798,000.00
901707929	CONSORCIO ALFA		19				23,046,233.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23,046,233.00
901707929	CONSORCIO ALFA		28				62,222,290.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	62,222,290.00
901707929	CONSORCIO ALFA		31				19,670,816.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,670,816.00
901707929	CONSORCIO ALFA		32				10,945,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,945,400.00

Estado Cuentas Pagadas
319298 FID 319298 CONSORCIO ALFA

Periodo Desde 01/01/2026 hasta 27/03/2026

Vigencia : 2026

Nit	Descripción	Recu	OrPa	V.doc	TpDo	NroDoc	Vr. Bruto	Iva	DESCUENTOS				Reintegros	Vr. Neto
									Rete Fuente	Rete Iva	Rete ICA	Otros		
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		2				41,095.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	41,095.88
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		4				39,656.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39,656.98
899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE		6				11,935.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,935.48
901707929	CONSORCIO ALFA		1				21,879,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,879,000.00
901707929	CONSORCIO ALFA		3				90,954,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	90,954,040.00
901707929	CONSORCIO ALFA		5				370,696,248.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	370,696,248.00
901707929	CONSORCIO ALFA		7				250,345.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,345.04
901707929	CONSORCIO ALFA		8				8,008.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.82
						Totales	483,880,330.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	483,880,330.20

Estado Cuentas Pagadas
319298 FID 319298 CONSORCIO ALFA

Periodo Desde 01/04/2025 hasta 31/12/2025

Nit	Descripción	Recu	OrPa	V.doc	TpDo	NroDoc	Vr. Bruto	Iva	Rete Fuente	Rete Iva	Rete ICA	Otros	Reintegros	Vr. Neto
901707929	CONSORCIO ALFA		35				40,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
901707929	CONSORCIO ALFA		37				21,725,636.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,725,636.00
						Totales	884,916,550.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	884,916,550.51

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: **Aval Fiduciaria S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **Nro. Identificación:** **800140887**
Generado por: **JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO4984	*****4984

Período
2026/03/01 - 2026/03/27

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$285,196.48	$1.20	$285,197.68	$0.00

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/11	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,07
2026/03/10	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,07
2026/03/09	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A959139	$11.935,48	$0,00
2026/03/09	IVA COBRADO	A959831	$1.102,00	$0,00
2026/03/09	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A959459	$5.800,00	$0,00
2026/03/09	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,08
2026/03/09	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,08
2026/03/09	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,08
2026/03/09	GMF	0000000	$75,35	$0,00
2026/03/06	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,08
2026/03/05	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,08

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800140887
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO4984	*****4984

Período
2026/03/01 - 2026/03/27

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$285,196.48	$1.20	$285,197.68	$0.00

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/04	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,08
2026/03/03	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,08
2026/03/02	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$0,08

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Fidecomiso:	319298 CONSORCIO ALFA

VALOR PMA	$ 1.367.860.723,00	DIFERENCIA PMA Y CONSIGNACION	$ 0,00	TOTAL PAGADO
VALOR ENTREGADO	$ 1.367.860.723,00	TOTAL DISPONIBLE	$ 0,00	$ 1.367.860.723,00
VALOR ANTICIPO CONTRATO	$ 1.367.860.723,00	TOTAL %	100%	

1	Transporte y alquiler de maquinaria						0,00%	$ 0,00
TERCERO	NIT	CONCEPTO	MES	ORDEN	VALOR	G.BANCARIOS	GMF	TOTAL
#N/D								
TOTAL PAGOS					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR DISPONIBLE								$ 0,0

2	Compra de equipos y repuestos						0,00%	$ 0,00
TERCERO	NIT	CONCEPTO	MES	ORDEN	VALOR	G.BANCARIOS	GMF	TOTAL
#N/D								
TOTAL PAGOS					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR DISPONIBLE								$ 0,0

3	Compra de materiales						29,24%	$ 400.000.000,00
TERCERO	NIT	CONCEPTO	MES	ORDEN	VALOR	G.BANCARIOS	GMF	TOTAL
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	05	01	$ 15.303.314,00			$ 15.303.314,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	06	03	$ 3.290.438,00			$ 3.290.438,00
AIRAVATA SAS	900291838	DESEMBOLSO	07	05	$ 10.710.000,00			$ 10.710.000,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	02-26	14	$ 370.696.248,00			$ 370.696.248,00
TOTAL PAGOS					$ 400.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.000.000,00
VALOR DISPONIBLE								$ 0,0

4	Contratacion subcontratistas						56,84%	$ 777.485.295,00
TERCERO	NIT	CONCEPTO	MES	ORDEN	VALOR	G.BANCARIOS	GMF	TOTAL
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	05	01	$ 80.700.680,00			$ 80.700.680,00
MILEIDY LASSO GUEVARA	1088310400	DESEMBOLSO	05	01	$ 14.533.800,00			$ 14.533.800,00
JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S	901105420	DESEMBOLSO	05	01	$ 8.925.000,00			$ 8.925.000,00
MILEIDY LASSO GUEVARA	1088310400	DESEMBOLSO	06	02	$ 39.621.400,00			$ 39.621.400,00
ANDREA CAROLINA ALFARO GALLO	1022388950	DESEMBOLSO	06	02	$ 31.875.000,00			$ 31.875.000,00
JORGE ENRIQUE ALEMAN CIFUENTES	79388230	DESEMBOLSO	06	02	$ 1.500.000,00			$ 1.500.000,00
GERMAN MUÑOZ MILLAN	12229097	DESEMBOLSO	06	03	$ 14.058.219,00			$ 14.058.219,00
JUAN SEBASTIAN VILLAMIL DUARTE	1090481882	DESEMBOLSO	06	03	$ 5.702.040,00			$ 5.702.040,00
GEOSENSE S.A.S.	900392689	DESEMBOLSO	06	03	$ 45.815.000,00			$ 45.815.000,00
YONIER LEONARDO RAMOS ROA	1117544994	DESEMBOLSO	06	03	$ 1.866.600,00			$ 1.866.600,00
MILEIDY LASSO GUEVARA	1088310400	DESEMBOLSO	06	04	$ 64.156.680,00			$ 64.156.680,00
WATERBLASTING SAS	900886294	DESEMBOLSO	06	04	$ 140.973.440,00			$ 140.973.440,00
MILEIDY LASSO GUEVARA	1088310400	DESEMBOLSO	08	06	$ 58.948.161,00			$ 58.948.161,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	10	07	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000,00
MILEIDY LASSO GUEVARA	1088310400	DESEMBOLSO	10	08	$ 9.843.370,00			$ 9.843.370,00
GEOSENSE S.A.S.	900392689	DESEMBOLSO	10	08	$ 19.635.000,00			$ 19.635.000,00
MILEIDY LASSO GUEVARA	1088310400	DESEMBOLSO	10	09	$ 42.633.415,00			$ 42.633.415,00
MILEIDY LASSO GUEVARA	1088310400	DESEMBOLSO	11	11	$ 35.743.450,00			$ 35.743.450,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	11	11	$ 40.000.000,00			$ 40.000.000,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	02-26	13	$ 90.954.040,00			$ 90.954.040,00
TOTAL PAGOS					$ 777.485.295,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 777.485.295,00
VALOR DISPONIBLE								$ 0,0

5	Nomina y aportes						13,92%	$ 190.375.428,00
TERCERO	NIT	CONCEPTO	MES	ORDEN	VALOR	G.BANCARIOS	GMF	TOTAL
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	05	01	$ 16.845.333,00			$ 16.845.333,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	06	03	$ 26.798.000,00			$ 26.798.000,00
CONSORCIO ALFA	901707929	DESEMBOLSO	07	05	$ 18.584.833,00			$ 18.584.833,00
CONSORCIO ALFA	901707929	DESEMBOLSO	07	05	$ 4.461.400,00			$ 4.461.400,00
JORGE ENRIQUE ALEMAN CIFUENTES	79388230	DESEMBOLSO	08	06	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00
YONIER LEONARDO RAMOS ROA	1117544994	DESEMBOLSO	08	06	$ 5.600.000,00			$ 5.600.000,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	10	07	$ 13.399.000,00			$ 13.399.000,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	10	07	$ 4.461.400,00			$ 4.461.400,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	10	07	$ 14.361.890,00			$ 14.361.890,00
JUAN SEBASTIAN VILLAMIL DUARTE	1090481882	DESEMBOLSO	10	08	$ 4.861.530,00			$ 4.861.530,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	10	09	$ 19.670.816,00			$ 19.670.816,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	10	10	$ 4.659.500,00			$ 4.659.500,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	10	10	$ 6.285.900,00			$ 6.285.900,00
JUAN SEBASTIAN VILLAMIL DUARTE	1090481882	DESEMBOLSO	11	11	$ 3.781.190,00			$ 3.781.190,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	11	11	$ 21.725.636,00			$ 21.725.636,00
CONSORCIO ALFA	901707929	REEMBOLSO	01-26	12	$ 21.879.000,00			$ 21.879.000,00
TOTAL PAGOS					$ 190.375.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.375.428,00
VALOR DISPONIBLE								$ 0,0

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

PANTALLAZO DEL SECOP EVIDENCIANDO EL CARGUE DE LAS CUENTAS

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	54	10/09/2025 9:34:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	47.143.374 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	59	1/10/2025 9:54:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	96.917.707 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	60	24/10/2025 2:11:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	126.163.132 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 004	66	19/02/2026 11:16:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	112.113.225 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 005	67	19/02/2026 4:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	328.308.966,3 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 006	68	27/03/2026 4:26:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	221.306.235,1 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 007	69	27/03/2026 4:29:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	214.897.945,4 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	FORMATO61ACTADEINICIO004 Lote 2.pdf	FORMATO61ACTADEINICIO004 Lote 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP VIGENCIA 2025 CTO 24001291 H4 LT 2 2024 - CONSORCIO ALFA-signed.pdf	RP VIGENCIA 2025 CTO 24001291 H4 LT 2 2024 - CONSORCIO ALFA-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta Parcial No. 1.pdf	Acta Parcial No. 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta Parcial No. 2.pdf	Acta Parcial No. 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta Parcial No. 3.pdf	Acta Parcial No. 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	251209-746 5 FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES_opt.pdf	251209-746 5 FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES_opt.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP 88126 - CTO 24001291 H4 2024 LT 2 - CONSORCIO ALFA - traslado vf_firmado.pdf	CDP 88126 - CTO 24001291 H4 2024 LT 2 - CONSORCIO ALFA - traslado vf_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 58626 - CTO 24001291 H4 2024 LT 2 - CONSORCIO ALFA - traslado vf_firmado.pdf	RP 58626 - CTO 24001291 H4 2024 LT 2 - CONSORCIO ALFA - traslado vf_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta Parcial No. 4.pdf	Acta Parcial No. 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Acta Parcial No. 5.pdf (Archivado)	Acta Parcial No. 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Acta de parcial de Obra No. 5.pdf (Archivado)	Acta de parcial de Obra No. 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial de Obra No. 5.pdf	Acta parcial de Obra No. 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial de obra No. 6.pdf	Acta parcial de obra No. 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	Acta parcial de obra No. 7.pdf	Acta parcial de obra No. 7.pdf	Proveedor	Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	**DIA** 30	**MES** 11	**AÑO** 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			**CONTRATO OBRA No.**	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			**CONTRATO INTERV. No.**	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			**AEROPUERTO PITALITO**			

ITEM	**LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).**	**UND.**	**ML**	**REF.**	**19,1**


ACTA No.	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**V. PARCIAL**	**% EJECUCUON**	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**COLOR**					
ACTA 9	**CANALES REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS**									 
	SEMANA 40									
	SEMANA 41									
	SEMANA 42	983,00				983,00	1,00		983,00	
	SEMANA 43									
	SEMANA 44									

ACUMULADO ACTAS	**7.912,09**
ACUMULADOS ANTERIORES	**6.929,09**
TOTAL PRESENTE ACTA	**983,00**

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

DETALLE PLATAFORMA
ESCALA 1:XXX

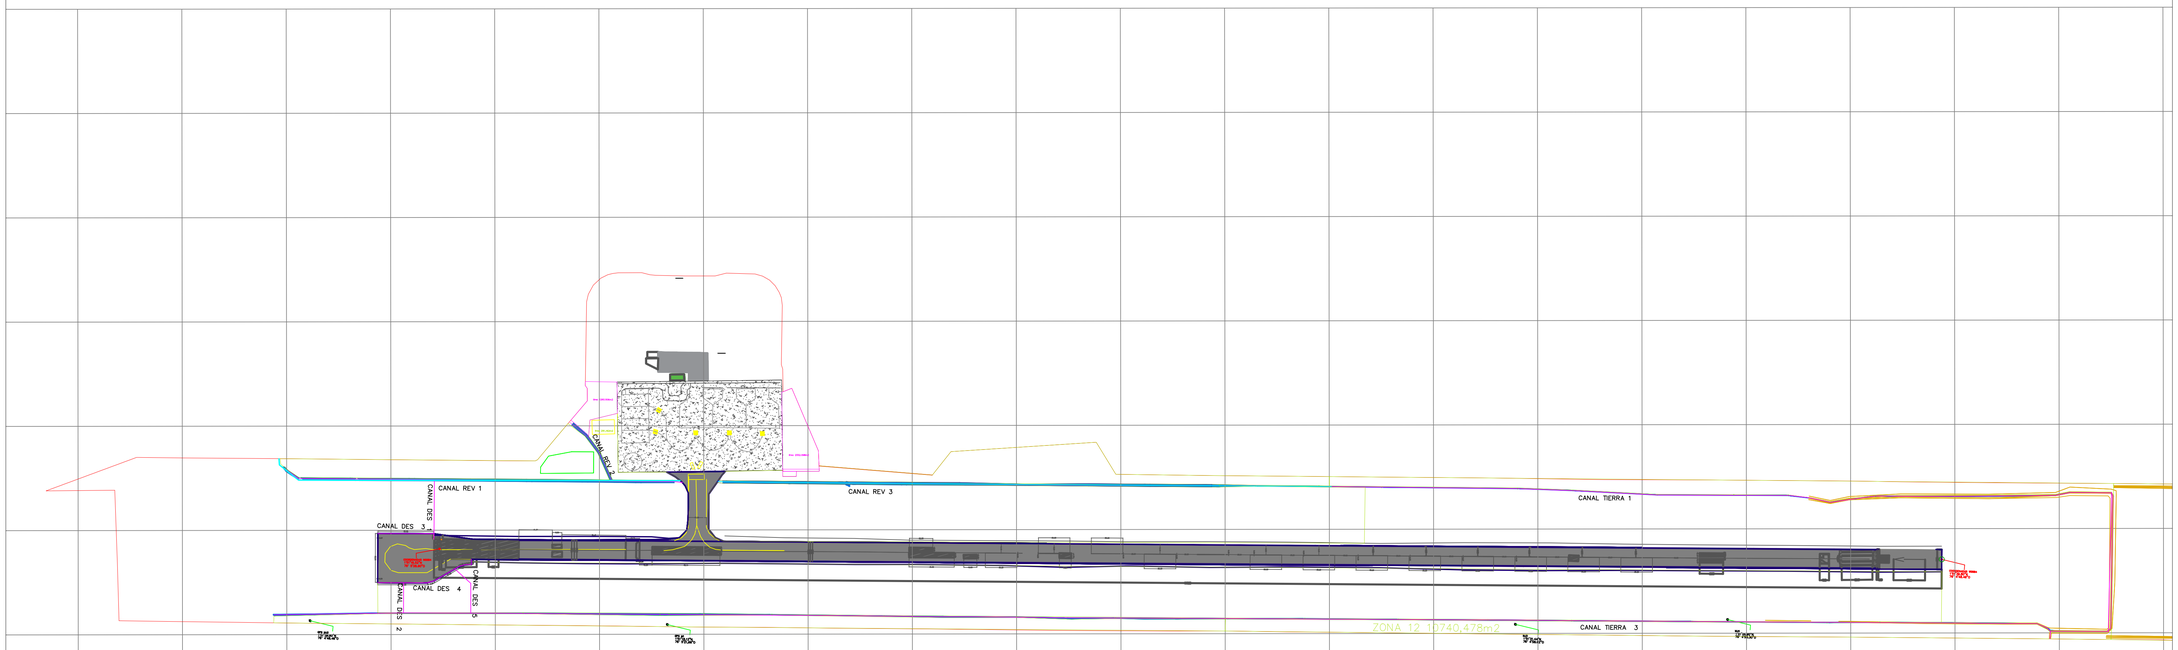

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 27/05/2025

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "CONTADOR "
CIUDAD: PITALITO - DEPARTAMENTO: HUILA

PROYECTO:
MANTENIMIENTO DE PISTA o CALLE DE RODAJE o PLATAFORMA
UMBRAL DESPLAZADO o DETALLES DE PISTA o DETALLES DE PLATAFORMA

CONTIENE:
PLANO ITEM 18.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL ACTA 5 PITALITO

N° CONTRATO: 22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - AEROPUERTO

CONTRATISTA:

DIRECTOR CONTRATISTA: Octavio Augusto Morales

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. LLLL LLLLL LLLLLL XXX XXXXXXX
REVISO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. LLLL LLLLL LLLLLL XXX XXXXXXX
REVISO DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. LLLL LLLLL LLLLLL XXX XXXXXXX
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 1 ESCALA H: 1 : 2000
CÓDIGO REFERENCIA: 2025-05-28 GLA OACI -002

NOTA TÉCNICA:

DATUM	ORIGEN NACIONAL		
ELIPSOIDE	WGS 84		
SISTEMA DE COORDENADAS	GEOGRAFICAS / PLANAS		
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN NACIONAL		

DECLINACIÓN MAGNÉTICA AÑO:5° W (2017)/0°9'W

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES SWY (m)	DIMENSIONES CWY (m)	DIMENSIONES STRIP(m)	DIMENSIONES RESA
07 NIL	NO	NO	1620 x 80	NO
25 NIL	NO	NO	1620 x 80	NO





CONVENCIONES :

COLOR BLANCO — ANCHO 0.45 m — SEÑAL FAJA LATERAL PISTA
COLOR AMARILLO — SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA
SEÑAL DE EJE DE RODAJE
COLOR BLANCO — SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO
COLOR BLANCO — SEÑAL DE PUNTO DE VISADA
COLOR BLANCO — ANCHO 1.8m — SEÑAL DE FAJA TRANSVERSAL — UMBRAL
COLOR BLANCO — VER ANEXO — SEÑA DE UMBRAL DE PISTA
SEÑAL IDENTIFIC. PUESTO ESTACIONATO.
SEÑAL DESIGN. DE PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
SEÑAL CON INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO AERONAVE
SEÑAL DE BORDE PLATAFORMA Y CALLE R.
SEÑAL DESIGNADOR DE PISTA
SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES
SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES
PISTA / CALLE RODAJE / PLATAORMA
SEÑAL PROHIBICIÓN ESTACIONATO NPL.
SEÑAL AREA DE PROTECCIÓN AERONAVES
SEÑAL DE ENCENDIDO MOT (SPOT)

DATO GEOGRÁFICO DE POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA

N°	LONGITUD	LATITUD	N°	LONGITUD	LATITUD
GPS MJ1	1°51'18,12"N	76° 5'21,66"O			
GPS MJ2	1°51'39.80"N	76° 4'48.46"O			
GPS MJ3	1°51'31.44"N	76° 4'58.92"O			
GPS MJ4	1°51'34.90"N	76° 4'53.30"O			

NOTAS TÉCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
dia / mes / año	**Memoria técnica de georreferenciación** - Ing. zzzzzzzzzzzzzzzzz	# Anexo
dia / mes / año	**Memoria de especiación técnica del tipo de pintura** - Ing. XXXXX	# Anexo
dia / mes / año	**Memoria técnica justificativa de umbral desplazado** - Ing. zzz	# Anexo
dia / mes / año	**Memoria técnica del análisis operacional** - Ing. zzz	# Anexo
dia / mes / año	**Análisis de riesgos de seguridad operacional** - Ing. xxxxxxxxxx	# Anexo
dia / mes / año	**Aclaraciones al diseño** - Ing. xxxxxxxxxx	

NOMBRE ARCHIVO: 1.Plano item 18.2 Rocería y limpieza manual Acta 5- Pitalito

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

												FECHA	**DIA**	30	**MES**	11	**AÑO**	2025	
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA									**CONTRATO OBRA No.**			24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA									**CONTRATO INTERV. No.**			24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA									**AEROPUERTO PUERTO ASIS**							
ITEM			**LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).**									**UND.**	**UND**		**REF.**		**26,2**		
ACTA No.	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**V. PARCIAL**	**VANOS**			**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**							
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**COLOR**			**L**	**A**										
ACTA 9	**ENCOLES Y/O DESCOLES**																		
	E5					1,00					1,00								
	E6					2,00					2,00								
											ACUMULADO ACTAS	**17,00**							
											ACUMULADOS ANTERIORES	**14,00**							
											TOTAL PRESENTE ACTA	**3,00**							
Observaciones																			

MEMORIAS DE OBRA — **Pag. __1__ de _1___**

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	**DIA**	30	**MES** 11 **AÑO** 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			**CONTRATO OBRA No.**		24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			**CONTRATO INTERV. No.**		24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			**AEROPUERTO FLORENCIA**			

ITEM	**LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.**	**UND.**	**M2**	**REF.**	**31,1**

ACTA No.	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**V. PARCIAL**	**% EJECUCUON**	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**COLOR**					
ACTA 9	**PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE**									
	PISTA	1494,49	30,00			44834,73	10%		4.483,47	
	PLATAFORMA	72,09	294,00			21195,72	10%		2.119,57	
	CALLLES DE RODAJE ALFA	86,19	32,70			2818,35	10%		281,84	
	CALLLES DE RODAJE BRAVO	77,28	21,9			1692,35	10%		169,24	
	CALLLES DE RODAJE CHARLIE	75,59	19,3			1458,85	10%		145,89	





ACUMULADO ACTAS	**72.000,00**
ACUMULADOS ANTERIORES	**64.800,00**
TOTAL PRESENTE ACTA	**7.200,00**

Observaciones

A partir del avance de la actividad, hasta el acta anterior se había reconocido un progreso del 90%. Para la presente acta se reconoce un avance adicional del 10%, con lo cual se completa el 100% de ejecución del ítem correspondiente al corte Nº 9

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	**DIA**	30	**MES** 11 **AÑO** 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		**CONTRATO OBRA No.**	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		**CONTRATO INTERV. No.**	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA						

ITEM	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.**	**UND.**	**BMA**	**REF.**	**40,1**

ACTA No.	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**			**V. PARCIAL**	**OBSERVACION**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		LARGO	**ANCHO**	**VALOR EN DINERO**				
ACTA 9	**SALDO BMA FLORENCIA AL 31/03/2025**			**$ 84.864.156,00**		**EL VALOR SALE DE OPERAR ARITMETICAMENTE BALIZAS DE 12" FIN DE UMBRAL - VALOR FCATURA FAIR #123 (SUBTOTAL) / SALDO INICIAL BMA FLORENCIA**		
	BALIZAS DE 12" FIN DE UMBRAL - VALOR FCATURA FAIR #123 (SUBTOTAL)			$ 15.160.000,00	**0,1506278224273240**		**0,1506278224273240**	
	BALIZAS DE 12" FIN DE UMBRAL - VALOR FCATURA FAIR #123 (IVA VENTAS 19%)			$ 2.880.400,00	**0,0286192862611916**		**0,0286192862611916**	
	SALDO BMA FLORENCIA AL 30/11/2025			**$ 66.823.756,00**				

ACUMULADO ACTAS	**0,3360477010095750**
ACUMULADOS ANTERIORES	**0,1568005923210590**
TOTAL PRESENTE ACTA	**0,1792471086885160**

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA — **Pag. __1__ de _1___**

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

Vr. 2
11/03/2021

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

INFORME MENSUAL #10

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONSORCIO ALFA



NIT 901.707.929-0

INFORME TÉCNICO PERIODO 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

OBJETO CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y FLORENCIA CAQUETÁ, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2

ESTADO DE CAMBIOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN				
REVISIÓN	**FECHA**	**OBJETO**	**ELABORADO POR**	**APROBADO POR**
			CARGO	**CARGO**
00	29-11-2025	Versión Inicial	Residente de Obra	Director de Obra

	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
ÁREA	Técnica	Técnica	Técnica
CARGO	Residente de Obra	Residente de Obra	Director de Obra
NOMBRE	Ing. Juan Paulo Arias	Ing. Juan Paulo Arias	Ing. Octavio Morales

FIRMA			
FECHA	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025

ORIGINAL FIRMADO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
   1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
   1.2. OBJETO 5
   1.3. LOCALIZACIÓN 5
   1.4. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO 7
   1.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
2. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 9
   2.1. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN: ACTIVIDADES Y CONTROL DE PRESUPUESTO CON CORTE (30/9/25). 9
   2.2. PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS Y PROGRAMADOS 16
   2.3. CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES POR DISCIPLINAS 17
   2.4. INFORME DE COMITÉS Y ESTADO DE PLANES DE ACCIÓN. 19
   2.5. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 22
   2.6. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS 23
3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 24
   3.1. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS HASTA LA FECHA FINAL DEL INFORME (30/11/25). 24
      3.1.1. Aeropuerto Pitalito 24
      3.1.2. Gráfica avance físico del contrato de obra (30/11/2025). 27
      3.1.3. Aeropuerto Puerto Asís 27
      3.1.4. Gráfica avance físico del contrato de obra (30/11/2025). 30
      3.1.5. Aeropuerto Florencia 31
      3.1.6. Gráfica avance físico del contrato de obra (30/11/2025). 34
   3.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 34
      3.2.1. Aeropuerto Pitalito 34

3.2.2. Aeropuerto Florencia 35
3.3. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO, JUSTIFICACIÓN Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. 35
3.3.1. Aeropuerto Pitalito 35
3.3.2. Aeropuerto Puerto Asís 36
3.3.3. Aeropuerto Florencia 37
3.4. ACTAS DE LIBERACIÓN DE OBRA, Y/O DE RECIBO DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA 38
3.5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO. 38
3.5.1. Aeropuerto Pitalito 38
3.5.2. Aeropuerto Puerto Asís 39
3.5.3. Aeropuerto Florencia 40
3.6. CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO. 42
3.7. RESUMEN AL CONTROL DE GESTIÓN, A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN. 42
4. LABORATORIOS Y ENSAYOS. 43
4.1. COPIA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 43
4.2. ANÁLISIS TÉCNICO Y RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS. 43
4.3. CONTROL TÉCNICO DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y CONTROLES DE OBRA. 43
4.4. PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO 43
5. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 43
5.1 ANTICIPO DE OBRA 43
5.1. CUADRO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO. 44
5.2. SOPORTE DE LAS ACTAS DE PAGO. 48
5.3. GRAFICA PRESUPUESTAL. 49
6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES. 49
6.1. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 50
7. FORMATOS DE CONTROL. 53
7.1. RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA POR EMPRESA. 53
7.2. RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA MEDIANTE GRÁFICO. 53
7.3. RELACIÓN DEL EQUIPO EN OBRA. 54
7.4. CONTROL CLIMATOLÓGICO. 54
7.5. MATERIALES EN OBRA Y PROGRAMADOS PARA LABOR. 54
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 55

8.1. AEROPUERTO PITALITO 55
8.2. AEROPUERTO PUERTO ASIS 62
8.3. AEROPUERTO FLORENCIA 71
9. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO 77
10. LISTADO DE ANEXOS. 77

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 8
Tabla 2. Cumplimiento de la programación. 16
Tabla 3.Tabla de Avance Actividades Aeropuerto Pitalito 26
Tabla 4.Tabla de Avance Actividades Aeropuerto Puerto Asís 30
Tabla 5.Tabla de Avance Actividades Aeropuerto Florencia 34
Tabla 6. Cuadro Financiero 42
Tabla 7. Cuadro de Control Presupuesto Programado vs Ejecutado 47
Tabla 8. Cuadro de Soportes Actas Parciales 48
Tabla 9. Evaluación de Riesgos 52
Tabla 10. Relación de Personal en obra por Empresa 53
Tabla 11. Relación de Vehículos 54

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización General Aeropuerto Pitalito 6
Ilustración 2. Localización General Aeropuerto Florencia 6
Ilustración 3. Localización General Aeropuerto Puerto Asis 7
Ilustración 4. Grafica Avance Aeropuerto Pitalito 27
Ilustración 5. Grafica Avance Aeropuerto Puerto Asís 30
Ilustración 6. Grafica Avance Aeropuerto Florencia 34
Ilustración 7. Grafica Presupuestal Programado vs Ejecutado 49

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual No. 10 del período de ejecución comprendido entre el 1 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE del 2025, en donde se describen las actividades ejecutadas y los procedimientos empleados para el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire de los Aeropuertos Pitalito, Florencia y Puerto Asís, así como las acciones pertinentes dirigidas a disponer y respaldar la seguridad, operatividad, eficacia, funcionalidad y prestación de servicio de los aeropuertos, con el fin de extender al máximo la vida útil de la infraestructura y asegurar un apropiado grado de satisfacción a los usuarios respecto a los servicios ofrecidos, todo esto dirigido al cumplimiento del objeto del contrato de obra No. 24001291 H4 Lote 2.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En la ciudad de Bogotá D.C., el veintitrés (23) de enero de 2025, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: GUILLERMO ANDRÉS GALÁN ECHEVERRI, identificado con cedula de ciudadanía No 79.784.164 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO ALFA de identificado con NIT 901.707.929-0, como contratista del presente contrato de Obra No 24001291 H4 - Lote 2, y PAOLO MAFIOLI PUCHE persona mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificada con cedula No 1.010.188.895 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal de CONSORCIO AEROPUERTOS SB. como contratista de interventoría adjudicado para el seguimiento y control del contrato de obra No 24001325 H3. De esta manera se tramita y legaliza acta de inicio de contrato de obra e interventoría que consiste en actividades de mantenimiento rutinario de la infraestructura lado aire de los Aeropuertos Pitalito, Florencia y Puerto Asís, en las áreas compuestas denominadas como áreas de maniobras como pistas y calles de rodaje, zonas verdes de franjas de pista, zonas verdes de seguridad, drenajes y todos sus elementos, vías perimetrales y de acceso, cerramientos perimetrales internos y externos, entre otras muchas actividades varias que garantizan la seguridad, operabilidad y operatividad de los Aeropuertos Pitalito, Florencia y Puerto Asís.

1.2. OBJETO

El contrato de obra No. 24001291 H4 Lote 2, tiene como objetivo principal, REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y FLORENCIA CAQUETÁ, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2.

1.3. LOCALIZACIÓN

El AEROPUERTO CONTADOR, identificado por medio del código IATA: PTX y el código OACI: SKPI, está situado en la ciudad de Pitalito departamento del Huila, es el segundo aeropuerto más importante del departamento después del Aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva. Tiene una pista de una longitud aproximada de 1.500 m. Se encuentra a 6 km de distancia de la zona urbana de Pitalito, además de ubicarse a tan solo 30 minutos del Parque Arqueológico de San Agustín, considerado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO.



Ilustración 1. Localización General Aeropuerto Pitalito

El AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES, identificado por medio del código IATA: FLA y el código OACI: SKFL, está situado en la ciudad de Florencia departamento del Caquetá, El aeropuerto se encuentra localizado entre los corregimientos de San Martín y Venecia, en el sitio conocido como vereda Capitolio, sobre la vía que comunica a la ciudad de Florencia con el municipio de La Montañita. Tiene una pista de una longitud aproximada de 1.400 m. Se encuentra a 3 km de distancia de la zona urbana de Florencia.



Ilustración 2. Localización General Aeropuerto Florencia

El AEROPUERTO TRES DE MAYO, identificado por medio del código IATA: PUU y el código OACI: SKAS, El aeropuerto Tres de Mayo de Puerto Asís, se encuentra ubicado a pocos metros del centro de la ciudad en la salida a la capital del departamento del Putumayo (Mocoa). Actualmente operan allí tres aerolíneas comerciales y sirve de tránsito a diversas aeronaves militares y privadas en su gran mayoría de la industria petrolera. Cuenta con una torre de control aproximada de 26 metros de altura. Su nombre hace honor a la fecha de cumpleaños del municipio.



Ilustración 3. Localización General Aeropuerto Puerto Asís

1.4. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Durante este período, se prestaron los servicios pactados para el cumplimiento del contrato con el personal técnico del contratista en diferentes actividades de mantenimiento rutinario de las áreas lado aire de los Aeropuertos Pitalito, Florencia y Puerto Asís, de acuerdo, con las especificaciones técnicas.

Para el segundo periodo comprendido entre el 1 de NOVIEMBRE de 2025 al 30 de NOVIEMBRE de 2025, el proyecto tuvo un avance en las actividades relacionados a continuación:

- Localización, Replanteo y Control Topográfico Pitalito
- Rocería en franjas de seguridad del Aeropuerto Pitalito
- Rocería en franjas de seguridad del Aeropuerto Puerto Asís
- Rocería en franjas de seguridad del Aeropuerto Florencia
- Limpieza y Reacondicionamiento de canales del Aeropuerto de Pitalito
- Limpieza y Reacondicionamiento de canales del Aeropuerto de Florencia
- Limpieza de Encoles y Descoles en el Aeropuerto de Pitalito
- Reparación (Limpieza) de cerramiento Puerto Asís
- Reparación (Limpieza) de cerramiento Florencia
- Suministro e instalación de Asfalto en Frio Pitalito

Hasta la fecha del presente periodo no se han suscrito actas de modificación y/o modificatorios al contrato.

1.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL
Contrato No:	24001291 H4 Lote 2
Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y FLORENCIA CAQUETÁ, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2
Contratista:	CONSORCIO ALFA con NIT: 901707929-0
Representante legal:	GUILLERMO ANDRÉS GALÁN ECHEVERRI
Valor del contrato:	VALOR INICIAL $ 6.788.000.000
Plazo inicial:	VEINTE (20) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31/07/2026.
Plazo según Modificatorio n°1	N/A
Dirección:	Aeropuerto Pitalito (Huila) – Aeropuerto Contador Aeropuerto Puerto Asís (Putumayo) – Aeropuerto Tres de Mayo Aeropuerto Florencia (Caquetá) – Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes
CDP	No. 89624 del 26 de abril de 2024
CDP ADICIÓN 1	N/A
RP	No. 3525 del 14 de enero de 2025
RP ADICIÓN 1	N/A
Supervisor y/o interventor:	CONSORCIO AEROPUERTOS SB – NIT: 901901166-9
Supervisor Designado por la Entidad	JUANITA VILLAMIZAR DURAN

Tabla 1. Información general del contrato

2. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2.1. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN: ACTIVIDADES Y CONTROL DE PRESUPUESTO CON CORTE (30/9/25).

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO EJECUTADO A 30/11/25		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	% EJECUTADO
	AEROPUERTO DE PITALITO – AEROPUERTO CONTADOR							
17	**LOCALIZACIÓN**							
17.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	55.000	$ 1.553,00	$ 85.415.000,00	49.500,00	$ 76.873.500,00	90,00%
18	**ROCERÍA**							
18.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).)	M2	2.430.000	$ 106,00	$ 257.580.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	800.000	$ 107,00	$ 85.600.000,00	1.427.788,40	$ 152.773.358	178,47%
19	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**							
19.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	8.400	$ 26.672,00	$ 224.044.800,00	7.912.09	$ 211.031.265	94,19%
19.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	100	$ 59.736,00	$ 5.973.600,00	10,00	$ 597.360,00	10,00%
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	25	$ 2.949.186,00	$ 73.729.650,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.	M2	500	$ 64.081,00	$ 32.040.500,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20	**PAVIMENTOS**							
20.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	860	$ 83.575,00	$ 71.874.500,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	250	$ 5.447,00	$ 1.361.750,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	500	$ 3.672,00	$ 1.836.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	500	$ 1.504.622,00	$ 752.311.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%

20.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	3	$ 6.060.981,00	$ 18.182.943,00	0,59	$ 3.571.130	19.64%
20.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.000	$ 7.169,00	$ 7.169.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20	$ 975.164,00	$ 19.503.280,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10	$ 1.174.386,00	$ 11.743.860,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10	$ 1.397.452,00	$ 13.974.520,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	360	$ 147.622,00	$ 53.143.920,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	2.670	$ 3.791,00	$ 10.121.970,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	600	$ 37.447,00	$ 22.468.200,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**							
21.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	7.000	$ 8.691,00	$ 60.837.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	800	$ 58.309,00	$ 46.647.200,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	10	$ 43.435,00	$ 434.350,00	0,00	$ 0,00	0,00%
22	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**							
22.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	2.000	$ 31.656,00	$ 63.312.000,00	4.560,00	$ 144.351.360	228,00%
22.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	40.000	$ 363,00	$ 14.520.000,00	34.320,00	$ 12.458.160	85,80%
23	**CERRAMIENTO**							
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	200	$ 90.704,00	$ 18.140.800,00	56,83	$ 5.155.021	28,42%
23.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10	$ 26.565,00	$ 265.650,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES	M3	10	$ 742.982,00	$ 7.429.820,00	0,00	$ 0,00	0,00%

	Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.							
23.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	50	$ 565.363,00	$ 28.268.150,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	ML	300	$ 18.107,00	$ 5.432.100,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	AEROPUERTO DE PUERTO ASIS – AEROPUERTO TRES DE MAYO							
24	**LOCALIZACIÓN**							
24.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	43.000	$ 1.553,00	$ 66.779.000,00	38.700,00	$ 60.101.100,00	90,00%
25	**ROCERÍA**							
25.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).	M2	1.520.000	$ 106,00	$ 161.120.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	500.000	$ 107,00	$ 53.500.000,00	679.028,83	$ 72.656.084	135,81%
26	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**							
26.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	8.000	$ 26.672,00	$ 213.376.000,00	3.112,52	$ 83.017.133	38,91%
26.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	100	$ 59.736,00	$ 5.973.600,00	17,00	$ 1.015.512	17,00%
26.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	25	$ 2.949.186,00	$ 73.729.650,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.	M2	500	$ 64.081,00	$ 32.040.500,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27	**PAVIMENTOS**							
27.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	950	$ 83.575,00	$ 79.396.250,00	0,00	$ 0,00	0,00%

27.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	250	$ 5.447,00	$ 1.361.750,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	500	$ 3.672,00	$ 1.836.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	580	$ 1.504.622,00	$ 872.680.760,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	3	$ 6.060.981,00	$ 18.182.943,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.918	$ 7.169,00	$ 13.748.079,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20	$ 975.164,00	$ 19.503.280,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10	$ 1.174.386,00	$ 11.743.860,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	20	$ 1.397.452,00	$ 27.949.040,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	370	$ 147.622,00	$ 54.620.140,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.100	$ 3.791,00	$ 11.752.100,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	800	$ 37.447,00	$ 29.957.600,00	0,00	$ 0,00	0,00%
28	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**							
28.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	7.900	$ 8.691,00	$ 68.658.900,00	0,00	$ 0,00	0,00%
28.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	900	$ 58.309,00	$ 52.478.100,00	0,00	$ 0,00	0,00%
28.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	5	$ 43.435,00	$ 217.175,00	0,00	$ 0,00	0,00%
29	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**							
29.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	2.000	$ 31.656,00	$ 63.312.000,00	4.920,00	$ 155.747.520,00	246,00%
29.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	41.000	$ 363,00	$ 14.883.000,00	38.400,00	$ 13.939.200,00	93,66%
30	**CERRAMIENTO**							
30.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA	ML	200	$ 90.704,00	$ 18.140.800,00	98,56	$ 8.939.786	49,28%

	GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).							
30.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10	$ 26.565,00	$ 265.650,00	0,00	$ 0,00	0,00%
30.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	10	$ 742.982,00	$ 7.429.820,00	0,00	$ 0,00	0,00%
30.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	50	$ 565.363,00	$ 28.268.150,00	0,00	$ 0,00	0,00%
30.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	ML	300	$ 18.107,00	$ 5.432.100,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	AEROPUERTO DE FLORECIA – AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES							
31	**LOCALIZACIÓN**							
31.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	72.000	$ 1.553,00	$ 111.816.000,00	72990,96	$ 113.354.960	101,38%
32	**ROCERÍA**							
32.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).	M2	1.620.000	$ 106,00	$ 171.720.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
32.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	540.000	$ 107,00	$ 57.780.000,00	824501,08	$ 88.221.615	152,69%
33	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**							
33.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	11.690	$ 26.764,00	$ 312.871.160,00	5.649,00	$ 151.189.836,00	48,32%
33.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	100	$ 59.736,00	$ 5.973.600,00	10,00	$ 597.360,00	10,00%
33.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	60	$ 2.949.186,00	$ 176.951.160,00	0,00	$ 0,00	0,00%
33.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.	M2	1.000	$ 64.081,00	$ 64.081.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%

34	**PAVIMENTOS**							
34.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	1.090	$ 83.575,00	$ 91.096.750,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	250	$ 5.447,00	$ 1.361.750,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	500	$ 3.672,00	$ 1.836.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	640	$ 1.504.622,00	$ 962.958.080,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.5	SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO TIPO MDF-19 O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE ILUMINACIÓN, CORTE, IMPRIMACIÓN, DEMOLICIÓN Y RETIRO.	M3	3	$ 6.060.982,00	$ 18.182.946,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.000	$ 7.169,00	$ 7.169.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10	$ 975.164,00	$ 9.751.640,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	5	$ 1.174.386,00	$ 5.871.930,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	5	$ 1.397.452,00	$ 6.987.260,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	450	$ 147.622,00	$ 66.429.900,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	4.000	$ 3.791,00	$ 15.164.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%
34.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	1.100	$ 37.447,00	$ 41.191.700,00	0,00	$ 0,00	0,00%
35	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**							
35.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	9.100	$ 8.691,00	$ 79.088.100,00	0,00	$ 0,00	0,00%
35.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	1.350	$ 58.309,00	$ 78.717.150,00	0,00	$ 0,00	0,00%
35.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	5	$ 43.435,00	$ 217.175,00	0,00	$ 0,00	0,00%
36	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**							
36.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	3.000	$ 31.656,00	$ 94.968.000,00	6.240,00	$ 197.533.440,00	208,00%

36.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	65.000	$ 363,00	$ 23.595.000,00	54.000,00	$ 19.602.000,00	83,08%
37	**CERRAMIENTO**							
37.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	200	$ 90.704,00	$ 18.140.800,00	209,67	$ 19.017.905	104,83%
37.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10	$ 26.565,00	$ 265.650,00	0,00	$ 0,00	0,00%
37.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	10	$ 742.982,00	$ 7.429.820,00	0,00	$ 0,00	0,00%
37.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	50	$ 565.363,00	$ 28.268.150,00	0,00	$ 0,00	0,00%
37.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	ML	300	$ 18.107,00	$ 5.432.100,00	0,00	$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**$ 6.467.013.631,00**		**$ 1.591.744.495,98**	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 6.467.013.631,00**		**$ 1.591.744.495,98**	
ADMINISTRACIÓN				25%				
IMPREVISTOS				2%				
UTILIDAD				2%				
VALOR TOTAL AIU				29%				
IVA				19%	**$ 19.050.118,00**		**$ 4.688.859,77**	
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 6.486.063.749,00**		**$ 1.596.433.355,75**	**24.61%**
38	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PITALITO**							
38.1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.**	**BMA**	**1**	**$100.645.417,00**	$ 100.645.417,00	**0**	$ 0,00	0%
39	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PUERTO ASÍS**							
39.1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES),**	**BMA**	**1**	**$100.645.417,00**	$ 100.645.417,00	**0**	$ 0,00	0%

	TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.							
40	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE BMA AEROPUERTO FLORENCIA**							
40.1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.**	**BMA**	**1**	**$100.645.417,00**	$ 100.645.417,00	0,336047701	$ 33.821.661,00	33,60%
	IVA							
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 301.936.251,00**		**$ 33.821.661,00**	**11,20%**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 6.788.000.000,00**		**$ 1.630.255.016,99**	**24,02%**

Tabla 2. Cumplimiento de la programación.

2.2. PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS Y PROGRAMADOS

De acuerdo con la Tabla No. 2, durante el presente periodo los planes de trabajo ejecutados se cumplieron conforme a lo programado, priorizando las actividades esenciales para el mantenimiento de las áreas lado aire de los Aeropuertos Pitalito, Florencia y Puerto Asís.

Es importante señalar que dichos planes de trabajo se elaboran a partir de las diversas actividades de mantenimiento previstas para el periodo. En términos generales, se puede afirmar que estos se ejecutaron satisfactoriamente, atendiendo las solicitudes de la entidad y de otros actores involucrados en la operación y el óptimo funcionamiento de los Aeropuertos Pitalito, Florencia y Puerto Asís, garantizando condiciones de calidad y seguridad.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES POR DISCIPLINAS

GESTIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD

Dando cumplimiento a las Especificaciones Técnicas del contrato, se emite resumen de las actividades llevadas a cabo en el control y calidad de la obra correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE del 2025 por medio de un informe como apéndice al presente.

Adicional a esto, de manera específica se lleva un seguimiento por parte de todos los componentes del contrato a las diferentes actividades de mantenimiento contenidas en el presupuesto para garantizar su correcta ejecución.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se efectuaron las siguientes actividades de orden administrativo:

- Trámite ante la Aerocivil para los ingresos del personal y equipos al proyecto y tramite de pólizas para carnetización vehículos y maquinaria.
- Afiliaciones al sistema de seguridad social, del personal que ingresó al proyecto durante el mes.
- Correspondencia del proyecto relacionada con la Interventoría y la Aerocivil.
- Control de los procesos administrativos para las nóminas del personal y reporte de horas laboradas del personal.
- Seguimiento a la expedición de Stickers y/o Carnet de ingreso para el personal, vehículos y maquinaria del Contratista.
- Realización de entrevistas para cumplir con el personal mínimo exigido en el pliego de condiciones.

GESTIÓN AMBIENTAL

La implementación de las acciones de manejo, corrección o compensación para la atención de las potenciales afectaciones ambientales ocasionadas en razón a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra pública N° 24001291 H4 LOTE 2, se presentan en el instrumento de planificación - Plan de Manejo Ambiental - de la Obra, derrotero que se estructuro armonizado con los lineamientos definidos en Plan de Manejo Ambiental PMA de los Aeropuertos Pitalito, Florencia y Puerto Asís, aprobado por la corporación autónoma regional correspondiente a cada Aeropuerto (donde corresponde, PAGA para Pitalito.

La evidencia de la gestión realizada por el Consorcio Alfa durante el periodo se presenta en los informes quincenales, y en el informe mensual, documento que compila todas las acciones ejecutadas durante el periodo y que hace parte integral del presente documento. (ANEXO 1)

Durante el periodo reportado en el presente, se realizaron entre otras, las siguientes actividades:

- Seguimiento a la gestión documental del área ambiental y PMA.
- Realización de charlas, capacitación e inducción ambiental.

- Elaboración de informes mensuales.
- Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas por la UAEAC y la Interventoría.

La información detallada del área ambiental se encuentra relacionada en el informe mensual ambiental (ANEXO #1).

GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

Dando cumplimiento a nuestro SG-SST y plan anual HSE y a fin de dar a conocer la gestión y ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, que se realizan en el desarrollo del proyecto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y FLORENCIA CAQUETÁ, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2” cumpliendo la legislación nacional vigente y el Plan de gestión HSEQ del año en curso.

Se llevaron a cabo agrandes rasgos las siguientes labores SST (Donde Aplique):

- Inspecciones preoperacionales a la maquinaria y vehículos asignados al Proyecto.
- Entrega de elementos de protección personal EPP.
- Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo - SST.
- Inducción SST.
- Elaboración de informes mensuales.
- Control personal administrativo y operativo.
- Análisis de trabajo seguro.
- Verificación afiliaciones a seguridad social.
- Investigación de accidentes (si aplica).
- Seguimiento de indicadores de sistema de gestión del proyecto.
- Revisión de casos especiales.
- Nóminas y Certificados de retiro de Personal.
- La información detallada del área SST se encuentra relacionada en el informe mensual SST. (ANEXO 2).

GESTIÓN SEGURIDAD OPERACIONAL.

En cumplimiento con el Plan de Seguridad Operacional establecido en el contrato No. 24001291 H4 LOTE 2, el Consorcio Alfa asume la responsabilidad de llevar a cabo el mantenimiento rutinario de la infraestructura aeroportuaria en de los Aeropuertos Pitalito, Florencia y Puerto Asís, en el lado aire, conforme a las directrices de la Autoridad Aeronáutica Colombiana y el Reglamento Aeronáutico Colombiano - RAC - 219 Gestión de la Seguridad Operacional.

Nuestro compromiso se fundamenta en mantener niveles aceptables de seguridad operacional, lo cual implica la continua identificación y notificación de posibles peligros que puedan incidir en las operaciones de los Aeropuertos Pitalito, Florencia y Puerto Asís. En este sentido, uno de los principales objetivos del Consorcio es garantizar la continuidad de las operaciones a lo largo de todas sus actividades. Para alcanzar estos objetivos, es crucial la identificación proactiva de peligros que puedan afectar directamente la seguridad de las aeronaves, así como la

implementación de medidas correctivas oportunas para mitigar dichos riesgos. Esto se logra a través de la verificación, inspección y reporte diligente de cualquier anomalía detectada.

Fomentamos una comunicación fluida y constante entre contratistas, el Sistema de Administración de Seguridad (SAM) y otras áreas relevantes que puedan contribuir a fortalecer la seguridad operacional. Esta colaboración activa es esencial para mantener los estándares de seguridad operacional en un nivel aceptable y garantizar la continuidad de las operaciones aeroportuarias de manera segura y eficiente.

- Actividades Desarrolladas durante el mes de NOVIEMBRE 2025 (Donde Aplique):
- Protocolos de seguridad para ingreso de personal, maquinaria, vehículos y herramienta a zonas de trabajo en áreas restringidas.
- Identificación de actos de riesgo previo ejecución de actividades.
- Control y limpieza de FOD.
- Planificación, solicitud y publicación de Ventanas Operacionales (NOTAM) para la ejecución de los trabajos. (si aplica)
- La información detallada del área SEGURIDAD OPERACIONAL se encuentra relacionada en el informe mensual. (ANEXO 3).

GESTIÓN DOCUMENTAL

De acuerdo con el plan de calidad del proyecto, el plan de gerencia y las normativas al respecto, el Consorcio Alfa, viene adelantando la gestión documental.

Las comunicaciones oficiales, los correos electrónicos, los informes mensuales, semanales y diarios, los reportes de gestión y seguimiento, los informes de levantamientos topográficos de zonas verdes y cerramientos, los planos y en general todos los documentos del contrato y que hacen parte de este, se encuentran debidamente organizados, nombrados y archivados.

2.4. INFORME DE COMITÉS Y ESTADO DE PLANES DE ACCIÓN.

Se llevó a cabo comités de obra **N° 39***(6/11/2025),* **40***(13/11/2025),* **41***(20/11/2025) Y* **42***(27/11/2025)* con fecha de NOVIEMBRE de 2025 cuyo tema principal fue el seguimiento de obra. A fecha de entrega del presente informe, donde se destacan los siguientes temas tratados y planes de acción:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de compromiso
1	Respuesta y subsanación de faltantes de información laboral según Correo electrónico del día 01-08-2025, las comunicaciones CO-CASB-0518-2025-VT del 27 de agosto, CO-CASB-0592-2025-VT del 01 de octubre de 2025, correos del 29 de octubre, comunicado CO-CASB-0656-2025-VT del 30 de octubre, correo del 05 de noviembre de 2025 y correo del 14 de noviembre de 2025, notificando al Consorcio Alfa el incumplimiento por la NO entrega de la información laboral del personal contractual.	Contratista	24-11-2025

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de compromiso
2	Respuesta a observaciones del Informe de levantamiento de daños de pavimento de Florencia según CO-CASB-0569-2025-VT del 22 de septiembre de 2025.	Contratista	21-11-2025
3	Respuesta a observaciones del Informe de levantamiento de daños de pavimento de Puerto Asís según CO-CASB-0570-2025-VT del 22 de septiembre de 2025.	Contratista	21-11-2025
4	Entrega de la información para la ejecución de núcleos de pavimento en el aeropuerto de Puerto Asís. Según CO-CASB-0677-2025-VT del 14 de noviembre de 2025: - Seguridad social (personal empleado para la realización de la actividad). - Documentos del vehículo y conductor - Señalización del vehículo (PSO). - El uso de EPP'S y prendas acordes al PSO (chalecos reflectivos). - Inducción y notificaciones de riesgo.	Contratista	21-11-2025
5	Ejecución de núcleos para el aeropuerto de Puerto Asís.	Contratista	24-11-2025
6	Respuesta a requerimientos del Informe de levantamiento de daños de pavimento de Pitalito según CO-CASB-0622-2025-VT del 20 de octubre de 2025.	Contratista	24-11-2025
7	Respuesta a las observaciones del informe técnico referente a la ejecución de núcleos de pavimento realizado el día 07 de noviembre de 2025 en el aeropuerto de Pitalito según CO-CASB-0692-2025-VT del 19 de noviembre de 2025.	Contratista	26-11-2025
8	Entrega de ajustes del APU NP de rejillas peatonales aeropuerto de Florencia según mesa de trabajo del 31 de octubre de 2025.	Contratista	21-11-2025
9	Ajuste del informe topográfico de Pitalito según RA-CASB-0862-2025-VT del 06 de octubre de 2025 y según CO-CASB-0655-2025-VT del 30 de octubre de 2025.	Contratista	24-11-2025
10	Respuesta observaciones informe topográfico de Puerto Asís (CO-CASB-0522-2025-VT)	Contratista	21-11-2025
11	Respuesta a observaciones análisis y propuesta de alternativas de solución al problema de drenaje en Puerto Asís (CO-CASB-0463-2025-VT)	Contratista	21-11-2025
12	Respuesta a observaciones de los detalles de tapas en margen de pista Florencia CO-CASB-0650-2025-VT del 29 de octubre de 2025 y según reunión con interventoría del 31 de octubre de 2025.	Contratista	20-11-2025
13	Revisión de la entrega de justificación de precio de cantidades y valores para reparación de canales Florencia según reunión con el contratista del 31 de octubre de 2025 y RA-CASB-0988-2025-VT del 13 de noviembre de 2025.	Interventoría	21-11-2025
14	Radicación de la documentación del personal asociado a la ejecución de la actividad de instalación requeridos para nivelación de luces de umbral en Puerto Asís según comunicado CO-CASB-0688-2025-VT del 19 de noviembre de 2025.	Contratista	25-11-2025

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de compromiso
15	Revisión de la Entrega de diseño de mezcla de pavimento (Proveedor Fernando Ochoa - Pavimentos Americanos, planta localizada en Puerto Asís). Según RA-CASB-1006-2025-VT del 20 de noviembre de 2025.	Interventoría	24-11-2025
16	Respuesta a las observaciones del Diseños de señalización Pitalito. Según CO-CASB-0571-2025-VT del 22 de septiembre de 2025 y CO-CASB-0580-2025-VT del 23 de septiembre de 2025 y teniendo en cuenta las observaciones socializadas por la Aerocivil el 21 de octubre de 2025 en comité semanal para Pitalito.	Contratista	21-11-2025
17	Respuesta a observaciones del Diseños de señalización Puerto Asís según CO-CASB-0573-2025-VT del 22 de septiembre de 2025, CO-CASB-0580-2025-VT del 23 de septiembre de 2025 y observación adicional notificada en comité del 06 de noviembre de 2025.	Contratista	21-11-2025
18	Respuesta a las observaciones del Diseños de señalización Florencia. Según CO-CASB-0572-2025-VT del 22 de septiembre de 2025 y CO-CASB-0580-2025-VT del 23 de septiembre de 2025 y teniendo en cuenta las observaciones socializadas por la Aerocivil el 21 de octubre de 2025 en comité semanal.	Contratista	21-11-2025
19	Respuesta a observaciones a entrega de programación de visitas del Director de Obra, Profesional Ambiental SST, Inspector de Apoyo Lado Aire y Topografía a cada aeropuerto según CO-CASB-0561-2025-VT del 18 de septiembre de 2025.	Contratista	20-11-2025
20	Ajuste a las luces de taxeo para entrega al aeropuerto de Florencia con cargo a la Bolsa de Monto Agotable según compromiso del comité del 20 de noviembre de 2025.	Contratista	25-11-2025
21	Presentar diseño de mezcla de concreto para construcción de pasarelas en Puerto Asís.	Contratista	21-11-2025
22	Entrega de ajustes del balance No. 1 de cantidades y presupuesto. Según correo de interventoría hacia el contratista del día martes 18 de noviembre de 2025.	Contratista	21-11-2025
23	Remisión a la Interventoría para revisión y aprobación el diseño de concreto de 21 Mpa, así como también las fichas técnicas de los materiales a utilizar para instalación de indicadores de viento en Puerto Asís según CO-CASB-0687-2025-VT del 18 de noviembre de 2025	Contratista	21-11-2025
24	Presentar ajustes a la versión 1 del Plan de Contingencia No. 2 de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de Aerocivil según CO-CASB-0693-2025-VT del 20 de noviembre de 2025	Contratista	24-11-2025
25	Radicación del informe de topografía de la toma de información realizada el 25 de octubre de 2025 para la propuesta de reparación del cerramiento colapsado en el aeropuerto de Florencia.	Contratista	21-11-2025
26	Visita del especialista en hidráulica para la toma de información para la propuesta de reparación del cerramiento colapsado en el aeropuerto de Florencia.	Contratista	25-11-2025
27	Reunión con operadores del aeropuerto de Pitalito para la socialización de actividades de asfalto a realizar en el	Contratista	21-11-2025

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de compromiso
	aeropuerto para el trámite del NOTAM de precaución y cierre radicado a la Aerocivil en comunicado CO-CASB-0658-2024-VT del 04 de noviembre de 2025 y según correo de la Aerocivil del día 19 de noviembre de 2025.		
28	Revisión del estado del NOTAM de precaución y cierre para el aeropuerto de Puerto Asís para la realización de actividades de asfalto y según socialización realizada el 19 de noviembre de 2025.	Aerocivil	25-11-2025
29	Solicitud del NOTAM de precaución y cierre para el aeropuerto de Florencia, para la realización de actividades de asfalto prevista su ejecución para después del 15 de enero de 2026.	Contratista	15-12-2025
30	Entrega de los ajustes de las fichas programa socioeconómico (FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOTE 2), Según CO-CASB-0636-2025-VT del 22 de octubre de 2025, oficio CO-CASB-0661-2025-VT del día 04 de noviembre, correo el día 18 de noviembre de 2025 y correo del 20 de noviembre de 2025.	Contratista	25-11-2025
31	Entrega de listado de personal y equipos y documentación para actividades de pavimento en Puerto Asís (inicio previsto por confirmar por el contratista.) y según comunicado CO-CASB-0683-2025-VT del 18 de noviembre de 2025	Contratista	21-11-2025

2.5. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

En este periodo ya se terminó la ejecución plan de contingencia #1 el cual tenía principales actividades para mitigación del atraso que se llevaba, de las cuales se plantea adelantar las actividades de topografía (localización y replanteo) que este aprobadas como mínimo del 80% de su representación contractual, ciclos 3 de rocería ejecutados en su totalidad, ciclo 1 de mantenimiento de canales, reparación de cerramientos (Limpieza y desmalezado), Descontaminación de pista con Equipo de chorro de agua a presión, medición de coeficiente de rozamiento, lo cual se cumplió en un 80%, permitiendo financieramente nivelarnos con la ejecución de actividades.

Así mismo en el periodo se llevaron a cabo recorridos de inspección y diagnóstico en las áreas del lado aire, con el objetivo de verificar las condiciones y planificar la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento.

Con el propósito de continuar cumpliendo con los requerimientos del contrato, se mantienen actualizados los procedimientos y se implementan mejoras continuas en las actividades de mantenimiento. Asimismo, se elaboran planes más detallados y se incorpora nuevo personal y equipo, lo que permite mejorar los rendimientos y la eficiencia operativa.

2.6. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de los deberes y obligaciones derivados del contrato 24001291 H4 LOTE 2, el contratista de obra hizo entrega a la Interventoría los siguientes documentos: Se desembolso el anticipo de obra, se tramito la orden de desembolso #9 por valor de $ 62.304.231,00, el desembolso #10 por valor de $ 10.945.400,00 y el desembolso #11 $101.250.276,00 respectivamente.

A continuación, se indican las actividades ejecutadas en el periodo del 1 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE del 2025 en cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- 18.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).
- 19.1 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 19.2 LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 20.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).
- 24.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO
- 25.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).
- 29.2 MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.
- 30.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).
- 32.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).
- 33.1 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 37.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).

3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

3.1. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS HASTA LA FECHA FINAL DEL INFORME (30/11/25).

3.1.1. Aeropuerto Pitalito

ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	UND	Cantidad Acumulada	Total Costo acumulado	% Ejecutado
17	**LOCALIZACIÓN**				
17.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	49500,00	$76.873.500	90,00%
18	**ROCERÍA**				
18.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).	M2	0,00	$-	0,00%
18.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	**1427788,40**	$152.773.358	178,47%
19	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				
19.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	**7812,09**	$211.031.264,48	94,19%
19.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	**10**	$597.360	10,00%
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	0,00	$-	0,00%
19.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.	M2	0,00	$-	0,00%
20	**PAVIMENTOS**				
20.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	0,00	$-	0,00%

20.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	0,00	$-	0,00%
20.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	0,00	$-	0,00%
20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	0,00	$-	0,00%
20.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	0,59	$3.571.130	19,64%
20.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	0,00	$-	0,00%
20.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	0,00	$-	0,00%
20.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	0,00	$-	0,00%
20.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	0,00	$-	0,00%
20.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	0,00	$-	0,00%
20.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	0,00	$-	0,00%
20.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	0,00	$-	0,00%
21	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**				
21.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	0,00	$-	0,00%
21.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	0,00	$-	0,00%

21.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	0,00	$-	0,00%
22	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**				
22.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	4560,00	$144.351.360	228,00%
22.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	34320,00	$12.458.160	85,80%
23	**CERRAMIENTO**				
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	56,83	$5.155.021	28,42%
23.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	0,00	$-	0,00%
23.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE ½" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	0,00	$-	0,00%
23.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	0,00	$-	0,00%
23.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	ML	0,00	$-	0,00%
COSTO DIRECTO				**$606.285.984,73**	
IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$2.312.674,91**	
COSTO DIRECTO + IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$608.598.659,64**	
38	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PITALITO**				
38,1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.	BMA	**0,00**	$ -	0,00%
,90COSTO BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 0,00**	
COSTO DIRECTO + IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$608.598.659,64**	
COSTO TOTAL				**$608.598.659,64**	

Tabla 3.Tabla de Avance Actividades Aeropuerto Pitalito

3.1.2. Gráfica avance físico del contrato de obra (30/11/2025).

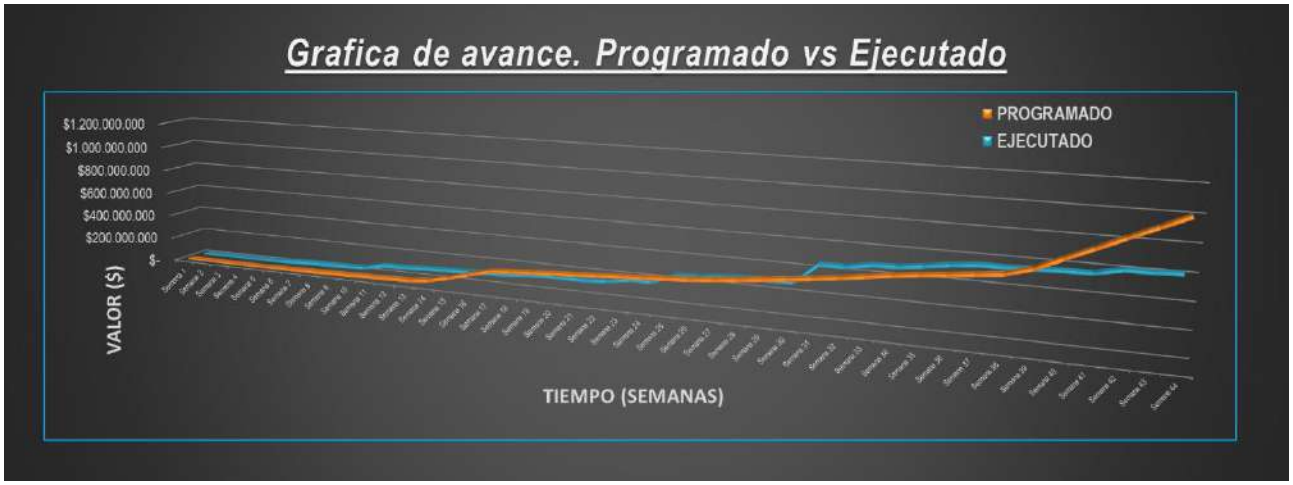


Ilustración 4. Grafica Avance Aeropuerto Pitalito

a la fecha del presente informe mensual el avance reportado es el siguiente:

PROGRAMADO	EJECUTADO
51,02%	28,98%
$1.071.360.393,97	$608.598.659,64

3.1.3. Aeropuerto Puerto Asís

ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	UND	Cantidad Acumulada	Total Costo acumulado	% Ejecutado
24	LOCALIZACIÓN				
24.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	38.700,00	$ 60.101.100,00	90,00%
25	ROCERÍA				
25.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).	M2	0,00	$ 0,00	0,00%
25.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	679.028,83	$ 72.656.084,71	135,81%
26	ESTRUCTURAS Y DRENAJES				

26.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	3.112,52	$ 83.017.133,44	38,91%
26.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	17,00	$ 1.015.512,00	17,00%
26.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
26.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.	M2	0,00	$ 0,00	0,00%
27	**PAVIMENTOS**				
27.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
27.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
27.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
27.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
27.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
27.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	0,00	$ 0,00	0,00%
27.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
27.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%

27.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
27.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
27.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	0,00	$ 0,00	0,00%
27.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
28	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**				
28.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
28.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	0,00	$ 0,00	0,00%
28.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	0,00	$ 0,00	0,00%
29	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**				
29.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	4.920,00	$ 155.747.520,00	246,00%
29.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	38.400,00	$ 13.939.200,00	93,66%
30	**CERRAMIENTO**				
30.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	98,56	$ 8.939.674,46	49,28%
30.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
30.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y	M3	0,00	$ 0,00	0,00%

	FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.				
30.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
30.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
COSTO DIRECTO				**$ 395.074.030,40**	
IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ 1.507.007,95**	
COSTO DIRECTO + IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ 396.581.016,59**	
39	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PUERTO ASÍS**				
39.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.	BMA	**0,00**	$ -	0,00%
COSTO BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 0,00**	
COSTO DIRECTO + IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ 396.581.016,59**	
COSTO TOTAL				**$ 396.581.016,59**	

Tabla 4.Tabla de Avance Actividades Aeropuerto Puerto Asís

3.1.4. Gráfica avance físico del contrato de obra (30/11/2025).

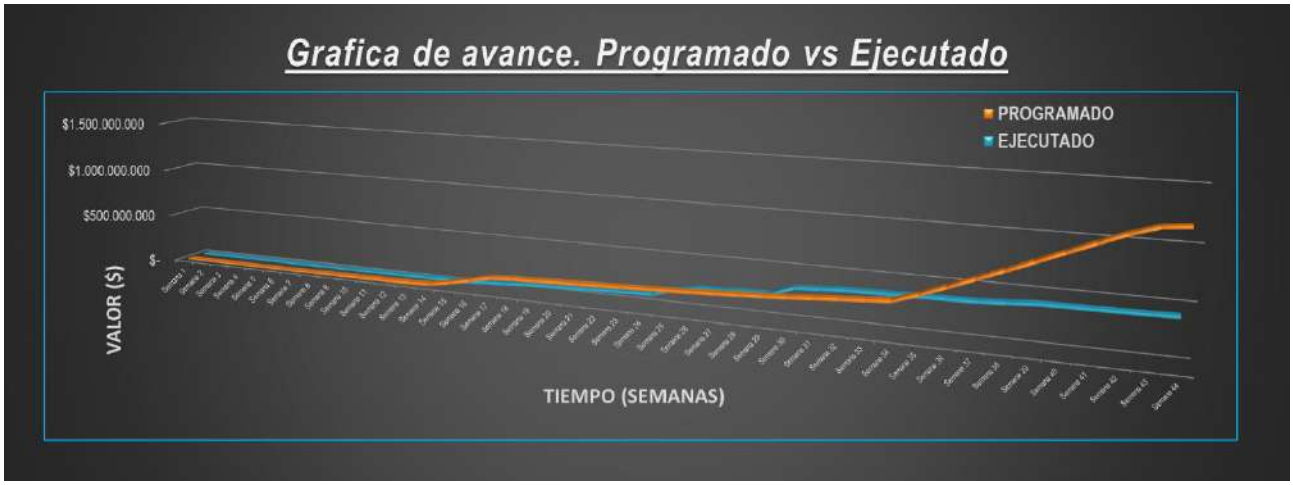


Ilustración 5. Grafica Avance Aeropuerto Puerto Asís

a la fecha del presente informe mensual el avance reportado es el siguiente:

PROGRAMADO	EJECUTADO
57,87%	18,75%
$ 1.223.928.739,87	$ 396.581.016,59

3.1.5. Aeropuerto Florencia

ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	UND	Cantidad Acumulada	Total Costo acumulado	% Ejecutado
31	**LOCALIZACIÓN**				
31.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	72.990,96	$ 113.354.960,88	101,38%
32	**ROCERÍA**				
32.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).	M2	0,00	$ 0,00	0,00%
32.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	824.501,08	$ 88.221.615,56	152,69%
33	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				
33.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	5.649,00	$ 151.189.836,00	48,32%
33.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	10,00	$ 597.360,00	10,00%
33.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
33.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.	M2	0,00	$ 0,00	0,00%
34	**PAVIMENTOS**				
34.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE	M3	0,00	$ 0,00	0,00%

	PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.				
34.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
34.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
34.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
34.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
34.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	0,00	$ 0,00	0,00%
34.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
34.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
34.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
34.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
34.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	0,00	$ 0,00	0,00%
34.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
35	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**				
35.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE	ML	0,00	$ 0,00	0,00%

	SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.				
35.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	0,00	$ 0,00	0,00%
35.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	0,00	$ 0,00	0,00%
36	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**				
36.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	6.240,00	$ 197.533.440,00	208,00%
36.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	54.000,00	$ 19.602.000,00	83,08%
37	**CERRAMIENTO**				
37.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	209,67	$ 19.017.905,01	104,83%
37.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
37.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	0,00	$ 0,00	0,00%
37.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
37.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
COSTO DIRECTO				**$ 622.700.054,21**	
IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ 2.375.286,29**	
COSTO TOTAL				**$ 625.075.340,77**	

40	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO FLORENCIA**				
40.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.	BMA	0,336047701	$33.821.661,00	33,60%
COSTO BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$33.821.661**	
COSTO DIRECTO + IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ 625.075.340,77**	
COSTO TOTAL				**$ 625.075.340,77**	

Tabla 5.Tabla de Avance Actividades Aeropuerto Florencia

3.1.6. Gráfica avance físico del contrato de obra (30/11/2025).

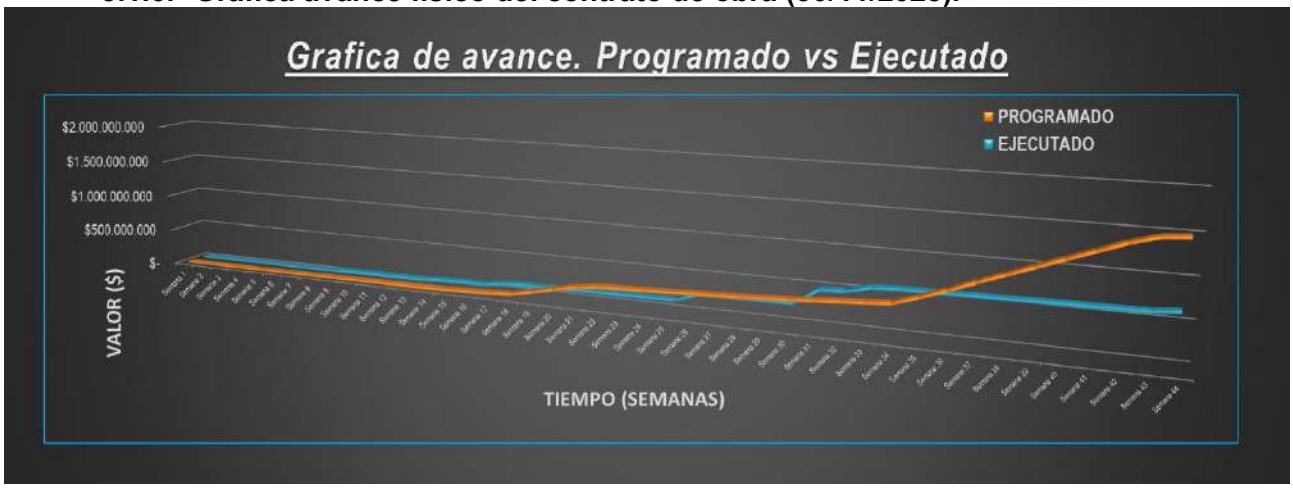


Ilustración 6. Grafica Avance Aeropuerto Florencia

a la fecha del presente informe mensual el avance reportado es el siguiente:

PROGRAMADO	EJECUTADO
60,24%	**24,29%**
$ 1.550.073.483,35	**$ 625.075.340,77**

3.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

3.2.1. Aeropuerto Pitalito

- 18.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).
- 19.1 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 19.2 LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O

CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX.

3.2.2Aeropuerto Puerto Asís

- 25.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).
- 26.2 LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).

3.2.2. Aeropuerto Florencia

- 31.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.
- 32.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

3.3. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO, JUSTIFICACIÓN Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO.

3.3.1. Aeropuerto Pitalito

- 17.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.
- 18.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).
- 19.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.
- 20.1 DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.
- 20.2 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 20.3 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 20.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.
- 20.11 TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.
- 21.3 LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO). (NO SE REQUIERE EN EL CONTRATO)
- 23.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA,

ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).

- 38.1 BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.

Actualmente se avanza en el proceso de adquisición del material pendiente, así como en la vinculación del personal requerido para el desarrollo de estas actividades. De igual manera, se identificaron actividades contempladas en la programación inicial que no resultan necesarias dentro del alcance del contrato

3.3.2. Aeropuerto Puerto Asís

- 24.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.
- 25.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).
- 26.1 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 26.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.
- 26.4 NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.
- 27.1 DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.
- 27.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.
- 27.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO
- 27.11 TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.
- 28.3 LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO). (NO SE REQUIERE EN EL CONTRATO)
- 39.1 BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.

Actualmente se avanza en el proceso de adquisición del material pendiente, así como en la vinculación del personal requerido para el desarrollo de estas actividades. De igual manera, se identificaron actividades contempladas en la programación inicial que no resultan necesarias dentro del alcance del contrato

3.3.3. Aeropuerto Florencia

Se identificaron actividades contempladas en la programación inicial que no resultan necesarias dentro del alcance del contrato.

- 32.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).
- 33.1 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 33.2 LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 33.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.
- 34.1 DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.
- 34.2 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 34.3 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 34.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.
- 34.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).
- 34.6 ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).
- 34.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).
- 34.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).
- 34.9 SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501

FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).

- 34.11 TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.
- 34.12 RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.
- 35.3 LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO). (NO SE REQUIERE EN EL CONTRATO)
- 37.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).
- 40.1 BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.

3.4. ACTAS DE LIBERACIÓN DE OBRA, Y/O DE RECIBO DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA

En el presente periodo se encuentra en revisión el acta de cobro parcial #4.

3.5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO.

En el siguiente Periodo se Planea ejecutar las siguientes Actividades:

3.5.1. Aeropuerto Pitalito

- 17.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.
- 18.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).
- 19.2 LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 19.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.
- 19.4 NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.
- 20.1 DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.

- 20.2 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 20.3 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 20.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.
- 20.11 TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.
- 20.12 RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.
- 21.3 LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).
- 38.1 BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.

La programación de las actividades mencionadas se ha previsto para su ejecución en el siguiente periodo contractual, con el fin de garantizar el avance oportuno de las mismas dentro del cronograma establecido. Este ajuste responde a la necesidad de contar previamente con la adquisición del material pendiente y la vinculación del personal especializado, factores indispensables para desarrollar dichas labores de manera adecuada y conforme a las condiciones técnicas del contrato. De esta forma, se busca optimizar los recursos disponibles, evitar reprocesos y asegurar que cada actividad aporte de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3.5.2. Aeropuerto Puerto Asís

- 24.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.
- 25.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).
- 26.1 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 26.2 LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 26.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.
- 26.4 NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.

- 27.2 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 27.3 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 27.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).
- 27.6 ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).
- 27.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).
- 27.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).
- 27.9 SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).
- 27.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).
- 27.12 RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.
- 28.3 LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).
- 39.1 BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.

La programación de las actividades mencionadas se ha previsto para su ejecución en el siguiente periodo contractual, con el fin de garantizar el avance oportuno de las mismas dentro del cronograma establecido. Este ajuste responde a la necesidad de contar previamente con la adquisición del material pendiente y la vinculación del personal especializado, factores indispensables para desarrollar dichas labores de manera adecuada y conforme a las condiciones técnicas del contrato. De esta forma, se busca optimizar los recursos disponibles, evitar reprocesos y asegurar que cada actividad aporte de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3.5.3. Aeropuerto Florencia

- 31.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.
- 32.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).
- 33.1 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO

REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).

- 33.2 LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- 33.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.
- 33.4 NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.
- 34.2 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 34.3 SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).
- 34.12 RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.
- 35.3 LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).
- 40.1 BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.

La programación de las actividades mencionadas se ha previsto para su ejecución en el siguiente periodo contractual, con el fin de garantizar el avance oportuno de las mismas dentro del cronograma establecido. Este ajuste responde a la necesidad de contar previamente con la adquisición del material pendiente y la vinculación del personal especializado, factores indispensables para desarrollar dichas labores de manera adecuada y conforme a las condiciones técnicas del contrato. De esta forma, se busca optimizar los recursos disponibles, evitar reprocesos y asegurar que cada actividad aporte de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3.6. CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO.

Aeropuerto Pitalito al 30/11/25			
Porcentaje Programado (%)	51,02%	Porcentaje Ejecutado (%)	28,98%
Valor Programado ($)	$ 1.071.360.393,97	Valor ejecutado ($)	$ 608.598.659,64
Aeropuerto Puerto Asís al 30/11/25			
Porcentaje Programado (%)	57,87%	Porcentaje Ejecutado (%)	18,75%
Valor Programado ($)	$ 1.223.928.739,87	Valor ejecutado ($)	$ 396.581.016,59
Aeropuerto Florencia al 30/11/25			
Porcentaje Programado (%)	60,24%	Porcentaje Ejecutado (%)	24,29%
Valor Programado ($)	$ 1.550.073.483,35	Valor ejecutado ($)	$ 625.075.340,77
VALORES DEL CONTRATO 24001291 H4 LOTE2 al 31/08/25			
Porcentaje Programado (%)	56,65%	Porcentaje Ejecutado (%)	24,02%
Valor Programado ($)	$ 3.845.362.617,19	Valor ejecutado ($)	$ 1.630.255.016,99
Valor Acumulado Fecha de Corte Informe		$	1.630.255.016,99

Tabla 6. Cuadro Financiero

3.7. RESUMEN AL CONTROL DE GESTIÓN, A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN.

Durante el presente periodo se continuó con la ejecución conforme a la programación inicial de obra; sin embargo, los informes de avance registran un acumulado del -31,48% frente al cronograma contractual, requiriéndose la implementación de medidas correctivas lo que contribuyó significativamente a mitigar el atraso inicial y a nivelar el avance real alcanzado al 30 de NOVIEMBRE de 2025

De manera complementaria, se encuentra en proceso la elaboración del Balance de Obra N.°1, en el cual se priorizan las actividades catalogadas como críticas para la operación del proyecto. Entre estas se destacan:

- Demarcación de pintura en pista por metro cuadrado, fundamental para garantizar la seguridad operacional.
- Mantenimiento y limpieza de canales, actividad clave para la adecuada evacuación de aguas lluvias y la prevención de inundaciones.
- Reestructuración de recursos provenientes de la intervención en asfalto de pista y calles de rodaje, buscando optimizar la asignación presupuestal y de personal.
- Descontaminación de pista, indispensable para mantener las condiciones de seguridad aeronáutica.

Para el siguiente periodo se proyecta dar continuidad al Quinto ciclo de rocería en los tres aeropuertos, asegurando el control de vegetación en áreas operacionales, así como iniciar las actividades de mantenimiento de cerramientos perimetrales, con el fin de reforzar la seguridad física de las instalaciones aeroportuarias.

4. LABORATORIOS Y ENSAYOS.

4.1. COPIA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

No se generan ensayos durante el presente periodo.

4.2. ANÁLISIS TÉCNICO Y RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS.

No aplica para el presente periodo.

4.3. CONTROL TÉCNICO DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y CONTROLES DE OBRA.

- Asfalto en Frio
- Emulsión Asfáltica

4.4. PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Extracción de testigos de pavimento asfaltico (extracción de núcleos)

5. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

5.1 ANTICIPO DE OBRA

ACTA No.	FECHA	VALOR ANTICIPO
Desembolso #1	14/04/2025	$ 136.308.127,00
Desembolso #2	15/05/2025	$ 72.996.400,00
Desembolso #3	20/06/2025	$ 97.530.297,00
Desembolso #4	18/06/2025	$ 205.130.120,00
Desembolso #5	9/07/2025	$ 33.756.233,00
Desembolso #6	26/08/2025	$ 67.548.161,00
Desembolso #7	29/09/2025	$ 62.222.290,00
Desembolso #8	29/09/2025	$ 34.339.900,00
Desembolso #9	7/10/2025	$ 62.304.231,00
Desembolso #10	22/10/2025	$ 10.945.400,00
Desembolso #11	19/11/2025	$ 101.250.276,00
SUBTOTAL	$ 884.331.435,00	

5.1. CUADRO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO.

Se realiza un seguimiento semanal y se presenta en los informes respectivos.

AÑO	AEROPUERTO	SEMANA	DATOS	
			VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
2025	Pitalito	Semana 1	$ -	$ -
		Semana 2	$ -	$ -
		Semana 3	$ -	$ -
		Semana 4	$ -	$ -
		Semana 5	$ 956.810,23	$ 4.252.489,92
		Semana 6	$ 3.348.835,82	$ 10.205.975,81
		Semana 7	$ 3.348.835,82	$ 6.591.359,38
		Semana 8	$ 3.348.835,82	$ 3.508.304,19
		Semana 9	$ 3.348.835,82	$ 2.338.869,46
		Semana 10	$ 3.348.835,82	$ 7.973.482,79
		Semana 11	$ 3.348.835,82	$ 33.705.716,54
		Semana 12	$ 3.348.835,82	$ 4.602.267,25
		Semana 13	$ 5.169.182,57	$ 6.459.147,06
		Semana 14	$ 17.896.474,27	$ 9.036.701,56
		Semana 15	$ 38.294.548,31	$ 2.104.982,51
		Semana 16	$ 46.231.959,49	$ 7.930.893,71
		Semana 17	$ 46.231.959,49	$ 2.322.200,50
		Semana 18	$ 15.624.282,71	$ 16.637.977,15
		Semana 19	$ 10.523.003,25	$ 10.887.481,45
		Semana 20	$ 10.523.003,25	$ -
		Semana 21	$ 10.523.003,25	$ 715.792,34
		Semana 22	$ 10.531.884,35	$ 13.530.941,52
		Semana 23	$ 10.585.170,95	$ 29.088.992,83
		Semana 24	$ 10.585.170,95	$ 1.558.753,19
		Semana 25	$ 10.585.170,95	$ 67.975.368,40
		Semana 26	$ 13.108.059,75	$ 9.053.226,66
		Semana 27	$ 17.908.966,08	$ 19.632.654,77
		Semana 28	$ 18.707.616,39	$ 9.177.609,41
		Semana 29	$ 20.246.107,83	$ 802.082,84
		Semana 30	$ 20.302.363,20	$ 3.583.147,01
		Semana 31	$ 23.088.991,87	$ 154.693.588,25
		Semana 32	$ 25.178.963,37	$ -
		Semana 33	$ 27.109.645,66	$ 31.672.297,61
		Semana 34	$ 27.109.645,66	$ 4.952.804,81
		Semana 35	$ 24.457.141,43	$ 22.819.438,86
		Semana 36	$ 18.946.590,68	$ 28.349.600,60
		Semana 37	$ 20.842.663,45	$ 17.283.863,17
		Semana 38	$ 20.842.663,45	$ 529.756,53
		Semana 39	$ 55.982.447,04	$ 5.961.627,30
		Semana 40	$ 86.343.718,61	$ 6.090.942,11
		Semana 41	$ 86.343.718,61	$ 2.161.864,58
		Semana 42	$ 86.343.718,61	$ 40.646.945,56
		Semana 43	$ 86.931.703,27	$ 261.580,78
		Semana 44	$ 123.862.194,25	$ 9.497.931,23

2025	Puerto Asís	Semana 1	$ -	$ -
		Semana 2	$ -	$ -
		Semana 3	$ -	$ -
		Semana 4	$ -	$ -
		Semana 5	$ -	$ -
		Semana 6	$ -	$ -
		Semana 7	$ 1.175.233,53	$ -
		Semana 8	$ 2.056.658,67	$ -
		Semana 9	$ 2.056.658,67	$ -
		Semana 10	$ 2.056.658,67	$ 2.977.996,63
		Semana 11	$ 2.056.658,67	$ 2.742.439,78
		Semana 12	$ 2.056.658,67	$ 1.059.200,96
		Semana 13	$ 3.922.513,92	$ 1.994.345,56
		Semana 14	$ 11.622.880,67	$ 2.989.989,10
		Semana 15	$ 34.006.218,10	$ 523.000,60
		Semana 16	$ 48.148.168,84	$ 12.585.563,21
		Semana 17	$ 48.148.168,84	$ 11.138.652,87
		Semana 18	$ 13.647.685,17	$ 16.297.516,46
		Semana 19	$ 7.897.604,55	$ 7.602.465,08
		Semana 20	$ 7.897.604,55	$ 4.975.605,77
		Semana 21	$ 7.897.604,55	$ 10.622.174,93
		Semana 22	$ 7.933.128,95	$ 8.087.069,81
		Semana 23	$ 7.959.772,25	$ 7.253.798,92
		Semana 24	$ 7.959.772,25	$ 4.556.705,08
		Semana 25	$ 7.959.772,25	$ 70.832.109,14
		Semana 26	$ 8.635.684,25	$ 34.896.852,58
		Semana 27	$ 9.833.229,75	$ 2.600.969,11
		Semana 28	$ 10.671.941,56	$ 15.930.977,10
		Semana 29	$ 12.521.918,46	$ 745.745,79
		Semana 30	$ 13.497.511,12	$ 84.448.418,45
		Semana 31	$ 18.374.111,29	$ 13.961.236,84
		Semana 32	$ 17.209.232,16	$ 12.107.946,26
		Semana 33	$ 16.335.572,81	$ 4.408.905,23
		Semana 34	$ 16.335.572,81	$ 2.739.155,93
		Semana 35	$ 81.384.668,39	$ 6.155.070,22
		Semana 36	$ 92.312.543,24	$ 1.939.706,92
		Semana 37	$ 95.284.828,64	$ 3.374.884,92
		Semana 38	$ 95.284.828,65	$ 15.861.766,67
		Semana 39	$ 98.742.120,74	$ 17.079.804,35
		Semana 40	$ 101.335.089,81	$ 3.663.514,52
		Semana 41	$ 99.212.428,71	$ 1.434.371,37
		Semana 42	$ 99.212.428,71	$ 1.821.672,31
		Semana 43	$ 77.602.618,25	$ 2.129.721,67
		Semana 44	$ 33.682.988,75	$ 5.041.662,44

2025	Florencia	Semana 1	$ -	$ -
		Semana 2	$ -	$ -
		Semana 3	$ -	$ -
		Semana 4	$ -	$ -
		Semana 5	$ -	$ -
		Semana 6	$ 1.324.814,15	$ -
		Semana 7	$ 2.318.424,77	$ 511.893,47
		Semana 8	$ 2.318.424,77	$ 2.462.883,70
		Semana 9	$ 2.318.424,77	$ 17.504.752,10
		Semana 10	$ 2.318.424,77	$ 1.904.469,09
		Semana 11	$ 2.318.424,77	$ 91.217,91
		Semana 12	$ 2.318.424,77	$ 1.504.470,96
		Semana 13	$ 2.318.424,77	$ 230.591,27
		Semana 14	$ 2.318.424,77	$ 19.412.516,64
		Semana 15	$ 4.780.598,71	$ 5.368.567,94
		Semana 16	$ 10.936.033,56	$ 1.121.934,42
		Semana 17	$ 10.936.033,56	$ 36.487.618,02
		Semana 18	$ 17.838.180,56	$ 13.644.223,84
		Semana 19	$ 62.641.481,81	$ 3.158.608,10
		Semana 20	$ 65.299.766,98	$ 2.148.772,13
		Semana 21	$ 63.376.194,29	$ 11.602.257,37
		Semana 22	$ 33.412.973,49	$ -
		Semana 23	$ 10.940.557,89	$ 2.439.264,33
		Semana 24	$ 10.940.557,89	$ -
		Semana 25	$ 11.002.725,59	$ 6.905.031,66
		Semana 26	$ 11.115.236,33	$ 103.792.063,48
		Semana 27	$ 11.199.619,39	$ 6.548.380,15
		Semana 28	$ 11.758.760,60	$ 5.242.997,13
		Semana 29	$ 14.354.159,11	$ 2.944.106,57
		Semana 30	$ 15.896.739,42	$ 4.606.155,41
		Semana 31	$ 22.278.112,08	$ 206.297.215,37
		Semana 32	$ 21.709.702,73	$ 12.269.180,22
		Semana 33	$ 20.389.218,13	$ 74.872.642,55
		Semana 34	$ 24.661.749,49	$ 18.852.837,38
		Semana 35	$ 101.449.268,83	$ 725.070,81
		Semana 36	$ 117.561.059,52	$ 1.447.467,33
		Semana 37	$ 124.935.324,46	$ 6.526.721,21
		Semana 38	$ 119.552.230,02	$ -
		Semana 39	$ 120.313.760,71	$ 7.541.912,21
		Semana 40	$ 120.884.908,73	$ 3.276.332,87
		Semana 41	$ 119.671.959,53	$ 3.488.548,66
		Semana 42	$ 118.762.247,63	$ 3.758.882,07
		Semana 43	$ 92.625.499,08	$ 5.587.322,10
		Semana 44	$ 38.976.610,92	$ 30.798.432,30

AÑO	AEROPUERTO	SEMANA	DATOS	
			VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
2025	CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2	Semana 1	$ -	$ -
		Semana 2	$ -	$ -
		Semana 3	$ -	$ -
		Semana 4	$ -	$ -
		Semana 5	$ 956.810,23	$ 4.252.489,92
		Semana 6	$ 4.673.649,97	$ 10.205.975,81
		Semana 7	$ 6.842.494,12	$ 7.103.252,85
		Semana 8	$ 7.723.919,26	$ 5.971.187,88
		Semana 9	$ 7.723.919,26	$ 19.843.621,56
		Semana 10	$ 7.723.919,26	$ 12.855.948,51
		Semana 11	$ 7.723.919,26	$ 36.539.374,23
		Semana 12	$ 7.723.919,26	$ 7.165.939,17
		Semana 13	$ 11.410.121,26	$ 8.684.083,89
		Semana 14	$ 31.837.779,71	$ 31.439.207,29
		Semana 15	$ 77.081.365,12	$ 7.996.551,05
		Semana 16	$ 105.316.161,89	$ 21.638.391,34
		Semana 17	$ 105.316.161,89	$ 49.948.471,38
		Semana 18	$ 47.110.148,44	$ 46.579.717,45
		Semana 19	$ 81.062.089,61	$ 21.648.554,64
		Semana 20	$ 83.720.374,78	$ 7.124.377,90
		Semana 21	$ 81.796.802,09	$ 22.940.224,64
		Semana 22	$ 51.877.986,79	$ 21.618.011,33
		Semana 23	$ 29.485.501,09	$ 38.782.056,08
		Semana 24	$ 29.485.501,09	$ 6.115.458,27
		Semana 25	$ 29.547.668,79	$ 145.712.509,21
		Semana 26	$ 32.858.980,33	$ 147.742.142,72
		Semana 27	$ 38.941.815,22	$ 28.782.004,02
		Semana 28	$ 41.138.318,55	$ 30.351.583,64
		Semana 29	$ 47.122.185,40	$ 4.491.935,20
		Semana 30	$ 49.696.613,74	$ 92.637.720,87
		Semana 31	$ 63.741.215,24	$ 374.952.040,46
		Semana 32	$ 64.097.898,26	$ 24.377.126,48
		Semana 33	$ 63.834.436,60	$ 110.953.845,38
		Semana 34	$ 68.106.967,96	$ 26.544.798,12
		Semana 35	$ 207.291.078,65	$ 29.699.579,90
		Semana 36	$ 228.820.193,44	$ 31.736.774,85
		Semana 37	$ 241.062.816,55	$ 27.185.469,30
		Semana 38	$ 235.679.722,12	$ 16.391.523,20
		Semana 39	$ 275.038.328,49	$ 30.583.343,87
		Semana 40	$ 308.563.717,15	$ 13.030.789,50
		Semana 41	$ 305.228.106,85	$ 7.084.784,61
		Semana 42	$ 304.318.394,95	$ 46.227.499,94
		Semana 43	$ 257.159.820,60	$ 7.978.624,56
		Semana 44	$ 196.521.793,92	$ 45.338.025,97
TOTAL GENERAL			**$ 3.845.362.617,19**	**$ 1.630.255.016,99**

Tabla 7. Cuadro de Control Presupuesto Programado vs Ejecutado

5.2. SOPORTE DE LAS ACTAS DE PAGO.

ACTA No.		COSTO TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL A PAGAR	ESTADO
1	31/03/2025	$ 47.143.374,00	$ 16.028.747,00	$ 31.114.627,00	PAGADA
2	30/04/2025	$ 96.917.707,00	$ 32.950.020,00	$ 63.967.687,00	PAGADA
3	30/05/2025	$ 126.163.132,00	$ 42.895.465,00	$ 83.267.667,00	PAGADA
4	31/06/2025	$ 112.113.225,00	$ 38.118.497,00	$ 73.994.728,00	EN REVISIÓN
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL A LA FECHA		$ 382.337.438,00	$ 129.992729,00	$ 252.344.709	

Tabla 8. Cuadro de Soportes Actas Parciales

A la fecha del presente informe está en revisión el acta parcial #4.

5.3. GRAFICA PRESUPUESTAL.

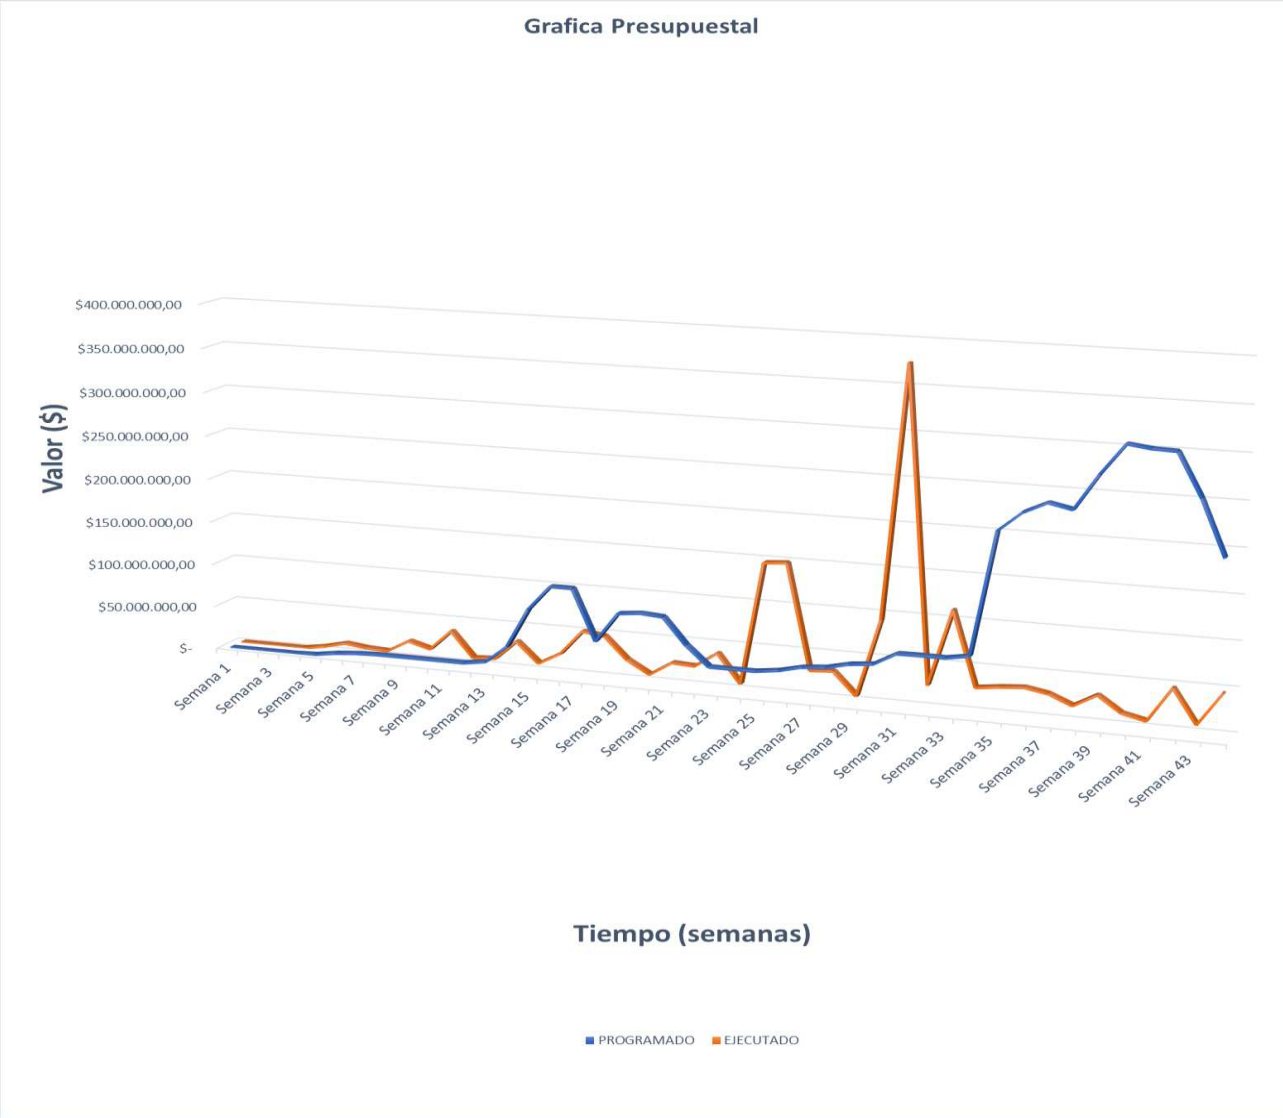


Ilustración 7. Grafica Presupuestal Programado vs Ejecutado

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.

- Para este periodo se reporta un avance ejecutado en el aeropuerto de Pitalito del 28,98% que corresponde a valor de $ 608.598.659,64 pesos colombianos, principalmente en las actividades de rocería y mantenimiento de canales.

- Para este periodo se reporta un avance ejecutado en el aeropuerto de Puerto Asís del 18,75% que corresponde a valor de $ 396.581.016,59 pesos colombianos principalmente en las actividades de rocería y mantenimiento de canales.

- Para este periodo se reporta un avance ejecutado en el aeropuerto de Florencia del 24,29% que corresponde a valor de $ 625.075.340,77 pesos colombianos, principalmente en las actividades de actividades de rocería, mantenimiento de canales, bolsa de monto agotable.

- Durante el periodo correspondiente a este informe se evidenció que algunas actividades programadas no fueron ejecutadas. Dichas actividades resultan representativas dentro del alcance contractual y, a la fecha, generan un atraso en el avance global del proyecto. No obstante, el Consorcio Alfa ha puesto en marcha las medidas correctivas necesarias para mitigar estas falencias y asegurar el cumplimiento integral del contrato en todas sus áreas: administrativa, técnica, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo (SST), de seguros, riesgos y contable.

- A la fecha de edición del presente informe, se realizaron desde el área administrativa los trámites pertinentes ante La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) para la solicitud de carnets de personal y vehículos a ingresar de personal nuevo. También se realizó el manejo de correspondencia tanto enviada como recibida, archivo de información del proyecto, gestión de recursos humanos, contratación, nomina, afiliaciones a EPS, descargos, entre otras, así como la digitalización de documentos y tramite de pólizas. Además, se realizaron capacitaciones a todo el personal sobre seguridad aeroportuaria, esto con el fin de garantizar el correcto mantenimiento del Aeropuerto.

- Desde el área ambiental se desarrollaron las actividades descritas en el anexo No.1 INFORME MENSUAL AMBIENTAL.

- Todas estas actividades se desarrollan con el ánimo de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra No. 24001291 H4 LOTE 2, cuyo objeto es “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y FLORENCIA CAQUETÁ, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2.”

6.1. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.

No.	Descripción	Estado	Estraegia de mitigación
1	Inadecuada modalidad de contratación	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
2	Inadecuado estructuración del Proceso de Contratación	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
3	Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
4	Colusión en el proceso	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
5	Inadecuada selección del contratista	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
6	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
7	Declaración del presente proceso de contratación como desierto. O Declaración del proceso de contratación de Interventoría como desierto	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
8	Incrementos inesperados en los costos de insumos, materiales, transporte y/o equipos debido a la fluctuación de los precios del mercado en el sitio y el entorno del sitio en donde se ejecutará el contrato por cambios intempestivos de las condiciones macroeconómicas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
9	Escases de mano de obra calificada y no calificada	A la fecha, el CONSORCIO ALFA ha identificado un alto indice de ausentimos en cuanto a la mano de obra no calificada u oficios varios, al respecto se ha manifestado en los distintos comités de seguimiento el impacto que esto genera al interior del contrato y los rendimientos estimados.	Establecer convenios con SENA o instituciones locales para capacitación exprésa Aumentar incentivos de retención (alimentación, bonificaciones) Redefinir cronograma con menor simultaneidad de frentes
10	Mayores costos del transporte de material resultante o mayores costos de disposición final del material en botadero autorizado.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
11	Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por bloqueos o manifestaciones en las vias de acceso al Aeropuerto.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
12	Oposición social al proyecto, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
13	Retención forzada de personal y/o equipos	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
14	Sentencias y/u órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
15	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
16	Terminación o modificación parcial del contrato de obra como consecuencia de la ejecución de un contrato de concesión o modificaciones al contrato de concesion existente en el Aeropuerto.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
17	Falta de suscripción del contrato de interventoría para el incio del contrato de obra	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
18	Terminación anticipada o modificación parcial del contrato de obra como consecuencia del riesgo reputacional ocasionado por el Contratista	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
19	Demoras en la expedición de permisos internos por el concesionario o el explotador del aeropuerto para realizar los trabajos en áreas restringidas de la zona lado tierra o lado aire del aeropuerto.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.

20	Interferencia en la continuidad de los trabajos generado por código azul	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
21	Presencia de Foreign Object Damage (FOD), e incursiones en la zona de ejecución de la obra.	A la fecha, el CONSORCIO ALFA ha sido apremiado frente a la disposición de material proveniente de la poda y rosería de las áreas que requieren esta actividad de mantenimiento, el cual se represa y representa un posible riesgo en la operación del aerodromo.	Realizar jornadas extras de recolección de material proveniente de la poda y rocería, con el fin de evitar cualquier posible riesgo operativo ocasionado por el excesivo material proveniente de la poda.
22	Mayores cantidades y/o actividades requeridas para la ejecución de la Etapa de mantenimiento	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
23	Cortes accidentales a las redes REAN / REAP/RTAN / RTAP existentes en el Aeropuerto.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
24	Ejecución de actividades sobre áreas que tengan afectación de garantías de contratos anteriores	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
25	Manejo inadecuado de vectores en la zona de la obra	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
26	Falta de permisos NOTAM, permiso de intervención y renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos en zonas de maniobra de aeronaves (plataforma, calles de rodaje, pistas).	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
27	Riesgos por eventos asociados a la operación aeréa.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
28	El valor de las actividades para los mantenimientos de emergencia supera el valor previsto de la bolsa de monto agotable.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
29	Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones técnicas contractuales.	A la fecha, el CONSORCIO ALFA ha sido apremiado frente a la disposición de material proveniente de la poda y rosería de las áreas que requieren esta actividad de mantenimiento, el cual se represa y representa un posible riesgo en la operación del aerodromo.	Realizar jornadas extras de recolección de material proveniente de la poda y rocería, con el fin de evitar cualquier posible riesgo operativo ocasionado por el excesivo material proveniente de la poda.
30	Escasez de repuestos para sistemas de ayudas visuales y sistema aeroportuarios	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
31	Hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
32	Adiciones o prórrogas del contrato debido a trabajos nocturnos y festivos.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
33	Inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o maniobra del aeropuerto.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
34	Altos niveles de precipitación.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
35	Amenaza geológica	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
36	Contagio del personal de la obras con enfermedades contagiosas, envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos y demas enfermedades que se puedan presentar.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
37	Ocurrencia de fenómenos naturales adversos, previsibles, como inundaciones, precipitaciones intensas, Pluviosidad, Terremotos, Sismos, Descargas eléctricas, entre otros	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
38	Cambios en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, por actualizaciones Tecnicas o Juridicas.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
39	Emisión de manera tardía de los permisos, licencias, autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios para el desarrollo de las obras.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
40	Incumplimiento del PMA y /o deficiencias en la implementacion de los permisos y/o autorizaciones , en áreas de la obras, que ocasionen medidas preventivas por la Autoridad Ambiental Competente.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
41	Cambio de políticas gubernamentales, por modificaciones en la situación política, sistema de gobierno o conflictos sociales que sean probables o previsibles.	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.
42	Fallos en los sistemas de comunicaciones necesarios para realizar el adecuado desarrollo del contrato	N/A	No se ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de mitigación para el riesgo en comento.

Tabla 9. Evaluación de Riesgos

7. FORMATOS DE CONTROL.

7.1. RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA POR EMPRESA.

A continuación, se muestra el número de trabajadores por empresa del mes de NOVIEMBRE de 2025 y se adiciona columna de accidente de trabajo ocurridos en el periodo.

RAZÓN SOCIAL	# Trabajadores Activos	# Trabajadores Flotantes	A.T. (Accidente de Trabajo) en el Periodo
CONSORCIO ALFA	6	0	0
MILEIDY LASSO - PITALITO	9	0	0
MILEIDY LASSO - FLORENCIA	8	0	0
MILEIDY LASSO - PUERTO ASIS	7	0	0
TOTAL	**30**	**0**	**0**

Tabla 10. Relación de Personal en obra por Empresa

7.2. RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA MEDIANTE GRÁFICO.

En el siguiente gráfico, se presenta la relación de trabajadores del numeral anterior.



7.3. RELACIÓN DEL EQUIPO EN OBRA.

#	MAQUINARIA Y/O VEHÍCULO	MARCA	MODELO	CÓDIGO/ PLACA	CAPACIDAD/ TON	EMPRESA	ACTIVIDAD
1	CAMIONETA	TOYOTA	2009	CWV720	0.60	MILEYDI LASSO	ROCERÍA Y CORTE PASTO
2	CAMIONETA	FOTON	2021	GTT995	2.85	MILEYDI LASSO	ROCERÍA Y CORTE PASTO
3	CAMIONETA	KIA	2007	FMB142	0.6	MILEYDI LASSO	ROCERÍA Y CORTE PASTO

Tabla 11. Relación de Vehículos

7.4. CONTROL CLIMATOLÓGICO.

Durante el presente periodo, el Consorcio Alfa enfrentó condiciones climáticas adversas ciertos días del periodo, presentándose lluvias de manera recurrente durante las distintas jornadas laborales desarrolladas en los aeropuertos de Florencia, Pitalito y Puerto Asís. Dichas precipitaciones generaron la interrupción parcial o total de las labores programadas, afectando el normal desarrollo de las actividades. Con el fin de sustentar estas interrupciones, se realizó un registro diario de las precipitaciones presentadas, el cual se encuentra debidamente consolidado en el Anexo 9.

7.5. MATERIALES EN OBRA Y PROGRAMADOS PARA LABOR.

En el presente periodo, el Consorcio Alfa dispone de asfalto en frío y liga para atender eventuales contingencias relacionadas con baches en la pista del aeropuerto de Pitalito, aeropuerto de Puerto Asís. Para el próximo periodo, correspondiente al mes de 2025, se tiene programada la ejecución de trabajos de rocería (ítems 18.2, 25.2 y 32.2), los cuales incluyen la aplicación de fumigación para el control de maleza. Es importante resaltar que esta última actividad es desarrollada directamente por el subcontratista encargado de la rocería.

De manera complementaria, se proyecta iniciar los trabajos de mantenimiento de cerramientos, previendo que el proveedor designado sea quien suministre e instale el material requerido para este tipo de actividades.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1. AEROPUERTO PITALITO

Actividades desarrolladas en el periodo de 1/11/2025 al 30/11/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO CONTADOR**		
PERIODO	31/10/2025 **AL** 6/11/2025	**AREA:**	**TECNICA**



FOTO N°	7
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	Aprovechamiento de material vegetal sobrante de Rocería



FOTO N°	8
FECHA:	6/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	9
FECHA:	6/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	Fumigación



FOTO N°	10
FECHA:	6/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	Fumigación



FOTO N°	11
FECHA:	6/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	12
FECHA:	6/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	Inducción a Nuevo personal

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO CONTADOR**

PERIODO 31/10/2025 **AL** 6/11/2025 **AREA:** TECNICA



FOTO N°	1
FECHA:	31/10/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	Recolección de material vegetal



FOTO N°	2
FECHA:	31/10/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	Retiro de material vegetal



FOTO N°	3
FECHA:	4/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	4
FECHA:	4/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	5
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	6
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	1.2
LOCALIZACION:	Aprovechamiento de material vegetal sobrante de Rocería

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO CONTADOR**

PERIODO 7/11/2025 **AL** 13/11/2025 **AREA:** TECNICA



FOTO N°	7
FECHA:	10/11/2025
ITEM:	19.1
LOCALIZACION:	



FOTO N°	8
FECHA:	10/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	9
FECHA:	10/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	Fumigación



FOTO N°	10
FECHA:	11/11/2025
ITEM:	19.1
LOCALIZACION:	



FOTO N°	11
FECHA:	12/11/2025
ITEM:	19.1
LOCALIZACION:	



FOTO N°	12
FECHA:	13/11/2025
ITEM:	18.2 y 19.1
LOCALIZACION:	

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO CONTADOR**

PERIODO 7/11/2025 **AL** 13/11/2025 **AREA:** TECNICA



FOTO N°	1
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	
LOCALIZACION:	Extracción de Núcleos para determinación de espesores de la carpeta asfáltica de la Pista



FOTO N°	2
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	
LOCALIZACION:	Extracción de Núcleos para determinación de espesores de la carpeta asfáltica de la Pista



FOTO N°	3
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	4
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	19.1
LOCALIZACION:	



FOTO N°	5
FECHA:	8/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	6
FECHA:	8/11/2025
ITEM:	19.2
LOCALIZACION:	

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO CONTADOR**
PERIODO	**14/11/2025 AL 20/11/2025** — **AREA:** **TECNICA**



FOTO N°	1
FECHA:	18/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	2
FECHA:	18/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	Limpieza de pista



FOTO N°	3
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	4
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	
LOCALIZACION:	Orden y Aseo de Bodega



FOTO N°	5
FECHA:	8/11/2025
ITEM:	
LOCALIZACION:	Pausas Activas



FOTO N°	6
FECHA:	8/11/2025
ITEM:	
LOCALIZACION:	Firmas de Preoperacionales y ATS

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO CONTADOR**
PERIODO	21/11/2025 **AL** 27/11/2025 **AREA:** TECNICA





FOTO N°	7
FECHA:	25/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	

FOTO N°	8
FECHA:	25/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	





FOTO N°	9
FECHA:	26/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	Aprovechamiento de material vegetal sobrante de roceria

FOTO N°	10
FECHA:	26/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	





FOTO N°	11
FECHA:	27/01/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	

FOTO N°	12
FECHA:	27/01/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO CONTADOR**

PERIODO 21/11/2025 **AL** 27/11/2025 **AREA:** TECNICA



FOTO N°	1
FECHA:	21/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	2
FECHA:	21/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	3
FECHA:	22/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	4
FECHA:	22/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	5
FECHA:	24/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	



FOTO N°	6
FECHA:	24/11/2025
ITEM:	18.2
LOCALIZACION:	

8.2. AEROPUERTO PUERTO ASIS

Actividades desarrolladas en el periodo de 1/11/2025 al 30/11/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO TRES DE MAYO**
PERIODO	31/10/2025 **AL** 6/11/2025 **AREA:** TECNICA



FOTO N°	1
FECHA:	31/10/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	2
FECHA:	31/10/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	3
FECHA:	31/10/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	4
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	5
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	6
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	25,2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	7
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	8
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO TRES DE MAYO**

PERIODO 7/11/2025 **AL** 13/11/2025 **AREA:** TECNICA



FOTO N°	1
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	2
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	3
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	4
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	9
FECHA:	11/11/2025
ITEM:	26.2
LOCALIZACION:	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).



FOTO N°	10
FECHA:	11/11/2025
ITEM:	26.2
LOCALIZACION:	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).



FOTO N°	11
FECHA:	13/11/2025
ITEM:	25,2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	12
FECHA:	13/11/2025
ITEM:	25,2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO TRES DE MAYO**
PERIODO	**14/11/2025 AL 20/11/2025** — **AREA: TECNICA**



FOTO N°	1
FECHA:	14/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	2
FECHA:	14/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	3
FECHA:	14/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	4
FECHA:	14/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	9
FECHA:	18/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	10
FECHA:	18/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	11
FECHA:	18/11/2025
ITEM:	25,2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	12
FECHA:	18/11/2025
ITEM:	25,2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO TRES DE MAYO**

PERIODO 21/11/2025 AL 27/11/2025 **AREA:** TECNICA



FOTO N°	1
FECHA:	21/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	2
FECHA:	21/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	3
FECHA:	21/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



FOTO N°	4
FECHA:	21/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)



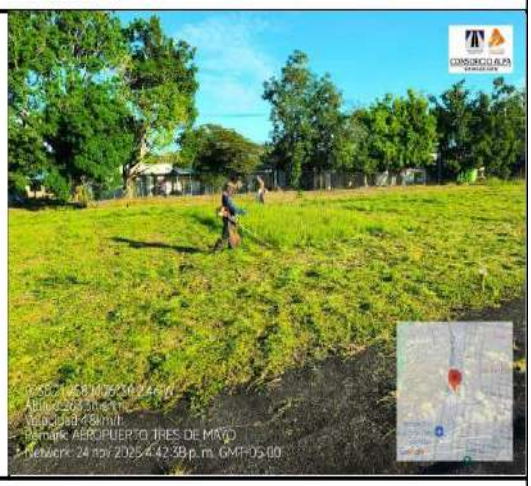


FOTO N°	5
FECHA:	24/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

FOTO N°	6
FECHA:	24/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).





FOTO N°	7
FECHA:	27/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)

FOTO N°	8
FECHA:	27/11/2025
ITEM:	25.2
LOCALIZACION:	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL, CONTROL DE MALESA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)

8.3. AEROPUERTO FLORENCIA

Actividades desarrolladas en el periodo de 1/11/2025 al 30/11/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES**
PERIODO	31/10/2025 **AL** 6/11/2025 **AREA:** TECNICA





FOTO N°	1
FECHA:	31/10/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

FOTO N°	2
FECHA:	31/10/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).





FOTO N°	3
FECHA:	4/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

FOTO N°	4
FECHA:	4/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES**

PERIODO	31/10/2025	**AL**	6/11/2025	**AREA:**	**TECNICA**

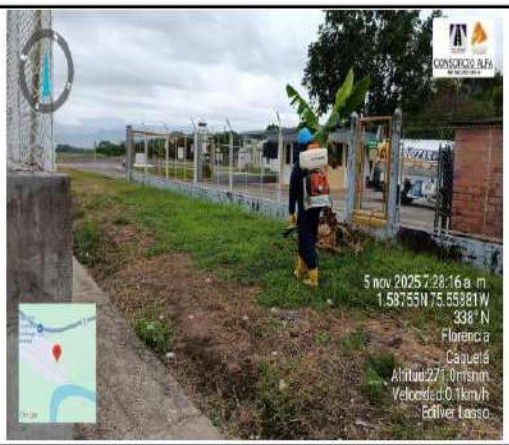


FOTO N°	5
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	6
FECHA:	5/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	7
FECHA:	06/11./2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	8
FECHA:	06/11./2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES**
PERIODO	7/11/2025 **AL** 13/11/2025 **AREA:** TECNICA



FOTO N°	1
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	2
FECHA:	7/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	3
FECHA:	8/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	4
FECHA:	8/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES**

PERIODO	7/11/2025	AL	13/11/2025	AREA:	TECNICA





FOTO N°	5
FECHA:	10/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

FOTO N°	6
FECHA:	10/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).





FOTO N°	7
FECHA:	11/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

FOTO N°	8
FECHA:	11/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES**

PERIODO	7/11/2025	AL	13/11/2025	AREA:	TECNICA



FOTO N°	9
FECHA:	12/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	LLUVIAS INTENSAS DURANTE TODO EL DIA



FOTO N°	10
FECHA:	12/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	LLUVIAS INTENSAS DURANTE TODO EL DIA



FOTO N°	9
FECHA:	13/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	10
FECHA:	13/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO	22001378 H4 DE 2022 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF) LOTE 2 - **AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES**
PERIODO	14/11/2025 **AL** 20/11/2025 **AREA:** TECNICA



FOTO N°	1
FECHA:	14/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	2
FECHA:	14/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	3
FECHA:	14/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).



FOTO N°	4
FECHA:	14/11/2025
ITEM:	32.2
LOCALIZACION:	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).


9. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO

Para este capítulo se entregan junto con el presente informe la relación de correspondencia envida y recibida y la bitácora de obra. (ANEXO 7 y 8).

Posterior a la entrega de este informe se allegará dos anexos más correspondientes al informe de gestión programa de gerencia.

10. LISTADO DE ANEXOS.

En la siguiente imagen se relacionan los anexos vinculados al presente informe.

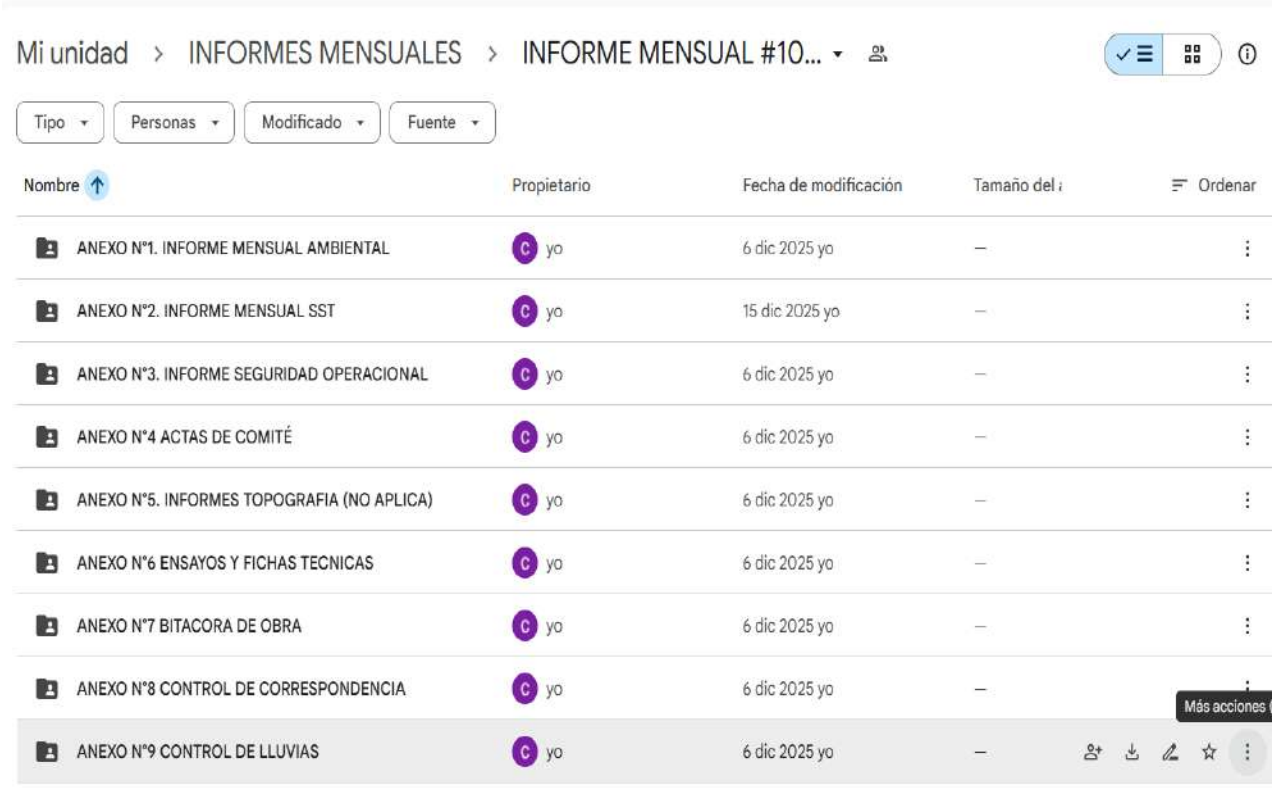

CONSORCIO ALFA

NIT 901.707.929-0

ANEXOS

CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 LOTE 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

(1) Ing Apoyo (1) Inspectora SISOMA.
(1) Ing Ambiental
(4) Ayudantes.
(1) Conductor.
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (1) Taladro.
Actividades de Obra: Se continua con la recolección y acopio de material sobrante proveniente del ciclo 5- Rocería; se registra 1 viaje de material hasta el sitio de disposición final.
Actividades de SST: El dia de hoy se realiza la recolección de material el cual es llevado hasta el sitio de disposición final; se verifica la utilización de los elementos de protección personal (EPP).

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria.

Nota. 193. 4 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo:

Personal Obra	Personal Interventorial.
(1) Ing Residente.	(1) Ing Residente.
(1) Ing Apoyo.	(1) Inspectora SISOMA.
(1) Ing Ambiental	
(1) Inspector SISOMA.	
(2) Ayudantes.	
(1) Coordinador Rocería.	

Maquina y Equipos: Herramienta menor.
Actividades de Obra: Se continua con la recolección y acopio de material sobrante proveniente del ciclo 5- Rocería, sobre el costado izquierdo en dirección de la cabecera 01 a la Cabecera 25.
Actividades de SST: Se tiene el acompañamiento del SST del contratista, el cual realiza al personal capacitación sobre el riesgo y utilización de EPP; luego realiza pesa de traba-

jo con el profesional SST del contratista se da la aprobación al informe SST correspondiente al mes de Julio.

Ing Residente Obra — Ing Residente Interventoría

Nota. 194. 5 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.

Personal Obra	Personal Interventoría.
(1) Ing Residente.	(1) Ing Residente
(1) Ing Apoyo.	(1) Inspectora SISOMA.
(1) Ing Ambiental	
(2) Ayudantes.	
(1) Conductor	
(1) Coordinador de Rocería.	

Maquina y Equipos: Herramienta menor; (1) Tombo; (1) Guadaña.
Actividades de Obra: Se continua con la recolección y acopio del material sobrante proveniente del Ciclo 5 - Rocería; se registra 1 viaje de material hasta el sitio de disposición final; se continua con el corte vegetal sobre la Cabecera 25.
Actividades de SST: Se realiza junto con el profesional ambiental del contratista seguimiento a cantidad de viajes retirados provenientes de la rocería; igualmente se realiza seguimiento a control de personal correspondiente al mes anterior; se evidencia la ubicación de punto de encuentro en área aeropuerto.

Ing Residente Obra — Ing Residente Interventoría.

Nota. 195. 6 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.

Personal Obra	Personal Interventoría.
(1) Ing Apoyo.	(1) Ing Residente.
(1) Ing Ambiental	(1) Inspectora SISOMA

(1) Ayudante
(1) Guadañador.
(1) Coordinador de Cuadrilla.
(2) Técnicos.
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (1) Guadaña; (1) Extractor de núcleos; (1) Camioneta.
Actividades de Obra: Se continua con la ejecución del corte vegetal en la cabecera 25, conforme con los procedimientos establecidos y las condiciones de seguridad operacional; se inicia con la limpieza de encoles y descoles de los canales revestidos; se realiza la extracción de núcleos para verificar el espesor del asfalto, los puntos se tomaron en las zonas a intervenir.
Actividades de SST: El contratista realizo inducción al personal que ingresa; se realiza acompañamiento a los trabajos de extracción de núcleos y se verifica que haya firmado los ATS; se realiza inspección y se verifica que se estén usando los elementos de protección personal.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria.

Nota 196. 7 de noviembre del 2025
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.

Personal Obra
(1) Ing Apoyo.
(1) Ing Ambiental.
(1) Ayudante.
(1) Guadañador.
(1) Coordinador de Cuadrilla. (2) Tecnicos.
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (1) Guadañador; (1) Extractor de nucleos; (1) Camioneta.
Actividades de Obra: Se continua con la ejecución del corte vegetal en la cabecera 25, conforme a los procedimientos estable-

Personal Interventoria.
(1) Ing Residente.
(1) Inspectora SISOMA.

cados y las condiciones de seguridad operacional; se inicia con la limpieza de excesos y descoles de los canales revestidos; se realiza la extracción de núcleos para verificar el espesor del asfalto, los cuales se tomarán en las zonas a intervenir.
Actividades de SST: El contratista realiza inducción al personal que va a realizar la extracción de núcleos; se hace acompañamiento a las actividades.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría.

Nota. 197. 08 de noviembre del 2025
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.
Personal Obra
(1) Ing Apoyo
(1) Guadañador.
Maquina y Equipos: (1) Guadaña.
Actividades de Obra: Se realiza el corte vegetal sobre la zona al frente de Plataforma, con esta actividad se realiza el 100% del corte del cuelo 5- Rocería.
Actividades de SST: Se verifica la correcta utilización de los EPPs.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría

Nota. 198. 10 de noviembre del 2025
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.
Personal Obra
(1) Ing Residente.
(1) Ing Apoyo.
(1) Ing Ambiental
(2) Ayudantes
(1) Fumigador.
Personal Interventoría.
(1) Ing Residente.
(1) Inspectora SISOMA.
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (1) Fu-

mejadora.

Actividades de Obra: Se ejecuta la recolección y acopio del material sobrante de rocería correspondiente al acdo 5, específicamente en el sector de la cabecera 25; Una vez conducida esta fase, se procede con las labores de fumigación, dando así cierre a las actividades programadas para el acdo 5 - Rocería.

Actividades de SST: Se realiza acompañamiento a las actividades verificando condiciones del área y uso adecuado de EPP.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría.

Nota. 199. 11 de noviembre del 2025.

Estado del tiempo: No se reportan lluvias.

Personal Obra	Personal Interventoría.
(1) Ing Apoyo.	(1) Ing Residente.
(1) Ing Ambiental	(1) Inspectora SISOMA.
(3) Ayudantes	

Maquinaria y Equipos: Herramienta menor.

Actividades de Obra: Se realiza la limpieza y reacondicionamiento de canales revestidos; Paralelamente, también se intervienen los desates y excesos que están en dirección del canal.

Actividades de SST: Se verifica que el personal cuente con la hidratación en campo. Se revisa que el ATS se encuentre firmado; Se realiza recorrido revisando condiciones en que se realizan las actividades; Se habla con el Ing. Ambiental para que mantenga organizada la bodega y el punto ecológico.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría.

Nota. 200 12 de noviembre del 2025

Estado del tiempo: No se reportan lluvias.

Personal de Obra	Personal Interventoría.
(1) Ing Residente.	(1) Ing Residente.
(1) Ing Apoyo	(1) Inspectora SISOMA.
(1) Ing Ambiental	
(3) Ayudantes.	

Maquina y Equipos: Herramienta menor.
Actividades de Obra: Se realiza la recolección y acopio del material sobrante proveniente de la limpieza y reacondicionamiento de canales revestidos; Paralelamente, el Sobrante de la limpieza de los descoles y encoles.
Actividades de SST: El contratista envia documentación para ingreso de un trabajador igualmente la realiza la inspección para ingreso de Obra.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría

Nota. 201. 13 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: Se reportan lluvias en la mañana

Personal Obra	Personal Interventoría.
(1) Ing. Residente.	(1) Ing. Residente.
(1) Ing Apoyo.	(1) Inspectora SISOMA.
(1) Ing Ambiental	
(2) Ayudantes	
(1) Conductor	

Maquina y Equipos: Herramienta menor; 1 Turbo
Actividades de Obra: Se realiza la recolección y acopio del material proveniente de la limpieza y reacondicionamiento de canales revestidos; y de la limpieza de encoles y descoles; se retira 1 viaje de material sobrante de los canales, encoles y descoles.
Actividades de SST: El contratista envia el informe SST de septiembre; Se realiza retiro de material hasta el sitio botadero

do; se realiza recorrido de inspección de canales y vista, y se recomienda al contratista hacer el retiro de material que se encuentra acopiado.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría.

Nota. 202. 14 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo; No se reportan lluvias.
Personal Obra
(1) Ing Residente.
(1) Ing Apoyo
(1) Ing Ambiental
Maquina y Equipos: N/A.
Actividades de Obra: No se ejecutan actividades.
Actividades de SST: Se realiza mesa de trabajo con el ingeniero ambiental del contratista. para aclarar temas de actas socioeconómicas; No se presenta personal operativo; Se realiza actividades administrativa por parte del contratista.

Personal Interventoría.
(1) Ing Residente.
(1) Inspectora SISOMA.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría.

Nota. 203. 18 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: Se reportan lluvias intermitentes.
Personal Obra
(1) Ing Apoyo
(1) Ing Ambiental
(1) Guadañador.
(2) Ayudantes.
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (1) Guadaña.
Actividades de Obra; Se realiza el corte vegetal sobre las franjas de seguridad perimetrales al ingreso a plataforma; Paralelamente, se realizo la recolección y acopio del

Personal Interventoría.
(1) Ing. Residente.
(1) Inspectora SISOMA.

material Entrante.
Actividades de SST: Se revisa documentación para ingreso de 2 Trabajadores; se realiza pausa de trabajo con profesional SST del contratista y se aprueba el informe mensual correspondiente al mes de agosto; El contratista realiza pausas activas y socialización del ATS; se evidencia la rotulación de productos químicos en cafetín.

Ing Residente Obra
Ing Residente Interventoría

Nota. 204. 19 de noviembre del 2025
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.
Personal Obra
N/A.
Personal Interventoría.
1 Ing Residente.
1 Inspectora SISOMA.

Maquina y Equipos: N/A.
Actividades de Obra y SST: El día de hoy se realce la visita de un alto funcionario del gobierno; Por lo tanto, por parte de la Gerencia del proyecto nos informan que no se pueden realizar actividades en la jornada.

Ing Residente Obra
Ing Residente Interventoría.

Nota 205 20 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.
Personal Obra
1 Ing Apoyo.
1 Ing Ambiental
(2) Ayudantes
1 Guadañador.
Personal Interventoría.
1 Ing Residente.
1 Inspectora SISOMA.

Maquina y Equipos: Herramienta menor;
1 Guadaña.
Actividades de Obra: Se realiza el corte

vegetal sobre las franjas de seguridad perimetrales al ingreso a plataforma; Paralelamente, se realiza la recolección y acopio del material sobrante.
Actividades de SST: Se recomienda al contratista que el personal llegue con la dotación que le entregaron.

Ing Residente Obra — Ing Residente Interventoría.

Nota. 206. 21 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.

Personal Obra	Personal Interventoría.
(1) Ing Apoyo	(1) Ing Residente.
(1) Ing Ambiental	(1) Inspectora SISOMA.
(3) Ayudantes.	
(2) Guadañadores.	
(1) Conductor	

Maquinaria y Equipos: Herramienta menor; (2) Guadañas; (1) Turbo.
Actividades de Obra: Se continua con la actividad de corte vegetal sobre la Cabecera 07; Paralelamente, se realiza la recolección y acopio de material sobrante para facilitar el cargue y retiro del mismo; se registra 1 viaje de material sobrante hasta el sitio de disposición final.
Actividades de SST; Se realiza por parte del Contratista Socialización de actualización de Cartilla Vial y restricción de asfalto existente; Se hace supervisión a los trabajos de maleza; se recomienda al personal que se encuentra guadañando que utilice los guantes de protección.

Ing. Residente Obra — Ing. Residente Interventoría

Nota 207. 22 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.
Personal Obra
(1) Ing Apoyo.
(1) Ayudante.
(2) Guadañadores
Personal Interventoría.
(1) Ing Residente.
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (2) Guadañas.
Actividades de Obra: Se continua con la actividad de corte vegetal sobre la franja de seguridad costado derecho dirección cabecera 07 a la 25; Paralelamente, se realiza la recolección y acopio del material sobrante para facilitar su cargue y retiro.
Actividades de SST: Supervisión de la utilización de Epp para las actividades conespondiente de la jornada.

Ing Residente Obra
Ing Residente Interventoría.

Nota. 208. 24 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: Se reportan lluvias en la mañana
Personal Obra
(1) Ing Residente.
(1) Ing Apoyo.
(1) Ing. Ambiental
(2) Ayudantes.
(2) Guadañadores.
(1) Conductor.
Personal Interventoría.
(1) Ing Residente
(1) Inspectora SISOMA.
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (2) Guadañas; (1) Tumbo.
Actividades de Obra. Se continua con la actividad de corte vegetal sobre la franja de seguridad costado derecho dirección cabecera 07 a 25; Paralelamente, se realiza la recolección y acopio de material sobrante para facilitar el cargue

y retiro del mismo; se registra 1 viaje de material de ~~[illegible]~~ te hasta el sitio de disposición final.
Actividades de SST: se indica al contratista que no se autorizan trabajos hasta tanto el personal operativo de Mileidy Lasso haya firmado el ATS y la charla de seguridad ya que no se cuentan con estos documentos al día; Así mismo se evidencia en campo que hay un personal operativo que no esta portando la debida dotación que le fue entregada para laborar. Se revisa documentación para ingreso de un trabajador a obra; El contratista esta realizando la inducción a 2 trabajadores.

Ing Residente Obra — Ing Residente Interventoria.

Nota. 209. 25 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: No se reportan

Personal Obra
(1) Ing Apoyo.
(1) Ing Ambiental
(5) Ayudantes.
(2) Guadañas.
(1) Conductor.

Personal Interventoria.
(1) Ing Residente.
(1) Inspectora SISOMA.

Maquina y Equipos: Herramienta menor; (2) Guadañas; (1) Turbo.
Actividades de Obra: Se continua con la actividad de corte vegetal sobre la franja de seguridad Costado derecho dirección cabecera 07 a 25; Paralelamente, se realiza la recolección y acopio de material sobrante para facilitar el cargue y retiro del mismo; se registra el retiro de 1 viaje hasta el sitio de disposición final.
Actividad de SST: Se verifica que el personal se le entrego la dotación y que la estan utilizando; se verifica el uso adecuado de EPP; se realiza la revisión de documentos para

ingreso de un trabajador, se realiza mesa de trabajo con el profesional SST para revisar los ajustes al informe del mes de septiembre.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría.

Nota. 210. 26 de noviembre del 2025.

Estado del tiempo: No se reportan lluvias.

Personal Obra
(1) Ing Auxiliar
(1) Ing Apoyo.
(5) Ayudantes.
(2) Cuadrilladores.
(1) Conductor

Personal Interventoría
(1) Ing Residente.
(1) Inspectora SISOMA

Maquina y equipos: Herramienta menor; (2) Guadañas; (1) Turbo.

Actividades de Obra: Se continua con la actividad de corte vegetal sobre la cabecera 25; Paralelamente, se realiza la recolección y acopio de material sobrante; se registra el retiro de 1 viaje hasta el sitio de disposición final.

Actividades de SST: Se recomienda al personal operativo prevención en las áreas de seguridad cuando hay presencia de aeronaves en el aeropuerto guardando en protocolo de seguridad operacional; se recomienda al contratista mantener la hidratación permanente para el personal que se encuentra laborando; se da la aprobación al informe SST del mes de septiembre.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría

Nota. 211 27 de noviembre del 2025

Estado del tiempo:

Personal Obra
(1) Ing Residente

Personal Interventoría.
(1) Ing Residente

(1) Ay Apoyo (1) Inspector SISOMA.
(1) Ay Ambiental
(5) Ayudantes
(2) Guadañeros.
(1) Conductor.
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (2) Guadañas; (1) Torbo.
Actividades de Obra: Se continua con la actividad de corte vegetal sobre la cabecera 25; Paralelamente, se realiza la recolección y acopio del material sobrante; se registra el retiro de 1 viaje de material hasta el sitio de disposición final.
Actividades de SST: Se realiza seguimiento a las actividades de recolección de material; Se hace verificación de uso adecuado de EPP.

Ay Residente Obra Ay Residente Interventoria.

Nota. 212. 28 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo:

Personal Obra
(1) Ay Residente.
(1) Ay Apoyo
(1) Ay Ambiental
(4) Ayudantes.
(3) Guadañadores.
(1) Conductor
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (3) Guadañas; (1) Torbo.
Actividades de Obra: Se continua con la actividad de corte vegetal costado izquierdo en dirección cabecera 01 a la 25; Paralelamente, se realiza la recolección y acopio del material sobrante; se registra el retiro de 1

Personal Interventoria.
(1) Ay Residente.
(1) Inspectora SISOMA.

viaje hasta el sitio de disposición final.
Actividades de SST: El contratista realiza inspección de extintor, botiquín y kit para control de derrames; se hace seguimiento al uso de EPP, se verifica que es este suministro la hidratación al personal.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría

Nota 213. 29 de noviembre del 2025.
Estado del tiempo: No se reportan lluvias.
Personal Obra Personal Interventoría.
(1) Ing Apoyo (1) Ing Residente.
(3) Ayudantes
(3) Guadañadores.
Maquina y Equipos: Herramienta menor; (3) Guadañas.
Actividades de Obra: Se continua con la actividad de corte vegetal costado izquierdo dirección cabecera 07 a 25; se realiza la recolección y acopio del material sobrante.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoría.

Nota. 214. 1 de diciembre del 2025.
Estado del tiempo:
Personal Obra Personal Interventoría.

Sabado 01 de Noviembre de 2025

No se programaron Actividades por parte del Contratista, personal de Interventoria en labores administrativas Durante la jornada de la mañana.

Ing. Residente de Interventoría

Domingo 02 de Noviembre de 2025

Sin Actividades

Ing. Residente de Interventoria

Lunes 03 de Noviembre de 2025.

Sin Actividades (día festivo).

Ing. Residente de Interventoría

Martes 04 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Sisoma.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes.
Equipo y Maquinaria: Herramienta menor.

Actividades
Se realiza limpieza de Cobertura Vegetal en margen de pista, en margen izquierdo entre las abscisas K0+160 - K0+230, se Conforma el material Sobrante en las franjas de seguridad.

Ing. Residente de Interventoría

Miercoles 05 de Noviembre de 2025.

Estado del tiempo: Sdrodo
Personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora SiSoma.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes
Equipo y Maquinaria: Herramienta menor.

Actividades

Se realiza limpieza de Cobertura Vegetal en margen de pista en margen derecha entre las abscisas Km1+230 - Km1+320, entre las abscisas Km1+230 - Km1+290, el ancho intervenido es de 15 metros. Se conforma el material sobrante en la franja de Seguridad.

Ing. Residente de Interventoria.

Jueves 06 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Sisoma
personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes
equipo y Maquinaria: Herramienta menor.

Actividades
Se realiza limpieza de Cobertura Vegetal en margen de pista, entre las abscisas Km1+320 - Km1+360, M.D.,
Se da la Directriz por parte de la Supervisión de Suspender la actividad en horas blandas por posible lluvia, se debe puntualizar la ejecución en horas Diurnas

Ing. Residente de Interventoria

Viernes 07 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
personal de Interventoria: 1 Residente, 1 Inspectora Sisoma.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes
Equipo y Maquinaria: Herramienta menor.

Actividades
Se realiza limpieza de Cobertura Vegetal en margen de pista entre las abscisas Km1+240 - Km1+270 M.I., Se reanudaron las actividades una vez se realizo recorrido entre Contratista e Interventoria para identificar zonas duras.

Se realiza recorrido en Conjunto entre el Residente de Interventoria y el Ingeniero de Apoyo para la verificación e identificación en Campo de bachecos en la zona norte cerca a la loza de señal de mural 11 y señal de punto de visado de Km1+250 adicional se observo que una de los luces de mural tiene un fallo en la luz roja

Asistencia por parte del Personal de Interventoria a reunión previa al Simulacro de respuesta a emergencias.

Ing. Residente de Interventoria

Sabado 08 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
Personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Sisoma
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 3 Ayudantes.

Actividades
Participacion del personal de contratista e interventoria en el Simulacro de respuesta a emergencias llevado a cabo en la jornada de la mañana.

No se realizan actividades de obra.

Ing. Residente de Interventoria

Domingo 09 de Noviembre de 2025

No se realizan Actividades

Ing. Residente de Interventoria

Lunes 10 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Lluvias fuertes de 12:00 p.m - 1:00 p.m.
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Sisoma
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes
Equipo y Maquinaria: Herramienta menor.

Actividades

Se realiza limpieza de Cobertura Vegetal en margen de pista (Zonas duras), margen derecho entre las abscisas K0+270 - K0+550
Se conforma el material sobrante en los bunjas de seguridad.

Ing. Residente de Interventoría

Martes 11 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Sisoma.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes.
Equipo y Maquinaria: Herramienta menor.

Actividades
Se realiza limpieza de Cobertura Vegetal en margen de Pista (Zonas duras), entre las abscisas K0+550 - K0+600 M.I. y entre las abscisas K0+400 - K0+450 M.D.
Se realiza limpieza de rejilla del canal que recoge las aguas de los Condes (Medidas), Zona Suroccidental.

Ing. Residente de Interventoría

Miercoles 12 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Sisoma.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes.
Equipo y Maquinaria: Herramienta menor.

Actividades

Se realiza limpieza de Cobertura vegetal en margen de pista (Tomo duro). entre las abscisas K0+550 - K0+520, M.D. ancho 2m.

Ing. Residente de Interventoria.

Jueves 13 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: lluvias fuertes de 11:00 a.m - 12:00 p.m
personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora SST.
personal de Contratista: 1 Ingeniero de apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes.
Equipo y Maquinaria: Herramienta menor.

Actividades
Se realiza limpieza de Cobertura Vegetal en margen de pista (Tomo duro). entre las abscisas K0+520 - K0+760 M.D. ancho variable
Durante las lluvias se suspendieron las actividades.

Ing. Residente de Interventoria.

Viernes 14 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado.
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspector SST.
Personal de contratista: 1 Ingeniero de apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes
Equipo y Maquinaria: Herramienta menor

Actividades
Se realiza limpieza de Cobertura vegetal en margen de pista (ambos lados) entre las siguientes abscisas K0+760 - K0+860, K0+880 - K0+970 (entre calles de rodaje Charlie y Bravo), K1+020 - K1+095 (), K1+180 - K1+190 Con un ancho intervenido Variable.

Ing. Residente de Interventoría.

Sábado 15 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspector SST

No se programan actividades por parte del personal de Contratista.
El personal de Interventoría en labores administrativas hasta medio día.

Ing. Residente de Interventoría

Domingo 16 de Noviembre de 2025

Sin Actividades

Ing. Residente de Interventoría

Lunes 17 de Noviembre de 2025

Día festivo No se Programan actividades.

Ing. Residente de Interventoría

Martes 18 de Noviembre de 2025.

Estado del tiempo: Soleado
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspector SST
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 5 Ayudantes, 2 guadañadores), 1 encargado de cuadrilla y Conductor.
Equipo y Maquinaria: 1 vehículo, 2 guadañas).

Actividades

Se da inicio al corte de material vegetal Ciclo 5, entre la isla de la calle de rodaje Charlie y el acceso a bomberos hacia la Cabecera 19 (Zona 13). área de corte 8.919,94 m², área acumulada a la fecha 8.919,94 m² (6.3% con respecto al área total).

Se realizan actividades de recolección y disposición final en la isla entre calle de rodaje charlie y acceso a bomberos la zona verde alrededor de la torre de control. área intervenida 5.227,28 m², se disponen 2 viajes

Ing. Residente de Interventoría

Miercoles 19 de Noviembre de 2025.

Estado del tiempo: Soleado
Personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Sisoma.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de apoyo, 1 Inspector SST, 5 Ayudantes, 2 guadañadores, 1 encargado y Conductor.
Equipo y Maquinaria: 1 Vehículo, 2 guadañas, 1 Soplador.

Actividades
Se da Continuidad al corte de material Vegetal en el costado Noroccidental hacia la Cabecera 19 (Zona 13, 19), área de corte 23.679 m², área acumulada a la fecha 3259 m² (22.8c% Con respecto al área total).

Se realizan recolección y disposición final de material Sobrante en el costado Noroccidental a partir del acceso a bomberos hacia la Cabecera 19. área intervenida 3.692,66 m², área acumulada 8.919,99 (27.36% con respecto al corte).

Ing. Residente de Interventoria

Jueves 20 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
Personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora SiSoma.
Personal de contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 4 Ayudantes 3 guadañadores), 1 encargado de cuadrilla y Conductor.
Equipo y Maquinaria: 1 Vehiculo, 1 Sopladora, 3 guadaña).

Actividades
Se realiza corte de material vegetal en el costado Noroccidental hacia la Cabecera 19 (Jara 13 y 141 a la altura de la señal de umbral), área de corte 6.627 m2, área acumulada a la fecha 39.225 m2 (27.51% con respecto al área de corte).

Se realiza recoleccion y disposición final de material Sobrante en el costado Noroccidental hacia la cabecera 19 área intervenida: 6.250 m2, área acumulada a la fecha: 15.169 m2 (38.67% con respecto al corte).

Se realiza recorrido en plataforma y pista por parte del personal de Interventoria con presencia del Director y Especialista Aeroportuario de la Interventoria

Nota: Se Solicita por parte de la Interventoria la Suspensión de las actividades hasta No garantizar la Comunicación efectiva con torre de control. Se reanudan las actividades en horas de la tarde autorizando unicamente la recolección

Se realiza Comité de obra No. 42 de manera presencial con la participación de la Supervisión, la dirección de Interventoria y Gerencia.

Ing. Residente de Interventoria

Viernes 21 de Noviembre de 2025.

Estado del tiempo: Sdrodo.
personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora SiSoma.
personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, SAyudantes)
3 guadañadores), 1 encargado de cuadrilla y Conductor
1 Ingeniero Residente.
Equipo y Maquinaria: 1 Vehiculo, 1 Sopladora, 3 guadaña.

Actividades
Se realiza Corte de material Vegetal en el Costado Noroccidental hacia la cabecera 19 (Zona 12, 14), rodeando la plataforma de Viraje 19 (Zona 1) avanzando hacia el Costado Nororiental (Zona 2y).
Con un área de Corte: 18.083 m², área acumulada a la fecha 57.3ce m² (40.20%) Con respecto al Corte.

Se realiza Recolección y disposicion final de material sobrante en el Costado Noroccidental hacia la cabecera 19, área intervenida 10.524 m², se disponen 3 viajes, área acumulada 25.693 m² (44.03% Con respecto al corte).

Se realiza Recorrido en pista para seguimiento a la pista y Verificar en campo el estado de la carpeta asi: como tambien los tramos a intervenir que se tienen proyectados dentro del balance este recorrido se realiza en conjunto con la Supervision, Directora de Interventoria y Gerencia del Aeropuerto.

Ing. Residente de Interventoria.

Sabado 22 de Noviembre de 2025.

Estado del tiempo: Soleado
Personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora SISOMA.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 5 Ayudantes
1 encargado de cuadrilla y conductor, 3 guadañadores)
Equipo y Maquinaria: 1 Vehículo, 3 guadañas, 1 Sopladora.

Actividades)

Se realiza Corte de material Vegetal en el costado Nororiental (Zona 3 y 4), Area de Corte: 3000 m², área acumulada a la fecha: 60.308m² (40.63%. Con respecto al área de corte).

Se realiza Recolección y disposición final de material Sobrante en el costado Noroccidental hacia la cabecera 29 Area intervenida 2.350 m², se dispone 1 viaje área acumulada a la fecha: 26.043 m² (45.12%. Con respecto al corte).

Ing. Residente de Interventoria

Domingo 23 de Noviembre de 2025

Sin Actividades.

Ing. Residente de Interventoria

Lunes 24 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado.
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora SISOMA.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 5 Ayudantes, 2 guadañadores, 1 encargado 1 Conductor.
Equipo y Maquinaria: 1 Vehículo, 2 guadañas, 1 Sopladora.

Actividades

Se realiza Corte de material Vegetal en el costado Nororiental avanzando hacia la plataforma 01 (Zona 3 y 4). área de corte 18.747 m², área acumulada a la fecha 76.055 m² (53.3% con respecto al área total).

Se realiza recolección y disposición final de material Sobrante en el costado Noroccidental, hacia la cabecera 19 Derecha/de Umbral. área intervenida 19.907 m², se dispone 1 viaje área acumulada a la fecha 40.100 m² (51.22% con respecto al Corte).

Ing. Residente de Interventoría

Martes 25 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora SISOMA.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST,
3 guadañadores, 4 Ayudantes, 1 encargado de
Cuadrilla y Conductor.
Equipo y Maquinaria: 1 Vehículo, 1 Sopladora, 2 guadañas.

Actividades

Se realiza Corte de material Vegetal en el costado Suroriental hasta la plataforma 01 (Zona 4,5), área de corte: 28.095 m² área acumulada a la fecha: 109.157 m² (73% con respecto al área total).

Se realiza recolección y disposición de material Sobrante del ciclo 5, en el costado Norte (Zona 1) y el costado Nororiental (Zona 2,3) área intervenida 12.172 m² se disponen 2 viajes, área acumulada a la fecha 57.272 m² (55% con respecto al corte).

Nota: Se realizará acompañamiento por parte de la Interventoría a la actividad de extracción de núcleos programada para las 11:30 p.m.

Ing. Residente de Obra

Miercoles 26 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: lluvias fuertes de 9:00 a.m - 11:30 a.m, tarde bloqueada.
Personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Sisema.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de apoyo, 1 Inspector SST, 4 Ayudantes
3 guadañadores, 1 encargado de cuadrilla y
Conductor, 1 laboratorista, 1 auxiliar de laboratorio
Equipo y Maquinaria: 1 Sopladora, 3 guadañas, 1 Vehiculo,
extractor de nucleo.

Actividades

Se realiza Corte de material vegetal en el costado sur (Zona 6) bordeando la plataforma al hacia el costado Suroccidental (Zona 7 y 8), area de corte 20.665m², área acumulada a la fecha 124.792m² (67.54% con respecto al corte).

Se realiza recolección y disposición de material sobrante del ciclo 5. en el costado horizontal (Zona 2 y 3). área intervenida 11.577m², se disponen 3 viajes, area acumulada 68.594m² (55.12% con respecto al corte).

Se realiza acompañamiento a la extracción de nucleos por parte de la interventoria, se obtienen 4 unidades en pista y 1 en plataforma, la actividad se realizo de 9:00 a.m del dia 25/11/25 al 9:00 am del 26/11/25.

Ing. Residente de Interventoria

Jueves 27 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleada
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Ambiental
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de Apoyo, 1 Inspector SST, 3 Ayudantes, 3 guadañadores, 1 encargado de cuadrilla y Conductor.
Equipo y Maquinaria: 1 Vehículo, 3 guadañas, 1 Sopladora.

Actividades

Se realiza Corte de Material Vegetal en el costado Suroccidental (Zona 7, 8, 9 y 10), área de corte 13.833 m², área acumulada 138.025 m² (97.29% con respecto al área total).

Se realiza recolección y Disposición de material sobrante en el costado noroccidental (Zona 2 y 3). área intervenida: 4.624 m² Se disponen 3 viajes, área acumulada a la fecha 73.478 m² (51% con respecto al corte)

Ing. Residente de Interventoría

Viernes 28 de Noviembre de 2025.

Estado del tiempo: lluvias moderadas durante toda la jornada hasta las 3 pm.
Personal de Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspector, 5 Sisoma
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de apoyo, 1 inspector SST, 7 Ayudantes
1 encargado de cuadrilla, Conductor.
Equipo y Maquinaria: 1 Sopladora, 1 Vehículo.

Actividades

Se realiza recolección y disposición de material sobrante en el costado noroccidental (Zona 2, 3), área intervenida 1.705 m², se disponen 2 viajes, área acumulada 69.183 m² (60.73 % con respecto al corte).

Ing. Residente de Interventoría

Sabado 29 de Noviembre de 2025

Estado del tiempo: Soleado
Personal de Interventoria: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspectora Sisoma.
Personal de Contratista: 1 Ingeniero de apoyo 1 inspector SST, 5 Ayudantes
2 guadañadores. 1 encargado de cuadrilla y Conductor
Equipos y Maquinaria: 1 Vehiculo, 2 guadañadoras, 1 Espaldona.

Actividades
Se realizo Corte de material vegetal en las islas entre Calles de rodaje Alfa, Bravo, Bravo y Charlie. área de corte acumulado 142.545m2 (100% del área total).

Se realiza recolección y disposicion final de material Sobrante entre las Calles de rodaje alfa y Bravo, Bravo y Charlie.
área intervenida 3.799 m2, se disponen 3 viajes.
área acumulada 88.10m2 (69.60% con respecto al corte)

Ing. Residente de Interventoria

Domingo 30 de Noviembre de 2025

Sin Actividades

Ing. Residente de Interventoria

Maquinaria y Equipos: Camioneta con estacas, rastrillos.

Ambiental: Se observa una gran cantidad de material sin recolección y retiro sobre las franjas de seguridad.
- pendiente la radicación del informe mensual de septiembre.

SST: El personal cuenta con sus respectivos EPPs, dotación y suministro de hidratación.

04 Noviembre 2025.

Condiciones optimos para la ejecución de las actividades.

Personal Interventoria: Ing. Resid. Camilo Paez
Insp SISOMA Kelly España.

Personal obra: Angela tatiana Muñoz B.
Yonier Leonardo Ramos Roa - Ing A.
Edwin Ospina Bolaños - Cuad.
Edilver Lasso Guevara - Conductor
John fredy Ospina Bolaños
Johan Ricardo Correa Oliveros
Julio herney Daraviña Escobar
Yehison alejandro Riaño Cantor.

Actividades de obra: Recolección y retiro de 02 Viajes de material hacia el sitio de disposición final. Desde la cabecera 12 hacia la cabecera 30, por el costado izquierdo.
Sobre las 14:00 se reactivan las actividades de corte sobre el costado

Izquierdo desde la cabecera 12 hacia la 30.
Maquinaria y Equipos:
Camioneta con estacas, rastrillos y Guadañas

Ambiental: Se realiza el control y Seguimiento al material resultante de la rocería (cesped).
SST: Personal con dotación, EPPs y Suministro de hidratación.

-No hay fumigación.

05 Noviembre 2025

Condiciones optimas Para la ejecución de las actividades.
Personal Interventoria: Ing. Resid. Camilo Paez
Insp SISOMA Kelly España
Personal obra: Angelo tatiana Muñoz B.
Jonier Leonardo Ramos Roa.
Edwin Ospina Bolaños.
Edilver Lasso Guevara.
John fredy Ospina Bolaños.
Johan ricardo Correa Oliveros.
Julio herney Dora Vinto Escobar
Jehison Alejandro Rueda Cantor

Actividades de obra:
Recolección y retiro de material: Se realizaron 2 Viajes desde la cabecera 12 hacia la cabecera 30, Por el costado Izquierdo de la Pista.
Labores de Corte: Ejecución de actividades de Corte y limpieza Sobre el Costado Izquierdo, en el mismo tramo Comprendido entre la cabecera 12 y la 30.

Maquinaria y Equipos: Camioneta con estacas rastrillos y Gundañas.

Ambiental: Se mantiene el seguimiento continuo sobre la gestión en la actividad de recolección y retiro de material y Se le informa al Contratista Suspender la actividad de corte debido al desfase observado entre corte, recolección y retiro del material.
SST: El personal cuenta con sus respectivas EPPs, hidratación y acompañamiento de la inspectora SST.

06- Noviembre 2025

Se Presentaron buenas condiciones climateas, favorables para el desarrollo normal de las actividades.
Personal Interventoria: Ing. Resid. Camilo Paez.
Insp SISOMA Kelly España.
Juan felipe Martinez Planta – Director I
Personal Obra: Angela tatiana Muñoz B - Insp SST.
Jonier Leonardo Ramos Roa - Apoyo Ing
Juan Paulo Arias Ayala - Residente Obra
Edwin Ospina Bolaños - Ayud.
Edilver Lasso Guevara - Conductor
John fredy Ospina bolaños - Guad.
Johan ricardo Correa Olivenos - Ayud
Julio herney Daraviña Escobar - Ayud.
Yehison Alejandro Rincón Cantor
Octavio Augusto Morales Ayala - D. Obra

Actividades de obra: Recoleccion y retiro de material: Se realizaron 5 Viajes desde la Cabecera 12 hacia la Cabecera 30, Por el costado izquierdo de la Pista.
- Se realiza el comite presencial en la

Sala de Juntas del aeropuerto Gustavo Artond. Paredes en conjunto con los residentes, directores y el Ingeniero Michael por Parte de la aeronatica.

Ambiental: Como seguimiento y contro sobre el material cortado Producto del corte de roceria, se realizó la suspensión de la actividad de corte.
No se evidencia la fumigación con Alisin.
SST= Personal con su respectiva dotación y EPPs.

07 Noviembre 2025.
Condiciones Optimas Para la geecución de lo actividades.
Jonier Leonardo Ramos Ron.-
Personal Obra= Juan Paolo Arias Ayala.
Edwin Ospina Bolaños
Edilver Lasso Guevara.
John fredy Ospina Bolaños.
Johan Ricardo Correa Olveros
Octavio Augusto Morales Ayala.

Personal Interventoria: Ing. Resid. Camilo Paez
Insp SISOMA Kelly España.
Director Juan felipe. Martinez.
El dia de hoy, se realizó un recorrido en Campo en Compañia de la gerente del aeropuerto, funcionario de la aerocivil de la Supervisión de bogota, la interventoria y el contratista. A continuación, se Presentan los puntos Claves socializados.
Rejillas: Se revisó la necesidad de reemplazar los rejillas que limitan el lado aire con el

lado tierra. Se le recordó al contratista la necesidad de Presentar la Justificación de los tramos a reemplazar y de los tramos a demoler o renivelas Para el apoyo de las nuevas rejillas.
- Cerramiento Perimetral: Se revisó el cerramiento perimetral en el Sector del mediterraneo, donde hay un tramo aproximado de 30 metros que colapsó y debe Ser reemplazado. El contratista Se comprometió a presentar el análisis completo y los costos de la intervención.
- Eliminación de puerta de acceso: Se gerente manifiesta la necesidad de eliminar una Puerta de acceso y convertir esa longitud en Cerramiento Perimetral.
- Limpieza de material Vegetal: Se habló de la necesidad de realizar la limpieza de material Vegetal en las bermas de la Pista.
- Reconstrucción de Canales: Se solicitó la actividad de reconstruccion de canales, Para lo cual Se revisó el APU presentado Por el contratista y Se ajustó con los precios contractuales.
- Ajustes de demarcación: Se habló de la necesidad de ajustar los diseños de demarcación, incluyendo el helipuerto uno, dos, de acuerdo a las Posibilidades de espacio.
- Adición de presupuesto: El funcionario de la Supervisión de bogotá expuso la Posibilidad de adicionar presupuesto al contrato, Para lo cual Se le solicitó al contratista Identificar las Posibles obras a ejecutar con una adición contractual.

Actividades realizadas: Recolección y retiro de material: Se realizaron 4 viajes desde la cabecera 12 hacia la cabecera 30, por el costado izquierda de la pista.

Powered by CamScanner

lado tierra. Se le recordó al contratista la necesidad de Presentar la justificación de los tramos a reemplazar y de los tramos a demoler o renivelas para el apoyo de las nuevas rejillas.

- Cerramiento Perimetral: Se revisó el cerramiento perimetral en el Sector del mediterraneo, donde hay un tramo aproximado de 30 metros que colapsó y debe ser reemplazado. El contratista se comprometió a presentar el análisis completo y los costos de la intervención.
- Eliminación de puerta de acceso: El gerente manifiesta la necesidad de eliminar una puerta de acceso y convertir esa longitud en Cerramiento Perimetral.
- Limpieza de material Vegetal: Se habló de la necesidad de realizar la limpieza de material Vegetal en las bermas de la Pista.
- Reconstrucción de Canales: Se solicitó la actividad de reconstruccion de canales, para lo cual se revisó el APU presentado por el contratista y se ajustó con los precios contractuales.
- Ajustes de demarcación: Se habló de la necesidad de ajustar los diseños de demarcación, incluyendo el helipuerto uno, dos, de acuerdo a las posibilidades de espacio.
- Adición de presupuesto: El funcionario de la supervisión de bogotá expuso la posibilidad de adicionar presupuesto al contrato, para lo cual se le solicitó al contratista identificar las posibles obras a ejecutar con una adición contractual.

Actividades realizadas: Recolección y retiro de material: Se realizaron 4 viajes desde la cabecera 12 hacia la cabecera 30, por el costado izquierda de la pista.

Despues de las 16:00, se inician actividades corte Cerca al lugar como destino "Campamento"
Maquinaria y Equipo: Carmoneta con estacas rastrillos y guadañas.
Ambiental: Se le realiza la observación al ingeniero de apoyo y subcontratista mejorar la actividad de recolección.
SST: Personal con dotación y suministro de hidratación.

Noviembre.

08 octubre 2025

Condiciones optimas para la ejecución de las actividades.
Horario = 7:00 am hasta 12:37 PM.
Personal Interventoria: Ing. Camilo Paez.
Insp SISOMA Kelly España
Personal obra: Angelo Tatiana Muñoz Bocanegro
Edwin Ospina Bolaños - Cuad.
edilver lasso Guevara - Conductor
John fredy Ospina Bolaños - Cuad.
Johan Ricardo Correa Oliveros - Ayud
Julio herney Doraviza Escobar - Ay.

Actividades de obra:
Se realiza Corte alrededor de la Zona del "Campamento"
y asimismo se procede con el retiro del material:
Se refiraa dos (02) Viajes hacia el sitio de disposición.

Ambiental: Se realiza el retiro de dos (02) Viajes de material hacia el sitio de disposición.
SST: Personal con sus respectivos EPPs y dotación.

10 Nov 2025

Condiciones optimas para la ejecución de las actividades.
Personal Interventoria: Ing. Resid. Camilo Paez
Insp SISOMA Kelly España
Personal obra: Anyela tatiana Muñoz B.
- Edwin Ospina Bolaños - Guad.
Edilver Lasso Guevara - Conductor
John fredy Ospina bolaños - Guad.
Johan ricardo Correa Oliveros - Ayud.
Julio herney Daraviña Escobar - Ayud
Yehison Alejandro Riaño Cantor - Ayud.
Actividades realizadas:
Corte: Se finalizó el corte en la zona
-Ubicada en el "Campamento".
-Se Inicio corte en la isla entre Bravo y charlie.
Recolección y retiro de material: Se realizaron tres (03) Viajes de material: 1.5 desde el campamento y 1.5 de la isla entre bravo y Charlie.
Maquinaria y Equipos:
-Camioneta con estacas
- Rastrillos
- Guadañas (02).

SST: Se observa material suelto en la isla intervenida.
Personal con sus respectivos EPPs y dotación.

11 Nov - 2025

Condiciones optimas Para la ejecución de las actividades.
Personal Interventoria: Ing. Resid. Camilo Paez.
Insp SISOMA Kelly España
Personal obra: Anyela tatiana Muñoz B - Insp SST
Jonier Leonardo Ramos Roa - Ing Apoyo

Powered by CamScanner

Edwin Ospina Bolaños
Edilver Lasso Guevara
John fredy Ospina Bolaños.
Johan ricardo Correa Oliveros = 7:00 - 12:00 PM
Julio herney Daraviña Escobar
Yehson Alejandro Riaño Cantor.
Actividades: Continúa el corte de Cesped. entre la isla entre bravo y charlie. Asimismo, se hace el retiro del material cortado.
Se avanza en la recolección y retiro del material ubicado en la zona del campamento.
Se realiza el retiro de 03 Viajes de material hacia el sitio de disposición final.

Herramienta y Equipos: Camioneta con estacas, rastrillos, sopladora y guadañas.

Ambiental: a la fecha no se ha recibido las correcciones del informe mes de agosto y los Informes Correspondientes a los meses de septiembre y octubre no se han entregado.
-Se avanza en el retiro del material
SST: personal con sus respectivos EPP, y dotación.

12 Nov 2025

Condiciones optimas Para la ejecucion de las actividades.
personal InterVentoria: Ing. Resd. Camilo Paez
Insp SISOMA Kelly España
Personal obra: Edwin Ospina Bolaños
Edilver Lasso Guevara
John fredy Ospina Bolaños.
Johan ricardo - Renuncia.
Julio herney Daraviña Escobar

Yehison Alejandro Riaño Cantor.
Actividades realizadas:
Se finaliza con el corte en la isla entre Bravo y charlie y se inicia con la isla entre Alfa y Bravo
Se realizaron 03 Viajes de material hacia el sitio de disposición final.
Maquinaria y Equipos
Camioneta con estacas
Rastrillos
Guadañas.
Ambiental: pendiente la ejecución de la actividad. de fumigación.
- Pendiente la entrega de las Subsanación Para los Informes de agosto y septiembre.
- Pendiente la radicación del Informe correspondiente Para el mes de octubre.
SSI: personal con dotación, EPPs y suministro de hidratación.

13 Nov - 2025

Condiciones optimas para la ejecución de las actividades.
Personal: Interventoria: Ing. Resid. Camilo Paez.
Insp SISOMA Kelly España.
Personal obra:
Yoner Leonardo Ramos Roa.
Angela tatiana Muñoz B
Edwin Ospina Bolaños.
Edilver Lasso Guevara.
John fredy Ospina Bolaños.
Julio herney Daraviña Escobar.
Jehison Alejandro Riaño Cantor.

Powered by CamScanner

Actividades de obra:
Se inicia la actividad de corte sobre la zona del "mediterraneo". Asi mismo se realizó el retiro de 02 Viajes de material hacia el sitio de disposición.
Maquinaria y Equipos:
Camioneta con estacas
Rastrillos
Guadañas.
Ambiental: No se realizan actividades de fumigación.
SST: Personal con sus respectivos EPPs y
dotación
El dia de hoy, no se permitio la iniciación de los actividades debido a qué no se Presentó los respectivos responsables del consorcio.
A las 9:20 am, se iniciaron actividades, momento en el qué hizo presencia el Ingeniero de apoyo

14 Nov - 2025
Buenas condiciones para la ejecución de las actividades.
Personal Interventoria: Ing. Resid. Camilo Paez.
Inspector SISOMA Kelly España.
Personal obra: Angela Tatiana muñoz B.
Edilver Lasso Guevara
Edwin Ospina
John fredy ospina
Julio Heaney Daraviña
Yehison Alejandro Riaño Cantor.

Se finalizan las actividades correspondientes al ciclo 5. (corte, recoleccion, retiro y fumigación).
El dia de hoy, ejecutaron la actividad de

Corte.
Ambiental:
- Pendiente la subsanaciones correspondientes a los informes de agosto y septiembre.
- Se desconoce el estado del informe correspondiente a octubre.

SST:
Pendiente la radicación de los informes de Septiembre y octubre.

15 Nov - 2025
No hubo programación de actividades por parte de contratista de obra.
No hubo Presencia de Personal.

18 - Nov - 2025
No hubo Programación de actividades por Parte del Contratista de obra.
No hubo Presencia de Personal

19 - Nov - 2025
No hubo Programación de actividades Por parte del contratista de obra.
No hubo Presencia de Personal.

20 - Nov - 2025
No hubo Programación de actividades Por parte del contratista de obra.
No hubo Presencia personal

21 - Nov - 2025
No hubo Programación de actividades Por parte del contratista de obra.
No hubo Presencia Personal

22 - Nov - 2025
No hubo Programación de actividades por parte del contratista de Obra.
No hubo presencia personal

Powered by CamScanner

24 - Nov - 2025
No hubo programación de actividades por parte del contratista de obra. Ni personal del contratista.

25 - Nov - 2025
No hubo programación de actividades por parte del contratista de obra. Ni personal del contratista.

26 Nov - 2025
No hubo Programación de actividades Por Parte del Contratista de obra. Ni Personal de contratista

27 - Nov - 2025
No hubo Programación de actividades por Parte del contratista de obra ni personal del contratista.

28 - Nov - 2025
No hubo Programación de actividades Por Parte del contratista.

29 - Nov - 2025
No hubo programación de actividades por Parte del Contratista.

1 Diciembre - 2025
No hubo Programación de actividades por Parte del contratista de obra.

Powered by CamScanner

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS
PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 09
DE CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 DE 2024 LOTE 2

La Interventoría del Contrato de Obra No. 240001291 H4 de 2024– *"*REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 2*"*. Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **CONSORCIO ALFA**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de obra No. 09, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025**, hace aprobación de los siguientes documentos anexos del acta en mención:

- INFORME MENSUAL TECNICO NOVIEMBRE DE 2025 FLORENCIA (RA-CASB-0112-2026-VT)
- INFORME MENSUAL AMBIENTAL NOVIEMBRE DE 2025 FLORENCIA (RA-CASB-0112-2026-VT)
- INFORME MENSUAL SST NOVIEMBRE DE 2025 FLORENCIA (RA-CASB-0112-2026-VT)
- INFORME MENSUAL TECNICO NOVIEMBRE DE 2025 PITALITO (RA-CASB-0112-2026-VT)
- INFORME MENSUAL AMBIENTAL NOVIEMBRE DE 2025 PITALITO (RA-CASB-0112-2026-VT)
- INFORME MENSUAL SST NOVIEMBRE DE 2025 PITALITO (RA-CASB-0112-2026-VT)
- INFORME MENSUAL TECNICO NOVIEMBRE DE 2025 PUERTO ASIS (RA-CASB-0112-2026-VT)
- INFORME MENSUAL AMBIENTAL NOVIEMBRE DE 2025 PUERTO ASIS (RA-CASB-0112-2026-VT)
- INFORME MENSUAL SST NOVIEMBRE DE 2025 PUERTO ASIS (RA-CASB-0112-2026-VT)

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB
