JH INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
NIT. 900992549-1
CELULAR: 3009684433-3104527279

Becerril, Cesar 6 de agosto de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL CESAR
Ciudad.
Atn. Ing. Yunis Cuentas Zambrano

ASUNTO: INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC 003 DE 2025.

1. INTRODUCCION

De manera atenta me dirijo a usted como representante legal de la empresa JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S con el fin de hacer entrega de las actividades realizadas del Contrato de Obra No. SAMC 003 DE 2025 suscrito entre la alcaldía municipal de BECERRIL, y JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S, que tiene por objeto "**1. SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR"** el municipio recibe a entera satisfacción lo relacionado en el objeto contractual,

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

MODALIDAD CONTRACTUAL	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OFICINA O SECRETARÍA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE OBRAS
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	02 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR

OBJETO:	SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
CONTRATISTA:	JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S.		
NIT CONTRATISTA	900992549-1		
REPRESENTANTE LEGAL	JOHAN FAVIANY HINOJOSA CESPEDES identificado con la cedula de ciudadanía No 1.065.580.722 de Valledupar.		
VALOR:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($299.990.441, oo)		
PLAZO:	TRES (3) MESES		
FECHA DE INICIO:	08/05/2025		
NOMBRE DEL SUPERVISOR O DELEGADO	YUNIS CUENTAS ZAMBRANO		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	N.A.
PRORROGAS	N.A.	N.A.	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE AGOSTO DE 2025		

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS

El objeto del contrato tuvo como alcance Suministro, reparación e instalación de transformadores y materiales eléctricos para garantizar el correcto funcionamiento de las redes eléctricas del Municipio de Becerril, Departamento del Cesar.

A continuación, se detallan los trabajos realizados en la intervención:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
	MATERIALES		
1	SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO DE 12MX750 KG.	UNI	5,00
2	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 75 KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	3,00
3	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 50 KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	3,00

4	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	2,00
5	CONECTOR TRANSVERSAL EN CALIENTE	UNI	27,00
6	COLLARIN DE TRANSFORMADOR 7-8 1 SALIDA	UNI	24,00
7	AISLADOR CARRETO LOZA3 1/4	UNI	10,00
8	CONECTOR DE PERFORACION ASILADO PRINCIPAL 4 A 4/0	UNI	45,00
9	CORTACIRCUITOS 27KV - 100 AMP	UNI	33,00
10	PARARRAYOS POLIMERICOS 15KV - 10KA	UNI	33,00
11	CRUCETA AUTOSOPORTADA GALVANIZADA EN CALIENTE 1/4X3X2.40 MTS	UNI	13,00
12	FUSIBLE DE SOGA DE 1 AMP - 15KV	UNI	20,00
13	FUSIBLE DE SOGA DE 2 AMP - 15KV	UNI	20,00
14	FUSIBLE DE SOGA DE 3 AMP - 15KV	UNI	20,00
15	FUSIBLE DE SOGA DE 30 AMP - 15KV	UNI	30,00
16	FUSIBLE DE SOGA DE 4 AMP - 15KV	UNI	20,00
17	FUSIBLE DE SOGA DE 5 AMP - 15KV	UNI	19,00
18	PERNO 5/8 X 12"	UNI	10,00
19	CINTA BANDIT 5/8	MTS	90,00
20	HEBILLA BANDIT 5/8	UNI	60,00
21	KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UNI	5,00
22	CABLE DE COBRE THHN # 2	MTS	145,00
23	CABLE TRENZADO EN ALUMINIO 2X2/0+1X2/0	MTS	380,00
24	PERCHA 1 VIA GALVANIZADA EN CALIENTE	UNI	10,00
25	VARILLA COPER WELL 5/8 X 2.40 MTS	UNI	5,00
26	TORNILLO 5/8 X 1" 1/2	UNI	10,00
27	TERMINAL ESAÑADO DE PONCHAR n2	UNI	24,00
28	CONECTR AMPAC CON ESTRIBO 2/0	UNI	25,00
29	CABLE ALUMINIO TIPO ACSR n2	Mts	3.796,00
30	TERMINAL ESTAÑADO DE PONCHAR n2/0	UNI	12,00
31	RETENIDA DE MEDIA TENSION	UNI	5,00
32	AISLADOR LINE POST 13.200V CON PIN	UNI	10,00
33	AISLADOR DE SUSPENSION SINTETICO	UNI	10,00
34	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	2,00
35	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	1,00

MANO DE OBRA			
1	MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN POSTE CON CARRO CANASTA DE 1 HASTA 75 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	UNI	13,00
2	ELABORACION DE POLO A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS	UNI	5,00
3	MONTAJE DE PROTECCIONES MT PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO HASTA 75KVA	UNI	4,00
4	BALACEO E INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS	UNI	3,00
5	ELLABORACION DE HUECO PARA POSTE DE CONCRETO DE 12 Mts X 750 kg DE 180 cm DE PROFUNDIDAD X 40 cm DE ANCHO	UNI	7,00
6	ELLABORACION DE HUECO PARA RETENIDA DE MEDIA TENSION DE 160 cm DE PROFUNDIDAD X 40 cm DE ANCHO	UNI	3,00
7	INCADA Y APLOMADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 Mts X 750kg.	UNI	7,00
8	TENDIDO Y TENCIONADA DE TRAMO DE 380 Mts DE CABLE TRENZADO EN ALUMINIO 2X2/0+1X2/0 EN POSTE	GLB	1,00
9	CAMBIO DE PARARRAYOS POLIMERICOS A 13200 VOLTIOS	UNI	8,00
10	TENDIDO Y TENCIONDA DE TRAMO 1000 Mts DE LINEA MONOFASICA EN CABLE ACSR N° 2 EN POSTE	GLB	1,00
11	TENDIDO Y TENCIONDA DE TRAMO 396 Mts DE LINEA MONOFASICA EN CABLE ACSR N° 2 EN POSTE	GLB	1,00
12	TENDIDO Y TENCIONDA DE TRAMO 502 Mts DE LINEA MONOFASICA EN CABLE ACSR N° 2 EN POSTE	GLB	1,00

Anexo:

- Memorias de cálculo con Registro fotográfico.
- Corte Presupuestal Con actividades Realizadas y Facturadas en el presente Informe.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Se contrató el personal, se hicieron los respectivos pagos al sistema general de aportes a seguridad social (Salud y Pensión) correspondientes al mes de julio y agosto del presente año.

5. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:


CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 299,990,441	
ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO	$114.237.226	PAGADO 18/06/2025
SEGUNDO PAGO	$154.651.392	PAGADO 29/08/2025
TERCER PAGO	31.101.823,00	PENDIENTE
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (valor del informe – valor de la amortización)	$ 31.101.823,00	PENDIENTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	$ 0	N.A.

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 100%

GRAFICA AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR	VALOR DEL ANTICIPO
$ 299.990.441	$ 299.990.441	0	$ 31.101.823,00	0

GRAFICA EN BARRA

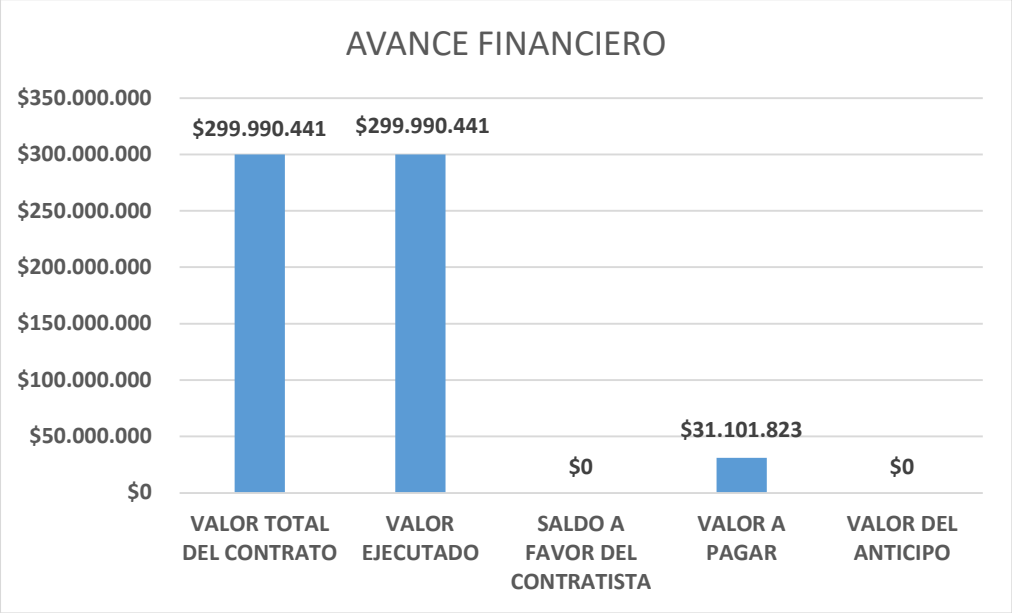

6. SEGUIMIENTO DE POLIZAS

Fueron aprobadas por la oficina jurídica del Municipio de Becerril Cesar las pólizas expedidas por la compañía **SEGUROS MUNDIAL** Pólizas identificadas con el número**: BQ-100102159 Póliza de Seguro de Cumplimiento** expedida el 06 de mayo de 2025 y **póliza de seguro de Responsabilidad civil extracontractual número BQ-100028589** expedida el 06 de mayo de 2025**,** para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones adquiridas en virtud del Contrato de Obra **SAMC 003 DE 2025** cuyo objeto es: **1. SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.,** suscrito el día dos (02) de mayo de 2025.

AMPARO	Vr. Asegurado	Vigencia	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29.999.044,10	02/05/2025	02/12/2025
PRESTACIONES SOCIALES	14.999.522,05	02/05/2025	02/08/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29.999.044,10	02/05/2025	02/08/2030
AMPAROS BASICOS - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000.00	02/05/2025	02/12/2025
PATRONAL	284.700.000.00	02/05/2025	02/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000.00	02/05/2025	02/12/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000.00	02/05/2025	02/12/2025

ATENTAMENTE

JOHAN FAVIANY HINOJOSA CESPEDES
Cédula de ciudadanía No. 1.065.580.722 de Valledupar
Representante Legal, JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S
