
PROGRAMACION DE OBRA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**CONSTRUCCION PABELLÓN EXPOSITIVO UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME EN BOGOTÁ, D.C**	**107 días**	**28/05/26**	**11/09/26**	
2	Inicio	0 días	28/05/26	28/05/26	
3	**ACTIVIDADES CONTRACTUALES**	**107 días**	**28/05/26**	**11/09/26**	
4	Empradización o Poda de césped y tratamiento para inhibir su crecimiento	**5 días**	6/09/26	10/09/26	45
5	Alquiler baño provisional	**101 días**	2/06/26	10/09/26	27CC+5 días
6	Implementación del Plan de Manejo Arqueológico y monitoreo arqueológico. (incluye actividades de lavado, clasificación y análisis de los materiales recuperados e informe final aprobado por el ICANH)	**30 días**	8/06/26	7/07/26	30
7	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	**5 días**	2/06/26	6/06/26	27CC+5 días
8	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	**0 días**	6/08/26	6/08/26	44
9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	**0 días**	2/08/26	2/08/26	8FC-5 días
10	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	**8 días**	2/08/26	9/08/26	9
11	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de CIMENTACIÓN, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos. To	32 días	23/06/26	24/07/26	35FC-10 días
12	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PÉ	58 días	10/07/26	5/09/26	11FC-15 días
13	PANEL AL COMPUESTO ARKOBOND (O MADERA PARA FACHADAS)	**39 días**	2/08/26	9/09/26	45FC-35 días
14	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	**6 días**	23/08/26	28/08/26	53
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	**5 días**	28/08/26	1/09/26	54
16	Pintura vinilo Techo(2 manos) **	**0 días**	2/09/26	2/09/26	39FC-3 días
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO LAMINADO TIPO MADERA 8MM	**22 días**	7/08/26	28/08/26	44
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM	**8 días**	29/08/26	5/09/26	17
19	SALIDA LÀMPARA TOMA EMT COMPLETA	**5 días**	7/08/26	11/08/26	8
20	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	**0 días**	11/08/26	11/08/26	19
21	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	**3 días**	7/09/26	9/09/26	22
22	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	**3 días**	4/09/26	6/09/26	26
23	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	**0 días**	11/08/26	11/08/26	20
24	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	**2 días**	10/09/26	11/09/26	21
25	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	**8 días**	3/09/26	10/09/26	39FC-2 días
26	Cableado y conectores CC y CA, calidad exterior	**10 días**	25/08/26	3/09/26	61
27	Aseo durante la obra	**106 días**	28/05/26	10/09/26	2
28	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**99 días**	**5/06/26**	**11/09/26**	
29	**PRELIMINARES DE OBRA**	**78 días**	**5/06/26**	**21/08/26**	
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CINTA Y COLOMBINAS PLASTICAS	**3 días**	5/06/26	7/06/26	7FC-2 días
31	Provisional Electrica con Generador Electrico. INC COMBUSTIBLE PARA 2 MESES, OPERARIRIO Y TRANSPORTE (7 kva - 9 kva)	**60 días**	23/06/26	21/08/26	11CC
32	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**15 días**	**13/06/26**	**27/06/26**	
33	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO , NO INC RETIRO	**15 días**	13/06/26	27/06/26	6FC-25 días
34	**CIMENTACION**	**60 días**	**15/06/26**	**13/08/26**	
35	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 1800	**15 días**	18/06/26	2/07/26	33FC-10 días
36	SUMINISTRO E INSTALACION RELLENO EN SUELO CEMENTO (B-200 mas Cemento), INC COMPACTACION MANUAL	**20 días**	3/07/26	22/07/26	35
37	TRASIEGO DE MATERIALES POR TRAMO A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 100 M	**60 días**	15/06/26	13/08/26	30CC+10 días
38	**CIELOS RASOS**	**4 días**	**1/09/26**	**5/09/26**	
39	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO PLANO DRYWALL ALTURAS MAYORES A 4M	**0 días**	5/09/26	5/09/26	13FC-5 días
40	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRYWALL ALTURAS MAYORES A 4M -ML	**0 días**	1/09/26	1/09/26	39FC-4 días
41	**CUBIERTA**	**25 días**	**28/07/26**	**21/08/26**	
42	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR INC ESTRUCURA	**25 días**	28/07/26	21/08/26	13CC-5 días
43	**PISOS**	**45 días**	**23/07/26**	**5/09/26**	
44	PISO EN ETERBOARD 20mm PARA BASE DE MODULOS. INC ESTRUCTURA	**15 días**	23/07/26	6/08/26	12FC-45 días
45	PISO EXTERIOR TIPO DECK BETA MADERA COLOR TECKA. INC ESTRUCTURA (INC DESPERDICIO POR CURVAS DE DISEÑO)	**45 días**	23/07/26	5/09/26	12FC-45 días
46	**PINTURA**	**29 días**	**2/08/26**	**31/08/26**	
47	Pintura vinilo Techo(2 manos) ** INC FILOS	**0 días**	31/08/26	31/08/26	40FC-1 día
48	PINTURA SOBRE MURO DRY WALL,ALTURAS MAYORI	**8 días**	7/08/26	14/08/26	8
49	PINTURA SOBRE MURO DRY WALL,ALTURAS MAYORES A 4M, UNA MANO	**0 días**	2/08/26	2/08/26	9
50	**CARPINTERÍA METALICA, ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS**	**28 días**	**15/08/26**	**11/09/26**	
51	POLICARBONATO PARA VENTILACION RECUBRIMIENTO INTERNO PARA MICROPERFORADO	**3 días**	9/09/26	11/09/26	52
52	POLICARBONATO PARA ILUMINACIÓN RECUBRIMIENTO INTERNO PARA MICROPERFORADO	**9 días**	31/08/26	8/09/26	13FC-10 días
53	PUERTA EN ALUMINIO BATIENTE	**8 días**	15/08/26	22/08/26	48
54	PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA	**5 días**	23/08/26	27/08/26	53
55	**INSTALACIONES MANEJO PLUVIALY BAÑO SECO**	**20 días**	**22/08/26**	**10/09/26**	
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" (DESCOLGADA Y/O ADOSADA)	**7 días**	29/08/26	4/09/26	58
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" (DESCOLGADA Y/O ADOSADA)	**6 días**	5/09/26	10/09/26	56
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LÀMINA GALVANIZADA CAL. 22, 0,25 X 0,15m	**7 días**	22/08/26	28/08/26	42
59	**ELECTRICOS**	**30 días**	**12/08/26**	**10/09/26**	
60	TUBERÍA IMC 1 1/4	**7 días**	12/08/26	18/08/26	23
61	Acometidas de Tableros y Circuitos 4 3/4" IMC	**3 días**	22/08/26	24/08/26	62
62	CAJAS DE PASO 10X10	**3 días**	19/08/26	21/08/26	60
63	SALIDA TOMA DOBLE emt COMPLETA	5 días	12/08/26	16/08/26	19
64	TUBERÍA emt 1/2"	6 días	17/08/26	22/08/26	63
65	SISTEMA FOTOVOLTAICO CONFORMADO POR Panel solar 620W 12UN INVERSOR 10KW -48V 1UN Estructura 12UN Baterias LITIO 5,12KWh 6UN Conectores mc4 6UN Conectores Y mc4 0UN TABLEROS DC 2UN RACK BATERIAS 1UN Proteccion AC 1UN PROTECCIÓN DC +DPS 2UN Cable 8AWG 30UN	19 días	23/08/26	10/09/26	64
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ALTURA DE 6 METROS, INCLUYE PLACA BASE	15 días	23/08/26	6/09/26	64
67	SUMINISTRO E INSTALCION DE ILUMINACIÓN EXTERIOR LAMPARA CON Panel 60W , Flujo luminoso 11.200 lúmenes ,Temperatura color 3000 kelvin	7 días	4/09/26	10/09/26	66FC-3 días
68	fin	0 días	11/09/26	11/09/26	51

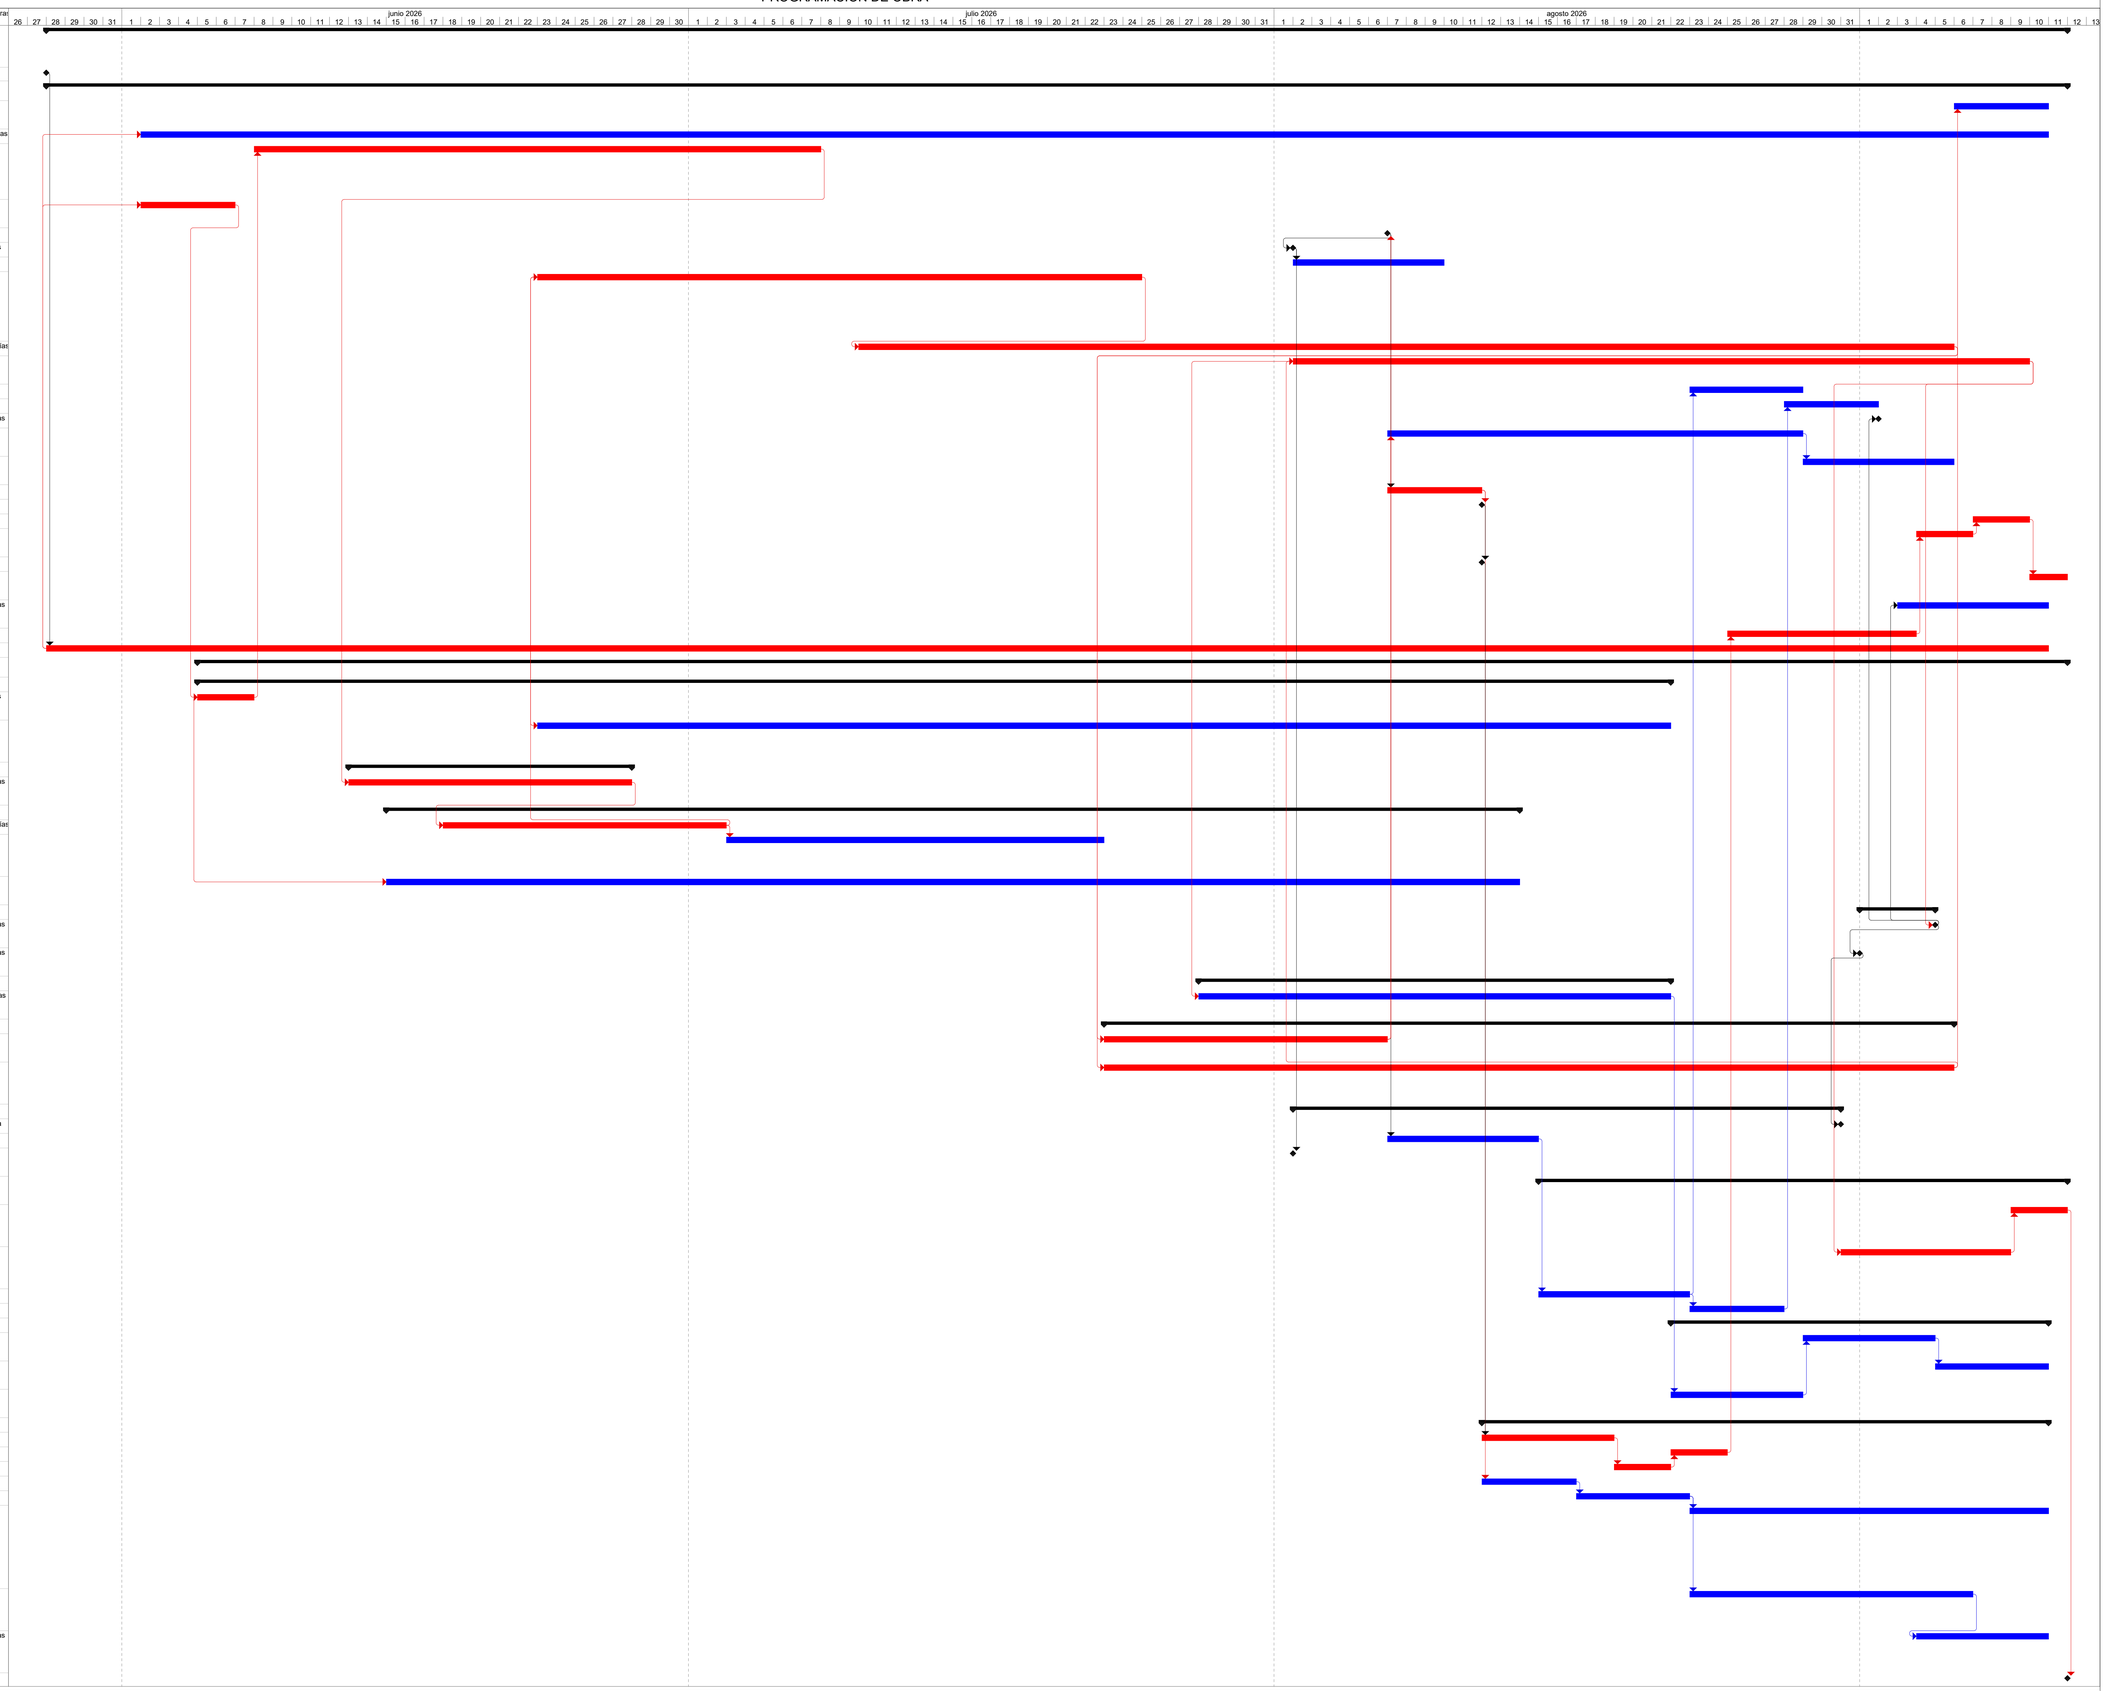

Proyecto: PROGRAMACION#7 3.
Fecha: 20/05/26

normales | externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin
ruta critica | agrupadas | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | normal
