	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/05/2026	**PERIODO REPORTADO DEL:**	22/04/2026	**AL:**	30/04/2026
CONTRATO Nº	019-00-I-CACOM-6- GRUAL-2026	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026		
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6				
FECHA DE INICIO	22/04/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/12/2026		

VALOR INICIAL	$ 1,702,129,960.04	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR TOTAL**	$ 1,702,129,960.04

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 10 DE ABRIL DE 2026 E INICIÓ SU EJECUCIÓN A PARTIR DEL 22 DE ABRIL DE 2026, FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. 85-44-101144756 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A., CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO; ASÍ MISMO, CUENTA CON PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 85-40-101067453, EXPEDIDA POR LA MISMA ASEGURADORA

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Residente de obra	1	100	100	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Profesional SST	1	100	100	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Técnico electricista	1	50	100	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asesor estructural	1	30	100	SI	N/A
						TOTAL	4				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	0.00%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
Semana 2	0.00%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO



GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
OP09 DEPOSITO ARMAMENTO AEREO CACOM6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
10. ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
OP02 HANGAR CHARLI CACOM6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
3. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

11. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
BI10 COLEGIO GIMFA EDIF ADMINISTRATIVO CACOM6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
3. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
8. CIELO RASO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
10. ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
13. CARPINTERIA EN VIDRIO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
14. CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
16. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
BI12 BIBLIOTECA GIMFA CACOM6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
3. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
7. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
8. CIELO RASO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
10. ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
11. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

BI142 CANCHA DE MICROFUTBOL GIMFA CACOM6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
3. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
7. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
11. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
15. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
17. URBANISMO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
TORRES Y MASTILES RADAR (PRINCIPAL, SIRENA) CACOM6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
OFICINAS RADAR OPERATIVA CACOM6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
3. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
8. CIELO RASO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
10. ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
16. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE DE INCENDIOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
OP01 TORRE DE CONTROL NUEVA CACOM6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
8. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

10. ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
12. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
SURTIFRUVER ID BI312 CACOM6 (PARQUEADERO AUTOMOTORES)			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
3. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
11. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
15. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO	No aplica a la fecha del presente informe	0.00%
	EJECUTADO		0.00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	253	9	244

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN CORRESPONDEN A LA ETAPA INICIAL DE ALISTAMIENTO, REVISIÓN DE FRENTES DE INTERVENCIÓN, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PRELIMINARES, RECONOCIMIENTO DE ÁREAS Y COORDINACIÓN TÉCNICA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES, SIN REGISTRARSE AVANCE FÍSICO DE OBRA DURANTE EL PERIODO REPORTADO. LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN CORRESPONDEN A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL DEL CONTRATO, VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS, SOPORTES CONTRACTUALES, COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA, SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO ADECUADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES ATRASADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO. SE RECOMIENDA MANTENER LA TRAZABILIDAD DOCUMENTAL, LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL INICIO OPORTUNO DE LOS FRENTES DE OBRA

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1,702,129,960.04	$ 1,702,129,960.04	$ 0.00	0.00%	$ 1,702,129,960.04	100%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 1,702,129,960.04	$ 1,702,129,960.04				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1,702,129,960.04	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	No se han presentado adiciones al contrato durante el periodo reportado
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	No se han presentado adiciones al contrato durante el periodo reportado
VALOR TOTAL	$ 1,702,129,960.04	Corresponde al valor total vigente del contrato.
ANTICIPO (No aplica)	$ 0.00	El contrato no contempla anticipo
PRIMER PAGO PAC JULIO	$ 0.00	Corte programado al 30 de mayo de 2026; durante el periodo reportado no se generó pago.
SEGUNDO PAGO PAC SEPTIEMBRE	$ 0.00	Corte programado al 31 de julio de 2026; no aplica para el presente periodo.
TERCER PAGO PAC NOVIEMBRE	$ 0.00	Corte programado al 30 de septiembre de 2026; no aplica para el presente periodo.
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	Durante el periodo del 22 al 30 de abril de 2026 no se registran pagos efectuados ni actas parciales de recibo

12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
No aplica en el presente periodo						

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMENDÓ AL CONTRATISTA MANTENER ESPECIAL ATENCIÓN EN LA RADICACIÓN, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE INGRESARÁ A LA UNIDAD, CON EL FIN DE EVITAR RETRASOS EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ASÍ MISMO, SE INDICÓ LA NECESIDAD DE COORDINAR OPORTUNAMENTE LA LOGÍSTICA DE INGRESO DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS, DE SEGURIDAD Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTINUAR CON LA PLANEACIÓN DETALLADA DE LOS FRENTES DE INTERVENCIÓN, LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO Y LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES NECESARIOS PARA EL ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÌ (Condiciones Climaticas):

SE PRESENTARON CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES, DE TIEMPO SOLEADO Y POCO NUBLADO.

ELABORO:

ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES
Firma y Posfirma

REVISO:

ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)









VERIFICACIÓN DE ALCANCE TECNICO EN LOS FRENTES DE OBRA DEL CONTRATO

INFORME MENSUAL DE OBRA N°1

22 DE ABRIL DE 2026 – 30 DE ABRIL DE 2026



BI10 COLEGIO GIMFA EDIF ADMINISTRATIVO CACOM6

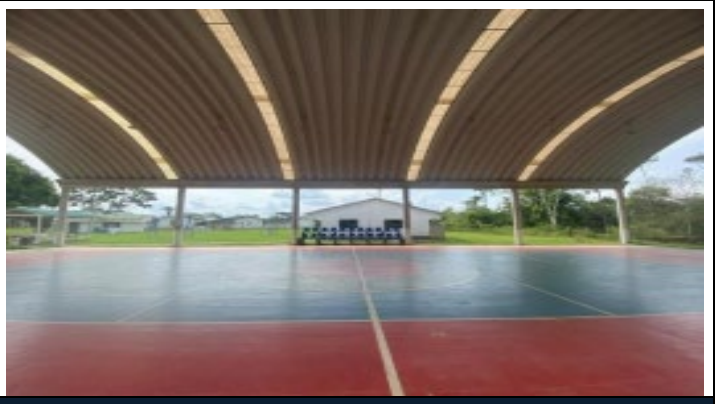

BI142 CANCHA DE MICROFUTBOL GIMFA CACOM6

CONTRATO DE OBRA No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6

TRES ESQUINAS, SOLANO – CAQUETÁ

ABRIL 2026

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Informe mensual de obra n°1

No. Versión	Fecha	Elaboró (Cargo-firma)	Revisó (Cargo-firma)	Aprobó (Cargo-firma)	Description de la modificación
		Ing. Melkis Mateo Pineda Oñate	JOHAN VÁSQUEZ Residente de obra: Johann Alexander Vásquez Cuellar	Supervisor del contrato: ST. Carlos Andrés Herrera Castro	

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 7
   1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 7
      1.1.1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS A CONTRATAR 8
   1.2. OBJETO DEL CONTRATO 10
   1.3. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA 10
      1.3.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA 10
      1.3.2. PERSONAL LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 10
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 12
   2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS 12
      2.1.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS 12
   2.2. CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 13
      2.2.1. CONTRATO DE OBRA 13
   2.3. CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA 13
   2.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 14
      2.4.1. CONTRATO DE OBRA 14
   2.5. CUADRO DE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATISTA DE OBRA 15
   2.6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 30
      2.6.1. AVANCE FINANCIERO 31
   2.7. CUADRO SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO. 31
   2.8. CONTROL DE CALIDAD 32
   2.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO 32
3. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 37

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos Contrato de obra 7
Tabla 2. Personal de obra 10
Tabla 3. Personal Aeronáutica Civil 10
Tabla 4. Estado actual de Pólizas del Contratista 12
Tabla 5. Cuadro control legal Contrato de Obra 13
Tabla 6. Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal del Contrato de Obra 14
Tabla 7. Relación de actas de recibo parcial de obra 15
Tabla 8. Relación Programado vs Ejecutado 31

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Pólizas – digital

Anexo 2. Correspondencia.

Anexo 3. Acta de avance

Anexo 4. Actas de reunión – digital

Anexo 5. Certificados de calidad

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual tiene como finalidad presentar el estado de avance físico y técnico de las actividades ejecutadas en el marco del contrato denominado “Adecuación y mantenimiento de la infraestructura no residencial del CACOM-6”, celebrado entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 6 y el Consorcio Construcciones ARKAF 2026, para la intervención y mejoramiento de diferentes instalaciones estratégicas ubicadas en Tres Esquinas, Caquetá.

El proyecto contempla la ejecución de actividades de adecuación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura en distintas áreas operativas, administrativas, educativas y logísticas del CACOM-6, con el propósito de preservar las condiciones de funcionalidad, seguridad, durabilidad y operatividad de las instalaciones que apoyan el cumplimiento de la misión institucional.

Dentro de las intervenciones priorizadas se incluyen trabajos en el Depósito de Armamento Aéreo, Hangar Charli, Torre de Control Nueva, Oficinas Radar Operativa, Colegio GIMFA, Cancha de Microfútbol, sistema de detección y extinción de incendios y biblioteca del colegio, torres y mástiles radar, así como otras áreas complementarias definidas por la Entidad, contemplando actividades de obra civil, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, mantenimiento estructural, impermeabilizaciones, acabados y adecuaciones generales.

Las actividades desarrolladas durante el periodo reportado se ejecutan conforme a las especificaciones técnicas, lineamientos normativos y requerimientos establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad y control técnico en cada frente de trabajo.

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente, el avance alcanzado en los diferentes frentes de obra, el seguimiento al cronograma de ejecución y las observaciones relevantes derivadas del desarrollo contractual, evidenciando el progreso de las metas establecidas para el proyecto.

1. GENERALIDADES

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026
CONTRATANTE	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6
SUPERVISOR	ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026
NIT:	902.053.758-3
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
IDENTIFICACIÓN	1.182.774.968 DE SAN AGUSTÍN HUILA
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6
PERIODO DEL INFORME	ENTRE 22 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR	MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE ($1.702.129.960,04)
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, en los términos del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, a partir de la firma del Acta de Inicio hasta el 30 de septiembre de 2026.

Tabla 1. Datos Contrato de obra

1.1.1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS A CONTRATAR

1.1.1.1. *LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA*.



El proyecto objeto del presente contrato se desarrolla en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 6, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ubicado en el corregimiento de Tres Esquinas, municipio de Solano, departamento del Caquetá.

Las actividades de adecuación y mantenimiento se ejecutan en diferentes frentes de obra distribuidos al interior de la unidad militar, incluyendo áreas operativas, administrativas,

educativas, logísticas y de apoyo, conforme a las necesidades priorizadas por la Entidad y definidas en las especificaciones técnicas del contrato.

Entre las instalaciones intervenidas se encuentran el Depósito de Armamento Aéreo, Hangar Charli, Torre de Control Nueva, Oficinas Radar Operativa, Colegio GIMFA, Cancha de Microfútbol, sistema de detección y extinción de incendios, torres y mástiles radar y biblioteca del colegio, así como demás áreas complementarias contempladas dentro del alcance contractual.

1.1.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Comando Aéreo de Combate No. 6 presenta diferentes necesidades de mantenimiento, adecuación y rehabilitación en su infraestructura operativa, administrativa, educativa y logística, debido al deterioro ocasionado por el uso permanente y las condiciones ambientales de la región. Estas condiciones afectan elementos estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y arquitectónicos, haciendo necesaria la intervención oportuna de las instalaciones para garantizar su adecuado funcionamiento y seguridad. Por lo anterior, se requiere la ejecución del proyecto de “Adecuación y mantenimiento de la infraestructura no residencial del CACOM-6”, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad, operatividad y durabilidad de las áreas intervenidas, contribuyendo al bienestar del personal y al cumplimiento eficiente de la misión institucional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

1.1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A CONTRATAR

1. PRELIMINARES
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
3. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS
4. ESTRUCTURA
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7. MAMPOSTERÍA
8. CIELO RASO
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
10. ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA
11. CARPINTERÍA METÁLICA
12. CARPINTERÍA EN ALUMINIO

13. CARPINTERÍA EN VIDRIO
14. CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE
15. CUBIERTAS
16. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
17. URBANISMO

1.2. OBJETO DEL CONTRATO

1.2.1. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6**", mediante la ejecución de actividades de adecuación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del Comando Aéreo de Combate No. 6, conforme a los diagnósticos de instalaciones, fichas técnicas, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, garantizando condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y operatividad en las áreas intervenidas.

1.3. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

1.3.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Para la ejecución del contrato, el contratista deberá contar con el personal técnico y profesional mínimo exigido en las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la permanencia y disponibilidad del recurso humano requerido para el correcto desarrollo de las actividades programadas.

Tabla 2. Personal de obra

CARGO	NOMBRE
Residente de obra	Ing. Johann Vásquez
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ing. Yinna Blanco
Asesor Estructural	Ing. Ancizar Perez
Técnico electricista	Ing. Diego Culma

1.3.2. PERSONAL LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

Tabla 3. Personal COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

CARGO	NOMBRE
Supervisor	ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS

2.1.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS

2.1.1.1. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

El contratista deberá constituir y mantener vigentes las garantías exigidas por la Entidad para la correcta ejecución del contrato, conforme a lo establecido en la normatividad contractual aplicable y los documentos del proceso.

Tabla 4. Estado actual de Pólizas del Contratista

PÓLIZA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones).

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101144756	0	17/04/2026	Cumplimiento del contrato	10/04/2026	30/01/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/04/2026	30/09/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras.	5 AÑOS	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101067453	0	17/04/2026	10/04/2026	30/09/2026

Anexo 1. Relación de pólizas de contrato de cumplimiento y de responsabilidad civil

2.2. CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se resume a continuación para el Contrato de Obra No 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026:

2.2.1. CONTRATO DE OBRA

Tabla 5. Cuadro control legal Contrato de Obra

RESUMEN CONTRATO DE OBRA	
NÚMERO DE CONTRATO	No 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026
CONTRATANTE	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6
FECHA DE FIRMA	10/04/2026
FECHA DE ACTA DE INICIO	22/04/2026
PLAZO	161 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2026
VALOR DEL CONTRATO	MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE ($1.702.129.960,04)
VALOR PROGRAMADO ACUMULADO DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	N.A.
VALOR EJECUTADO ACUMULADO DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	N.A.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	0 %
DÍAS TRANSCURRIDOS	8 días
DÍAS RESTANTES	153 días
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

2.3. CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA

Ver Anexo 2. La correspondencia se encuentra en el Formato completo de las comunicaciones.

2.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

2.4.1. CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026 cuenta con un valor total de MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.702.129.960,04), destinados a la ejecución de actividades de adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura no residencial del Comando Aéreo de Combate No. 6. Los pagos del contrato se realizarán mediante cortes parciales de obra, previa presentación de actas de avance, facturación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión, conforme al cronograma financiero y disponibilidad presupuestal establecida por la Entidad.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR
A-02-01-01-001-002	Edificios distintos a viviendas	$ 1.298.807.832,68
A-02-02-02-005-004	Servicios de construcción	$ 385.811.115,97
A-02-02-02-008-007	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	$ 17.511.011,39
TOTAL CONTRATO		**$ 1.702.129.960,04**

Tabla 6. Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal del Contrato de Obra

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR ($)
02-02-02-005-004-01-2	CEGOT-CACOM-6 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Todo Costo, Protección y Sostenimiento de Bienes Inmuebles	**43.645.651,08**
02-02-02-005-004-01-2	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura No Residencial, Conservación, Protección y Sostenimiento de Bienes Inmuebles	**342.165.464,89**
02-02-02-008-007-01-5	CEGOT-CACOM-6 - Mantenimiento, Rehabilitación y Modernización de Sistema Contra Incendios	**17.511.011,39**

02-01-01-001-002-11	CEGOT-CACOM-6 - Mejoramiento de Acabados Interiores y Exteriores en Infraestructura Principal del Componente No Residencial	**65.506.197,33**
02-01-01-001-002-11	Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura No Residencial, con Refuerzo Estructural, Modernización y Mejora de Acabados	**1.233.301.635,35**
TOTAL		**$ 1.702.129.960,04**

2.5. CUADRO DE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se relacionan las actas de recibo parcial de obra del contratista que han sido tramitadas.

Tabla 7. Relación de actas de recibo parcial de obra

Acta	Periodo	Valor Acta	Saldo del contrato
Valor inicial del contrato	-	-	$ 1.702.129.960,04
Total ejecutado en obra		$ -	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBRAS DESARROLLADAS DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO:

1	**PRELIMINARES**		
1,1	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO	M²	210,00
1,2	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO.	M	20,00
1,3	DESMONTE DE LAMINA METALICA, INCLUYE ANDAMIOS Y RETIRO DE SOBRANTES.	M²	632,27
1,4	DESMONTE DE CIELO RASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M²	321,04
1,5	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS Y RETIRO DE SOBRANTES	M²	106,72
1,6	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	3,00
1,7	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	7,00
1,8	DESMONTE DE PANEL METÁLICO TIPO LOUVER EXISTENTE, INCLUYENDO RETIRO DE ANCLAJES Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL	M²	25,90
1,9	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES INCLUYE GUARDAESCOBAS Y RETIRO.	M²	400,03
1.10.	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M²	2,10
1,11	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	M²	6,09
1,12	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M³	5,35
1,13	DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA	M³	24,57
1,14	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR	M	1.029,78

1,15	MANTENIMIENTO DE LAMINAS METALICAS, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS POR AMBAS CARAS, DEL COLOR A CONVENIR	M²	75,20
1,16	MANTENIMIENTO DE PORTON METÁLICO TIPO HANGAR INCLUYE AMBAS CARAS, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR	M²	568,08
1,17	RETIRO DE LUMINARIAS Y TOMAS INTERNAS UBICADAS EN EL ÁREA A INTERVENIR, INCLUYE RESANE DE PARED Y ACABADOS, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.	GBL	3,00
1,18	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE, QUE INCLUYE LAVADO A PRESIÓN CONTROLADA, REPARACIÓN DE GOTERAS, APLICACIÓN DE PINTURA ESPECIAL PARA TIPO CUBIERTA (TRES MANOS) EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, Y REMPLAZO DE PIEZAS AFECTADAS CON EL MISMO TIPO DE MATERIAL	M²	857,75
1,19	LAVADO DE MUROS Y PISOS POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE DESENGRASANTE USO DE HIDROLAVADORA PARA PREPARACION DE ZONA	M²	893,84
1.20.	MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN ALUMINIO, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, Y AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE.	M	201,65
1,21	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE EN ALUMINIO, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, Y AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, INCLUYE AMBAS CARAS	M²	157,79
1,22	REMOCIÓN DE PINTURA EPOXICA POR MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS, INCLUYE ESCARIFIRACIÓN Y LIJADO DE SUPERFICIE	M²	646,00

1,23	REMOCIÓN DE MANTO ASFALTICO, POR MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS, INCLUYE EL LAVADO DE LA SUPERFICIE, GRATEADO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS Y RETIRO DE SOBRANTES	M²	90,54
1,24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL PUESTO AVANZADO DE CONTROL, INCLUYE DIAGNÓSTICO, CORRECCIÓN DE FALLAS Y EL SUMINISTRO, REEMPLAZO, INSTALACIÓN, AJUSTE Y/O REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TALES COMO PANEL DE CONTROL, DETECTORES, DISPOSITIVOS DE ALARMA, FUENTES DE ALIMENTACIÓN, BATERÍAS, CABLEADO, TUBERÍAS, VÁLVULAS, BOQUILLAS, AGENTE EXTINTOR Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYENDO PRUEBAS FUNCIONALES, PUESTA EN SERVICIO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE.	GBL	1,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		
2,1	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M²	35,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	M³	59,63
2,3	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M³	33,46
3	**CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS**		
3,1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	M²	290,22
3,2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI (m³) INCLUYE FORMALETAS	M³	1,60
3,3	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM INCLUYE FORMALETAS, ACERO DE REFUERZO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M	6,02
3,4	COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M³	0,45

3,5	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M²	10,00
3,6	PAÑETE LISO PARA FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS	M	5,20
3,7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES	M²	289,16
3,8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	36,59
3,9	VIGA DE CONFINAMIENTO 15X30CM EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	19,60
3.10.	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M³	0,78
3,11	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M³	5,13
3,12	SUMINISTRO, PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RIEL TRIPLE METÁLICO EMBEBIDO EN CONCRETO DE REPARACIÓN DE ALTA RESISTENCIA (SIKAEMACO® S 469 O SIMILAR. INCLUYE ALISTADO DE LA ZONA, LIMPIEZA, PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO SIKADUR®-32 O SIMILAR, CURADO Y MANO DE OBRA	ML	91,00
3,13	CONSTRUCCION DE PLACA AEREA MACIZA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE , FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, HASTA E=0.12 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M²	25,04
4	**ESTRUCTURA**		
4,1	**ACERO DE REFUERZO**		
4.1.1	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL SEGUN PLANOS FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 (kg)	KG	812,43
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
5,1	**INSTALACIÓN HIDRAULICA**		

5.1.1	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	19,00
5.1.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	50,00
5.1.3	PRUEBA HIDRÁULICA	UN	1,00
5.1.4	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO EN PVC DE 1/2" CON CAJA DE REGISTRO Y TAPA PROTECTORA, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRANSPORTE	UN	3,00
5,2	**INSTALACIÓN SANITARIA**		
5.2.1	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	8,00
5.2.2	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	38,00
5.2.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO Ø 4" CON SIFÓN**	UN	4,00
5.2.4	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	78,02
5.2.5	FILTRO FRANCES PARA CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS E INFILTRACIONES, INCLUYE GEOTEXTIL NO TEGIDO 200 GR/M2 , GRAVA, TUBO PVC 4" DRENAJE PERFORADO PROFUNDIDAD HASTA 1,2M	ML	127,35
5.2.6	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	UN	4,00
5.2.7	PRUEBA SANITARIA	UN	2,00
5.2.8	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	17,00
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
6,1	**BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA**		
6.1.1	DUCTO PVC - DB DE 1XØ3/4". INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJAS Y TAPA CIEGAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M	40,00

6.1.2	DUCTO EMT DE 1X Ø3/4". INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJA, UNIONES, TAPA CIEGAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M	60,00
6,2	**TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL**		
6.2.1	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (un)	Un	2,00
6.2.2	TABLERO TIPO INDUSTRIAL AUTOSOPORTADO (TABLERO DISTRIBUCION TRIFASICO), GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, UN (2) CIRCUITOS TRIFÁSICOS, DOS (2) CIRCUITOS BIFASICOS, CUATRO (04) CIRCUITOS MONOFASICOS, BARRAJES Y TOTALIZADOR (NORMAL Y EMER)	Un	2,00
6,3	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**		
6.3.1	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 2 CUXAWG FASES) + 1 X NO.2 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 6 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE DUCTERIA, CURVAS, UNIONES, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	10,00
6.3.2	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 6 CUXAWG FASES) + 1 X NO.6 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA	M	82,08

6.3.3	ACOMETIDA EN CABLE 1 X (NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 12 CUXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE DUCTERIA, CURVAS, UNIONES, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	100,00
6,4	**SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)**		
6.4.1	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG, CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	7,00
6.4.2	INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INTEMPERIE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	4,00
6.4.3	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V	UN	3,00
6.4.4	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO	UN	2,00

6.4.5	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	22,00
6.4.6	LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRADO 60X60 DE 40W DL, 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA	UN	42,00
6.4.7	LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W ANTIPOLVO, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	20,00
6.4.8	TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	4,00
6.4.9	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	25,00

6.4.10	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON TAPA TIPO INTEMPERIE 15A/120V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, CURVAS, UNIONES, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00
6.4.11	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	UN	4,00
6.4.12	SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED TORTUGA 12W DL P27751 DE SYLVANIA, 6500K, 1080LM, 12W, IP65, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECION NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	6,00
6.4.13	INTERRUPTOR TRIPLE SENCILLO	Un	10,00
6.4.14	INTERRUPTOR SENCILLO EXPLOSION PROOF, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A T	Un	2,00
6.4.15	LUMINARIA LED SYLVANIA EXPLOSION PROOF SYL SECURE LED LINEAL, 80W, 5000K, 4110-10960LM, 100-277V, IP66, IK08, FP>0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE	Un	11,00

	SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.		
6.4.16	"SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA REFLECTOR LED SOLAR PRO 400W 3.2 40000MAH CCT Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Un	2,00
6.4.17	LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY 100W DL, 6000K, 12500LM, 100-240V, IP65, IK08, FP>0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECION NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	10,00
6.4.18	INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INTEMPERIE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Un	3,00
6,5	**SISTEMA DE PUESTA TIERRA**		
6.5.1	SISTEMA DE PUESTA TIERRA CAPACITIVO PARA TABLERO COMPUESTO POR 1 POZO DE 6 BOLSAS DE 15KG DE HIDROSOLTA, PUNTOS DE SOLDADURA EXOTÉRMICA,1 CONTRAPESO LINEAL DE HIDROSOLTA 7,5-1/0, MOLDE LAMINA 2,5X2 MM PARA CONEXION KIT LINEAL, MOLDE LAMINA 2,5X2 MM PARA CONEXION CABLE CONDUCTOR- KIT LINEAL,1 CAJA DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30) M CON TAPA, CONECTORES BIMETÁLICOS, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS, PASES PERFORACIONES, REGATAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Un	3,00

6.5.2	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CON BAJANTE Y PUESTA TIERRA, INSTALADO EN POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE 1 PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO DE 5/8" ALTURA ÚTIL 60 CM, PUESTA A TIERRA TIPO ANILLO CON 1 VARILLA CW 5/8" COBRE- 99%, P	Un	2,00
7	**MAMPOSTERIA**		
7,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.12 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	M²	78,79
8	**CIELO RASO**		
8,1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (m²)	M²	347,10
9	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**		
9,1	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM INCLUYE BOQUILLA	M²	238,44
9,2	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM INCLUYE BOQUILLA	M	140,58
9,3	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	141,58
9,4	PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60×60 CM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ADHESIVO PARA PORCELANATO, BOQUILLA, CRUCETAS/NIVELADORES, CORTES, LIMPIEZA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M²	51,79
9,5	ESCARIFICACIÓN DE PISO Y REMOCIÓN DE TORNILLOS O ELEMENTOS SOBRESALIENTES DEL PISO + LAVADO PARA REMOCIÓN DE IMPURESAS Y GRASAS + TRATAMIENTO RELLENO Y PULIDO DE JUNTAS CON ELASTOMERO DE POLIUTERANO +IMPRIMACION EN POLIURETANO DE ALTA ADHERENCIA + CAPA DE MORTERO DE NIVELACIÓN FLUIDO DE POLIUTERANO + APLICACIÓN DE POLIURETANO A 3 CAPAS CON PULIDA FINAL + APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE POLURETANO AROMATICO	M²	63,00

9,6	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE DE PLACA DE CUBIERTAS CON POLIUREA HÍBRIDA DE DOS COMPONENTES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS SIKALASTIC®-859 R ULTIMATE (CAPA 1. IMPRIMANTE SIKAFLOOR-161, CAPA 2. IMPERMEABILIZACIÓN SIKALASTIC®-859 R ULTIMATE, CAPA 3. PROTECCION UV S	M²	81,82
9,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE CON ALTA ADHERENCIA COLOR A DEFINIR A 3 MANOS PARA ZONA DEPORTIVA, PROTECCIÓN ANTI SOL, LAVABLE, (INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE LAVADO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS).	M²	646,00
9,8	APLICACIÓN MANUAL DE DEMARCACION LINEAL DE CANCHA TONALIDAD BLANCO DOS MANO DE PINTURA ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE.	M	293,00
10	**ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA**		
10,1	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	5,00
10,2	ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	20,89
10,3	ESTUCO Y VINILO TIPO-2, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	446,97
10,4	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M²	500,00
10,5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M²	500,00
10,6	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	M	600,00
10,7	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	M	600,00
10,8	PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE, FILOS, BORDES, CARTERAS Y DILATACIONES)	M²	461,10
11	**CARPINTERIA METALICA**		

11,1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	KG	3.498,77
11,2	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y/O RIEL Y/O MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	M²	2,10
11,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 PARA SELLADO DE VANOS, INCLUYE, PREPARACIÓN DE ZONA, ANDAMIOS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS, SOLDADURA, TORNILLOS, SILICONA, REFUERZO EN ANGULO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FIJACION, Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	110,40
11,4	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RODAMIENTO Y ENGRANAJES PARA PORTÓN DE HANGAR, INCLUYE GATOS HIDRAULICOS Y PUNTALES PARA REALIZAR EL DESMONTE DE LOS RODAMIENTOS	Un	24,00
12	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**		
12,1	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PANEL METÁLICO TIPO LOUVER DE LAMAS HORIZONTALES FIJAS, CON MARCO PERIMETRAL Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN INCLUYENDO ANCLAJES, TORNILLERIA, SELLOS Y REMATES	M²	31,20
13	**CARPINTERIA EN VIDRIO**		
13,1	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M²	3,60
14	**CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE**		
14,1	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO,BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS	M²	7,84

	SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20.		
15	**CUBIERTAS**		
15,1	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS	M²	320,24
15,2	TEJA EN LÁMINA PARA MUROS/PUERTAS SIN TRASLAPO COLOR GRIS SEGUN UMA EXTERIOR O SIMILAR Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA PANEL CAL 22 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	560,49
15,3	CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM	M	15,20
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**		
16,1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR	UN	10,00
16,2	LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO II	UN	7,00
16,4	LLAVE TERMINAL PARA MANGUERA	UN	2,00
17	**URBANISMO**		
17,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA PLASTICA TIPO ESTADIO COLOR A DEFINIR, INCLUYE LOS ANCLAJES, TORNILLOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	UN	60,00
18	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**		
18,1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	2.721,11
18,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD (m³)	M³	32,00

2.6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Actividades administrativas

- El 10 de abril de 2026 se realizó la entrega de los documentos iniciales correspondientes al Consorcio Construcciones ARKAF 2026. Posteriormente, el 14 de abril de 2026, se efectuó la remisión de los estudios de seguridad requeridos para el proceso de ingreso y ejecución contractual.

- El 16 de abril de 2026 se radicó la documentación necesaria para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 19-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, así como el envío del correo de bienvenida y socialización inicial del proyecto. Posteriormente, el 20 de abril de 2026, el equipo del Comando Aéreo de Combate No. 6 presentó observaciones a la documentación inicial, las cuales fueron revisadas para su correspondiente ajuste y atención.

- Se realizó el ingreso de personal administrativo para efectuar recorrido y verificación de los diferentes frentes de obra, durante el cual se identificaron observaciones relacionadas con ítems a contemplar en el presupuesto, se efectuaron ajustes de cantidades conforme a las condiciones evidenciadas en sitio y se dio inicio a la logística requerida para el ingreso de materiales al área de intervención.

Actividades operativas: N.A.

Nota: Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades operativas de obra, debido a que el proyecto se encontraba en fase inicial de alistamiento y gestión administrativa, conforme a la programación establecida y aprobada para el contrato.

En esta etapa se desarrollaron actividades preliminares correspondientes a logística de ingreso, estudios de seguridad del personal, visitas técnicas de reconocimiento, verificación de áreas de intervención, revisión documental, coordinación con la supervisión y organización de frentes de trabajo, las cuales constituyen hitos necesarios para garantizar el inicio adecuado y seguro de las actividades constructivas dentro de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 6.

2.6.1. AVANCE FINANCIERO

Tabla 8. Relación Programado vs Ejecutado

PROGRAMADO		PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO 30 DE ABRIL DE 2026		EJECUTADO ACUMULADO	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0	0	$0	0	$ 0	0	$ 0	0

Nota: De acuerdo con la programación aprobada para el periodo reportado, las actividades previstas correspondían a la etapa preliminar y de alistamiento del proyecto, contemplando hitos relacionados con logística, estudios de seguridad, visitas técnicas, reconocimiento de áreas y coordinación administrativa para el inicio de las obras.

En consecuencia, el avance ejecutado durante el periodo presenta conformidad frente a lo programado, teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas corresponden a la fase inicial del contrato y constituyen requisitos necesarios para garantizar el adecuado inicio operativo, técnico y de seguridad de los diferentes frentes de obra dentro de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 6.

2.7. CUADRO SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO.

Durante el periodo del 22 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 se registran temperaturas máximas entre 29 °C y 35 °C y mínimas entre 21 °C y 24 °C, condiciones que evidencian un ambiente cálido y húmedo, propio de la región amazónica. Las variaciones térmicas moderadas sugieren presencia de humedad atmosférica y probabilidad de precipitaciones intermitentes. Entre los días 22 y 28 se presentan temperaturas relativamente estables, con máximas entre 29 °C y 33 °C, lo que permite inferir condiciones de nubosidad variable y posibles lluvias aisladas en horas de la tarde o noche. Para los días 29 y 30 se evidencia un incremento significativo de la temperatura, alcanzando hasta 35 °C el día 30, situación que podría estar asociada a una disminución temporal de las precipitaciones y mayor presencia de radiación solar. En términos generales, el periodo analizado muestra condiciones típicas de clima tropical húmedo, con probabilidad de lluvias moderadas y eventos aislados de precipitación, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

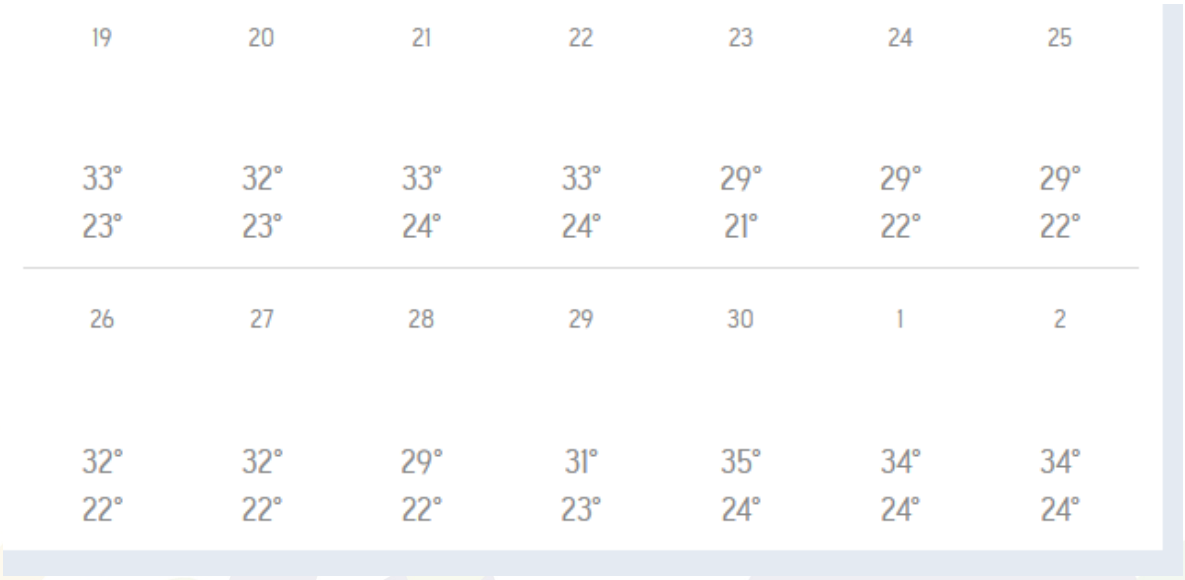

19	20	21	22	23	24	25
33° 23°	32° 23°	33° 24°	33° 24°	29° 21°	29° 22°	29° 22°
26	27	28	29	30	1	2
32° 22°	32° 22°	29° 22°	31° 23°	35° 24°	34° 24°	34° 24°

2.8. CONTROL DE CALIDAD.

N.A.

2.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO

En el presente capítulo se relaciona el registro fotográfico correspondiente a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, con el fin de evidenciar el avance físico de los diferentes frentes de obra intervenidos dentro del proyecto “Adecuación y mantenimiento de la infraestructura no residencial del CACOM-6”. Las fotografías presentadas permiten verificar el estado inicial, proceso constructivo y avance de las actividades desarrolladas en cada una de las áreas intervenidas, sirviendo como soporte técnico y documental del cumplimiento de las actividades ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas y lineamientos establecidos por la Entidad.

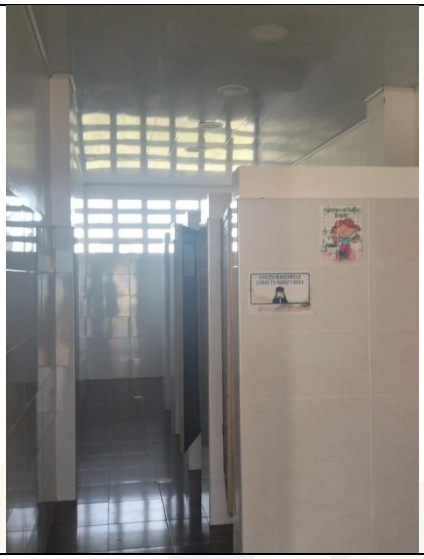	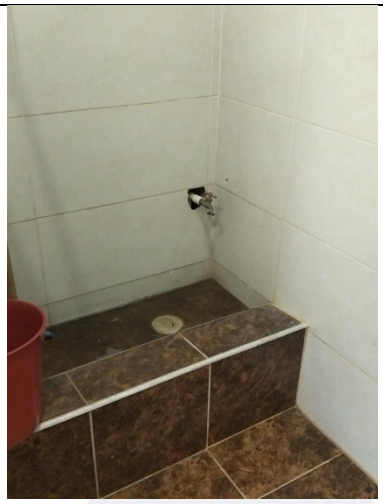
Fotografía No. 01. Vista de recorrido a frente BI10 COLEGIO GIMFA EDIF ADMINISTRATIVO CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.	**Fotografía No. 02.** Vista de recorrido a frente BI10 COLEGIO GIMFA EDIF ADMINISTRATIVO CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.
	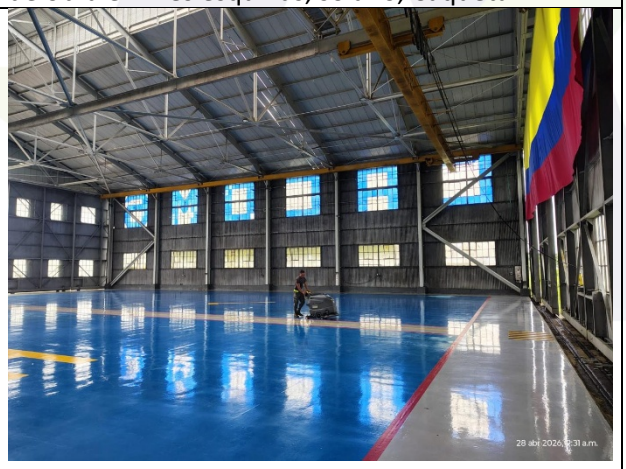
Fotografía No. 03 Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.	**Fotografía No. 04.** Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.



Fotografía No. 05 Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.



Fotografía No. 06. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.



Fotografía No. 07. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.



Fotografía No. 08. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.



Fotografía No. 09. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.



Fotografía No. 10. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.

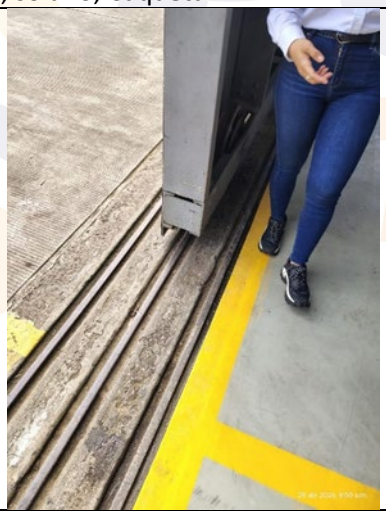

Fotografía No. 11. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.



Fotografía No. 12. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fotografía No. 13. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.</td><td>Fotografía No. 14. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografía No. 15. Vista de recorrido a frente OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.</td><td>Fotografía No. 16 Vista de recorrido a frente BI10 COLEGIO GIMFA EDIF ADMINISTRATIVO CACOM6 de obra en Tres esquinas, solano, Caquetá.</td></tr>
</table>

2.10. RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA

N.A.

3. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

En el periodo del informe del contrato en referencia, el CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026 dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, relacionadas a continuación:

- Se realizó la remisión de los estudios de seguridad requeridos para el ingreso del equipo administrativo a Tres Esquinas, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos para el acceso y desarrollo de actividades en la zona.

- Se radicó la documentación inicial correspondiente al Acta de Inicio, atendiendo posteriormente las observaciones emitidas mediante la respectiva subsanación documental, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos exigidos para la formalización contractual.

- Se llevó a cabo la firma del Acta de Inicio, formalizando el comienzo de las actividades contractuales conforme a los lineamientos y condiciones establecidos entre las partes.

- Durante el recorrido técnico realizado, se efectuaron observaciones relacionadas con ítems a contemplar dentro del presupuesto y ajustes de cantidades de obra, con el propósito de garantizar la adecuada definición de los alcances y necesidades requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Firma:



Johann Alexander Vásquez Cuellar

Residente de Obra

Consorcio Construcciones ARKAF 2026

CONTRATANTE:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CONTRATO DE OBRA No: 019-00-I-CACOM-6- GRUAL-2026

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM6.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026.

PERÍODO DEL INFORME: 22/04/2026 al 30/04/2026

ÍTEM	ELABORÓ CONTRATISTA
CARGO	Residente SST
NOMBRE	Yinna Blanco Arenas
FIRMA	

Contenido

INTRODUCCIÒN 3
ALCANCE 3
Alcance y Funciones de la Supervisión en Seguridad y Salud en el Trabajo 3
Función de la Interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo 3
Compromiso y Responsabilidad 4
DESARROLLO DEL INFORME 4
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL PERIODO 4
Describa las principales recomendaciones derivadas de las inspecciones de seguridad: 9
Describa las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra: 9
Clasificación de la accidentalidad en el periodo: 10
ANEXOS DEL INFORME 10

INTRODUCCIÒN

El presente informe documenta la gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) implementada por la contratista CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARKAF 2026, mediante la elaboración del Informe Mensual SST.

En concordancia con lo anterior, la Fuerza Aerea Colombiana ha establecido, a través de los lineamientos, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para cada uno de los proyectos, con el objetivo de garantizar ambientes laborales seguros y el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de SST en Colombia.

Estas actividades, que son transversales a todos los componentes involucrados en la ejecución del proyecto, están orientadas a controlar, asegurar y evaluar el cumplimiento de los requisitos y necesidades manifestadas, con la finalidad de alcanzar la satisfacción plena de la entidad respecto a la ejecución del contrato.

ALCANCE

Alcance y Funciones de la Supervisión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Los contenidos del presente informe son aplicables a las actividades desarrolladas por el contratista bajo la supervisión de la interventoría, en el marco de la ejecución contractual del contrato de obra 591 del 2024 con la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Función de la Interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo

La interventoría tiene la función general de ejercer control y vigilancia sobre el contratista, específicamente en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, está facultada para:

- Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones relacionadas con el desarrollo de la ejecución contractual, asegurando que las actividades se realicen conforme a los lineamientos y normativas.
- Supervisar y verificar que las condiciones de seguridad y salud en el sitio de trabajo sean adecuadas y se mantengan durante toda la ejecución del proyecto.
- Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista para corregir posibles desviaciones o incumplimientos en materia de seguridad y salud, promoviendo un ambiente laboral seguro y saludable.
- Velar por la correcta implementación de las medidas preventivas, correctivas y de control en seguridad y salud en el trabajo, en línea con la legislación vigente.

Compromiso y Responsabilidad

Es fundamental que el contratista colabore activamente con la interventoría, proporcionando toda la información requerida y siguiendo las instrucciones impartidas, con el fin de garantizar la protección de la vida, la integridad física y la salud de todos los trabajadores involucrados en el proyecto.

DESARROLLO DEL INFORME

GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL PERIODO

Actividades ejecutadas en el periodo:

Medidas de control:

Durante el periodo de este informe, son se desarrollaron actividades en obra.

1. Seguridad social de todo el personal del proyecto para el periodo en curso.

Se remiten planillas de seguridad del personal administrativo.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
PINEDA OÑATE MELKIS MATEO	1003383526	ING. AUXILIAR
BLANCO ARENAS YINNA	1024582768	GESTOR SISO
DIEGO FERNANCO CULMA	1024537952	ASESOR ELECTRICO
ANCIZAR CERVERA	1102818450	ASESOR ESTRCUTURAL

Ver anexo 1 planillas de seguridad social

2. Exámenes médicos ocupacionales y carta de seguimiento a recomendaciones médicas del periodo y consolidado en el informe final.

Los exámenes médicos se remitirán una vez se inicien actividades operativas.

3. Paz y salvo, liquidaciones del personal retirado, con los soportes de consignación bancaria, del periodo y consolidado en el informe final.

Paz y salvos para el presente periodo no aplica.

4. Ausentismo por enfermedad de origen común y laboral (con gráfica e indicador) del periodo y consolidado en el informe final.

AUSENTISMO LABORAL - AÑO 2026	
DATOS	**ABRIL**
Número de días de ausencia por incapacidad laboral del periodo	0
Número de días de ausencia por incapacidad común del periodo	0
Número de días de trabajo programados en el mes	9
Número de trabajadores programados en el mes	2
% de Ausentismo por Causa medica	0,00

DESCRIPCION DE LA GRAFICA: En el mes de abril se presentó 0 incapacidad de origen común.

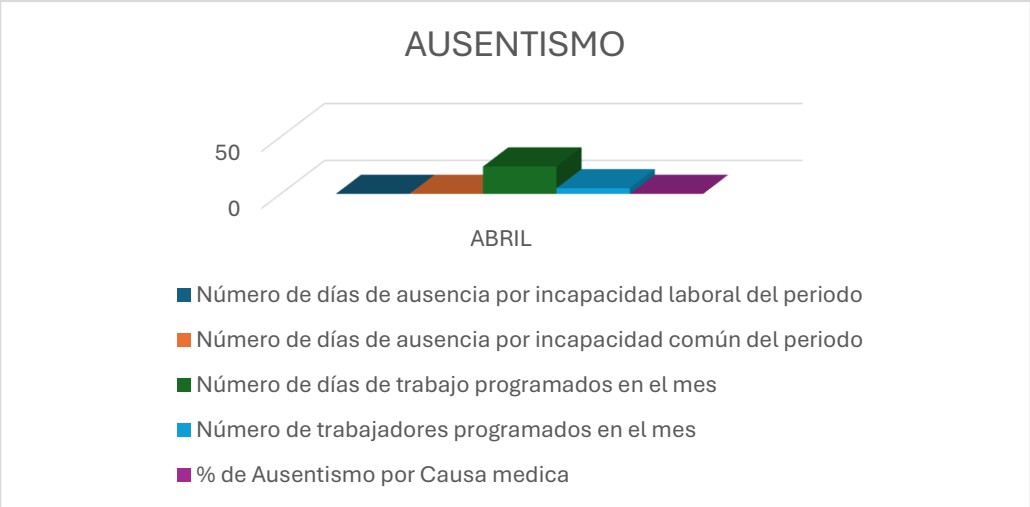

5. Inducciones SST del periodo y consolidado

Para el presente periodo no se realizan inducciones, ya que no se programó ingreso de personal a obra.

6. Entrega de EPP y dotación.

Para el periodo no aplica puesto que no se desarrollaron actividades operativas.

7. Actividades de promoción de la salud (Estilos de vida saludable)

Los estilos de vida saludables son fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades graves y muertes prematuras. Según la Organización Mundial de la Salud, un estilo de vida saludable incluye hábitos que promueven la salud y previenen enfermedades. En el contexto de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es importante implementar un plan de acción coordinado entre trabajadores y la dirección para fomentar estos hábitos en el lugar de trabajo. Además,

programas como pausas activas y ejercicios pueden mejorar la salud y productividad de los empleados.

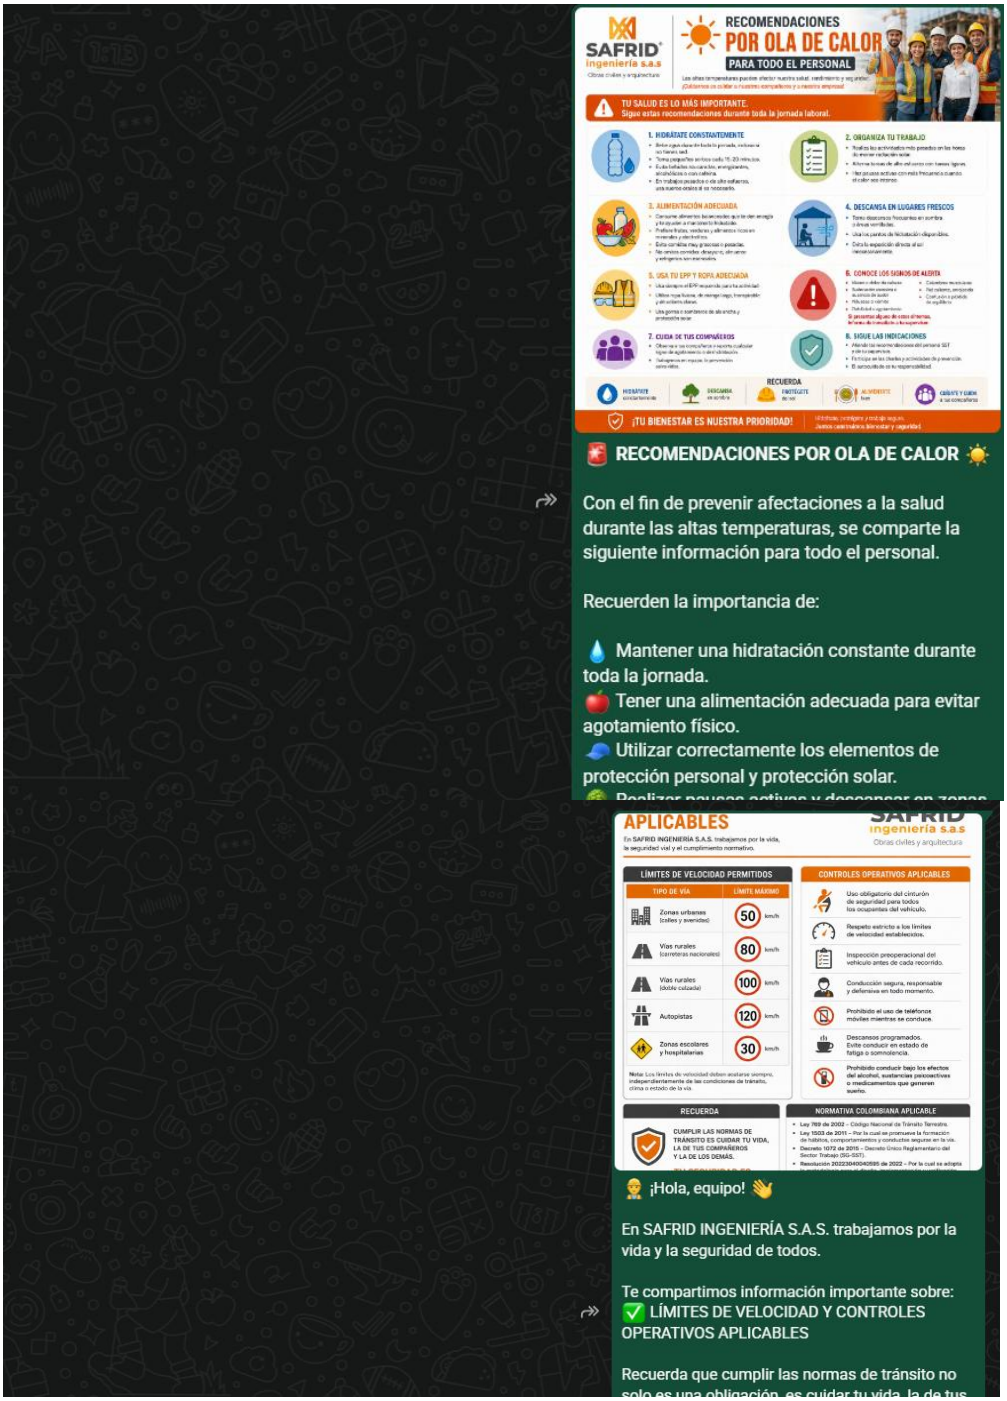

8. Pausas activas del periodo.

Para el periodo no se realiza calistenia teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas fueron administrativas en obra.

9. Orden y aseo.

Con la realización de orden y aseo en obra buscamos crear un ambiente de trabajo seguro y digno, que nos ayude a eliminar lo innecesario y clasificar lo útil para garantizar un entorno laboral adecuado. Implementar medidas preventivas y correctivas para así mitigar el impacto de la ocurrencia de accidentes o incidentes laborales.

10. Señalización, cerramientos, delimitaciones de áreas de trabajo.

La señalización y la demarcación de áreas de trabajo son componentes clave para garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores, que permiten identificar riesgos, prevenir accidentes y mantener un ambiente de trabajo ordenado y seguro.

11. Medidas de control de TAR (permisos, ATS, personal capacitado, equipos certificados, hojas de vida de equipos, sistemas de acceso, medidas preventivas, etc.)

Para este informe no se desarrollaron actividades que requirieran ATS.

12. Mantenimientos preventivos de Maquinas, equipos y herramientas.

Para el periodo no se hace uso de maquinaría, ya que las actividades que se desarrollaron fueron netamente de pintura, aseo general e instalación de madera de cerramiento.

13. Inspecciones Preoperacionales, de máquinas, equipos, herramientas y elementos de protecciones contra caídas.

Para el periodo de este informe no se realizó inspección de herramientas.

14. Grupos de apoyo (Brigada, COPASST, CCL)

La conformación se realizará una vez se inicien actividades operativas.

15. Ejecución plan de trabajo (con gráfica e indicador) del periodo y del informe final.

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO - AÑO 2026	
DATOS	**ABRIL**
Número Actividades programadas en el mes	3

Número de actividades ejecutadas en el mes	3
% De cumplimiento Plan de trabajo	**100%**

DESCRIPCION DE LA GRAFICA: Para el mes de enero se ejecutaron actividades estipuladas en el plan de Trabajo, logrando cumplimiento del 100%.

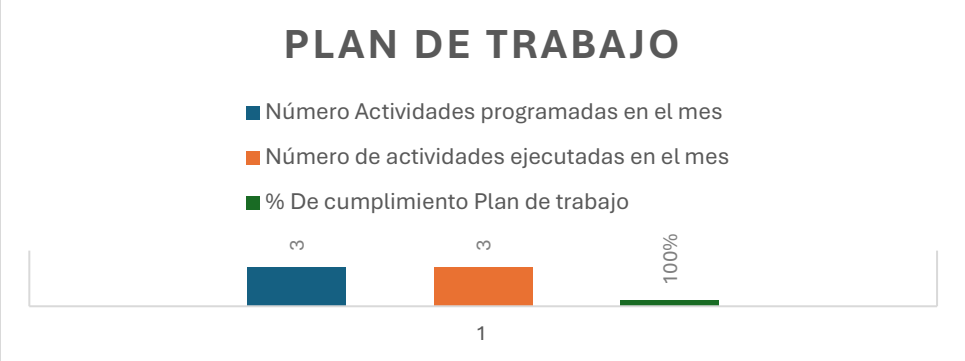

16. Ejecución plan de capacitaciones (con gráfica e indicador) del periodo y del informe final.

CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIONES CHARLAS - AÑO 2026	
DATOS	**ABRIL**
Número de capacitaciones programadas en el mes	0
Número de capacitaciones ejecutadas en el mes	0
% De cumplimiento plan de capacitación	0%

DESCRIPCION DE LA GRAFICA: Para el mes de abril no se realizan capacitaciones.

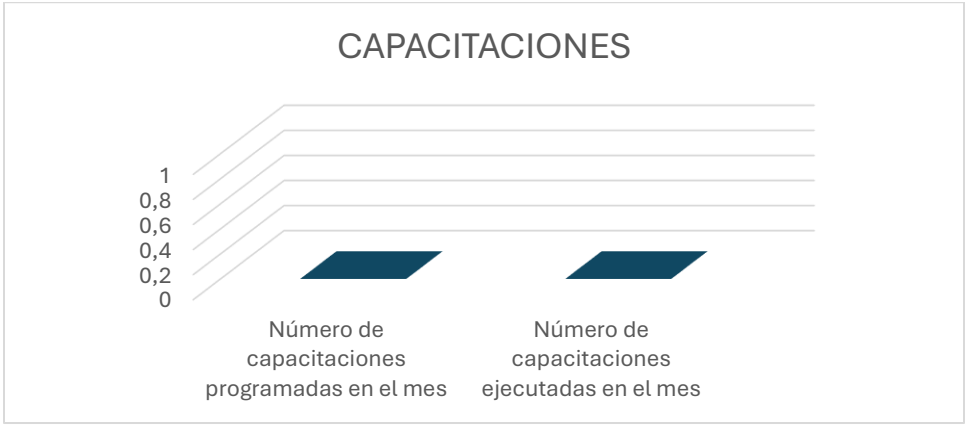

Describa las principales recomendaciones derivadas de las inspecciones de seguridad:

Se recomienda realizar orden y aseo antes, durante y después de cada actividad programada con el fin de mitigar posibles incidentes o accidentes en la obra, al igual que la reposición de EPP al personal operativo cuando se inicien actividades operativas.

17. Describir las Inspecciones realizadas y sus hallazgos o si no se presentaron recomendaciones del periodo y del informe final.

Durante el periodo del presente informe no se realizaron inspecciones de seguridad.

18. Evidencias de la ejecución del plan de acción de los hallazgos, del periodo y del informe final. Matriz de ACPM.

Se realiza mejora a las recomendaciones de la matriz de hallazgos, siendo enviada a la interventoría con el soporte correspondiente.

Describa las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra:

19. Adecuación de puntos de emergencia, del periodo.

Se contará con los equipos de emergencia en obra una vez se inicien actividades.

20. Capacitaciones y socializaciones a la brigada de emergencia y comité operativo de emergencia, del periodo y consolidado en el informe final.

En el período señalado no se desarrollaron capacitaciones ni actividades complementarias, considerando el plan de contingencia y el avance de la obra. Adicionalmente, el proceso de entrega y cierre de la obra requirió la dedicación total del equipo técnico y operativo, razón por la cual no fue posible ejecutar las actividades previstas.

21. Inspecciones de los recursos de emergencia, del periodo y consolidado en el informe final.

Para este informe se cuenta ya con los puntos de emergencia establecidos y con las debidas inspecciones de estos.

22. Campañas, del periodo y consolidado en el informe final.

Divulgación de políticas, PESV y ola de calor.

23. Simulacros, del periodo y consolidado en el informe final.

Para este informe no se realiza simulacros en el proyecto.

Clasificación de la accidentalidad en el periodo:

Para este informe no se presentan accidentes de trabajo.

24. Descripción de Accidentalidad del periodo (con gráfica e indicador) y consolidado en el informe final.

ACCIDENTALIDAD - AÑO 2026	
DATOS	**ABRIL**
Número de AT del periodo	0
Número de trabajadores del periodo	2

DESCRIPCION DE LA GRAFICA: Para el mes de abril no se presentan accidentes de trabajo.

.

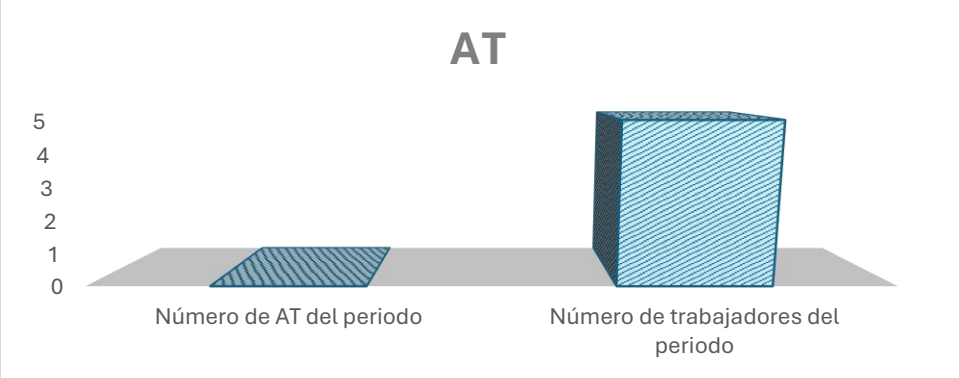

ANEXOS DEL INFORME

1. Planillas de seguridad social integral
2. Exámenes médicos

ANEXO 1

Planillas de seguridad social integral

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CONSORCIO DUOSAF	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82400643	13/05/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$32,406,522	$9.399.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.200	0		0		0	0	0	0	70.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.400	0		0		0	0	0	0	220.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	432.100	0		0		0	0	0	0	432.100	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	14.100	0		0		0	0	0	0	14.100	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.704.900	0	0	0	0	0	0		2.704.900	7
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.920.600	0	0	0	0	0	0		1.920.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.063.900				2.063.900	0	0	2.063.900			20.639	2.063.900	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.202.900	0	0	1.202.900	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.227.100	1.227.100
Pensión	3	4.905.700	4.905.700
Riesgos Laborales	1	2.063.900	2.063.900
CCF	1	1.202.900	1.202.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	9.399.600	9.399.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CONSORCIO DUOSAF	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82400643	13/05/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$32,406,522	$9.399.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1003383526	PINEDA OÑATE MELKIS MATEO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1006095663	ROZO CALDERON DANIEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1007593980	TIQUE OME RUBY FERNANDA	1	0			S																	25-14	1.866.667	28	298.700	0	0	0	0	EPS008	1.866.667	28	74.700	14-11	1.866.667	28	5	130.000	CCF24	1.866.667	28	74.700	0	0	0	0	0
4	CC 1007593980	TIQUE OME RUBY FERNANDA	1	0			S										X							25-14	133.334	2	21.400	0	0	0	0	EPS008	133.334	2	5.400	14-11	133.334	2	5	0	CCF24	133.334	2	0	0	0	0	0	0
5	CC 1014206916	CARRANZA CEPEDA CLAUDIA NATALIA	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
6	CC 1023887082	BELTRAN RAMIREZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	5	117.900	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
7	CC 1023887082	BELTRAN RAMIREZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
8	CC 1024537952	CULMA NUÑEZ DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	4.800.000	30	768.000	0	0	0	0	EPS008	4.800.000	30	192.000	14-11	4.800.000	30	5	334.100	CCF24	4.800.000	30	192.000	0	0	0	0	0
9	CC 1090450950	AREVALO DUARTE ANIBAL	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF24	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
10	CC 1122784137	JIMENEZ NARVAEZ PAOLA ANDREA	1	0			S																	25-14	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	ESSC18	4.500.000	30	180.000	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF24	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
11	CC 11406871	HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	5	101.600	CCF24	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
12	CC 11406871	HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO	1	5			S										X								0	0	0	0	0	0	0	EPS017	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0
13	CC 1232408061	ALVARADO ORTIZ JESUS GREGORIO	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	5	117.900	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
14	CC 1232408061	ALVARADO ORTIZ JESUS GREGORIO	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
15	CC 52269174	TORRES CAMARGO OLGA LUCIA	1	0			S									X								231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	0	14-11	1.750.905	30	5	0	CCF24	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
16	CC 74245810	VARGAS ORTIZ NELSON JOMAN	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
17	CC 91538380	LOZANO TOVAR ALEX	1	0			S																	25-14	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS002	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	5	109.700	CCF24	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
18	CC 91538380	LOZANO TOVAR ALEX	1	0			S											X						25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	5	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
19	PT 5294790	PEDREAÑEZ FUENTES ALEXANDER ENRIQUE	1	0			S	X																230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPSC34	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
20	PT 5294790	PEDREAÑEZ FUENTES ALEXANDER ENRIQUE	1	0			S												L					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSC34	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS	TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82937769	13/05/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$74,938,368	$21.702.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	220.200	0		0		0	0	0	0	220.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	565.700	0		0		0	0	0	0	565.700	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.028.300	0		0		0	0	0	0	1.028.300	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	674.100	0		0		0	0	0	0	674.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.752.300	0	0	133.500	133.500	0	0		6.019.300	7
230301	Porvenir	800224808-8	4.686.000	0	0	0	0	0	0		4.686.000	11
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.272.600	0	0	0	0	0	0		1.272.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.447.600				3.447.600	0	0	3.447.600			34.476	3.447.600	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.998.600	0	0	2.998.600	23

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.998.600	2.998.600
Pensión	4	12.258.100	12.258.100
Riesgos Laborales	1	3.447.600	3.447.600
CCF	1	2.998.600	2.998.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	21.702.900	21.702.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900520848-4	SAFRID INGENIERIA SAS		TRANSVERSAL 21 BIS No.59-57 Bogota	7576146	coordinadorsst@safridingenieria.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82937769	13/05/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$74,938,368	$21.702.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000139652	HIGUERA SUAREZ MARIA ISABEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1007443885	GALINDEZ CARLOSAMA JOHANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	1	8.900	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
3	CC 1007443885	GALINDEZ CARLOSAMA JOHANA PAOLA	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	1	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
4	CC 1007851713	ARIAS RAMOS KAREN YULIETH	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
5	CC 1018492836	JOVEN HERNANDEZ ANGIE JULIANA	1	0			S																	230201	3.383.334	29	541.400	0	0	0	0	EPS008	3.383.334	29	135.400	14-11	3.383.334	29	1	17.700	CCF24	3.383.334	29	135.400	0	0	0	0	0
6	CC 1018492836	JOVEN HERNANDEZ ANGIE JULIANA	1	0			S												L					230201	116.667	1	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.667	1	4.700	14-11	116.667	1	1	0	CCF24	116.667	1	4.700	0	0	0	0	0
7	CC 1019148886	CERON ARGOTE DIANY VERUSKA	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
8	CC 1020792364	RIVERA PANCHE EDUARDO ANDRES	1	0			S	X																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1024582768	BLANCO ARENAS YINNA CONSTANZA	1	0			S																	230301	5.198.410	30	831.800	0	0	0	0	EPS017	5.198.410	30	208.000	14-11	5.198.410	30	5	361.900	CCF24	5.198.410	30	208.000	0	0	0	0	0
10	CC 1032485282	JIMENEZ ZUBIETA YOHAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.880.000	30	460.800	0	0	0	0	EPS005	2.880.000	30	115.200	14-11	2.880.000	30	5	200.500	CCF24	2.880.000	30	115.200	0	0	0	0	0
11	CC 1033818796	VILLA MEJIA LUZ ADRIANA	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
12	CC 1074556927	BECERRA MARTINEZ DANIEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1075301925	ESCOBAR MENDEZ LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1082772835	ANACONA MARTINEZ YANCI KARINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1082773803	CERON MOLINA MARIA CRISTINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1082774968	CERON MOLINA MIGUEL ALEXANDER	1	0			S																	230201	7.200.000	30	1.152.000	0	0	36.000	36.000	EPS017	7.200.000	30	288.000	14-11	7.200.000	30	1	37.600	CCF24	7.200.000	30	288.000	0	0	0	0	0
17	CC 1082778594	ZUÑIGA NAVIA ADIER JOHAN	1	0			S																	230301	2.700.000	30	432.000	0	0	0	0	EPS008	2.700.000	30	108.000	14-11	2.700.000	30	5	188.000	CCF24	2.700.000	30	108.000	0	0	0	0	0
18	CC 1094932568	LONDOÑO JIMENEZ MARIO ALEXANDER	1	0			S																	230201	7.500.000	30	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	30	300.000	14-11	7.500.000	30	5	522.000	CCF24	7.500.000	30	300.000	0	0	0	0	0
19	CC 1102870540	RADA PATERNINA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1127573865	SANDOVAL JULIO ANA CECILIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 12143895	CERON MOLINA FRANQUI RUBER	1	0			S																	230201	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS008	12.000.000	30	480.000	14-11	12.000.000	30	5	835.200	CCF24	12.000.000	30	480.000	0	0	0	0	0
22	CC 2000018376	RINCON MOLINA SANDRA YENIRETH	1	0			S																	230301	3.866.667	29	618.700	0	0	0	0	EPS005	3.866.667	29	154.700	14-11	3.866.667	29	1	20.200	CCF24	3.866.667	29	154.700	0	0	0	0	0
23	CC 2000018376	RINCON MOLINA SANDRA YENIRETH	1	0			S												L					230301	133.334	1	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	1	5.400	14-11	133.334	1	1	0	CCF24	133.334	1	5.400	0	0	0	0	0
24	CC 52189470	LOPEZ NANCY	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 52352730	CAMERO ANGELA MARIA	1	0			S																	25-14	2.700.000	30	432.000	0	0	0	0	EPS017	2.700.000	30	108.000	14-11	2.700.000	30	5	188.000	CCF24	2.700.000	30	108.000	0	0	0	0	0
26	CC 52389385	JIMENEZ MURCIA YOANY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1102818450 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-03	230201	800229739	PROTECCION	1	0	714.600	0	714.600
Período salud:	2026-03	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	558.300	0	558.300
Planilla Nro.:	36764166 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	46.700	0	46.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-04-14	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	223888663	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 1.319.600

PAGADO
