INFORME DE INTERVENTORÍA No2

CONTRATO No 26-17 EC



“PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No GGC-2072-2025 DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

1 de abril de 2026 – 30 de abril de 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1 Localización del proyecto 4

2.2 Características técnicas del proyecto 5

2.3 Presupuesto General del proyecto 6

2.4 Justificación ajustes realizados a los proyectos 7

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 7

3.1 Documentos generales del contrato 7

3.1.1 Otrosí. Adicionales y Prorrogas 8

3.1.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra 8

3.1.3 Cronograma de actividades 8

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 9

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 16

4.1 Avance de obra 16

4.2 Seguimiento de garantías 17

4.2.1 Garantías del contrato de obra 17

4.2.2 Garantías de interventoría 18

4.3 Personal contrato de obra 18

5.- PLAN DE TRABAJO. 19

6.- RELACIÓN DE BENEFICIERIO. 19

6.1.– Beneficiarios iniciales del proyecto. 19

7.- CONCLUSIONES. 32

8.- RECOMENDACIONES. 32

9. ANEXOS 32

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra presenta el estado de avance del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. GGC-2072-2025 DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, ejecutado en el marco del Contrato No. 26-17EC, suscrito el 23 de febrero de 2026 entre **KAPPA INGENIERÍA S.A.S.,** en calidad de Administrador del proyecto, y la **ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P.,** en calidad de contratante.

El proyecto tiene como finalidad la implementación de 623 sistemas individuales solares fotovoltaicos destinados a mejorar las condiciones de acceso al servicio de energía eléctrica en zonas rurales no interconectadas del municipio de Becerril. Este informe consolida las actividades técnicas, administrativas y operativas desarrolladas durante el periodo reportado, así como los avances alcanzados en la entrega de materiales, ejecución en campo, gestión social y demás componentes asociados al cumplimiento del objeto contractual.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización del proyecto

Becerril es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Cesar. Tiene una población, se creó municipio en el año de 1977 por ordenanza de la asamblea del César y liderazgo del señor Eloy Guillermo Quiroz coronel nacido en becerril cesar el 25 de junio de 1935 y fue su primer alcalde en 1977, becerril es reconocido en la década del 70 a nivel nacional cuando era uno de los principales cultivadores de algodón a nivel nacional ahora cuenta con la mina más grande del mundo entero que está ubicada en la parte de abajo precisamente en diferentes fincas como son normandía nueva dicha Centroamérica la Armenia y el descanso que lleva su nombre de la mina más grande del mundo, becerril tiene 25.000 habitantes. El municipio es reconocido también por ser el lugar de nacimiento del cantante Rafael Orozco. La economía del municipio es principalmente minera, con la explotación de carbón térmico, seguida de la agropecuaria, basada en el cultivo de la palma africana, yuca, plátano, maíz entre otros

Limita con los municipios de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibírico y la frontera con Venezuela por la Serranía del Perijá, llamada también la Serranía de los Motilones.

El principal accidente geográfico es la serranía del Perijá, que lo limita con Venezuela. Su territorio es plano en su casi totalidad. Los principales ríos son el Maracas, Socomba y el Tocuy. También en parte de su área se encuentra el bloque El Descanso, habilitado para la explotación del carbón. Basa su economía en la agricultura y la ganadería. Celebra la fiesta patronal con la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero. Realiza el Festival de la Paletilla, en honor de los indígenas yukpas, quienes aún habitan el territorio.



Localización de Becerril en Colombi



Ubicación de Becerril

Figura 1. Localización General del Proyecto

La intervención se sitúa en las zonas rurales dispersas del municipio, priorizando aquellas veredas que no cuentan con conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Entre las áreas identificadas se encuentran Santa Rita, El Centro, El Hatillo, Sokorpa, Canaima, Manantiales Altos, Santa Cecilia, Esmeralda, Sikakao, Tocore, Caño Rodrigo, El Porvenir, Nueva Mercedes, Ipika, Merika, San Genaro, Kuya, Peñas, Capihuara, Tierra Seca, Tucuycito La Loma, Altos del Tucuy, Maraca, Manantial y Betulia, entre otras. Estas localidades constituyen el núcleo territorial donde se desarrollan las actividades del proyecto, orientadas a mejorar las condiciones de acceso a servicios energéticos en la población rural no interconectada.

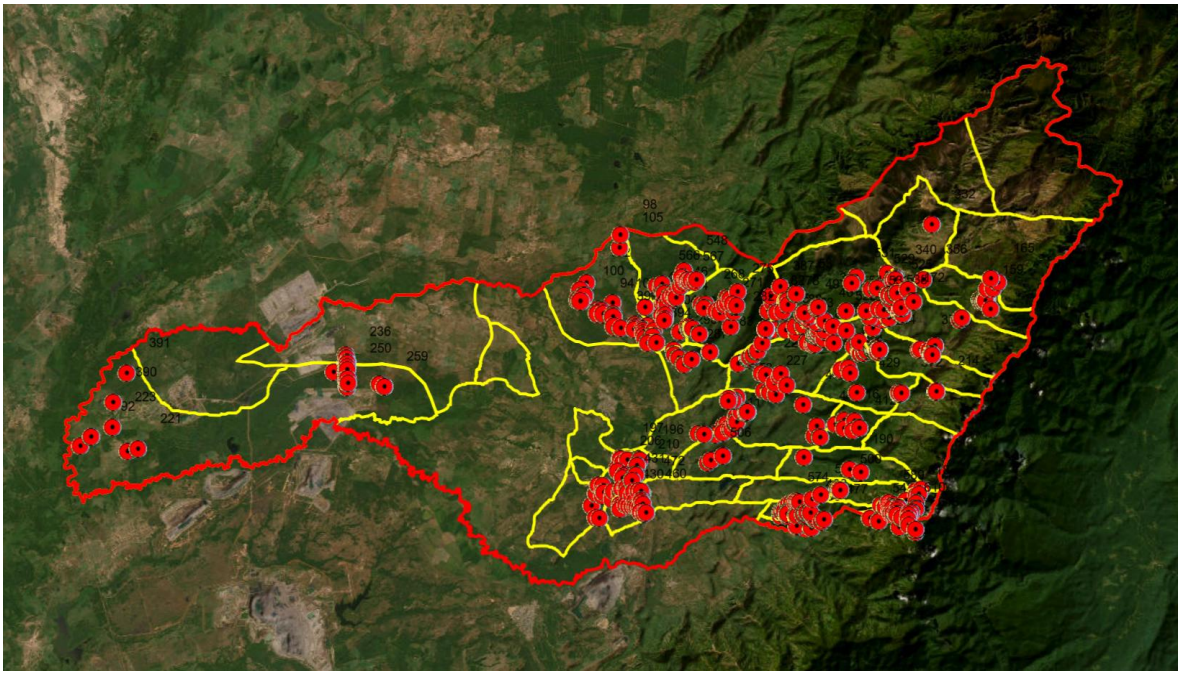


Figura 2. Localización especifica del proyecto

2.2 Características técnicas del proyecto

Los sistemas están conformados por módulos solares, estructuras de soporte, controlador de carga, baterías de almacenamiento y protecciones eléctricas. Cada unidad cuenta con un módulo fotovoltaico de capacidad nominal acorde a la demanda energética del usuario, una estructura metálica anclada al terreno o a la vivienda, un banco de baterías para garantizar autonomía, y un sistema de regulación y protección que asegura el funcionamiento eficiente y seguro del conjunto. La instalación incluye además cableado, accesorios y elementos de conexión certificados.

Este proyecto se propone abordar desafíos energéticos, ambientales y sociales en comunidades rurales mediante la implementación de sistemas solares fotovoltaicos, al mismo tiempo que promueve el uso responsable de la energía y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias. Los sistemas instalados están diseñados para mejorar la disponibilidad de energía, reducir la dependencia de fuentes contaminantes y contribuir al bienestar de las familias beneficiarias.

2.3 Presupuesto General del proyecto

DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE BECERRIL

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE KITS FOTOVOLTAICOS PARA LAS FAMILIAS EN LA ZONA RURAL NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR

PRESUPUESTO DE OBRA

No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD USUARIOS	VALOR UNITARIO	TOTAL HERRAMIENTAS	TOTAL MATERIALES	TOTAL TRANSPORTE	TOTAL MANO DE OBRA	SUBTOTAL GENERAL
1	**INSTALACION KIT FOTOVOLTAICO**								
1.1	Localización y georreferenciación de vivienda	UND	623	$ 109,658.9	$ 33,726	$ -	$ -	$ 75,933	$ 68,317,500.93
C.N.1.2	Suministro, transporte e instalación generador solar 1250 Wp, η=20% +3%. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, IEC61205.	UND	623	$ 3,185,338.0	$ 29,591	$ 2,380,443	$ 479,400	$ 295,905	$ 1,984,465,574.00
1.3	Suministro, transporte e instalación de banco de batería de 100 Ah/24 Vdc tipo rack, 2560 Wh. Vida útil de 6000 ciclos a un DoD del 80%. Garantía de 5 años	UND	623	$ 5,748,005.64000	$ 51,041	$ 4,890,754	$ 295,800	$ 510,411	$ 3,581,007,514
1.4	Suministro, transporte e instalación de controlador de 24 Vdc 40A, tipo MPPT, tension maxima de circuito abierto 150 Voc. Garantía 10 años	UND	623	$ 1,944,383.9000	$ 10,812	$ 1,774,447	$ 51,000	$ 108,124	$ 1,211,351,170
1.5	Suministro, transporte e instalación de inversor de potencia 1000W-24Vdc 120 Vac con función: Voltaje adaptativo de desconexión LVD, 60Hz, onda senoidal pura. Garantía 10 años.	UND	623	$ 2,739,132.0	$ 29,710	$ 2,320,522	$ 91,800	$ 297,100	$ 1,706,479,236
N.P.1	Suministro, transporte, cimentación reforzada cumpliendo NSR10 e instalación de soporte para 2 paneles solares	UND	623	$ 1,898,777.0	$ 19,177	$ 1,257,128	$ 430,700	$ 191,773	$ 1,182,938,071.00
1.7	Suministro, transporte e Instalacion Sistema de puesta a tierra del sistema fotovoltaico	UND	623	$ 1,256,230.1	$ 70,615	$ 504,270	$ 265,200	$ 416,146	$ 782,631,352.30
C.N.1.8	Suministro transporte e instalación de gabinete eléctrico de medidas (900x700x400) en lámina cold rolled, IP54, para los equipos de los SSFV	UND	623	$ 2,171,400.0	$ 29,710	$ 1,538,590	$ 306,000	$ 297,100	$ 1,352,782,200
2	**INSTALACIONES INTERNAS**								
N.P.2	Suministro, transporte e instalacion de instalaciones internas en tubería métalica y medidor prepago monofásico bifilar	UND	623	$ 2,135,535.0	$ 11,983	$ 1,650,177	$ 102,000	$ 371,375	$ 1,330,438,305

COSTO DIRECTO		**$ 13,200,410,922.650**
COSTO INDIRECTO	**25%**	**$ 3,300,102,731**
ADMINISTRACION	**18%**	**$ 2,376,073,966**
UTILIDAD	**5%**	**$ 660,020,546**
IMPREVISTOS	**2%**	**$ 264,008,218**
GS: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE (ESCUELA TEJ)	**0.8%**	**$ 105,603,287**
COSTO TOTAL OBRA (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO+ GS+PMA)		**$ 16,606,116,940.69**

Figura 3. Presupuesto general

2.4 Justificación ajustes realizados a los proyectos

Durante la ejecución del proyecto se realizó una modificación orientada al ajuste de nombre a tres ítems contractuales, sin que ello implicara variación alguna en su alcance, cantidad o valor. Adicionalmente, se incorporaron dos ítems no previstos inicialmente, cuya inclusión resultó necesaria para garantizar la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento integral del objeto contractual.

- Los ítems a la cual se le cambiaron los nombres son: ítem 1.2, ítem 1.3 y el ítem 1.8
- Ítems No previstos (N.P1 Y N.P 2)

VER ANEXO 1.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Documentos generales del contrato

Aspectos contractuales del contrato de obra:

Entidad Contratante:	**ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S. P**
NIT:	891.190.127-3
Número de contrato:	26-17 **EC**
Objeto contractual:	**"ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No GGC-2072-2025 DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**
Valor del contrato en número:	$847.473.853
Valor del contrato en letras:	Ochocientos cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y tres dos mil pesos m/l
Fecha de firma de acta de inicio:	Veintiuno (21) días del mes de febrero del año 2026
Plazo de ejecución:	Seis (06) Meses
Fecha de finalización del Proyecto:	20 de agosto de 2026
Contratista:	**KAPPA INGENIERIA S.A.S.**
NIT:	901.232.412-5
Nombre del representante legal de interventoría:	Sebastián Herrera Franco
Identificación del representante legal de interventoría:	Cédula de ciudadanía N° 1.094.936.436
Tiempo transcurrido del Contrato:	Un (1) meses
Periodo de informe:	23 de febrero de 2026 al 31 de marzo de 2026

Tabla 1. Información del contrato de obra

3.1.1 Otrosí. Adicionales y Prorrogas

Para este periodo del presente informe no se han presentado adicionales y prorrogas.

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 2. Otrosíes y Adicionales en tiempo y/o valor del contrato de obra.

3.1.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

Para este periodo del presente informe no se han hecho suspensiones al contrato de obra.

DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	TIEMPO DE SUSPENSION	FECHA REINICIO	MOTIVO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Tabla 3. Suspensiones y reinicios al contrato de obras

3.1.3 Cronograma de actividades

DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE BECERRIL

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE KITS FOTOVOLTAICOS PARA LAS FAMILIAS EN LA ZONA RURAL NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR

CRONOGRAMA DE OBRA

		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8			
No	DESCRIPCION	SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
1	**INSTALACION KIT FOTOVOLTAICO**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1	Localización y georrefenrenciación de vivienda	ETAPA PRECONTRACTUAL																												ETAPA DE LIQUIDACIÓN			
1.2	Suministro, transporte e instalación generador solar 1100 Wp, η=20% +3%. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, IEC61205.																																
1.3	Suministro, transporte e instalación de banco de batería de 100 Ah/24 Vdc tipo rack, 2560 Wh. Vida útil de 6000 ciclos a un DoD del 80%. Garantía de 5 años																																
1.4	Suministro, transporte e instalación de controlador de 24 Vdc 40A, tipo MPPT, tension maxima de circuito abierto 150 Voc. Garantía 10 años																																
1.5	Suministro, transporte e instalación de inversor de potencia 1000W-24Vdc 120 Vac con función: Voltaje adaptativo de desconexión LVD, 60Hz, onda senoidal pura. Garantía 10 años.																																
1.6	Suministro, transporte, cimentación e instalación de soporte para 2 paneles solares																																
1.7	Suministro, transporte e Instalacion Sistema de puesta a tierra del sistema fotovoltaico																																
1.8	Suministro transporte e instalación de gabinete eléctrico de medidas (900x600x450) en lámina cold rolled, IP54, para los equipos de los SSFV																																
2	**INSTALACIONES INTERNAS**																																
2.1	Suministro, transporte e instalacion de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminacion y dos (2) tomacorrientes dobles) y medidor prepago monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo)																																

Tabla 4. Cronograma de obra

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Para la ejecución de actividades durante este periodo se atendieron con la coordinación técnica, los cuales se indican a continuación:

- **Localización y georreferenciación de vivienda**

Durante este periodo, se realizó 560 georreferenciaciones.



Figura 4. Localización y replanteo de viviendas

- **Suministro, transporte e instalación de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminación y dos (2) tomacorrientes dobles) y medidor prepago monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo)**

A partir del 6 de abril de 2026 se iniciaron las actividades de instalaciones eléctricas internas en las viviendas de los beneficiarios. Las labores ejecutadas incluyeron: tendido y fijación de tubería EMT, instalación de acometidas internas, montaje de luminarias, tomacorrientes y adecuación de los puntos eléctricos necesarios para la futura conexión de los equipos solares. Estas actividades se desarrollaron conforme a los planos eléctricos aprobados, las especificaciones técnicas del proyecto y las normas vigentes de instalaciones de baja tensión. Durante el periodo reportado, el equipo técnico logró intervenir 280 viviendas, completando su instalación interna y avanzando simultáneamente en la caracterización técnica inicial de los 623 beneficiarios contemplados en el alcance contractual.



figura 5. Actividad de instalaciones de interna

Instalación de valla informativa del proyecto.



Figura 6. Valla informativa del proyecto

- **Instalación de Generadores fotovoltaico**

Durante el presente periodo se realizó la instalación de 360 paneles solares, distribuidos de dos (2) paneles por beneficiario. Con esta actividad se completó la dotación de 180 beneficiarios, equivalentes al 28.9 % del total de 623 beneficiarios previstos en el proyecto, quienes quedaron con sus respectivos sistemas fotovoltaicos instalados conforme a las especificaciones técnicas establecidas.



Figura 7. Actividades auxiliares del proyecto

- **Instalación de Banco de batería**

Durante el presente periodo se realizó la instalación de 180 banco de baterías del total de 623 beneficiarios previstos en el proyecto, quienes quedaron con sus respectivos sistemas fotovoltaicos instalados conforme a las especificaciones técnicas establecidas.



Figura 8. Actividades de instalación

- **Instalación de controlador**

Durante el presente periodo se realizó la instalación de 180 controladores del total de 623 beneficiarios previstos en el proyecto, quienes quedaron con sus respectivos sistemas fotovoltaicos instalados conforme a las especificaciones técnicas establecidas.



Figura 9. Actividades de instalación de controlador

- **Instalación de inversor**

Durante el presente periodo se realizó la instalación de 180 inversores del total de 623 beneficiarios previstos en el proyecto, quienes quedaron con sus respectivos sistemas fotovoltaicos instalados conforme a las especificaciones técnicas establecidas.



Figura 10. Actividades de instalación de inversor

- **Cimentación e instalación de soporte para paneles solares**

Durante el presente periodo se realizó la construcción de 180 cimentaciones y se realizó la instalación de 180 mástil del total de 623 beneficiarios previstos en el proyecto, quienes quedaron con sus respectivos sistemas fotovoltaicos instalados conforme a las especificaciones técnicas establecidas.



Figura 11. Actividades de instalación de mástil

- **Sistema de puesta a tierra del sistema fotovoltaico**

Durante el presente periodo se realizó la construcción de 180 cimentaciones y se realizó la instalación de 180 mástil del total de 623 beneficiarios previstos en el proyecto, quienes quedaron con sus respectivos sistemas fotovoltaicos instalados conforme a las especificaciones técnicas establecidas.



Figura 12. Actividades de instalación de sistema puesta a tierra

- **Suministro e instalación de gabinete eléctrico**

Durante el presente periodo se realizó la instalación de 180 gabinetes del total de 623 beneficiarios previstos en el proyecto, quienes quedaron con sus respectivos sistemas fotovoltaicos instalados conforme a las especificaciones técnicas establecidas.



Figura 13. Actividades de instalación de gabinetes eléctricos

- **Suministro e instalación de instalaciones internas**

Durante el presente periodo se realizó la instalación de 280 instalaciones internas del total de 623 beneficiarios previstos en el proyecto, quienes quedaron con sus respectivos sistemas fotovoltaicos instalados conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

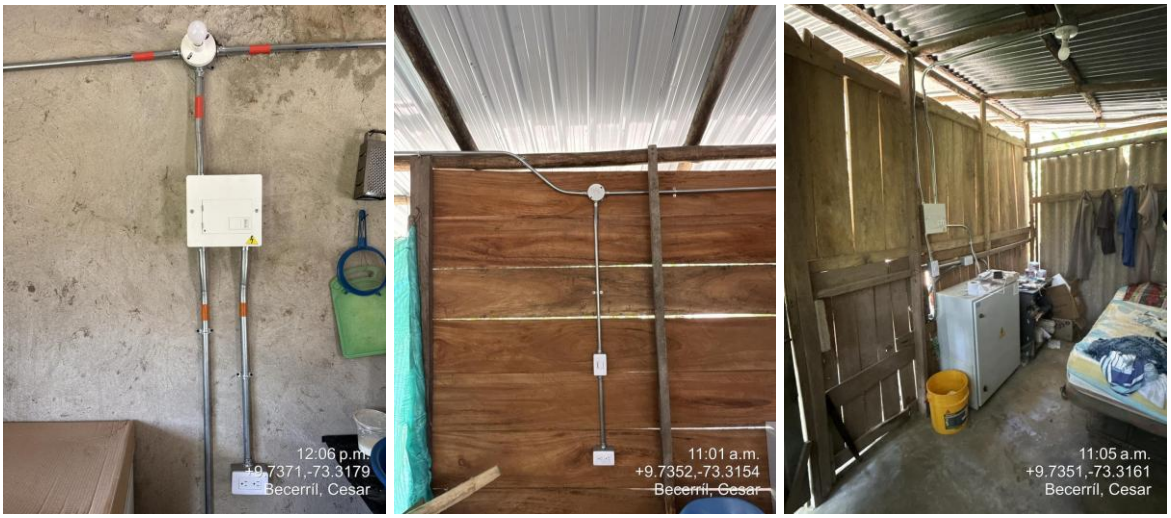


Figura 14. Actividades de instalación de instalaciones internas eléctricas

- **Comunidades energéticas**

Para el presente periodo se conformaron 57 comunidades energéticas que agrupan a los 623 beneficiarios del proyecto.

- 41 comunidades tienen los momentos del 0 al 5
- 16 comunidades tienen los momentos del 0 al 2



Figura 15. Actividades de la escuela TEJ

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Avance de obra

El presente informe detalla las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, correspondiente al primer mes de actividades.

AVANCE DE OBRA FINANCIERO				
VALOR COSTO DIRECTO DEL PROYECTO				$ 16,606,116,940.69
	OBRA EJECUTADA		OBRA PENDIENTE	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
PORCENTAJE	30.83%	30.83%	69.17%	69.17%
VALOR $	$ 5,118,986,655	$ 5,118,986,655	$ 11,487,130,285	$ 11,487,130,285

Tabla 5. Avance de obra

ITEM	ACTIVIDAD	%EJECUTADO SEMANA	%EJECUTADO ACUMULADO	
	CAPITULOS			
1	REEPLANTEO	26,00%	89,89%	
2	GENERACIÓN FOTOVOLTAICA	12,84%	28,89%	
3	BATERIAS	12,84%	28,89%	
4	CONTROLADOR	12,84%	28,89%	
5	INVERSOR DE CARGA	12,84%	28,89%	
6	CIMENTACIÓN	12,84%	28,89%	
7	SISTEMA PUESTA A TIERRA	3,85%	28,89%	
8	GABINETE	12,84%	28,89%	
9	INTERNAS Y MEDIDA	7,54%	44,34%	
				% AVANCE
% de Avance ejecutado semana				11,84%
% de Avance ejecutado acumulado				30,83%

Tabla 6. Avance de obra en % por ítems



4.2 Seguimiento de garantías

4.2.1 Garantías del contrato de obra

POLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 61-45-101026388	**18 de febrero de 2026**	Cumplimiento del contrato.	17/02/2026	17/02/2027	$ 3.322.652.809,23
		Buen manejo de anticipo	17/02/2026	17/02/2027	$ 8.306.632.023,08
		Salarios y prestaciones sociales.	17/02/2026	17/02/2027	$ 2.491.989.606,92
		Calidad del Servicio	17/02/2026	17/02/2027	$ 2.491.989.606,92
		Calidad de los elementos			$4.983.979.213,85
PÓLIZA OBLIGACIONES A TERCEROS AFECTADOS N° 61-40-101023193	**18 de febrero de 2026**	Obligaciones a terceros	17/02/2026	17/02/2027	$3.322.652.809,23

PÓLIZA ACTUALIZACIÓN DE ACTA DE INICIO	**23 de febrero de 2026**		**23/02/2026**	**17/02/2027**	$3.322.652.809,23

Tabla 7. Garantías contrato de obra y terceros

4.2.2 Garantías de interventoría

POLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
PÓLIZA DE AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES N° CHU-100013694	**19 de febrero de 2026**	Cumplimiento del contrato.	17/02/2026	17/02/2027	$ 169.494.770,60

Tabla 8. Garantías interventoría

4.3 Personal contrato de obra

A continuación, se lista el personal del contratista de obra utilizado en el proyecto:
El personal de obra controlado diariamente y utilizado durante el presente periodo

OBRA: Personal Administrativo		
NOMBRE	**CARGO**	**CANTIDAD**
JAVIER IGNACIO LOPEZ MAESTRE	Director de Obra	1
JHONNY TURIZO GARIZADO	Residente de Obra	1
WILMAR GIL USMA	Residente de Obra	1
EINER MAESTRE COTES	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	1
ELIANA BARRIOS	Ingeniera ambiental	1
ANDREA BRAVO	Abogada	1
DANIELA BRAVO	Contadora	1
Personal Operativo		
JHIN JAVUER HOYOS SÁNCHEZ	Técnico electricista	1
CARLOS ARTURO CUADROS AMADOR	Técnico electricista	1
JUAN CARLOS POLO HERRERA	Técnico electricista	1
JANESON OSORIO CARDENAS	Técnico electricista	1
CLODOROMIRO ACEVEDO	Técnico electricista	1
EDWIN MONTES	Técnico electricista	1
TOTAL		**13**

Tabla 9. Personal contratista de obra

5.- PLAN DE TRABAJO.

- Continuar con los procesos de replanteo, instalación y puesta en servicio de los sistemas solares fotovoltaicos, manteniendo los estándares de calidad definidos y el cumplimiento de las metas de cobertura energética.
- Implementar acciones correctivas frente a las condiciones particulares de las viviendas y la dispersión geográfica de las veredas, con el fin de mitigar impactos y evitar afectaciones al cronograma general.
- Realizar monitoreo permanente del avance físico y operativo, asegurando la coherencia entre las actividades ejecutadas, los recursos utilizados y los objetivos del proyecto.

6.- RELACIÓN DE BENEFICIERIO.

Procedimos a relacionar la población objetivo, por medio de la Tabla N°10, presentamos la relación de los beneficiarios correspondiente:

6.1. – Beneficiarios iniciales del proyecto.

	VEREDA	*NOMBRE DEL USUARIO*	*No. CEDULA*	*LATITUD*	*LONGITUD*
1	VDA SANTA RITA	CECILIO ORTIZ MARTINEZ	9,876,231	09°45´27"	73°08´04"
2	VDA SANTA RITA	ELKIN ANDRES FERNANDEZ RAMIREZ	1,062,805,910	09°45´03"	73°08´19"
3	VDA SANTA RITA	JESUS ALBERTO GONZALEZ CAPITAN	1,062,804,535	09°45´57"	73°08´23"
4	VDA SANTA RITA	PATRICIA BARRETO GONZALEZ	49,670,116	09°44´57"	73°08´24"
5	VDA SANTA RITA	VANESSA ORTIZ CAPITAN	1,003,040,375	09°44´58"	73°08´20"
6	VDA SANTA RITA	JESUALDO CAPITAN MONTECRISTO	1,062,815,395	09°44´53"	73°08´25"
7	VDA SANTA RITA	AUGUSTO GUERRA BLANCO	15,016,723	09°45´03"	73°08´17"
8	VDA SANTA RITA	LUIS EDUARDO QUIÑONES RAMIREZ	19,515,710	09°45´26"	73°08´06"
9	VDA SANTA RITA	DORAINIS FERNANDEZ CAPITAN	85,486,247	09°44´20"	73°5´59"
10	VDA SANTA RITA	MARTHA GONZALEZ BARRETO	26,827,104	09°44´21"	73°5´59"
11	VDA SANTA RITA	IBANARVOS JULIO	13,164,710	09°44´22"	73°5´59"
12	VDA SANTA RITA	LUIS ALFONSO GRANADOS	18,974,639	09°44´22"	73°5´59"
13	VDA SANTA RITA	YESID	85,486,247	09°44´22"	73°5´55"
14	VDA SANTA RITA	ARELIS TORREZ GARCIA	1,003,037,979	09°44´21"	73°5´55"
15	VDA SANTA RITA	YORVIS MANUEL BELTRAN	1,079,656,188	09°44´17"	73°5´60"
16	VDA SANTA RITA	SAMIR LEONEL CONTRERAS	1,065,595,435	09°44´15"	73°5´59"
17	VDA SANTA RITA	JOSE DANIEL ORTIZ MARTINEZ	1,003,038,702	09°44´18"	73°6´2"
18	VDA SANTA RITA	JUAN GREGORIO QUIROZ CAPITAN	1,003,040,393	09°44´18"	73°6´3"
19	VDA SANTA RITA	KEINER JOSE URIBE MARTINEZ	1,062,808,724	09°44´19"	73°6´5"
20	VDA SANTA RITA	MARIA ELENA GONZALEZ PEREZ	1,062,804,851	09°44´18"	73°6´7"
21	VDA SANTA RITA	MIRYAM QUIROZ GONZALEZ	49,774,253	09°44´21"	73°6´9"
22	VDA SANTA RITA	LAURA MICHEL RAMIREZ CAPITAN	1,062,806,065	09°44´21"	73°6´10"
23	VDA SANTA RITA	SEBASTIAN DAVID TAMAR ORTIZ	1,062,805,611	09°44´22"	73°6´10"

24	VDA SANTA RITA	BLANCA CECILIA QUEVEDO	21,190,513	09°44´21"	73°5´55"
25	VDA SANTA RITA	ASTRID CAROLINA JIMENEZ	1,062,811,932	09°44´23"	73°6´11"
26	VDA SANTA RITA	EDINSON FABIAN GONZALEZ	1,062,805,283	09°44´23"	73°6´10"
27	VDA SANTA RITA	JOSE MANUEL MERIÑO	1,079,936,957	09°44´24"	73°6´9"
28	VDA SANTA RITA	DIANA PATRICIA QUIROZ	1,062,808,746	09°44´27"	73°6´0"
29	VDA SANTA RITA	KAREN ANDREA CANCHILA ORTIZ	1,005,664,374	09°44´26"	73°6´1"
30	VDA SANTA RITA	ADRIANA MICHEL AVILA ORTIZ	1,065,595,883	09°44´25"	73°6´1"
31	VDA SANTA RITA	UBALDER TRUJILLO HERNANDEZ	12,567,912	09°44´21"	73°5´55"
32	VDA SANTA RITA	KAROL DANIELA BARRETO ORTIZ	1,062,805,621	09°44´19"	73°6´25"
33	VDA SANTA RITA	MERLYN SAYID FERNANDEZ MARTINEZ	1,003,040,098	09°44´14"	73°6´32"
34	VDA SANTA RITA	ESNEIDER BERNAL	1,003,039,404	09°44´13"	73°6´32"
35	VDA SANTA RITA	ELIDA MARTINEZ	1,062,806,347	09°44´12"	73°6´40"
36	VDA SANTA RITA	SANDRA BERNAL	1,062,806,227	09°44´11"	73°6´40"
37	VDA SANTA RITA	JESUS ANDRES MARTINEZ	1,062,804,854	09°44´12"	73°6´40"
38	VDA SANTA RITA	WILMAR JESUS BERNAL	1,062,804,001	09°44´21"	73°6´42"
39	VDA SANTA RITA	ADELINA MARTINEZ	1,062,806,219	09°44´23"	73°6´38"
40	VDA SANTA RITA	JOSE ALFREDO BERNAL	1,062,806,219	09°44´19"	73°6´25"
41	VDA SANTA RITA	JOSE EDUARDO PEREZ	12,568,817	09°44´39"	73°6´43"
42	VDA SANTA RITA	JUAN DAVID BERNAL	1,062,805,898	09°44´28"	73°6´55"
43	VDA EL CENTRO	ADYS JULIETH SOLANO MARTINEZ	1,062,809,617	09°45´27"	73°08´04"
44	VDA EL CENTRO	FRANCISCO RAFAEL CARRANZA	19,601,856	09°45´29"	73°08´43"
45	VDA EL CENTRO	HERMELYS BERMUDEZ LAGO	1,065,562,315	09°45´37"	73°08´43"
46	VDA EL CENTRO	GUSTAVO ADOLFO ROJAS HINOJOSA	12,567,301	09°45´23"	73°08´23"
47	VDA EL CENTRO	ALEJANDRO VALDERRAMA MONTOYA	14,242,233	09°45´39"	73°08´42"
48	VDA EL CENTRO	TOMAS GREGORIO HINOJOSA SUAREZ	12,565,373	09°45´5"	73°08´4"
49	VDA EL CENTRO	EDUARDO TORREZ PEREZ	1,032,407,596	09°45´42"	73°08´56"
50	VDA EL CENTRO	ELIOSA JOSEFINA SUAREZ DE FUENTES	36,486,550	09°45´46"	73°08´52"
51	VDA EL CENTRO	CARLOS ARTURO RODRIGUEZ BOLAÑOS	5,049,107	09°45´47"	73°09´56"
52	VDA EL CENTRO	MARIA CAROLINA ARAGON DAZA	56,075,036	09°46´30"	73°09´10"
53	VDA EL CENTRO	JUAN ANDRES OROZCO	1,081,787,255	09°46´30"	73°09´11"
54	VDA EL CENTRO	MIGUEL ANGEL JIMENEZ OROZCO	12,566,445	09°45´1"	73°08´19"
55	VDA EL CENTRO	NUBIA ESTHER VASQUEZ OROZCO	49,687,635	09°46´15"	73°09´31"
56	VDA EL CENTRO	ANA DELINA PALACIO DE RIVERA	39,011,015	09°44´58"	73°08´19"
57	VDA EL CENTRO	GILBERTO DE LA CRUZ PALACIO MAESTRE	12,718,773	09°44´46"	73°08´5"
58	VDA EL CENTRO	ERASMO ANTONIO MOLINA MAESTRE	12,489,717	09°44´36"	73°07´42"
59	VDA EL CENTRO	ISMAEL DOMINGO FUENTES OROZCO	12,565,145	09°45´27"	73°08´4"
60	VDA EL CENTRO	EMILDA AMAYA DE VILLAMIZAR	36,489,447	09°45´25"	73°08´3"
61	VDA EL CENTRO	DELVIS ADELA OCHOA OROZCO	49,744,383	09°44´54"	73°08´27"
62	VDA EL CENTRO	DANIEL OROZCO MIELES	12,567,898	09°44´37"	73°08´44"
63	VDA EL CENTRO	YELIS JOHANA OROZCO MIELES	1,062,805,921	09°45´17"	73°08´54"
64	VDA EL CENTRO	MIGUEL ARMANDO OROZCO MIELES	12,568,350	09°45´26"	73°08´7"
65	VDA EL CENTRO	ERIK LICETH ENCISO VILLERO	1,003,039,161	09°45´30"	73°08´41"
66	VDA EL CENTRO	JUAN BENITO OROZCO DAZA	79,456,986	09°45´25"	73°08´36"
67	VDA EL CENTRO	PASCUAL PRIETO PARRADO	3,272,238	09°45´11"	73°08´18"
68	VDA EL CENTRO	CAMILO LACOUTURE	1,065,622,841	09°45´4"	73°08´18"
69	VDA EL CENTRO	SERGIO GREGORIO LACOUTURE LACOUTURE	80,415,637	09°45´1"	73°08´21"
70	VDA EL CENTRO	FRANCISCO LACOUTURE	80,423,212	09°45´38"	73°08´42"
71	VDA EL CENTRO	MARIA ELISA BELLO PALACIO	49,696,889	09°45´2"	73°08´18"
72	VDA EL CENTRO	LAURA LILIANA MANCILLA JAIMES	1,065,605,870	09°45´59"	73°08´20"
73	VDA EL CENTRO	MARIA ELOISA OROZCO	26,873,518	09°44´59"	73°9´8"

74	VDA EL CENTRO	DELSI LILIANA DIAZ ESTRADA	1,043,442,636	09°45´6"	73°9´34"
75	VDA EL CENTRO	MARIA DEL CARMEN NOTIEN OROZCO	1,062,814,347	09°45´3"	73°8´18"
76	VDA EL CENTRO	HERMES BERMUDEZ CAMARGO	77,005,327	09°45´2"	73°8´18"
77	VDA EL CENTRO	ERIK LICETH ENCISO VILLERO	1,003,039,161	09°45´8"	73°9´34"
78	VDA EL CENTRO	LILIA PEREZ GARCIA	26,872,612	09°45´50"	73°9´42"
79	VDA EL CENTRO	ETILVIA OROZCO	26,872,279	09°46´5"	73°9´30"
80	VDA EL CENTRO	ALDO PEREZ GARCIA	18,970,585	09°46´14"	73°9´34"
81	VDA EL CENTRO	ENEIDA MARIA PEREZ VIDES	49,744,369	09°45´58"	73°10´8"
82	VDA EL CENTRO	EVERT FRANCISCO GARCIA ARIAS	18,939,401	09°45´51"	73°10´16"
83	VDA EL CENTRO	ALVARO LACOUTURE FERNANDEZ	81,720,158	09°45´3"	73°8´19"
84	VDA EL CENTRO	YESENIA PEREZ SANDOVAL	49,610,311	09°45´1"	73°8´20"
85	VDA EL CENTRO	EDINSON PEREZ BOLAÑO	77,178,487	09°44´57"	73°8´23"
86	VDA EL CENTRO	YENIS ESTHER MENDOZA PEREZ	36,518,438	09°44´51"	73°8´15"
87	VDA EL CENTRO	LEONELA ISABEL MANJARREZ	1,064,707,353	09°45´15"	73°9´13"
88	VDA EL CENTRO	IMEL PEREZ GARCIA	18,934,137	09°45´7"	73°9´35"
89	VDA EL CENTRO	THOMAS PEREZ GARCIA	18,936,749	09°44´33"	73°8´32"
90	VDA EL CENTRO	YASMIL PEREZ GARCIA	49,685,496	09°44´32"	73°8´28"
91	VDA EL CENTRO	LIBARDO PEREZ GARCIA	12,565,687	09°44´34"	73°8´25"
92	VDA EL HATILLO	REINALDO FLORES BLANCO	12,687,178	9°45´37"	73°16´29"
93	VDA EL HATILLO	EDWARD JOAQUIN VILLARREAL CALDERON	77,153,290	9°45´51"	73°16´57"
94	VDA EL HATILLO	LEONEL ENRIQUE CAMPO PACHECO	77,033,837	9°45´45"	73°17´6"
95	VDA EL HATILLO	MARIELIS OVALLE DAZA	36,710,723	9°45´44"	73°16´52"
96	VDA EL HATILLO	SAUL VICENTE VEGA	5,165,426	9°46´10"	73°16´30"
97	VDA EL HATILLO	ARISTIDES JOSE ARIZA	8,280,390	9°46´26"	73°17´39"
98	VDA EL HATILLO	MANUEL ANTONIO ARIZA	8,263,439	9°48´49"	73°16´11"
99	VDA EL HATILLO	LACIDES JOSE VEGA OROZCO	5,164,711	9°45´37"	73°16´30"
100	VDA EL HATILLO	TERESITA ROMERO BAYONA	37,322,440	9°46´14"	73°17´48"

101	VDA EL HATILLO	WILLIAM ANTONIO VERGEL PACHECO	88,141,502	9°46´17"	73°17´53"
102	VDA EL HATILLO	ANDREA LORENA VERGEL ROMERO	1,091,666,148	9°46´57"	73°17´33"
103	VDA EL HATILLO	PABLO BONILLA	79,402,836	9°45´45"	73°16´29"
104	VDA EL HATILLO	LUIS GUILLERMO ALVAREZ NOVOA	12,522,228	9°45´54"	73°17'5"
105	VDA EL HATILLO	MANUEL IGNACIO MEZA	12,695,728	9°48´19"	73°16´13"
106	VDA EL HATILLO	EDINSON JOSE CORONEL DAZA	1,944,519	9°46´39"	73°17´48"
107	VDA SOKORPA	EVARISTO PEREZ RAMIREZ	12,566,067	9°46´18"	73°1´45"
108	VDA SOKORPA	VIRGINIA PEREZ RAMIREZ	49,610,139	9°46´16"	73°1´45"
109	VDA SOKORPA	CRISTIAN SANTIAGO JIMENEZ PEREZ	1,003,038,834	9°46´17"	73°1´46"
110	VDA SOKORPA	MARLENE CAPITAN MARQUEZ	1,003,040,141	9°46´17"	73°1´46"
111	VDA SOKORPA	PATRICIA CAPITAN BARRETO	1,003,039,938	9°46´17"	73°1´46"
112	VDA SOKORPA	ARGENIS MARTINEZ FERNANDEZ	1,003,040,106	9°46´17"	73°1´47"
113	VDA SOKORPA	JOSE EDWARD PEREZ CAPITAN	1,003,040,062	9°46´16"	73°1´46"
114	VDA SOKORPA	LAURA GONZALEZ PEREZ	49,610,153	9°46´17"	73°1´47"
115	VDA SOKORPA	KEILA PEREZ HERNANDEZ	1,062,811,738	9°46´17"	73°1´47"
116	VDA SOKORPA	LUIS ANGEL SANCHEZ GONZALEZ	1,062,811,910	9°46´17"	73°1´48"
117	VDA SOKORPA	OSCAR JOSE CAPITAN GONZALEZ	1,193,601,906	9°46´17"	73°1´48"
118	VDA SOKORPA	DUVAN MARTINEZ GONZALEZ	1,003,039,872	9°46´17"	73°1´48"
119	VDA SOKORPA	ALBEIRO FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,003,038,191	9°46´16"	73°1´48"
120	VDA SOKORPA	MARBELIS PEREZ PEREZ	1,193,151,166	9°46´16"	73°1´47"
121	VDA SOKORPA	ALFREDO GONZALEZ PEREZ	1,062,804,442	9°46´16"	73°1´47"
122	VDA SOKORPA	MARTHA BOHORQUEZ MARTINEZ	49,744,323	9°46´16"	73°1´48"
123	VDA SOKORPA	REYES JAVIER VELA VILLALOBOS	82,392,363	9°46´16"	73°1´48"

124	VDA SOKORPA	CARLOS JESUALDO PEREZ CAPITAN	1,062,804,336	9°46´16"	73°1´48"
125	VDA SOKORPA	JOSE ROBERTO PEREZ JIMENEZ	1,151,482,119	9°46´16"	73°1´48"
126	VDA SOKORPA	JOSE FRANCISCO CAPITAN ALVAREZ	12,566,073	9°46´16"	73°1´48"
127	VDA SOKORPA	MERCEDES CAPITAN LOPEZ	49,610,146	9°46´16"	73°1´48"
128	VDA SOKORPA	MARIA ISABEL CAPITAN MARTINEZ	1,003,038,009	9°46´16"	73°1´48"
129	VDA SOKORPA	LUIS ORLEY PEREZ CAPITAN	1,003,038,684	9°46´15"	73°1´47"
130	VDA SOKORPA	MARIA ESPERANZA PEREZ SANCHEZ	1,003,039,284	9°46´16"	73°1´48"
131	VDA SOKORPA	LAURA MARCELA RODRIGUEZ PEREZ	1,062,806,375	9°46´19"	73°1´49"
132	VDA SOKORPA	LUIS EDUARDO CAPITAN MARTINEZ	1,003,040,393	9°46´15"	73°1´49"
133	VDA SOKORPA	JHON FREDY PEREZ RAMIREZ	1,003,040,006	9°46´15"	73°1´49"
134	VDA SOKORPA	ELENA PATRICIA GONZALEZ FERNANDEZ	*1,003,040,271*	9°46´15"	73°1´49"
135	VDA SOKORPA	MARUCHA MARTINEZ GONZALEZ	1,003,038,135	9°46´15"	73°1´48"
136	VDA SOKORPA	FARID LEONARDO CAPITAN MARTINEZ	1,062,804,892	9°46´15"	73°1´47"
137	VDA SOKORPA	JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREZ	1,062,804,502	9°46´15"	73°1´48"
138	VDA SOKORPA	LIZETH PEREZ GONZALEZ	1,003,040,043	9°46´14"	73°1´48"
139	VDA SOKORPA	NICOLAS GARCIA RODRIGUEZ	12,568,784	9°46´14"	73°1´48"
140	VDA SOKORPA	GLORIA LOPEZ MARTINEZ	49,744,332	9°46´13"	73°1´49"
141	VDA SOKORPA	EDINSON DE JESUS GARCIA MARTINEZ	1,151,482,121	9°46´14"	73°1´49"
142	VDA SOKORPA	LUIS JOSE LOPEZ BERNAL	1,062,815,331	9°46´13"	73°1´49"
143	VDA SOKORPA	LUIS CARLOS LOPEZ FERNANDEZ	12,567,568	9°46´13"	73°1´50"
144	VDA SOKORPA	JOSE GREGORIO QUIROZ CAPITAN	1,062,805,236	9°46´12"	73°1´52"
145	VDA SOKORPA	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ CAPITAN	1,062,806,156	9°46´11"	73°1´53"
146	VDA SOKORPA	DARLYS JULIANA CAPITAN MARTINEZ	1,003,039,894	9°46´12"	73°1´53"
147	VDA SOKORPA	CORNELIO CAPITAN MARTINEZ	1,003,040,013	9°46´12"	73°1´54"
148	VDA SOKORPA	ADRIELA OSORIO BERNAL	1,003,038,144	9°46´11"	73°1´53"
149	VDA SOKORPA	SANDRA AMALIA PEREZ MARTINEZ	1,003,040,047	9°46´12"	73°1´57"
150	VDA SOKORPA	ROBINSON DE JESUS CAPITAN BOHORQUEZ	1,003,040,139	9°46´12"	73°1´58"
151	VDA SOKORPA	LISAIDA CAPITAN MARTINEZ	1,003,040,026	9°46´12"	73°1´58"
152	VDA SOKORPA	MARIA ANGELICA SANCHEZ GONZALEZ	1,062,808,583	9°46´12"	73°1´58"
153	VDA SOKORPA	VERONICA MARTINEZ PEREZ	1,003,039,875	9°46´12"	73°1´58"
154	VDA SOKORPA	PATRICIA QUINTERO HERNANDEZ	1,003,040,280	9°46´13"	73°1´58"
155	VDA SOKORPA	LETICIA CAPITAN FERNANDEZ	49,744,335	9°46´12"	73°1´59"
156	VDA SOKORPA	JOSE RAFAEL BERNAL QUINTERO	1,003,040,221	9°46´12"	73°1´59"
157	VDA SOKORPA	LILIANA PATRICIA BERNAL QUINTERO	1,066,864,084	9°46´11"	73°1´59"
158	VDA SOKORPA	MAIRA MILENA CAPITAN SANCHEZ	1,062,804,170	9°46´12"	73°2´0"
159	VDA SOKORPA	KEINER ANDRES CAPITAN SANCHEZ	1,062,806,247	9°46´15"	73°2´2"
160	VDA SOKORPA	WEIMAR DE JESUS QUIROZ CAPITAN	1,062,807,195	9°46´15"	73°2´2"
161	VDA SOKORPA	MARIA CELINA CAPITAN MARQUEZ	49,610,214	9°45´54"	73°1´37"
162	VDA SOKORPA	ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO	49,748,586	9°46´40"	73°1´45"
163	VDA SOKORPA	YOINER DE JESUS FIGUEROA PAREJO	1,062,811,179	9°46´41"	73°1´31"
164	VDA SOKORPA	LUCELLYS GONZALEZ SANCHEZ	1,062,805,086	9°46´55"	73°1´20"
165	VDA SOKORPA	LUZ MILA PEREZ CAPITAN	1,062,805,255	9°47´4"	73°1´37"
166	VDA SOKORPA	DEIFAN CAPITAN GONZALEZ	1,193,008,240	9°46´31"	73°5´17"
167	VDA SOKORPA	GILBERTO RODRIGUEZ LOPEZ	1,003,038,001	9°46´24"	73°5´28"
168	VDA SOKORPA	LUIS CARMELO CAPITAN SANCHEZ	1,062,804,127	9°46´27"	73°5´37"
169	VDA SOKORPA	EDWIND DE JESUS PEREZ MARTINEZ	1,062,807,524	9°46´27"	73°5´37"
170	VDA SOKORPA	ANGEL EULER PEREZ MARTINEZ	1,062,807,524	9°46´2"	73°5´23"
171	VDA SOKORPA	MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ	49,610,145	9°46´2"	73°5´21"
172	VDA SOKORPA	SERGIO LUIS MUÑOZ AVILA	12,568,746	9°45´57"	73°5´8"
173	VDA SOKORPA	CLAUDIA DAMARIS PEREZ MARTINEZ	1,062,804,923	9°45´56"	73°5´9"

174	VDA SOKORPA	JHON RONALDO CAPITAN MARTINEZ	1,062,806,540	9°45´56"	73°5´9"
175	VDA SOKORPA	JORGE LEONEL RODRIGUEZ LOPEZ	12,568,485	9°45´50"	73°5´9"
176	VDA SOKORPA	AURELIANA BERNAL GARCIA	1,062,804,048	9°45´47"	73°5´11"
177	VDA SOKORPA	LUIS ALBERTO OSORIO BERNAL	1,003,039,854	9°45´42"	73°5´4"
178	VDA CANAIMA	DAYANA HERNANDEZ AMARIZ	36,451,547	9°42´27"	73°11´50"
179	VDA CANAIMA	PAYO GUACANEME MANJARREZ	77,152,088	9°42´21"	73°11´51"
180	VDA CANAIMA	LUIS FERNANDO MACHADO QUIROZ	12,567,806	9°42´22"	73°11´39"
181	VDA CANAIMA	VDA ASATAPO	1,067,719,620	9°42´30"	73°11´30"
182	VDA SOCOMBA	VDA KOSARI	12,578,895	9°41'53"	73°11'7"
183	VDA SOCOMBA	MARITZA SARABIA MANDON	37,327,078	9°41'55"	73°11'7"
184	VDA SOCOMBA	LEONOR GARCIA VERGARA	1,003,039,370	9°41'55"	73°11'4"
185	VDA SOCOMBA	OSCAR ENRIQUE PACHECO MARTINEZ	18,935,669	9°41'56"	73°11'5"
186	VDA MANANTIALES ALTO	FABIO SUAREZ CARCAMO	12,566,212	9°38´57"	73°7´28"
187	VDA MANANTIALES ALTO	CARMEN RAMOS	49,744,354	9°38´56"	73°7´26"
188	VDA MANANTIALES ALTO	JOSE DEL CARMEN BARRETO	5,067,580	9°38´56"	73°7´27"
189	VDA MANANTIALES ALTO	CARLOS FRAGOZO ROMERO	12,717,299	9°38´55"	73°7´27"
190	VDA MANANTIALES ALTO	URVEYS MENDOZA	84,070,411	9°39´44"	73°7´3"
191	VDA MANANTIALES ALTO	ROBINSON SARABIA	12,568,436	9°39´38"	73°6´37"
192	VDA MANANTIALES ALTO	JOSE ALBERTO ARMENTA CRUZ	77,095,142	9°40´11"	73°8´51"
193	VDA SANTA CECILIA	SENEN MOJICA MIRANDA	12,565,711	9°39´28"	73°15´34"
194	VDA SANTA CECILIA	JOSE TRINIDAD ARENGAS LOPEZ	5,087,440	9°39´15"	73°15´43"
195	VDA SANTA CECILIA	VICTOR ENRIQUE IGUARAN MARRUGO	1,062,806,826	9°39´50"	73°15´31"
196	VDA SANTA CECILIA	ARIEL VALLE	4,975,172	9°40´3"	73°15´24"
197	VDA SANTA CECILIA	DARWIN ORTEGA RODRÍGUEZ	1,062,806,606	9°40´7"	73°16´12"
198	VDA SANTA CECILIA	RAQUEL MORAMAY TORRES AMAYA	49,744,010	9°39´57"	73°16´5"
199	VDA SANTA CECILIA	DIONANGEL DONADO	77,036,973	9°39´56"	73°16´6"
200	VDA SANTA CECILIA	HÉCTOR FAVIO PÁEZ OLAYA	86,004,837	9°40´5"	73°16´11"
201	VDA SANTA CECILIA	FABIO SIERRA JINETTE	1,062,808,689	9°40'3"	73°15'54"
202	VDA SANTA CECILIA	MELVA NIEVES	26,872,983	9°40'5"	73°15'53"

203	VDA SANTA CECILIA	FRANCISCO HERNÁNDEZ	50,887,972	9°40´5"	73°15´54"
204	VDA SANTA CECILIA	JAIME JOSÉ MEJÍA CASTRO	73,129,972	9°40´5"	73°16´11"
205	VDA SANTA CECILIA	LIRIS CASTILLEJO MEJÍA	49,744,461	9°39´43"	73°16´19"
206	VDA SANTA CECILIA	GEILER OSORIO CASTILLEJO	10,622,804,379	9°39´37"	73°16´18"
207	VDA SANTA CECILIA	ELIZABETH MANOTAS ARIAS	1,003,038,606	9°39´29"	73°16´1"
208	VDA SANTA CECILIA	DILBERT SMIT MANOTAS	1,062,812,889	9°39´26"	73°16´3"
209	VDA SANTA CECILIA	JOSE ORTIZ	19,518,826	9°39´21"	73°16´6"
210	VDA ESMERALDA	OSMELIA BARRETO CASTRO	49,744,135	9°39´29"	73°15´34"
211	VDA ESMERALDA	JULIO PIZARRO	7,591,075	9°39´50"	73°15´31"
212	VDA SIKAKAO	MARTIN ALONSO GONZALEZ PEREZ	1,062,804,427	9°42'46"	73°3'41"
213	VDA SIKAKAO	PROSPERO SANCHEZ PEREZ	1,193,600,146	9°42'45"	73°3'41"
214	VDA SIKAKAO	JUAN GILBERTO GARCIA	1,062,805,110	9°42'46"	73°3'43"
215	VDA SIKAKAO	ROGELIO BARRAS PEREZ	1,062,805,069	9°42'45"	73°3'42"
216	VDA SIKAKAO	LUIS JEIDER GONZALEZ SANCHEZ	1,062,805,087	9°42'45"	73°3'43"
217	VDA SIKAKAO	SANDRA VANESSA GARCERANT GONZALEZ	1,062,804,284	9°42'45"	73°3'43"
218	VDA SIKAKAO	ANDRES RONALDO SANCHEZ CAPITAN	1,062,804,284	9°42'44"	73°3'43"
219	VDA SIKAKAO	LUZ ANGELA CAPITAN MARQUEZ	1,003,037,981	9°42'44"	73°3'42"
220	VDA SIKAKAO	MARTHA CECILIA SANCHEZ GONZALEZ	1,003,040,447	9°42'44"	73°3'43"
221	VDA TOCORE	YERSON RENÉ SARABIA NAVARRO	1,062,807,790	9°49'53"	73°58'15"
222	VDA TOCORE	CARMEN ROSA AVILA CARDONA	1,062,812,200	9°49'58"	73°58'15"
223	VDA TOCORE	*WILGEN GUERRERO RESTREPO*	1,193,097,823	9°49'53"	73°58'16"

224	VDA CAÑO RODRIGO	SANTANDER PEREZ	84,042,152	9°42´36"	73°9´57"
225	VDA CAÑO RODRIGO	SONIA RODRIGUEZ	1,004,278,840	9°42´41"	73°10´12"
226	VDA CAÑO RODRIGO	ALFONSO RAFAEL RODRIGUEZ ALFARO	77,023,615	9°42´41"	73°10´13"
227	VDA CAÑO RODRIGO	JESUS EDUARDO CASTILLO ZULETA	17,990,451	9°42´45"	73°10´26"
228	VDA CAÑO RODRIGO	NELLY ISABEL SEGUANE CAMPÓ	42,401,032	9°43´26"	73°10´32"
229	VDA CAÑO RODRIGO	ANA MILENA SEGUANE CAMPO	1,094,831,013	9°43´22"	73°10´21"
230	VDA CAÑO RODRIGO	OSCAR PACHECO	18,935,669	9°43´3"	73°10´1"
231	VDA CAÑO RODRIGO	JOSE ARAGON ROMERO	12,568,949	9°43´18"	73°9´49"
232	VDA CAÑO RODRIGO	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ PINTO	1,065,586,423	9°43´25"	73°9´46"
233	VDA EL PORVENIR	RUTH OÑATE	36,488,902.00	9°44´1"	73°27´15"
234	VDA EL PORVENIR	JAMIN OÑATE	77,175,573	9°44´8"	73°27´16"
235	VDA EL PORVENIR	CARLOS GUERRA	1,067,818,792	9°43´58"	73°27´16"
236	VDA EL PORVENIR	ALEJANDRO MEJIA	18,934,536	9°43´52"	73°27´13"
237	VDA EL PORVENIR	LUIS OÑATE	17,841,544	9°43´50"	73°27´16"
238	VDA EL PORVENIR	EUCLIDES GONZALEZ	77,153,636	9°43´49"	73°27´13"
239	VDA EL PORVENIR	OSMAIRA GONZALEZ	36,495,648	9°43´49"	73°27´13"
240	VDA EL PORVENIR	JOSE MANUEL GONZALEZ	12,566,245	9°43´42"	73°27´15"
241	VDA EL PORVENIR	LAUDINA GONZALEZ	37,710,545	9°43´41"	73°27´13"
242	VDA EL PORVENIR	CARMEN PEREZ	49,691,594	9°43´35"	73°27´14"
243	VDA EL PORVENIR	INGRIS GAMEZ	26,996,822	9°43´34"	73°27´13"
244	VDA EL PORVENIR	WILSON SIMANCA	18,956,880	9°43´35"	73°27´15"
245	VDA EL PORVENIR	ANA GREGORIA MACHADO	36,489,703	9°43´30"	73°27´16"
246	VDA EL PORVENIR	NELFA PEREZ	49,689,988	9°43´29"	73°27´15"
247	VDA EL PORVENIR	LUIS PEREZ	1,067,712,738	9°43´29"	73°27´16"
248	VDA EL PORVENIR	OLBER ATENCIO	77,156,511	9°43´23"	73°27´15"
249	VDA EL PORVENIR	ALCIDES QUINTERO	77,036,661	9°43´12"	73°27´15"
250	VDA EL PORVENIR	MARTHA RAMIREZ	49,686,078	9°43´13"	73°27´12"
251	VDA EL PORVENIR	AIDA GALEZO	49,692,839	9°43´6"	73°27´15"
252	VDA EL PORVENIR	ELIZABETH MEJIA	49,685,775	9°43´3"	73°27´13"
253	VDA EL PORVENIR	RAFAEL RAMIREZ	18,938,300	9°43´3"	73°27´14"
254	VDA EL PORVENIR	JOSEFINA PACHECO	49,689,234	9°43´2"	73°27´11"
255	VDA EL PORVENIR	ASTRID OÑATE	26,870,273	9°42´55"	73°27´14"
256	VDA EL PORVENIR	AGUSTINA FLOREZ	49,685,524	9°42´52"	73°27´13"
257	VDA EL PORVENIR	RICARDO MEJIA	18,937,085	9°43´28"	73°27´46"
258	VDA EL PORVENIR	SAID MEJIA	18,939,172	9°43´0"	73°25´55"
259	VDA EL PORVENIR	ARQUIMEDES DE LEON	12,410,217	9°42´54"	73°25´43"
260	VDA EL PORVENIR	ANDERSON SIMANCA MEJIA	77,159,422	9°42´54"	73°25´43"
261	VDA NUEVA MERCEDES	GASCON	7,597,877	9°44´57"	73°13´1"
262	VDA NUEVA MERCEDES	MARIA BERTEL	26,827,104	9°45´10"	73°13´17"
263	VDA NUEVA MERCEDES	MOISES ARIAS ARIAS	79,524,501	9°45´8"	73°13´20"
264	VDA NUEVA MERCEDES	DANIEL AGUSTIN ARIAS ARIAS	77,011,486	9°45´7"	73°13´24"
265	VDA NUEVA MERCEDES	JHON ALBEIRO CHAVEZ	1,062,807,321	9°45´15"	73°13´28"
266	VDA NUEVA MERCEDES	JOSE RAFAEL ARIAS MARIN	12,568,493	9°45´15"	73°13´23"
267	VDA NUEVA MERCEDES	ALVARO ARIAS ARIAS	12,567,934	9°45´58"	73°12´50"
268	VDA NUEVA MERCEDES	JORGE ELIECER GUACANEME	1,694,087	9°46´6"	73°12´56"
269	VDA NUEVA MERCEDES	YEINIS ARIAS TORRES	1,062,809,191	9°46´7"	73°12´46"
270	VDA NUEVA MERCEDES	ALCIDES MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	1,062,813,763	9°45´50"	73°12´22"
271	VDA NUEVA MERCEDES	EVER MENDOZA	1,062,811,326	9°45´46"	73°12´13"
272	VDA NUEVA MERCEDES	ABNER TORRES	1,062,809,127	9°45´56"	73°12´11"
273	VDA NUEVA MERCEDES	JAIME ESCORCIA (PADRE)	4,988,926	9°46´4"	73°12´2"

274	VDA NUEVA MERCEDES	JAIME ESCORCIA (HIJO)	77,158,297	9°46´9"	73°11´55"
275	VDA NUEVA MERCEDES	MEDARDO RODRIGUEZ	18,932,935	9°46´19"	73°11´49"
276	VDA NUEVA MERCEDES	EDWIN TORRES	12,568,896	9°46´22"	73°11´56"
277	VDA NUEVA MERCEDES	EDGARDO TORRES	1,003,038,618	9°46´35"	73°11´31"
278	VDA NUEVA MERCEDES	JORGE MALO	1,118,842,712	9°46´7"	73°11´44"
279	VDA NUEVA MERCEDES	GLADYS PIANETTA	49,728,652	9°46´3"	73°11´34"
280	VDA NUEVA MERCEDES	JUAN DURAN	12,488,575	9°46´0"	73°11´34"
281	VDA NUEVA MERCEDES	ELIAS PACHECO	12,566,131	9°45´48"	73°11´40"
282	VDA NUEVA MERCEDES	ALFONSO MORA PEREZ	12,566,319	9°45´14"	73°11´47"
283	VDA NUEVA MERCEDES	JAIDER BAYONA	1,079,936,578	9°44´16"	73°12´36"
284	VDA NUEVA MERCEDES	JOSE ANTONIO ARIAS	12,502,611	9°44´15"	73°12´36"
285	VDA NUEVA MERCEDES	SARA	22,531,516	9°44´15"	73°12´35"
286	VDA NUEVA MERCEDES	CAMARIEL	6,632,301	9°43´58"	73°13´19"
287	VDA NUEVA MERCEDES	OCTAVIO GOMEZ	12,565,598	9°43´46"	73°13´37"
288	VDA NUEVA MERCEDES	JUAN MARRIAGA PACHECO	19,515,598	9°44´1"	73°13´50"
289	VDA NUEVA MERCEDES	NAIN PEREZ	77,154,764	9°44´9"	73°14´0"
290	VDA NUEVA MERCEDES	MEREDITH CABARCA	26,876,393	9°44´20"	73°14´2"
291	VDA NUEVA MERCEDES	JOSE HIGUERA	35,005,051	9°45´2"	73°13´47"
292	VDA IPIKA	NORMA JIMENEZ ROMERO	1,062,806,081	9°44´18"	73°10´41"
293	VDA IPIKA	YEISON URIBE JIMENEZ	1,131,006,097	9°44´17"	73°10´41"
294	VDA IPIKA	CARLOS DAN ROMERO JIMENEZ	1,000,040,124	9°44´17"	73°10´42"
295	VDA IPIKA	KEINER	1,079,936,578	9°44´7"	73°10´52"
296	VDA IPIKA	JANER OSORIO BERNAL	19,586,322	9°44´2"	73°10´55"
297	VDA IPIKA	JHON JAIRO QUIROZ RODRIGUEZ	1,193,111,538	9°44´1"	73°10´55"
298	VDA IPIKA	TITO JOSE ROCHA PATIÑO	1,193,151,170	9°44´2"	73°10´58"
299	VDA IPIKA	DONALDO ALFONSO SANCHEZ	73,315,012	9°44´2"	73°10´59"
300	VDA IPIKA	CARLOS DARI CONTRERAS FERNANDEZ	1,003,038,961	9°44´3"	73°11´0"
301	VDA IPIKA	KISON DAIR CONTRERAS FERNANDEZ	1,062,804,175	9°44´3"	73°11´0"
302	VDA IPIKA	EVELIO VARELA	35,005,051	9°44´2"	73°10´59"
303	VDA IPIKA	LUIS ANGEL ROHA PATIÑO	1,003,040,008	9°44´3"	73°11´0"
304	VDA IPIKA	JHON JAIDER MIRANDA MAESTRE	84,009,920	9°44´2"	73°11´0"
305	VDA IPIKA	YERSON URIBE JIMENEZ	1,003,049,120	9°44´1"	73°11´0"
306	VDA IPIKA	GUSTAVO SURMAY	19,768,266	9°44´2"	73°11´1"
307	VDA IPIKA	FRANCISCO ANTONIO	12,567,619	9°44´3"	73°11´1"
308	VDA IPIKA	MARBEL AVILA ANGARITA	1,003,038,627	9°44´2"	73°11´1"
309	VDA IPIKA	VICTOR ELIAS AVILA FLORES	12,563,126	9°44´1"	73°11´1"
310	VDA IPIKA	RODOLFO AVILA ANGARITA	1,003,038,639	9°44´2"	73°11´2"
311	VDA IPIKA	HERNANDO MENDOZA PATIÑO	35,005,077	9°44´2"	73°11´2"
312	VDA IPIKA	WILSON AVILA GONZALEZ	1,062,808,747	9°44´3"	73°11´2"
313	VDA IPIKA	WENDY AVILA GONZALEZ	1,062,805,275	9°44´3"	73°11´2"
314	VDA IPIKA	ZENAIDA QUIROZ MONTECRISTO	1,003,039,922	9°44´3"	73°11´2"
315	VDA IPIKA	EDWIN JOSE ROCHA TORRES	1,062,804,015	9°44´3"	73°11´2"
316	VDA IPIKA	CARLOS JIMENEZ TORRES	1,062,805,143	9°44´3"	73°11´3"
317	VDA IPIKA	MILEIDYS CAROLINA SOCARRAS MARTINEZ	1,062,805,368	9°44´2"	73°11´3"
318	VDA IPIKA	WILFRIDO PEREIRA ALTAMAR	7,151,938	9°44´2"	73°11´3"
319	VDA IPIKA	ARGENIS PEDROZO QUIROZ	1,003,039,445	9°44´0"	73°11´3"
320	VDA IPIKA	DEIMER PEDROZO QUIROZ	1,193,111,647	9°44´1"	73°11´3"
321	VDA IPIKA	LORENA PEDROZO QUIROZ	1,193,111,661	9°44´1"	73°11´4"
322	VDA IPIKA	WENDY MARIA RODRIGUEZ	45,775,470	9°44´1"	73°11´4"
323	VDA IPIKA	INGRIS SUJEY QUIROZ RODRIGUEZ	1,003,039,910	9°44´0"	73°11´4"

324	VDA IPIKA	ANDRES ALFONSO PEDROZO QUIROZ	1,062,809,951	9°44´1"	73°11´4"
325	VDA IPIKA	CARLOS DANIEL JIMENEZ ROMERO	12,592,147	9°44´1"	73°11´4"
326	VDA IPIKA	JOSE LUIS QUIROZ MONTECRISTO	12,569,228	9°43´48"	73°11´27"
327	VDA IPIKA	DINA LUZ CAPITAN GONZALEZ	1,062,806,197	9°43´48"	73°11´28"
328	VDA IPIKA	JULIO ENRIQUE QUIROZ MONTECRISTO	1,193,233,673	9°43´56"	73°10´59"
329	VDA IPIKA	INGRIS PAOLA QUIROZ MONTECRISTO	1,003,039,981	9°43´56"	73°11´0"
330	VDA IPIKA	ANGELICA QUIROZ MONTECRISTO	1,003,039,917	9°43´56"	73°11´2"
331	VDA IPIKA	KELAN ANDRES GARCIA QUIROZ	1,062,805,596	9°44´36"	73°10´30"
332	VDA MERIKA	ALONSO CAPITAN VALENCIA	1,082,250,055	9°44'9"	73°3'51"
333	VDA MERIKA	MARTIN CAPITAN RODRIGUEZ	1,081,907,214	9°44'11"	73°3'53"
334	VDA MERIKA	LUIS ENRIQUE CAPITAN MONTECRISTO	1,004,278,778	9°44'9"	73°3'52"
335	VDA MERIKA	EDWIN CAPITAN MONTECRISTO	85,484,055	9°44'9"	73°3'53"
336	VDA MERIKA	MARTIN CAPITAN MONTECRISTO	85,005,059	9°44'9"	73°3'54"
337	VDA MERIKA	OMAR CAPITAN MONTECRISTO	85,005,087	9°44'8"	73°3'53"
338	VDA SAN GENARO	BETSI LILIANA JIMENEZ QUIROZ	1,082,249,666	9°46´11"	73°04´39"
339	VDA SAN GENARO	MILEIDIDS TORRES MARTINEZ	36,728,757	9°46´39"	73°4´52"
340	VDA SAN GENARO	MARINA MARTINEZ JIMENEZ	1,128,144,121	9°47´1"	73°5´25"
341	VDA SAN GENARO	WILMAR MAESTRE TORRES	9,875,789	9°47´4"	73°5´19"
342	VDA SAN GENARO	EDWARD SIERRA OCHOA	77,153,667	9°47´4"	73°5´20"
343	VDA SAN GENARO	DANIELA TORRES MARTINEZ	57,450,966	9°47´5"	73°5´20"
344	VDA SAN GENARO	DAVINSON RESTREPO FERNANDEZ	73,315,012	9°47´2"	73°5´19"
345	VDA SAN GENARO	DIANA EDITH MARTINEZ ESPITIA	1,128,108,706	9°47´2"	73°5´19"
346	VDA SAN GENARO	MARIA FERNANDA NAVARRO	57,450,966	9°47´5"	73°5´20"
347	VDA SAN GENARO	TENIS OMAIRA ZAMBRANO CAPITAN	1,128,109,330	9°47´7"	73°5´17"
348	VDA SAN GENARO	LUIS LEONEL ZAMBRANO CAPITAN	72,045,355	9°46´24"	73°5´28"
349	VDA SAN GENARO	KAKET DARIO JIMENEZ MAESTRE	1,128,107,120	9°46´16"	73°5´34"
350	VDA SAN GENARO	GERALDIN TORRES RAMIREZ	1,128,109,330	9°46´3"	73°5´21"
351	VDA SAN GENARO	ELSI CABALLERO	1,128,106,336	9°45´57"	73°5´8"
352	VDA SAN GENARO	ALBEIRO DE JESUS JIMENEZ	1,062,805,386	9°45´56"	73°5´9"
353	VDA SAN GENARO	MARIELA GARCIA TORRES	1,003,038,015	9°45´56"	73°5´8"
354	VDA SAN GENARO	YEINER DE JESUS GONZALEZ GARCIA	19,596,415	9°45´50"	73°5´9"
355	VDA SAN GENARO	KENDRI LORENA GONZALEZ GARCIA	1,062,804,345	9°45´43"	73°5´4"
356	VDA SAN GENARO	NORALBA CAPITAN ROMERO	1,003,040,379	9°47´2"	73°4´12"
357	VDA SAN GENARO	EVA SANDRITH SIERRA RESTREPO	1,128,106,336	9°45´34"	73°2´45"
358	VDA SAN GENARO	ESTHER CABALLERO	1,193,210,589	9°45´29"	73°2´50"
359	VDA KUYA	TENNIS TORRES GONZALEZ	1,128,109,572	9°45'7"	73°10'2"
360	VDA KUYA	DUVEINIS FERNANDEZ GONZALEZ	1,193,210,589	9°45'7"	73°10'21"
361	VDA KUYA	JANETH TORRES GONZALEZ	57,403,848	9°45'7"	73°10'21"
362	VDA KUYA	ALEXANDER VALDERRAMA MENDOZA	1,134,329,207	9°45'8"	73°10'21"
363	VDA KUYA	FIDEL QUIROZ MONTECRISTO	1,003,040,320	9°45'8"	73°10'22"
364	VDA KUYA	ILVER QUIROZ MONTECRISTO	1,003,040,387	9°45'8"	73°10'22"
365	VDA KUYA	JENNIS PAOLA RODRIGUEZ	1,062,807,192	9°45'9"	73°10'22"
366	VDA KUYA	SUGEY CRISTINO QUIROZ	1,062,806,444	9°45'9"	73°10'22"
367	VDA MAYORIA	VIARNOL HERNANDEZ MARTINEZ	9,876,529	9°42'38"	73° 5'7"
368	VDA MAYORIA	JESUS ORLEY HERNANDEZ MARTINEZ	1,723,281	9°42'39"	73° 5'7"
369	VDA MAYORIA	JOSE MANUEL HERNANDEZ BARRETO	7,597,928	9°42'39"	73° 5'6"
370	VDA MAYORIA	HERNANDO HERNANDEZ	72,306,087	9°42'40"	73° 5'6"
371	VDA MAYORIA	ELKIN MARTINEZ	1,081,787,999	9°42'41"	73° 5'2"
372	VDA MAYORIA	ABEL MARTINEZ HERNANDEZ	72,052,949	9°42'42"	73° 5'8"
373	VDA PEÑAS	LUIS CARLOS QUINTERO QUIROZ	7,593,882	9°44'20"	73°4'22"

374	VDA PEÑAS	YEISON DAVID QUERUBIN QUINTERO	7,597,940	9°44'22"	73°4'18"
375	VDA PEÑAS	LUIS REINALDO QUINTERO QUERUBIN	1,083,032,119	9°44'19"	73°3'59"
376	VDA PEÑAS	CLEIBIS QUERUBIN QUINTERO	9,877,729	9°44'19"	73°3'58"
377	VDA PEÑAS	JAIDER ANDRES QUINTERO RODRIGUEZ	9,877,846	9°44'11"	73°3'53"
378	VDA PEÑAS	ROSALBA HERNANDEZ	57,403,894	9°44'9"	73°3'51"
379	VDA PEÑAS	LEIDYS PAOLA MARTINEZ	1,128,107,079	9°44'9"	73°3'52"
380	VDA PEÑAS	FABIO HERNANDEZ QUINTERO	1,151,187,275	9°44'9"	73°3'53"
381	VDA PEÑAS	DORA HERNANDEZ	1,004,120,818	9°44'8"	73°3'53"
382	VDA PEÑAS	LIBIA QUINTERO HERNANDEZ	44,159,397	9°44'10"	73°3'53"
383	VDA PEÑAS	NORA LILIBETH MENDEZ	57,306,458	9°44'9"	73°3'54"
384	VDA PEÑAS	KELLY MENDEZ QUINTERO	57,305,435	9°44'29"	73°3'44"
385	VDA PEÑAS	LUIS DANIEL QUINTERO HERNANDEZ	19,563,104	9°44'30"	73°3'44"
386	VDA ASATAPO	LUZ ESTHER HERNANDEZ RESTREPO	57,305,422	9°46'10"	73°10'6"
387	VDA ASATAPO	DEIVIS PAOLA MARTINEZ HERNANDEZ	1,065,129,768	9°46'25"	73°10'11"
388	VDA ASATAPO	LUZ ANGELINA BERNAL MARTINEZ	36,453,090	9°46'47"	73°9'48"
389	VDA ASATAPO	YULEIDIS BARRERA	1,081,797,027	9°46'20"	73°9'50"
390	VDA KOSARI	WILMER HERNANDEZ	1,081,811,629	9°50'19"	73°58'7"
391	VDA KOSARI	WILSON HERNANDEZ	19,587,956	9°50'37"	73°57'52"
392	VDA KOSARI	JOSE VICENTE HERNANDEZ	1,082,981,420	9°49'56"	73°58'21"
393	VDA KOSARI	WILLIAM HERNANDEZ	1,131,005,665	9°49'56"	73°58'22"
394	VDA CAPIHUARA	YAJAIRA DEL CARMEN ARRIETA SIERRA	49,689,759	9°44'36"	73°15'5"
395	VDA CAPIHUARA	GABRIEL DARIO SERNA GOMEZ	18,939,826	9°44'37"	73°14'44"
396	VDA CAPIHUARA	JESUS SALAS	1,067,722,609	9°44'52	73°14'53"
397	VDA CAPIHUARA	MYRIAN FUENTES	49,758,530	9°45'11"	73°16'10"
398	VDA CAPIHUARA	CARLOTA HERRERA	49,735,629	9°45'13"	73°15'35"
399	VDA CAPIHUARA	PABLO BONILLA	79,402,836	9°45'15 "	73°16'26"
400	VDA CAPIHUARA	JHON SANCHEZ	77,034,989	9°45'20"	73°15'36"
401	VDA CAPIHUARA	ALVARO GARCIA	77,015,333	9°45'08"	73°15´38 "
402	VDA CAPIHUARA	YARLEDYS OLAYA	1,126,241,174	9°45'6"	73°15'16"
403	VDA CAPIHUARA	ISIDRO TAFUR	77,006,047	9°45'17"	73°15'05"
404	VDA CAPIHUARA	MARLENIS REDONDO	42,489,181	9°45'06"	73°14´50"
405	VDA CAPIHUARA	JOSÉ CABRERA	77,156,263	9°44'48"	73°15'12"
406	VDA CAPIHUARA	GABRIEL SERNA	18,939,826	9°44'55"	73°15'15"
407	VDA CAPIHUARA	YAJAIRA ARRIETA	49,689,759	9°45'0"	73°15'16"
408	VDA CAPIHUARA	JULIO CESAR RADA	1,015,839	9°45´10"	73°15'17"
409	VDA CAPIHUARA	ARCENIO SILVA	1,148,707,219	9°45'11"	73°15'20"
410	VDA CAPIHUARA	LINA SANTOFIMIO	49,692,892	9°46'0"	73°15'11"
411	VDA TIERRA SECA	PEDRO LUIS AVILA ANGARITA	1,064,110,221	9°41´19"	73°7´17"
412	VDA TIERRA SECA	JOSE ALFONSO QUIROZ	12,566,902	9°41´14"	73°6´57"
413	VDA TIERRA SECA	JAIME ROJO	12,565,929	9°41´20"	73°6´41"
414	VDA TIERRA SECA	JUAN VICENTE OCHOA OLIVEROS	19,603,542	9°41´36"	73°6´52"
415	VDA TIERRA SECA	NEDER NEGRETE SANCHEZ	12,569,209	9°41´38"	73°7´16"
416	VDA TIERRA SECA	DIOMEDES DURAN	13,355,852	9°41´28"	73°7´37"
417	VDA TIERRA SECA	FELIX ENRIQUE MIRANDA MAESTRE	1,122,812,104	9°40´58"	73°8´13"
418	VDA TIERRA SECA	ALEXANDER SANCHEZ QUINTERO	1,065,204,408	9°41'1"	73°8'27"
419	VDA TIERRA SECA	CARLOS EDUARDO NUÑEZ GRACIANO	12,569,181	9°41'24"	73°8'21"
420	VDA TIERRA SECA	DIVANI DURAN CAMARGO	26,946,423	9°43'35"	73°7'25"
421	VDA TIERRA SECA	JAVIER MORA MANOSALVA	5,092,779	9°43'34"	73°7'27"
422	VDA TIERRA SECA	CARLOS EMILIO GALVIZ RINCON	1,065,646,590	9°43'33"	73°7'27"
423	VDA TIERRA SECA	JULIO ALFREDO QUIROZ	12,567,516	9°43'34"	73°7'26"

424	VDA TIERRA SECA	GNECCO LUIS QUIROZ MENDOZA	12,565,782	9°43'39"	73°7'8"
425	VDA TIERRA SECA	ELBA SEGUANES CAMPO	49,774,379	9°43'27"	73°7'4"
426	VDA TIERRA SECA	CANDELARIO SARABIA	5,468,367	9°42'42"	73°6'47"
427	VDA TIERRA SECA	WILLIAM PAREDES AGUILAR	12,567,338	9°42'13"	73°8'53"
428	VDA TIERRA SECA	JULIO GOMEZ PALLARES	84,044,351	9°42'58"	73°9'32"
429	VDA TIERRA SECA	MEDARDO BERRIO SANABRIA	12,566,587	9°42'41"	73°6'48"
430	VDA TUCUYCITO LA LOMA	JOSE DANIEL BATISTA GONZALEZ	12,523,975	9°38´19"	73°16´12"
431	VDA TUCUYCITO LA LOMA	ZAYBETH CONTRERAS	42,401,292	9°38´56"	73°16´8"
432	VDA TUCUYCITO LA LOMA	ALBERTO CONTRERAS ARRIETA	18,965,246	9°39´4"	73°17´5"
433	VDA TUCUYCITO LA LOMA	RAFAEL MOJICA	13,842,453	9°39´3"	73°16´54"
434	VDA TUCUYCITO LA LOMA	ANA MILENA AEGUELLO CORREA	32,884,762	9°38´45"	73°17´10"
435	VDA TUCUYCITO LA LOMA	*ALVARO GARCIA ARIAS*	12,567,501	9°38´16"	73°17´21"
436	VDA TUCUYCITO LA LOMA	*LUZ MIRIAN NUÑEZ AREVALO*	49,661,622	9°37´48"	73°17´11"
437	VDA TUCUYCITO LA LOMA	*GENITH VIECCO ROCHA*	42,498,391	9°37´47"	73°17´2"
438	VDA TUCUYCITO LA LOMA	LUZ FANNY RODRIGUEZ	36,518,910	9°38´14"	73°16´10"
439	VDA TUCUYCITO LA LOMA	ELIAS TAMARA	5,060,865	9°38´8"	73°16´12"
440	VDA TUCUYCITO LA LOMA	BREINER SANTIAGO RANGEL	1,064,108,564	9°38´40"	73°16´30"
441	VDA TUCUYCITO LA LOMA	RUBEN PEREZ YEPES	98,462,133	9°38´39"	73°16´55"
442	VDA TUCUYCITO LA LOMA	MARIA CRISTINA	12,567,230	9°38´44"	73°17´10"
443	VDA TUCUYCITO LA LOMA	LUCIO ANTONIO ARROYO POLO	15,015,925	9°38´48"	73°16´51"
444	VDA TUCUYCITO LA LOMA	LUIS JOSE GARCIA OSORIO	12,566,567	9°38´48"	73°16´55"
445	VDA TUCUYCITO LA LOMA	CARMEN CECILIA DURAN RINCON	36,518,652	9°38´50"	73°16´28"
446	VDA TUCUYCITO LA LOMA	GLADIS GUTIERREZ	49,662,841	9°38´30"	73°16´31"
447	VDA TUCUYCITO LA LOMA	ELIAS ALEXANDER TAMARA	12,567,717	9°38´47"	73°16´51"
448	VDA TUCUYCITO LA LOMA	HERMES HERNANDEZ	12,569,604	9°38´39"	73°16´12"
449	VDA TUCUYCITO LA LOMA	GUILLERMO ROJAS	241,409	9°38´14"	73°16´12"
450	VDA TUCUYCITO LA LOMA	ANA ROSA SUAREZ	26,872,965	9°38´18"	73°15´58"
451	VDA TUCUYCITO LA LOMA	JOSE ANIBAL AMAYA	18,936,054	9°38´15"	73°15´51"
452	VDA TUCUYCITO LA LOMA	FELIX ALFONSO MOJICA	5,115,925	9°38´14"	73°15´43"
453	VDA TUCUYCITO LA LOMA	ARNOLDO ENRIQUE ROMERO RIVERO	17,970,290	9°38´46"	73°15´55"
454	VDA TUCUYCITO LA LOMA	FRANCISCO RADA MAESTRE	13,438,641	9°38´39"	73°15´44"
455	VDA TUCUYCITO LA LOMA	JOSE CULMAN	501,241	9°38´27"	73°15´36"
456	VDA TUCUYCITO LA LOMA	VICTOR SANCHEZ OBESO	1,770,368	9°38´14"	73°15´36"
457	VDA TUCUYCITO LA LOMA	FRANCIA GALVIS CUADRO	26,793,409	9°38´13"	73°15´31"
458	VDA TUCUYCITO LA LOMA	JOSE GIOVANNY ACOSTA CUBIDES	18,957,142	9°38´29"	73°15´21"
459	VDA TUCUYCITO LA LOMA	YUDIS QUINTERO GALVIS	26,946,292	9°38´25"	73°15´21"
460	VDA TUCUYCITO LA LOMA	ADRIANA PAULA SIERRA	1,065,581,725	9°38´20"	73°15´17"
461	VDA TUCUYCITO LA LOMA	MERSY MEJIA TORRES	49,722,516	9°38´11"	73°15´25"
462	VDA TUCUYCITO LA LOMA	ANA FELICIA MEJIA	36,550,574	9°38´2"	73°15´23"
463	VDA TUCUYCITO LA LOMA	HUGGES RUBIO MOLINA	18,938,460	9°37´58"	73°15´14"
464	VDA TUCUYCITO LA LOMA	JOSE DE LOS REYES MIRANDA	5,004,822	9°37´59"	73°15´14"
465	VDA TUCUYCITO LA LOMA	JESUS HIPOLITO AREVALO	12,568,406	9°38´0"	73°15´9"
466	VDA TUCUYCITO LA LOMA	FRANKLIN CUENTAS	72,294,915	9°38´49"	73°16´12"
467	VDA TUCUYCITO LA LOMA	JESUS MARIA NUÑEZ	5,091,375	9°38´58"	73°15´59"
468	VDA TUCUYCITO LA LOMA	LUIS EDUARDO POLO NIEVES	1,062,815,507	9°38´58"	73°15´56"
469	VDA TUCUYCITO LA LOMA	HENRRY MEJIA ARDILA	91,323,485	9°38´49"	73°15´39"
470	VDA TUCUYCITO LA LOMA	JORGE MIGUEL MUÑOZ CABALLERO	12,570,137	9°37´59"	73°15´16"
471	VDA TUCUYCITO LA LOMA	EIVER MOLINA ESCOBAR	12,568,583	9°38´51"	73°15´28"
472	VDA TUCUYCITO LA LOMA	EDUARDO PALMIERI	12,488,100	9°38´50"	73°15´21"
473	VDA TUCUYCITO LA LOMA	JULIA ELENA HINOJOSA	26,972,394	9°38´46"	73°15´21"

474	VDA TUCUYCITO LA LOMA	CRISTIAN ARAGON	1,062,816,150	9°38´44"	73°15´19"
475	VDA TUCUYCITO LA LOMA	DAIRO LUIS MOJICA NIEVES	1,062,814,547	9°38´45"	73°15´18"
476	VDA ALTO DEL TOCUY	HERNANDO CASTRO BARRAZA	12,568,696	09°37´42"	73°08´10"
477	VDA ALTO DEL TOCUY	MARY LUZ RAMIREZ GUTIERREZ	49,610,371	09°37´48"	73°08´4"
478	VDA ALTO DEL TOCUY	SAMUEL GARCIA SALAZAR	1,062,805,338	09°37´48"	73°08´25"
479	VDA ALTO DEL TOCUY	LUIS FELIPE GARCIA SALAZAR	1,062,814,779	09°37´52"	73°08´28"
480	VDA ALTO DEL TOCUY	MELSAR QUINTERO SANTIAGO	12,501,055	09°37´52"	73°08´29"
481	VDA ALTO DEL TOCUY	LEONARDO CASTRO CUELLO	1,062,806,119	09°37´51"	73°08´30"
482	VDA ALTO DEL TOCUY	ANGEL ANTONIO TORRES PEREZ	79,817,237	09°37´56"	73°08´30"
483	VDA ALTO DEL TOCUY	ALFONSO CASTRO CUELLO	12,568,827	09°38´3"	73°08´36"
484	VDA ALTO DEL TOCUY	LEONARDO ARENAS SANCHEZ	1,067,719,386	09°38´4"	73°08´45"
485	VDA ALTO DEL TOCUY	NELSON ENRIQUE SANTANA PARRA	12,569,269	09°38´3"	73°08´46"
486	VDA ALTO DEL TOCUY	LUZ ELIDA CARBONEL ROJAS	49,700,000	09°37´57"	73°08´48"
487	VDA ALTO DEL TOCUY	URIEL PRECIADO VASQUEZ	9,302,172	09°37´56"	73°08´47"
488	VDA ALTO DEL TOCUY	CELEON ESTEBAN FORERO	1,062,809,124	09°37´59"	73°08´53"
489	VDA ALTO DEL TOCUY	ANA YIBES QUINTERO PACHECO	1,066,062,380	09°37´27"	73°08´33"
490	VDA ALTO DEL TOCUY	IVAN DARIO FERNANDEZ	1,081,786,293	09°37´30"	73°09´7"
491	VDA ALTO DEL TOCUY	JULIAN BUELVAS	1,062,816,056	09°37´32"	73°9´8"
492	VDA ALTO DEL TOCUY	JORGE LUIS MELENDEZ PEREZ	92,516,343	09°37´56"	73°9´8"
493	VDA ALTO DEL TOCUY	LUIS EDUARDO PRADA JIMENEZ	1,062,810,965	09°37´56"	73°9´10"
494	VDA ALTO DEL TOCUY	JEFERSSON SUAREZ MENESES	1,064,707,800	09°37´54"	73°9´30"
495	VDA ALTO DEL TOCUY	OSNAIDER GARCIA	1,064,113,547	09°37´59"	73°9´31"
496	VDA ALTO DEL TOCUY	EDUARDO JOSE WILCHES GUILLEN	77,142,652	09°38´0"	73°9´31"
497	VDA ALTO DEL TOCUY	HUBERT EDUARDO DURAN RANGEL	1,004,898,964	09°38´4"	73°9´30"
498	VDA ALTO DEL TOCUY	EURIEL LEMUS SUMALE	77,033,713	09°38´6"	73°9´38"
499	VDA ALTO DEL TOCUY	ELIBARDO RANGEL LOPEZ	72,337,344	09°37´54"	73°9´47"
500	VDA ALTO DEL TOCUY	JEINER CHAPARRO MEZA	1,064,112,750	09°38´58"	73°7´32"
501	VDA ALTO DEL TOCUY	EDUARDO PALMEIRI	12,488,100	09°38´4"	73°9´44"
502	VDA ALTO DEL TOCUY	CARLOS PALMIERI COTES	1,062,811,784	09°38´8"	73°9´39"
503	VDA MARACA	JOSE DEL CARMEN RIVERA PARRA	77,152,494	9°40´3"	73°12´33"
504	VDA MARACA	YAILETH BASTIDAS MORALES	1,067,713,604	9°40´13"	73°12´4"
505	VDA MARACA	MIRYAM POLO JORDAN	49,692,553	9°41´32"	73°11´30"
506	VDA MARACA	ANIBAL BARROS VILLAZON	18,937,136	9°39´57"	73°12´41"
507	VDA MARACA	EORASIMO GONZALEZ	77,022,390	9°41´3"	73°12´49"
508	VDA MARACA	PEDRO VICENTE TAUTIVA OLAYA	1,070,952,869	9°41´27"	73°11´54"
509	VDA MARACA	JIMMY ALEXANDER MEJIA LEAL	79,831,752	9°41´5"	73°13´3"
510	VDA MARACA	ALVARO MIRANDA FUENTES	77,157,062	9°41´2"	73°12´22"
511	VDA MARACA	ANDREINA PABON BARBOSA	1,067,724,455	9°41´7"	73°12´17"
512	VDA MARACA	ENAUDI MORALES ORTIZ	77,142,863	9°41´7"	73°12´4"
513	VDA MARACA	YUDIS VALERIO CONTRERAS	1,005,525,726	9°41´18"	73°11´50"
514	VDA MARACA	MARIA CRISTINA MORENO GARCIA	1,193,122,402	9°41´15"	73°11´42"
515	VDA MARACA	ELEINIS MENLISSA ROLONG PEDROZA	1,003,275,405	9°41´28"	73°11´36"
516	VDA MARACA	CARLOS EMIRO ROJAS SOLANO	1,091,073,366	9°41´23"	73°12´1"
517	VDA MARACA	RICHARD DAVID LESME HERNANDEZ	77,159,760	9°41´40"	73°11´32"
518	VDA MARACA	JENNIFER LESME ROJAS	1,067,728,479	9°41´43"	73°11´33"
519	VDA MARACA	ANA CECILIA ARREGOCE ALANDETE	49,691,155	9°41´46"	73°11´31"
520	VDA MARACA	EDILSA ARREGOCE ALANDETE	49,696,441	9°41´56"	73°11´20"
521	VDA MANATIAL	SAID CAÑIZARES PACHECO	1,127,352,436	09°41´15"	73°11´47"
522	VDA MANATIAL	YEYSON ARENAS ARENAS	1,002,817,210	09°45´15"	73°07´45"
523	VDA MANATIAL	CARLOS MARIO HERRERA MERCADO	1,073,974,473	09°45´34"	73°5´35"

524	VDA MANATIAL	JUAN DE JESUS PACHECO ASCANIO	19,665,334	09°46´2"	73°5´24"
525	VDA MANATIAL	EZEQUIEL CAÑIZARES SEPULVEDA	1,062,804,906	09°46´27"	73°5´37"
526	VDA MANATIAL	EUCLIDES PACHECO ASCANIO	12,567,763	09°45´5"	73°07´14"
527	VDA MANATIAL	MARCIANA BEATRIZ RANGEL CASTRO	57,408,446	09°46´27"	73°5´38"
528	VDA MANATIAL	EIDER PACHECO DURAN	1,003,038,929	09°46´42"	73°6´3"
529	VDA MANATIAL	ELEMIR DURAN	1,062,808,014	09°46´40"	73°6´17"
530	VDA MANATIAL	DIEGO ALEJANDRO MORALES TORRES	1,146,440,965	09°47´17"	73°5´37"
531	VDA MANATIAL	BLADIMIR PACHECO DURAN	1,003,038,912	09°46´54"	73°7´1"
532	VDA MANATIAL	EDUAR NIÑO PRADO	1,003,241,354	09°45´50"	73°6´29"
533	VDA MANATIAL	ROSA MELIA CONTRERAS MONROY	1,052,573,042	09°47´9"	73°6´49"
534	VDA MANATIAL	JOEL PRADO PRADO	77,233,485	09°45´11"	73°6´12"
535	VDA MANATIAL	ANGELICA MARGARITA ARTEAGA BLANCO	22,531,469	09°45´55"	73°6´0"
536	VDA MANATIAL	ZORAIDA HERNANDEZ MADRIAGA	1,003,038,393	09°45´29"	73°5´51"
537	VDA MANATIAL	NERY PADILLA MOLINA	12,566,134	09°45´34"	73°6´5"
538	VDA MANATIAL	DIANYS VIVIANA RODRIGUEZ PALLARES	36,573,847	09°45´52"	73°5´48"
539	VDA MANATIAL	LUZ MARY PRADO DURAN	36,454,025	9°37´47"	73°5´59"
540	VDA MANATIAL	JAIME LUIS MIRANDA ACOSTA	76,192,289	9°45´36"	73°6´21"
541	VDA MANATIAL	FRANKLIN ASCANIO LEON	1,062,804,730	9°45´36"	73°6´20"
542	VDA MANATIAL	ASTRID ARENAS PADILLA	1,062,818,137	9°37´53"	73°6´18"
543	VDA MANATIAL	DAGO ALBERTO GALVIS RINCON	1,065,626,403	9°45´50"	73°7´16"
544	VDA MANATIAL	WILFREDO MONSALVE CABALLERO	91,473,950	9°38´20"	73°5´44"
545	VDA MANATIAL	ADOLFO MALDONADO	13,168,696	09°46´7"	73°14´29"
546	VDA BETULIA	FABIO SUAREZ CARCAMO	12,566,241	09°46´12"	73°14´25"
547	VDA BETULIA	LUIS ALBERTO TORRES JIMENEZ	1,003,038,022	09°46´24"	73°14´11"
548	VDA BETULIA	ELSA MARIA LAGO BALCAZAR	49,731,332	09°47´25"	73°13´37"
549	VDA BETULIA	ELIAS ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ	18,965,097	09°46´28"	73°14´2"
550	VDA BETULIA	GREGORIO ISIDRO BARROS	12,712,503	09°47´10"	73°13´43"
551	VDA BETULIA	CRISTO HUMBRETO RINCON CASTRO	12,524,020	09°46´32"	73°14´25"
552	VDA BETULIA	DAIRO FORERO REYES	85,434,635	09°46´23"	73°13´57"
553	VDA BETULIA	LISNEY LOREY VASQUEZ RAMOS	1,003,039,722	09°45´41"	73°14´31"
554	VDA BETULIA	EDUARDO ALVAREZ CARO	17,802,364	09°45´40"	73°14´24"
555	VDA BETULIA	ELVER JOSE VALENCIA SAUCEDO	1,062,809,277	09°45´42"	73°14´23"
556	VDA BETULIA	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ RAMOS	84,036,736	09°45´33"	73°14´23"
557	VDA BETULIA	ANA MERCEDES OTOLORA AVILA	1,062,816,345	09°45´29"	73°14´25"
558	VDA BETULIA	IVAN ALEXI CARRILLO RESTREPO	1,062,815,334	09°45´9"	73°14´49"
559	VDA BETULIA	MERCEDES CECILIA AVILA SUAREZ	49,748,621	09°47´4"	73°13´30"
560	VDA BETULIA	YUSELIS PATRICIA OTOLORA AVILA	1,062,806,377	09°45´15"	73°15´16"
561	VDA BETULIA	CARLOS OTOLORIA PALLARES	85,433,881	09°46´22"	73°13´56"
562	VDA BETULIA	LEIDYS GUERRERO RESTREPO	1,062,805,304	09°46´27"	73°14´3"
563	VDA BETULIA	WILSON PEREZ BERNAL	1,003,040,089	09°46´37"	73°13´54"
564	VDA BETULIA	YAZMIN PEREZ LOPEZ	1,062,806,139	09°46´45"	73°14´32"
565	VDA BETULIA	ISRAEL DE JESUS PEREZ BERNAL	1,062,804,895	09°46´54"	73°14´30"
566	VDA BETULIA	EDGAR DE JESUS PEREZ BERNAL	1,003,040,325	09°46´50"	73°14´44"
567	VDA BETULIA	WILGEN GUERRERO RESTREPO	1,084,732,815	09°46´48"	73°13´46"
568	VDA BETULIA	TULIA RESTREPO PEREZ	49,610,300	09°46´57"	73°13´39"
569	VDA BETULIA	ANGEL ESTEBAN RESTREPO	19,602,139	09°47´4"	73°13´33"
570	VDA SANTA FE	FABIAN VEGA BELEÑO	12,569,007	09°47´10"	73°13´43"
571	VDA VILLA MATILDE	LUXARIS CAMPO OSPINO	49,647,311	09°47´3"	73°13´30"
572	VDA PITALITO	ELÍ GARCIA	12,566,612	09°47´0"	73°13´24"
573	VDA BECERRIL	ALEXANDER TORRES AMAYA	12,566,717	09°46´5"	73°14´18"

574	VDA CANADA	CARMEN SARABIA	49,610,413	9°38'15"	73° 9'36"
575	VDA CANADA	LUIS SANTIAGO NARVAEZ	1,081,907,684	9°38'15"	73° 9'35"
576	VDA CANADA	EIDER SMITH SUAREZ	1,065,866,764	9°38'28"	73° 9'13"
577	VDA CANADA	MILTON JOSE NARVAEZ	73,566,324	9°38'22"	73° 9'28"
578	VDA CANADA	CIRO NAVARRO	88,277,466	9°38'26"	73° 9'21"
579	VDA CANADA	IVAN CARREÑO	77,100,400	9°38'5"	73° 9'47"
580	VDA CANADA	NINFA MARIA BUSTAMANTE	49,758,961	9°38'30"	73° 9'9"
581	VDA CANADA	ALEJANDRO PRADO	12,567,498	9°38'29"	73° 9'5"
582	VDA CANADA	LUIS RICARDO COGOLLO	1,143,332,465	9°38'28"	73° 9'2"
583	VDA CANADA	INGRID YULIETH CUBILLOS	1,062,810,825	9°38'35"	73° 8'32"
584	VDA CANADA	LUIS DURAN	36,518,218	9°38'45"	73° 8'12"
585	VDA LA UNION	EDGAR DELGADO AMARIS	77,154,384	9°38´21"	73°5'14"
586	VDA LA UNION	RAFAEL RICARDO MINDIOLA ALTURO	1,064,117,787	9°38'18"	73°5'29"
587	VDA LA UNION	DORIS AMARIS DE DELGADO	39,065,743	9°38´31'	73°5´36"
588	VDA LA UNION	CIRO ANTONIO MORA CASTILLA	12,567,593	9°38´6"	73°5'21"
589	VDA LA UNION	MARÍA ISABEL GALVIS AVENDAÑO	1,062,806,338	9°38´24"	73°5'54"
590	VDA LA UNION	LUIS DANIEL RODRÍGUEZ MORA	12,568,568	9°38'4"	73°5´19"
591	VDA LA UNION	MIGUEL LEONARDO AMARIS ZABALETA	1,003,040,142	9°38´11"	73°5'33"
592	VDA LA UNION	ANTONIO MACHADO GARCÍA	1,051,656,162	9°37´74"	73°5´18"
593	VDA LA UNION	ROBINSON SANCHEZ RINCON	1,121,299,450	9°38´27"	73°5'26"
594	VDA LA UNION	ALEXANDER SARABIA MANDÓN	12,568,824	9°38'22"	73°5'27"
595	VDA LA UNION	FABIÁN MORA AVENDAÑO	1,010,151,618	9°38'19"	73°5'14"
596	VDA LA UNION	CRISTO ANTONIO PINEDA CASTILLA	77,147,901	9°38'26"	73°5'29"
597	VDA LA UNION	EVELIO RICÓN SÁNCHEZ	12,565,476	9°38'22"	73°5'32"
598	VDA LA UNION	ANA ILCE RINCÓN SÁNCHEZ	56,053,046	9°38'26"	73°5'32"
599	VDA LA UNION	ALBERTO QUINTERO PINEDA	1,065,234,399	9°38'13"	73°5'35"
600	VDA YOBA	JHONNY SARABIA MANDON	12,568,456	09°47´3"	73°13´20"
601	VDA YOBA	MARIBEL AVILA ANGARITA	1,003,038,627	9°47´0"	73°13´24"
602	VDA YOBA	VICTOR ELIAS AVILA FLORES	12,568,126	9°46´58"	73°13´11"
603	VDA YOBA	THOMAS ENRIQUE AVILA FLORES	19,563,177	9°47´4"	73°13´7"
604	VDA YOBA	YERSON SARABIA NAVARRO	1,062,807,790	9°46´59"	73°13´25"
605	VDA EL PROGRESO	DUVAN RINCON BACCA	1,062,808,079	9°38'9"	73° 4'52"
606	VDA EL PROGRESO	ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ	14,273,418	9°37'56"	73° 4'55"
607	VDA EL PROGRESO	ALFONSO JOSE PEREZ VELEZ	1,007,611,475	9°38'5"	73° 4'53"
608	VDA EL PROGRESO	EDIER ANGEL AVENDAÑO	1,065,204,402	9°38'10"	73° 4'47"
609	VDA EL PROGRESO	GEOVANNY RINCON BACCA	12,524,705	9°37'55"	73° 4'55"
610	VDA EL PROGRESO	RAUL ANTONIO LOPEZ REYES	12,567,092	9°37'58"	73°5'9"
611	VDA EL PROGRESO	MARIBEL VACA BACCA	49,748,555	9°37'36"	73°5'14"
612	VDA EL PROGRESO	JOSE DEL CARMEN RINCON VACA	1,062,815,460	9°38'6"	73°5'27"
613	VDA EL PROGRESO	WILLIAM DAVID SARZA PUENTE	1,193,547,945	9°38'6"	73°5'32"
614	VDA EL PROGRESO	EDINSON RINCON VACA	1,062,813,781	9°37'42"	73°4'54"
615	VDA EL PROGRESO	BRAYAN QUINTERO MENESES	1,062,807,264	9°37'33"	73°4'39"
616	VDA EL PROGRESO	EDGAR CONTRERAS ASCANIO	12,567,770	9°37'26"	73°4'39"
617	VDA EL PROGRESO	MARIA PEREZ PRADO	36,518,175	9°38'18"	73°4'36"
618	VDA EL PROGRESO	JOSE SANTIAGO VACA CAÑIZARES	12,568,478	9°38´36"	73°4'56"
619	VDA EL PROGRESO	RAUL ANTONIO BACCA BACCA	1,064,111,090	9°38´31"	73°4'34"
620	VDA EL PROGRESO	JESUALDO CONTRERAS NUÑEZ	12,565,732	9°38'48"	73°4'32"
621	VDA EL PROGRESO	MARIDYS CONTRERAS ASCANIO	49,610,360	9°38'58"	73°4'32"
622	VDA EL PROGRESO	JEINER ELECTOR CADENA BELEÑO	12,568,459	9°38'51"	73°4'26"
623	VDA EL PROGRESO	YARILEIDYS CONTRERAS RINCONES	1,121,296,426	9°39'2"	73°4'20"

Tabla 10. Relación de beneficiarios.

7.- CONCLUSIONES.

El porcentaje de avance ejecutado del proyecto durante el periodo contemplado entre el 1 de abril al 30 de abril de 2026 es del 30.83% por lo que se infiere que se presenta un adelanto progresivo de acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista.

8.- RECOMENDACIONES.

Durante la ejecución se identificaron algunas dificultades relacionadas con la amplia dispersión geográfica de las veredas priorizadas. Se recomienda seguir avanzando con las actividades de replanteo, continuar actividades de energización de las viviendas.

9. ANEXOS

SEBASTIAN HERRERA FRANCO
Representante legal KAPPA INGENIERIA S.A.S
Administración externa
