20 de febrero de 2026 - Viernes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) encargado y cuatro (4) oficiales, quienes ejecutaron demolición de placa para la instalación de rampas para contenedores del shut de basuras, instalación de tubería EMT y cajas de paso, armado de acero y vaciado de rampa de la salida del shut de basuras; remates de rampa existentes laterales al acceso peatonal de la entrada principal y emboquillado del enchape de muros del shut de basuras.

Oscar López
Residente de obra.

21 de febrero de 2026 - Sábado

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) encargado y cuatro (4) oficiales. Se realizó la instalación de perfilería para el cielo raso en el shut de basuras. De manera complementaria, se ejecutó el estucado de los muros externos del shut de basuras.

Oscar López
Residente de obra.

22 de febrero de 2026 - Domingo

No se laboró

23 de febrero de 2026 - lunes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) encargado y cuatro (4) oficiales. Se efectuó la fijación de los paneles de superboard de seis (6) mm a la estructura destinada al cielo raso del shut de basuras. Asimismo, se llevó a cabo el armado de acero y el vaciado de la rampa en el lindero sur, frente a la nueva puerta del cerramiento. Paralelamente, se realizaron actividades de instalación de tomas eléctricas e interruptores en oficinas de la zona administrativa y el cableado eléctrico correspondiente en dichas oficinas.

Oscar López
Residente de obra

// // //

24 de febrero del 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presenaa de un (1) encargado y cuatro (4) oficiales se ejecutaron labores de masillado y estucado de paneles de superboard en el cielo raso del shut de basuras, asi como el embaguillado de la baldosa en granito ubicada en el mismo espacio. De igual manera, se continuó con el armado de acero y el vaciado de la rampa en el lindero sur frente a la nueva puerta del cerramiento. Adicionalmente, se realizó la instalación de tomas eléctricos e interruptores de oficinos de la zona administratiua y el cableado eléctrico en el shut de basuras.

Oscar López
Residente de obra.

25 de febrero del 2026 - Miercoles.

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) encargado y cuatro (4) oficiales. Se desarrollaron actividades de aireglo de filas en oficinas de la zona administrativa, asi como la pintura de marcos metálicos de puertos y ventanas en dichos oficinas. Igualmente, se ejecutaron remates de muros en la fachada interna de las oficinas de la zona administrativa.

Oscar López
Residente de obra.

26 de febrero del 2026 - 1'

Jueves - Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) encargado y cuatro (4) oficiales. Se realizó la instalación del módulo de cerramiento metálico colindante con el shut de basuras. Asimismo, se llevó a cabo la aplicación de pintura exterior en los muros del shut de basuras. De manera complementaria, se efectuó el vaciado de gravilla en bordillos de la zona de oficinas. Tambien se ejecutó la instalación de la canal en lámina galvanizada para el shut de basuras, incluyendo los soportes en ángulo. Durante la Jornada se adelantó la pulida de baldosa en granito en el shut de basuras y la instalación de tubería EMT

para la acometida eléctrica conectada al tablero principal del colegio.

Oscar López
Residente de obra.

27 de febrero del 2026 - Viernes
Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) encargado y cuatro (4) oficiales. Se realizó la aplicación de pintura en esmalte gris en el marco exterior del shut de basuras. Igualmente, se ejecutó la instalación del tablero eléctrico para la zona de oficinas, indagando los breakers. De manera paralela, se llevó a cabo la instalación de lámparas en las oficinas de la zona administrativa.

Oscar López
Residente de obra.

28 de febrero del 2026 - Sabado
Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) encargado y tres (3) oficiales. Se realizaron remates de pintura interna en las oficinas de la zona administrativa. Asimismo, se ejecutó la limpieza de vidrios en las ventanas de las oficinas de la zona administrativa. Durante la jornada también se efectuó el desmonte de cerramiento en la zona administrativa y en el shut de basuras. Finalmente, se realizó la pulida y brillado de la media caña en granito en el shut de basuras y de la baldosa en granito en la garita de los guardas.

Oscar López
Residente de obra

01 de Marzo del 2026 - Domingo
No se laboró.

// // //

02 de marzo del 2026 - lunes
Durante la jornada se contó con la presencia de (1) encargado y dos (2) oficiales. Se efectuó la instalación de los vidrios faltantes en las ventanas de las oficinas de la zona administrativa. Adicionalmente, se realizaron remates de pintura exterior en la fachada oriental de la zona administrativa


Oscar López
Residente de obra.

03 de marzo del 2026 - Martes.
Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) encargado y dos (2) oficiales Se llevó a cabo la aplicación de pintura en marcos de puertas. De igual manera, se realizaron resanes de muros internos en zonas de oficina que requerían correcciones. Asimismo, se ejecutó la aplicación de estuco en los filos superiores de la oficina de sala de profesores en la zona administrativa.

Oscar López
Residente de obra.


1073246437 | Programacion Colegio Integrado de Fontibon - Sede A

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		06/11/2025	**27/02/2026**	98d
1	INICIO	06/11/2025	06/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**27/02/2026**	**98d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	06/11/2025	27/02/2026	98d
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de...	13/11/2025	14/11/2025	2d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**22/11/2025**	**31/01/2026**	**60d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORI...	22/11/2025	26/11/2025	3d
3.2	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	26/11/2025	01/12/2025	5d
3.3	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	30/01/2026	31/01/2026	2d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	15/01/2026	16/01/2026	2d
3.5	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	13/01/2026	14/01/2026	2d
3.6	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	15/01/2026	17/01/2026	3d
3.7	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16/01/2026	17/01/2026	2d
3.8	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	15/01/2026	17/01/2026	3d
3.9	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	28/01/2026	29/01/2026	2d
4	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**18/12/2025**	**16d**
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	01/12/2025	03/12/2025	3d
4.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	16/12/2025	18/12/2025	3d
5	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/12/2025**	**20/01/2026**	**34d**
5.1	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	12/12/2025	16/12/2025	4d
5.2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	22/12/2025	26/12/2025	5d
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	19/01/2026	20/01/2026	2d
6	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/12/2025**	**19/01/2026**	**40d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	04/12/2025	19/01/2026	40d
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	19/12/2025	22/12/2025	3d
7	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/01/2026**	**22/01/2026**	**2d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	21/01/2026	22/01/2026	2d
8	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**03/02/2026**	**16d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	27/01/2026	31/01/2026	5d
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	16/01/2026	03/02/2026	16d
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**16/02/2026**	**5d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	11/02/2026	13/02/2026	3d
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	14/02/2026	16/02/2026	2d
10	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**31/01/2026**	**04/02/2026**	**3d**
10.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	31/01/2026	04/02/2026	3d
11	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/02/2026**	**11/02/2026**	**7d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	04/02/2026	11/02/2026	7d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	07/02/2026	11/02/2026	3d
12	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/02/2026**	**19/02/2026**	**3d 6h**
12.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16/02/2026	18/02/2026	3d
12.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	16/02/2026	19/02/2026	3d 6h
12.3	ENTREGA DE ACABADOS AULA	19/02/2026	19/02/2026	
13	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/01/2026**	**28/01/2026**	**20d**
13.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	26/01/2026	27/01/2026	2d
13.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	21/01/2026	22/01/2026	2d
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	23/01/2026	26/01/2026	3d
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	06/01/2026	28/01/2026	20d
13.5	ENTREGA DE CUBIERTA	28/01/2026	28/01/2026	
14	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**27/02/2026**	**98d**
14.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	06/11/2025	27/02/2026	98d
14.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	20/01/2026	22/01/2026	3d
15	**NO PREVISTOS**	**15/11/2025**	**19/02/2026**	**82d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	09/02/2026	14/02/2026	5d 1h
15.2	DESMONTE Y RETIRO DE LEONES	21/11/2025	22/11/2025	2d
15.3	DESMONTE DE TAPAS DE SUPERBOARD DE LA CUBIERTA	03/01/2026	06/01/2026	2d
15.4	CORTE DE TEJA	09/01/2026	12/01/2026	3d
15.5	RECORRIDO DE CUBIERTA (INCLUYE SUJECION DE TEJAS Y RESANES A QUE HAYA LUGAR)	29/12/2025	01/01/2026	4d
15.6	APUNTALAMIENTO PARA MURO SEGÚN DISEÑO	15/11/2025	20/11/2025	5d
15.7	PINTURA DE REJA DE TECHO	23/01/2026	27/01/2026	4d
15.8	DESMONTE Y REINSTALACION DE REJA DE TECHO	09/01/2026	16/02/2026	33d
15.9	ENCORAZADO	26/01/2026	27/01/2026	2d
15.10	FIN	19/02/2026	19/02/2026	

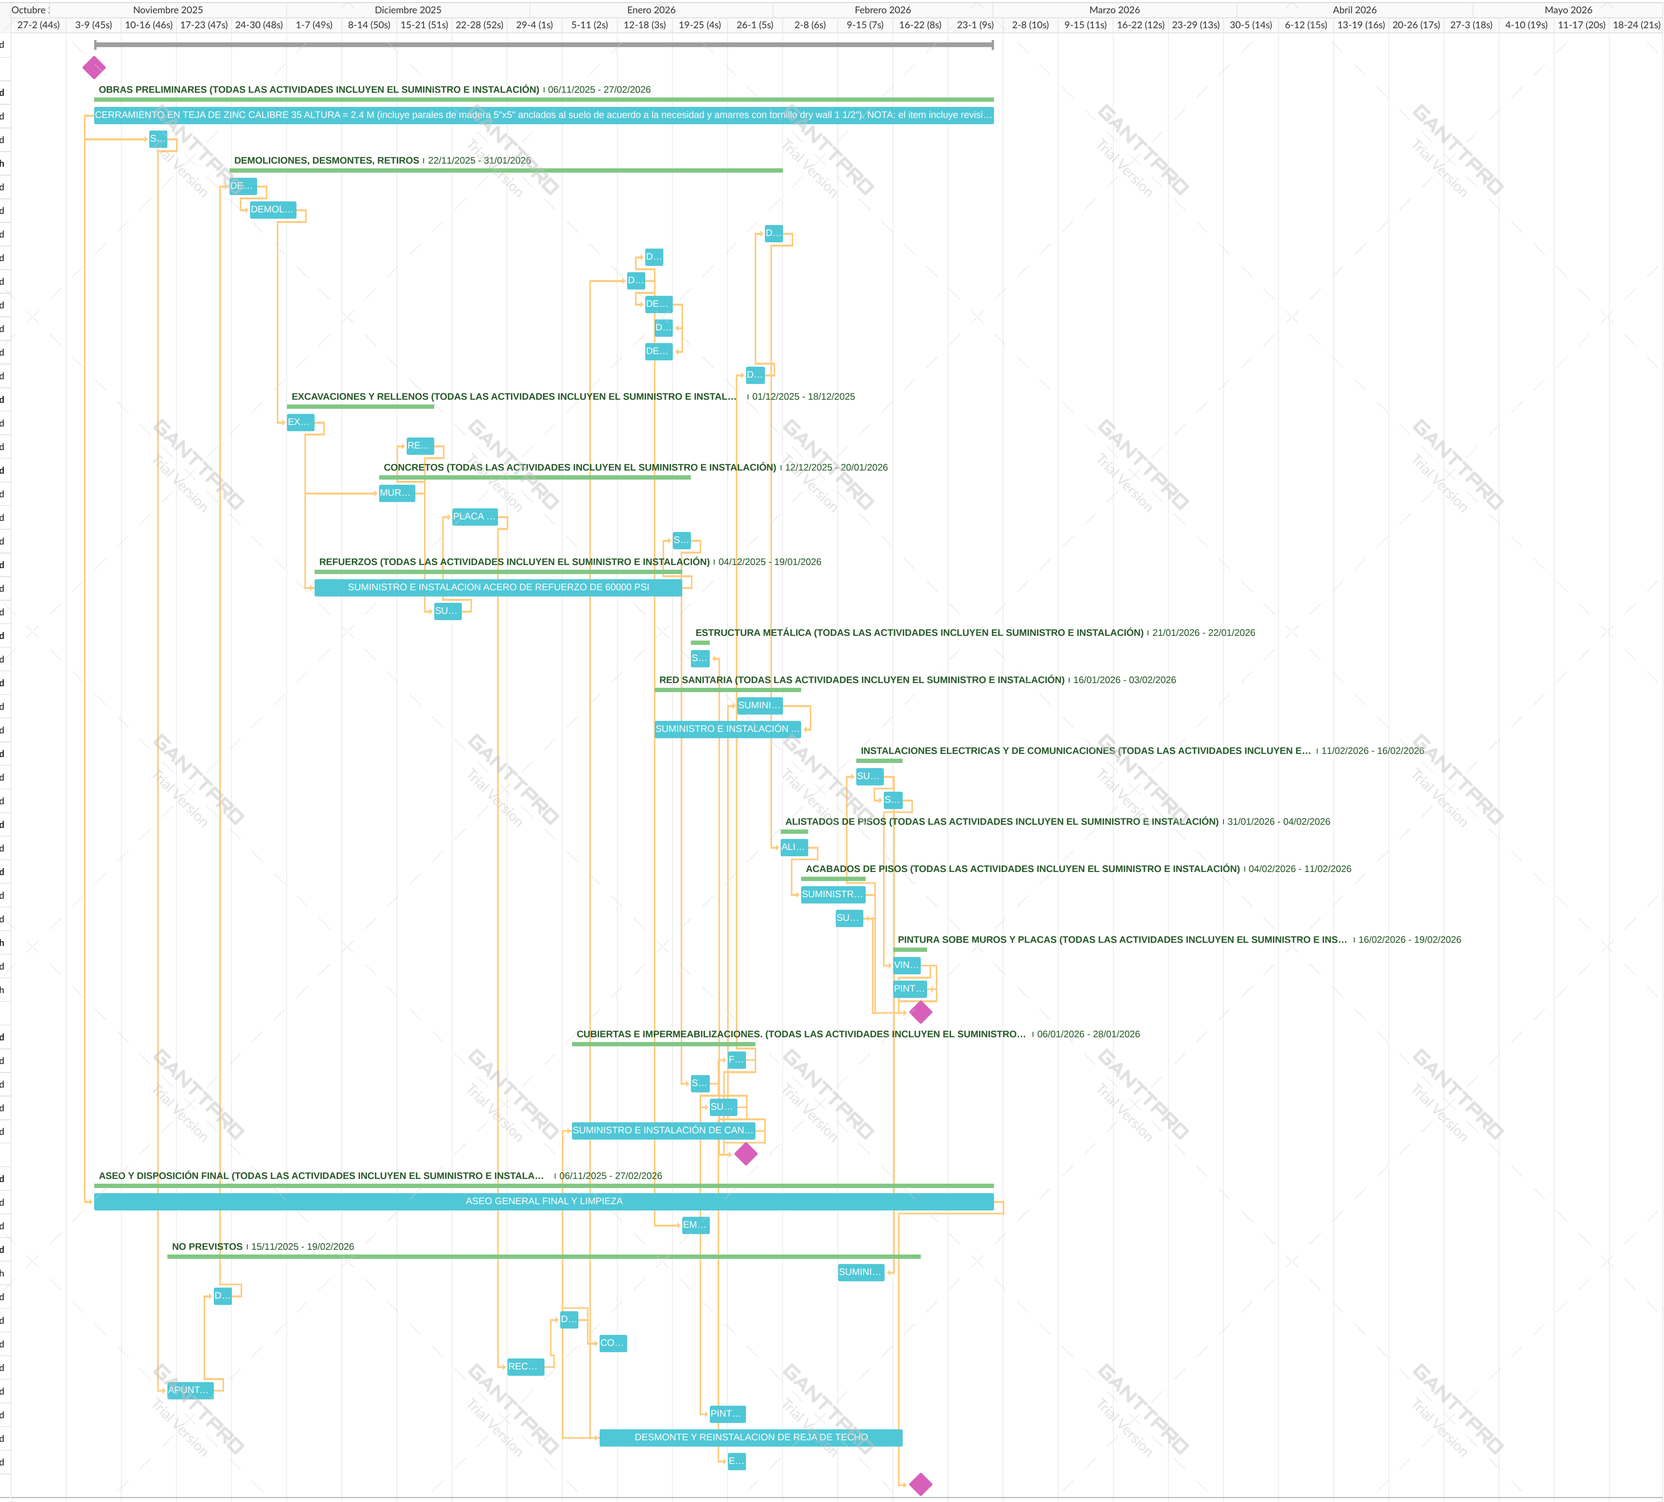

1073246437 | Programacion Colegio Antonio Van Uden - Sede C


	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		18/11/2025	**13/04/2026**	126d
1	INICIO	18/11/2025	18/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/11/2025**	**13/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	18/11/2025	13/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**20/11/2025**	**09/03/2026**	**94d**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ...	05/01/2026	08/01/2026	3d
3.2	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	03/01/2026	06/01/2026	2d
3.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	23/12/2025	25/12/2025	2d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	27/12/2025	30/12/2025	2d
3.5	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	23/12/2025	24/12/2025	2d
3.6	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS D...	06/12/2025	09/03/2026	80d
3.7	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	02/01/2026	03/01/2026	2d
3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE R...	08/01/2026	10/01/2026	2d
3.9	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	28/11/2025	26/12/2025	24d 2m
3.10	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	27/12/2025	31/12/2025	4d
3.11	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	24/11/2025	02/01/2026	35d
3.12	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	20/11/2025	25/12/2025	31d
3.13	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	24/11/2025	03/01/2026	36d
3.14	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	19/02/2026	20/02/2026	1d
3.15	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	29/12/2025	01/01/2026	3d
3.16	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RE...	08/01/2026	10/01/2026	2d
3.17	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE...	03/01/2026	06/01/2026	2d
3.18	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y ...	02/01/2026	09/01/2026	6d
4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/01/2026**	**07/04/2026**	**82d**
4.1	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPE...	02/01/2026	07/04/2026	82d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**20/01/2026**	**8d 7h**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	10/01/2026	13/01/2026	2d
5.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	17/01/2026	20/01/2026	2d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**22/01/2026**	**09/02/2026**	**15d**
6.1	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	03/02/2026	06/02/2026	3d
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	06/02/2026	09/02/2026	2d
6.3	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	31/01/2026	04/02/2026	3d
6.4	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	22/01/2026	26/01/2026	3d
7	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/01/2026**	**07/02/2026**	**16d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	29/01/2026	07/02/2026	8d
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	20/01/2026	22/01/2026	2d
8	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**26/03/2026**	**52d 58m**
8.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	24/01/2026	29/01/2026	4d
8.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	26/02/2026	26/03/2026	25d
9	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/01/2026**	**03/02/2026**	**4d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y T...	29/01/2026	03/02/2026	4d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**25/02/2026**	**37d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	13/01/2026	25/02/2026	37d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	13/02/2026	20/02/2026	6d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/01/2026	15/01/2026	2d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**15/01/2026**	**19/01/2026**	**3d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	15/01/2026	19/01/2026	3d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	15/01/2026	19/01/2026	3d
11.3	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	17/01/2026	17/01/2026	
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**12/02/2026**	**28d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	07/02/2026	11/02/2026	3d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	07/02/2026	12/02/2026	4d
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	10/01/2026	15/01/2026	4d
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	10/01/2026	15/01/2026	4d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**13/02/2026**	**2d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	11/02/2026	13/02/2026	2d
14	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**20/01/2026**	**6d 7h**
14.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	13/01/2026	16/01/2026	3d
14.2	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZAD...	17/01/2026	20/01/2026	2d
15	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/03/2026**	**23/03/2026**	**1d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	21/03/2026	23/03/2026	1d
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/12/2025**	**20/03/2026**	**83d**
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	10/03/2026	11/03/2026	1d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	13/12/2025	20/03/2026	83d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	13/12/2025	20/03/2026	83d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	13/12/2025	19/03/2026	82d
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	26/12/2025	31/12/2025	4d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS ...	11/03/2026	13/03/2026	2d
17	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**06/03/2026**	**12d**
17.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	20/02/2026	24/02/2026	3d
17.2	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	02/03/2026	06/03/2026	4d
18	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23/02/2026**	**12/03/2026**	**15d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	23/02/2026	03/03/2026	7d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	06/03/2026	09/03/2026	2d
18.3	WIN DE ALUMINIO	06/03/2026	12/03/2026	5d
18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	02/03/2026	05/03/2026	3d
19	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/03/2026**	**12/03/2026**	**5d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	06/03/2026	12/03/2026	5d
20	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/02/2026**	**16/03/2026**	**24d 2m**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	16/02/2026	26/02/2026	10d
20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	11/03/2026	16/03/2026	4d
21	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**26/02/2026**	**6d**
21.1	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	20/02/2026	26/02/2026	6d
22	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/03/2026**	**12/03/2026**	**4d**
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	07/03/2026	12/03/2026	4d
23	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/03/2026**	**27/03/2026**	**22d**
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	21/03/2026	23/03/2026	1d
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON F...	24/03/2026	26/03/2026	2d
23.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	26/03/2026	27/03/2026	1d
23.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	02/03/2026	04/03/2026	2d
24	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/03/2026**	**30/03/2026**	**3d**
24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXI...	26/03/2026	30/03/2026	3d
24.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	26/03/2026	30/03/2026	3d
25	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**14/03/2026**	**27d**
25.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	11/02/2026	18/02/2026	6d
25.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/03/2026	14/03/2026	3d
25.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	11/03/2026	14/03/2026	3d
25.4	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CER...	14/02/2026	18/02/2026	3d
26	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**03/04/2026**	**32d**
26.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	26/02/2026	03/04/2026	32d
26.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	27/02/2026	03/04/2026	31d
26.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	14/03/2026	18/03/2026	3d
26.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARI...	26/02/2026	01/04/2026	30d
26.5	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEM...	14/03/2026	19/03/2026	4d
26.6	ENTREGA DE PINTURA DE FACHADAS	28/03/2026	28/03/2026	
27	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/03/2026**	**17/03/2026**	**5d**
27.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ...	11/03/2026	17/03/2026	5d
28	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/03/2026**	**31/03/2026**	**2d**
28.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	28/03/2026	31/03/2026	2d
28.2	ENTREGA DE BAÑOS	31/03/2026	31/03/2026	
29	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**05/12/2025**	**21/03/2026**	**91d 7h 58m**
29.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	06/01/2026	21/03/2026	64d 2m
29.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	12/03/2026	14/03/2026	2d
29.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	13/12/2025	05/03/2026	71d
29.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	06/12/2025	25/02/2026	69d
29.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	05/12/2025	08/12/2025	2d
29.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	02/01/2026	21/03/2026	68d
29.7	ENTREGA DE CUBIERTA	14/03/2026	14/03/2026	
30	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/11/2025**	**13/04/2026**	**126d**
30.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	18/11/2025	13/04/2026	126d
30.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	03/01/2026	08/01/2026	4d
31	**ITEM NO PREVISTOS**	**18/11/2025**	**01/04/2026**	**116d**
31.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	13/12/2025	04/03/2026	69d
31.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALI...	07/03/2026	12/03/2026	4d
31.3	DESMONTE DE LAMINAS DE SUPERBOARD Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE 8MM, INCLUYE MASILLA Y DEMAS EL...	26/02/2026	28/02/2026	3d
31.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLES DE SANITARIO 50CM	19/03/2026	23/03/2026	3d
31.5	DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	05/01/2026	06/01/2026	2d
31.6	DESMONTE DE INCRUSTACIONES INCLUYE RETIRO	03/01/2026	05/01/2026	1d
31.7	DESMONTE Y REINTALACION DE TANQUE DE AGUA	18/02/2026	18/03/2026	24d
31.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA , ACOPLE Y SIFÓN)	26/03/2026	27/03/2026	1d
31.9	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION	18/11/2025	14/01/2026	50d
31.10	DESMONTE E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL EXISTENTE, (INCLUYE EL DESMONTE DE LA MALLA ESLABONADA Y DE LAS MA...	24/02/2026	01/04/2026	32d
31.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TI...	18/03/2026	19/03/2026	1d
31.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARG...	19/03/2026	23/03/2026	3d
31.13	ENCORAZADO	20/02/2026	24/02/2026	3d
31.14	FIN	31/03/2026	31/03/2026	

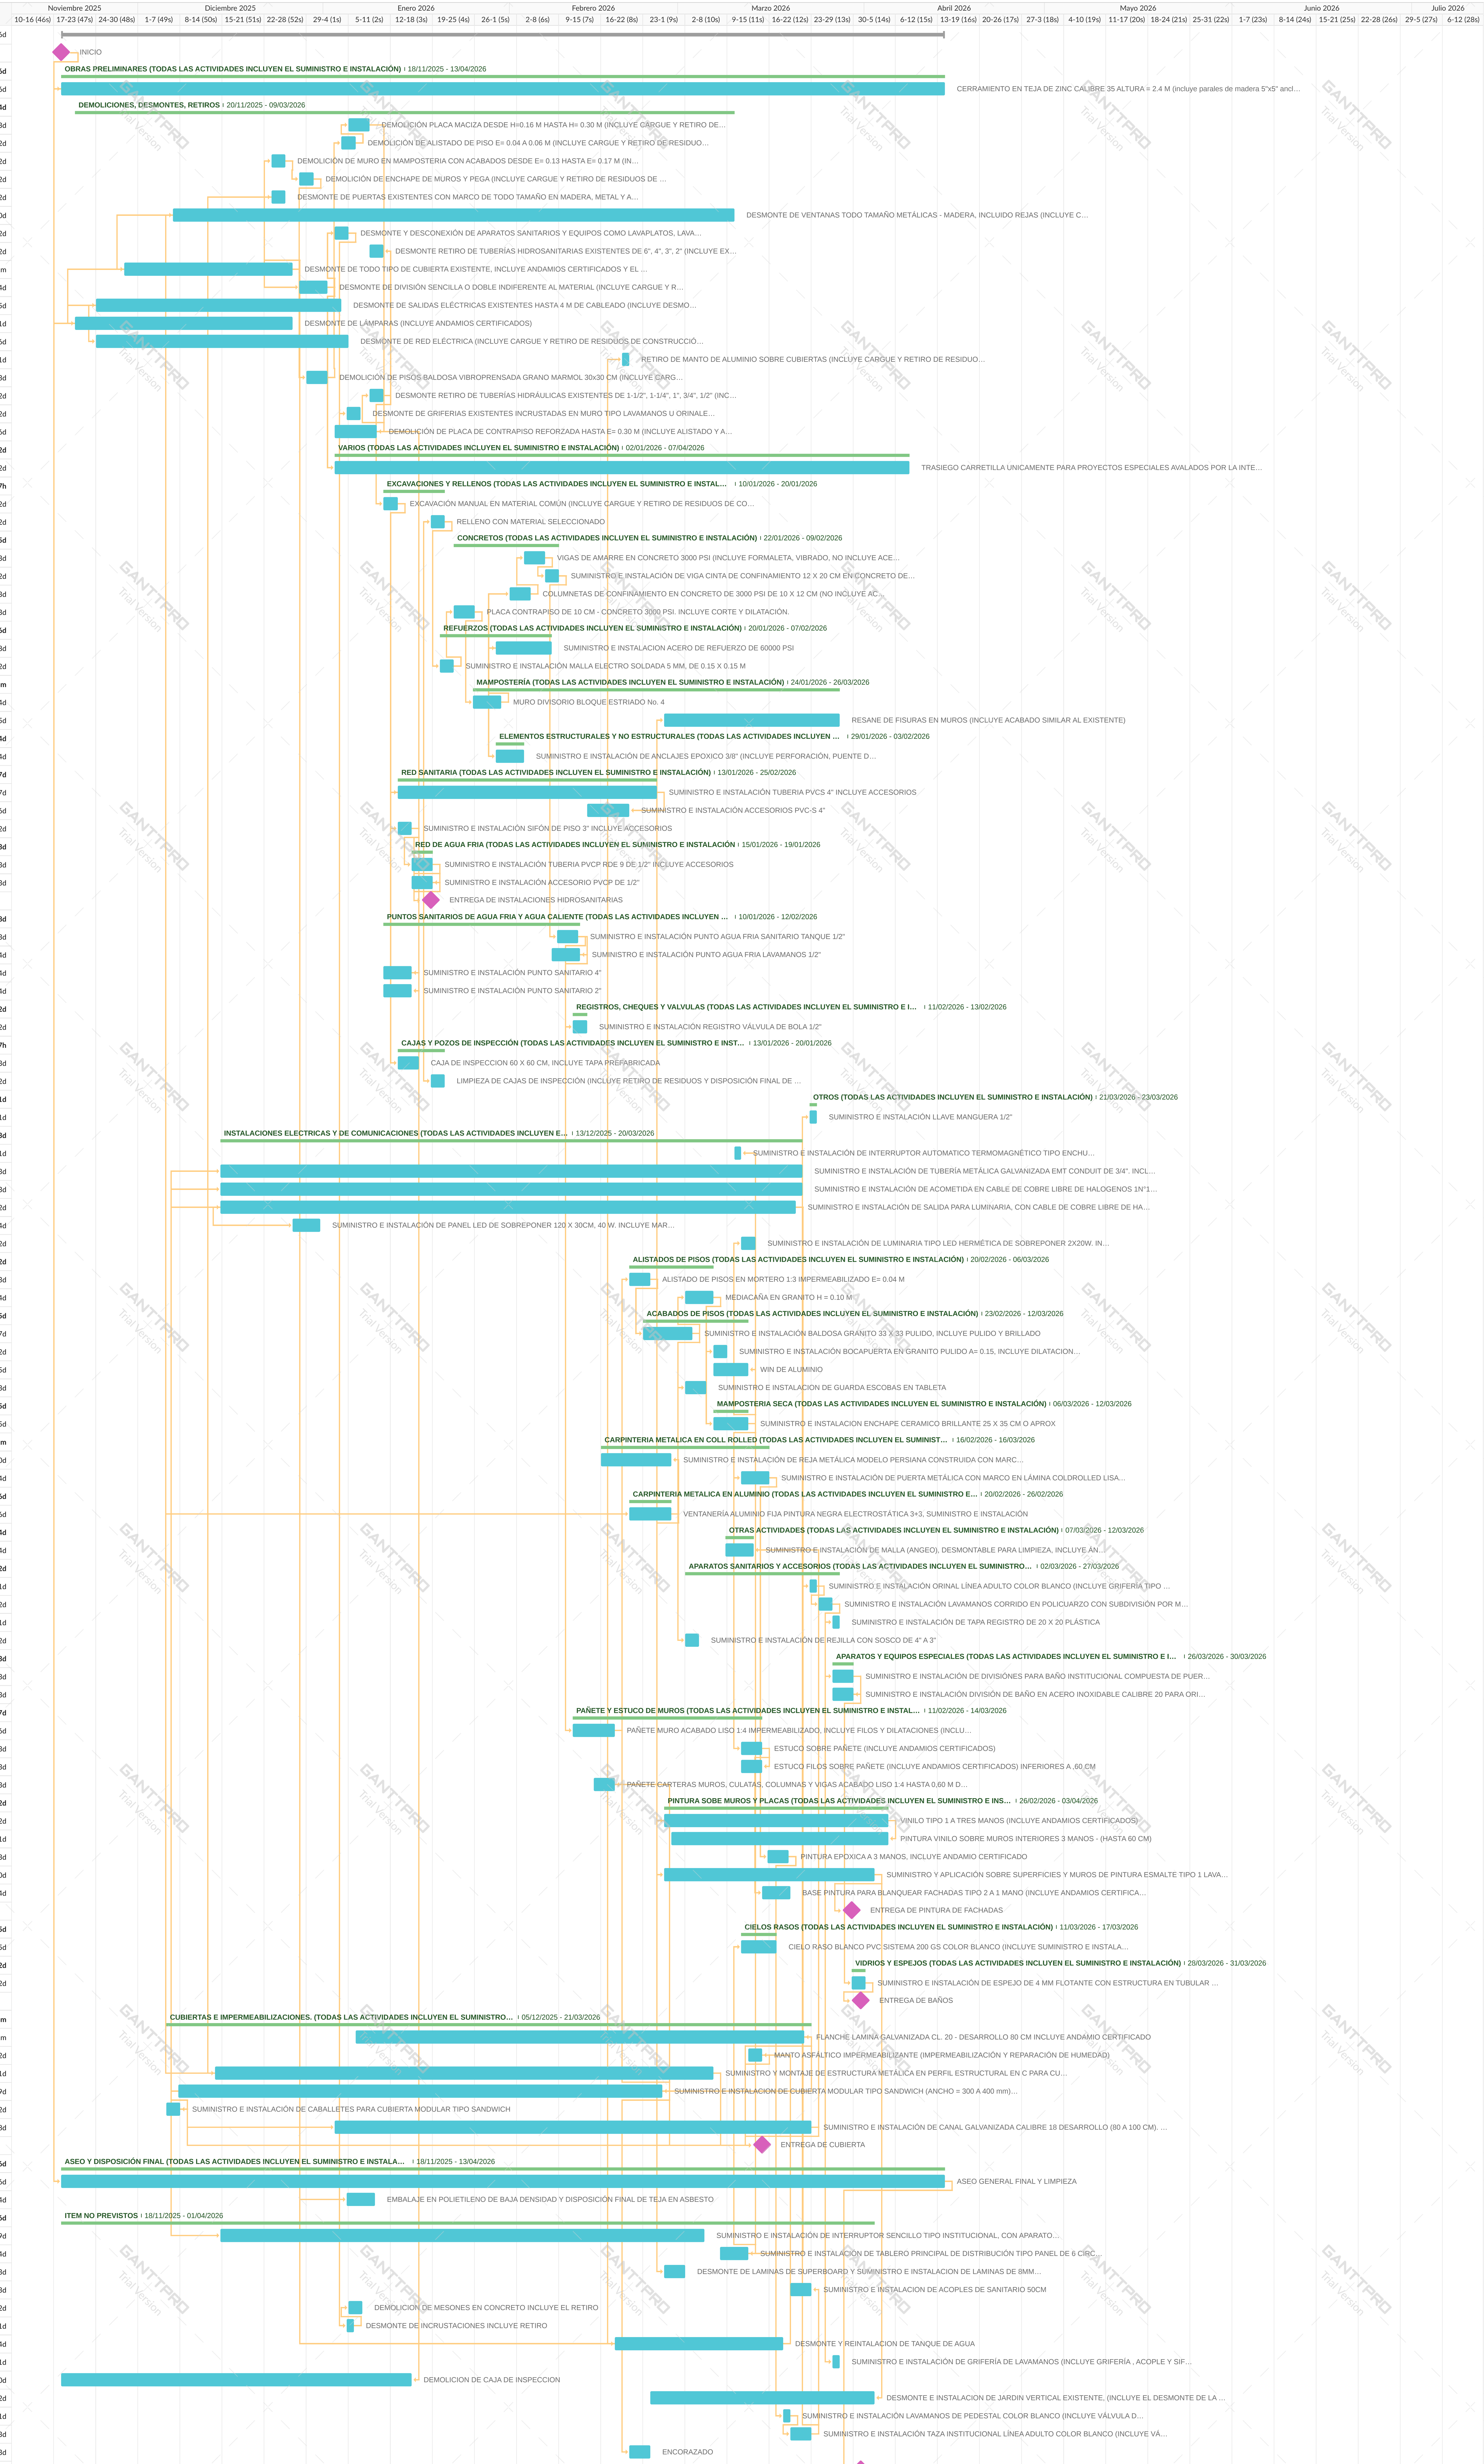


GANTTPRO Trial Version

1073246437 | Programacion Colegio Tecnico Internacional - Sede A

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		06/11/2025	**01/04/2026**	126d
1	INICIO	06/11/2025	06/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**01/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la neces...	06/11/2025	01/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**08/11/2025**	**19/02/2026**	**89d**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	06/12/2025	12/12/2025	5d
3.2	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	05/12/2025	06/12/2025	2d
3.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	20/11/2025	17/01/2026	51d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	24/11/2025	28/11/2025	5d
3.5	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	10/01/2026	14/01/2026	3d
3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	19/01/2026	20/01/2026	2d
3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS ...	15/01/2026	19/01/2026	4d
3.8	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	10/11/2025	11/11/2025	2d
3.9	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE R...	17/12/2025	18/12/2025	2d
3.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	08/01/2026	10/01/2026	3d
3.11	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	08/11/2025	10/11/2025	2d
3.12	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.13	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.14	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.15	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	29/11/2025	02/12/2025	3d
3.16	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y R...	17/12/2025	18/12/2025	2d
3.17	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO D...	12/11/2025	13/11/2025	2d
3.18	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y ...	13/12/2025	17/12/2025	4d
4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**16/03/2026**	**75d**
4.1	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUP...	19/12/2025	16/03/2026	75d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**30/12/2025**	**9d 7h**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	19/12/2025	20/12/2025	2d
5.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	27/12/2025	30/12/2025	2d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**05/01/2026**	**20/01/2026**	**14d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	17/01/2026	20/01/2026	3d
6.2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	05/01/2026	07/01/2026	3d
7	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/01/2026**	**16/01/2026**	**12d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	15/01/2026	16/01/2026	2d
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	03/01/2026	05/01/2026	2d
8	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**26/01/2026**	**2d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	24/01/2026	26/01/2026	2d
9	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**25/03/2026**	**65d 7h**
9.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	19/01/2026	03/03/2026	37d 2h
9.2	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	08/01/2026	12/01/2026	4d
9.3	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	07/02/2026	25/03/2026	39d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**09/02/2026**	**45d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	20/12/2025	24/12/2025	3d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	06/02/2026	09/02/2026	3d
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	06/02/2026	09/02/2026	3d
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	19/12/2025	24/12/2025	5d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**24/12/2025**	**29/12/2025**	**5d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	24/12/2025	26/12/2025	3d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	26/12/2025	29/12/2025	3d
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**26/12/2025**	**6d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	23/12/2025	26/12/2025	4d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	23/12/2025	26/12/2025	4d
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	20/12/2025	24/12/2025	4d
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	20/12/2025	24/12/2025	4d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/12/2025**	**03/01/2026**	**5d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	29/12/2025	31/12/2025	3d
13.2	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	03/01/2026	03/01/2026	
14	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**02/01/2026**	**6d 7h**
14.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	26/12/2025	27/12/2025	2d
14.2	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZA...	27/12/2025	02/01/2026	5d
15	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/01/2026**	**07/03/2026**	**54d 1h**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	07/03/2026	07/03/2026	1d
15.2	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	03/01/2026	05/01/2026	1d
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/01/2026**	**27/02/2026**	**35d**
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	19/02/2026	24/02/2026	5d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	19/02/2026	19/02/2026	1d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, ...	19/01/2026	22/01/2026	4d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS N...	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1...	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	04/02/2026	07/02/2026	4d
16.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS ...	24/02/2026	27/02/2026	4d
17	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/01/2026**	**07/02/2026**	**17d 7h**
17.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	19/01/2026	22/01/2026	4d
17.2	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	31/01/2026	07/02/2026	6d
18	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/01/2026**	**17/03/2026**	**43d 2h**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	07/02/2026	14/02/2026	7d
18.2	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRET...	14/02/2026	16/02/2026	2d
18.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	13/03/2026	17/03/2026	3d
18.4	WIN DE ALUMINIO	26/01/2026	31/01/2026	6d
18.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	12/03/2026	17/03/2026	4d
18.6	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA No 3 LAVADA. INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA H=10 CM Y ESPESOR=...	16/02/2026	17/02/2026	2d
19	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23/01/2026**	**14/02/2026**	**19d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	23/01/2026	02/02/2026	9d
19.2	ENTREGA DE OBRA BLANCA	14/02/2026	14/02/2026	
20	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/03/2026**	**18/03/2026**	**11d**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	14/03/2026	18/03/2026	4d
20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	06/03/2026	07/03/2026	2d
21	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/02/2026**	**07/02/2026**	**2d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLER...	06/02/2026	07/02/2026	2d
22	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**09/03/2026**	**20d**
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	28/02/2026	03/03/2026	2d
22.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	28/02/2026	03/03/2026	3d
22.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON ...	03/03/2026	06/03/2026	4d
22.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	04/03/2026	06/03/2026	3d
22.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	07/03/2026	09/03/2026	2d
22.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	14/02/2026	17/02/2026	3d
23	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/03/2026**	**07/03/2026**	**5d**
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXI...	03/03/2026	05/03/2026	3d
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	03/03/2026	07/03/2026	5d
24	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**09/02/2026**	**23d 7h**
24.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	13/01/2026	19/01/2026	6d
24.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	22/01/2026	24/01/2026	3d
24.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	31/01/2026	09/02/2026	7d
25	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/02/2026**	**05/03/2026**	**22d 1h**
25.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	07/02/2026	16/02/2026	7d
25.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	07/02/2026	16/02/2026	7d
25.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	24/02/2026	27/02/2026	4d
25.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	28/02/2026	05/03/2026	5d
26	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/02/2026**	**24/02/2026**	**5d**
26.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ...	19/02/2026	24/02/2026	5d
27	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/03/2026**	**14/03/2026**	**3d**
27.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	12/03/2026	14/03/2026	3d
27.2	ENTREGA DE BAÑOS	14/03/2026	14/03/2026	
28	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/01/2026**	**06/02/2026**	**15d**
28.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTI...	20/01/2026	26/01/2026	6d
28.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	29/01/2026	02/02/2026	4d
28.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	02/02/2026	03/02/2026	2d
28.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICO...	04/02/2026	05/02/2026	2d
28.5	ENTREGA DE CUBIERTA	06/02/2026	06/02/2026	
29	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**01/04/2026**	**126d**
29.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	06/11/2025	01/04/2026	126d
29.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	17/01/2026	23/01/2026	6d
30	**NO PREVISTOS**	**12/11/2025**	**19/03/2026**	**109d**
30.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO EN PVC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	27/02/2026	09/03/2026	8d
30.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE ...	18/02/2026	24/02/2026	6d
30.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTICO PARA EL ALISTADO DEL PISO	07/03/2026	13/03/2026	5d
30.4	RETIRO DE MUEBLES DE MADERA INCLUYE SU PROTECCION	25/02/2026	27/02/2026	2d
30.5	DEMOLICION Y RETIRO DE MESONES O POCETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	14/11/2025	19/11/2025	5d
30.6	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	12/11/2025	12/11/2025	1d
30.7	DESMONTE Y RETIRO DE ESPEJOS	29/11/2025	03/12/2025	4d
30.8	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	02/12/2025	04/12/2025	3d
30.9	TAPAS DE INSPECCION PARA CIELO DE PVC INCLYE LA PERFORACION, EL MARCO Y LA TAPA EN PVC	19/02/2026	25/02/2026	6d
30.10	SUMINISTRO E INSTALCIONES DE ACOPLE SANITARIO DE 50CM	27/02/2026	03/03/2026	4d
30.11	DESMONTE Y RETIRO DE DOMO	10/01/2026	12/01/2026	1d
30.12	ESCARIFICACION DE MUROS	23/01/2026	31/01/2026	8d
30.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO DE SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (IN...	28/02/2026	02/03/2026	2d
30.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE BRIDA...	28/02/2026	03/03/2026	3d
30.15	VENTANERÍA CON PERSIANA EN ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	07/03/2026	14/03/2026	6d
30.16	ENCOROZADO	26/01/2026	28/01/2026	3d
30.17	PAÑETE LINEAL HASTA LOS .59 M	19/01/2026	22/01/2026	4d
30.18	FIN	19/03/2026	19/03/2026	

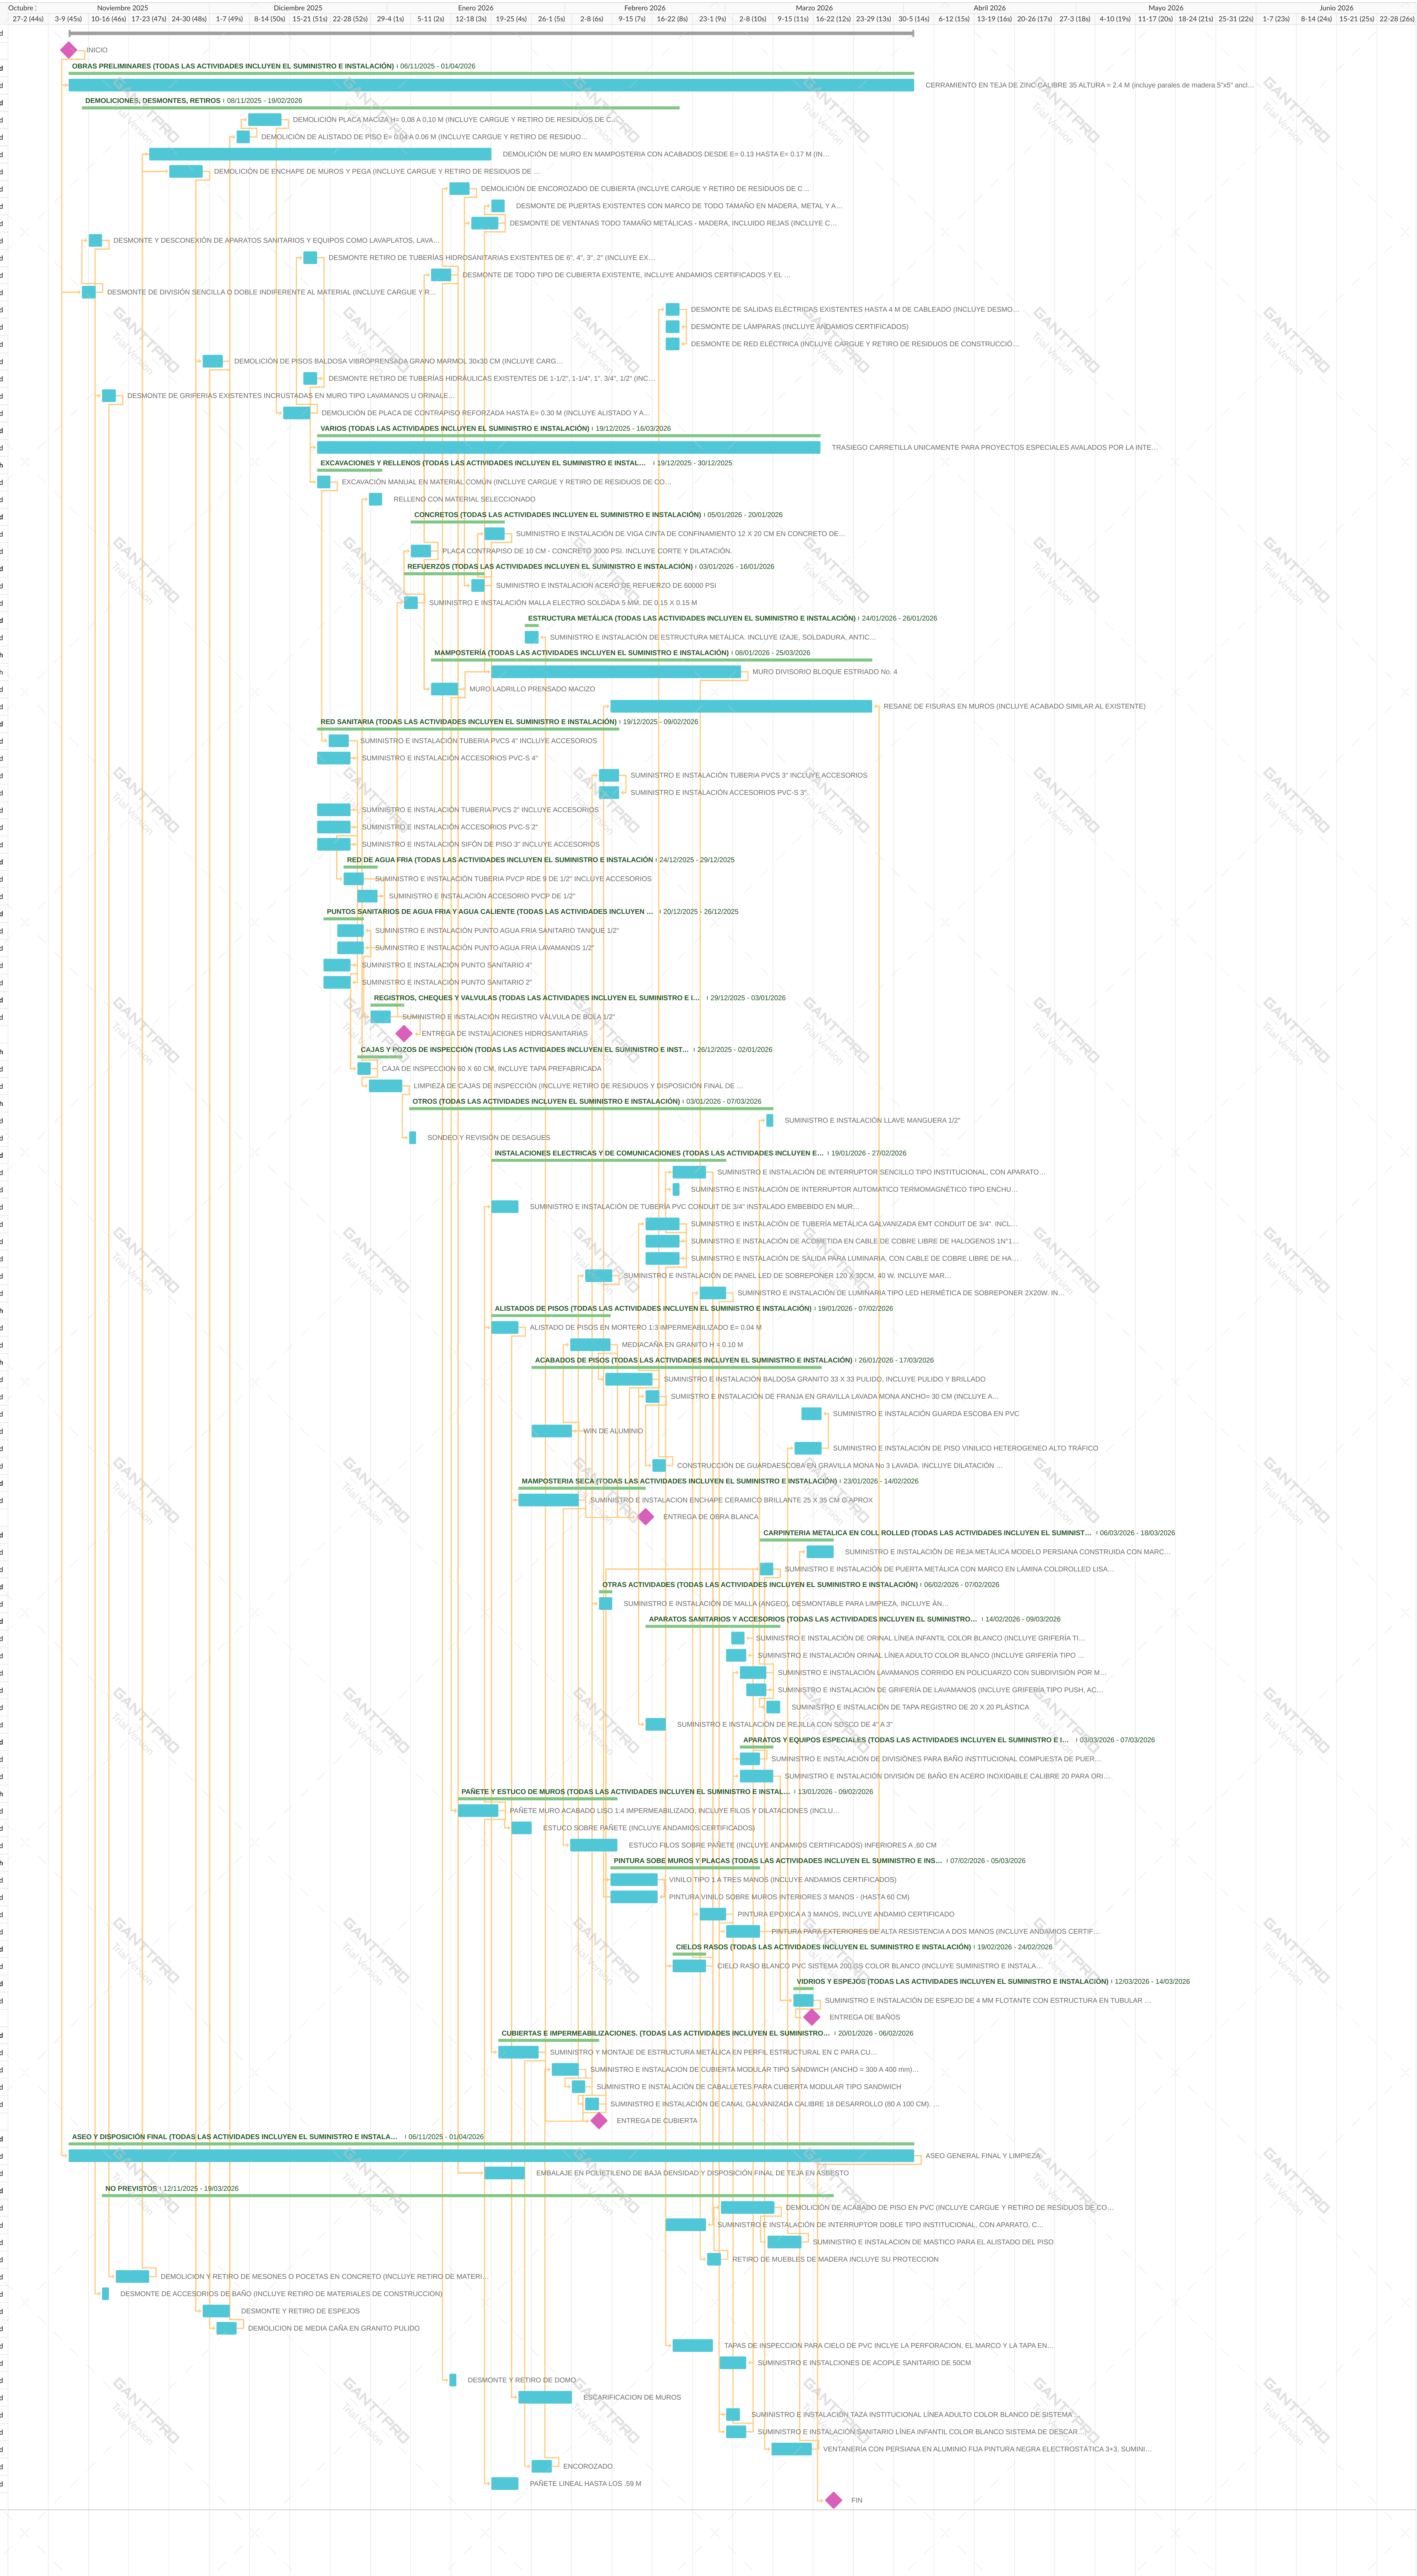


	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		24/11/2025	**18/04/2026**	126d
1	INICIO	24/11/2025	24/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/11/2025**	**18/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	24/11/2025	18/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**29/11/2025**	**28/01/2026**	**52d**
3.1	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	28/01/2026	28/01/2026	1d
3.2	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE ...	13/12/2025	17/12/2025	3d
3.3	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	29/11/2025	04/12/2025	5d
4	**MANTENIMIENTOS**	**17/12/2025**	**29/01/2026**	**38d**
4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMON...	17/01/2026	29/01/2026	10d
4.2	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE M...	17/12/2025	19/12/2025	3d
4.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	16/01/2026	29/01/2026	12d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**19/02/2026**	**4d**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	14/02/2026	19/02/2026	4d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/02/2026**	**26/02/2026**	**4d**
6.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	21/02/2026	26/02/2026	4d
7	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**20/12/2025**	**1d**
7.1	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	20/12/2025	20/12/2025	1d
8	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/02/2026**	**21/02/2026**	**3d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	19/02/2026	21/02/2026	3d
9	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**27/03/2026**	**26d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABAD...	26/02/2026	27/03/2026	26d
10	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/01/2026**	**03/02/2026**	**5d**
10.1	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	29/01/2026	03/02/2026	5d
11	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/03/2026**	**06/04/2026**	**7d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	30/03/2026	03/04/2026	5d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	06/04/2026	06/04/2026	1d
12	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/02/2026**	**12/02/2026**	**1d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PAR...	12/02/2026	12/02/2026	1d
13	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**14/01/2026**	**21d**
13.1	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA...	27/12/2025	07/01/2026	10d
13.2	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE ...	08/01/2026	13/01/2026	5d
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	20/12/2025	25/12/2025	5d
13.4	PINTURA DE CANCHA	14/01/2026	14/01/2026	
14	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/02/2026**	**12/02/2026**	**9d**
14.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	03/02/2026	06/02/2026	4d
14.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	04/02/2026	06/02/2026	3d
14.3	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	07/02/2026	12/02/2026	5d
14.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10/02/2026	11/02/2026	2d
14.5	ENTREGA DE PINTURA	12/02/2026	12/02/2026	
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**08/04/2026**	**2d**
15.1	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA...	07/04/2026	08/04/2026	2d
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/12/2025**	**08/04/2026**	**105d 1h**
16.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	08/04/2026	08/04/2026	1d
16.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	06/12/2025	13/12/2025	6d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	30/03/2026	04/04/2026	6d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS ...	25/03/2026	30/03/2026	5d
16.5	ENTREGA DE CUBIERTA	13/12/2025	13/12/2025	
16.6	ENTREGA PERGOLA	08/04/2026	08/04/2026	
17	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/11/2025**	**18/04/2026**	**126d**
17.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24/11/2025	18/04/2026	126d
18	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/02/2026**	**10/04/2026**	**50d**
18.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN	12/02/2026	10/04/2026	50d
19	**NO PREVISTOS**	**29/11/2025**	**09/04/2026**	**112d**
19.1	MANTENIMIENTO DE REJILLA DE CARCAMO (AJUSTE-ALINEACION-SOLDADURA)	14/01/2026	17/01/2026	4d
19.2	MANTENIMIENTO DE BAJANTE,	13/12/2025	16/12/2025	2d
19.3	DESMONTE Y REINSTALACION DE TANQUES DE AGUA	29/11/2025	01/12/2025	2d
19.4	DESMONTE Y REINSTALACION DE TUBERIA	01/12/2025	17/12/2025	15d
19.5	AUTONIVELANTE	04/12/2025	06/12/2025	3d
19.6	FIN	09/04/2026	09/04/2026	

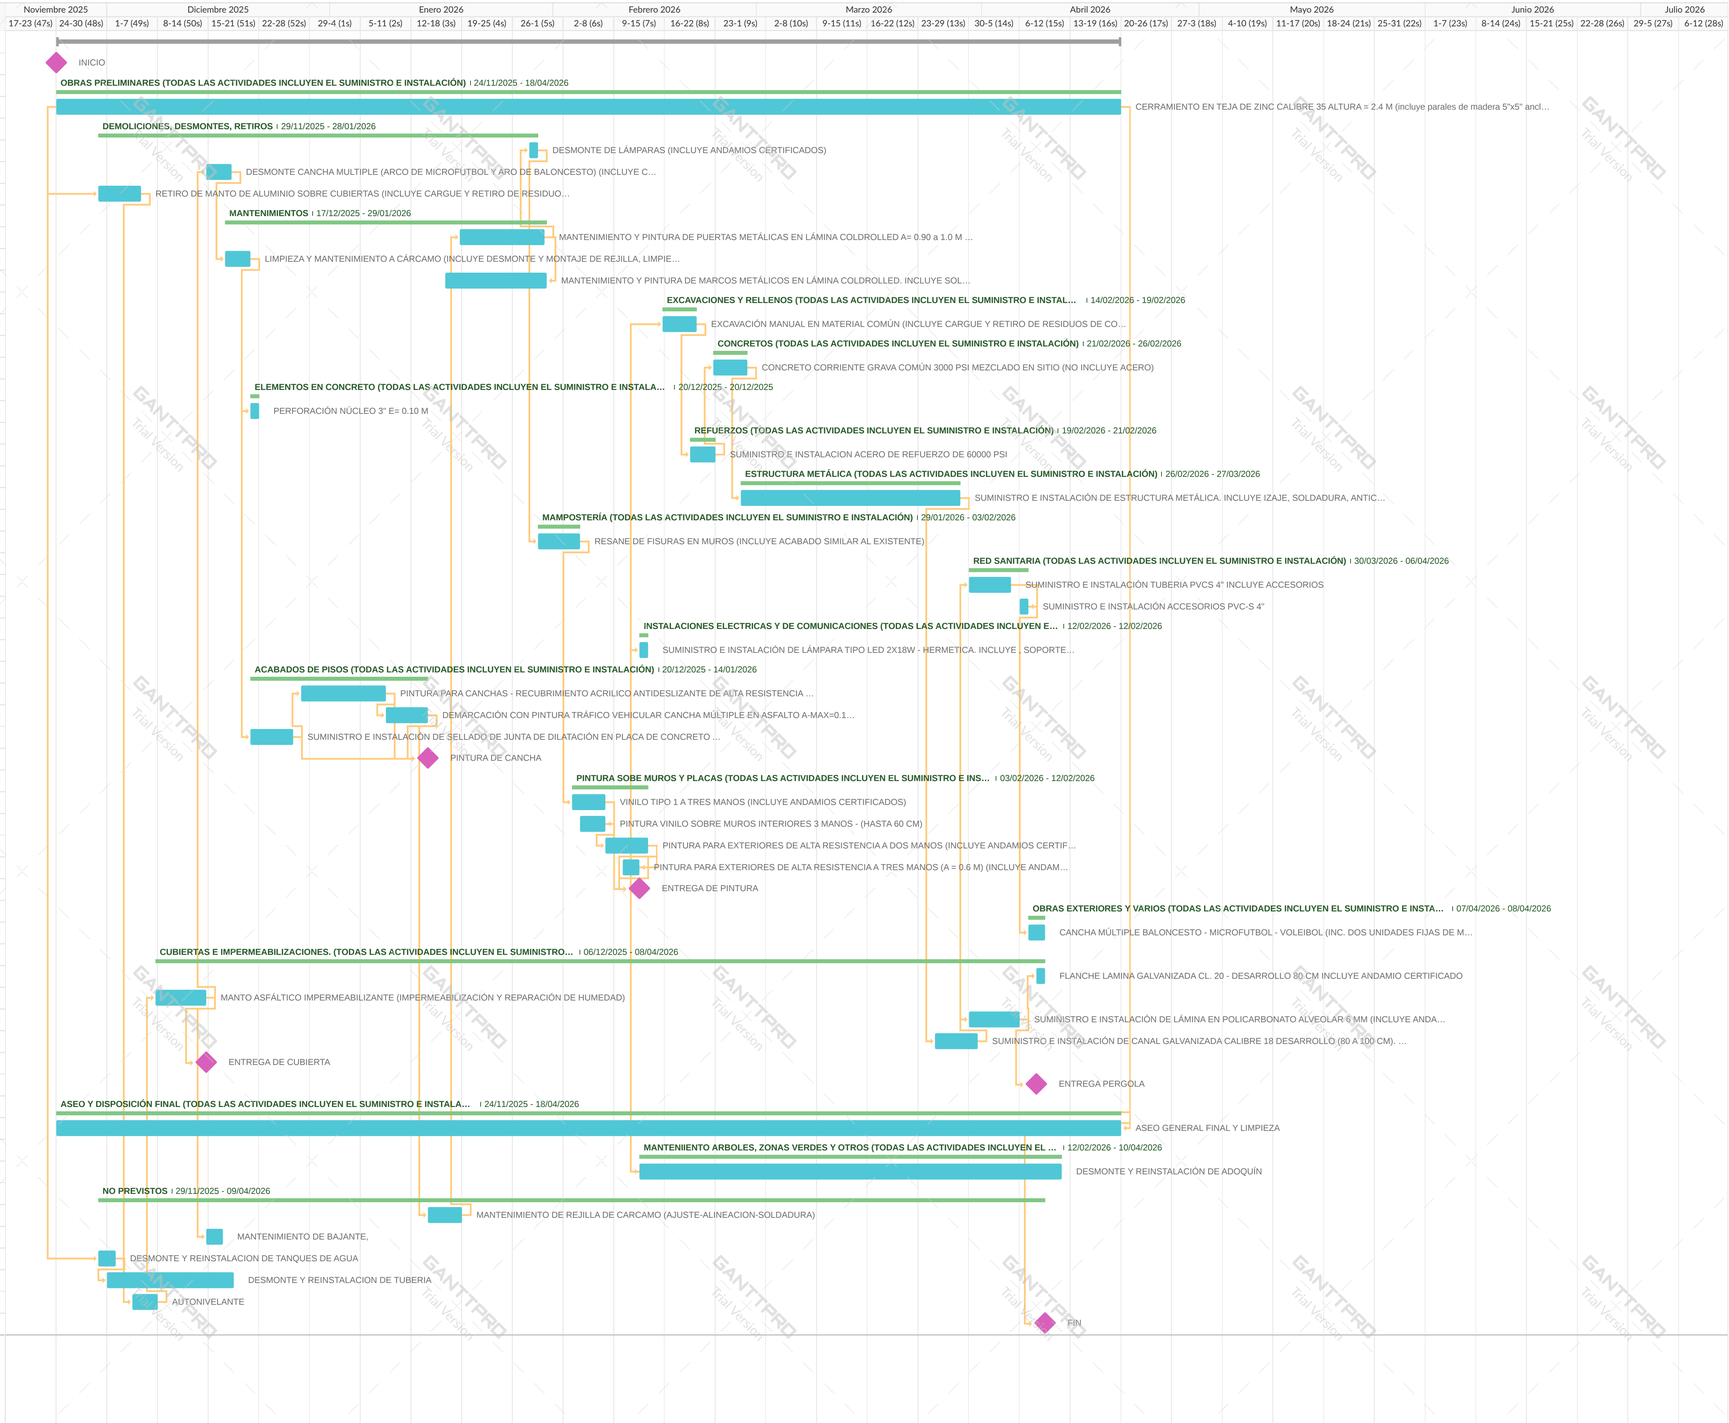


1073246437 | Programacion Colegio Marco Antonio Carreño - Sede B

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		01/12/2025	**25/04/2026**	126d
1	INICIO	01/12/2025	01/12/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/12/2025**	**24/04/2026**	**122d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la neces...	04/12/2025	24/04/2026	122d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**06/12/2025**	**13/03/2026**	**84d**
3.1	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	09/01/2026	15/01/2026	6d
3.2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	26/12/2025	08/01/2026	12d
3.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC...	06/12/2025	10/12/2025	4d
3.4	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	23/12/2025	23/12/2025	1d
3.5	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	18/12/2025	23/12/2025	5d
3.6	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/12/2025	18/12/2025	7d
3.7	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	17/12/2025	23/12/2025	6d
3.8	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	12/03/2026	13/03/2026	2d
3.9	FIN DESMONTE DE CUBIERTA	09/01/2026	09/01/2026	
4	**MANTENIMIENTOS**	**10/04/2026**	**16/04/2026**	**6d**
4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMON...	10/04/2026	16/04/2026	6d
4.2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	10/04/2026	16/04/2026	6d
5	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**31/01/2026**	**06/02/2026**	**6d**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	31/01/2026	06/02/2026	6d
6	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/01/2026**	**30/01/2026**	**3d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	28/01/2026	30/01/2026	3d
7	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**19/02/2026**	**4d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	14/02/2026	19/02/2026	4d
8	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**13/04/2026**	**75d**
8.1	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	16/01/2026	24/01/2026	8d
8.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	09/04/2026	13/04/2026	4d
9	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**28/01/2026**	**4d**
9.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	24/01/2026	28/01/2026	4d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/03/2026**	**05/03/2026**	**4d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	02/03/2026	05/03/2026	4d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	03/03/2026	05/03/2026	3d
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/03/2026**	**09/04/2026**	**18d 7h**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	31/03/2026	01/04/2026	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS N...	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1...	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	04/04/2026	09/04/2026	4d
12	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**13/04/2026**	**115d**
12.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTU...	12/03/2026	18/03/2026	6d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	11/04/2026	13/04/2026	2d
12.3	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO D...	01/12/2025	03/12/2025	3d
13	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/03/2026**	**16/04/2026**	**26d**
13.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	18/03/2026	19/03/2026	2d
13.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARI...	09/04/2026	16/04/2026	7d
13.3	FIN DE PINTURA	16/04/2026	16/04/2026	
14	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/02/2026**	**19/03/2026**	**35d 7h**
14.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	14/03/2026	19/03/2026	4d
14.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	14/03/2026	17/03/2026	3d
14.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTI...	06/02/2026	20/02/2026	13d
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	02/03/2026	12/03/2026	10d
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	12/03/2026	14/03/2026	3d
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TO...	25/02/2026	02/03/2026	5d
14.7	FIN CUBIERTA	19/03/2026	19/03/2026	
15	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**25/04/2026**	**126d**
15.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	01/12/2025	25/04/2026	126d
15.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	15/01/2026	22/01/2026	7d
16	**NO PREVISTOS**	**02/12/2025**	**16/04/2026**	**116d 7h**
16.1	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO Y REINSTALACION	12/03/2026	17/03/2026	5d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	20/03/2026	27/03/2026	7d
16.3	PUERTA CON CHAPA PARA CERRAMIENTO	02/12/2025	03/12/2025	2d
16.4	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN SUPERBOARD	11/04/2026	16/04/2026	4d
16.5	PINTURA REJA CUBIERTA	23/02/2026	24/02/2026	2d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BA...	28/03/2026	31/03/2026	3d
16.7	ENCORAZADO	19/02/2026	23/02/2026	4d
16.8	FIN	16/04/2026	16/04/2026	

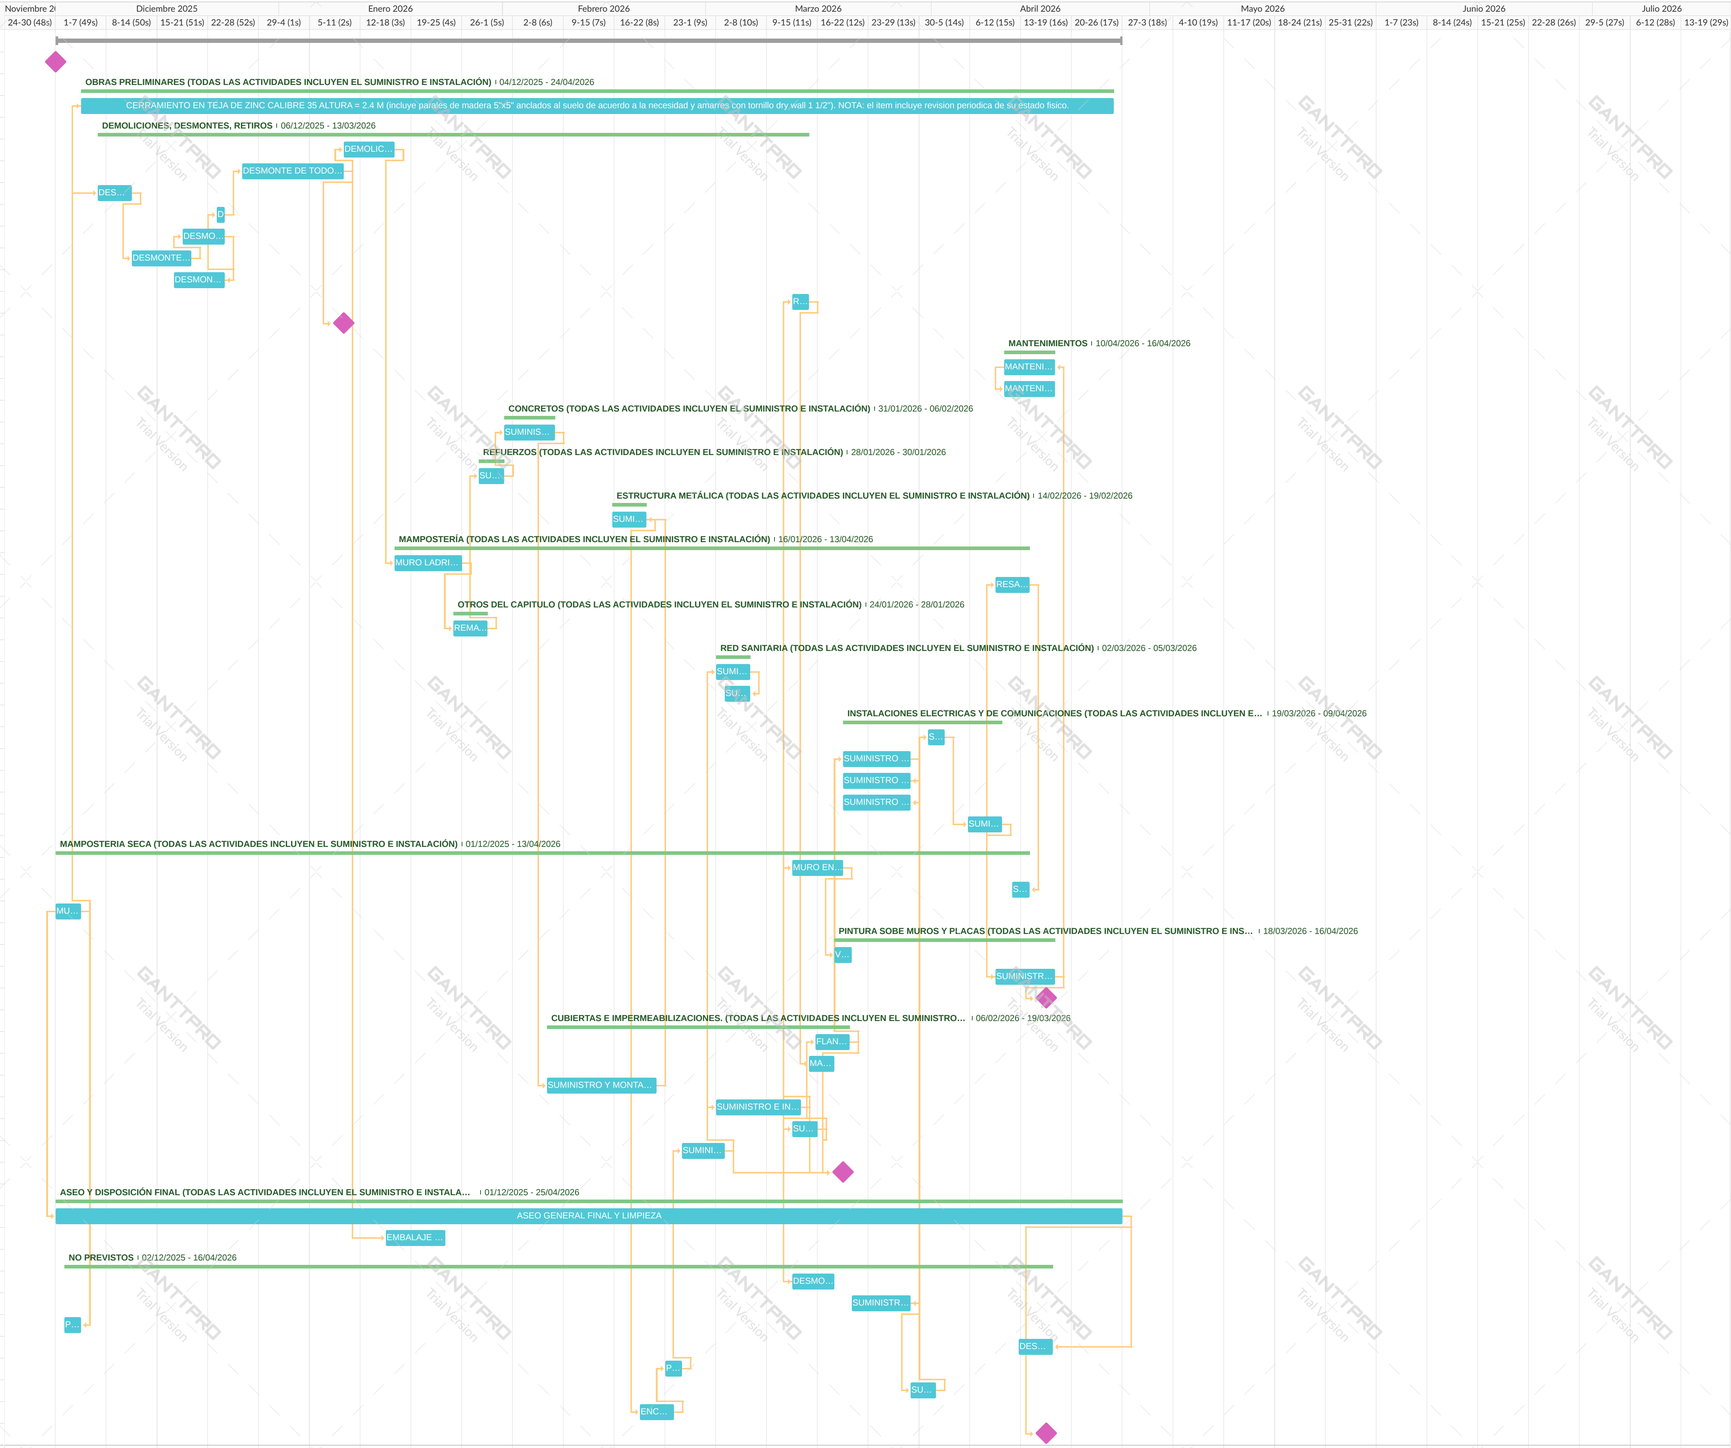


	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		21/11/2025	**11/05/2026**	147d
1	INICIO	21/11/2025	21/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/11/2025**	**11/05/2026**	**147d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	21/11/2025	11/05/2026	147d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**22/11/2025**	**04/04/2026**	**114d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	06/03/2026	07/03/2026	2d
3.2	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	20/12/2025	22/12/2025	2d
3.3	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	22/11/2025	26/11/2025	3d
3.4	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS D...	26/11/2025	28/11/2025	3d
3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	04/04/2026	04/04/2026	1d
3.6	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	13/12/2025	20/12/2025	6d
3.7	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC...	29/11/2025	02/12/2025	3d
3.8	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	04/12/2025	05/12/2025	2d
3.9	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓ...	07/03/2026	10/03/2026	2d
3.10	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	09/12/2025	11/12/2025	3d
3.11	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	02/12/2025	03/12/2025	2d
3.12	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	09/12/2025	11/12/2025	3d
4	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/03/2026**	**05/03/2026**	**3d**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	03/03/2026	05/03/2026	3d
5	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/02/2026**	**03/03/2026**	**2d**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	28/02/2026	03/03/2026	2d
6	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/03/2026**	**20/03/2026**	**5d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	16/03/2026	20/03/2026	5d
7	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**22/04/2026**	**53d**
7.1	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	20/02/2026	27/02/2026	7d
7.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	20/04/2026	22/04/2026	3d
8	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**28/02/2026**	**3d**
8.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	26/02/2026	28/02/2026	3d
9	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/03/2026**	**01/04/2026**	**4d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	28/03/2026	01/04/2026	4d
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	28/03/2026	01/04/2026	4d
10	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**07/04/2026**	**1d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	07/04/2026	07/04/2026	1d
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**23/04/2026**	**14d 7h**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	18/04/2026	21/04/2026	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	18/04/2026	23/04/2026	4d
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 ...	22/04/2026	22/04/2026	1d
11.7	FIN ACTIVIDADES ELECTRICAS	23/04/2026	23/04/2026	
12	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/04/2026**	**09/04/2026**	**2d**
12.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	08/04/2026	09/04/2026	2d
13	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/04/2026**	**18/04/2026**	**5d**
13.1	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRET...	16/04/2026	18/04/2026	3d
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	14/04/2026	15/04/2026	2d
14	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/04/2026**	**14/04/2026**	**9d**
14.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	10/04/2026	14/04/2026	4d
14.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTU...	04/04/2026	09/04/2026	5d
15	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/03/2026**	**27/03/2026**	**13d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	13/03/2026	18/03/2026	5d
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	18/03/2026	23/03/2026	5d
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE...	24/03/2026	27/03/2026	4d
16	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/04/2026**	**21/04/2026**	**11d 7h**
16.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	08/04/2026	17/04/2026	9d
16.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/04/2026	21/04/2026	8d
16.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	16/04/2026	20/04/2026	4d
17	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**09/04/2026**	**27/04/2026**	**16d**
17.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	09/04/2026	10/04/2026	2d
17.2	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	18/04/2026	20/04/2026	1d
17.3	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	23/04/2026	27/04/2026	4d
17.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	23/04/2026	27/04/2026	4d
18	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/03/2026**	**21/04/2026**	**37d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	21/04/2026	21/04/2026	1d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	10/03/2026	12/03/2026	3d
19	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/03/2026**	**11/04/2026**	**28d**
19.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	10/03/2026	21/03/2026	11d
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	25/03/2026	04/04/2026	10d
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	07/04/2026	10/04/2026	4d
19.4	FIN DE CUBIERTA	11/04/2026	11/04/2026	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/11/2025**	**11/05/2026**	**147d**
20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	21/11/2025	11/05/2026	147d
20.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	29/12/2025	02/01/2026	5d
21	**NO PREVISTOS**	**06/12/2025**	**27/04/2026**	**121d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BAR...	15/04/2026	18/04/2026	4d
21.2	ESCARIFICIACION	04/04/2026	07/04/2026	2d
21.3	DESMONTE DE REJA DE TECHO	12/12/2025	13/12/2025	2d
21.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	04/04/2026	16/04/2026	10d
21.5	SUMINISTRO E INSTALCIONES DE ACOPLE SANITARIO DE 50CM	20/04/2026	20/04/2026	1d
21.6	DEMOLICION DE MUROS DE SUPERBOARD INCLUYE EL RETIRO	06/12/2025	08/12/2025	2d
21.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA DE .80X2.10 INCLUYE CHAPA	09/04/2026	10/04/2026	2d
21.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TI...	21/04/2026	21/04/2026	1d
21.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL , BRIDA DE ...	20/04/2026	20/04/2026	1d
21.10	ENCOROZADO	21/03/2026	24/03/2026	3d
21.11	PAÑETE LINEAL .HASTA 59 M	27/02/2026	05/03/2026	6d
21.12	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA CON PERSIANA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	05/03/2026	10/03/2026	5d
21.13	ENTREGA DE BAÑO	22/04/2026	22/04/2026	
21.14	FIN	27/04/2026	27/04/2026	

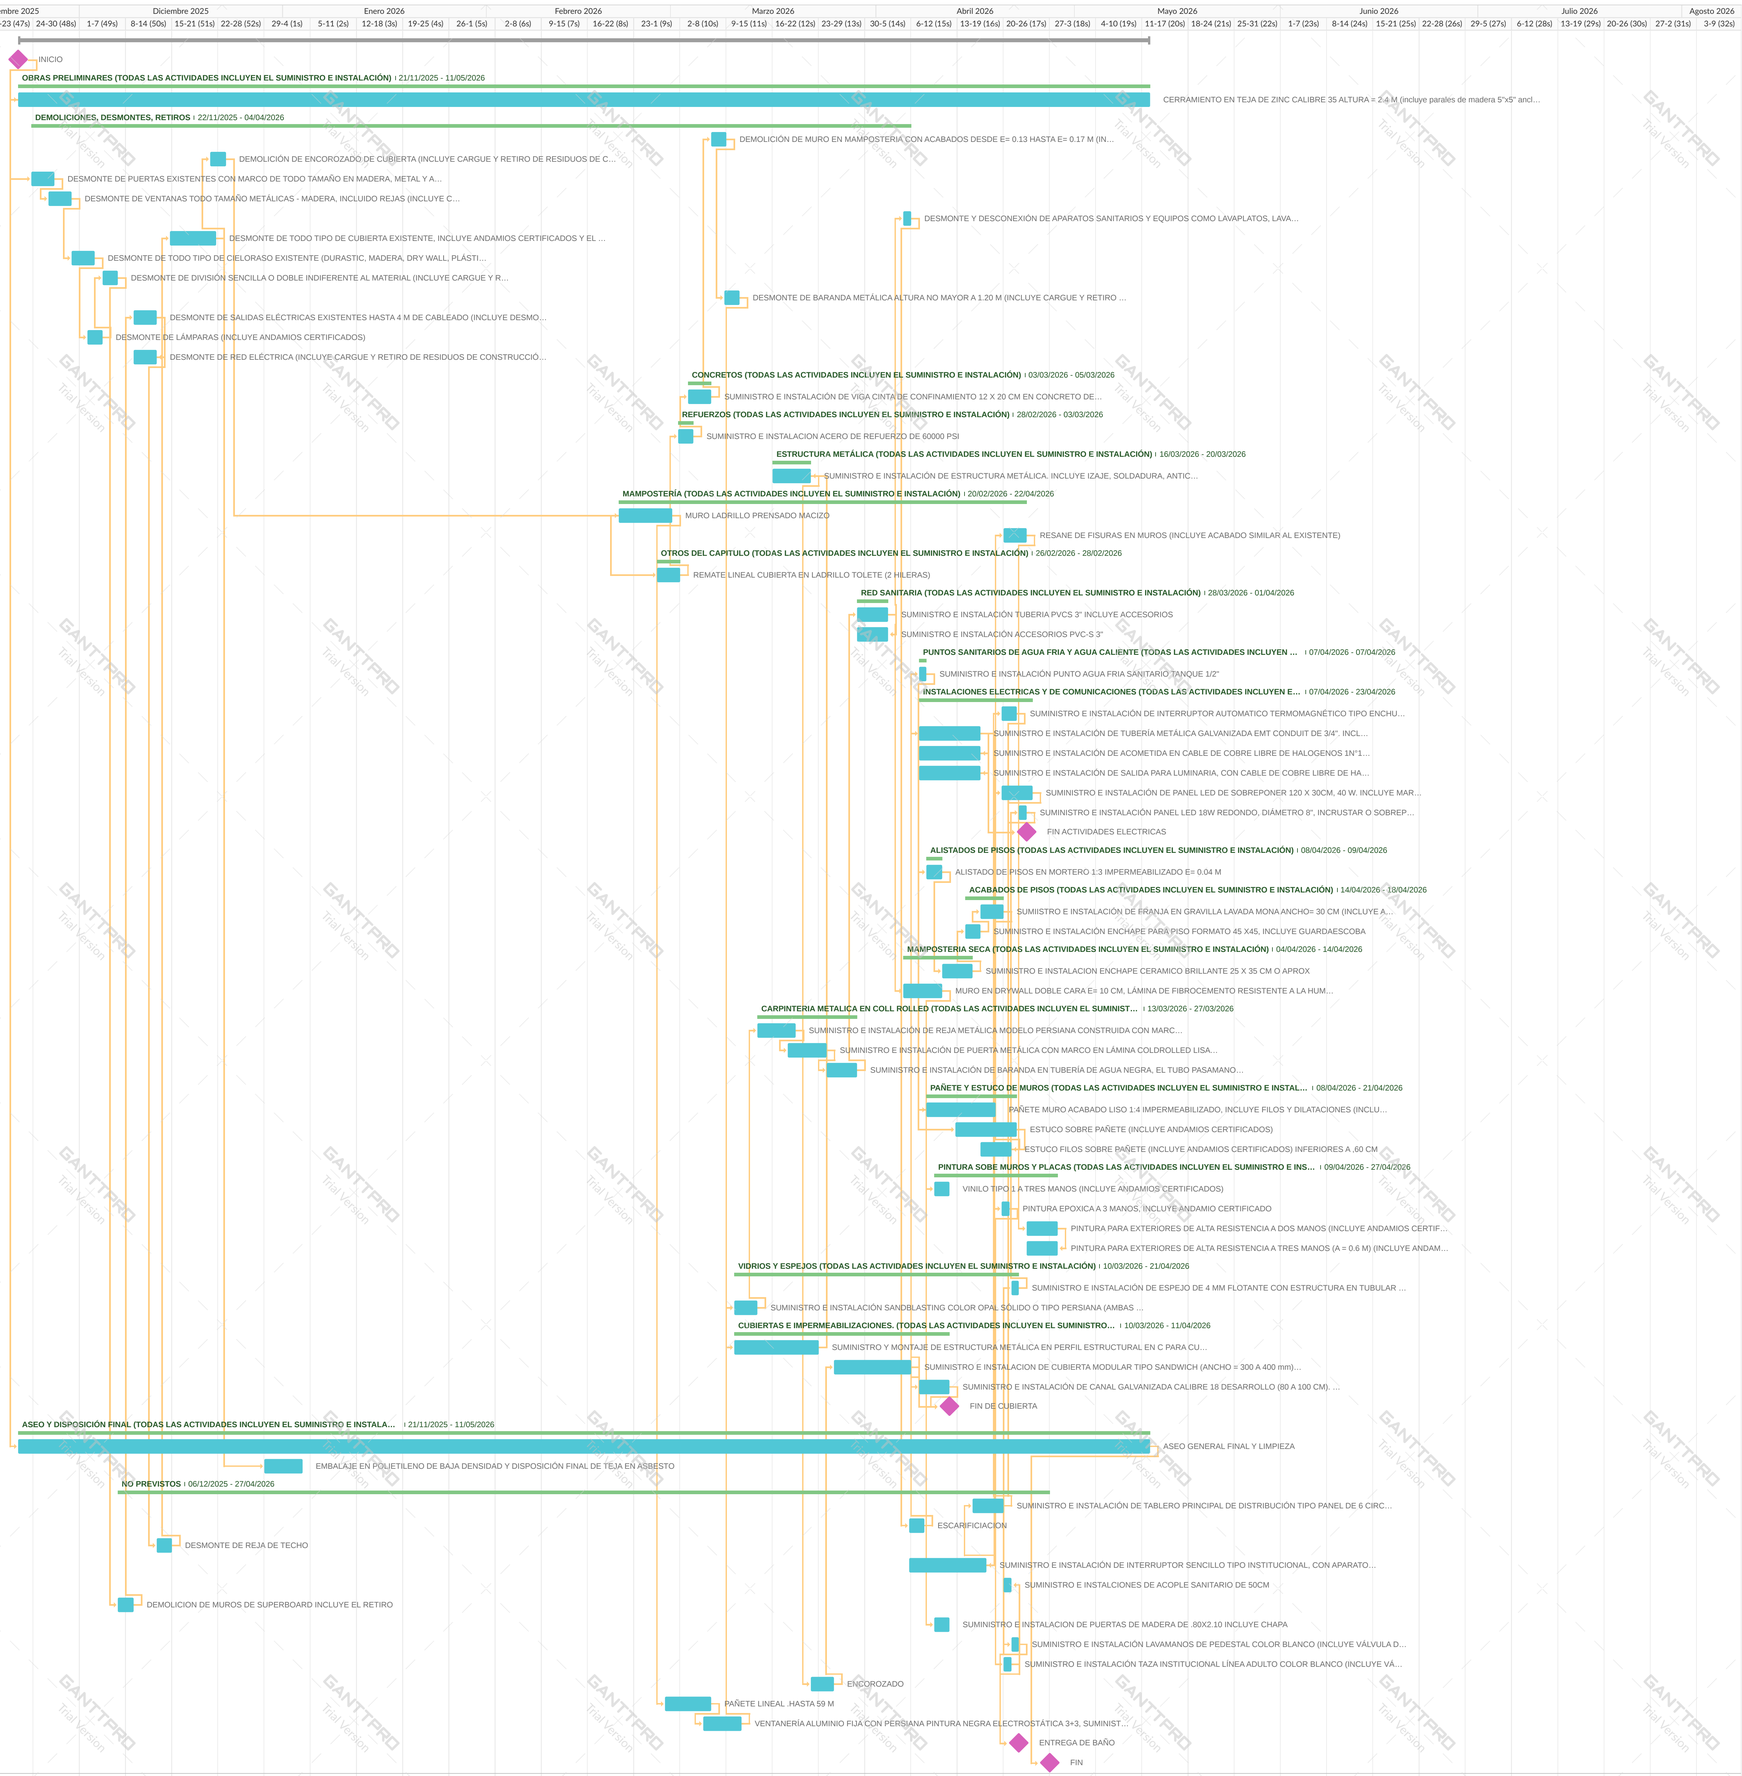

1073246437 | Programacion Colegio Cultura Popular - Sede C

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		13/11/2025	**24/01/2026**	63d
1	INICIO	13/11/2025	13/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/11/2025**	**24/01/2026**	**63d**
2.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplaz...	09/12/2025	09/12/2025	1d
2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	13/11/2025	24/01/2026	63d
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de i...	14/11/2025	14/11/2025	1d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**15/11/2025**	**11/12/2025**	**22d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ...	11/12/2025	11/12/2025	1d
3.2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA M...	18/11/2025	19/11/2025	2d
3.3	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FIN...	03/12/2025	03/12/2025	1d
3.4	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	02/12/2025	02/12/2025	1d
3.5	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAM...	01/12/2025	02/12/2025	2d
3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CAR...	15/11/2025	17/11/2025	1d
4	**MANTENIMIENTOS**	**16/01/2026**	**21/01/2026**	**5d**
4.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, ...	16/01/2026	21/01/2026	5d
4.2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	17/01/2026	20/01/2026	3d
5	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/12/2025**	**10/12/2025**	**1d**
5.1	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, C...	10/12/2025	10/12/2025	1d
6	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/12/2025**	**12/12/2025**	**1d**
6.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	12/12/2025	12/12/2025	1d
7	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/12/2025**	**18/12/2025**	**4d**
7.1	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJE...	16/12/2025	17/12/2025	2d
7.2	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	16/12/2025	18/12/2025	3d
7.3	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ...	15/12/2025	15/12/2025	1d
8	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/12/2025**	**15/12/2025**	**1d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	15/12/2025	15/12/2025	1d
9	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**22/12/2025**	**3d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABAD...	19/12/2025	22/12/2025	3d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/12/2025**	**29/12/2025**	**14d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	27/12/2025	29/12/2025	2d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	27/12/2025	29/12/2025	2d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	13/12/2025	15/12/2025	2d
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**13/12/2025**	**15/12/2025**	**2d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	13/12/2025	15/12/2025	2d
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/12/2025**	**30/12/2025**	**2d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	29/12/2025	30/12/2025	2d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/12/2025**	**30/12/2025**	**1d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	30/12/2025	30/12/2025	1d
14	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17/01/2026**	**17/01/2026**	**1d**
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	17/01/2026	17/01/2026	1d
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**21/01/2026**	**12d**
15.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) ...	08/01/2026	10/01/2026	3d
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	17/01/2026	20/01/2026	3d
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	10/01/2026	19/01/2026	8d
15.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG ...	10/01/2026	14/01/2026	4d
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	10/01/2026	14/01/2026	4d
15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NEC...	17/01/2026	21/01/2026	4d
15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PAR...	20/01/2026	20/01/2026	1d
16	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**09/01/2026**	**13d**
16.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	29/12/2025	30/12/2025	2d
16.2	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	26/12/2025	27/12/2025	2d
16.3	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	05/01/2026	09/01/2026	5d
17	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/12/2025**	**19/01/2026**	**34d**
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	02/01/2026	09/01/2026	7d
17.2	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	16/01/2026	19/01/2026	3d
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	10/01/2026	15/01/2026	5d
17.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PAR...	11/12/2025	13/12/2025	3d
18	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**05/01/2026**	**9d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	02/01/2026	05/01/2026	3d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA ...	26/12/2025	29/12/2025	3d
19	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**12/01/2026**	**2d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISA...	10/01/2026	12/01/2026	2d
19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON...	10/01/2026	12/01/2026	2d
20	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/12/2025**	**30/12/2025**	**1d**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	30/12/2025	30/12/2025	1d
21	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**16/01/2026**	**1d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	16/01/2026	16/01/2026	1d
21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	16/01/2026	16/01/2026	1d
22	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**08/01/2026**	**17d 7h**
22.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	19/12/2025	24/12/2025	5d
22.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	19/12/2025	24/12/2025	5d
22.3	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	03/01/2026	08/01/2026	4d
22.4	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	03/01/2026	08/01/2026	4d
22.5	ENTREGA DE OBRA GRIS	08/01/2026	08/01/2026	
23	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**21/01/2026**	**12d**
23.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	20/01/2026	3d
23.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	17/01/2026	20/01/2026	3d
23.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	20/01/2026	20/01/2026	1d
23.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	21/01/2026	4d
23.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	21/01/2026	4d
23.6	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEM...	08/01/2026	09/01/2026	2d
23.7	ENTREGA DE OBRA BLANCA	21/01/2026	21/01/2026	
24	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/01/2026**	**16/01/2026**	**2d**
24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASIL...	15/01/2026	16/01/2026	2d
25	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**22/12/2025**	**21/01/2026**	**27d**
25.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	27/12/2025	27/12/2025	1d
25.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFI...	16/01/2026	21/01/2026	5d
25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	22/12/2025	24/12/2025	3d
25.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS ...	27/12/2025	30/12/2025	2d
25.5	ENTREGA DE CUBIERTA	21/01/2026	21/01/2026	
26	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/11/2025**	**24/01/2026**	**63d**
26.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	13/11/2025	24/01/2026	63d
26.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	15/01/2026	15/01/2026	1d
27	**NO PREVISTOS**	**14/11/2025**	**22/01/2026**	**59d**
27.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS PUERTA, BARRAJES DE NEU...	15/01/2026	16/01/2026	2d
27.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE...	10/01/2026	14/01/2026	4d
27.3	DESMONTE Y REINTALACION DE REJA DE CERRAMIENTO	10/12/2025	21/01/2026	36d 2h
27.4	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO	14/11/2025	14/11/2025	1d
27.5	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO	10/12/2025	10/12/2025	1d
27.6	CHAPA DE SEGURIDAD	13/01/2026	13/01/2026	1d
27.7	PUERTA DE REJA EN LA MALLA DE CERRAMIENTO	15/11/2025	15/11/2025	1d
27.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE GALLINERO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	13/12/2025	19/12/2025	5d
27.9	FIN	22/01/2026	22/01/2026	

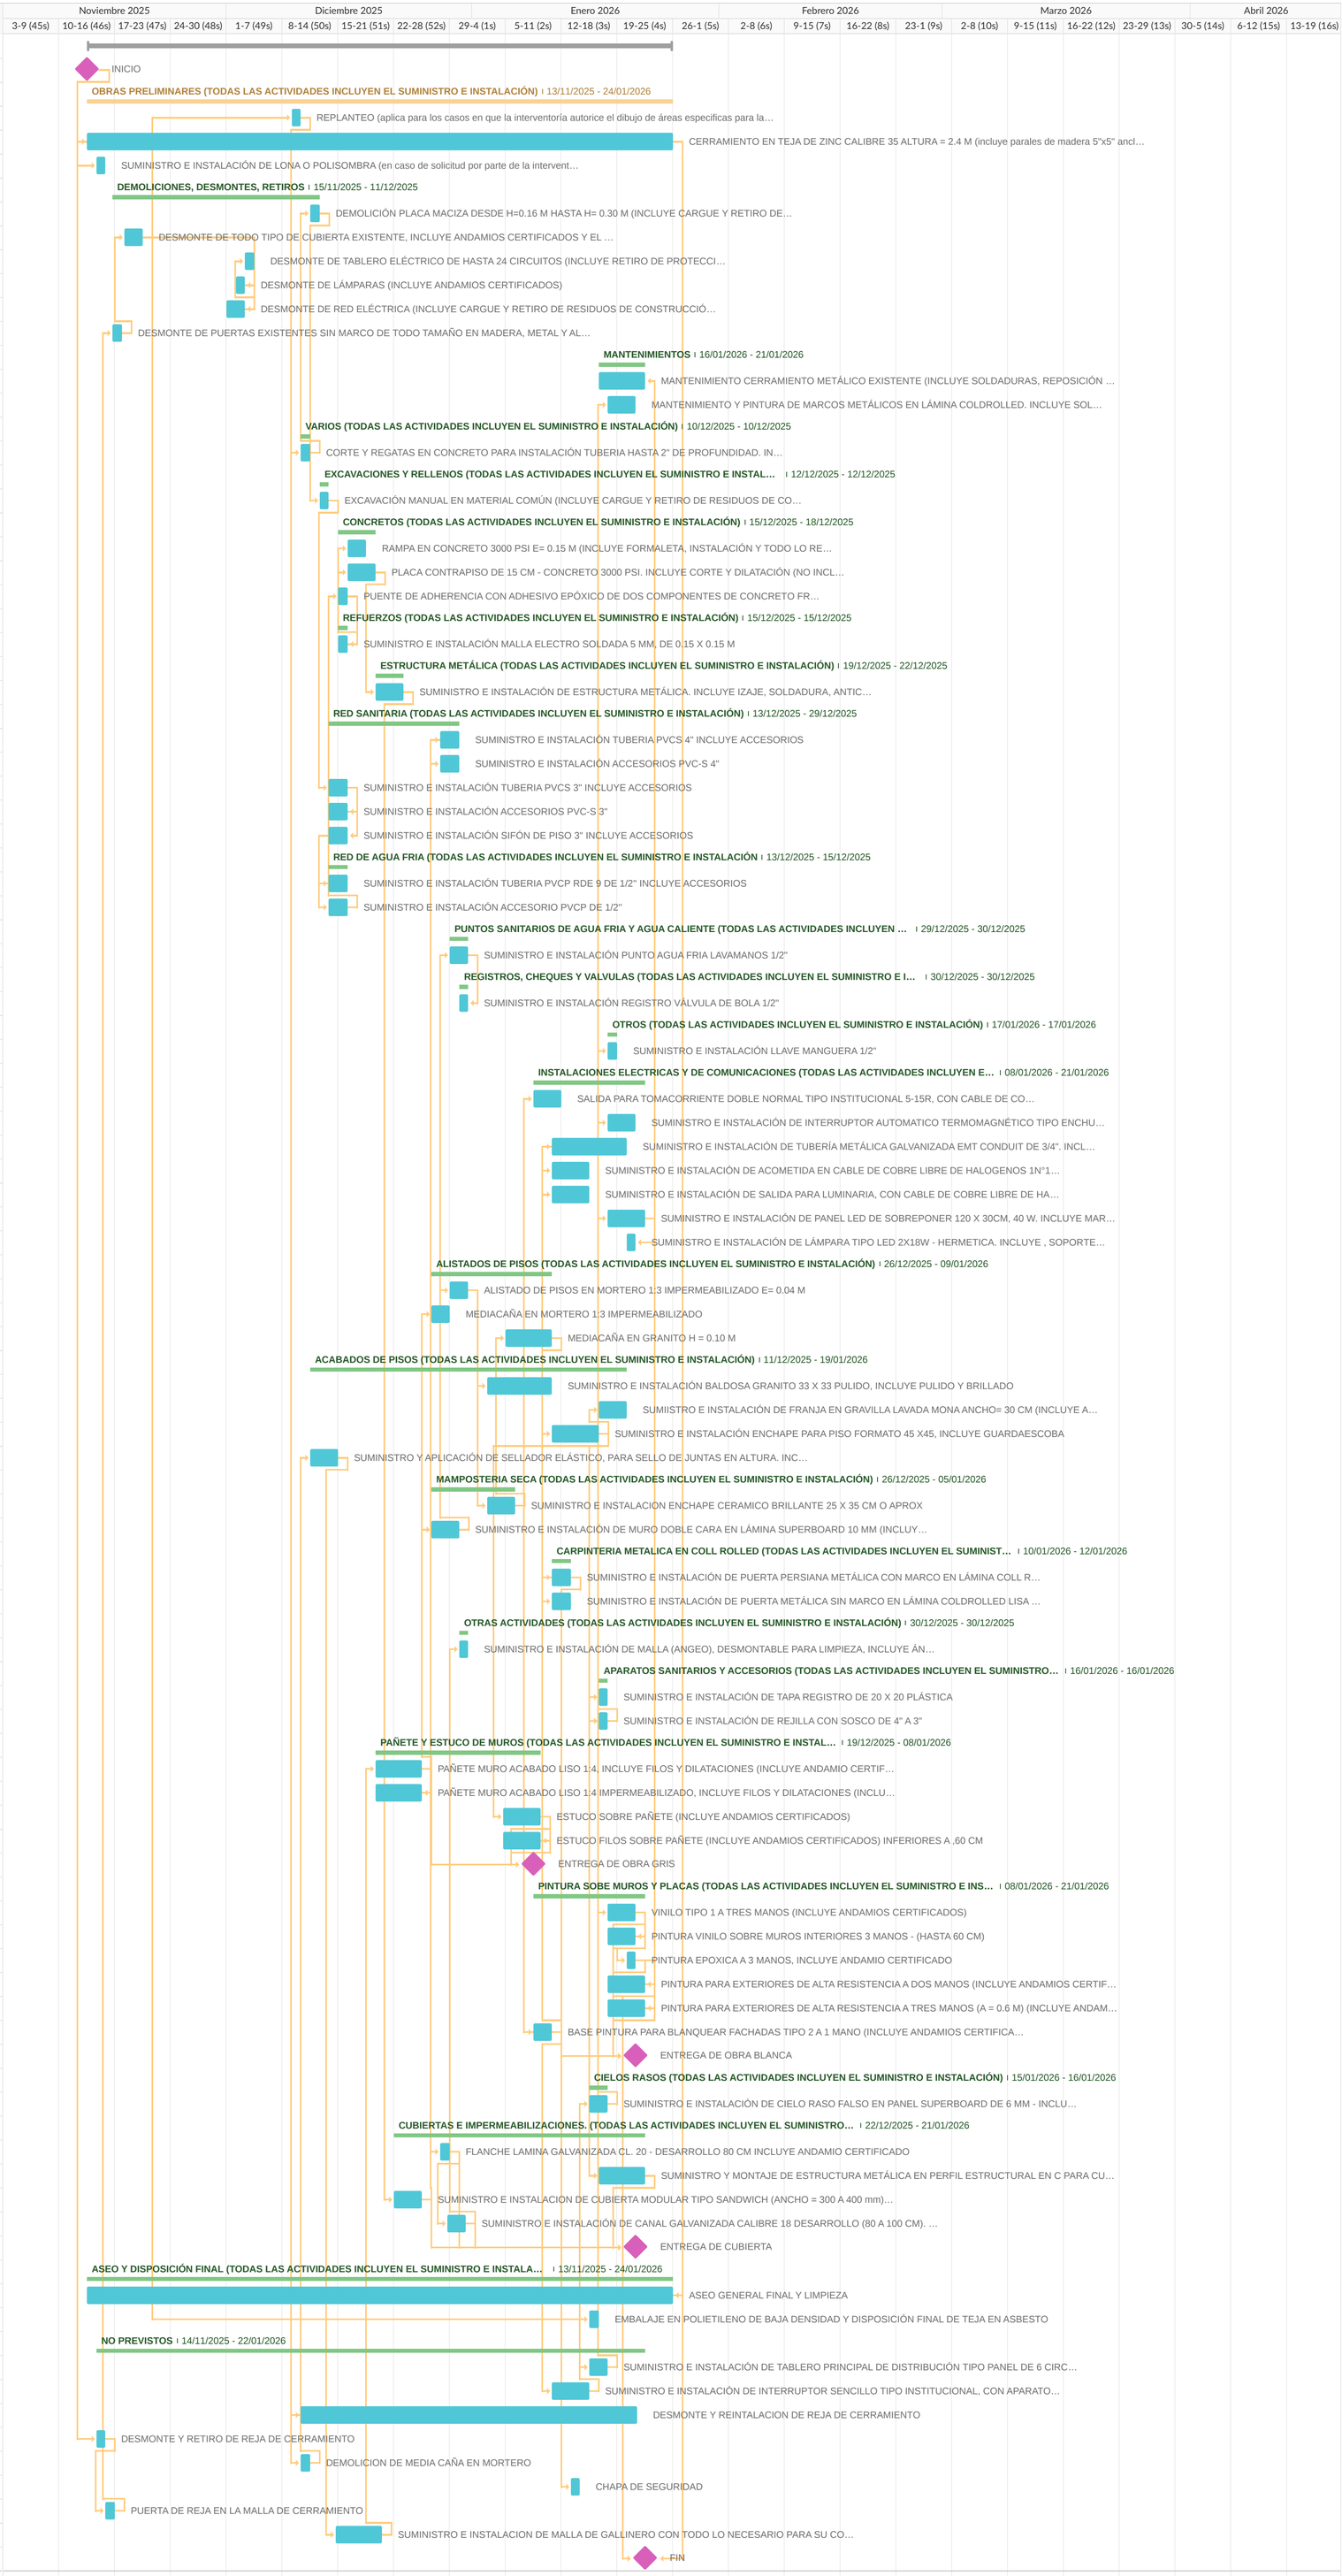

ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A

SEMANA No. 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias



Se evidencia que se realiza el armado de la zapata, incluida la parrila.



Se evidencia que se esta realizando la demolicion y excacion del 03 punto de intervencion estructural.



Lunes: No se evidencia personal en el aula CRIL.



Se evidenciaun 90% del desarrollo total de la demolicion y excacion del 03 punto para la intervencion estructural.



Se evidencia que se fundio la parte inferior de la zapata N°2.



Se evidencia que la disposicion de la tierra negra de la excavacion en el area de la casona se esta realizando sobre el jardin existente, la SST lo autoriza mientras esta sea dispersada correctamente.

SEMANA No. 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias



Martes: No se evidencia personal en el aula CRIL.



Se evidencia que se esta realizando la figuracion del acero para el armado de la tercera zapata.



Se evidencia que se realizo la instalacion de tuberia en MT, los puntos electricos y las luminarias del aula CRIL.



Se evidencia que se fundio la parte inferior de la zapata N°3.



Se evidencia que se esta realizando el armado de la formaleta de la zapata N°2.




Se evidencia que se avanza en el resane de muros en el aula CRIL.

SEMANA No. 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias




Se evidencia que se finaliza el armado de la formaleta de la zapata N°2.

SEMANA No. 19 (Consecutivo) **DEL** 9/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias

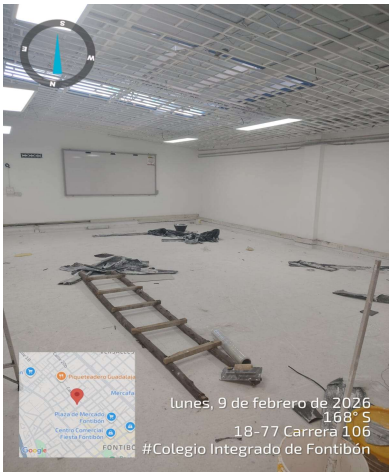

Se evidencia que se esta realizando la segunda capa de pintura de aula CRIL.

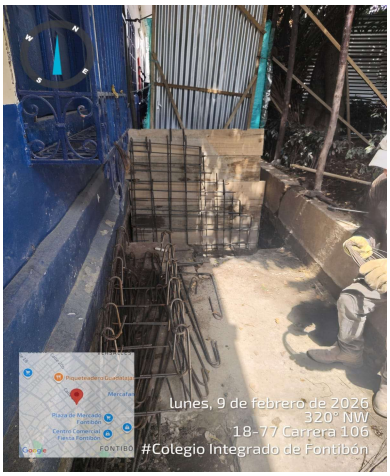

Se evidencia que se empieza a ejecutar el armado de la formaleta de la zapata N°3 en el area de la casona.



Se evidencia que se realiza el proceso de desencofrado de la zapata N°2.



Se evidencia que se empieza a ejecutar el armado de la formaleta de la zapata N°3 en el area de la casona.



Se evidencia el personal que realiza el proceso de mezcla para fu ndir la zapata N°3.



Se evidencia que se funde la zapata N°3 en su totalidad y se espera secado para desencofrar.

SEMANA No. 19 (Consecutivo) **DEL** 9/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias



Se evidencia que se funde la zapata N°3 en su totalidad y se espera secado para desencofrar.



Se evidencia que se finalizan actividades de pintura al interior del aula CRIL.



Se evidencia que esta pendiente realizar la limpieza fina y el brillado del piso del aula CRIL.



Se evidencia que se esta realizando el proceso de demolicion y excavacion para la zapata N°4.



Se evidencia que se esta realizando el proceso de demolicion y excavacion para la zapata N°4.



Se evidencia que se realiza el desencofrado de la zapata N°4.

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias



Se evidencia que se estan ultimando detalles de pintura en el area de la cercha.



Se evidencia que se esta realizando detalles de pintura en el area que presenta detalles.



Se evidencia que se esta finalizando el armado de la zapata N°4.



Se evidencia que se realiza el encofrado con la formaleta de la zapata N°4.



Se evidencia que se esta realizando la mezcla para fundir la zapata N°4, se revisa dosificacion.



Se evidencia que la zapata N°4 se encuentra en procesode fraguado,

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias




Se evidencia que se realizo los detalles correspondientes al ingreso del aula CRIL.



Se evidencia que se realizo los detalles correspondientes al ingreso del aula CRIL.



Se evidencia que se avanza en la limpieza de tuberia MT, tuberia de gas natural y canaleta.

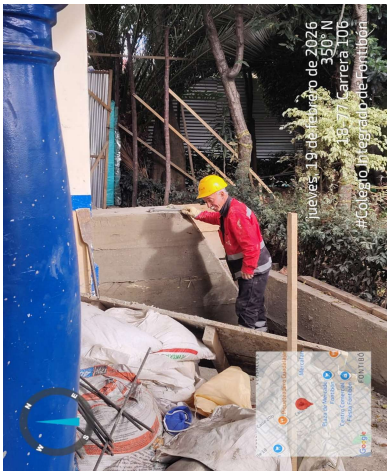

Se evidencia que se realiza el desencofrado de la zapata N°4.



Se evidencia que se avanza en la limpieza de canaleta.

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.



Entrega aula CRI: Se realizan observaciones en referencia a la instalacion de la canal, la cual se informa que se dara respuesta por parte del apoyo de la supervision via e-mail.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias



Entrega aula CRI: Se evidencia el ajuste de la canaleta de acuerdo a lo observado durante la entrega, se autoriza por parte del apoyo a la supervision.




Entrega aula CRI: Se evidencia la instalacion de tapa ciega plastica blanca de acuerdo a los detalles observados durante la entrega, autoriza el apoyo de la supervision.



Entrega aula CRI: Se evidencia la instalacion de tapa ciega plastica blanca de acuerdo a los detalles observados durante la entrega, autoriza el apoyo de la supervision.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la instalacion de tornilleria internamente en la cubierta tipo sandwich.

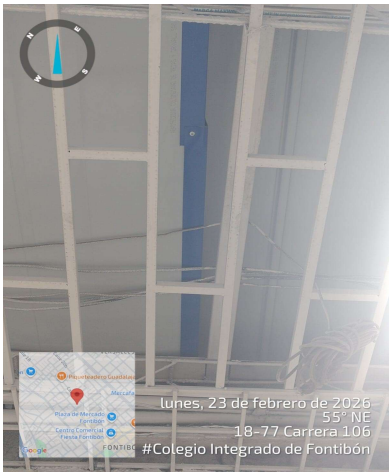

Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la instalacion de tornilleria internamente en la cubierta tipo sandwich.



Se evidencia la instalacion de malla electrosoldada y que se da inicio a la fundida de la placa de contrapiso para el anden de la casona.

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias



Se evidencia la instalacion de malla electrosoldada y que se da inicio a la fundida de la placa de contrapiso para el anden de la casona.




Se evidencia que se realiza la derivacion de la bajante de aguas lluvias del costado derecho de la casona.



Se evidencia la dosificacion de las cantidades requeridas para la mezcla de placa del anden en el area del casona.



Se evidencia que se realiza en sitio la mezcla para la placa del anden con mezcladora en sitio.

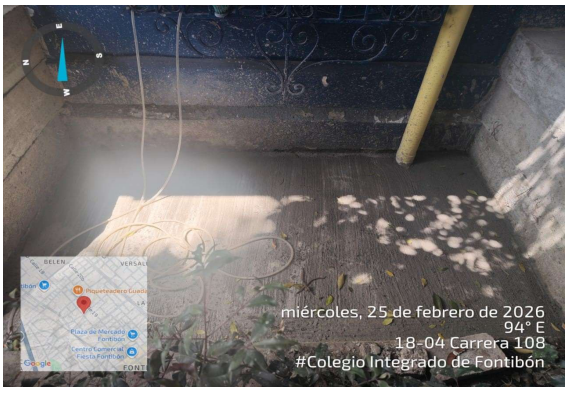

Se evidencia que se afina y se da acabado al area ya fundida en referencia a la placa del anden en la casona.



Se evidencia que se realiza el desarrollo de la instalacion de las bajantes de aguas lluvias correspondientes a la canal de la casona.

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias



Se evidencia que se afina y se da acabado al area ya fundida en referencia a la placa del anden en la casona.



Se evidencia que se esta realizando la placa correspondiente al anden en el area de la casona .

ANEXO N° 1.12:
RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C


SEMANA No. 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias



Se evidencia que se realizo la jornada de aseo del anuncio del colegio, esta pendiente la finalizacion de la ventaneria.



Lunes: No se evidencia personal en obra, se observa que los frentes estan cerrados.

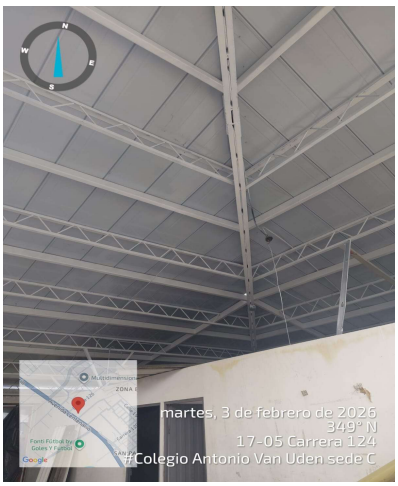

Se evidencia que se realizo la instalacion de la cubierta en el area de la biblioteca.



Se evidencia que se avanza en las actividades de pañete de la bateria de baños.



Se evidencia que se realizo la instalacion de la cubierta en el area de la biblioteca.



Se evidencia que se realizo la instalacion de la cubierta en el area de la biblioteca.

SEMANA No. 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias



Se evidencia que se avanza en las actividades de pañete de la bateria de baños.



Se evidencia que se realiza el sello de la ventana instalada pendiente.



Se evidencia que se avanza en las actividades de pañete de la bateria de baños.



Se evidencia que se avanza en las actividades de pañete en las cuchillas de la bateria de baños.



Se evidencia que se estan realizando los filos de los muros de la bateria de baños.



Se realiza jornada de orden y aseo en el area de la biblioteca.
