
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27.03.2026	Inicio	10:28 AM.	Fin	12:00 pm.	Lugar	Integrado de Fontibon - Sede A.
Asunto	Comite de Obra N°13						
Asistentes					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	27.03.2026.	Elaborado por	Residente de interventoria - Natalia Mora La Rotta			Próxima Reunión	

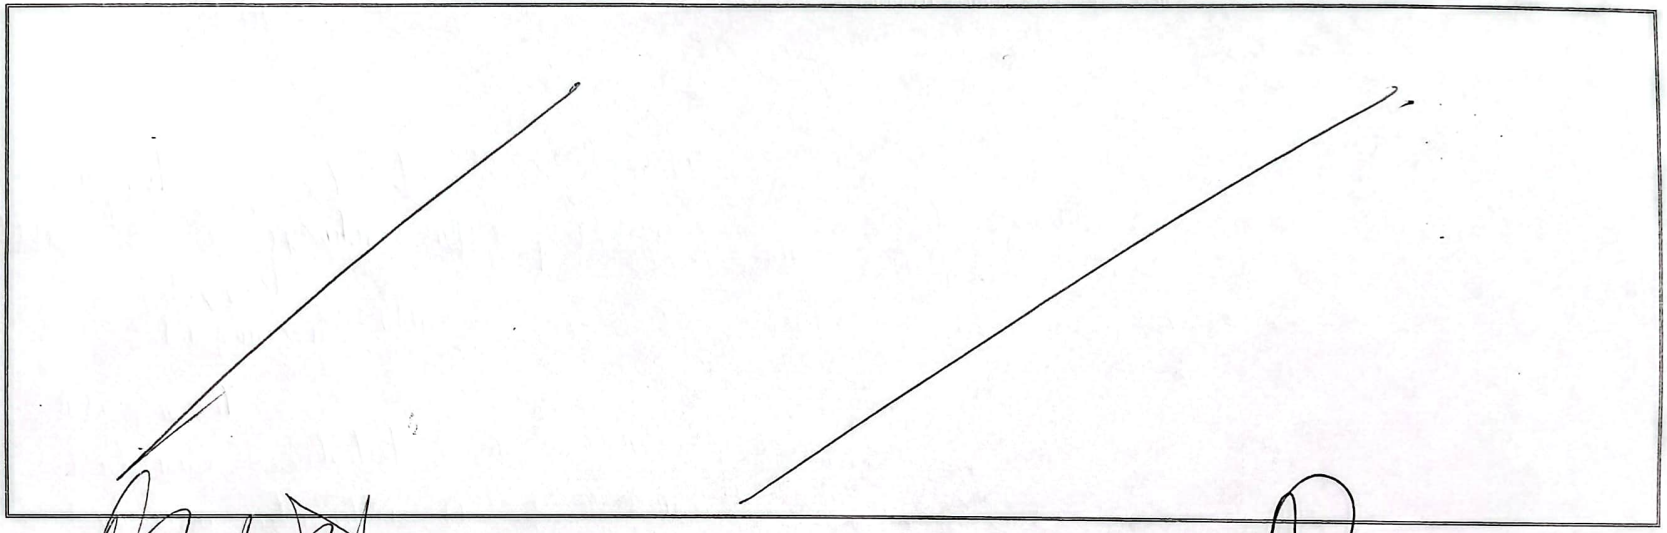

NOMBRE: Hernan Lopez Paez.
CARGO: Supervisor del Contrato.

NOMBRE: Lorena Rodriguez Rodriguez.
CARGO: Supervisor del contrato.

Yesenia Ramirez.

NOMBRE: Natalia Mora La Rotta
CARGO: Residente de Interventoria

NOMBRE: Andres Cortes
CARGO: Residente Obra

NOMBRE: Maria Yesenia Camacho
CARGO: Inspector Interventoria

NOMBRE: Oscar A. Lopez Gil
CARGO: Residente de obra

NOMBRE: FRANS COCK
CARGO: DIRECTOR OBRA

NOMBRE: Paula Martinez
CARGO: Residente de Interventoria

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	1-4-26	Inicio	9:30 am	Fin		Lugar	SED
Asunto	Acta de Comite. Nº14.						
Asistentes	Supervision, Interventoria, Contratista Obra.					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	1-4-26	Elaborado por	Arq. Paula Martinez			Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

- Balance: Revision el Sabado
  Ver tema de rejas (Prioritario)

- Informe Semanal: De acuerdo con el informe semanal presentado, la supervisión aclara que no se puede hacer modificatoria con el 7. de atraso.

-Integrado: Se solicitan actas de entrega. (Ambas). Definitiva y espacio pendiente a entregar.

-Van Uden: Baño: Fachada Blanca.
Lavamanos: Tapar hueco a.60
Lamparas de Biblioteca: Enviar registro fotograficos.

-Internacional: N.P Bombas → URGENTE
La supervisión menciona que en caso que se presente novedad de rebosamiento, esto va a costa del contratista.
Caja en Concreto
Entrega viernes 10 de abril.
Entrega Baterias Martes 7 de abril.
Actas recibido de espacios y acta final de entrega.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- Venezuela: Reprogramación
  La interventoría reitera que lleva mes y medio solicitando andamio para verificar las condiciones efectuadas con la instalación del manto asfáltico.
  Se reitera que bajante se debe conectar a caja de inspección.
- Marco Antonio Carreño: Se menciona que el frente debe entregarse el 25 de abril. y se solicita reporte diario
- Julio Garavito: Se mencona que las ventanas no están incluidas en el presupuesto por lo que hay que incluirlas.
  Tapar todo → No ventana.

- <<Compromisos adquiridos>>
- Cultura Popular: Entregado
- Jazmín Sede B: Entrega 2 de Mayo
  CCTV. → Trabajando
- Canelones: Entre lunes y martes se instalará equipos de dosificación
- Merced: Ya se realizaron actividades de carcamo, placa y tubería.
  Faltan actividades de cerramiento y desconectar tanques para bajarlos.
  Verificar ubicación 3 tanques, como se harán conexiones, cubierta, malla eslabonada
  N.P Equipo.
- Villemar Sede C: Se estableció que la rejilla del carcamo es metálica, debido a dimensiones. Metálica y con Angulo

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Cocna: Falta, el contratista se compromete a hacer actividades el siguente fin de semana.
Canaleta: Se encuentra en fabricación (para desviar acometida).

Se determina que se debe alargar la zona que va en gravilla por temas de persepción.

- N.P.s. → Se han realizado observaciones, por lo tanto se acuerda que se radiquen los concertados, respecto a los demas el contratista solicita mesa de trabajo con la SED (secretaria de educación).

Se recuerda que la descripción de NPs debe incluir "y demas actividades para su correcta ejecución"

- Acta Parcial: El 5 debe quedar radicado a interventoria.
El 10 debe quedar radicado a supervisión.

NOMBRE: TRANS COCE	NOMBRE: Jorge Rodriguez R.	NOMBRE: Natalia Maria la Fe
CARGO: DIRECTOR DE OBRA	CARGO: Directora de Interven.	CARGO: Residente de Interventor
NOMBRE: Andrea Catalina Garcia	NOMBRE: Hernan Gloria Lopez	NOMBRE:
CARGO: Residente Obra	CARGO: Apoyo Supervision.	CARGO:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:

Powered by CamScanner

Con la pintura de la biblioteca interna y externa y
se continua con la destroncada del paso-se
finalizan actividades a las 5pm. Se labora
con herramienta menor ~~se trabaja~~
~~el~~ lleno en las horas de la tarde.
27-02-026 Se inician actividades a las 7am
Se labora con 3 personas
Carlos Chaparro D.C 1931879?
Pedro Felipe Buitrago Nuñez 1033790393
Alberto Hurtado Hurtado 19724924
Se continua con la pulida de las barras y la
media caña de la bodega y arco y
se pinta el aula faltante de ventanería en
la parte blanca - Clima soleado se labora con
herramienta menor, se finalizan actividades a las
5pm
28-02-026 - ~~Se labora~~ Festivo
Se inician actividades a las 7am
Se labora con 3 personas
Carlos Oswaldo Chaparro Diaz a 1931879?
Pedro Felipe Buitrago Nuñez 1033790393
Luis Eduardo Bermudez Leal 1024305693
Se continua Retocando la Pared la
Pintura de la biblioteca y el salon del
Bloque Alianza Se finalizan actividades a las
2:30 pm
01-03-026 - No se labora Dia festivo
02-03-026 Se inicia actividades a las 7am
Se labora con 2 personas
Carlos Oswaldo Chaparro Diaz a 1931879?
Pedro Felipe Buitrago Nuñez 1033790393
Se continua con la pintura de la estructura
de los barras y de los muros de la biblioteca
Clima soleado se labora con herramienta
menor se finalizan actividades a las 5 a
las 5pm.

03-03-26 Se inician actividades a las 7am
Se labora con 3 personas
Carlos Chaparro Daza 1931879
Pedro Felipe Buitrago Mora 1033790393
Carlos Humberto Medina 1000255342
- Se continua Estucando baños embaquillando
pintando - Retocando y con las instalaciones
electricas - herramienta menor - Clima Stead
- Se finalizan actividades a las 5pm
04-03-26 Se inician actividades a las 7am
Se labora con 3 personas
Carlos chaparro Daza 1931879
Pedro Felipe Buitrago Mora 1033790393
Carlos Humberto Medina 1000255342
Se continua Estucando los baños, con las
instalaciones electricas Retoques de pintura -
Retiro Se labora con herramienta menor
Se finalizan actividad. a las 5pm
05-03-26 - Se inician labores a las 7am.
Se Continuan con los Retoques de pintura -
de Los baños de la biblioteca - se embaquillado
y estuco - Se labora con los. dos 2 personal
Carlos chaparro Daza. 1931879
Pedo Felipe Buitrago Mora 1033790393
Se labora con herramienta menor. Clima
Stead - Se presentan lluvias suave
06-03-26 Se inician labores a las 7am
Se labora con 2 personas
Carlos Chaparro Daza 1931879
Pedro Felipe Buitrago 1033790393
Se continua con los estucos de los baños
y la pintura. Se retocan los biblioteca
y se pinta la puerta Se labora con
herramienta menor Clima Stead
Se finalizan actividades a las 5pm
Nota: Por Solicitud de La Secretaria

debido a las etraciones no se puede laborar
nos hasta el lunes
07-03-26 No se labora.
08-03-26 No se labora dia festivo
09-03-26 Se inician labores a las 7am.
se labora con dos personas
Carlos Chaparro Plaza 1933849
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393
- Se continua con la pintura de los silos se realiza
la aplicada del manto donde va el tanque y se
continua con el retoco y la pintura- se finalizan
actividades a las 5pm
10-03-26 Se inician labores a las 7am
Se labora con 3 personas
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393
Edwin Oswaldo Chaparro Loaiza 1036795390
Carlos Humberto Humberto Mendoza 1007853420
Se continua realizando retoco y pintura de bases
y soldadura se hace retoco y la instalacion de
los tanques se lleve a la tarde se finalizan
actividades a las 5pm
11-03-26- Se inician labores a las 7am
Se labora con 3 personas
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393
Edwin Oswaldo Chaparro Loaiza 1013679580
Oswaldo Chaparro Plaza 79323582
Se continua con el retoco de las bases y
se realiza la actividad de impermeabilizacion de la
base del tanque - (se amplia mañana)
Se labora con herramienta menor - se finalizan
actividades a las 5pm
12-03-26- Se inician labores a las 7am
Se labora con 3 personas
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393
Edwin Oswaldo Chaparro Loaiza 1036795390
Oswaldo Chaparro Plaza 79323582

se realiza la instalación del marco del tan-
y se coloca el tanque. se continua con
el estuco de los baños se instalan los
marcos de las ventanas de la cubierta
faltante. se clima sitiado. se finalizan
actividades a las 5pm. se labora con
herramienta menor
13-03-026 se inician actividades a las 7am
se labora con 3 personal
Pedro felipe Buitrago Muñoz 1'033790393
Edwin Oswaldo chaparro Loaiza 1'013679500
Oswaldo Chaparro Daza 79323502
se realiza la instalación del tanque.
se continua con el estuco de los
baños interno y externo y la instalación de
las tapas de superboard en los techos
se labora con herramienta menor. clima
sitiado se finalizan actividades a las
5pm
14-03-026 se inician actividades a las 7am
se labora con 5 personas
Pedro felipe Buitrago Muñoz 1'033790393
Edwin Oswaldo chaparro Loaiza 1'013679500
Oswaldo Chaparro Daza 79323502
Casimiro Coguello Baron 79302740
Hernando Vicente Ramirez Saez 4121973
se comienzan a realizar los refuerzamientos
de la canal por solicitud de la interventoria
se continua con los estucos y pintura
se finalizan actividades a las 12:30pm
15-03-026 Dia festivo - No se labora.
16-03-026 se labora con 3 personas
Pedro felipe Buitrago Muñoz 1'033790393
Casimiro Coguello Baron 79302740
Hernando Vicente Ramirez Saez 4'121973
se continua haciendo el refuerzo de la canal

del area de las bancas y se continua realizando retoques de pintura en la parte de las bancas y la biblioteca - llueve a las horas de las tarde. llegan las sanitarias y ornatos al colegio - llueve desde las 3pm se suspenden las actividades de soldadura.

17-03-026 Se inician actividades a las 7am
se labora con 5 personal
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1'033790393
Casimiro Cogollo Baron 79302740
Hernando Vicente Roncancio Suarez 4'121973
Edison Oswaldo Chaparro Loaiza 1'013679580
Alberto Hurtado Hurtado 79727924
Se Continua con los refuerzos de la canal de las Bancas. Se Continua con las estucos y la pintura de la biblioteca - Clima Nublado se labora con herramienta menor - Soldadura taladro pulidora - Se Continua con la pulida y brillado de los pisos Se finalizan actividades a las 5pm - llueve en las horas de la tarde

Jerson Guzman

18-03-026 Se inician actividades a las 7am
Se labora con 6 personal
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1'033790393
Casimiro Cogollo Baron 79302740
Hernando Vicente Roncancio Suarez 4'121973
Edison Oswaldo Chaparro Loaiza 1'013679580
Alberto Hurtado Hurtado 79727924
Jaime Andres Angulo Arboleda 1'087790877
Se Presentan lluvias desde las horas de la mañana lo cual afectado las labores de las actividades - Se realizan trabajos de pintura en la fachada de la biblioteca y de la parte interna - se continua con el brillado y la pulida de los pisos y del refuerzo de la canal hasta donde el clima lo permite se finalizan actividades a las 5pm

Jerson Guzman

18 03 26 Se pintaron puertas de amarillo y se adelantaron labores de soldad de refuerzo a la canal ——— Jerson Guzman ———

19 03 26 Se inician actividades a las 7am
Se labura con 5 personas
Pedro Felipe Buitrago Muñoz - 1033790393
Edison Oswaldo Chaparro Loaiza - 1073679750
Cacimiro Cogollo Baron - 79302740
Hernando Vicente Roncancio Saenz - 4121973
Jaime Andres Angulo Arboleda - 1087828065
Se adelanta actividad de pintura en lateral de la biblioteca, las puertas y marco del interior de la biblioteca se encuentran pintadas de amarillo, se realizan labores de soldadura para el reforzamiento de la canal, se pintan las vigas de blanco, En el bloque alianza se realizo la instalación de los vidrios de las ventanas faltantes (2).
Se finalizan actividades 5pm ——— Jerson Guzman

20-3-26 Se inician actividades 7am
Se labura con 5 personas
Pedro Felipe Buitrago Muñoz - 1033790393
Edison Oswaldo Chaparro Loaiza - 1073679750
Cacimiro Cogollo Baron - 79302740
Hernando Vicente Roncancio Saenz - 4121973
Jaime Andres Angulo Arboleda - 1087828065
Se realiza la fundicion de tapas de cajas de inspección del baño y remates en las mismas en el piso con mortero
Se instalaron los perfiles de reforzamiento a la canaleta, se pintan los sobres y vigas de la biblioteca
- finalizan actividades 5pm

21-03-26 Se inician actividades 7am
Se labura con 4 personas
Pedro Felipe Buitrago Muñoz - 1033790393
Cacimiro Cogollo Baron - 79302740
Hernando Vicente Roncancio Saenz - 4121973
Jaime Andres Angulo Arboleda - 1087828065
Se realiza la instalación de perfiles de reforzamiento d

canaleta, se realiza Pintura en vigas de la biblioteca y remates en ventanas instaladas en el bloque alianza
Se finalizan labores 5pm JG

22-03-26 No se labora
23-03-26 No se labora dia festivo JG
24-03-26 Se inician actividades a las 7am
Se labora con cuatro (4) personas
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393
Jaime Andres Angulo Arboleda 1087828065
Casimiro Cogollo Baron - 7930274O
Hernando Vicente Rancancio Saenz - 4121973
Se realizan labores de pintura en perfiles de cercha y bajante fluvial de la canaleta, se continua con pintura en vigas e instalación de puertas en biblioteca JG
Se finalizan actividades 5pm

25-03-26 Se inician actividades a las 7am
Se labora con siete (7) personas
Casimiro Cogollo Baron - 7930274O
Hernando Vicente Rancancio - Saenz - 4121973
Jaime Andres Angulo Arboleda - 1087828065
Leonardo de Jesus Uribe - 71370768
Luis Fernando Orozco Villamarin - 80 000 362
Ronald Mauricio Cuervo Bedoya - 75105258
Michael Esteban Orozco Hernandez - 1193419G5
Se realiza la instalación de cubierta en los baños y divisiones de los mismos, se continua con pintura en vigas de la biblioteca
Realizando la instalación de las divisiones en el baño de hombres JG se presento una interferencia con la tubería de suministro, resultando en una perforación, se realizan labores de reparación de la red y soldadura
Se finalizan actividades 5pm

26-03-26 Se inician actividades a las 7am
Se labora con cinco (5) personas
Casimiro Cogollo Baron - 7930274O
Hernando Vicente Rancancio Saenz 4121973

Jaime Andres Angulo Arboleda - 1087828065
Carlos Humberto Mendoza - 1005853420
Leonardo de Jesus Uriego - 71370768
Se realiza instalación de la segunda bajante fluvial, se
Continua con la instalacion de divisiones de baños y
pintura de vigas de la biblioteca. Se inicia con actividad
instalación de luminarias
Se labora con herramienta menor - equipo de
Soldadra - taladro - y pulidora - el clima
durante la semana ha sido Soleado en
La mañana y lluvia en la tarde lo
Cual en algunos momentos atrasado las
actividades de Soldadra se finalizan
actividades a las 5pm

27-03-26 Se inician actividades 7am
Se labora con (4) personas
Jaime Andres Angulo Arboleda - 1087828065
Carlos Humberto Mendoza - 1005853420
Pedro Felipe Buitrago Muñoz - 1033790343
Luis Guillermo Castañeda - 80110143
Se realiza instalación de luminarias led en baños y se
inicia con remates en baños y biblioteca.
Se finalizan actividades 5pm

28-03-26 Se inician actividades 7am
Se labora con (3) personas
Jaime Andres Angulo Arboleda - 1087828065
Pedro Felipe Buitrago Muñoz - 1033790343
Luis Guillermo Castañeda - 80110143
Se realizan remates en baños y puertas de biblioteca, se
Continua con actividades de pintura de vigas
Se finalizan actividades 5pm

29-03-26 No se labora dia festivo

30-03-26 Se inician actividades 7am
Se labora con tres (3) personas
Jaime Andres Angulo Arboleda 1087828065
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790391
Luis Guillermo Castañeda - 80190143
Se adelanta actividad de pintura en vigas de los baños y remates en las paredes internas y externas con estuco, se continua con pintura en puertas de biblioteca.
Se finalizan actividades 5pm JG

31-03-26 Se inician actividades 7am
Se labora con (2) personas
Jaime Andres Angulo Arboleda 1087828065
Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790391
Se realiza el lijado de estuco en los interiores de los baños para posterior pintura. Se realiza instalación de luminarias en la biblioteca
Se finalizan actividades 5pm

01-04-26 Se inician actividades 7am
Se labora con tres (3) personas
Jaime Andres Angulo Arboleda - 1087828065
Luis Guillermo Castañeda - 80190143
Edison Oswaldo Chaparro Zoaiza - 1013679350
Se continua con la preparación de las paredes para posterior pintura y se empieza con la instalación de aparatos sanitarios; se inicia con pintura de franja de fachada del bloque alianza y alfeizar.
Se finalizan actividades 5pm. JG

02-04-26 No se labora dia festivo
03-04-26 No se labora dia festivo
04-04-26 Se inician actividades 7am
Se labora con (1) una persona
Jaime Andres Angulo Arboleda - 1087828065
Se culmina con la pintura en la fachada y alfeizar en color negro
Se culminan actividades 12pm J.G

Se Continua con la instalacion del Cielo Raso del area de los baños - Se finalizan actividades a las 5pm
03-03-026 - Se inician Actividades a las 7am
Se labora con 5 personas
Jose Maria Colmenares 79270650
Jefferson David Rodriguez Cortes 1'034274403
Luis Guillermo Castañeda 8'011043
Santiago Arcila Giraldo 1'011091925
Edwin Oswaldo Chaparro Lozada 1'013679750
Se Continuan con los remates del enchape - Pintura - estuco - Filos - Se Continua con la instalacion de las lamparas - Se labora con herramienta menor - Se finaliza el dia - Llega material a la obra perfiles pintura - Puc - Se finalizan actividades a las 5pm
04-03-026 Se inician actividades a las 7am
Se labora con 6 personas
Jose Maria Colmenares 79270650
Jefferson David Rodriguez Cortes 1'034274403
Luis Guillermo Castañeda 8'011043
Santiago Arcila Giraldo 1'011091925
Edwin Oswaldo Chaparro Lozada 1'013679750
Carlos Humberto Mendoza 1003853400
Se Continua con los Remates de enchape - pintura - instalacion de lamparas - Se Continua con la instalacion de las ventanas - Se Continua con Retoques de estuco y pintura - Se labora con herramienta menor - y el dia es Soleado se finalizan actividades a las 5pm
05-03-026 - Se inician actividades a las 7am -
Se Labora Con 5 personas
Jose Maria Colmenares 79270650

Jeffeson David Rodriguez Cortes 1'034774403
Luis Guillermo Castaneda 8'011043
Santiago Arcila Giraldo 1'011091925
Edson Oswaldo Chaparro Loaiza 1'013679730
Se Continua Con la pintura de los bancos terminados de pintura - La pintura de la Reja del aula 6 la instalacion del Guardadoba y los detalles de pintura Se finalizan actividades a las 5pm Clima Nublado Hubo lluvia suave Se labora con herramienta menor
06-03-026- Se inician labores a las 7am
Se labora con personal
Jose Maria Colmenares 79270650
Jeffeson David Rodriguez Cortes 1'034774403
Luis Guillermo Castaneda 8 011 043
Santiago Arcila Giraldo 1'011091925
Edson Oswaldo Chaparro Loaiza 1'013679730
Se Continua Con las cunetas - Pintura de los bancos
Se realiza la cunetion de la ventilacion del bano de bachillerato - Nota por orden de la secretaria NO Se deben realizar actividades Sino hasta el medio dia y retomar el lunes por las vacaciones - Se labora hasta las 5pm Hoy llovio en el trabajo y llueve Sobre el medio dia Afectando las actividades
07-03-026 - No se labora
08-03-026 Dia festivo No se labora
09-03-026 Se inician actividades a las 7am
Se labora con personal
Jose Maria Colmenares 79270650
Jeffeson David Rodriguez Cortes 1'034774403
Luis Guillermo Castaneda 8'011043
Santiago Arcila Giraldo 1'011091925
Edson Oswaldo Chaparro Loaiza 1'013679730
Se Continua pintando la Reja del fondo
Se Continua con los detalles de pintura

de las aulas y los baños Clima Soleado -
se labora con herramienta menor - se finalizan
actividades a las 5pm
10-03-026 Se inician actividades a las 7am
se labora con herramienta menor - se
trabaja con 5 personas
Jose Maria Colmenares 79270650
Jefferson David Rodriguez Cortes 1'034274403
Luis Guillermo Castañeda 8'011043
Santiago Arcila Giraldo 1'011091925
Alberto Hurtado Hurtado 79274924
Se continuan con los remates del enlace - la
Pintura y labrillada del piso - Clima
Soleado - se labora con herramienta menor.
Se finalizan actividades a las 5pm
11-03-026 Se inician actividades a las 7am.
Se labora con 5 personas
Jose Maria Colmenares 79270650
Jefferson David Rodriguez Cortes 1'034274403
Luis Guillermo Castañeda 8'011043
Santiago Arcila Giraldo 1'011091925
Alberto Hurtado Hurtado 79274924
Se continua con resane de pintura en
instalacion de guardaescobas del salon multiple
Se continua con la brillada de los pisos
con pintura de los salones - Clima Soleado
lluvias suaves en la tarde - se finalizan
actividades a las 5pm
12-03-026 Se inician actividades a las 7am
Se labora con 5 personas.
Jose Maria Colmenares 79270650
Jefferson David Rodriguez Cortes 1'034274403
Luis Guillermo Castañeda 8'011043
Santiago Arcila Giraldo 1'011943
Alberto Hurtado Hurtado 79279924.
Se continuan con los resanes y pintura.

de baños y aulas. Se realizan con la limpieza de áreas de trabajo de la instalación de la rejilla de las aulas y de los baños - y (ventanas) Hacia en las horas de la tarde baja dificulta la llegada de las vidrios que quedan haciendo falta se finalizan actividades a las 3pm se labora con herramienta menor

13-03-026 Se inician actividades a las 7am se labora con 4 personas

José María Colmenares 79270650

Jefferson David Rodríguez Cortes 1'034274403

Luis Guillermo Castañeda 8'011043

Santiago Arala Giraldo 1'011089925

Se continua con los Retoques de pintura - Resanes Aseo - Pomates de obra - Se labora con herramienta menor y se trabaja hasta las 5pm Clima soleado - Lluvias en la tarde - Noche

14-03-026 - Se inician actividades a las 7am

Se labora con 5 personas

José María Colmenares 79270650

Jefferson David Rodríguez Cortes 1'034274403

Luis Guillermo Castañeda 8'011043

Santiago Arala Giraldo 1'011089925

Luis Oliva 1'083559315

Se Comienza la instalación de la otra Red de Ventilación. Se continuan con resanes de pintura y se comienza con la instalación del acero inoxidable de los baños de bachillerato Clima soleado se labora hasta las 5pm

15-03-026 Se inician labores a las 7am

Se labora con 1 persona

Luis Oliva 1'083559315

- Se continua con la instalación de las divisiones de los baños de bachillerato se finalizan actividades a las 4pm APM.

Se inician labores a las 7am
Se labora con 4 personal
Jose María Colmenares - 79270650
Jefferson David Rodriguez Cortes 1034279403
Luis Guillermo Castañeda 80110143.
Se continua con la instalacion de los divi

-Se finalizan actividades a 5pm

17-03-26 Personal presente 6 personas adelantando actividades en los baños y aula multip
Baño de bachillerato se continua con limpieza de paredes exteriores de los
baños, baños primaria; instalacion de tramo de tubería de ventilación y
canaleta galvanizada; instalación de divisiones (3) de baños y orinales (3
e instalación de lámparas eléctricas de luces LED y en baño de
mujeres (6) divisiones de baños; En el aula multiple remates en
ventanas y paredes interiores con estuco, pintura de vigas y
relleno de entregantas de los guardaescobas. Se conto con
presencia de personal SST para desarrollar labores de alturas.

Jeison Fabian Franco Guzman

Personal - Jefferson David Rodriguez Cortés - 1034279403
Luis Guillermo Castañeda - 80110143
José María Colmenares Mateus - 79270265
Leonardo de Jesús Urrego Usuga - 71370768
Santiago Acala Giraldo - 1011091925
Jaime Andrés Angulo Arboleda - 1087828065

18-03-26 Personal presente - Jefferson David Rodriguez Cortes - 1034279403
Luis Guillermo Castañeda 80110143 - José María Colmenares Mateus - 7927026
Santiago Acala Giraldo - 1011091925 - Carlos Humbertos Mendoza - 1005853421
Se adelantan labores de limpieza de los baños, se realizan remates en las
rendijas de ventilación; Aula multiple, se continúan haciendo remates de estuco
se estan limpiando las tuberías de electricidad de pintura, instalación de
lamparas LED, y remates de pintura, por lluvias no se realizaron
labores de alturas. Se finalizan actividades a 5pm

19-03-26 Se inician labores 7am
Se labura con personal
Jeferson David Rodriguez Cortes 1034279403
Luis Guillermo Castañeda -80110143
Jose Maria Colmenares Mateus - 79270768
Santiago Arcila Giraldo - 1011091925
Se realizan labores de resane en las paredes en los baños e instalacion de tuberia de ventilacion y conduleta galvanizada en el ultimo tramo
Se finalizan actividades a 5pm
Jerson Guzman

20-03-26 Se inician labores 7am
Se labura con 4 personas
Jose Maria Colmenares Mateus - 79270265
Luis Guillermo Castañeda - 80110143
Santiago Arcila Giraldo - 1011091925
Carlos Humberto Mendoza - 1005853420
Se realiza la instalacion de santarios en los baños de bachillerato y remates entre el techo PVC y la pared con cemento blanco; se continua con la instalación de luminarias en el aula multiple y el punto de acopio ubicado al costado de la carretera se retiro
Jerson Guzman

21-03-26 Se inician labores 7am
Se labura con 3 personas.
Jeferson David Rodriguez Cortes - 1034279403
Edison Osvaldo Chaparro - 1013679750
Santiago Arcila Giraldo - 1011091925
Se continua con la instalación de santarios en baños de bachillerato y limpieza de tuberia electrica.
Se finalizan actividades a 5pm.
Jerson Guzman

22-03-26 No se labura dia festivo
23-03-26 No se labura dia festivo
24-03-26 Se inician labores 7am
Se labura con cuatro(4) personas
Jeferson David Rodriguez Cortes - 1034279403
Luis Guillermo Castañeda - 80110143
Santiago Arcila Giraldo - 1011091925

Edison Oswaldo Chaparro - 1013679750
Se continua con istalacion en baños de bachillerato, remates en el aula multiple en el interior de limpieza de la tuberia electrica
Se finalizan actividades 5pm J.G

25 03 26 Se inician actividades 7am
Se labura con (2) personas
Edison Oswaldo Chaparro - 1013679750
Luis Guillermo Castañeda - 80110143
Se realiza la instalación de mesones de lavamanos en baños de primaria y bachillerato de hombres, se adelantan remates en las rendijas de ventilación de baños de primaria e instalacion de santaños;
Finalizan actividades 5pm. J.G

26-03-26 Se inician labores a las 7am
Se labura con (4) personas
Edison Oswaldo Chaparro 1013679750
Luis Guillermo Castañeda - 80110143
Jeferson David Rodriguez Cortes - 1034279403
Santiago Arcila Giraldo - 1011091925
Se continua con la instalación de santaños en baños de primaria y remates en filos en el aula multiple. y pintura J.G
Finalizan Actividades 5pm

27-03-26 Se inician labores 7am
Se labura con (4) personas
Edison Oswaldo Chaparro 1013679750
Jeferson David Rodriguez Cortes 1034279403
Santiago Arcila Giraldo - 1011091925
Jose Maria Colmenares - 79270265
Se realiza instalación de tuberias de urinales y lavamanos en los baños, se realiza la instalación de puertas del aula multiple y vidrios faltantes
Se finalizan actividades 5pm J.G

28-03-26 Se inician actividades 7am
Se labura con seis (6) personas
Edison Oswaldo Chaparro - 1013671750
Jeferson David Rodriguez Cortes - 1034271403
Jose Maria Colmenares - 7127 0265
Santiago Arcila Giraldo - 1011019125
Hernando Vicente Roncancio Saenz - 4121973
Carmiro Cogollo Baron - 7130 2740
Se realiza la instalación de grifos y desagues de los lavaderos, se hace la instalación de las tapas de registro de los baños, con silicona. en el aula multiple se realizo ensamble de puertas y soporte a la cercha con perfiles. - Finalizan actividades 5 PM

29-03-26 No se labura dia festivo.

30-03-26 Se inician labores 7am
Se labura con seis (6) personas
Jose Maria Colmenares - 79270265
Santiago Arcila Giraldo - 1011019125
Jeferson David Rodriguez Cortes - 1034794 03
Edison Oswaldo Chaparro - 1013679750
Hernando Vicente Roncancio Saenz - 4121973
Carmiro Cogollo Baron - 79302740
Se continua con remates en baños y aula multiple, se realizan las estructuras de aseguramiento a la cercha y canaleta
Finalizan actividades 5PM

31-03-26 Se inician labores 7am
Se labura con cinco (5) personas
Jose Maria Colmenares - 79270265
Santiago Arcila Giraldo - 1011019125
Hernando Vicente Roncancio - 4121973
Carmiro Cogollo Baron - 79302740
Se adelantan labores de limpieza y reforzamiento de la canaleta del aula multiple.
Se culminan actividades 5PM

01-04-26 Se inician labores a 7am
Se labura con (5) cinco trabajadores
Jose Maria Colmenares - 79270265
Santiago Arcila Giraldo - 1011101925
Jeferson David Rodriguez Cortes - 1034794403
Gerardo Cogollo Barón - 74302740
Hernando Vicente Roncancio - 4121973
Se adelantan labores de limpeza, instalación de puerta de la
poceta y se continua con instalacion de bajantes fluviales y
la caneleta del aula multiple, instalación de cerraduras y
mesón lavamanos en baño de mujeres - Finalizan labores 5 PM
02-04-26 No se labura dia festivo
03-04-26 No se labura dia festivo
04-04-26 Se inician labores 7am
Se labura con (6) trabajadores.
Jose Maria Colmenares - 79270265
Santiago Arcila Giraldo - 1011101925
Jeferson David Rodriguez Cortes - 1034794403
Pedro Felipe Buitrago - 1033790393
Luis Guillermo Castañeda - 80800143
Edison Oswaldo Chaparro - 1013679750
Se continua con remates en baños e instalación de accesorios
en mesón de lavamanos de mujeres, se adelanta el cerramiento de
polisombra en aula multiple.
Se finalizan actividades a las 5pm.
05-04-26 - No se labura dia festivo
06-04-26 - Se inician actividades a las 7am.
Se labura con 6 trabajadores
Jose Maria Colmenares 79270265
Santiago Arcila Giraldo 1011101925
Jefferson David Rodriguez Cortez 1034794403
Pedro felipe Buitrago 1033790393
Edison Oswaldo Chaparro 1013679750
Se continua con la limpieza y aseo de los
baños y remates - instalación de boiferias -
y remates de pintura - remates de

Se finalizan actividades a las 6:50pm.-
Se realiza la instalacion de espejos de la
Ventana faltante. ATCO 2.00pm
03-04-26- Se inician labores a las 6:30
Se labora con 6 trabajadores
Jose Maria Colmenares 79270265
Santiago Arcila Giraldo 1011019125
Jefferson David Rodriguez Cortez 1034794103
Pedro felipe Buitrago 1035790373
Edison Oswaldo chaparro 1013679750
Se continua con el aseo de las bancas para
realizar entrega- Se quitan cerramientos
Nota en el transcurso se autoriza las siguientes
actividades pintar el muro de acceso de las
bancas de bachillerato el cual se debe ejecutar
el sabado y en el salon de lodica se autoriza
quitar el tablero existente- pintar el muro
donde estan los murales y se autoriza instalar
las ecluetas Sandblasting en las ventanas de
los pisos multiples. y 2 toma en el aula
multiple a la altura de 3 bloques

03-04-26 Se inician labores a las 7am
Se labora con 4 trabajadores
Jose Maria Colmenares - 79270265
Jeferson David Rodriguez Cortes - 1034794103
Casimiro Cogollo Baron - 7930270265
Andres Angulo Arboleda - 1098728665
Se realizan actividades de aseo y orden en punto de acopio, y
remate con mortero en la entrada del aula multiple JG

01 de marzo de 2026
No hubo personal en la obra,

Residente de obra

02 de Marzo de 2026
Durante la jornada no hubo personal en el frente de trabajo.

Residente de obra
03 de Marzo de 2026
Durante la jornada, no hubo personal en el frente de trabajo

Residente de obra
04 de marzo de 2026
Durante la jornada, no hubo personal en el frente de trabajo

Residente de obra

05 de Marzo de 2026
No se encontro personal, en el frente de trabajo durante la jornada del dia Jueves

Residente de obra

06 de marzo de 2026
Durante la jornada del dia Viernes, no hubo personal en el frente de trabajo.

Residente de obra

07 de marzo de 2026
Durante la jornada del dia Sabado, no se encontro personal laborando ya que el frente pertenece a puntos de votación para el dia Domingo

Residente de obra.

Powered by CamScanner

08 de Marzo de 2026.
El día Domingo, no se realizaron actividades en el frente de trabajo

Residente de obra.

09 de Marzo de 2026
No se encuentra personal laborando en el frente de trabajo, el día de hoy no se llevaron o ejecutaron Actividades.

Residente de obra.

10 de Marzo de 2026.
En el frente de obra no se encontra personal, realizando labores.

Residente de obra

11 de Marzo de 2026.
Durante la jornada, no se encuentra personal laborando, no se ejecutaron actividades.

Residente de obra.

12 de Marzo de 2026
En el frente de obra, se realiza el cerramiento en la parte posterior de la cancha principal, se ejecuto la actividad planeada.

Residente de obra.

13 de Marzo de 2026
Durante la jornada del Viernes, se continua con la actividad de Cerramiento en las áreas a intervenir., las actividades posteriores se empezaran la proxima Semana.

Residente de obra

14 de Marzo de 2026.
Durante la jornada de hoy sabado, no se encuentra personal ejecutando actividades en el frente de obra.

Residente de obra.

15 de Marzo de 2026.
El dia Domingo, no se realizaron actividades en el frente de trabajo

Residente de obra.

16 de Marzo de 2026.
En la institución educativa Republica de Venezuela, se evidencia que durante la semana pasada y el fin de semana a lo que respecta el dia Sabado, se realizó el cerramiento en las áreas a intervenir; para el dia de hoy se espera la llegada de material, para dar inicio a la actividad instalación de platinas, a la hora no se encuentra personal en el frente de trabajo.

Inspector de Interventoria Jose Victor

16 de Marzo de 2026.
Durante la jornada, no se encuentra personal laborando en frente de trabajo

Residente de obra

17 de Marzo de 2026.
En la institución educativa Republica de Venezuela, No se evidencia personal el dia de hoy en el frente de trabajo, tampoco se evidencia avance con respecto a las actividades, por otra parte se requiere del andamio certificado y en condiciones seguras para la supervición del manto asfaltico en la entrada principal. donde se bica la cubierta.

Inspector de Interventoria Jose Victor

Powered by CamScanner

17 de Marzo de 2026
Durante la Jornada, del dia de hoy no se encuentra personal, en el frente de trabajo, se espera la llegada de material para dar inicio a la actividad de la instalacion estructural de la pergola.

Residente de obra

18 de Marzo de 2026.
Durante la Jornada en la institución educativa Republica de Venezuela, se llevaron a cabo actividades: en presencia del Residente de obra y su personal se verificaron niveles y se marcaron ejes donde se llevaran a cabo el tema estructural. se presencio o se observo que durante la jornada estuvo presente personal de obra en el frente de trabajo.

Inspector de Interventoria Jose Victor

19 de marzo de 2026.
En la institución educativa Republica de Venezuela, se adelanta labores en el frente de trabajo, se cuenta con personal el cual realiza excavacion para dados de 40cm X 40cm y una excavación de 60cm de profundidad, tambien se observo la llegada de material al sitio, arena, gravilla, discos de corte entre otros materiales para la actividad.

Inspector de Interventoria Jose Victor

20 de Marzo de 2026
En la institución educativa Republica de Venezuela, se adelantan labores en el frente de trabajo, se observa avance en la excavación de las zapatas 15 zapatas en total de 40x40cm y 60cm de profundidad, se evidencia personal ejecutando la actividad propuesta.

Inspector de Interventoria

21 de Marzo de 2026
En el IED Republica de Venezuela, se adelantan labores en el frente de trabajo, se observa avance en la excavacion, y Fundida de zapatas Se evidencia personal ejecutando la actividad.

Inspector de Interventoria

Powered by CamScanner
