CONSORCIO
PLANTA DE BENEFICIO
PALESTINA

Oficio IP-132-019-2025

Manizales, Caldas, 14 de mayo de 2026.

Señores
FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S
Juan Sebastián Gómez Castaño
Representante Legal
Contratista – Contrato de Obra 205 de diciembre de 2025

Copia:
Alcaldía Municipal de Palestina
Juan Sebastián Valencia
Secretario de Planeación
Supervisor del contrato

Referencia: Contrato de Obra 205 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

Asunto: Aprobación Acta de Cobro N°1 corregida.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en calidad de Interventoría del contrato de obra 205 de diciembre de 2025, nos permitimos comunicarle que, una vez revisada y verificada la documentación remitida mediante Oficio 022-205-2025 de fecha 14 de mayo de 2026, correspondiente al Acta de Cobro N°1 corregida del contrato de la referencia, esta Interventoría APRUEBA la mencionada acta de cobro, toda vez que los documentos presentados cumplen con los requisitos técnicos, administrativos y financieros exigidos en el contrato.

Los documentos revisados y validados como soporte del Acta de Cobro N°1 son los siguientes:

- Factura de obra civil y equipos.
- Cesión de derechos autenticado.
- Aceptación cesión de derechos.
- Certificado de existencia y representación legal Prospera.
- RUT Prospera.
- Cédula representante legal Prospera.
- Certificado bancario Prospera.
- RUT Fusión Ingeniería SAS.
- Cámara de comercio Fusión Ingeniería SAS.
- Cédula representante legal Fusión Ingeniería SAS.
- Planillas de seguridad social.
- Paz y salvo de parafiscales.
- Documentos revisora fiscal.
- Acta de cobro parcial N°1.
- Memorias de cantidades N°1.
- Informe de obra – Acta de Cobro N°1.

CONSORCIO
PLANTA DE BENEFICIO
PALESTINA

En consecuencia, se procede a dar el aval correspondiente para que la entidad contratante adelante los trámites de pago a que haya lugar, conforme a las condiciones estipuladas en el contrato y la normativa vigente aplicable.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud adicional que surja en el desarrollo del contrato.

Cordialmente,

ING.ALEXANDER PATIÑO TORRES
Director de interventoría
Planta de beneficio Palestina

NOTA: Se adjunta oficio OFICIO 022- 205 -2025
y anexos

OFICIO 026- 205 -2025

Manizales-Caldas, 23 de Mayo de 2026.

Señores
Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Ing. Alexander Patiño Torres
Representante Legal
Interventoría

Referencia: Contrato de Obra 205 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

Asunto: Remisión Acta de cobro N°1 corregida según revisión de planeación y documentación solicitada.

Cordial saludo,
Por medio de la presente, en calidad de representante legal de la empresa Fusión Ingeniería SAS, me permito dirigirme a ustedes como interventoría del contrato de obra 205 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA"., para remitir el acta de cobro N°1 del contrato de la referencia, junto con la documentación solicitada, para su revisión y respectivo trámite, con los siguientes anexos:

- Prefactura corregida de obra civil.
- Acta de cobro parcial N°1.
- Memorias de cantidades Civil Externas N°1
- Certificado de existencia y representación legal actualizado Fusión Ingeniería S.A.S
- Certificado de existencia y representación legal actualizado Prospera.
- Certificado bancario Fusión Ingeniería S.A.S
- Certificado bancario Prospera
- Copia de la bitácora de obra.
- Copia Actas de comité de obra 1, 2, 3 y 4.

ALCALDIA MUNICIPAL
Palestina - Caldas
Recibido hoy 27-05-2026
Radicado Folio 66-67
Orden No. 1178
VENTANILLA UNICA

Cordialmente,

Juan Sebastián Gómez C.

Juan Sebastián Gómez Castaño
Representante Legal
Fusión Ingeniería S.A.S
314- 686- 8307
Proyectó: Ing. Laura Alegría Zapata V.

22-Mayo-26

FUSION INGENIERIA S.A.S
Ingeniería integrada su servicio.

Km 1 Carretera Panamericana N° 71 - 240
Bodega B Aranjuez
Tels. (6) 8887089 - 3206992614
E-mail: contabilidad@fusioningenieria.com.co
Manizales (Caldas)

NIT: 900510128 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Resolución DIAN N° 18764102204137
Fecha 27/11/2025 - 27/11/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE401 al FELE600 Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en Manizales, a partir del 1 de noviembre de 2024, conforme a la Resolución 044 del 11 de septiembre de 2024.
Email: lorenagc021@gmail.com
Teléfono: 3153027768

Departamento	Fecha		
Caldas	25	05	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FELE436

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE PALESTINA
Dirección: CR 10 8 25
Email: alcaldia@palestina-caldas.gov.co

NIT: 890801141 - 7
Departamento: Caldas
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 17:16:46
Total de Lineas: 3

Fecha de firmado: 25/05/2026 17:16:47
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Moneda: COP, Peso colombiano

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	% o VAL	MONTO		
1	FI002	1,00	COSTO DIRECTO Acta N. 1 del Contrato N°205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es: ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	EA				$49.798.335,00	$49.798.335,00
2	AIU 1	1,00	ADMINISTRACIÓN 30%	EA				$14.939.500,00	$14.939.500,00
3	80141607	1,00	Gestión de eventos	94				$1.997.564,00	$1.997.564,00

Notas:

SON: (sesenta y seis millones setecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve pesos cero centavos)

CUFE: feed38c87e898cca2b201259fdecb041af1f51d4e90f663761deed8a16416b09e203aa0b2991b9bad828f8f281ebb647

Subtotal:	$66.735.399,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$66.735.399,00

Para pagos: Bancolombia Cuenta Corriente N° 37395437929 / Davivienda Cuenta de Ahorros N° 086100181626 / Banco de Bogotá Cuenta Corriente N° 589048727

Firma Digital:
HaSN2SBmHxSxcUmYnGRevumUhnm4ero2wOMs38DVdr/0mN0YXerLPgIaUs9ckV+Dn5ZxNiWc+ZrOeZJEzk0OC0d
PtKQ/WuggVv3bo4oi5vnJhpzXk6/TB8PCzRjpKgAwTZXAq71NEPRYt1aVZk6FkqD1sFY1DAmSczMuDdU/
u9aCC9v3WLIuVhWiGILd/
U7d8J03is2tlUpa+ZScYhn4bbrulygeykWmI7f5gHDn31zf4pCTbAssWqEok+fs8Batia8IpZQj3kiqsWiJu3hqVzsDzcV01
Fxw5N6JzhJ2JAE33t0bq2os4mR7FMnYjI+p3B4k0XPY79FyaTrhgxkBDA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Gobierno de CALDAS

ALCALDIA DE PALESTINA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PALESTINA

	ACTA No. 1	FECHA DE ELABORACION	8 / 5 / 2026
CONTRATO No :	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	PLAZO INCIAL:	30 DE MARZO DE 2026
		FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA		
CONTRATISTA:	FUSION INGENIERIA SAS		
		SUSPENSION DE CONTRATO:	18 DE MARZO DE 2026
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA	FECHA TERMINACIÓN SUSPENSION:	17 DE ABRIL DE 2026
		VALOR ADICION	N/A
		PRORROGA	N/A
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA	VALOR DE CONTRATO	OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. $847.240.692

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N°1		VALOR ACUMULADO	
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	OBRAS INTERIORES								
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 7.031.010,00**		**$ 1.732.221,00**		**$ 1.732.221,00**
1.2	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO SIMPLE.	M2	20,92	$ 72.624,23	$ 1.519.299,00	20,92	$ 1.519.299,00	20,92	$ 1.519.299,00
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CEMENTO O LADRILLO	M2	204,75	$ 26.286,72	$ 5.382.207,00	8,10	$ 212.922,00	8,10	$ 212.922,00
1.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	M2	6,06	$ 21.370,38	$ 129.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.0	**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 5.677.961,00**		**$ 820.130,00**		**$ 820.130,00**
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 4"	UN	2,00	$ 186.526,58	$ 373.053,00	2,00	$ 373.053,00	2,00	$ 373.053,00
4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 2"	UN	9,00	$ 89.415,37	$ 804.738,00	5,00	$ 447.077,00	5,00	$ 447.077,00
4.13	TRASLADO DE TANQUES DE AGUA	GL	1,00	$ 328.694,00	$ 328.694,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.14	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 DE ALTURA Y 0.10 DE ESPESOR PARA SEPARAR SECCIÓN INTERMEDIA DE SECCIÓN LIMPIA	ML	23,42	$ 48.203,00	$ 1.128.914,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.15	CONSTRUCCIÓN CANAL RECOLECTORA CENTRAL SEMICIRCULAR D=8" EN TUBERIA NOVAFORT	ML	23,42	$ 129.913,00	$ 3.042.562,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA**				**$ 11.667.613,00**		**$ 7.775.851,00**		**$ 7.775.851,00**
5.1	SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM DE ESPESOR (INCLUYE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	29,46	$ 140.236,20	$ 4.131.639,00	25,86	$ 3.626.508,00	25,86	$ 3.626.508,00
5.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA CINTA DE AMARRE CULATA DE 0,13 * 0,10 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	7,31	$ 181.330,52	$ 1.325.526,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MURO DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	22,50	$ 204.804,71	$ 4.608.106,00	20,26	$ 4.149.343,00	20,26	$ 4.149.343,00
5.4	ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFILERÍA TIPO C 120X60 3MM. (INCLUYE TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN)	M2	13,06	$ 122.672,00	$ 1.602.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.0	**MAMPOSTERIA**				**$ 14.778.827,00**		**$ 8.058.988,00**		**$ 8.058.988,00**

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N°1		VALOR ACUMULADO	
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN LADRILLO FAROL DE 0,13*0,20*0,30, incluye mortero 1:3	M²	94,45	$ 72.566,98	$ 6.854.024,00	49,20	$ 3.570.295,00	49,20	$ 3.570.295,00
6.2	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, E=0.02 M	M²	91,85	$ 32.211,96	$ 2.958.701,00	90,40	$ 2.911.961,00	90,40	$ 2.911.961,00
6.3	RESANE CON MORTERO 1:3 PARA CONFORMACIÓN DE CARTERA PARA VANO DE VENTANA	M2	2,94	$ 58.788,00	$ 172.837,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM ENCINTADO Y MASILLADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	25,08	$ 191.119,00	$ 4.793.265,00	8,25	$ 1.576.732,00	8,25	$ 1.576.732,00
7.0	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				**$ 2.473.373,00**		**$ 413.878,00**		**$ 413.878,00**
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9.	M	30,00	$ 82.445,77	$ 2.473.373,00	5,02	$ 413.878,00	5,02	$ 413.878,00
8.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 11.729.171,00**		**$ -**		**$ -**
8.1	DILIGENCIAR CADA UNO DE LOS FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA POR EL ENTE CERTIFICADOR EN RETIE Y RETILAP, PRESESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Y PLANOS RECORDS Y TODOS LOS TRÁMITES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN.	M2	950,00	$ 5.655,00	$ 5.372.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE TAPA DE PROTECCIÓN INTEMPERIE Y CAJA DE PASO SENCILLA	UN	10,00	$ 215.170,79	$ 2.151.708,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA LUMINARIA, INCLUYE LAMPARA HERMETICA	UN	13,00	$ 313.477,00	$ 4.075.201,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR)	UN	1,00	$ 130.012,00	$ 130.012,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9.0	**PINTURA**				**$ 4.542.657,00**		**$ -**		**$ -**
9.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA 3 MANOS Y ESTUCO MUROS EXTERIORES	M²	128,96	$ 32.029,64	$ 4.130.543,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA INTERIOR LAVABLE SOBRE PINTURA EXISTENTE, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA. COLOR BLANCO.	ML	18,64	$ 22.109,14	$ 412.114,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10.0	**CUBIERTAS**				**$ 2.566.376,00**		**$ 1.540.336,00**		**$ 1.540.336,00**
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE F.C PERFIL 7, INCLUYE PERFIL PARA ESTRUCTURA DE LA MISMA	M²	18,56	$ 105.070,68	$ 1.950.112,00	14,66	$ 1.540.336,00	14,66	$ 1.540.336,00
10.5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE CALIBRE 26 PARA EMPATE ENTRE CUBIERTA EXISTENTE Y MURO	M2	17,77	$ 34.680,00	$ 616.264,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12.0	**CIELO RASO**				**$ 2.015.065,00**		**$ -**		**$ -**
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC 10MM PARA ZONA DE DESPACHO. INCLUYE. ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	17,77	$ 113.397,00	$ 2.015.065,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13.0	**PISOS Y ACABADOS**				**$ 309.891,00**		**$ -**		**$ -**
13.1	ENDURECEDOR DE PISO EN CONCRETO	M2	17,77	$ 17.439,00	$ 309.891,00	0,00	$ -	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N°1		VALOR ACUMULADO	
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14.0	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**$ 3.059.739,00**		**$ 2.044.303,00**		**$ 2.044.303,00**
14.1	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PISOS PARA VESTIER	M²	4,71	$ 81.601,79	$ 384.344,00	0,00	$ -	0,00	$ -
14.2	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PARED VESTIER	M²	19,57	$ 87.676,04	$ 1.715.820,00	19,46	$ 1.706.176,00	19,46	$ 1.706.176,00
14.3	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON CABADO LISO, H=0,10 M	M	30,99	$ 30.964,03	$ 959.575,00	10,92	$ 338.127,00	10,92	$ 338.127,00
15.0	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 2.511.325,00**		**$ -**		**$ -**
15.2	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA	M²	1,89	$ 132.618,15	$ 250.648,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14 PARA BUQUES EN ZONA DE CABEZAS Y VSICERAS	M2	1,96	$ 654.474,00	$ 1.282.769,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.9X2.10 METROS , CON MARCO CARGADO EN MORTERO, INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$ 488.954,00	$ 977.908,00	0,00	$ -	0,00	$ -
20.0	**ASEO GENERAL**				**$ 3.168.250,00**		**$ -**		**$ -**
20.1	ASEO GENERAL	M2	950,00	$ 3.335,00	$ 3.168.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	EQUIPOS				**$ 312.936.913,00**		**$ 138.121.261,00**		**$ 138.121.261,00**
M-02 - M-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDAL O ACCIONAMIENTO MEDIANTE VÀLVULA DE RODILLA Y ESTERILIZADOR, INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y ANCLAJE A PLATAFORMAS	UND	5,00	$ 4.292.733,33	$ 21.463.667,00	5,00	$ 21.463.667,00	5,00	$ 21.463.667,00
M-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESPARRANCADOR ELÉCTRICO PARA APERTURA DE ANIMAL DURANTE EL CORTE CON SIERRA DE CANAL	UND	1,00	$ 6.802.991,67	$ 6.802.992,00	1,00	$ 6.802.992,00	1,00	$ 6.802.992,00
M-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLATAFORMA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL MEDIANTE MOTORREDUCTOR DE 1 HP, RIEL DE DESLIZAMIENTO CONSTRUIDO EN TUBO CUADRADO DE 100*100 EN ACERO INOXIDABLE REF 304, RODACHINAS EN EMPACK, PLATAFORMA CON BARANDAS EN PROTECCIÓN DE TUBO REDONDO DE 11/2" Y PISO EN LAMINA DE ALFAJOR ALUMINIO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO Y TUBERÍA SCH 40.	UND	2,00	$ 17.315.525,00	$ 34.631.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN EN "L" PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 3.848.832,33	$ 3.848.832,00	1,00	$ 3.848.832,00	1,00	$ 3.848.832,00
M-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO PARA SUSTITUIR LA ACTUAL EN ZONA DE SANGRIA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE LAVADO DE PANZAS. LARGO: 0,20*0,20	UND	6,00	$ 223.060,33	$ 1.338.362,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO PARA SALA DE PROCESOS CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE LAVADO DE PANZAS. LARGO: 1,0M A: 0,20M	UND	22,00	$ 547.963,67	$ 12.055.201,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LAVADOR DE PANZAS CONSTRUIDA EN ACERO INOX CAL. 18, INCLUYE DUCTO Y EXTRACTOR DE 14". DIMENSIONES: L: 2,10M A: 1,20 M, H: 0,50 M. LARGO DEL DUCTO: 5,0 M	UND	1,00	$ 12.513.276,00	$ 12.513.276,00	1,00	$ 12.513.276,00	1,00	$ 12.513.276,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N°1		VALOR ACUMULADO	
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
M-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA EVISCERACIÓN DE DOS NIVELES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, PARALES EN TUBERIA RED 6" SCH10 AISI 304, FLANCHE DE SUJECIÓN A PISO EN LAMINA 1/2 AISI 304, PLATAFORMA Y ESCALONES EN LAMINA DE ALFAJOR 1/8" AISI 304, MARCO DE ESCALERA CAL 16 AISI 304, BARANDAS EN TUBO DE 1 1/2 CAL 16 AISI 304 INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR DIMENSIONES: PLATAFORMA ALTA 1M ANCHO X 1M LARGO X 1,25M ALTO; PLATAFORMA BAJA 1M ANCHO X 1M LARGO X 0,60M ALTO	UND	1,00	$ 18.110.625,33	$ 18.110.625,00	1,00	$ 18.110.625,00	1,00	$ 18.110.625,00
M-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CARRO TIPO CUTTER PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 14. RECIPIENTE O CUBA COMPLETAMENTE SANITARIA CON TERMINACIONES REDONDEADAS PARA EVITAR DEPÓSITO DE PARTÍCULAS. CONSTRUIDOS EN LÁMINA ACERO INOX	UND	4,00	$ 5.735.508,67	$ 22.942.035,00	4,00	$ 22.942.035,00	4,00	$ 22.942.035,00
M-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVABOTAS EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS. INCLUYE MAGUERA Y CEPILLO PARA LAVADO	UND	2,00	$ 5.058.212,00	$ 10.116.424,00	1,00	$ 5.058.212,00	1,00	$ 5.058.212,00
M-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTERILIZADOR DE SIERRA DE ESTERNÓN EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA , SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN. • CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304 • ESTRUCTURA EN TUBO CUAD 1"1/2 CAL 16 AISI 304 • FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH10 AISI 304 • NIVELADORES EN LAMINA ¼ AISI 304 CON ESPARRAGO AISI 304	UND	1,00	$ 6.352.274,33	$ 6.352.274,00	1,00	$ 6.352.274,00	1,00	$ 6.352.274,00
M-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA PARA RECIBO Y REPASO DE PORCINOS, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGUE TUBO RED 1" SCH 40 AISI 304, INCLUYE BANDEJA DE RECOLECCIÓN Y RODACHINAS DE 3". DIMENSION L: 2,20 M, A: 0,90 H: 0,90 M	UND	1,00	$ 7.126.476,33	$ 7.126.476,00	1,00	$ 7.126.476,00	1,00	$ 7.126.476,00
M-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE RECIPIENTE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CONSTRUIDO EN ACERO INOX CAL. 14. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERÍA CUADRADA Y RODACHINAS DE 3". DIMENSIONES: L: 0,90M A: 0,70 M, H: 0,90 M	UND	2,00	$ 4.976.249,33	$ 9.952.499,00	2,00	$ 9.952.499,00	2,00	$ 9.952.499,00
M-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RIEL PARA ZONA DE DESPACHO . INCLUYE CORTE, CURVAS EN PLATINA DE 1/2*2" Y PINTURA DE RIEL	ML	16,00	$ 1.700.748,00	$ 27.211.968,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO DIMENSIONES: 0,90M X 1,85M	UND	3,00	$ 2.318.770,67	$ 6.956.312,00	3,00	$ 6.956.312,00	3,00	$ 6.956.312,00
M-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA DUCHA SENCILLA (INCLUYE REGISTRO DUCHA, TAPÓN PRUEBA HIDRÁULICA, BRAZO REGADERA, MANIJAS, REGADERA, ESCUDO E INSTRUCTIVO)	UND	3,00	$ 70.900,00	$ 212.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAPETOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL 16. INCLUYE CANAL CONECTOR DE AGUA EN PARTE INFERIOR, VÁLVULA DE PASO MANUAL CON CONEXIÓN DE AGUA DE 1/2 Y MAGUERA CON PISTOLA DE ACCIONAMIENTO..	UND	1,00	$ 3.391.485,33	$ 3.391.485,00	0,00	$ -	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N°1		VALOR ACUMULADO	
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
M-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA PARA CUARTO FRÍO FABRICADA EN PANEL CON UN ESPESOR DE 3", 11/2" PULGADAS DE ESPESOR, INYECTADA EN POLIURETANO CON DENSIDAD DE TREINTA Y CUATRO KILOGRAMOS METRO CÚBICO (34 KG. / MT 3), ECOLÓGICO, ACABADO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA IMPORTADA COLOR BLANCO. DIMENSIONES 2,0 X2,30	UND	1,00	$ 6.704.344,33	$ 6.704.344,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE GANCHOS PARA INSPECCIÓN DE VÍSCERAS ROJAS Y VÍSCERAS BLANCAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14 INCLUYE TUBERIA DE SOPORTE Y FIJACIÓN	UND	30,00	$ 344.695,00	$ 10.340.850,00	9,00	$ 3.102.255,00	9,00	$ 3.102.255,00
M-36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAMBIAVIAS EQUIPO FABRICADO EN ACERO ASTM A-36 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, FABRICADO EN PLATINERIA Y SOPORTERIA EN ACABADO POR INMERSIÓN GALVÁNICA EN CALIENTE .	UND	7,00	$ 1.236.743,67	$ 8.657.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-42	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE LOCKER CONSTRUIDO EN ALUMINIO CON ESPACIO PARA 9 PUESTOS LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 24	UND	2,00	$ 3.170.640,33	$ 6.341.281,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO DIMENSIONES 60X40CM INCLUYE VIDRIO DE 4MM	UND	5,00	$ 719.456,33	$ 3.597.282,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-46	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE SILLA PLASTICA DOBLE RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE CON BRAZOS INCLUYE TACÓN ANTIDESLIZANTE	UND	4,00	$ 108.101,00	$ 432.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO PARA EN ESPUMA REFORZADA Y LONA PARA MUELLE DE CARGA	UND	1,00	$ 3.090.265,00	$ 3.090.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE DE 36" 220V	UND	1,00	$ 2.255.984,00	$ 2.255.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA PARA MUELLE LA PUERTA ES DE 70MM EN LAMINA PRE PINTADA 90-02 CON PROTECCIÓN EN ALFAJOR A UN METRO DE ALTURA INCLUYE HERRAJES ITALIANOS Y MARCO EN ALUMINIO	UND	1,00	$ 2.955.381,00	$ 2.955.381,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJO PUERTA FABRICADO CON PERFIL EN PVC BLANCO	UND	5,00	$ 199.843,33	$ 999.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DESOLLADORA DE RODILLO, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. RODILLO EN LAMINA DE 1/8 ACERO INOX, EJE DE 1 1/2 INOX, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA CUADRADA DE 4" ACERO INOX. MOTORREDUCTOR DE 5H, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y BOTONERA DE MANDO.	UND	1,00	$ 13.891.805,67	$ 13.891.806,00	1,00	$ 13.891.806,00	1,00	$ 13.891.806,00
M-58	TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL ESCALDADOR, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS,	UND	1,00	$ 6.562.475,00	$ 6.562.475,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-59	TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOX PORCINOS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS,	UND	1,00	$ 2.381.075,00	$ 2.381.075,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-60	TRASLADO Y CONEXIÓN DEL ESTERCOLERO	UND	1,00	$ 13.073.200,00	$ 13.073.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-61	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CALDERA	UND	1,00	$ 5.894.612,50	$ 5.894.613,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-62	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CUARTO FRIOS	UND	1,00	$ 4.936.956,00	$ 4.936.956,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-63	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LAVAPANZAS	UND	1,00	$ 5.197.712,50	$ 5.197.713,00	0,00	$ -	0,00	$ -
M-64	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR	UND	1,00	$ 10.598.687,50	$ 10.598.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -

COSTO DIRECTO OBRAS INTERIORES		$ 71.531.258,00	$ 22.385.707,00	$ 22.385.707,00
COSTO DIRECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - IVA INCLUIDO		$ 312.936.918,00	$ 138.121.261,00	$ 138.121.261,00
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 384.468.176,00	$ 160.506.968,00	$ 160.506.968,00
AU OBRA CIVIL	30,00%	$ 21.459.377,00	$ 6.715.712,00	$ 6.715.712,00
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS	25,00%	$ 78.234.230,00	$ 34.530.315,00	$ 34.530.315,00
COSTO OBRAS INTERIORES		$ 484.161.783,00	$ 201.752.995,00	$ 201.752.995,00

	OBRAS EXTERIORES								

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N°1		VALOR ACUMULADO	
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	OBRAS PRELIMINARES				**$ 3.769.007,00**		**$ 796.317,00**		**$ 796.317,00**
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	503,44	$ 4.197,60	$ 2.113.251,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES	M2	43,29	$ 26.286,72	$ 1.137.952,00	11,40	$ 299.669,00	11,40	$ 299.669,00
1.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA CORRALES EXISTENTES (INCLUYE RETIRO)	M	24,23	$ 21.370,38	$ 517.804,00	23,24	$ 496.648,00	23,24	$ 496.648,00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				**$ 2.246.303,00**		**$ -**		**$ -**
2.4	LLENO COMPACTADO	M3	48,55	$ 46.267,83	$ 2.246.303,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	CIMENTACIONES				**$ 7.147.757,00**		**$ -**		**$ -**
2A.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS 1X1X0.3 EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REFUERZO	M3	7,00	$ 1.021.108,21	$ 7.147.757,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO, METALICAS Y MADERA				**$ 53.301.722,00**		**$ 9.470.221,00**		**$ 9.470.221,00**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA EN CONRETO DE 3000PSI CON ACABADO SANITARIO PARA CORRALES (incluye malla electrosoldada 15x15X40)	M2	122,04	$ 140.236,20	$ 17.114.426,00	34,41	$ 4.825.528,00	34,41	$ 4.825.528,00
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA 10X 15cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA CONCRETO 3000PSI	M	34,17	$ 181.330,52	$ 6.196.826,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNA DE 12X 15cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA, CONCRETO 3000PSI	M	32,40	$ 204.804,71	$ 6.635.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA DE 20X30cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI	M	17,80	$ 219.338,28	$ 3.904.923,00	17,65	$ 3.871.321,00	17,65	$ 3.871.321,00
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNA DE 20X28cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI	M	25,2	$ 201.589,52	$ 5.080.056,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPAS EN CONCRETO 3000 PSI, CON BANDA ANTIDESLIZANTE (CADA 20cm APORX.) Y ACABADO SANITARIO	M2	47,87	$ 243.854,64	$ 11.673.858,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA METALDECK CAL. 16, (incluye malla electrosoldada 15x15X4mm)	M2	14,92	$ 180.694,42	$ 2.695.961,00	4,28	$ 773.372,00	4,28	$ 773.372,00
	MAMPOSTERIA				**$ 3.169.030,00**		**$ -**		**$ -**
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERIA, LADRILLO FAROL 12	M2	43,67	$ 72.566,98	$ 3.169.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	INSTALACIONES HIDRAULICAS				**$ 7.588.755,00**		**$ -**		**$ -**
7.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BEBEDEROS DE CHUPON PARA CORRRAL DE INSPECCIÓN DE PORCINOS	UN	27,00	$ 16.696,00	$ 450.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN PARA BEBEDEROS DE CORRALES BOBINOS	M2	7,82	$ 913.367,00	$ 7.137.963,00	0,00	$ -	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N°1		VALOR ACUMULADO	
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PINTURA				**$ 16.654.816,00**		**$ 6.044.861,00**		**$ 6.044.861,00**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA ACABADO SANITARIO PARA CORRALES, CON PINTURA TIPO O SIMILAR KORAZA 3 MANOS	M2	174,68	$ 32.029,64	$ 5.594.938,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2	REMOSIÓN Y LIMPIEZA DE PINTURA DE PERFILES METALICOS DE MUROS DE CERRAMIENTO CORRALES	M	500,24	$ 22.109,14	$ 11.059.878,00	273,41	$ 6.044.861,00	273,41	$ 6.044.861,00
	CUBIERTAS				**$ 234.090,00**		**$ -**		**$ -**
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA	M	6,75	$ 34.680,00	$ 234.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	CARPINTERIA METALICA				**$ 96.074.987,00**		**$ -**		**$ -**
17.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA SOPORTAR MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR CL. 12 D=12 CM H=1.8	UN	63,00	$ 374.072,97	$ 23.566.597,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR DE D=6 CL. 12	M	386,84	$ 97.642,42	$ 37.771.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO METÁLICA ANTIVANDALICA DE 4.4M Y 2.5 DE ALTURA. Incluye SORPORTES Y ANCLAJES	M2	1,00	$ 728.507,58	$ 728.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN TUBO CIRCULAR DE CL.8 D=12 H=1.8	M2	2,00	$ 3.557.621,00	$ 7.115.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN TUBO CIRCULAR DE CL. 8 D=12 H=1.8	UN	8,00	$ 3.361.581,00	$ 26.892.648,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRAS VARIAS				**$ 72.455.021,00**		**$ 9.326.934,00**		**$ 9.326.934,00**
18.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PROTECCIÓN PARA INBORNAL DE 0.9*0.2 CON BARILLA DE 1"	UN	25,00	$ 262.367,00	$ 6.559.175,00	0,00	$ -	0,00	$ -
18.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REFLECTOR DE 250 VATIOS-SODIA ALTA PRESIÓN - 208/240 VOLTIOS - SODIO ALTA PRESIÓN - CUADRADO - CERRADO - ESTRIBOS COMPLETOS:CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN - REFERENCIA RRA ROY ALPHA O SIMILAR	UN	20,00	$ 818.863,93	$ 16.377.279,00	0,00	$ -	0,00	$ -
18.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA DE CORRALES DE INSPECCIÓN EN TEJA DE FIBROCEMENTO P-7 N°5, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA PINTADA	M2	17,66	$ 159.110,84	$ 2.809.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -
18.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA H=1.80m CON PERFILES QUE SOPORTEN SU PESO Y SUS RESPECTIVOS ANCLAJES (SE RECOMIENDA LAS DIAGONALES ESTRUCTURALES	M	70,57	$ 416.381,00	$ 29.384.007,00	22,40	$ 9.326.934,00	22,40	$ 9.326.934,00
18.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POLISOMBRA PARA PROTECCIÓN CORRALES, INLCUYE ESTRUCTURA METALICA.	M2	248,29	$ 27.274,00	$ 6.771.861,00	0,00	$ -	0,00	$ -
18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO INDUSTRIAL MOVIL CON ESCALERA	UN	2,00	$ 2.532.938,10	$ 5.065.876,00	0,00	$ -	0,00	$ -
18.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA	UN	1,00	$ 5.486.925,00	$ 5.486.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	ADECUACIONES SANITARIAS				**$ 12.720.561,00**		**$ 1.774.295,00**		**$ 1.774.295,00**
1.2	DEMOLICIÓN DE PISO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	M2	6,00	$ 72.624,23	$ 435.745,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 4"	ML	50,00	$ 186.526,58	$ 9.326.329,00	8,80	$ 1.641.434,00	8,80	$ 1.641.434,00
4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE ALCANTARILLADO DE 0,6mx0,6m H promedio 1,8 m	UN	4,00	$ 496.052,34	$ 1.984.209,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.9	CONEXIÓN A CÁMARA DE ALCANTARILLADO	UN	1,00	$ 132.860,79	$ 132.861,00	1,00	$ 132.861,00	1,00	$ 132.861,00
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Llosa DE CONTRAPISO PARA REPOSICIÓN DE PISO	M2	6,00	$ 140.236,20	$ 841.417,00	0,00	$ -	0,00	$ -

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS EXTERIORES			$ 275.362.049,00	$ 27.412.628,00	$ 27.412.628,00
	AU OBRA CIVIL	30,00%	$ 82.608.615,00	$ 8.223.788,00	$ 8.223.788,00
COSTO DIRECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - IVA INCLUIDO				$ -	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N°1		VALOR ACUMULADO	
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS			25,00%			$ -		$ -
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO				$ 357.970.664,00		$ 35.636.416,00		$ 35.636.416,00
	COSTO TOTAL DE OBRAS EXTERIORES				$ 357.970.664,00		$ 35.636.416,00		$ 35.636.416,00

	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL TOTAL				$ 346.893.307,00		$ 49.798.335,00		$ 49.798.335,00
	COSTO DIRECTO EQUIPOS				$ 312.936.918,00		$ 138.121.261,00		$ 138.121.261,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 659.830.225,00		$ 187.919.596,00		$ 187.919.596,00
	COSTOS INDIRECTOS				$ 182.302.222,00		$ 49.469.815,00		$ 49.469.815,00
	VALOR TOTAL PGIO(Plan de Gestión Integral en Obra)				$ 5.108.245,00		$ 1.997.564,00		$ 1.997.564,00
	COSTO TOTAL PROYECTO				$ 847.240.692,00		$ 239.386.975,00		$ 239.386.975,00

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingenieria SAS
Contratista de Obra


Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria

Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA



1,3	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES							M2
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Corrales porcinos	Cuarto pequeño existente		1,20	1,80	1,00	2,16	2,16	
			1,28	1,80	1,00	2,30	4,46	
	Bebedero		1,10	0,40	2,00	0,88	5,34	
			0,78	0,40	2,00	0,62	5,96	
Cuarto de observación Bovinos	Comedero		1,00	1,10	1,00	1,10	7,06	
	Bebedero		1,00	0,90	1,00	0,90	7,96	
	Vano de puerta veterinario		0,70	2,05	1,00	1,44	9,40	
Hidroflow			0,60	0,93	2,00	1,12	10,52	
			1,44	0,37	1,00	0,53	11,05	
Muro fachada entrada vehicular	Muro entre viga y muro ciclopeo		1,00	0,35	1,00	0,35	11,40	
						0,00	11,40	
TOTAL							11,40	

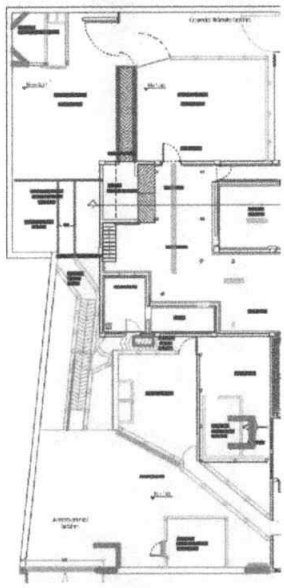

REGISTRO FOTOGRAFICO





Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusion Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

1,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA CORRALES EXISTENTES (INCLUYE RETIRO)							ML
Ubicaciòn	**Observaciones**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Unidad**	**Cant. Parcial**	**Cant. Acumulada**	**Cobro**
Desembarcadero	Rampa		2,58		6,00	15,48	15,48	
				3,00	1,00	3,00	18,48	
			0,57		5,00	2,85	21,33	
	Horizontal			1,91	1,00	1,91	23,24	
							23,24	
TOTAL							23,24	

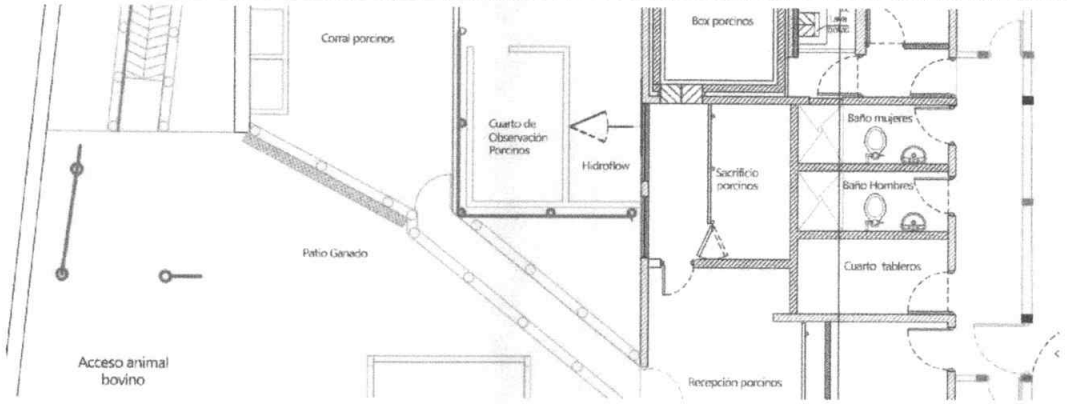

REGISTRO FOTOGRAFICO







Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA EN CONCRETO DE 3000PSI CON ACABADO SANITARIO PARA CORRALES (incluye malla electrosoldada 15x15X40)							M2
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Corrales Bovinos	Franja dañada	0,31	9,52		1,00	2,95	2,95	
		0,71	2,00		1,00	1,42	1,42	
		0,73	0,89		1,00	0,65	0,65	
Cuarto de observación bovinos	Losa demolida para tuberia	0,20	5,60		1,20	1,34	1,34	
	Losa demolida para tuberia	0,30	3,40		1,20	1,22	1,22	
	Losa demolida para tuberia	0,20	1,95		1,20	0,47	0,47	
	Losa demolida para tuberia	0,20	1,40		1,20	0,34	0,34	
	Losa demolida para tuberia	0,4	0,60		1,20	0,29	0,29	
	Se expande el ultimo tramo para ubicar las tuberias conectadas a la camara	0,1	3,00		1,20	0,36	0,36	
Corral recepción porcinos		0,47	3,12		1,00	1,47	1,47	
		4,30	3,60		1,00	15,48	15,48	
		0,80	1,90		0,50	0,76	0,76	
		3,60	1,90		1,00	6,84	6,84	
	Descuento área Metaldeck ítem 5,13	1,50	2,85		-1,00	-4,28	-4,28	
Cuarto de observación porcinos		2,93	1,74		1,00	5,10	5,10	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
TOTAL							34,41	

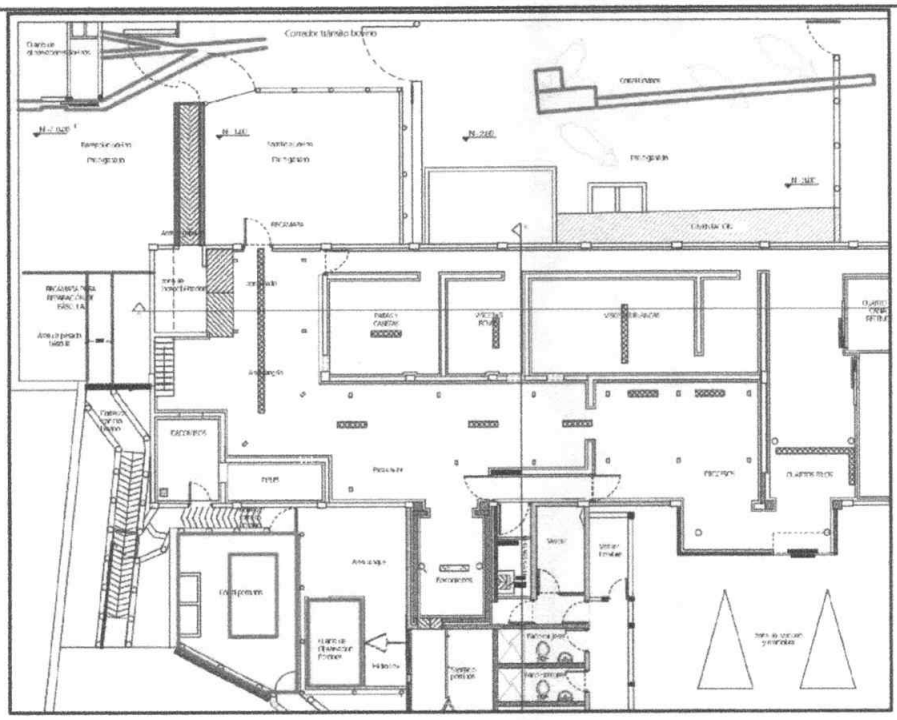

REGISTRO FOTOGRAFICO

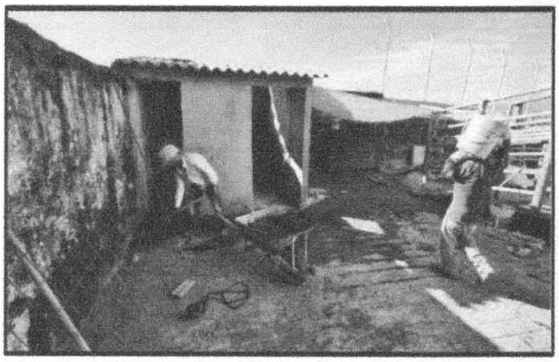

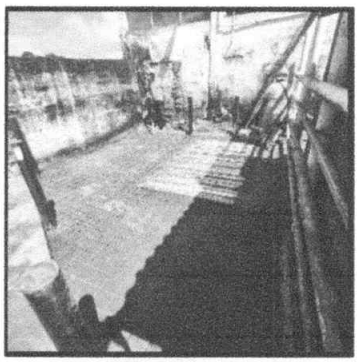





Juan Sebastián Gómez Castaño

Rep. Legal Fusión Ingenieria SAS

Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres

Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina

Interventoria


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1




CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

5,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA DE 20X30cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI							ML
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Vestier	Viga de cimentación		1,20		1,00	1,20	1,20	
	Viga de cimentación		3,25		1,00	3,25	4,45	
	Viga de cimentación puerta		1,20		1,00	1,20	5,65	
Pasillo acceso operarios	Viga de cimentación		4,20		1,00	4,20	9,85	
	Viga de cimentación entrada		1,00		1,00	1,00	10,85	
Cuarto de insumos	Viga de cimentación puerta		1,50		1,00	1,50	12,35	
Desembarcadero	Viga de cimentación (acero) rampa		0,70		1,00	0,70	13,05	
Desembarcadero	Viga de cimentación (acero) rampa		1,30		1,00	1,30	14,35	
Cuarto de subproductos	Viga de cimentación		3,30		1,00	3,30	17,65	
TOTAL							17,65	



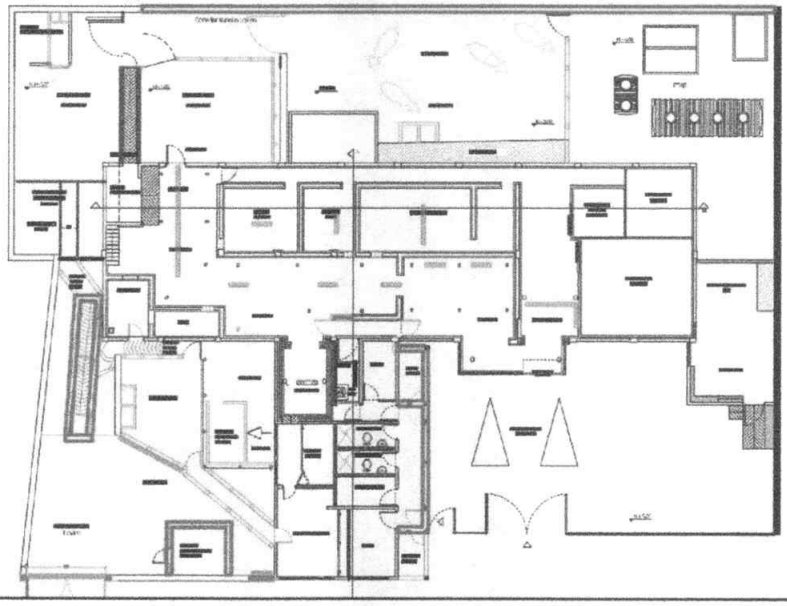



REGISTRO FOTOGRAFICO

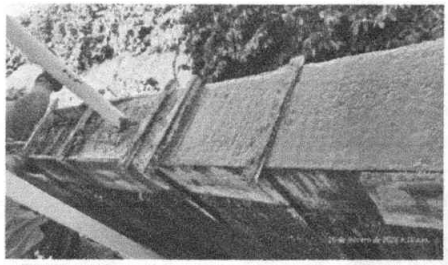

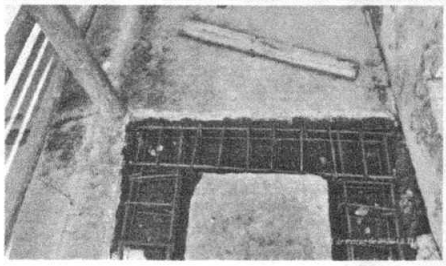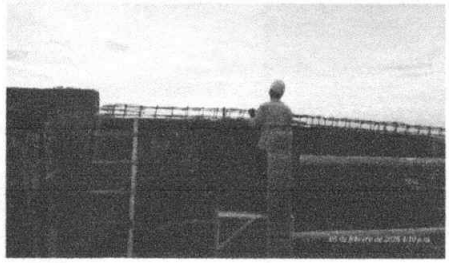

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusion Ingeniería SAS
Contratista de Obra

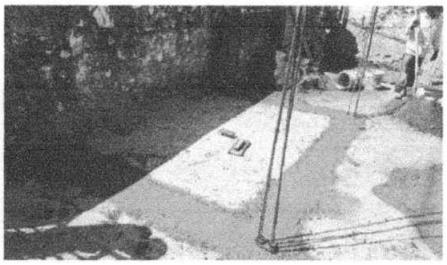Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria

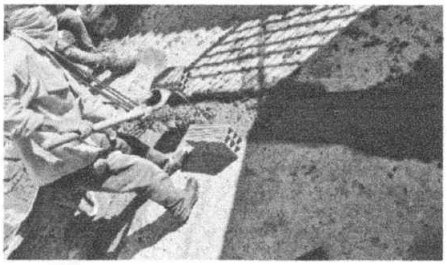Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

5,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA METALDECK CAL. 16, (incluye malla electrosoldada 15x15X4mm)	M2

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Corrales porcinos		1,50	2,85		1,00	4,28	4,28	
						0,00	4,28	
TOTAL							4,28	

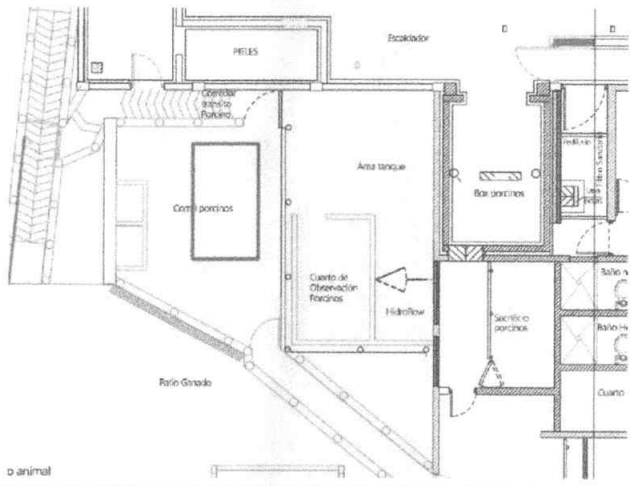

REGISTRO FOTOGRAFICO



Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA


9,2	REMOSIÓN Y LIMPIEZA DE PINTURA DE PERFILES METALICOS DE MUROS DE CERRAMIENTO CORRALES							ML
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
PTAR	Perfiles metalicos horizontal		2,18		6,00	13,08	13,08	
			2,13		6,00	12,78	25,86	
	Perfiles verticales		2,18		1,00	2,18	28,04	
			2,10		1,00	2,10	30,14	
	Puerta		1,60		5,00	8,00	38,14	
			0,38		2,00	0,76	38,90	
			0,90		3,00	2,70	41,60	
Corrales Bovinos	derecho (verticales)		1,95		2,00	3,90	45,50	
			1,90		1,00	1,90	47,40	
			2,00		1,00	2,00	49,40	
	derecho (horizontal)		6,00		1,00	6,00	55,40	
			4,00		1,00	4,00	59,40	
			5,50		3,00	16,50	75,90	
			5,90		1,00	5,90	81,80	
Corrales Bovinos	(verticales)		1,78		1,00	1,78	83,58	
			1,77		1,00	1,77	85,35	
			1,72		1,00	1,72	87,07	
			1,74		1,00	1,74	88,81	
			1,71		1,00	1,71	90,52	
	salida de la planta a corrales bovinos lado frontal (horizontal)		1,15		18,00	20,70	111,22	
			1,17		6,00	7,02	118,24	
Rampa de sacrificio Bovinos	Lado izquierdo (Vertical)		1,85		4,00	7,40	125,64	
	Lado izquierdo (horizontal)		3,90		6,00	23,40	149,04	
			3,80		2,00	7,60	156,64	
	Lado derecho (Vertical)		1,85		3,00	5,55	162,19	
			1,80		2,00	3,60	165,79	
	Lado derecho (horizontal)		4,95		8,00	39,60	205,39	
	perfil vertical de puerta oxidada		1,72		1,00	1,72	207,11	
Desembarcadero	Perfiles Verticales		1,72		2,00	3,44	210,55	
			1,73		1,00	1,73	212,28	
			1,77		2,00	3,54	215,82	
			1,79		1,00	1,79	217,61	
			1,80		1,00	1,80	219,41	
	Perfiles horizontales		9,00		6,00	54,00	273,41	
TOTAL							273,41	

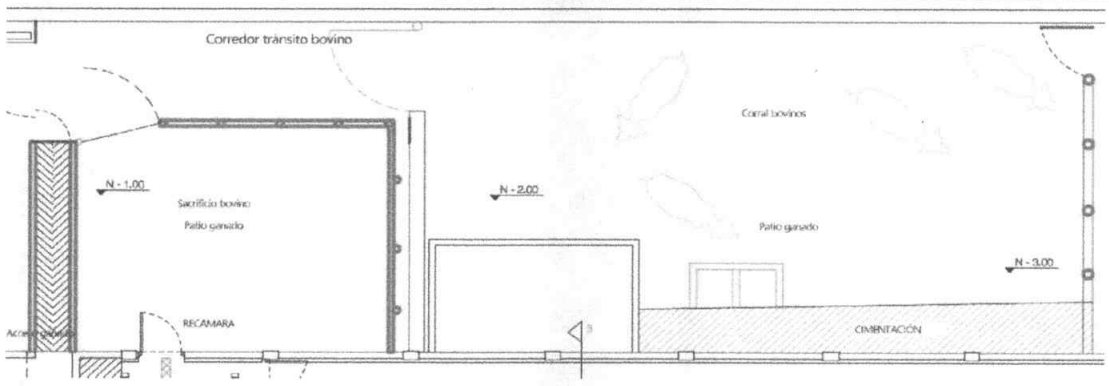

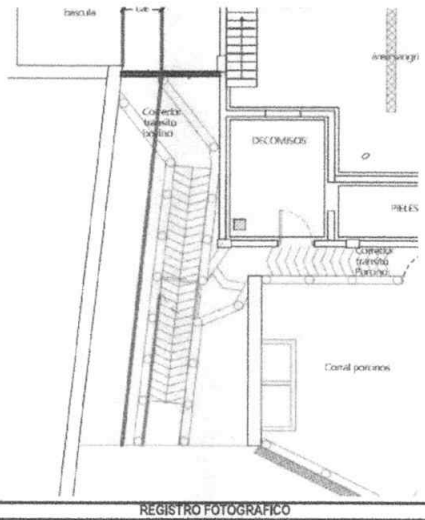

REGISTRO FOTOGRAFICO

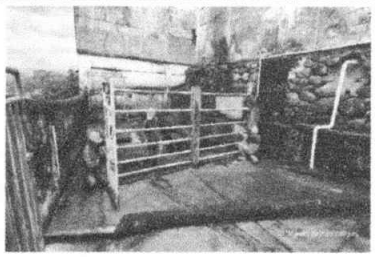

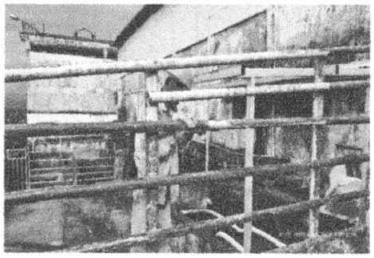Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusion Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria

Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

18,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA H=1.80m CON PERFILES QUE SOPORTEN SU PESO Y SUS RESPECTIVOS ANCLAJES (SE RECOMIENDA LAS DIAGONALES ESTRUCTURALES	ML

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
PTAR y Corrales Bovinos			32,00		0,70	22,40	22,40	
						0,00	22,40	
						0,00	22,40	
TOTAL							22,40	

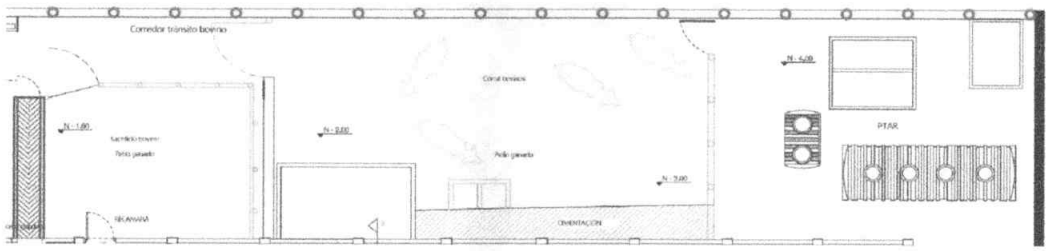

REGISTRO FOTOGRAFICO





Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS


ALCALDIA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4"							ML
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Cuarto de observación bovinos	entrada		8,80		1,00	8,80	8,80	
						0,00	8,80	
						0,00	8,80	
TOTAL							8,80	

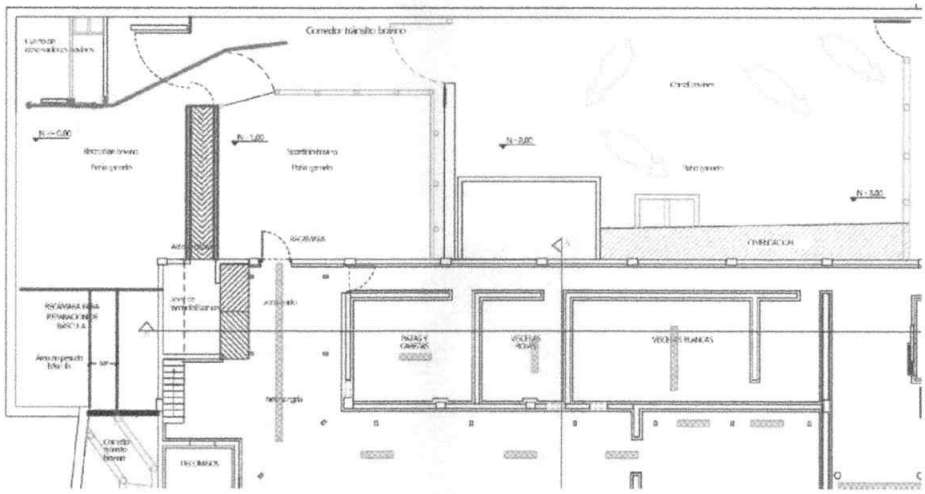

REGISTRO FOTOGRAFICO





Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusion Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria


Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

4,9	CONEXIÓN A CAMARA DE ALCANTARILLADO							UN
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Cuarto de observación porcinos					1,00	1,00	1,00	
							1,00	
							1,00	
TOTAL							1,00	

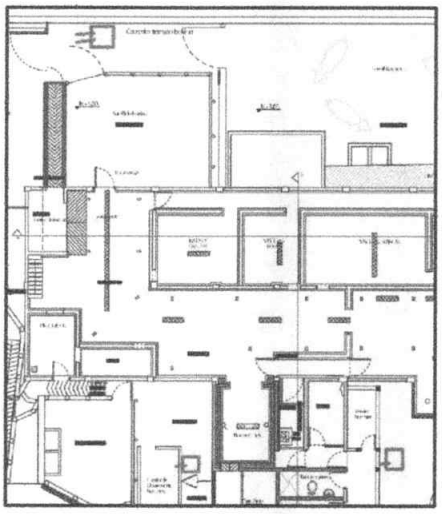

REGISTRO FOTOGRAFICO

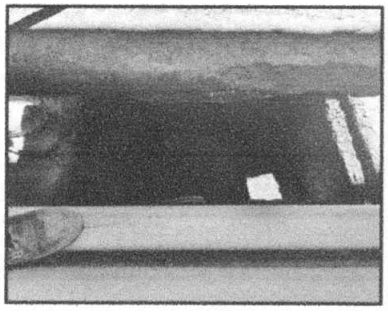

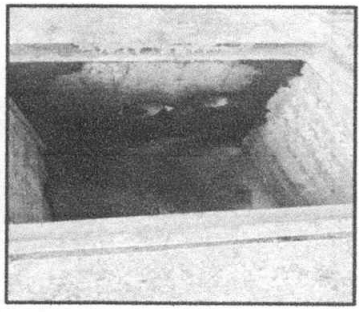

Juan Sebastian Gomez Castaño
Rep. Legal Fusion Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria

Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/04/2026 - 10:12:24
Recibo No. S001208563, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 5Mdb1KHuvK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : FUSION INGENIERIA S.A.S
Nit : 900510128-7
Domicilio: Manizales, Caldas

MATRÍCULA

Matrícula No: 150598
Fecha de matrícula: 21 de marzo de 2012
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : KM 1 CARRETERA PANAMERICANA 71 240 BODEGA B
Barrio : ARANJUEZ
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico : contabilidad@fusioningenieria.com.co
Teléfono comercial 1 : 8887089
Teléfono comercial 2 : 3206992614
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : KM 1 CARRETERA PANAMERICANA 71 240 BODEGA B
Barrio : ARANJUEZ
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico de notificación : admon.fusion2019@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 13 de marzo de 2012 de la El Accionista de Manizales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2012, con el No. 62290 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada FUSION INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social. La sociedad tendra por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A.

Diseño, construccion y suministro de soluciones de ingenieria mecanica. B. Diseño, construccion y suministro de soluciones de ingenieria civil. C. Diseño, construccion y suministro de soluciones de ingenieria electronica. D. Diseño, construccion y suministro de soluciones de ingenieria ambiental. E. Diseño, construccion y suministro de soluciones en procesos industriales. F. Contratacion pÚblica. G. Suministro e instalacion de equipos electronicos. H. Asesorías en ingeniería ambiental. I. Asesorías en ingeniería civil. J. Asesorías en ingeniería de sistemas. K. Soluciones para industrias de alimentos. L. Suministro de equipos medicos. M. Importación y comercialización de mercancías. N. Formulación de proyectos. O. Cualquier actividad lícita a desarrollarse en el territorio colombiano. Todas las demas inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Gerencia. La representación legal de la sociedad y la gestion de los negocios sociales estaran a cargo del gerente. El suplente del gerente lo reemplazara en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendra las mismas atribuciones que la gerente cuando entre a reemplazarla.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Gerente. El gerente esta facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin limite de cuantia. Seran funciones especificas del cargo, entre otras, las siguientes: - Constituir, para propositos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. - Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. - Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; ademas, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los limites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. - Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañia y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. - Cumplir las demas funciones que le

correspondan segun lo previsto en las normas legales y en los estatutos.

Parágrafo. - El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades publicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 13 de marzo de 2012 de la El Accionista, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2012 con el No. 62290 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JUAN SEBASTIAN GOMEZ CASTAÑO	C.C. No. 16.076.312

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 8 del 09 de junio de 2025 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 23 de julio de 2025 con el No. 105783 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISORA FISCAL	KATHERINE FORTICH BETANCOURT	C.C. No. 1.060.649.604	214103

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112

Actividad secundaria Código CIIU: E3600
Otras actividades Código CIIU: C2511 E3700

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.871.853.687,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Sandra Salazar

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/05/2026 - 11:38:56
Recibo No. S001216548, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xuSEtqNbsQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S.
Nit : 901653080-1
Domicilio: Manizales, Caldas

MATRÍCULA

Matrícula No: 226329
Fecha de matrícula: 10 de noviembre de 2022
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 46 27 03
Barrio : LLERAS
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico : julian.paz@prospera.com.co
Teléfono comercial 1 : 3143594236
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 46 27 03
Barrio : LLERAS
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico de notificación : julian.paz@prospera.com.co

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 10 de noviembre de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Manizales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2022, con el No. 94635 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social. - La Sociedad tendrá como objeto social principal (i) el otorgamiento de créditos, préstamos de dinero o mutuo con recursos propios a personas naturales y jurídicas, amparados o no con garantías reales o personales; (ii) Compraventa de títulos valores; (iii) Invertir en sociedades o empresas de cualquier sector económico, y en general, realizar todo tipo de inversiones en Colombia; iv) Celebrar contratos de arrendamiento sobre inmuebles propios; v) Financiación de proyectos de cualquier actividad empresarial con recursos propios; vi) La realización de inversiones en depósitos, servicios, fondos y productos de entidades bancarias, sociedades comisionistas de bolsa, fiduciarias y de otras entidades autorizadas para hacer transacciones financieras. Adicionalmente la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita como parte de su objeto principal de acuerdo con el artículo 5 de la ley 1258 de 2008.

Para el cumplimiento del objeto la sociedad podrá, especialmente, celebrar toda clase de actos y contratos en su propio nombre, o por cuenta de terceros que resulte necesario o conveniente para ejecutar o facilitar el desarrollo del objeto social en Colombia y/o en el exterior; adquirir bienes muebles e inmuebles a cualquier título, enajenarlos o de cualquier otra forma disponer de ellos, gravarlos con prenda o hipoteca, limitar su dominio, darlos en garantía a terceros por obligaciones propias; dar o tomar en arrendamiento o comodato bienes muebles o inmuebles; celebrar operaciones sobre establecimientos de comercio, participar como socio o accionista en la constitución de toda clase de sociedades comerciales o civiles y adquirir a cualquier título cuotas, partes o acciones en esta misma clase de sociedades; celebrar contratos de asociación, agrupación, cuentas en participación o colaboración empresarial así como cualquier acuerdo de intermediación comercial; invertir sus fondos en toda clase de bienes que produzcan rendimientos periódicos o renta fija; dar, aceptar, negociar, pagar, endosar, cancelar, vender, títulos valores de toda clase, invertir en bonos, cédulas y títulos de ahorro; compra y venta de acciones, títulos valores y de inversión y la participación como socio o accionista en toda clase de sociedades civiles o comerciales, la inversión en patrimonios autónomos, negocios, portafolios de inversión y actividades mercantiles, industriales y agroindustriales en el territorio nacional y en el exterior; celebrar contratos de mutuo como deudor o acreedor, con garantía o sin ella, celebrar contratos bancarios, en general realizar toda clase de actos y operaciones civiles y mercantiles y explotar actividades empresariales sin que pueda decirse que la sociedad carece de capacidad para desarrollar cualquier acto de tal naturaleza.

Parágrafo Primero: De acuerdo con la ley, se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia de la sociedad.

Parágrafo Segundo: La sociedad podrá participar en todo género de licitaciones públicas o privadas para el suministro de bienes o la prestación de servicios producidos, suministrados, distribuidos o comercializados por ella.

Parágrafo Tercero: La sociedad no podrá garantizar obligaciones de terceros ni de sus accionistas, salvo decisión unánime de todos los accionistas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 1.500.000.000,00

No. Acciones	1.500.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 1.200.000.000,00
No. Acciones	1.200.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 1.200.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Gerente: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado para periodos de un (1) año prorrogable automáticamente en caso de no ser revocado el nombramiento por la Asamblea General de Accionistas. El Gerente tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

Las funciones del Gerente o de sus suplentes terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas. También terminarán sus funciones por razón de su deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el Gerente o de sus suplentes sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el Gerente sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del Gerente o de sus suplentes, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

En aquellos casos en que el Gerente sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del Gerente de ésta.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Gerente: La sociedad será administrada y representada legalmente ante terceros por el Gerente, quien tendrá un suplente. Los representantes legales están autorizados para celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad.

Parágrafo Primero: Los administradores de la Sociedad podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, así como podrán votar los estados financieros y cuentas de fin de ejercicio.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 10 de noviembre de 2022 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2022 con el No. 94635 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JULIAN DAVID PAZ ABDALA	C.C. No. 75.098.379
SUPLENTE DEL GERENTE	JAIRO PAZ QUINTERO	C.C. No. 6.454.599

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 003 del 26 de marzo de 2025 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 14 de abril de 2025 con el No. 104449 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JACKELINE BUSTOS GRISALES	C.C. No. 1.061.625.978	308233-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 001 del 31 de agosto de 2023 de la Asamblea General De Accionistas	98022 del 14 de septiembre de 2023 del libro IX
*) Acta No. 002 del 27 de octubre de 2023 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas	98648 del 23 de noviembre de 2023 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: K6499
Actividad secundaria Código CIIU: K6613
Otras actividades Código CIIU: L6810 M7112

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $70.910.974,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : L6810.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Sandra Salazar

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 06/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FUSION INGENIERIA S A S** con **NIT 900.510.128-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 086100181626

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Certificado
Bancario

Viernes, 10 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES SAS identificado(a) con NIT 901653080, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85900002695	2023/02/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

30/12/2025 - 19/01/2026

ACTIVIDADES DETALLADAS:

- En el presente periodo se adelantaron actividades de carácter administrativo y técnico, entre las cuales se destacan la realización de visita de obra, la elaboración del balance de obra, la afiliación del personal requerido, la fabricación de equipos y la preparación de la documentación preliminar necesaria para el inicio y adecuada ejecución del proyecto.

.
.
.

Martes 20 de enero de 2026 Clima: Soleado

Personal en obra: • 1 Residente de obra • 1 Maestro
• 1 auxiliar de residente • 1 oficial
• 1 Profesional SST • 1 ayudante

EQUIPO: Herramienta menor

ACTIVIDADES DETALLADAS:

- Demolición de muros de mampostería y de elementos estructurales (vigas y columnas) en el corral de observaciones de porcinos

- Avence en la demolición de estructuras de concreto reforzado como muros y comedero en el área de corrales de porcinos, lavabotas en los filtros sanitarios 1 y 2; y demolición de muros en mampostería en el ingreso peatonal de la planta, esto para la construcción del vestier y el cuarto de insumos

Powered by CamScanner

- Levantamiento de inventario técnico detallado para establecer el estado actual de la infraestructura física y los equipos industriales en las diversas áreas de la PBA

- Atención y acompañamiento a delegados de la alcaldía de Palestina durante la visita técnica de validación y registro del inventario de infraestructura existente

- Labores de limpieza general en las zonas de intervención, incluyendo la recolección, evacuación y disposición de escombros y residuos sólidos generados durante la jornada

Lo intervenido fue realizado acompañamiento a las actividades de obra realizadas en la PBA

Miercoles 21 de enero de 2026 clima: Soleado

Personal en obra :- 1 Residente de obra · 1 Maestro
- 1 auxiliar de residente · 1 oficial
- 1 Profesional SST · 4 ayudantes

Equipo : Herramienta menor

Actividades detalladas :

- continuación de la demolición de comedero y bebedero en el corral de porcinos

- Demolición de la estructura de lavabotas en concreto, ejecutando la labor con precaución para proteger las redes de suministro de agua y desagües existentes.

Powered by CamScanner

- Ejecución de retiro de pintura epóxica deteriorada en muros de las salas de vísceras blancas y vísceras rojas, pasillo de cuartos fríos, sala de procesos y área de patas y cabezas.

La interventoría realizó acompañamiento a las actividades realizadas en obra

Jueves 22 de enero de 2026 clima: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra — 1 Maestro
1 auxiliar de residente — 1 Oficial
1 Profesional SST — 4 ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades detalladas:

- Retiro de refuerzos que se encontraban expuestos en el patio de corrales de bovinos

- continuación de la demolición del lavabotas ubicado en el primer filtro sanitario y desmonte de la puerta en los corrales

- Avance en la remoción de pintura en muros de la sala de procesos

- Acompañamiento a la inspección del Arquitecto Felipe (interventoría) para la validación y ajuste de cantidades presupuestales del proyecto

Se realizo acompañamiento con el Residente de obra para conocer las actividades que se encuentran en el presupuesto. en contraste de las actividades sin cantidades justificadas.

Powered by CamScanner

Viernes 23 de enero de 2026 clima: Soleado

Personal en obra: 1 Residente de Obra 1 Maestro
1 auxiliar de residente 1 oficial
1 Profesional SST 4 ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades detalladas:

- continuación de labores de retiro de pintura deteriorada en el corredor de acceso a salas y en el pasillo de acceso a cuartos fríos

- Traslado y protección de equipos de proceso para evitar daños por impacto o contaminación por polvo de construccion

- evacuación periódica de escombros para mantener la higiene y el tránsito seguro en la planta.

Se intervienen 14 Residentes profesionales en la actividad de obra en la planta.

Sabado 24 de enero de 2026 clima: lluvioso

Personal en obra: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 auxiliar de residente 1 oficial
1 Profesional SST 4 ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades detalladas:

- Se continua con remoción de pintura en muros de

Powered by CamScanner

salas de visceras, Patas y cabezas y corredor de cuartos Frios

- Toma de medidas Técnicas en sitio para el diseño y Fabricación de la estructura de cerramiento en malla eslabonada para protección de la planta

- Limpieza de áreas de Trabajo al cierre de Jornada

Lo anterior descrito Hs Realizamos acompañamiento en las actividades de obra.

Lunes 26 de enero de 2026 clima: soleado

Participantes: 1 Residente de obra 1 maestro
1 Auxiliar de residente 1 oficial
1 Profesional SST 4 ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor

Actividades detalladas:

- Avance en el retiro de pintura en mal estado en la sala de Procesos y puntos de acceso principales

- Movimiento y reubicación de equipos de acero inoxidable para despejar frentes de Trabajo

- Implementación de protocolos de limpieza para proteger la integridad de los equipos trasladados.

Lo anterior descrito Hs Realizamos acompañamiento en las actividades de obra en la planta

Powered by CamScanner

Martes 27 de enero de 2026 clima: lluvioso

Participantes: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 auxiliar de residente 1 Oficial
1 Profesional SST 4 ayudantes

Equipo: herramienta menor

Actividades detalladas:

- Proteccion de maquinaria y equipos de la planta mediante cubrimiento con lonas y bolsas verdes para mitigar el impacto del material particulado

- Desmonte de accesorios en acero inoxidable Clavamanos y esterilizadores de cuchillos) con su respectivo traslado a los cuartos Fríos para resguardarlos.

- Acompañamiento a delegado de la alcaldía para la Toma de muestras de agua destinadas a análisis Fisico químicos (PH y Cloro)

La inspectora realizo acompañamiento en la obra de la planta.

Miercoles 28 de enero de 2026 clima: lluvioso

Participantes: 1 Residente de Obra 1 Maestro
1 Auxiliar de Residente 1 Oficial
1 Profesional SST 4 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades detalladas:

Powered by CamScanner

- continuación de remoción de pintura en salas de vísceras, patas y cabezas.

- Reunión de seguimiento con la interventoría de obra para resolver consultas técnicas y validar avances

- Soporte técnico para el ajuste de planos arquitectónicos en AUTOCAD basándose en los hallazgos del levantamiento en sitio.

Los interventores no estuvo realizando acompañamiento en las actividades.

Jueves 29 de enero de 2026 clima: nublado

Participantes: 1 Residente de obra — 1 maestro
1 Auxiliar de obra → Aux residente — 1 oficial
1 Profesional SST — 4 ayudantes

Equipo: herramienta menor

Actividades detalladas:

- Inicio de remoción de pintura en perfiles y estructuras metálica en el área de corrales de bovinos

- Recepción y acopio de materiales destinados a la ejecución del cerramiento de obra.

Lo interventoría no estuvo realizando acompañamiento en las actividades de obra

Powered by CamScanner

Viernes 30 de enero de 2026 Clima: Soleado

Participantes: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar de residente 1 Oficial
1 Profesional SST 4 ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades detalladas:

- Continuación de Trabajos de remoción de pintura de Perfiles en corrales de bovinos

- Realizacion del comité de Obra Programado Para validación de áreas de intervención y Cronograma

- Ingreso de refuerzos (Fleyes) y Finalización del resguardo de equipos de acero inoxidable en los cuartos Fríos

Los intervenstos no estuvo Realizando acompañamiento en las Actividades de obras en la Planta

Lunes 2 de Febrero de 2026 Clima: Soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar de residente 1 Oficial
1 Profesional SST 5 ayudantes

Equipo: Pulidora grande, Herramienta menor

Actividades detalladas

- Avance con el retiro de pintura en mal estado de los Perfiles metalicos del área de corrales de Bovinos y

Powered by CamScanner

desembarcadero

- corte con Polidora y demolición de concreto para construcción de vigas de cimentación en el pasillo acceso Peatonal

- Ingreso de materiales de construcción: Arena de Pega y Arena de río

La interventoría HSE estuvo realizando acompañamiento en las actividades de obra

Martes 3 de Febrero de 2026 clima: Soleado

Personal: 1 Residente de obra — 1 Maestro
1 Auxiliar de residente — 1 Oficial
1 Profesional SST — 5 ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Polidora grande

Actividades detalladas

- continuación con el retiro de pintura en estructuras metálicas en la zona del tanque de agua

- Avance en la demolición de la losa y muros de mampostería en el pasillo de acceso de operarios

- Armado de la estructura de acero (canasta/refuerzo) para el inicio de la ejecución del cerramiento

- Recepción de materiales pétreos y ladrillos para la construcción de los nuevos muros en el pasillo de acceso

La interventoría HSE Realizo acompañamiento en obra

Powered by CamScanner

Miercoles 4 de Febrero de 2026 Clima : Soleado

Personal : 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar de residente 1 oficial
1 Profesional SST 5 ayudantes

Equipo : Herramienta menor, pulidora grande, concretadora de 1/2 bulto

Actividades detalladas

- Se realiza la demolicion del bebedero y comedero en el cuarto de observacion de bovinos

- Se ubica el acero de refuerzo para el cerramiento perimetral

- realizamiento de anclajes de 10 cm cada 2 metros en la viga de cerramiento

- Demolición de losa de piso en el cuarto de insumos

- Nivelación de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas

- Vaciado de concreto en vigas de cimentación

Lo interventor no estuvo realizando seguimiento en las actividades de obra en la planta

Powered by CamScanner

Jueves 5 de Febrero de 2026 clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra — 1 maestro
1 Auxilio de residente — 2 oficiales
1 Profesional SST — 5 ayudantes

Equipo: Herramienta menor. Pulidora grande.

Actividades detalladas

- comienzo con la demolición de Pediluvio en el Filtro Sanitario #2

- Avance de la construcción de muro en bloque ladrillo en pasillo de acceso

- Se realiza el amarre de acero de refuerzo para la viga del cerramiento perimetral de la planta

- cerramiento en yute para el lugar designado de los escombros

- control de calidad: zarandeo de arena de pega

La interventoría ha realizado acompañamiento a las actividades de obra en la planta.

Viernes 6 de Febrero de 2026 clima: mañana → lluvioso
tarde → soleado

Personal: 1 Residente de obra — 1 maestro
1 Auxiliar de residente — 2 oficiales
1 Profesional SST — 5 ayudantes

Powered by CamScanner

Equipo: Herramienta menor

Actividades detalladas

- Finalizacion con la demolición del lavabotas y Pediluvio del Filmo Sanitario #2

- Instalación de muros en ladrillo en el Pasillo de acceso y vestier

- Avance de muros en ladrillo en el cuarto de insumos

- Se continua con el armado de acero para vigas del cerramiento y columnetas del Pasillo de acceso.

- La interventoria Hs estuvo realizando acompañamiento en la obra

Lunes 9 de Febrero de 2026 clima: Mañana → lluvioso
Tarde → soleado

Personal:	1 Residente de obra	1 Maestro
	1 Aux de residente	2 Oficiales
	1 Profesional SST	5 ayudantes
	1 Auxiliar SST	

Equipo: Herramienta menor

Actividades detalladas:

- Se continua con la construcción de muros en mamposteria para el vestier de hombres y cuarto de insumos

Powered by CamScanner

- ejecucion de revoque (Pañete) en cuarto de observación de Bovinos

- Se continua armado de acero para vigas del cerramiento

Lo interventoria Ha Realizado actividades de seguimiento en la obra.

Martes 10 de Febrero de 2026 Clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar de residente 1 Oficial
1 Profesional SST 5 ayudantes
1 Auxiliar SST

Equipo: Herramienta menor

Actividades detalladas:

- Inicio de demolición de muros exteriores en la zona de desembarcadero

- continuación del revoque en cuarto de observación de Bovinos

- Se continua con construcción de muro en mampostería para cuarto de insumos y vestier

- Labores de aseo, orden y organizacion de obra.

Lo interventoria Ha Realizado seguimiento en las actividades de obra en la planta

Powered by CamScanner

Miercoles 11 de Febrero de 2026 clima: Soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar de residente 1 Oficial
1 Profesional SST 5 ayudantes
1 Auxiliar SST

Equipo: herramienta menor

Actividades detalladas:

- Se continua con la labor de demolición de muros en la zona del desembarcadero

- Levantamiento de muros en la sala de visceras rojas para cubrir la abertura de esta

- continuación del revoque de muros en el cuarto de observación de Bovinos

- Se comienza con el revoque de muros en el vestier de hombres.

Las intervenciones se estan realizando cumpliendo
en las actividades de obra

Jueves 12 de Febrero de 2026 clima: Soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar de residente 1 Oficial
1 Profesional SST 5 ayudantes
1 Auxiliar SST

Equipo: Herramienta menor

Powered by CamScanner

Actividades detalladas:

- continuación de la demolición de muros en la zona del desembarcadero

- Inicio de demolición de la rampa en la zona del desembarcadero

- Desmonte de rejillas (ventanas) en el pasillo de acceso para el realizamiento del cuarto de insumos

- Levantamiento de muros en ladrillo en el cuarto de insumos

- Se comienza con la delimitación para realizar corte y demolición en la losa del área de concreto del área de procesos para la ubicación de rejillas

Los inconvenientes de estos realizados corresponden a las actividades que se realizan en obra.

Viernes 13 de Febrero de 2026 clima: lluvioso

Personal: 1 Residente de obra 1 maestro
1 Auxiliar de residente 2 oficiales
1 Profesional SST 5 ayudantes
1 Auxiliar de SST

Equipo: Herramienta menor

Actividades detalladas

- Continuación con la demolición de la rampa del desembarcadero

- Demolición de losa en el área de procesos para la


Powered by CamScanner

Ubicacion de las rejillas 1x02m

- Se realiza revoque en el pasillo de acceso

- colocacion de Fleyes en las columnetas encontradas y realizadas en el pasillo de acceso

- se realizó el 2do comite de obra en el que se definieron Items del balance de obra y de actividades a realizar



Sabado 14 de Febrero de 2026 Clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra — 1 Maestro
1 Auxiliar de residente — 2 Oficiales
1 Profesional SST — 5 ayudantes
1 Auxiliar SST

Equipo: Herramienta menor

Actividades detallados:

- Continuacion con la demolición de la rampa y losa del desembarcadero

- se continua con la demolición de losa en el área de Procesos para la ubicacion de rejillas

- revoque de muros en el area de pasillo de acceso

- Ubicación de Formaletas en las columnetas para realizar el vaciado

Powered by CamScanner

Las inducciones HSE estuvo realizado acompañamiento en las actividades
Realizadas en la obra.

Lunes 16 de Febrero de 2026 clima: soleado → tarde
nublado → mañana

Personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar residente 3 Oficiales
1 Profesional SST 5 Ayudantes
1 Auxiliar SST

Equipo: Herramienta menor, Demoledor

Actividades detalladas

- Comienzo de demolición de losa en la zona de ingreso vehicular
- Revoque de muros del cuarto de insumos en la parte exterior
- Ubicación de Formaletas en las columnetas ubicado en el pasillo para realizar el vaciado
- Comienzo con la instalación del superboard en la zona de pieles y sangre
- Las inducciones HSE estuvo realizado acompañamiento en las actividades de la obra.

Martes 17 de Febrero de 2026 clima: nublado → mañana
soleado → tarde

Personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar residente 3 Oficiales
1 Profesional SST 6 ayudantes
1 Auxiliar SST

Powered by CamScanner

EQUIPO: Herramienta menor, Demoledor

Actividades detalladas:

- Continuación con la demolicion de losa en la zona de acceso vehicular
- Se continua con el revoque de muros del cuarto de insumos por la parte externa
- Se ubican Formaletas en las columnetas del cuarto de insumos para realizar el vaciado de estas
- Se pintan los tubos galvanizados con el wash primer
- Desmonte de puerta metalica en el desembarcadero para continuar con la demolición de la losa

Se interventoria las estas Realizando seguimiento en las actividades Realizadas en la obra

Miercoles 18 de Febrero de 2026 clima: Nublado → Mañana
Soleado → Tarde

Personal: 1 Residente de obra — 1 Maestro
1 Auxiliar residente — 2 Oficiales
1 Profesional SST — 6 ayudantes
1 Auxiliar SST

EQUIPO: Herramienta menor, Demoledor

Actividades detalladas

- Demolición de columna ubicada en la zona de acceso vehicular
- comienzo con la demolición de muro en el desembarcadero

Powered by CamScanner

- Se realiza revoque en la entrada al pasillo de acceso
- Demolicion del cuarto del hidroflow, salvaguardando el hidroflow en un cuarto
- se formaleteo y se realiza el vaciado de la viga en la zona del vestier
- Se realiza limpieza de escombros en la zona de demolicion de losa y de muros en el desembarcadero

Las intervenciones fueron realizadas bajo supervisión en las instalaciones de la obra

Jueves 19 de Febrero de 2026 clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Auxiliar residente, 1 Profesional SST, 1 Auxiliar SST, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Demoledor

ACTIVIDADES detalladas

- continuación con la demolición del muro en la zona del desembarcadero
- vaciado de viguetas en la entrada y en el cuarto de insumos
- Se continua con la labor de revoque en el pasillo de manera interna y externa
- Se completa la demolición del cuarto del hidroflow con el muro ciclopeo existente
- Se prosigue con la labor de la instalación del superboard en la zona de pieles y sangre dejando apertura para una puerta

Powered by CamScanner

- Retiro de escombros generados por las demoliciones en los corrales porcinos y cuarto de hidroFlow

La interventoria no realizo observaciones en las actividades realizadas en obra

Viernes 20 de Febrero de 2026 Clima: Soleado

Personal. 1 Residente de obra
1 Auxiliar residente
1 Profesional SST
1 Auxiliar SST
1 Maestro
3 oficiales
6 ayudantes

Equipo: Herramienta menor, demoledor

Actividades detalladas:

- Se continua con la demolición del muro en el área de corrales porcino
- Se sigue la labor de revoque en el pasillo de manera interna y externa.
- Revoque en los muros de las entradas al cuarto de insumos y vestier
- Se inicia la demolicion de la franja en mal estado del corral de bovinos
- Terminación de la instalación del superboard en la zona de pieles
- Retiro de escombros generados por las demoliciones en la zona de corrales bovinos y porcinos
- Se hace retiro de estructura metalica en zona del desembarcadero
- Se realizó el comité de obra #3 donde se reunieron los representantes de la gobernación David Stiven Tabares, Carlos Julian Ocampo, Andres osorio.

Powered by CamScanner

representantes de la alcaldia de Palestina: Gerson cajas, Juan Sebastian. Representantes de interventoria: Felipe Bucuru Patiño. Caterine Salonar Garcia. El contratista: Juan David, Diana Carolina López, Andrea López vásquez. Jessica Restrepo Ramirez, Alejandro Uribe. En este comite se hablaron de actividades de obra en la zona exterior y se realizo socialización de los items del balance de obra.

Interventoría

Sabado 21 de Febrero de 2026 Clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra — 1 Maestro
1 Auxiliar Residente — 3 oficiales
1 Profesional SST — 7 ayudantes
1 Auxiliar SST

Equipo: Herramienta menor, Demoledor

Actividades detallados

- continuación con la demolición del muro en el área de corrales Porcino
- continuación con la labor de revoque en el pasillo de manera interna y externa
- Revoque en la sala de visceras rojas del buque tapado
- se Termina de subir los muros en el vestier y cuarto de insumos para dar espacio para la instalación del cielo raso.
- Adecuación de formaleta para viga de cerramiento zona corrales bovinos

Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 23 de Febrero de 2026 clima: Nublado → Mañana
Soleado → Tarde

EQUIPO: Herramienta menor. demoledor

Personal. 1 Residente de obra 7 Maestro
1 Auxiliar residente 3 oficiales
1 Profesional SST 7 ayudantes
1 Auxiliar SST

ACTividades detalladas:

- continuación con demolición del muro en el área de corrales Porcino
- Se continua con la labor de revoque en el pasillo zona de vestier y cuarto de insumos
- se comienza con la excavación de Tierra en la entrada vehicular
- Se realiza excavación de Tierra zona desembarcadero
- se realiza el comedero y bebedero en vaciado de concreto con anclajes en el cuarto de observación de bovinos
- se Pintan los Tubos galvanizados para su instalación en la viga de cerramiento
- Adecuación de Formaleta para viga de cerramiento zona de corrales y anclajes en las columnas existentes

La interventoría ha estado Realizando acompañamiento en las actividades de la obra.

INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Martes 24 de Febrero de 2026 clima: nublado
soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar residente 3 oficiales
1 Profesional SST 7 ayudantes
1 Auxiliar SST

EQUIPO: Herramienta menor, demoledor

Actividades detalladas:

- Se realiza cortes y demolición en la losa de la planta para la ubicación de rejillas
- Se continua con la labor de revoque en el pasillo, zona de vestier y cuarto de insumos
- Se sigue con la excavación de tierra en la entrada vehicular
- Se recibe material de la Ferreteria Aldea Para realizamiento de muros. Flejes para el desembarcadero
- se realiza un viaje de retiro de escombros 8 m^3
- Localización para la ubicación de los cuartos de observacion de porcinos e hidroFlow
- Demolicion de cuartos de observación de bovinos para realizar la abertura de la entrada del veterinario

Las inconvenientes no estuvo presentes durante el desarrollo de las actividades de la obra

Miercoles 25 de Febrero de 2026 clima: Nublado → mañana
Soleado → Tarde

EQUIPO: Herramienta menor, Demoledor

Powered by CamScanner

Personal
- 1 Residente de obra
- 1 Auxiliar residente
- 1 Profesional SST
- 1 Auxiliar SST
- 1 Maestro
- 3 oficiales
- 7 ayudantes

Actividades detallados:

- se continua con la demolición dentro de la planta para la ubicación de resillas
- Se continua con labor de revoque en el pasillo de acceso, cuarto de vestier y cuarto de insumos
- Se prosigue con la excavación de tierra en la entrada vehicular
- adecuación de Tubos galvanizados para la viga de cerramiento en los corrales de bovinos
- Se comienza con la construcción de los muros estructurales del hidroFlow y del cuarto de observación de porcinos
- Demolición de muros en zona de corrales

La interventoría ha estado realizando acompañamiento en las actividades de la obra

Jueves 26 de Febrero de 2026 clima: Soleado

Personal:
- 1 Maestro
- 2 oficiales
- 7 ayudantes
- 1 Residente de obra
- 1 Auxiliar residente
- 1 Profesional SST
- 1 Auxiliar SST

EQUIPO: Herramienta menor, Demoledor, vibrador de concreto, concretadora de mediobulto

Actividades detallados:

Powered by CamScanner

- Se continua con la excavacion de tierra en la entrada vehicular
- se realiza el vaciado de la viga de cerramiento en la zona de corrales Bovinos
- continuacion con la construccion de cuartos de observacion porcinos e hidroFlow
- retiro de escombros mediante 2 viajes de volqueta.
- realizamiento de anclajes para la ubicacion de los tubos galvanizados

Lo interventoria ha Realizado acompañamiento en las actividades de la obra.

viernes 27 de Febrero de 2026 clima:

Personal. 1 Residente de obra — 1 maestro
1 Auxiliar residente — 2 oficiales
1 Profesional SST — 7 ayudantes
1 Auxiliar SST

Equipo: Herramienta menor, Demoledor, concretadora de medio bulto

Actividades detalladas:

- Se continua con la excavación de tierra en la entrada vehicular
- Se continuo con el vaciado de la viga de cerramiento con la ubicación de los perfiles para el futuro mallado del cerramiento.
- se continua con la labor de construcción del cuarto de observación de porcinos e hidroFlow en bloques estructurales.
- Se realiza el comité de obra #4 en el cual se hizo un recorrido rápido para definir actividades

Powered by CamScanner

que se deben ir trabajando en la proxima semana con lo que se ha hablado en los anteriores comites. En este comite estuvieon presentes por parte de la gobernación: Carlos Julian Ocampo. Por parte de la alcaldia: Gosan Cañas. Por parte de interventoria: Felipe Bucurú Patiño. Por parte del contratista: Orlando Giraldo, Jessica Restrepo Ramirez, Alejandro Uribe López, Diana carolina López, Andrea López vásq...

Interventoria

Lunes 2 de marzo de 2026 clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 maestro
1 Aux residente 2 oficiales
1 profesional SST 6 ayudantes
1 Aux SST

Equipo: Herramienta menor, demoledor.

Actividades detalladas:

- Se continua con la excavación en el ingreso vehicular.
- Demolición de losa en el interior de la planta para la ubicacion de las rejillas. Demolición de losa en la zona de pasillo de acceso. Demolición de bordillo en corrales bovinos.
- Descofrado de comedero y bebedero. Descofrado de la viga de cerramiento

La interventoria ha realizado actividades de acompañamiento en la obra.

Martes 3 de marzo de 2026 clima: soleado.

Equipo: Herramienta menor, demoledor.

Powered by CamScanner

Actividades detalladas:
- construccion de losa en los cuatros de observacion Bovinos e HidroFlow
- Se termina de demoler la losa del Pasillo de acceso, vestier, y cuarto de insumos, se demuele el bordillo en corrales bovinos
- retiro de PeFiles metalicos en el desembarcadero
- Demolicion de "zapatas" que sostenian los PeFiles

Lo Interventoria Realizo observaciones de cumplimiento en las labores de la obra

Miercoles 4 de Marzo de 2026.
Lo Interventoria Solicita al Contratista estar al tanto del muro en Concreto ciclopeo que cumple la Funcion de cerramiento en la Planta y que actualmente se encuentran Realizando Excavación y llenado de Subbase para una posterior Compactación. Hay que tener cuidado ya que esa parte del muro ya Falló. (Dislocacion) y la Vibracion de los Equipos de compactacion al momento de utilizarlos en esa zona con las vigas de cimentacion Destapadas en el muro de cerramiento Podria ocasionar Movimiento del muro. y Posible desplome. Por tanto si ese muro se evidencia que este en Situaciones de Caerse Por Favor Retirar al Personal que alli se ubica.

Jueves 5 de Marzo de 2026
Se continua con el llenado de Subbase en la Entrada Vehicular. Se Realiza demolición y Excavación para la ubicacion de las tuberias en el Sector de Pasillos Se Realiza los Cortes Antideslizantes en los Corrales de Bovinos. Se Realiza la demolicion de losa para la ubicacion de las vigas de Cimentacion en el Desembarcadero.

Viernes 6 de Marzo de 2026.
Continua con la demolicion de losa en Corrales de Porcinos. Se continua con la Compactacion de Subbase en la entrada de la Planta. Se Realiza Vaciado de Concreto en la Franja del Corral de Bovinos. Se le Solicita.

Powered by CamScanner

Al contratista que tome Independiente que realice actividades en la que se encuentre el riesgo su salud cuente con los elementos e implementos de protección personal. y que la interventoría. Cuando actividades en obra donde el trabajador no este cumpliendo con los elementos necesarios para esa actividad ocasionando que el trabajador pueda tener problemas de salud. es de tener en cuenta que hay un rubro (P610) que este destinado en proveer elementos de protección y dotación al personal vinculado en obra. y en caso de que no se tenga en obra dichos elementos la interventoría no realizará el pago de esta actividad que este dentro del presupuesto

Sabado 7 de marzo de 2026 clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Aux residente 2 oficiales
1 Profesional SST 7 ayudantes
1 Aux residente

Equipo: Herramienta menor. Demoledor. Pulidora, concretadora de medio bulto.
Actividades detalladas:

- continuación con la excavación de tierra en la zona del desembarcadero dejandolo a nivel para la proxima colocación de las canastas de refuerzo
- Se continua con la demolición de la losa en los corrales de porcinos. Demolición de losa fuera del cuarto de observación de bovinos para la proxima adecuación de tuberias de desagüe
- Se realiza el vaciado de la losa de 12 cm con malla en el vestier y pasillo dejando refuerzo para la escalera.
- retiro de escombros generado por las demoliciones

La interventoría no estuvo realizando actividades de acompañamiento en los trabajos de la obra.

Powered by CamScanner

Lunes 9 de marzo de 2026 Clima: Nublado → mañana
soleado → tarde

Personal: 1 Residente de obra — 1 Maestro
1 Aux residente — 1 Oficial
1 Profesional SST — 8 ayudantes
1 Aux SST

Equipos: Herramienta menor, Demoledor, concretadora de medio bulto, Pulidora

Actividades detalladas

* Ubicación y compactación de subbase en la oficina
- Vaciado de la losa de concreto reforzada con malla 15 x 15 x 5 en la oficina y cuarto de insumos.
- excavación de tierra al rededor del cuarto de observación de bovinos para la futura instalación de las tuberías de desagüe
- Se realizaron 3 retiros de escombro en volquetas
- corte con pulidora en la entrada de cuarto de observación de bovinos para las rejillas y desagüe
- Se inicia la demolición de muro para la ubicación de las columnas de los porticos
- excavación de tierra para ubicar las zapatas de las columnas.
- demolición de tapas de concreto reforzado en zona de corrales porcinos
- Rayado de pared en el cuarto de patas y cabezas

Se intervienen los espacios mencionados en las actividades de la obra.

Powered by CamScanner

Martes 10 de marzo de 2026 Clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Maestro
1 Aux residente, 2 Oficiales
1 Profesional SST, 8 ayudantes
1 AUX SST

EQUIPO: Herramienta menor, Pulidora, demoledor

ACTIVIDADES detalladas:

- Demolición de losa para la ubicación de rejillas en el cuarto de observación de bovinos
- excavación de tierra afuera del cuarto de observación de bovinos para dar pendiente de la instalación de las tubería de desagüe y de rejillas
- Se hace retiro de escombros en volqueta de 1 viaje.
- Se continua con la excavación de tierra para ubicar las zapatas de las columnas de la entrada vehicular.
- Se comienza con la excavación de tierra en corrales porcinos para ubicar proximamente la subbase
- Se continua con el rayado de paredes en el cuarto de patas y cabeza, visceras rojas y blancas

Lo inventariado ha estado haciendo acompañado en las actividades de la obra.

Miercoles 11 de marzo de 2026 clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Maestro
1 Aux residente, 2 oficiales
1 profesional SST, 7 ayudantes
1 AUX SST

EQUIPO: Herramienta menor, Pulidora, Demoledor, concretadora de

Powered by CamScanner

medio bulto

Actividades detalladas

- Se comienza con la instalación de tubería de desague del cuarto de observación de bovinos Demolición de losa para el desagüe en la entrada del veterinario
- Se realizaron las canastas de acero de refuerzo para las zapatas y porticos de columnas, de igual forma de las vigas de cimentación de la rampa del desembarcadero.
- Se realiza la instalación de todas estas canastas y se procede con la vaciada de concreto de las zapatas en la entrada vehicular.
- Se inicia con la ubicación de la capa de subbase en la zona de corrales porcinos
- Inicio de instalación de enchape en el cuarto de viseras rojas.

Lo interventoría Hse estuvo presente en las actividades Realizadas en la obra

Jueves 12 de marzo de 2026 clima lluvioso

Se solicita al contratista de la obra que los implementos de Protección Personal para la actividad del Resane de los muros estén en obra ya que esta actividad genera gran cantidad de polvo que puede perjudicar la salud de los que realizan dicha labor

Personal: 1 Residente de obra — 1 Maestro
1 Aux residente — 7 ayudantes
1 Profesional SST — 1 Oficial
1 Aux SST

Equipo: Herramienta menor, pulidora, concretadora medio bulto.

Powered by CamScanner

Actividades detalladas

- Se termina de realizar el vaciado de las columnas del pórtico de la entrada vehicular
- Se deja realizado el acero de las viguetas del cuarto de observación de porcinos e hidroflow para su vaciado
- Se termina de instalar las tuberías de desagüe del cuarto de observación de bovinos para proceder con el vaciado de la losa la próxima semana.
- Se comienza a instalar el acero necesario para la rampa del desembarcadero
- Se realiza demolición del muro ciclopeo del desembarcadero hacia corrales porcinos
- Se realiza picado de piso dentro de las rejillas para generar pendiente hacia los desagües.

Viernes 13 de marzo de 2026 clima: soleado

Personal: 2 Residente de obra — 1 Maestro
1 Auxiliar residente — 2 oficiales
1 profesional SST — 8 ayudantes
1 Auxiliar SST

Equipo: Herramienta menor, pulidora, demoledor, vibro compactador

Actividades detalladas.

- Se realiza el levantamiento de muros del cuarto de observación de porcinos e hidroflow.
- Se deja despejado la zona para hacer el planteamiento del cuarto de subproductos.
- Se continua con la labor de rayado de paredes dentro de la planta para la adecuación de la instalación de

Powered by CamScanner

enchape
- se continua con la demolicion de media cañas existentes para la instalacion de enchape
- Se continua con la ubicacion de subbase en corrales porcinos

Sabado 14 de marzo de 2026 clima: soleado

personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar residente 2 oficiales
1 profesional SST 8 ayudantes
1 auxiliar SST

Actividades detalladas
- Se termina de instalar la sub base en corrales porcinos.
- Se instala el acero de las viguetas que se habian preparado para el cuarto de observacion de porcinos e hidroflow para el vaciado de este la semana entrante
- Se realiza vaciado de losa en el comedero y bebedero del cuarto de observacion de bovinos para dejarlo a una buena altura para estos.

Lunes 16 de marzo de 2026 clima: soleado

personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar residente 3 oficiales
1 Profesional SST 8 ayudantes
1 Auxiliar SST

Equipo: Herramienta menor, Demoledor, concretadora de medio bulto.

Actividades detalladas:

Powered by CamScanner

- Se realiza el vaciado de la losa en donde se ubica la tubería de desague del cuarto de observación de Bovinos
- Se continua con la instalación del acero en la rampa del desembarcadero
- Se continua con la demolición del muro ciclopeo del desembarcadero hacia corrales Porcinos
- Se continua con el Picado de Piso de las rejillas para generar pendiente de desague

Martes 17 de marzo de 2026 clima: Soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 Maestro
1 Auxiliar residente 2 oficiales
1 Profesional SST 7 ayudantes.
1 Auxiliar SST

Equipo: Herramienta menor, Demoledor, concretadora de medio bulto, Pulidora.

Actividades detalladas:

- Se comienza con el planteo del cuarto de subproductos, comenzando con los cortes y demoliciones para las vigas de cimentación de este cuarto
- Se termina de demoler el muro de la rampa en dirección a corrales porcinos
- Se hace vaciado de la losa del de cuarto del Hidroflow con refuerzo de malla electrosoldada
- Se realiza vaciado de viguetas del cuarto de observación de porcinos
- Picado de piso de rejillas para dejas despejad y con pendiente los desagües de este.

Powered by CamScanner

Miercoles 18 de marzo de 2026 clima: lluvioso

personal: 1 Residente de obra
1 Auxiliar residente
1 Profesional SST
1 Auxiliar SST
1 Maestro
2 oficiales
8 Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, demoledor.

ACTIVIDADES detalladas:

- Demolición de losa en corrales porcinos para la instalación de las canastas de acero para las vigas de cimentación para la construcción del cuarto de subproductos no comestibles
- Se deja instalado el acero correspondiente de los muros de la rampa del desembarcadero
- Se realiza levantamiento de muro encima de la viga para dejar pendiente para la instalación de las tejas del cuarto de observación de porcinos e HidroFlow
- Se continua el picado de tierra al interior de la rejilla dentro de la planta para generar pendiente.

Powered by CamScanner

	CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA	MUNICIPIO DE PALESTINA- CALDAS ACTA DE COMITÉ N° 1.	PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	Municipio de Palestina - Caldas	FECHA	30	01	2026
Departamento	Caldas	CONTRATO No.	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

OBJETO DE CONTRATO:

"ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

CONTRATISTA OBRA:	FUSIÓN INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA

I. NOMBRE Y CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Nombre: Carlos Julián Ocampo M **Cargo:** Supervisor administrativo	
Nombre: Andrés Osorio Bermúdez **Cargo:** Supervisor técnico	
Nombre: Alexander Patiño Torres **Cargo:** Rep Legal. Interventoría	
Nombre: Catalina Salazar García **Cargo:** Prof. Seguridad y Salud	Catalina Salazar García.
Nombre: Felipe Bucaro Patiño **Cargo:** Residente de interventoría	
Nombre: Alesandro Uribe López **Cargo:** Residente de obra	
Nombre: Nelson J. Castaño Gonzalez. **Cargo:** Coord. Plantación apoyo supervisión	Nelson J. Castaño G.
Nombre: Gerson Cañas Vargas **Cargo:** Medico Veterinario	Gerson Cañas V.
Nombre: Juan David Ramirez G **Cargo:** Ing. Fusion	
Nombre: Andrea López Vásquez **Cargo:** Ing Civil Fusión Ingeniería SAS.	
Nombre: Diana Carolina López López **Cargo:** Ing. Civil - Fusion Ingeniería	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	

Powered by CamScanner

	CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA	MUNICIPIO DE PALESTINA- CALDAS ACTA DE COMITÉ N° 1	PÁGINA	1	DE	3
UNIDAD EJECUTORA:		Municipio de Palestina Caldas	FECHA	30	1	2026
Departamento		Caldas	CONTRATO No.	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

OBJETO DE CONTRATO:

"ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

CONTRATISTA OBRA:	FUSIÓN INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA

I. NOMBRE Y CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Nombre: Carlos Julián Ocampo. **Cargo:** Supervisor administrativo Gobernación de Caldas.	**Original Firmado**
Nombre: Andrés Osorio Bermúdez. **Cargo:** Supervisor técnico Gobernación de Caldas.	**Original Firmado**
Nombre: Alexander Patiño Torres. **Cargo:** Rep. Legal Interventoría de obra.	**Original Firmado**
Nombre: Caterine Salazar García. **Cargo:** Profesional seguridad industrial. Interventoría de Obra.	**Original Firmado**
Nombre: Felipe Bucurú Patiño. **Cargo:** Residente Interventoría de obra.	**Original Firmado**
Nombre: Alejandro Uribe López. **Cargo:** Auxiliar residente de obra. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Nelson Castaño Gonzáles. **Cargo:** Coordinador Planeación. Apoyo a la supervisión.	**Original Firmado**
Nombre: Gerson Cañas Vargas. **Cargo:** Médico veterinario.	**Original Firmado**
Nombre: Juan David Ramírez Gómez. **Cargo:** Ing. Alimentos. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Andrea López Vásquez **Cargo:** Ing civil. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Diana Carolina López López **Cargo:** Ing civil. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	

Powered by CamScanner

II. OBJETO

Recorrido en campo para revisión de presupuesto y planimetría con el fin de verificar la conveniencia y alcance de las actividades para la apertura de la planta de beneficio animal.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica

V. TEMAS TRATADOS

1. Siendo las 9:00 am del día 30 de enero de 2026 se da inicio al comité de obra en las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal de Palestina, se indica el claro objetivo de la reunión, el cual es revisar el alcance del proyecto de conformidad con las especificaciones técnicas, presupuesto y planimetría, en complemento con la visita inicial del proyecto.

2. En compañía de las personas relacionadas en el encabezado de este documento se da inicio al recorrido en el orden que se indica a continuación, se realiza la revisión de cada uno de los ítems del presupuesto por áreas con respecto a la ubicación relacionada en la planimetría, en tal sentido la supervisión del convenio y del contrato llega a la conclusión de realizar un balance de obra donde se incluyan las siguientes actividades adicionales y se corrijan las cantidades contractuales que garanticen el correcto cumplimiento de la normatividad INVIMA en la edificación:

>Corrales: Se indica que, se debe incluir la báscula de porcinos en el balance, cuarto de observación de porcinos y adecuación del cuarto de observación de bovinos incluyendo brete, comedero y bebedero, desague, rejilla en el ingreso y malla angeo, cuarto de almacenamiento de sangre y subproductos, organizar las tapas de los corrales en la zona donde se proyecta la adecuación de corrales de porcinos, Pintura de barandas en corrales y fachada. El hidrolavado de paredes y piso lo realizará la Administración Municipal. Se debe incluir la plataforma de inspección para corrales ubicada de manera paralela al muro donde se instalará el cerramiento perimetral.

>Ingreso vehicular: Se debe incluir la rampa de desembarcadero para bovinos y porcinos (ancho del muro 1,20 m para que se ajuste a 0,80 m libres una vez instaladas las barandas, además de la adecuación del ingreso de camiones, se debe garantizar que la altura del desembarque de los camiones sea de 1,20 hasta el punto donde salen los animales a la rampa, cambiar la cubierta de la báscula e instalar polisombra en todos los corrales.

>Zona de proceso: Se indica que se debe incluir en el balance el recorrido de la cubierta y cambio de teja que se requiera para evitar filtraciones, incluir de igual manera la instalación de flanches. Incluir el enchape para todas las áreas de proceso a una altura de 2,30 m y de esta altura hacia arriba dejar incluido solamente pintura tipo I.

>Cerramiento perimetral: Se debe incluir la concertina en el perímetro de la PBA con el fin de complementar el cerramiento. Incluir en el balance los anclajes requeridos para el acero soldado a los postes.

>Box de bovinos : Incluir el mantenimiento de la puerta guillotina, la contrapesa y el mantenimiento del box.

>Zona de pieles: Se solicita incluir en el balance el muro en superboard para la parte superior del cuarto con el fin de evitar zonas de acumulación de polvo y que este espacio sirva para almacenar elementos en dado caso.

Powered by CamScanner

>PTAR: Se solicita al contratista incluir en el balance el tablero eléctrico y la bomba, las tapas , la cubierta del lecho de secado y el estercolero, las bacterias. Y la limpieza de las unidades contenida en el ítem de mantenimiento.

>Varios: Incluir en el balance la celaduría nocturna teniendo en cuenta que la Administración no cuenta con este servicio contratado.

Se solicita al contratista realizar la instalación de la valla para el contrato y realizar la radicación del balance de obra.

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

NINGUNA

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Balance de obra. 05 de febrero de 2026.	Contratista e Interventoría.
Reunión para revisión de balance de obra con supervisión. 10 de febrero de 2026.	Contratista, interventoría, Supervisión Gobernación de Caldas y Supervisión Administración Municipal.
Entrega de arte para la valla. 05 de febrero de 2026.	Supervisión Gobernación de Caldas.

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Posible fecha:

FECHA 10 (DIA) 2 (MES) 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en PALESTINA - CALDAS a los:

TREINTA (Día en letras) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Powered by CamScanner

	CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA	MUNICIPIO DE PALESTINA- CALDAS ACTA DE COMITÉ N° 2	PÁGINA	1	DE	5

UNIDAD EJECUTORA:	Municipio de Palestina - Caldas	FECHA	13	02	2026
Departamento	Caldas	CONTRATO No.	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

OBJETO DE CONTRATO:

"ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

CONTRATISTA OBRA:	FUSIÓN INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA

I. NOMBRE Y CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Nombre: Gerson Cañas V Cargo: Medico Veterinario. Alcaldia Mpal	Gerson Cañas V.
Nombre: Carlos Julio Ocampo M Cargo: Supervisor administrativo Gobernacion	
Nombre: Andrés Osorio Bermúdez Cargo: Supervisor técnico Gobernacion	
Nombre: Felipe Bucurú Patiño Cargo: Residente de interventoria	
Nombre: Juan David Ramirez G Cargo: Coordin. Técnico Fusion Ing. SAS.	
Nombre: Alejandro Uribe López Cargo: Auxiliar residente Fusion Ing SAS.	
Nombre: Jessica Restrepo Ramirez Cargo: SST. Fusion Ing. SAS.	
Nombre: Diana Carolina López López Cargo: Lider Civil - Fusion Ingenieria SAS.	
Nombre: Andrea López Vásquez. Cargo: Residente obra. Fusion Ingenieria SAS	
Nombre: Cargo:	
Nombre: Cargo:	
Nombre: Cargo:	
Nombre: Cargo:	
Nombre: Cargo:	

Powered by CamScanner

	CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA	MUNICIPIO DE PALESTINA- CALDAS ACTA DE COMITÉ N° 2	PÁGINA	1	DE	5
UNIDAD EJECUTORA:		Municipio de Palestina Caldas	FECHA	13	2	2026
Departamento		Caldas	CONTRATO No.	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

OBJETO DE CONTRATO:

"ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

CONTRATISTA OBRA:	FUSIÓN INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA

I. NOMBRE Y CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Nombre: Gerson Cañas Vargas. **Cargo:** Médico veterinario.	**Original Firmado**
Nombre: Carlos Julián Ocampo. **Cargo:** Supervisor administrativo Gobernación de Caldas.	**Original Firmado**
Nombre: Andrés Osorio Bermúdez. **Cargo:** Supervisor técnico Gobernación de Caldas.	**Original Firmado**
Nombre: Felipe Bucurú Patiño. **Cargo:** Residente interventoría de obra.	**Original Firmado**
Nombre: Juan David Ramírez Gómez. **Cargo:** Ing. Alimentos. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Alejandro Uribe López. **Cargo:** Auxiliar residente de obra. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Jessica Restrepo Ramírez. **Cargo:** SST. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Diana Carolina López López **Cargo:** Ing civil. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Andrea López Vásquez **Cargo:** Ing civil. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	

Powered by CamScanner

II. OBJETO

Recorrido en campo con el fin de revisar cuales de las actividades incluidas en el balance deben ser retiradas y priorizar lo requerido en cada una de las áreas para cumplimiento del INVIMA.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay observaciones al acta de comité N°1.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Balance de obra. 05 de febrero de 2026.	Contratista e Interventoría.	Cumplido
Reunión para revisión de balance de obra con supervisión. 10 de febrero de 2026.	Contratista, interventoría, Supervisión Gobernación de Caldas y Supervisión Administración Municipal.	Cumplido
Entrega de arte para la valla. 05 de febrero de 2026.	Supervisión Gobernación de Caldas.	Pendiente de ajustes por el área de prensa de la Gobernación de Caldas

V. TEMAS TRATADOS

1. Siendo las 9:00 am del día 13 de febrero de 2026 se da inicio al comité de obra en las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal de Palestina, en el cual se pretende realizar la revisión de los ítems incluidos en el presupuesto del balance en cada una de las áreas de la planta con el fin de darle el mayor alcance a los requerimientos del INVIMA para apertura de la planta. La metodología de trabajo a implementar consiste en revisar cada una de las áreas de la PBA e ir indicando los requerimientos del INVIMA, será la supervisión tanto de la Administración como de la Gobernación quienes se encarguen de indicar cuáles actividades se dejan priorizadas en el proyecto y qué se puede retirar.

>Corrales bovinos:

1. Plataforma de observación de 3 metros, ubicarla a 1,80m de altura del piso.
2. Rayado del concreto en el área de corrales cada 15 cm.
3. Polisombra en toda el área de corrales.
4. Enchape para los bebederos, así como la instalación de puntos de suministro y desague.
5. Concreto de la canal en concreto que conduce el agua del estercolero a la PTAR.
6. Cubierta del lecho de secado de lodos y del estercolero.
7. Incluir el cerramiento para el estercolero a una altura de 60 cm con el fin de que los bovinos no tengan acceso, incluir una puerta pequeña para facilitar el ingreso del personal a realizar limpieza al estercolero.

Powered by CamScanner

8. Viga para cerramiento perimetral y cerramiento como está establecido en el presupuesto contractual. Incluir la totalidad de la planta e incluir la concertina dentro de los ítems no previstos. Se indica por parte de la interventoría que fue solicitado a la Administración Municipal la radicación de un oficio donde se indique de manera técnica la forma de instalación del cerramiento en la muro existente.

9. Pintura de barandas de corrales.

>PTAR:

1. Tablero eléctrico para operación de la bomba de retiro de lodos.
2. Bomba para succión de lodos.
3. Tapas para pozo de bombeo.

>Corral de observación de bovinos:

1. Incluir una puerta para ingreso de personal y una puerta para ingreso de bovinos.
2. Subir las paredes del corral hasta la cubierta para dejar hermético el espacio.
3. La puerta de ingreso de bovinos debe quedar de 0,80 metros libres.
4. Realizar la instalación de una rejilla anticucaracha para desague interno del cuarto en el momento de realizar limpieza y adicionalmente, realizar la conexión de la tubería a la cámara más próxima.
5. La puerta de ingreso de los bovinos debe ser corrediza para que pueda abrir de manera completa, esto considerando que la pendiente existente del corral y el espacio disponible para ubicación del bovino limitan las condiciones de espacio para abrir en una puerta convencional. Sin embargo, para el ingreso del veterinario si es posible realizar el ingreso por otra puerta que quedará ubicada de manera lateral con 60 cm de ancho libres.
6. Realizar la instalación de una rejilla en HR para evitar que el agua que escurra en los corrales ingrese al corral de observación por los espacios destinados al ingreso del bovino y el veterinario.
7. La cubierta no lleva canal de aguas lluvias ni bajante.

>Báscula de bovinos:

1. Incluir en el balance el cambio de la cubierta y estructura.

>Corrales de porcinos:

1. Corral de sacrificio: Se solicita instalar una lámina para tapar la parte baja de la baranda y evitar el paso de los porcinos por fuera de la manga de conducción. Este mismo sistema debe estar implementado para la zona de desembarcadero de porcinos.
2. Realizar el ajuste al box de porcinos para hermetizar el mismo evitando el ingreso de plagas o el contacto directo del área de proceso con el corral de sacrificio.
3. Incluir cielo raso en el corral de sacrificio (zona de ingreso y zona de conducción a box).
4. Incluir ventanas con angeo y celosía para las ventanas ubicadas sobre la parte superior de la manga del ingreso al box, de esta manera se garantiza la ventilación, iluminación y se evita el ingreso de plagas.
5. Incluir en el balance el cuarto de observación de porcinos y el cuarto para el hidroflow. Estos se ubicarán en la zona contigua al tanque de almacenamiento de 5000 L. Para ellos se debe realizar la demolición de la estructura existente y el burladero para ampliar el espacio y realizar una distribución adecuada. El cuarto de observación de porcinos debe ir construido en ladrillo estructural y debe contener comedero y bebedero, además de estar revocado. Se solicita incluir ventanas para ventilación en el cuarto de observación de porcinos y bovinos.
6. Polisombra en toda el área de corrales. No se incluirá en el balance de obra la báscula para porcinos.
7. Cambiar el sentido de la puerta de ingreso del corral de sacrificio de porcinos e incluir una puerta para el ingreso del veterinario.

Powered by CamScanner

8. Construir una rampa pequeña que evite el empozamiento de agua hacia la esquina del corral de sacrificio. Se define no instalar comederos y bebederos en este espacio. Instalar una lámina para evitar el paso de los porcinos hacia el muro en superboard. Instalar una rejilla anticucarachas en la zona para el lavado.

>Zona escaldador de porcinos y proceso:

1. El escaldador será ubicado contiguo a la sala de pieles. La peladora será ubicada dentro del área de pieles, se debe cerrar el espacio por donde ingresa en este momento la piel al cuarto y se debe abrir un buque por la parte frontal del cuarto es decir, sobre la pared que da hacia la zona de sangría, la puerta de ingreso de pieles debe abrir hacia afuera con un sistema de anclaje que permita el amarre superior mientras esté en operación la peladora. Se debe realizar la instalación de un soporte vertical para la perfilería en la zona del escaldador cimentado en un pilote, esto teniendo en cuenta que se debe trasladar el poste y conectar la rielería. El lavamanos se instalará en la pared del frente del escaldador con el esterilizador de cuchillos, el escaldador contará con campana de extracción de vapor.

2. Se debe retirar del balance las hojas de repuesto para las sierras de esternón y canal.

3. Para la salida del filtro sanitario se debe construir un muro y dos puertas, una de ellas conecta al área limpia previa al ingreso de cuartos fríos y la otra conecta al área sucia, zona de box de porcinos y escaldador. Esta área debe llevar una lámpara.

>Sangría:

1. Para esta área debe cambiarse la rejilla existente, reducir el espacio de la rejilla a 20 cm de ancho, cambiar por acero inoxidable, se define dejar la cañuela existente para no cambiar la pendiente de salida de la sangre, adicionalmente dejar la rejilla de un largo de 5,60m.

2. Subir los muros hacia el cielo raso en la zona de subproductos y dejar una puerta en acrílico tipo ingreso de duchas. No se suministrará escalera para el ingreso, indica el personal de la Administración que hará uso de una escalera de la PBA.

>Vísceras blancas y rojas:

1. Se define realizar la instalación de enchape a una altura de 1,90 m y el resto de pared en pintura tipo I. Incluir en el balance 2 luminarias adicionales.

2. Pasillo de vísceras: Incluir pintura epóxica hasta la junta de dilatación y por encima de esta acabado en pintura tipo I.

>Patas y cabezas:

1. Se define incluir en el balance enchape para paredes y 2 luminarias adicionales.

>Pasillo de cuarto frío:

1. Se define incluir en el balance pintura para el pasillo.

>Pasillo de cuartos fríos:

1. Se define incluir en el balance pintura para el pasillo en la parte más alta y completar con enchape para las áreas bajas indicadas por la supervisión.

2. Incluir dos plataformas móviles , una para lavado y otra para inspección previo al ingreso en el cuarto frío.

3. Realizar la instalación de una rejilla en L que cubra el espacio donde se esperan empozamientos en la zona de pasillo de cuartos fríos.

4. Incluir 4 topellantas (2 para zona de desembarcadero, 2 para zona de cargue de canales).

>Caldera:

1. Se define incluir en el balance marcos en malla para evitar el ingreso de personal por la parte alta a la zona de la Caldera, se propone en malla eslabonada.

>Zona de ingreso vehicular:

1. Se solicita incluir en el balance el ajuste en mortero y/o sistema metálico para templar la malla en la parte inferior para el ingreso vehicular de cargue de canales.

Powered by CamScanner

Algunas observaciones de carácter general importantes:

1. La limpieza de las paredes en la zona de corrales la realizará el Municipio haciendo uso de hidrolavadora en un momento próximo a la visita del INVIMA.

2. Se indica por parte de la supervisión que lo indicado en los planos acerca de la ubicación del escaldador de porcinos no se va a realizar por temas de alcance presupuestal, en lugar de ello el escaldador se ubicará como se indicó en la página 4 del presente comité.

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

NINGUNA

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Balance de obra. 18 de febrero de 2026.	Contratista e Interventoría.
Reunión para revisión del balance. 20 de febrero de 2026.	Supervisión, contratista, interventoría.

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Posible fecha:

FECHA	20	2	2026
	DIA	MES	AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en PALESTINA - CALDAS a los:

Trece	días del mes de	Febrero	de	2026
(Día en letras)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Powered by CamScanner

	CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA	MUNICIPIO DE PALESTINA- CALDAS ACTA DE COMITÉ N° 3	PÁGINA	1	DE	4

UNIDAD EJECUTORA:	Municipio de Palestina - Caldas	FECHA	20	02	2026
Departamento	Caldas	CONTRATO No.	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

OBJETO DE CONTRATO:

"ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

CONTRATISTA OBRA:	FUSIÓN INGENIERÍA SAS
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA

I. NOMBRE Y CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Nombre: Felipe Bucaro Patiño Cargo: Residente de interventoria	
Nombre: David Steven Taballi (ausente) Cargo: Medico Veterinario (Gobernacion)	
Nombre: Carlos Julian Ocampo Muñoz Cargo: Supervisor administrativo Gobernacion	
Nombre: Andres Osorio Bermudez Cargo: Supervisor tecnico Gobernacion	Andres
Nombre: Gerson Cañas V Cargo: Médico Veterinario Alcaldia Mpal.	Gerson Cañas V.
Nombre: Alejandro Uribe López Cargo: Aux residente de obra Contratista Obra	
Nombre: Jessica Restrepo Ramirez Cargo: SST Contratista Obra	
Nombre: Catalina Salazar García Cargo: SST Interventoria	Catalina Salazar García
Nombre: Juan David Ramirez G Cargo: Fusión Ingenieria SAS	
Nombre: Juan Sebastian Moreno Mejia Cargo: Secretario de Planeacion Alcaldia Mpal.	
Nombre: Diana Carolina López López Cargo: Ing. Civil Fusión Ingenieria	
Nombre: Andrea López Vásquez. Cargo: Gerente operacional / Residente Obra Ing. Fusión	
Nombre: Cargo:	
Nombre: Cargo:	

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE PALESTINA	**CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA**	**MUNICIPIO DE PALESTINA- CALDAS ACTA DE COMITÉ N° 3**	PÁGINA	1	DE	4

UNIDAD EJECUTORA:	Municipio de Palestina Caldas	FECHA	20	2	2026
Departamento	Caldas	CONTRATO No.	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

OBJETO DE CONTRATO:

"ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

CONTRATISTA OBRA:	FUSIÓN INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA

I. NOMBRE Y CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Nombre: Felipe Bucurú Patiño. **Cargo:** Residente interventoría de obra.	**Original Firmado**
Nombre: David Stiven Tabares Cárdenas. **Cargo:** Médico Veterinario Gobernación de Caldas.	**Original Firmado**
Nombre: Carlos Julián Ocampo. **Cargo:** Supervisor administrativo Gobernación de Caldas.	**Original Firmado**
Nombre: Andrés Osorio Bermúdez. **Cargo:** Supervisor técnico Gobernación de Caldas.	**Original Firmado**
Nombre: Gerson Cañas Vargas. **Cargo:** Médico veterinario.	**Original Firmado**
Nombre: Alejandro Uribe López. **Cargo:** Auxiliar residente de obra. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Jessica Restrepo Ramírez. **Cargo:** SST. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Caterine Salazar García. **Cargo:** Profesional seguridad industrial. Interventoría de Obra.	**Original Firmado**
Nombre: Juan David Ramírez Gómez. **Cargo:** Ing. Alimentos. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Juan Sebastián Rodriguez Mejía **Cargo:** Secretario de planeacion y desarrollo integral. Alcaldía.	**Original Firmado**
Nombre: Diana Carolina López López **Cargo:** Ing civil. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Andrea López Vásquez **Cargo:** Ing civil. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	

Powered by CamScanner

II. OBJETO

Revisión en campo del balance enviado por el contratista de obra y priorización de actividades teniendo en cuenta lo indicado por la supervisión acerca de la falta de recursos para adicionar el proyecto.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay observaciones al acta de comité N°2.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Balance de obra. 18 de febrero de 2026.	Contratista e Interventoría.	Cumplido

V. TEMAS TRATADOS

1. Siendo las 9:00 am del día 20 de febrero de 2026 se da inicio al comité de obra en las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal de Palestina, en el cual se pretende realizar la revisión de los ítems incluidos en el presupuesto del balance en cada una de las áreas de la planta. La metodología de trabajo a implementar consiste en revisar cada una de las áreas de la PBA e ir indicando los requerimientos del INVIMA, será la supervisión tanto de la Administración como de la Gobernación quienes se encarguen de indicar cuáles actividades se dejan priorizadas en el proyecto y qué se puede retirar.

Adicional a lo indicado en el comité N°2 se tiene lo siguiente:

>Corrales bovinos:

1. Retirar del balance la Plataforma de observación de 3 metros.
2. Polisombra en toda el área de manga de conducción desde cuarto de observación y hasta corral de

>Corral de observación de bovinos:

1. Instalar solamente concertina en el área que cubre la cubierta del cuarto de observación de bovinos.
2. No retirar la estructura de cubierta ni cambio de tejas.
3. Instalar dos ventanas pequeñas para ventilación e iluminación, estas quedarán ubicadas sobre la pared que da hacia el área de corrales.

>Báscula de bovinos:

1. Incluir en el balance el cambio de la cubierta y estructura. Esta se realizará a dos aguas.
2. Solicitud de concepto técnico sobre muro de cerramiento posterior

La Interventoría solicita al Secretario de Planeación pronunciamiento frente al Oficio IP-132-001-2025, mediante el cual se requiere contar con un concepto técnico respecto al muro de cerramiento posterior de la planta, considerando que sobre dicha estructura se tiene proyectada la instalación de la malla de cerramiento contemplada dentro del proyecto.Durante el desarrollo del comité, el Secretario de Planeación manifiesta que actualmente la Administración Municipal no cuenta con un profesional en ingeniería estructural que permita realizar la evaluación técnica del estado del muro y emitir una recomendación formal respecto a su capacidad estructural para soportar los elementos proyectados del cerramiento. En tal sentido, propone que la situación sea analizada en el marco del presente comité, con el fin de definir una alternativa técnica que permita al contratista continuar con la ejecución de las actividades programadas en obra. Por su parte, la Supervisión por parte de la Administración indica que, atendiendo la solicitud de la Interventoría relacionada con la presentación de un documento técnico donde se defina el sistema de anclaje del cerramiento en las zonas que presentan mayor criticidad —teniendo en cuenta el estado del muro existente que soportaría la viga del cerramiento—, se propone incluir dentro del balance del proyecto la siguiente alternativa constructiva:

Powered by CamScanner

Instalar tubería metálica redonda (similar a la utilizada para corrales), la cual será cimentada por la parte interna de la PBA, colindante con el muro existente. Cada elemento vertical contará con una cimentación de 0.30 m x 0.30 m x 0.50 m, con acero de refuerzo y concreto de 3.000 PSI.La tubería vertical será rigidizada mediante una viga metálica, a la cual se soldará la estructura del cerramiento contemplada dentro del presupuesto del proyecto, finalizando en su parte superior con concertina de seguridad. La separación entre los elementos verticales será de dos (2) metros.La anterior alternativa se plantea con el fin de garantizar la estabilidad del sistema de cerramiento, minimizar la intervención sobre el muro existente y permitir la continuidad de las actividades constructivas del proyecto.

>Zona de salida carros de sangre y desembarcadero de bovinos y porcinos:

1. Los carrros de sangre serán retirados por la zona de corrales de porcinos.

2. La rampa de desembarcadero de bovinos tendrá una longitud aproximada de 6,70 metros. Ancho de 1,20 metros para que una vez ubicadas las barandas el ancho libre sea de 0,80 m.

Observaciones generales al balance presentado:

Durante la evaluación del balance presentado por el contratista, el secretario de Planeación y la Interventoría solicitan al residente de obra explicar la forma en que se encuentran justificados los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a los ítems no previstos incluidos dentro del balance. En respuesta, el residente de obra manifiesta que cada uno de los APU presentados se encuentra sustentado con base en análisis utilizados en otros proyectos similares ejecutados en plantas de beneficio, entre ellas la Planta de Beneficio de Chinchiná, cuyos APU fueron previamente revisados y aprobados por la Gobernación de Caldas y ademas teniendo en cuenta el incremento de la mano de obra, lo cual ha servido como referencia técnica para la estructuración de los valores incluidos en el balance actual. Posteriormente, el secretario de Planeación consulta si, para los APU correspondientes a ítems no previstos —especialmente aquellos relacionados con equipos—, es posible complementar la justificación mediante cotizaciones o precios de proveedores, con el fin de fortalecer el soporte técnico y económico de los mismos. Así mismo la supervisión por parte de gobernación , solicita que aquellos APU que se encuentren presentados bajo unidades de medida globales puedan ser desagregados en mayor nivel de detalle, permitiendo identificar claramente los componentes de costo, con el propósito de contar con una adecuada justificación ante los entes de control y facilitar su revisión en eventuales procesos de auditoría. Frente a esta solicitud, el residente de obra del contratista manifiesta su conformidad e indica que es posible realizar dicha desagregación y complementar los APU con los respectivos soportes de proveedores, con el fin de brindar mayor claridad y respaldo técnico a los valores presentados.

Se realiza la revisión de la totalidad de los ítems contractuales y no previstos del balance y se define lo siguiente:

1. NP57. Desmonte de redes, aparatos y equipos para instalación de enchape. Se solicita especificar las cantidades y evitar los globales.

2. Incluir media caña en mortero en los cuartos de observación de bovinos y porcinos.

3. Retirar el ítem " Jornales " del balance y ajustar las cantidades en los ítems que correspondan.

4. Compartir un informe técnico del estado de los cuartos fríos para soportar el ítem propuesto en el balance.

Se indica por parte de la Alcaldía y Gobernación que el trámite de gestión y socialización en las Entidades se realizará el lunes y basados en ello se remitirá una respuesta.

Se dela claridad frente a los gastos adicionales que debe realizar el Municipio en el momento de solicitar la visita de apertura de la planta frente al INVIMA : Dotación, personal capacitado, veterinario, elementos de aseo, contratación de empresas para control de plagas y gestión documental.

Se define continuar con las siguientes actividades: Cerramiento Perimetral, cuartos de observación, adecuación de ingreso vehicular, enchape en las zonas de proceso.

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)
NINGUNA

Powered by CamScanner

	CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA	MUNICIPIO DE PALESTINA- CALDAS ACTA DE COMITÉ N° 3	PÁGINA	3	DE	4

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Gestión de adición al proyecto. 23 de febrero de 2026.	Supervisión Alcaldía y Gobernación.

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Posible fecha:

FECHA 27 (DIA) 2 (MES) 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en PALESTINA - CALDAS a los:

Veinte (Día en letras) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Powered by CamScanner

	CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA	MUNICIPIO DE PALESTINA- CALDAS ACTA DE COMITÉ N° 4	PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	Municipio de Palestina - Caldas	FECHA	27	02	2026
Departamento	Caldas	CONTRATO No.	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

OBJETO DE CONTRATO:

"ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

CONTRATISTA OBRA:	FUSIÓN INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA

I. NOMBRE Y CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Nombre: Carlos Julio Ocampo Mejor **Cargo:** Supervisor administrativo	C.O. - Julio Ocampo M
Nombre: **Cargo:** Orlando Giraldo Maestro	
Nombre: Alexandro Uribe López **Cargo:** Aux residente Fusion ingeniería	
Nombre: Jessica Restrepo Ramirez **Cargo:** SST	
Nombre: Gerson Cañas V **Cargo:** Medico Veterinario	Gerson Cañas V
Nombre: Felipe Bucaro Patiño **Cargo:** Residente de interventoria	
Nombre: Diana Carolina López **Cargo:** Ing. Civil. -Fusion Ingeniería SAS	
Nombre: Andrea Lopez Vasquez **Cargo:** Ing civil Fusion Ingeniería SAS. Residente	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	

Powered by CamScanner

	CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA	MUNICIPIO DE PALESTINA- CALDAS ACTA DE COMITÉ N° 4	PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	Municipio de Palestina Caldas	FECHA	27	2	2026
Departamento	Caldas	CONTRATO No.	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

OBJETO DE CONTRATO:

"ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

CONTRATISTA OBRA:	FUSIÓN INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA

I. NOMBRE Y CARGO	**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**
Nombre: Carlos Julián Ocampo. **Cargo:** Supervisor administrativo Gobernación de Caldas.	**Original Firmado**
Nombre: Orlando Giraldo. **Cargo:** Maestro de obra.	**Original Firmado**
Nombre: Alejandro Uribe López. **Cargo:** Auxiliar residente de obra. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Jessica Restrepo Ramírez. **Cargo:** SST. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Gerson Cañas Vargas. **Cargo:** Médico veterinario.	**Original Firmado**
Nombre: Felipe Bucurú Patiño. **Cargo:** Residente interventoría de obra.	**Original Firmado**
Nombre: Diana Carolina López López **Cargo:** Ing civil. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: Andrea López Vásquez **Cargo:** Ing civil. Fusión Ingeniería SAS.	**Original Firmado**
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	
Nombre: **Cargo:**	

Powered by CamScanner

II. OBJETO

Visita en campo de seguimiento a la obra.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay observaciones al acta de comité N°3.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Gestión de adición al proyecto. 23 de febrero de 2026.	Alcaldía y Gobernación	Cumplido

V. TEMAS TRATADOS

Siendo las 9:30 am del día 27 de febrero de 2026 se da inicio al comité de obra en las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal de Palestina, en el cual se pretende realizar la revisión de avance de las actividades del proyecto.

* Se solicita realizar un escalón entre el pasillo de la zona de baños y vestier y el ingreso al filtro sanitario.
* Se solicita incluir una rejilla de 0,20x1m en la zona de box de porcinos.
* Ubicar 2 lámpara en la zona de vísceras blancas. En patas y cabezas dos paralelas con la existente, al igual

*En zona de corral de descanso de bovinos: Ubicar la rejilla en L en la zona de ingreso a la PTAR. Ubicar un bordillo justo debajo de la baranda que divide corrales de la PTAR, demoler el bordillo existente para evitar accidentes de los bovinos, cerrar con mampostería la zona donde se encuentra actualmente ubicada la puerta de salida de corrales al predio contiguo por la zona de la PTAR.

* Se define además de las actividades habladas en el comité N°3, continuar con la fabricación de equipos y recorrido de cubierta

* Se indica que se debe realizar una prórroga tanto al convenio como al contrato. El supervisor Administrativo del convenio recomienda solicitarla por cuatro meses.

* Se solicita al contratista presentar informes de avance semanal ejecutivos.
* Se solicita realizar cambio de teja en la zona de vestier , las cuales se encuentran muy deterioradas.

* Se solicita ampliar el cuarto de observación de bovinos y el cuarto de localización de hidroflow. Se definen medidas en campo y se realiza el ajuste de inmediato, la supervisión aprueba las nuevas dimensiones.

* Se solicita iniciar con las actividades de demolición de la losa en la zona de pasillo de vestier, oficina y cuarto de insumos para nivelar el enchape a lo que actualmente se encuentra en la zona de baños.

La Interventoría, en articulación con la Supervisión designada por la Gobernación de Caldas y la Supervisión ejercida por la Secretaría de Planeación Municipal, se encuentra evaluando la viabilidad de realizar una suspensión temporal del contrato, mientras se adelanta y formaliza el trámite administrativo correspondiente a la adición contractual requerida para la ejecución de actividades no previstas dentro del alcance inicial del proyecto. Lo anterior se plantea considerando que, a la fecha, se registra aproximadamente un mes y medio de ejecución contractual, periodo durante el cual el contratista ha desarrollado de manera significativa las actividades inicialmente contempladas en el contrato, encontrándose próximo a la culminación de las mismas. En este sentido, se evidencia que el contratista estaría en condiciones de iniciar la ejecución de actividades no previstas, las cuales actualmente no cuentan con el respectivo soporte contractual y presupuestal.
En consecuencia, dicha situación limita la continuidad y el desarrollo normal de la obra, razón por la cual se considera pertinente evaluar la suspensión temporal del contrato, mientras se surten los procedimientos administrativos necesarios para la aprobación y formalización de la adición correspondiente, garantizando de esta manera la correcta ejecución del proyecto dentro del marco normativo, técnico y financiero aplicable.

Powered by CamScanner

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Posible fecha:

FECHA 5 (DIA) 3 (MES) 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en PALESTINA - CALDAS a los:

Veintisiete (Día en letras) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Powered by CamScanner

OFICIO 022- 205 -2025

Manizales-Caldas, 14 de Mayo de 2026.

Señores
Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Ing. Alexander Patiño Torres
Representante Legal
Interventoría

Referencia: Contrato de Obra 205 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

Asunto: Remisión Acta de cobro N°1 corregida.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en calidad de representante legal de la empresa Fusión Ingeniería SAS, me permito dirigirme a ustedes como interventoría del contrato de obra 205 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA"., me permito remitir el acta de cobro N°1 del contrato de la referencia, para su revisión y respectivo trámite, con los siguientes anexos:

- Factura de obra civil y equipos.
- Cesión de derechos autenticado.
- Aceptación cesión de derechos.
- Certificado de existencia y representación legal Prospera.
- RUT Prospera.
- Cédula representante legal Prospera.
- Certificado bancario Prospera.
- RUT Fusión Ingeniería SAS.
- Cámara de comercio Fusión Ingeniería SAS.
- Cédula representante legal Fusión Ingeniería SAS.
- Planillas de seguridad social.
- Paz y salvo de parafiscales.
- Documentos revisora fiscal.
- Acta de cobro parcial N°1.

FUSION INGENIERIA S.A.S

Ingeniería integrada su servicio.

Km 1 Carretera Panamericana Nº 71 - 240 Bodega B Aranjuez
Tels. (6) 8887089 - 3206992614
E-mail: contabilidad@fusioningenieria.com.co
Manizales (Caldas)

NIT 900510128-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764102204137
Fecha 27/11/2025 - 27/11/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE401 al FELE600 Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en Manizales, a partir del 1 de noviembre de 2024, conforme a la Resolución 044 del 11 de septiembre de 2024.
Email: lorenagc021@gmail.com
Teléfono: 3153027768

Departamento	Fecha		
Caldas	14	05	2026

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° FELE434

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE PALESTINA	**NIT:**	890801141-7	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	CR 10 8 25	**Departamento:**	Caldas	**Teléfono:**	
Email:	alcaldia@palestina-caldas.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	16:06:53	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	2				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	FI002	1,00	COSTO DIRECTO Acta N. 1 del Contrato N°205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es: ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	EA				$138.121.261,00	$138.121.261,00
2	AIU 1	1,00	ADMINISTRACIÓN 25%	EA				$34.530.315,00	$34.530.315,00

Notas:

SON: (ciento setenta y dos millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos setenta y seis pesos)
CUFE:

Subtotal:	$172.651.576,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$172.651.576,00

Para pagos: Bancolombia Cuenta Corriente Nº 37395437929 / Davivienda Cuenta de Ahorros Nº 086100181626 / Banco de Bogotá Cuenta Corriente Nº 589048727

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

MANIZALES CALDAS
JAIRO VILLEGAS ARANGO
Notario

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 002 de 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S

Entre los suscritos, JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ CASTAÑO, persona mayor de edad y vecino de Manizales -Caldas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.076.312 quien actúa en calidad de representante legal de **FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S** identificada con Nit: 900.510.128-7, quien actúa en calidad de CONTRATISTA y quien en adelante se denominará EL CEDENTE y por la otra parte **JULIÁN DAVID PAZ ABDALA**, persona mayor de edad y vecino de Manizales - Caldas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.098.379, quien actúa en calidad de representante legal de **PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S** identificada con Nit: 901.653.080-1, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales, quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominará **EL CESIONARIO,** hemos convenido celebrar el presente contrato de **CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS,** previas las siguientes consideraciones: 1. Que entre **EL MUNICIPIO DE PALESTINA** con Nit. 890.801.141-7 y **FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S** se celebró el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **N° 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025** y cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA." 2. Que mediante el presente instrumento jurídico **FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S** expresa su deseo y con el fin de garantizar la ejecución idónea del contrato de obra celebrado con EL MUNICIPIO DE PALESTINA de CEDER los derechos económicos que emergen del citado contrato de obra en favor de **PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S** 3. Que la CESIÓN DE DERECHOS derivados de un contrato tiene su fuente en el artículo 887 y siguientes del Código de Comercio y en los artículos 1960 y siguientes del Código Civil, en virtud de las cuales una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en todo o en parte de las relaciones derivadas del contrato. 4. Que es interés de las partes suscribir el presente contrato de CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS derivados del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 y cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA" citado y la CEDENTE se

compromete a notificar esta cesión de derechos al MUNICIPIO DE PALESTINA en los términos del artículo 894 del Código de Comercio y 1961 y siguientes del Código Civil. El presente contrato que se regirá por las cláusulas que a continuación se relacionan: **PRIMERA: OBJETO:** Por medio del presente contrato de CESIÓN, FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S, en su carácter de CEDENTE cede irrevocablemente a **PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S**, el 100% de los derechos económicos que emergen del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 celebrado entre EL MUNICIPIO DE PALESTINA y FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S, cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA." **SEGUNDA: ACEPTACIÓN: JULIAN DAVID PAZ ABDALA**, actuando en calidad de representante legal de **PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S** identificada con Nit: 901.653.080-1 acepta la CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS que mediante este instrumento se le efectúa. **TERCERA: ADJUDICACIÓN DE DERECHOS.** los derechos económicos que el CEDENTE **FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S** cede en favor de **PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S** tienen su origen en la suscripción del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, con EL MUNICIPIO DE PALESTINA. CESIÓN que se hace a título oneroso. **CUARTA: PRECIO. FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S** en su calidad de CEDENTE, reconoce a LA CESIONARIA **PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S** por la CESIÓN DE LOS DERECHOS que emana de este contrato, la suma de ochocientos cuarenta y siete millones trescientos cuarenta mil seiscientos noventa y dos pesos m/cte. ($847.240.692) y, por lo tanto, el pago deberá realizarse mediante abono en cuenta. **QUINTA - ACCIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO** El incumplimiento de las partes a cualquiera de las obligaciones establecidas en el clausulado del presente contrato de CESIÓN dará lugar a las acciones jurisdiccionales por incumplimiento del contrato de cesión de derechos económicos. **SEXTA CONDICIONES Y LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS CEDIDOS:** El CEDENTE declara que es el único titular de los derechos patrimoniales que por este acto son cedidos y, en consecuencia, puede disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. En todo caso, el CEDENTE acepta que responderá por cualquier reclamo que se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al CESIONARIO. **SEPTIMA NOTIFICACIÓN.** Para dar cumplimiento a los artículos 894 del Código de Comercio y 1960 del Código Civil Colombiano esta CESIÓN se notificará expresamente al MUNICIPIO PALESTINA a efectos de que las sumas de

dinero que sea necesario desembolsar en relación con las obras ejecutadas en virtud del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, sean efectuadas al CESIONARIO **PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S** de conformidad con lo prescrito en el presente contrato de CESIÓN. **OCTAVA.** Cualquier modificación o adición que las partes hicieren al presente contrato, deberá constar por escrito, suscribirse por las partes intervinientes y notificar la misma al MUNICIPIO DE PALESTINA. **NOVENA-. PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma el presente documento en Manizales, el cinco (5) días del mes de enero de 2026.

EL CEDENTE

FUSION INGENIERIA S.A.S
Nit: 900.510.128-7
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ CASTAÑO
C.C. 16.076.312
Representante legal

EL CESIONARIO

PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S
Nit: 901.653.080-1
JULIAN DAVID PAZ ABDALA
75.098.379
Representante legal

22266

NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE MANIZALES

NOTARIA QUINTA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

zwar4



Manizales, 2026-01-13 09:21:45

Ante la Notaria Quinta del Círculo de Manizales (Caldas), compareció:

GOMEZ CASTAÑO JUAN SEBASTIAN

quien se identificó con C.C. 16076312

y manifestó que es cierto el contenido de este documento y que la firma es suya. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. CONTRATO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS

X

FIRMA

JAIRO VILLEGAS ARANGO

NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE MANIZALES

QUINTA MANIZALES - CALDAS JAIRO VILLEGAS ARANGO Notario

22266

NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE MANIZALES

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Manizales, 2026-01-16 11:14:25

Ante la Notaría Quinta del Círculo de Manizales (Caldas), compareció:

PAZ ABDALA JULIAN DAVID

quien se identificó con C.C. 75098379

zzjn5



y manifestó que es cierto el contenido de este documento y que la firma es suya. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. CONTRATO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS

X

FIRMA

ESTEFANIA HOYOS DIAZ

NOTARIA QUINTA (E) DEL CÍRCULO DE MANIZALES

Palestina Caldas, 10 de marzo de 2026

SP-104-2026

Señor:
JUAN SEBASTIAN GOMEZ CASTAÑO
FUSION INGENIERIA S.A.S
Palestina, Caldas

ASUNTO: Respuesta a solicitud de cesión de derechos económicos – Contrato 205 de 2025.

Cordial saludo

En atención a su solicitud radicada ante esta oficina, referente a la cesión de derechos económicos derivados de la ejecución contractual (205-2025), me permito informarles que, tras el análisis jurídico correspondiente, dicha petición ha sido autorizada.

No obstante, es imperativo dejar constancia de que la empresa Fusión Ingeniería S.A.S. conservará en todo momento la responsabilidad técnica, administrativa y legal sobre la ejecución íntegra del Contrato 205 de 2025, limitándose la presente autorización exclusivamente al recaudo de los pagos en favor de la empresa Prospera Finanzas e Inversiones S.A.S.

Asimismo, tras la revisión de la documentación técnica y legal anexada a su solicitud, se evidenció la ausencia del certificado bancario actualizado de la empresa cesionaria (Prospera Finanzas e Inversiones S.A.S.). Este documento es un requisito indispensable para que la Secretaría de Hacienda proceda con el registro del pago y el trámite de la cuenta de cobro correspondiente.

Por lo anterior, se les requiere allegar dicho certificado a la mayor brevedad posible para dar continuidad al proceso administrativo.

Atentamente,

JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA
Secretario de Planeación y Desarrollo Integral

Proyecto: Paulina Carmona Piedrahita- ingeniera civil contratista

OFICIO 023- 205 -2025

Manizales-Caldas, 15 de Mayo de 2026.

ALCALDIA MUNICIPAL
Palestina - Caldas
Recibido hoy 15-05-2026
Radicado Folio 60-61
Orden No. 1077
VENTANILLA UNICA

Señores
Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Ing. Alexander Patiño Torres
Representante Legal
Interventoría

Referencia: Contrato de Obra 205 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

Asunto: Remisión Factura Acta de cobro N°1.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en calidad de representante legal de la empresa Fusión Ingeniería SAS, me permito dirigirme a ustedes como interventoría del contrato de obra 205 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA"., me permito remitir la factura del acta de cobro N°1 del contrato de la referencia, para su revisión y respectivo trámite.

- Factura de obra civil y equipos.

Cordialmente,

Juan Sebastián Gómez Castaño
Representante Legal
Fusión Ingeniería S.A.S

Proyectó:
Ing. Laura Alegría Zapata V.

Rbo 15-May-26

(+57) 320 699 2614
(+57) 305 444 4130
(606) 888 7080
gerencia@fusioningenieria.com.co
Km. 1 Vía Panamericana No. 71-240
Bodega B.
Manizales - Colombia
www.fusioningenieria.com.co

FUSION INGENIERIA S.A.S
Ingeniería integrada su servicio.

Km 1 Carretera Panamericana N° 71 - 240
Bodega B Aranjuez
Tels. (6) 8887089 - 3206992614
E-mail: contabilidad@fusioningenieria.com.co
Manizales (Caldas)

NIT: 900510128 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ▯ IVA
Resolución DIAN N° 18764102204137
Fecha 27/11/2025 - 27/11/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE401 al FELE600 Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en Manizales, a partir del 1 de noviembre de 2024, con
Email: lorenagc021@gmail.com
Teléfono: 3153027768

Departamento	Fecha		
Caldas	15	05	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FELE434

Nombre/Razón Social:	MUNICIPIO DE PALESTINA	NIT:	890801141 - 7	Fecha de firmado:	15/05/2026 08:00:16
Dirección:	CR 10 8 25	Departamento:	Caldas	Medio de pago:	Transferencia Débito Interbancario
Email:	alcaldia@palestina-caldas.gov.co	Forma de Pago:	Contado		
		Hora emisión:	08:00:13	Moneda:	COP, Peso colombiano
		Total de Lineas:	2		

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	FI002	1,00	COSTO DIRECTO Acta N. 1 del Contrato N°205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es: ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	EA				$138.121.261,00	$138.121.261,00
2	AIU 1	1,00	ADMINISTRACIÓN 25%	EA				$34.530.315,00	$34.530.315,00

Notas:

SON: (ciento setenta y dos millones seiscientos cincuenta y uno mil quinientos setenta y seis pesos cero centavos)

CUFE: 050ce623ed5e274215cf2c87227989a20ee35fb84d3853d4560eb84dcb6563296e453051877fa508abf17baece751c24

Subtotal:	$172.651.576,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$172.651.576,00

Para pagos: Bancolombia Cuenta Corriente N° 37395437929 / Davivienda Cuenta de Ahorros N° 086100181626 / Banco de Bogotá Cuenta Corriente N° 589048727

Firma Digital:
GxQ71ONyOQ7KoTDLoiGa9utNnHolPBrVE2+SdVn5S5crE33upCyae8ZJgV95EgLCRA4rAaSG2mWfwjlW8e6X3CynqC
3GEV3Pu0foycYULU0fkHwVKRqaTmwXRbOyZh9WqLhQbpyTcwlztm87g5fpyFR2dnlqT+RFwvV6urZzcCNWHVY2vUF
NehDxSyCpOqr6p1RXGIND17nww0LvpljTRBgJZ+iJMeWWqOyZltFVPyg5wsoG9FcJMYJn9GophqPOOC2CtAbEls06E
LAtD815aC0cpDahwQ6Z+0LU3iCCLIS2zrw3CTY1PH44+TUTNjACNzoYEq5VXBQwbt9X6h9EZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUSION INGENIERIA S.A.S
Ingeniería integrada su servicio.

Km 1 Carretera Panamericana N° 71 - 240
Bodega B Aranjuez
Tels. (6) 8887089 - 3206992614
E-mail: contabilidad@fusioningenieria.com.co
Manizales (Caldas)

NIT: 900510128 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764102204137
Fecha 27/11/2025 - 27/11/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE401 al FELE600 Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en Manizales, a partir del 1 de noviembre de 2024, con
Email: lorenagc021@gmail.com
Teléfono: 3153027768

Departamento	Fecha		
Caldas	15	05	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FELE433

Nombre/Razón Social:	MUNICIPIO DE PALESTINA	NIT:	890801141 - 7	Fecha de firmado:	15/05/2026 08:00:03
Dirección:	CR 10 8 25	Departamento:	Caldas	Medio de pago:	Transferencia Débito Interbancario
Email:	alcaldia@palestina-caldas.gov.co	Forma de Pago:	Contado		
		Hora emisión:	08:00:01	Moneda:	COP, Peso colombiano
		Total de Lineas:	3		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	FI002	1,00	COSTO DIRECTO Acta N. 1 del Contrato N°205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es: ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA	EA				$50.196.917,00	$50.196.917,00
2	AIU 1	1,00	ADMINISTRACIÓN 30%	EA				$15.059.075,00	$15.059.075,00
3	80141607	1,00	Gestión de eventos	94				$1.997.564,00	$1.997.564,00

Notas:

SON: (sesenta y siete millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos cero centavos)

CUFE: 23e7b93982f28ec87b76bf55dcb471d74272be625555971a101462d7874ba50c5c2159515dbf0ed26a1fd0a968ab4e30

Subtotal:	$67.253.556,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$67.253.556,00

Para pagos: Bancolombia Cuenta Corriente N° 37395437929 / Davivienda Cuenta de Ahorros N° 086100181626 / Banco de Bogotá Cuenta Corriente N° 589048727

Firma Digital:
a+3ADHUD2eRJK8ejRQIQZCw22szuHz1dCBH6ONMHZdIzq9VbLQOpGc0MNDrQvZXP5Y9ie4O+Bwj/59OMFJN9J/
l0e5nEkj9yPLTeQMQCZpzKfpXvN6Jn70Ly77oXwDkATgBzQfgiBK2K8A2pyzFhGamFJbSscE7tTOjWbCnkGjvVJJ5HGp
UEdsL8Y6SSx02nxbFn8Rdw2sTB82xK+n41aLEtJvDDxDmAya4GUu6UlS443OD4EqNEjzHhd4XpTWA1bG/
ne76sSxXm2VL4lvWzFq6I2qXvSQGb2I3ZI6FIKFSBA2yWudXMjE16UjtkLe7Ar1xTDIAnsfGfWpyNrT+kFQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/06/2025 - 09:20:55
Recibo No. S001102092, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN VHmM6tF9PP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S.
Nit : 901653080-1
Domicilio: Manizales, Caldas

MATRÍCULA

Matrícula No: 226329
Fecha de matrícula: 10 de noviembre de 2022
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 22 21 40 OF 213 - Centro
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico : julian.paz@prospera.com.co
Teléfono comercial 1 : 3143594236
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 22 21 40 OF 213 - Centro
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico de notificación : julian.paz@prospera.com.co

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 10 de noviembre de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Manizales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2022, con el No. 94635 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social. - La Sociedad tendrá como objeto social principal (i) el otorgamiento de créditos, préstamos de dinero o mutuo con recursos propios a personas naturales y jurídicas,

amparados o no con garantías reales o personales; (ii) Compraventa de títulos valores; (iii) Invertir en sociedades o empresas de cualquier sector económico, y en general, realizar todo tipo de inversiones en Colombia; iv) Celebrar contratos de arrendamiento sobre inmuebles propios; v) Financiación de proyectos de cualquier actividad empresarial con recursos propios; vi) La realización de inversiones en depósitos, servicios, fondos y productos de entidades bancarias, sociedades comisionistas de bolsa, fiduciarias y de otras entidades autorizadas para hacer transacciones financieras. Adicionalmente la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita como parte de su objeto principal de acuerdo con el artículo 5 de la ley 1258 de 2008.

Para el cumplimiento del objeto la sociedad podrá, especialmente, celebrar toda clase de actos y contratos en su propio nombre, o por cuenta de terceros que resulte necesario o conveniente para ejecutar o facilitar el desarrollo del objeto social en Colombia y/o en el exterior; adquirir bienes muebles e inmuebles a cualquier título, enajenarlos o de cualquier otra forma disponer de ellos, gravarlos con prenda o hipoteca, limitar su dominio, darlos en garantía a terceros por obligaciones propias; dar o tomar en arrendamiento o comodato bienes muebles o inmuebles; celebrar operaciones sobre establecimientos de comercio, participar como socio o accionista en la constitución de toda clase de sociedades comerciales o civiles y adquirir a cualquier título cuotas, partes o acciones en esta misma clase de sociedades; celebrar contratos de asociación, agrupación, cuentas en participación o colaboración empresarial así como cualquier acuerdo de intermediación comercial; invertir sus fondos en toda clase de bienes que produzcan rendimientos periódicos o renta fija; dar, aceptar, negociar, pagar, endosar, cancelar, vender, títulos valores de toda clase, invertir en bonos, cédulas y títulos de ahorro; compra y venta de acciones, títulos valores y de inversión y la participación como socio o accionista en toda clase de sociedades civiles o comerciales, la inversión en patrimonios autónomos, negocios, portafolios de inversión y actividades mercantiles, industriales y agroindustriales en el territorio nacional y en el exterior; celebrar contratos de mutuo como deudor o acreedor, con garantía o sin ella, celebrar contratos bancarios, en general realizar toda clase de actos y operaciones civiles y mercantiles y explotar actividades empresariales sin que pueda decirse que la sociedad carece de capacidad para desarrollar cualquier acto de tal naturaleza.

Parágrafo Primero: De acuerdo con la ley, se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia de la sociedad.

Parágrafo Segundo: La sociedad podrá participar en todo género de licitaciones públicas o privadas para el suministro de bienes o la prestación de servicios producidos, suministrados, distribuidos o comercializados por ella.

Parágrafo Tercero: La sociedad no podrá garantizar obligaciones de terceros ni de sus accionistas, salvo decisión unánime de todos los accionistas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 1.500.000.000,00
No. Acciones	1.500.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 1.200.000.000,00
No. Acciones	1.200.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 1.200.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Gerente: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado para periodos de un (1) año prorrogable automáticamente en caso de no ser revocado el nombramiento por la Asamblea General de Accionistas. El Gerente tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

Las funciones del Gerente o de sus suplentes terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas. También terminarán sus funciones por razón de su deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el Gerente o de sus suplentes sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el Gerente sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del Gerente o de sus suplentes, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

En aquellos casos en que el Gerente sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del Gerente de ésta.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Gerente: La sociedad será administrada y representada legalmente ante terceros por el Gerente, quien tendrá un suplente. Los representantes legales están autorizados para celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad.

Parágrafo Primero: Los administradores de la Sociedad podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, así como podrán votar los estados financieros y cuentas de fin de ejercicio.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 10 de noviembre de 2022 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2022 con el No. 94635 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

GERENTE	JULIAN DAVID PAZ ABDALA	C.C. No. 75.098.379
SUPLENTE DEL GERENTE	JAIRO PAZ QUINTERO	C.C. No. 6.454.599

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 003 del 26 de marzo de 2025 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 14 de abril de 2025 con el No. 104449 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JACKELINE BUSTOS GRISALES	C.C. No. 1.061.625.978	308233-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 001 del 31 de agosto de 2023 de la Asamblea General De Accionistas	98022 del 14 de septiembre de 2023 del libro IX
*) Acta No. 002 del 27 de octubre de 2023 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas	98648 del 23 de noviembre de 2023 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: K6499
Actividad secundaria Código CIIU: K6613
Otras actividades Código CIIU: L6810

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $72.185.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : K6499.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Sandra Salazar

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14896446220

(415)7707212489984(8020) 000001489644622 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 5 3 0 8 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 21 40 OF 213

42. Correo electrónico julian.paz@prospera.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 5 9 4 2 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 4 9 9	2 0 2 2 1 1 1 0	6 6 1 3	2 0 2 2 1 1 1 0	6 8 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN


59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 15 / 14 : 14: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAZ ABDALA JULIAN DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

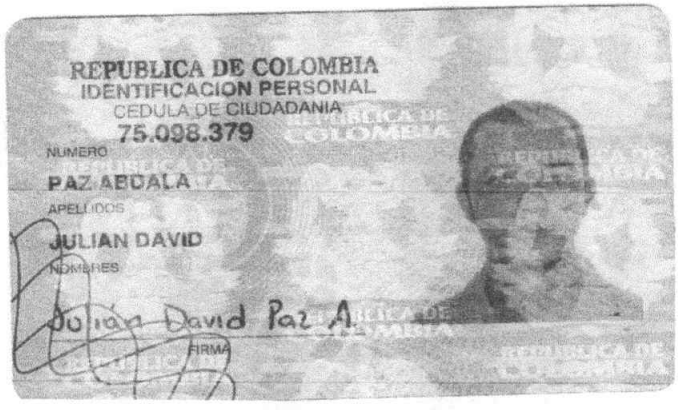
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
75.098.379
NUMERO
PAZ ABUALA
APELLIDOS
JULIAN DAVID
NOMBRES
Julian David Paz A.
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1981
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
21-JUL-1999 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0900100-35130592-M-0075098379-20050511
0043605130I 02 172501232

Certificado
Bancario

Miércoles, 11 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROSPERA FINANZAS E INVERSIONES SAS identificado(a) con NIT 901653080, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85900002695	2023/02/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141191143767

(415)7707212489984(8020) 000014119114376 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 0 1 2 8	7	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUSION INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
KM 1 CARR PANAMERICANA 71 240

42. Correo electrónico facturacion.fusioning@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 9 9 2 6 1 4	6 0 6 8 8 9 7 0 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	3 6 0 0	2 0 1 4 0 3 2 8	4 6 5 9	3 7 0 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ CASTAÑO JUAN SEBASTIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141191143767

(415)7707212489984(8020) **000014119114376 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 0 1 2 8	7	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	1	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 3 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 3 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 0 5 9 8	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 3 1 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 3 2 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141191143767

(415)7707212489984(8020) 000014119114376 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 0 1 2 8	7	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 3 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 6 0 7 6 3 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	CASTAÑO	JUAN	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141191143767

(415)7707212489984(8020) 000014119114376 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 0 1 2 8	7	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 0 6 4 9 6 0 4	4	2 1 4 1 0 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FORTICH	BETANCOURT	KATHERINE	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 6 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 3 3 3 5 4 4		1 0 7 8 1 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
YEPES	CASTAÑEDA	PAULA	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 6 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141191143767

(415)7707212489984(8020) 000014119114376 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 0 1 2 8	7	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Taller 1 9	Fabricación de productos metálicos para uso estructural 2 5 1 1	

162. Nombre del establecimiento
FUSION INGENIERIA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Caldas 1 7	Manizales 0 0 1	

165. Dirección
KM 1 CARR PANAMERICANA 71 240 BG

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 5 0 5 9 8	2 0 1 2 0 3 2 1	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
6 0 6 8 8 8 7 0 8 9		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 28/07/2025 - 14:33:18
Recibo No. S001111014, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN uTUxMefZBh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : FUSION INGENIERIA S.A.S
Nit : 900510128-7
Domicilio: Manizales, Caldas

MATRÍCULA

Matrícula No: 150598
Fecha de matrícula: 21 de marzo de 2012
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 18 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : KM 1 CARRETERA PANAMERICANA 71 240 BODEGA B - Aranjuez
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico : contabilidad@fusioningenieria.com.co
Teléfono comercial 1 : 8887089
Teléfono comercial 2 : 3206992614
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : KM 1 CARRETERA PANAMERICANA 71 240 BODEGA B - Aranjuez
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico de notificación : admon.fusion2019@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 8887089
Teléfono para notificación 2 : 3206992614

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 13 de marzo de 2012 de la El Accionista de Manizales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2012, con el No. 62290 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada FUSION INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social. La sociedad tendra por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A.

Diseño, construccion y suministro de soluciones de ingenieria mecanica. B. Diseño, construccion y suministro de soluciones de ingenieria civil. C. Diseño, construccion y suministro de soluciones de ingenieria electronica. D. Diseño, construccion y suministro de soluciones de ingenieria ambiental. E. Diseño, construccion y suministro de soluciones en procesos industriales. F. Contratacion pública. G. Suministro e instalacion de equipos electronicos. H. Asesorías en ingeniería ambiental. I. Asesorías en ingeniería civil. J. Asesorías en ingeniería de sistemas. K. Soluciones para industrias de alimentos. L. Suministro de equipos medicos. M. Importación y comercialización de mercancías. N. Formulación de proyectos. O. Cualquier actividad lícita a desarrollarse en el territorio colombiano. Todas las demas inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Gerencia. La representación legal de la sociedad y la gestion de los negocios sociales estaran a cargo del gerente. El suplente del gerente lo reemplazara en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendra las mismas atribuciones que la gerente cuando entre a reemplazarla.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Gerente. El gerente esta facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin limite de cuantia. Seran funciones especificas del cargo, entre otras, las siguientes: - Constituir, para propositos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. - Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. - Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; ademas, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los limites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. - Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañia y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. - Cumplir las demas funciones que le correspondan segun lo previsto en las normas legales y en los estatutos.

Parágrafo. - El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades publicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 13 de marzo de 2012 de la El Accionista, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2012 con el No. 62290 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JUAN SEBASTIAN GOMEZ CASTAÑO	C.C. No. 16.076.312

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 8 del 09 de junio de 2025 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 23 de julio de 2025 con el No. 105783 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISORA FISCAL	KATHERINE FORTICH BETANCOURT	C.C. No. 1.060.649.604	214103

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112
Actividad secundaria Código CIIU: E3600
Otras actividades Código CIIU: C2511 E3700

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA

Fecha expedición: 28/07/2025 - 14:33:18
Recibo No. S001111014, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN uTUxMefZBh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.611.606.628,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Sandra Salazar

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.076.312**

GOMEZ CASTAÑO

APELLIDOS

JUAN SEBASTIAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1983**

MANZANARES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.91	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-AGO-2001 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0900100-00586552-M-0016076312-20140609 **0038**976155A 1 41564174

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900510126	7	FUSION INGENIERIA SAS	S	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	K 1 VIA PANAMERICANA NRO 71 270		8867089		CONTABILIDAD@FUSIONINGENIERIA.COM.CO			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	86345622	E	2026-02-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	34.054.800	406.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF.DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
48 de 48	86345622	2026-02-06	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900510128	7	FUSION INGENIERIA SAS	R	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	K 1 VIA PANAMERICANA NRO 71 370		5027069		CONTABILIDAD@FUSIONINGENIERIA.COM.CO			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	363456622	E	2026-02-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	34.054.800	406.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF.DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
49 de 49	363456622		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
112.198.985	112.782.620	112.782.620	115.104.242	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras:4)				48	18.054.100	0	218.100	0	18.272.200
PROTECCION	230201	800229739	0	11	3.462.300	0	41.800	0	3.504.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	14	5.698.300	0	68.800	0	5.767.100
PORVENIR	230301	800224808	8	22	8.476.100	0	102.400	0	8.578.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	417.400	0	5.100	0	422.500
EPS(Administradoras:5)				49	4.508.500	0	54.600	0	4.563.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	933.200	0	11.300	0	944.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	9	1.478.900	0	17.900	0	1.496.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	386.500	0	4.700	0	390.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	19	1.339.800	0	16.200	0	1.356.000
NUEVA E.P.S. S.A. MIV	EPS041	900156264	2	6	371.200	0	4.500	0	375.700
ARP(Administradoras:1)				49	6.484.300	0	78.200	0	6.562.500
ARL SURA	14-11	860903790	5	49	6.484.300	0	78.200	0	6.562.500
CCF(Administradoras:2)				49	4.601.300	0	55.600	0	4.656.900
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	48	4.426.100	0	53.400	0	4.479.500
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	1	175.200	0	2.200	0	177.400
Gran Total					33.648.300	0	406.500	0	34.054.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900810128	7	FUSION INGENIERIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Juridica
MUNDEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
171	K 1 VIA PANAMERICANA NRO 71 270		8887089			CONTABILIDAD@FUSIONINGENIERIA.COM.CO		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36728778	E	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	36.822.000	723.100	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
55	36728779	2026-03-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 4415833	ATEHORTUA LOAIZA CESAR AUGUSTO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.750.905	121.900	1.750.905	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5711001
2	CC 4479733	VALENCIA RESTREPO ALVARO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5711001
3	CC 9846956	GARCIA VALDES ALEXANDER	1.750.905	F																0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.459.088	233.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	1.459.088	58.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.459.088	58.400	1.459.088	101.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	451.900	S	5711001
4	CC 9846956	GARCIA VALDES ALEXANDER	1.750.905	F													X			0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	291.818	11.700	CCF DE CALDAS-CCF11	291.818	11.700	291.818	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	70.100	S	5711001
5	CC 9847815	OSPINA MUÑOZ HUBER JAMI	2.446.636	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.467.982	234.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.467.982	58.800	CCF DE CALDAS-CCF11	1.467.982	58.800	1.467.982	102.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	454.700	S	5711001
6	CC 10266664	OSPINA ROJAS JORGE IVAN	2.550.959	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.550.959	408.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.550.959	102.100	CCF DE CALDAS-CCF11	2.550.959	102.100	2.550.959	177.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	790.000	S	5711001
7	CC 10275219	MORALES GONZALEZ JHON JAIRO	2.254.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.254.000	360.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.254.000	90.200	CCF DE CALDAS-CCF11	2.254.000	90.200	2.254.000	156.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	698.000	S	5711001
8	CC 10284136	AVENDAÑO CARMONA EUGENIO	1.750.905	F	X	X														0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	1.283.997	205.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.283.997	51.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.337.497	53.500	1.283.997	89.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	399.800	S	5711001
9	CC 15906363	BUITRAGO ALZATE JOSE ELMER	1.750.905	F		X														0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.459.088	233.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.459.088	58.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.692.542	67.800	1.459.088	101.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	461.300	S	5711001
10	CC 16076312	GOMEZ CASTAÑO JUAN SEBASTIAN	10.510.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	10.510.000	1.681.600	52.600	52.600	EPS SURA-EPS010	10.510.000	420.400	CCF DE CALDAS-CCF11	10.510.000	420.400	10.510.000	751.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	3.359.100	S	5711001
11	CC 24335544	RAMIREZ GOMEZ ISABEL CRISTINA	5.435.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.435.000	869.600	0	0	EPS SURA-EPS010	5.435.000	217.400	CCF DE CALDAS-CCF11	5.435.000	217.400	5.435.000	28.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.332.800	S	5711001
12	CC 24730366	GOMEZ CASTAÑO FRANCY LORENA	2.627.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.627.500	420.400	0	0	EPS SURA-EPS010	2.627.500	105.100	CCF DE CALDAS-CCF11	2.627.500	105.100	2.627.500	13.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	6	644.400	S	1841501
13	CC 36238563	CUERVO RENDON JULIMEY	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	5711001
14	CC 34000084	LOPEZ RAMIREZ LINA PILAR	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1841501
15	CC 75001739	CASTRILLON AGUIRRE ADALBERTO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1711001
16	CC 75030551	GIRALDO GARCIA ORLANDO	3.696.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.696.000	591.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.696.000	147.900	CCF DE CALDAS-CCF11	3.696.000	147.900	3.696.000	257.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.144.500	S	5711001
17	CC 75070666	JARAMILLO GOMEZ JOSE ALBEIRO	2.446.636	F		X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	733.991	117.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	733.991	29.400	CCF DE CALDAS-CCF11	805.351	32.300	733.991	51.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	230.300	S	5711001
18	CC 75073874	JIMENEZ BLANDON JOSE MANUEL	1.750.905	F	X	X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	875.453	140.100	0	0	SANITAS-EPS005	875.453	35.100	CCF DE CALDAS-CCF11	911.936	36.500	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	272.700	S	5711001
19	CC 75074265	LONDOÑO PEREZ WILMAR	2.300.000	F																0			21	21	21	21	COLPENSION ES-25-14	1.610.000	257.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.610.000	64.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.610.000	64.400	1.610.000	112.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	498.500	S	5711001
20	CC 75074265	LONDOÑO PEREZ WILMAR	2.300.000	F	X										X					0			3	3	3	3	COLPENSION ES-25-14	230.000	27.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	230.000	0	CCF DE CALDAS-CCF11	230.000	0	230.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	27.600	S	5711001
21	CC 75097129	RAMIREZ GOMEZ JUAN DAVID	5.465.200	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	5.465.200	874.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	5.465.200	218.700	CCF DE CALDAS-CCF11	5.465.200	218.700	5.465.200	380.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.692.300	S	5711001
22	CC 75107345	TORO JIMENEZ YONATHAN ANDRES	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.500.000	100.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
23	CC 75144859	URREA URREA JOHN JAIRO	1.750.905	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	875.453	140.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	875.453	35.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.146.521	45.700	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	281.900	S	5711001
24	CC 75146307	GIRALDO GARCIA JUAN CARLOS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5711001
25	CC 79492147	NEIRA BENAVIDES RICARDO	1.750.905	F		X														0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.575.815	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.575.815	63.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.670.656	66.900	1.575.815	109.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	491.900	S	5711001

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900810128	7	FUSION INGENIERIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUNDEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
171	K 1 VIA PANAMERICANA NRO 71 270		8887089		CONTABILIDAD@FUSIONINGENIERIA.COM.CO			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36728778	E	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	36.622.000	723.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
55	36728778	2026-03-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
120.221.394	120.221.394	120.221.394	121.167.981	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				55	19.327.600	0	389.200	0	19.716.800
PROTECCIÓN	230201	800229739	0	8	3.177.100	0	64.000	0	3.241.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	361.800	0	7.300	0	369.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	18	6.744.600	0	135.800	0	6.880.400
PORVENIR	230301	800224808	8	28	9.044.100	0	182.100	0	9.226.200
EPS(Administradoras: 5)				55	4.795.800	0	96.800	0	4.892.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	21	1.409.700	0	28.400	0	1.438.100
NUEVA E.PS. S.A.	EPS037	900156264	2	12	1.069.300	0	21.600	0	1.090.900
NUEVA E.PS. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	8	466.100	0	9.400	0	475.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	285.200	0	5.800	0	291.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	10	1.565.500	0	31.600	0	1.597.100
ARP(Administradoras: 1)				55	6.941.900	0	139.800	0	7.081.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	55	6.941.900	0	139.800	0	7.081.700
CCF(Administradoras: 1)				55	4.833.600	0	97.300	0	4.930.900
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	55	4.833.600	0	97.300	0	4.930.900
Gran Total					35.898.900	0	723.100	0	36.622.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900510128	7	FUSION INGENIERIA SAS	S	9	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	K 1 VIA PANAMERICANA NRO 71 270		8867089		CONTABILIDAD@FUSIONINGENIERIA.COM.CO			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37033875	E	2026-04-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	37.040.580	274.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
64 de 64	37033875	2026-04-60	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900510128	7	FUSION INGENIERIA SAS	S	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	K 1 VIA PANAMERICANA NRO 71 270		8827069		CONTABILIDAD@FUSIONINGENIERIA.COM.CO			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37833875	E	2026-04-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	37.040.500	274.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF.DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
64 de 64	37833875		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
122.499.304	125.601.466	125.601.466	128.106.265	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras:4)				62	19.634.500	0	146.300	0	19.780.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	6.221.000	0	46.300	0	6.267.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	301.300	0	2.300	0	303.600
PROTECCION	230201	800229739	0	11	3.484.500	0	26.000	0	3.510.500
PORVENIR	230301	800224808	8	34	9.627.700	0	71.700	0	9.698.400
EPS(Administradoras:5)				64	4.942.100	0	37.000	0	4.979.100
SANITAS	EPS005	830251440	6	5	350.500	0	2.700	0	353.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	12	832.200	0	6.200	0	838.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	29	1.558.500	0	11.600	0	1.570.100
NUEVA E.P.S. S.A. MDV	EPS041	900156264	2	10	532.500	0	4.000	0	536.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	14	1.668.400	0	12.500	0	1.680.900
ARP(Administradoras:1)				64	7.175.700	0	53.400	0	7.229.100
ARL SURA	14-11	860903790	5	64	7.175.700	0	53.400	0	7.229.100
CCF(Administradoras:1)				64	5.014.100	0	37.400	0	5.051.500
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	64	5.014.100	0	37.400	0	5.051.500
Gran Total					36.766.400	0	274.100	0	37.040.500

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8B24B2115F61AAAA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATHERINE FORTICH BETANCOURT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1060649604 de VILLAMARIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 214103-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.060.649.604**

FORTICH BETANCOURT

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

Katherine Fortich

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ABR-1990**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-JUN-2008 VILLAMARIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0913000-00108887-F-1060649604-20081023 0004717867A 2 28138091

216970

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideris.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214103-T



KATHERINE
FORTICH BETANCOURT
C.C. 1060649604
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 19/02/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

222243

CERTIFICACIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACION PERSONA JURÍDICA

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad **FUSIÓN INGENIERÍAS S.A.S.** identificada con NIT. **900.510.128-7**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 05 días del mes de mayo del año 2026, en Manizales.

Katherine Fortich Betancourt

Katherine Fortich Betancourt
Revisor Fiscal
Fusión Ingeniería S.A.S.
C.C. 1.060.649.604
T.P. 214103-T

INFORME DE OBRA - ACTA DE COBRO N°1

30/12/2025 al 17/03/2026

CONTRATO No. 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA:

FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S.

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERVENTORIA PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA

OBJETO:

ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA.

PALESTINA – CALDAS, MAYO DE 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 3
2.1. LOCALIZACIÓN. 4
2.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO. 4
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO 5
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS 8
5. PORCENTAJE DE AVANCE 22
6. PAGO DE APORTES PARAFISCALES 22

(+57) 320 699 2614
(+57) 305 444 4130
(606) 886 7080
gerencia@fusioningeniera.com.co
Km. 1 Vía Panamericana No. 71-240 Bodega B.
Manizales - Colombia
www.fusioningeniería.com.co

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe se presenta con el fin de brindar información referente a las labores ejecutadas en el Contrato No. 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

Todo el contenido aquí presentado, tiene como fin dar a conocer la situación actual de la ejecución de la obra, la trazabilidad y el avance del proyecto a la Supervisión del Contrato y la Interventoría, como obligación contractual del contratista.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

NÚMERO DE CONTRATO	205 del 30 de diciembre de 2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PALESTINA-CALDAS	
NIT	890.801.141-7	
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ANDRES OSORIO VALENCIA	
C.C.	4.417.452	
CONTRATISTA	FUSIÓN INGENIERÍA SAS	
NIT	900.510.128-7	
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ CASTAÑO	
C.C.	16.076.312	
OBJETO CONTRATADO	"ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA."	
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. $847.240.692	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES DE EJECUCIÓN A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	
SUSPENSIÓN N°1	18 DE MARZO DE 2026	
FINALIZACIÓN SUSPENSIÓN N°1	HASTA EL 17 DE ABRIL	
PRÓRROGA SUSPENSIÓN N°1	HASTA EL 17 DE MAYO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
30 DE DICIEMBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025.	30 DE MARZO DE 2026
MODIFICACIÓN	SUSPENSIÓN DE CONTRATO PARA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA."	
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ. Secretario de Planeación Municipal.	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA	

2.1. LOCALIZACIÓN.

Ubicado en la subregión Centro-Sur de Caldas, sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central, el municipio de Palestina es un nodo estratégico del Eje Cafetero. Limita al norte con Neira y Manizales; al oriente con Manizales y Chinchiná; al sur con Chinchiná y Santa Rosa de Cabal (Risaralda); y al occidente con Belalcázar y Risaralda (Caldas).

Su dinámica territorial está definida por la integración en el Área Metropolitana Centro-Sur, donde mantiene un estrecho vínculo funcional con Manizales. Esta relación se potencia por el turismo en el sector de Santagueda y la proyección logística del Aeropuerto del Café, consolidando al municipio como un eje de servicios y conectividad regional.



Ilustración 1 Localización del Municipio de Palestina en Colombia. (Fuente: Wikipedia).



Ilustración 2 Localización del Municipio de Palestina en Caldas. (Fuente: Wikipedia)

2.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

El Contrato de obra pública 205 del 30 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA.", está fundamentado en ejecutar actividades de suministro e instalación de equipos para la Planta de Beneficio Animal del municipio y realizar adecuaciones tanto internas como externas, para complementar la infraestructura requerida por el INVIMA y mejorar las condiciones de los procesos y las labores de sacrificio/beneficio animal que abastecen el Municipio.

El municipio de Palestina orienta sus esfuerzos hacia el fortalecimiento del desarrollo territorial mediante la promoción de proyectos que impulsen el progreso social y económico, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Como ente territorial, reconoce que la modernización de la planta no es solo un requerimiento legal, sino una necesidad social estratégica para evitar la dependencia total de centrales de sacrificio externas.

En este contexto, el sacrificio animal de los ganados provenientes de la región ha sido históricamente una actividad desarrollada en las centrales de beneficio locales. Si bien este modelo no siempre responde a los estándares ideales, constituye una práctica ajustada a las condiciones socioeconómicas del territorio y cumple funciones que resultan esenciales para la comunidad, entre las que se destacan:

- **Generación de empleo local:** las plantas de beneficio animal contribuyen significativamente a la oferta laboral del municipio, tanto en el ámbito administrativo como en el operativo.
- **Fortalecimiento de la economía regional:** se facilita la comercialización del ganado local, en especial para los pequeños y medianos productores, quienes no cuentan con la capacidad económica para asumir los altos costos de transporte hacia centrales ubicadas en otras ciudades.
- **Estabilidad en el precio de la carne:** al realizar el sacrificio dentro del municipio se reducen los costos logísticos, evitando incrementos en el valor final del producto para el consumidor.
- **Control sanitario y reducción del sacrificio clandestino:** Mantener operativas las plantas locales permite minimizar las prácticas informales de sacrificio, que suelen surgir cuando los productores poseen poco ganado y buscan alternativas de bajo costo, representando un riesgo para la salud pública.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

ID	OBRAS INTERNAS	
1.0	**PRELIMINARES**	
1.2	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO SIMPLE.	M2
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CEMENTO O LADRILLO	M2
4.0	**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**	
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIÁMETRO 4"	UN
4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIÁMETRO 2"	UN
5.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA**	
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM DE ESPESOR (INCLUYE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA)	M2
5.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MURO DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M
6.0	**MAMPOSTERÍA**	

6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN LADRILLO FAROL DE 0,13*0,20*0,30, incluye mortero 1:3	M²
6.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, E=0,02 M	M²
6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM ENCINTADO Y MASILLADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2
7.0	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9.	M
10.0	**CUBIERTAS**	
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE F.C PERFIL 7, INCLUYE PERFIL PARA ESTRUCTURA DE LA MISMA	M²
14.0	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**	
14.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PARED VESTIER	M²
14.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON CABADO LISO, H=0,10 M	M
	EQUIPOS	
M-02 - M-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDAL O ACCIONAMIENTO MEDIANTE VÁLVULA DE RODILLA Y ESTERILIZADOR, INCLUYE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ANCLAJE A PLATAFORMAS	UND
M-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESPARRANCADOR ELÉCTRICO PARA APERTURA DE ANIMAL DURANTE EL CORTE CON SIERRA DE CANAL	UND
M-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN EN "L" PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14. INCLUYE INSTALACIÓN.	UND
M-09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LAVADOR DE PANZAS CONSTRUIDA EN ACERO INOX CAL. 18, INCLUYE DUCTO Y EXTRACTOR DE 14". DIMENSIONES: L: 2,10M A: 1,20 M, H: 0,50 M. LARGO DEL DUCTO: 5,0 M	UND
M-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA EVISCERACIÓN DE DOS NIVELES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, PARALES EN TUBERÍA RED 6" SCH 10 AISI 304, FLANCHE DE SUJECIÓN A PISO EN LAMINA 1/2 AISI 304, PLATAFORMA Y ESCALONES EN LAMINA DE ALFAJOR 1/8" AISI 304, MARCO DE ESCALERA CAL 16 AISI 304, BARANDAS EN TUBO DE 1 1/2 CAL 16 AISI 304 INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR DIMENSIONES: PLATAFORMA ALTA 1M ANCHO X 1M LARGO X 1,25M ALTO; PLATAFORMA BAJA 1M ANCHO X 1M LARGO X 0,60M ALTO	UND
M-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CARRO TIPO CUTTER PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.	UND

	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 14. RECIPIENTE O CUBA COMPLETAMENTE SANITARIA CON TERMINACIONES REDONDEADAS PARA EVITAR DEPÓSITO DE PARTÍCULAS. CONSTRUIDOS EN LÁMINA ACERO INOX	
M-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVABOTAS EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, REFUERZOS. INCLUYE MANGUERA Y CEPILLO PARA LAVADO	UND
M-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTERILIZADOR DE SIERRA DE ESTERNÓN EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA, SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN. • CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304 • ESTRUCTURA EN TUBO CUAD 1"1/2 CAL 16 AISI 304 • FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH 10 AISI 304 • NIVELADORES EN LÁMINA ¼ AISI 304 CON ESPÁRRAGO AISI 304	UND
M-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA PARA RECIBO Y REPASO DE PORCINOS. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGÜE TUBO RED 1" SCH 40 AISI 304, INCLUYE BANDEJA DE RECOLECCIÓN Y RODACHINAS DE 3". DIMENSION L: 2,20 M, A: 0,90 H: 0,90 M	UND
M-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE RECIPIENTE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CONSTRUÍDO EN ACERO INOX CAL. 14. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERÍA CUADRADA Y RODACHINAS DE 3". DIMENSIONES: L: 0,90M A: 0,70 M, H: 0,90 M	UND
M-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO DIMENSIONES: 0,90M X 1,85M	UND
M-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE GANCHOS PARA INSPECCIÓN DE VÍSCERAS ROJAS Y VÍSCERAS BLANCAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14 INCLUYE TUBERIA DE SOPORTE Y FIJACIÓN	UND
M-57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DESOLLADORA DE RODILLO, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. RODILLO EN LÁMINA DE 1/8 ACERO INOX, EJE DE 1 1/2 INOX, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERÍA CUADRADA DE 4" ACERO INOX. MOTORREDUCTOR DE 5H, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y BOTONERA DE MANDO.	UND
	OBRAS PRELIMINARES	
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES	M2
1.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA CORRALES EXISTENTES (INCLUYE RETIRO)	M
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO, METÁLICAS Y MADERA	


5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA DE 20X30cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI	M
5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA METALDECK CAL. 16, (incluye malla electrosoldada 15x15X4mm)	M2
	PINTURA	
9.2	REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE PINTURA DE PERFILES METÁLICOS DE MUROS DE CERRAMIENTO CORRALES	M
	OBRAS VARIAS	
18.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA H=1.80m CON PERFILES QUE SOPORTEN SU PESO Y SUS RESPECTIVOS ANCLAJES (SE RECOMIENDA LAS DIAGONALES ESTRUCTURALES	M
	ADECUACIONES SANITARIAS	
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 4"	ML
4.9	CONEXIÓN A CÁMARA DE ALCANTARILLADO	UN

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UND
1.2	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO SIMPLE.	M2





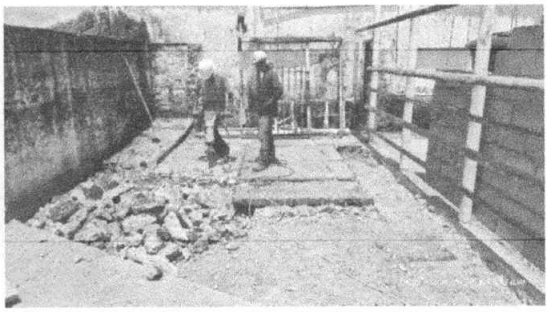



1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CEMENTO O LADRILLO	M2






4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIÁMETRO 4"	UN

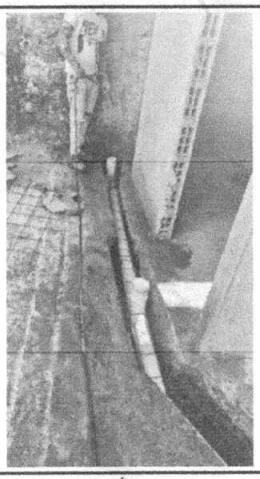



4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIÁMETRO 2"	UN

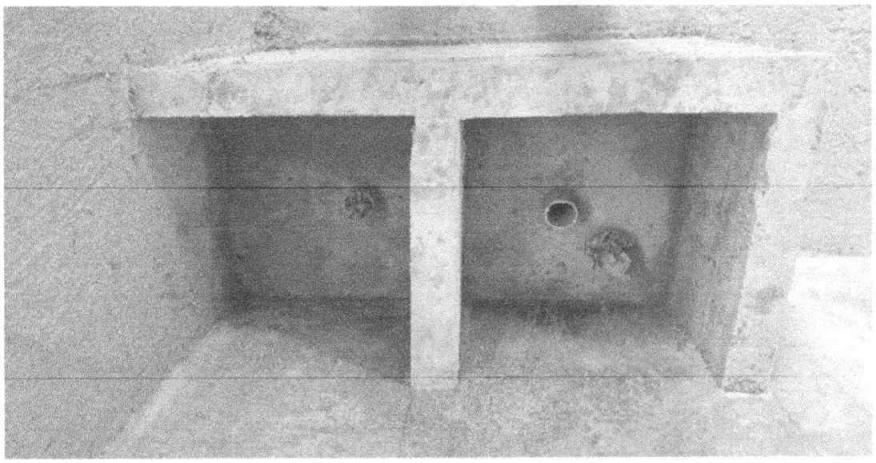





5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM DE ESPESOR (INCLUYE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA)	M2

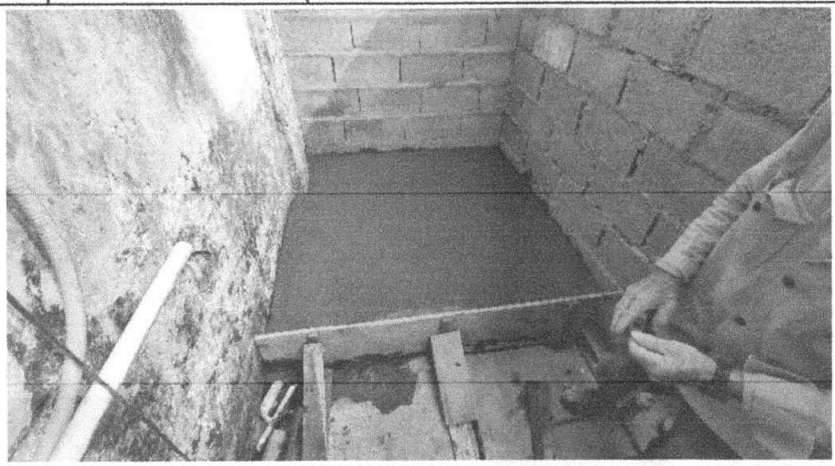


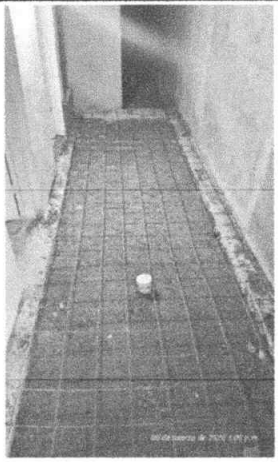

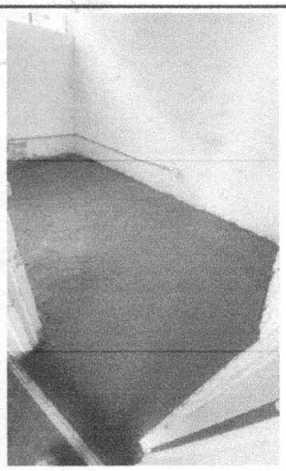



5.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MURO DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M



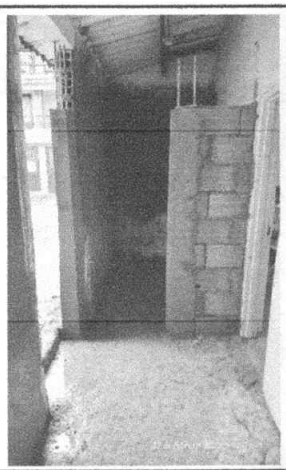


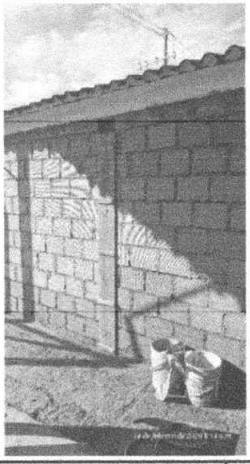


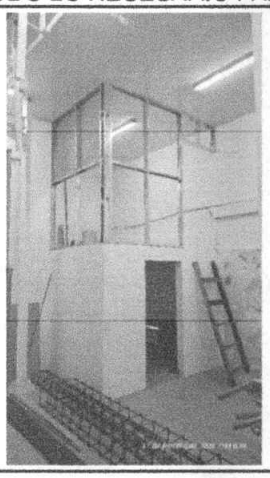
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN LADRILLO FAROL DE 0,13*0,20*0,30, incluye mortero 1:3	M²

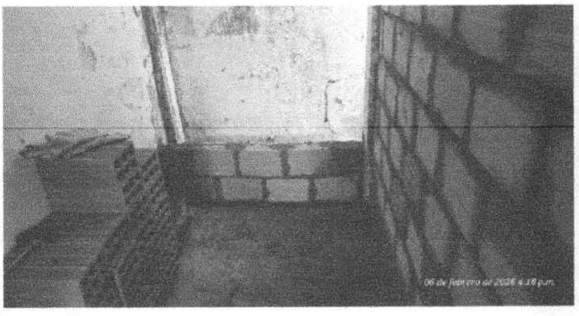




6.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, E=0,02 M	M²

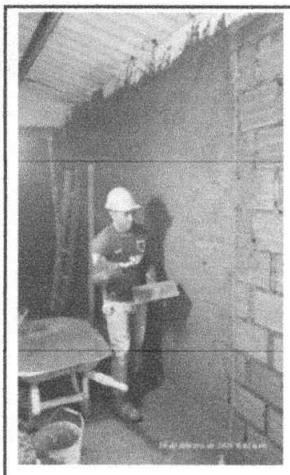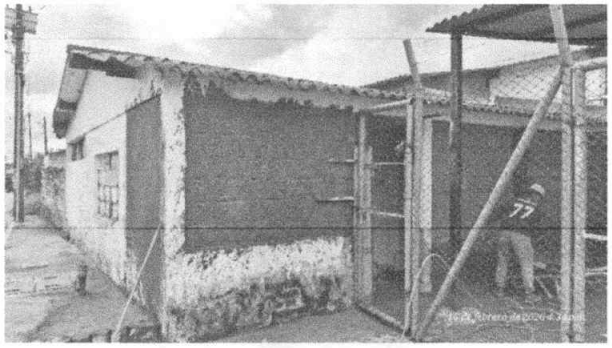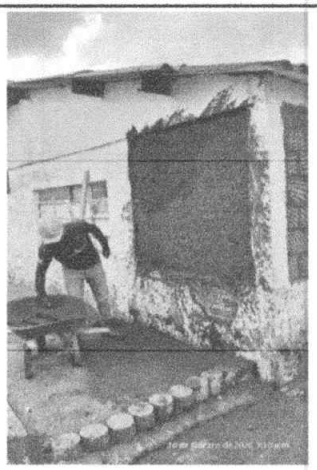6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM ENCINTADO Y MASILLADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2





7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9.	M

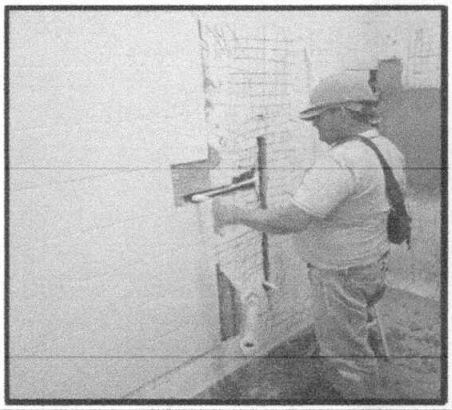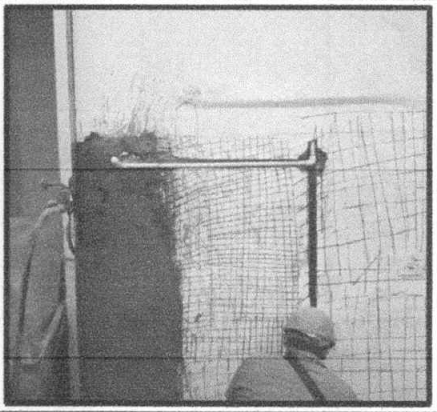



10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE F.C PERFIL 7, INCLUYE PERFIL PARA ESTRUCTURA DE LA MISMA	M²





14.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PARED VESTIER	M²

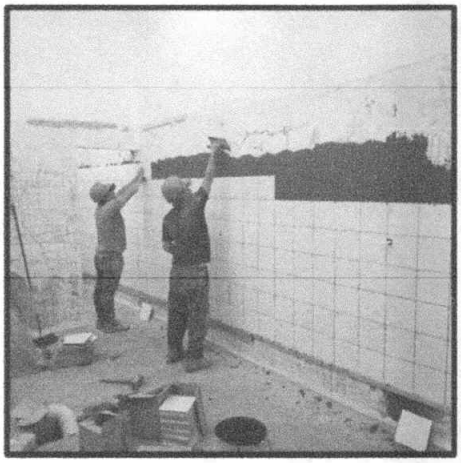


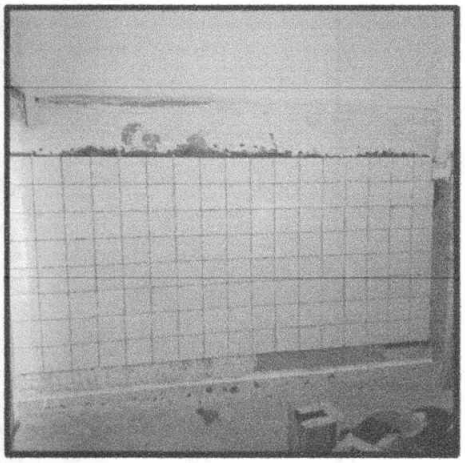


14.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON ACABADO LISO, H=0,10 M	M

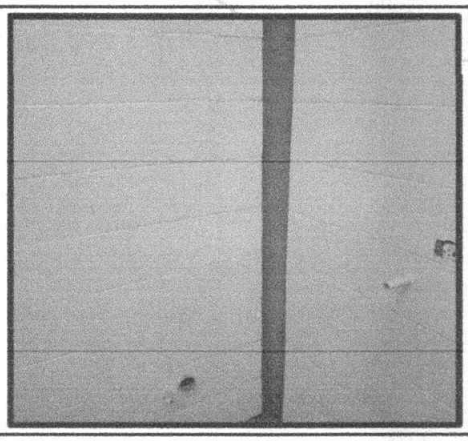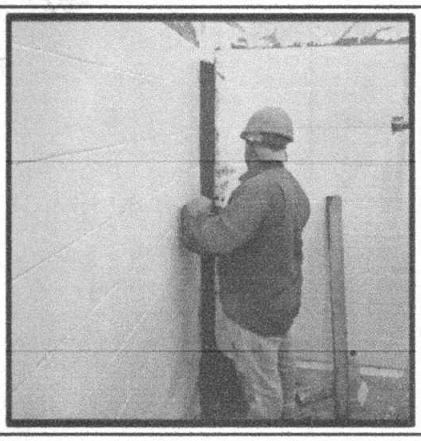



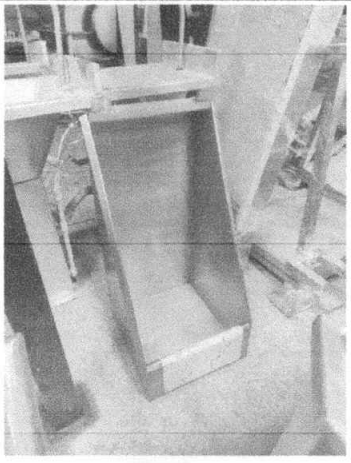
EQUIPOS		
M-02 - M-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDAL O ACCIONAMIENTO MEDIANTE VÁLVULA DE RODILLA Y ESTERILIZADOR, INCLUYE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ANCLAJE A PLATAFORMAS	UND

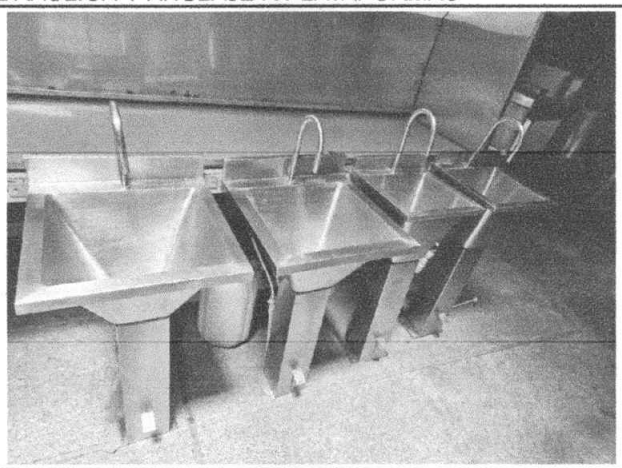

M-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESPARRANCADOR ELÉCTRICO PARA APERTURA DE ANIMAL DURANTE EL CORTE CON SIERRA DE CANAL	UND

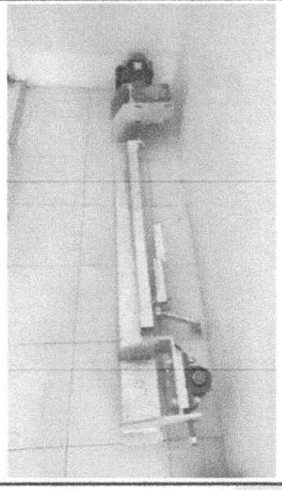

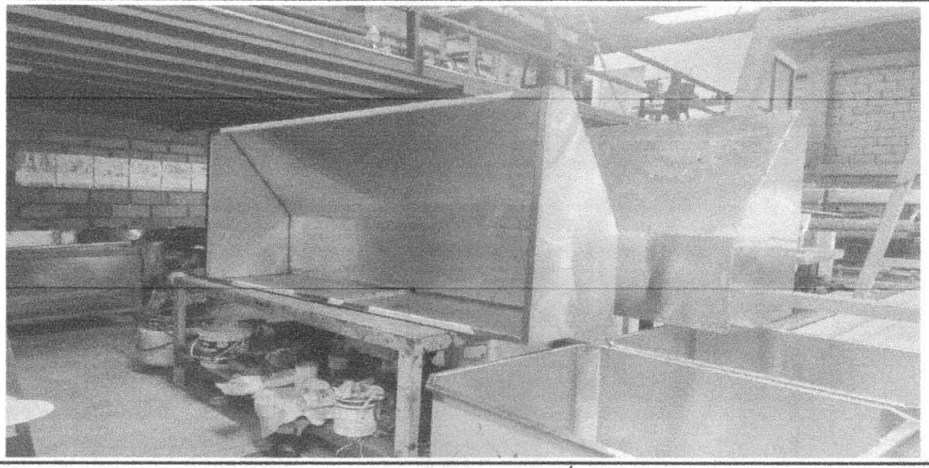
M-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN EN "L" PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14. INCLUYE INSTALACIÓN.	UND
M-09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LAVADOR DE PANZAS CONSTRUIDA EN ACERO INOX CAL. 18, INCLUYE DUCTO Y EXTRACTOR DE 14". DIMENSIONES: L: 2,10M A: 1,20 M, H: 0,50 M. LARGO DEL DUCTO: 5,0 M	UND
		
M-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA EVISCERACIÓN DE DOS NIVELES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, PARALES EN TUBERIA RED 6" SCH 10 AISI 304, FLANCHE DE SUJECIÓN A PISO EN LAMINA 1/2 AISI 304, PLATAFORMA Y ESCALONES EN LAMINA DE ALFAJOR 1/8" AISI 304, MARCO DE ESCALERA CAL 16 AISI 304, BARANDAS EN TUBO DE 1 1/2 CAL 16 AISI 304 INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR DIMENSIONES: PLATAFORMA ALTA 1M ANCHO X 1M LARGO X 1,25M ALTO; PLATAFORMA BAJA 1M ANCHO X 1M LARGO X 0,60M ALTO	UND
		
M-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CARRO TIPO CUTTER PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 14. RECIPIENTE O CUBA COMPLETAMENTE SANITARIA CON	UND

	TERMINACIONES REDONDEADAS PARA EVITAR DEPÓSITO DE PARTÍCULAS. CONSTRUIDOS EN LÁMINA ACERO INOX	
		
M-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVABOTAS EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, REFUERZOS. INCLUYE MANGUERA Y CEPILLO PARA LAVADO	UND
		
M-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTERILIZADOR DE SIERRA DE ESTERNÓN EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA, SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN. • CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304 • ESTRUCTURA EN TUBO CUAD 1"1/2 CAL 16 AISI 304 • FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH 10 AISI 304 • NIVELADORES EN LÁMINA ¼ AISI 304 CON ESPÁRRAGO AISI 304	UND


		
M-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA PARA RECIBO Y REPASO DE PORCINOS. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGÜE TUBO RED 1" SCH 40 AISI 304, INCLUYE BANDEJA DE RECOLECCIÓN Y RODACHINAS DE 3". DIMENSION L: 2,20 M, A: 0,90 H: 0,90 M	UND
		
M-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE RECIPIENTE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CONSTRUÍDO EN ACERO INOX CAL. 14. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERÍA CUADRADA Y RODACHINAS DE 3". DIMENSIONES: L: 0,90M A: 0,70 M, H: 0,90 M	UND



M-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO DIMENSIONES: 0,90M X 1,85M	UND
M-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE GANCHOS PARA INSPECCIÓN DE VÍSCERAS ROJAS Y VÍSCERAS BLANCAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14 INCLUYE TUBERIA DE SOPORTE Y FIJACIÓN	UND

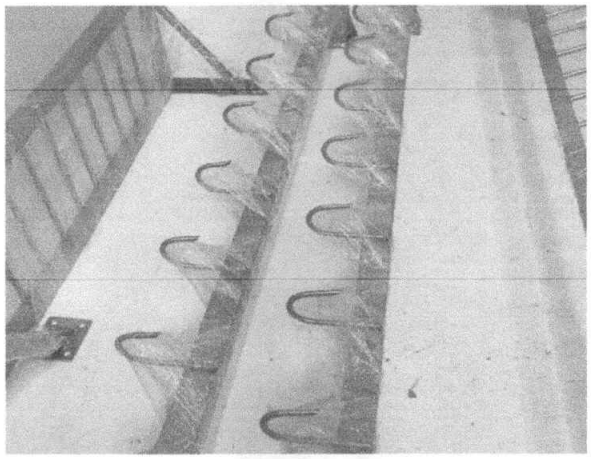


M-57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DESOLLADORA DE RODILLO, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. RODILLO EN LÁMINA DE 1/8 ACERO INOX, EJE DE 1 1/2 INOX, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERÍA CUADRADA DE 4" ACERO INOX. MOTORREDUCTOR DE 5H, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y BOTONERA DE MANDO.	UND

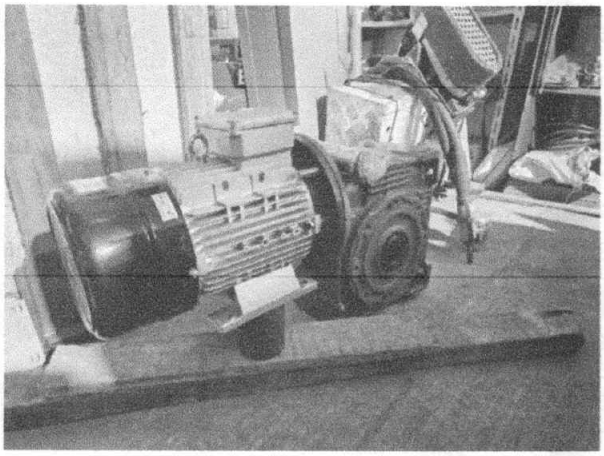



	OBRAS EXTERIORES	
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES	M2

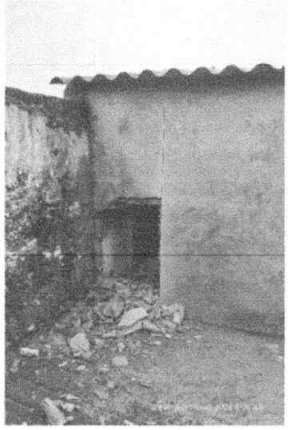







1.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA CORRALES EXISTENTES (INCLUYE RETIRO)	M




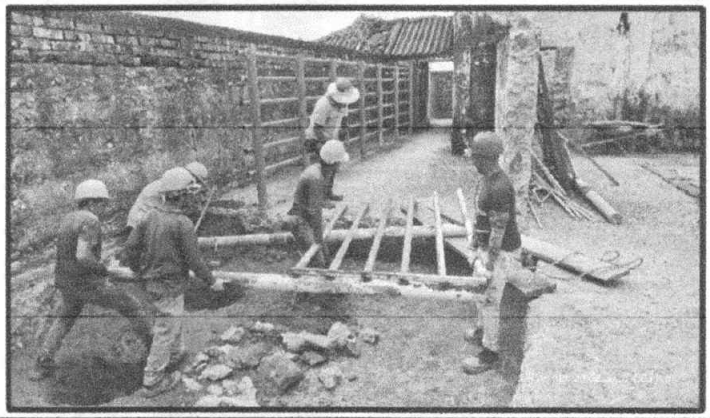


(+57) 320 699 2614
(606) 888 7089
gerencia@fusioningenieria.com.co
Km. 1 Vía Panamericana No. 71-240 Bodega B.
Manizales - Colombia
www.fusioningenieria.com.co

5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON ACABADO SANITARIO PARA CORRALES (incluye malla electrosoldada 15x15X40)	M2


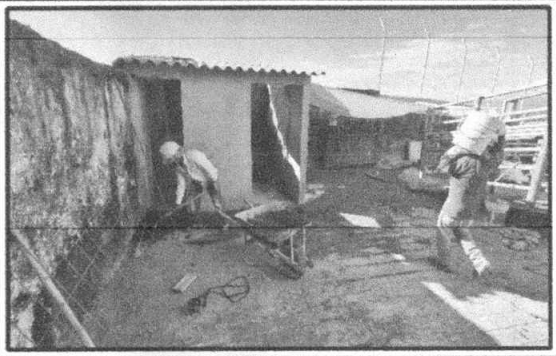
5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA DE 20X30 cm INCLUYE REFUEZO Y FORMALETA 3000 PSI	M

5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA METALDECK CAL. 16, (incluye malla electrosoldada 15x15X4mm)	M2

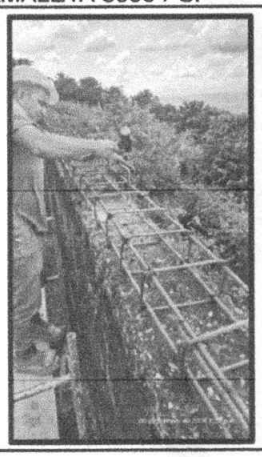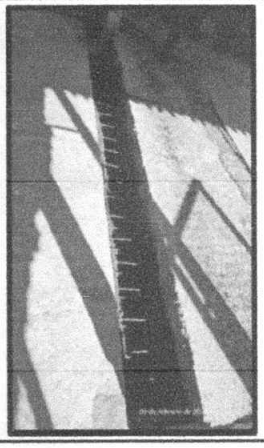


9.2	REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE PINTURA DE PERFILES METÁLICOS DE MUROS DE CERRAMIENTO CORRALES	M

18.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA H=1.80m CON PERFILES QUE SOPORTEN SU PESO Y SUS RESPECTIVOS ANCLAJES (SE RECOMIENDA LAS DIAGONALES ESTRUCTURALES	M

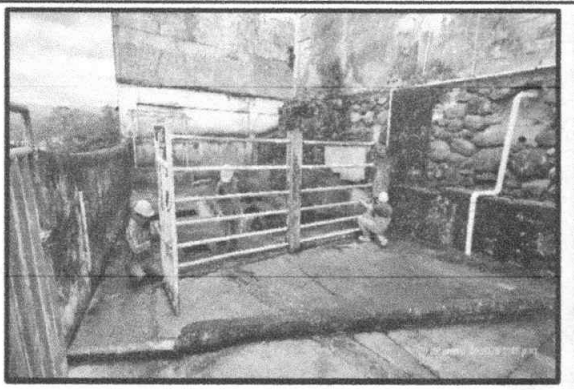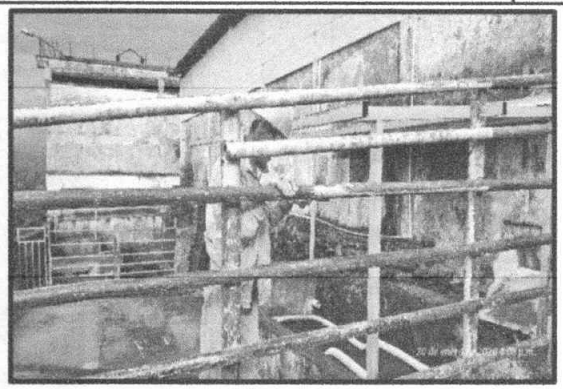



4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 4"	ML

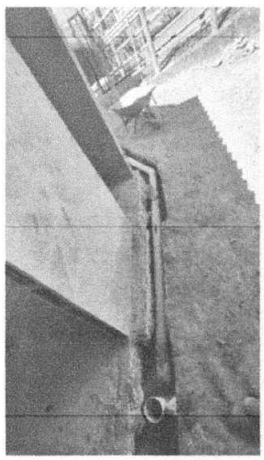


4.9	CONEXIÓN A CÁMARA DE ALCANTARILLADO	UN



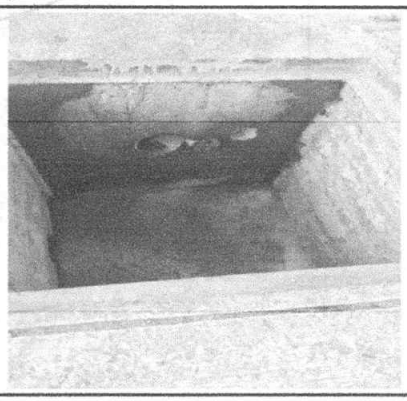

5. PORCENTAJE DE AVANCE

El porcentaje de avance correspondiente a la primera acta representa el 28.32% del valor total del contrato. Este porcentaje incluye únicamente los ítems contractuales ejecutados hasta la fecha.

6. PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Teniendo en cuenta la importancia tributaria y de seguridad del empleado, el contratista realizó las afiliaciones correspondientes del personal necesario en la obra; este se vinculó y se han realizado los pagos de manera puntual.

Atentamente,

Juan Sebastián Gómez Castaño
Representante Legal
Fusión Ingeniería S.A.S.


Proyectó: Ing. Laura Alegría Zapata V.
Revisó: Ing. Andrea López Vásquez.

Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA


1,2	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO SIMPLE.							M2
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Pasillo Acceso Operarios	Losa	1,15	6,13		1,00	7,05	7,05	
Vestier	Losa	1,13	2,52		1,00	2,85	9,90	
Cuarto de insumos	Losa	1,27	2,08		1,00	2,64	12,54	
Oficina	Losa	2,1	3,20		1,00	6,72	19,26	
Area de procesos	Para instalación de Rejillas	0,2	1,00		6,00	1,20	20,46	
		0,23	0,25		1,00	0,06	20,52	
Area de Visceras Blancas	Para instalación de Rejillas	0,2	2,00		1,00	0,40	20,92	
						0,00	20,92	
						0,00	20,92	
TOTAL							20,92	





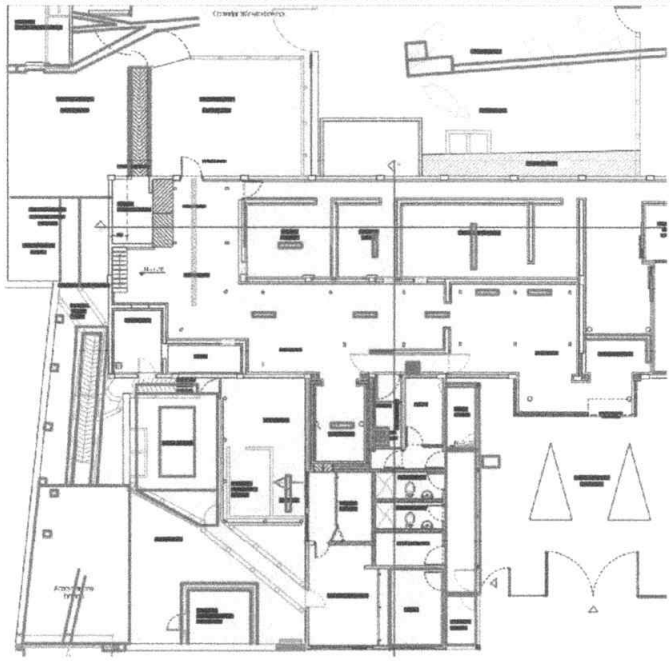


REGISTRO FOTOGRAFICO














Juan Sebastián Gómez C.

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA


1,3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CEMENTO O LADRILLO							M2
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Pasillo Ingreso Peatonal	Construcción vestier		6,32	1,00	1,00	6,32	6,32	
	Área triangular	0,50	0,33	1,00	3,00	0,50	6,82	
Cuarto de insumos	Para construcción de columneta		0,20	1,00	1,00	0,20	7,02	
Vísceras Blancas	Buque para vísceras rojas		0,38	0,38	2,00	0,29	7,31	
	Instalación desagüe		3,66	0,09	1,00	0,33	7,64	
Pieles y sangre	Buque		0,65	0,70	1,00	0,46	8,10	
TOTAL							8,10	

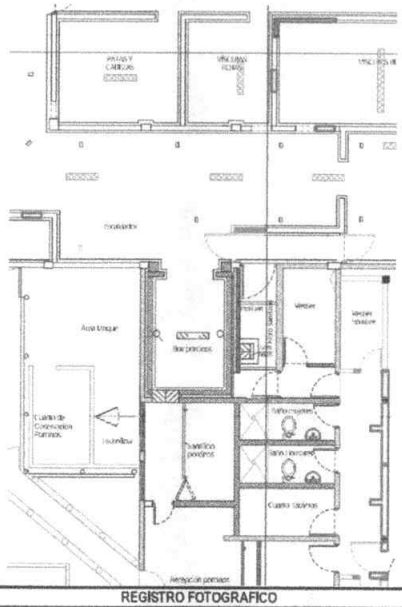

REGISTRO FOTOGRAFICO





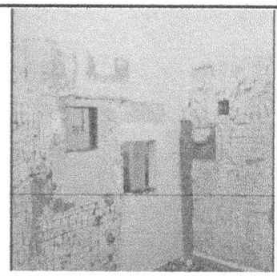

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

4,2	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 4"							UN
Ubicación	**Observaciones**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Unidad**	**Cant. Parcial**	**Cant. Acumulada**	**Cobro**
Cuarto de observacion bovino	Entrada bovino y veterinario				2,00	2,00	2,00	
						0,00	2,00	
TOTAL							2,00	

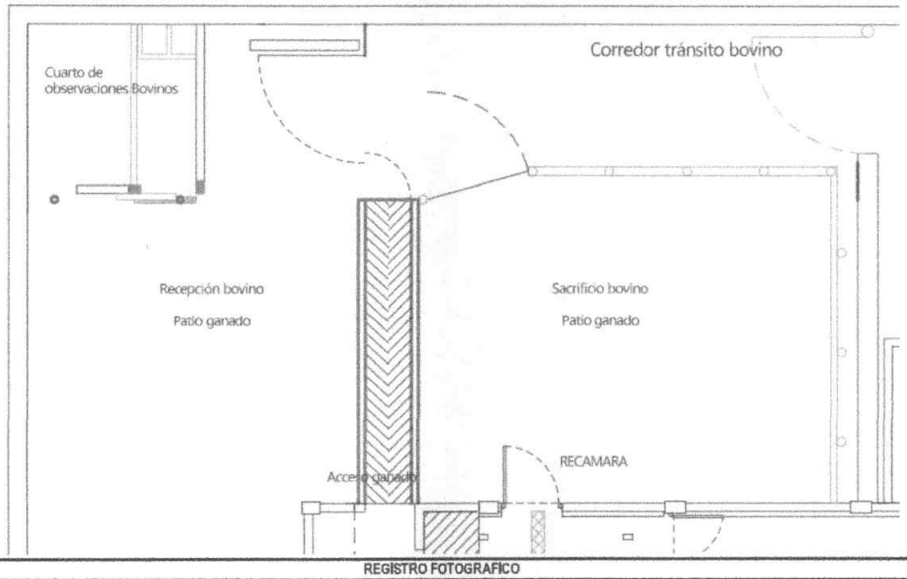

REGISTRO FOTOGRAFICO



Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra


Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría

Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria




Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

4,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIAMETRO 2"							UN
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Vestier					1,00	1,00	1,00	
Cuarto de observación bovinos	Comedero y bebedero				2,00	2,00	3,00	
Vísceras blancas	Lavamanos				1,00	1,00	4,00	
Patas y cabezas	Lavamanos				1,00	1,00	5,00	
TOTAL							5,00	

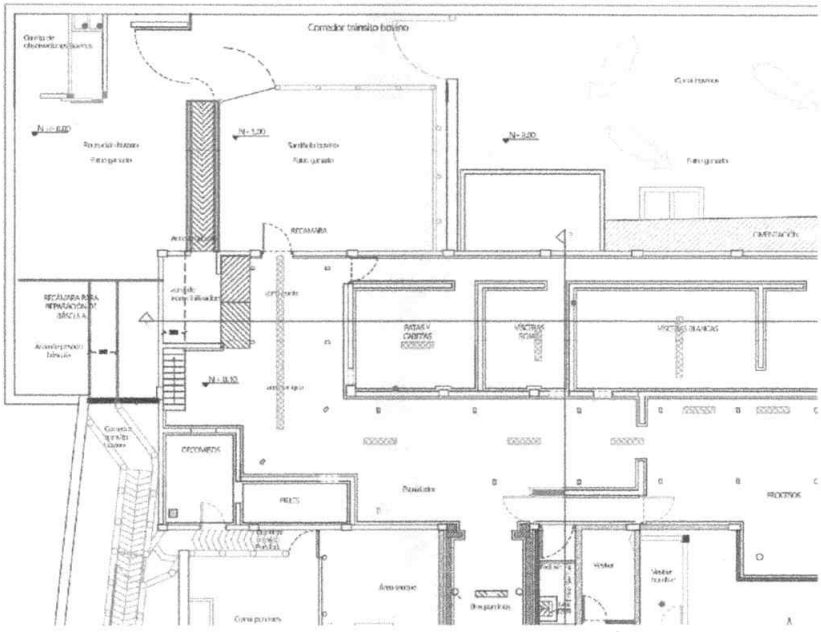

REGISTRO FOTOGRAFICO

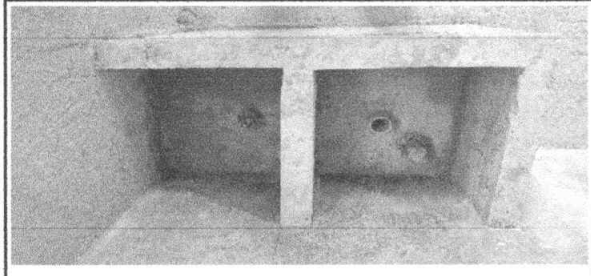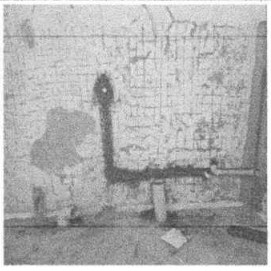
Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra


Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría

Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA


5,1	SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM DE ESPESOR (INLCLUYE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA)							M2
Ubicación	**Observaciones**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Unidad**	**Cant. Parcial**	**Cant. Acumulada**	**Cobro**
Vestier		1,36	2,66		1,00	3,62	3,62	
	Vano de puerta	0,16	0,77		1,00	0,12	3,74	
Pasillo		1,36	6,36		1,00	8,65	12,39	
Cuarto de insumos		2,20	1,39		1,00	3,06	15,45	
	Vano de puerta	0,16	0,75		1,00	0,12	15,57	
Oficinia		2,24	3,38		1,00	7,57	23,14	
Hidroflow		1,43	1,50		1,16	2,49	25,63	
Patas y cabezas	Tuberia 2"	0,10	0,35		1,00	0,04	25,67	
Zona de cargue	Tuberia 3" conexión a cámara	0,32	0,60		1,00	0,19	25,86	
						0,00	25,86	
TOTAL							25,86	

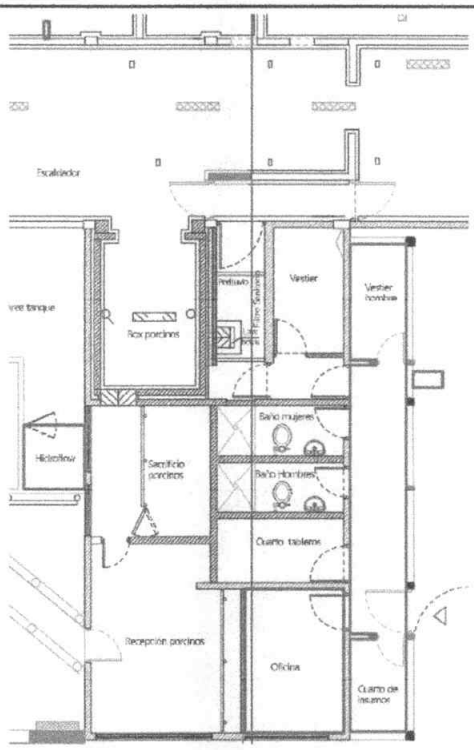


REGISTRO FOTOGRAFICO

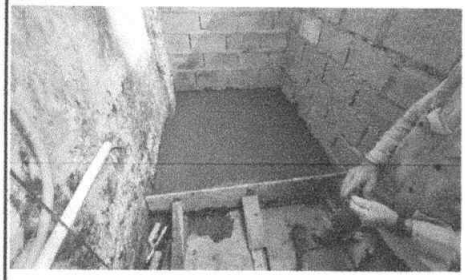





Juan Sebastián Gómez C.

Juan Sebastián Gómez Castaño

Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS

Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres

Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina

Interventoría

Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA


5,3	**SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MURO DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	**ML**


Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Pasillo acceso operarios				2,65	1,00	2,65	2,65	
Vestier				2,65	1,00	2,65	5,30	
	Vano de puerta			1,96	1,00	1,96	7,26	
Cuarto de insumos				2,65	1,00	2,65	9,91	
				2,05	1,00	2,05	11,96	
Cuarto de subproductos				1,98	3,00	5,94	17,90	
Area de procesos	Muro que se extiende			2,36	1,00	2,36	20,26	
						0,00	20,26	
TOTAL							20,26	

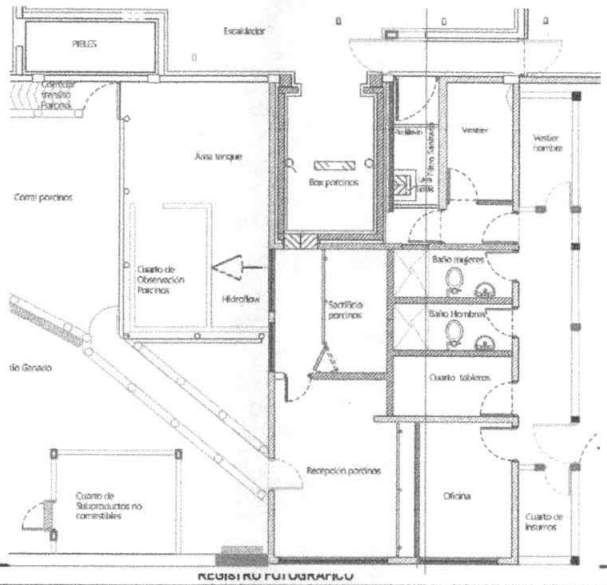


REGISTRO FOTOGRAFICO








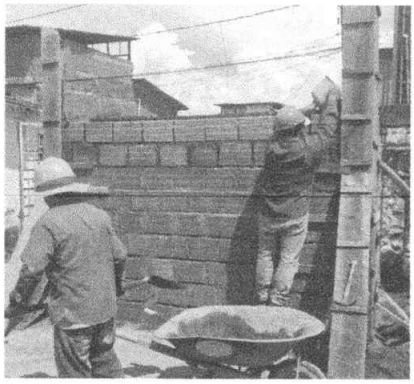



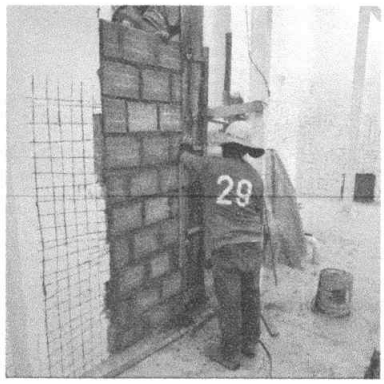

Juan Sebastián Gómez Castaño

Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS

Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres

Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina


Interventoría

Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	




CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA


6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN LADRILLO FAROL DE 0,13*0,20*0,30, incluye mortero 1:3							M2
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Pasillo acceso peatonal			4,00	2,65	1,00	10,60	10,60	
			3,36	2,65	1,00	8,90	19,50	
	Muro encima de viga entrada		1,00	0,30	1,00	0,30	19,80	
Vestier	Muro trasero		1,33	2,65	1,00	3,52	23,32	
	Puerta		0,35	2,15	1,00	0,75	24,07	
	Muro encima de viga		1,40	0,40	1,00	0,56	24,63	
	Abertura triangular parte superior		0,65	0,20	0,50	0,07	24,70	
Cuarto de insumos	Muro posterior		2,12	1,50	1,00	3,18	27,88	
	Muro trasero		1,39	1,50	1,00	2,09	29,97	
	Puerta		0,35	2,00	1,00	0,70	30,67	
	Muro encima de viga		1,40	0,40	1,00	0,56	31,23	
Vísceras rojas	Buque		0,62	0,60	1,00	0,37	31,60	
Cuarto de subproductos			2,50	1,98	1,00	4,95	36,55	
			2,96	1,98	1,00	5,86	42,41	
			1,00	1,98	1,00	1,98	44,39	
	Muro corto		0,44	1,98	1,00	0,87	45,26	
	Cuchillas		2,92	0,34	1,00	0,99	46,25	
	Hilada sobre muro existente		3,26	0,20	1,00	0,65	46,90	
						0,00	46,90	
Pieles y sangre	Cerrar buque		0,60	0,60	1,00	0,36	47,26	
Area de procesos	Muro que se extiende		0,90	2,16	1,00	1,94	49,20	
TOTAL							49,20	

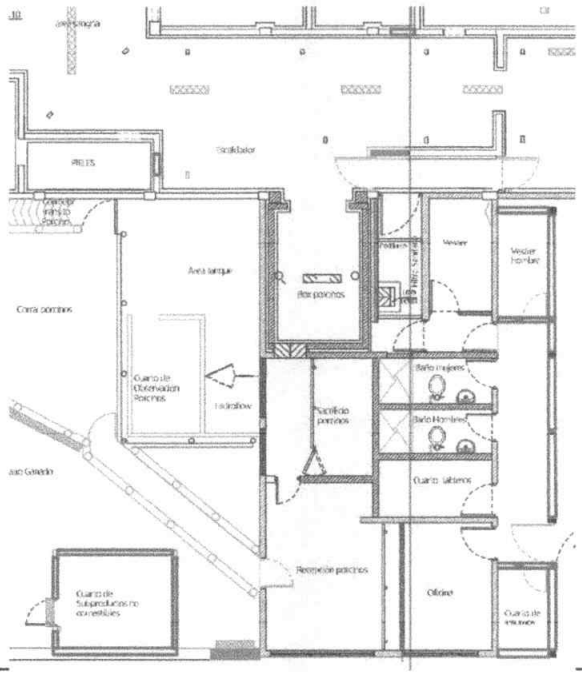

REGISTRO FOTOGRAFICO



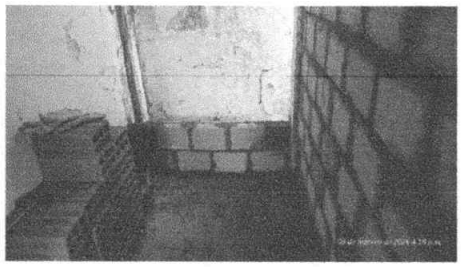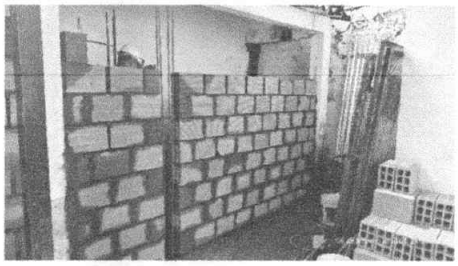

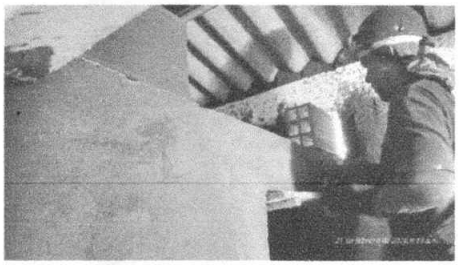


Juan Sebastián Gómez Castaño

Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS

Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres

Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina

Interventoría


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

6,2	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, E=0,02 M							M2
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Vestier			1,33	2,65	1,00	3,52	3,52	
	Puerta muro		2,11	0,70	2,00	2,95	6,47	
	Muro superior de la viga		1,40	0,50	2,00	1,40	7,87	
Cuarto de insumos	Muro posterior		2,12	1,50	1,00	3,18	11,05	
	Muro trasero		1,39	1,50	1,00	2,09	13,14	
	Muro posterior exterior		2,58	2,60	1,00	6,71	19,85	
	Muro traser exterior		1,60	2,22	1,00	3,55	23,40	
	Puerta muro		0,63	1,95	2,00	2,46	25,86	
	Muro superior de la viga		1,35	0,53	2,00	1,43	27,29	
Cuarto de observación bovinos			3,00	2,20	2,00	13,20	40,49	
			1,75	2,20	2,00	7,70	48,19	
	Buque vísceras roja		0,62	0,60	2,00	0,74	48,93	
Entrada			1,00	0,50	2,00	1,00	49,93	
Cuarto de observación porcinos	Muro interior costados		2,93	2,03	2,00	11,90	61,83	
	Muro entrada		1,03	2,03	1,00	2,09	63,92	
	Muro trasero		1,73	2,03	1,00	3,51	67,43	
	Cuchilla		1,73	0,25	0,50	0,22	67,65	
	Muro lateral izq (plano)		2,93	0,27	1,00	0,79	68,44	
	Frontal		1,25	2,18	1,00	2,73	71,17	
	Area triangular		1,25	0,12	0,50	0,07	71,24	
	Puerta		0,65	0,25	1,00	0,16	71,40	
			0,65	0,10	0,50	0,03	71,43	
	Puerta		0,15	2,06	1,00	0,31	71,74	
	Lateral		3,15	2,06	1,00	6,49	78,23	
	Muro trasero externo		3,46	2,06	1,00	7,13	85,36	
	Cuchilla (triangular)		3,46	0,37	0,50	0,64	86,00	
Corrales bovinos	Cerramiento de salida hacia cafetal		1,12	1,65	1,00	1,85	87,85	
Vísceras blancas	Desagüe conexión lavamanos 2"		2,80	0,09	1,00	0,25	88,10	
Patas y cabezas	Muro para realizar enchape a nivel del existente		1,98	0,98	1,00	1,94	90,04	
Pieles			0,60	0,60	1,00	0,36	90,40	
						0,00	90,40	
TOTAL							90,40	

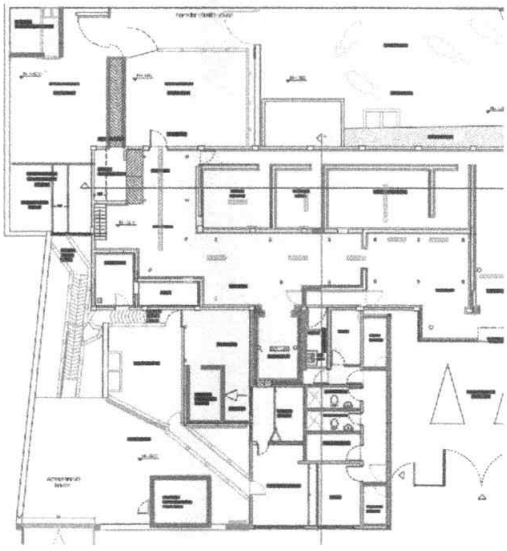




REGISTRO FOTOGRAFICO


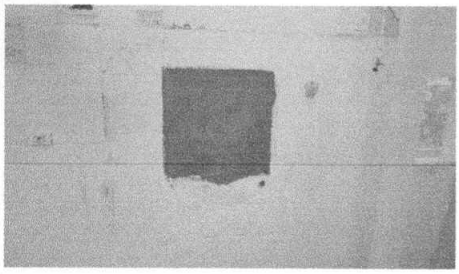


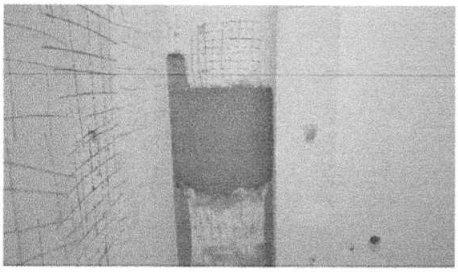



Juan Sebastián Gómez Castaño

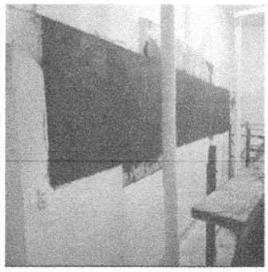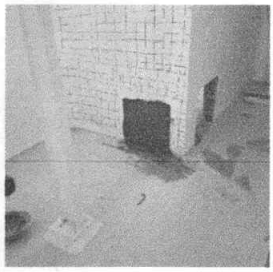Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS

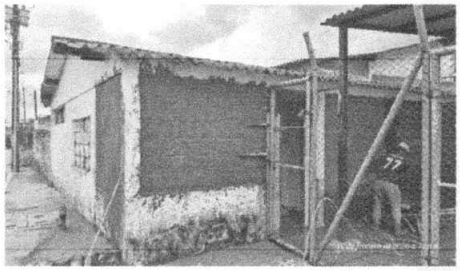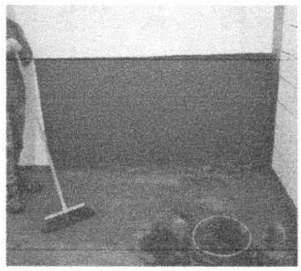Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres

Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina

Interventoría


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

6,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM ENCINTADO Y MACILLADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Area sangre y pieles	Muro		1,72	2,35	1,00	4,04	4,04	
			1,60	2,35	1,00	3,76	7,80	
	Vano de puerta		0,90	0,50	1,00	0,45	8,25	
TOTAL							8,25	

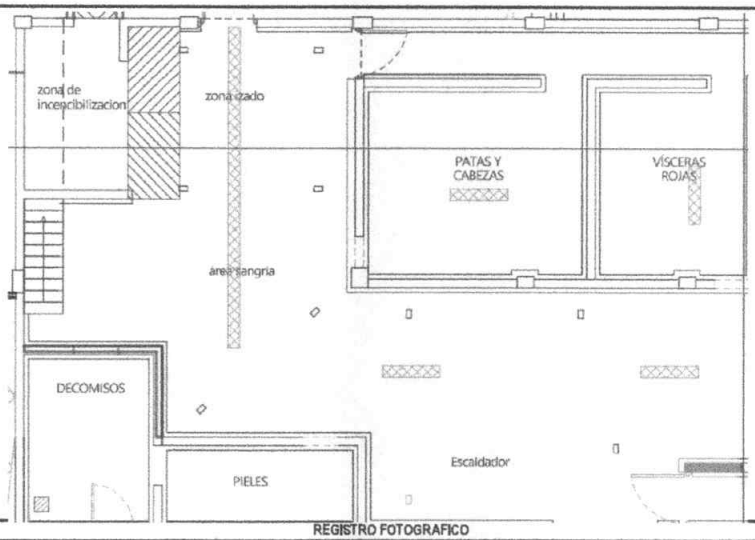

REGISTRO FOTOGRAFICO





Juan Sebastián Gómez C.

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA


7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÒN TUBERÍA PVC PRESIÒN 1/2" RDE 9.							ML
Ubicación	**Observaciones**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Unidad**	**Cant. Parcial**	**Cant. Acumulada**	**Cobro**
Vísceras Blancas	Suministro para el lavamanos		2,00		1,00	2,00	2,00	
	Suministro para el esterilizador		1,80		1,00	1,80	3,80	
Vísceras rojas	Modificación de suministro existente para meson		0,40		1,00	0,40	4,20	
Area de procesos	Area sucia, modificaciòn de suministro		0,82		1,00	0,82	5,02	
TOTAL							5,02	

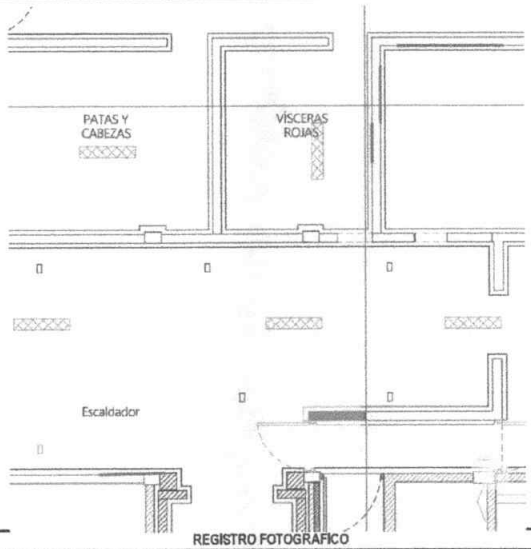

REGISTRO FOTOGRAFICO





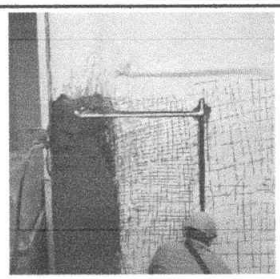

Juan Sebastián Gómez C.

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA


10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE F.C PERFIL 7, INCLUYE PERFIL PARA ESTRUCTURA DE LA MISMA							M2
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Cuarto de insumos	Recorrido de cubierta	0,92	1,30		1,00	1,20	1,20	
	Recorrido de cubierta	1,84	2,44		1,00	4,49	5,69	
Vestier	Recorrido de cubierta	0,92	2,44		1,00	2,24	7,93	
Pasillo acceso operarios	Recorrido de cubierta	0,92	2,44		2,00	4,49	12,42	
Sacrificio porcinos	Recorrido de cubierta	0,92	2,44		1,00	2,24	14,66	
						0,00	14,66	
TOTAL							14,66	

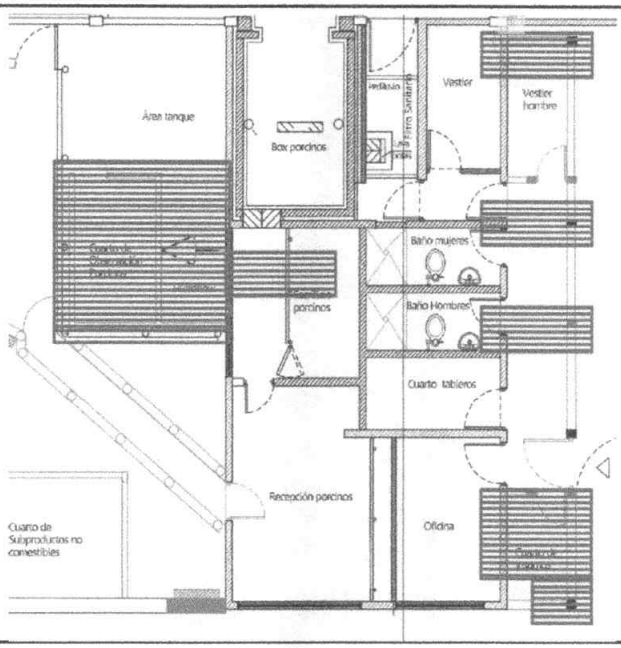


REGISTRO FOTOGRAFICO

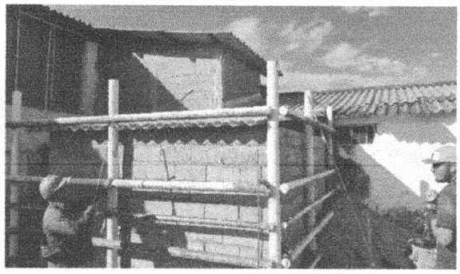

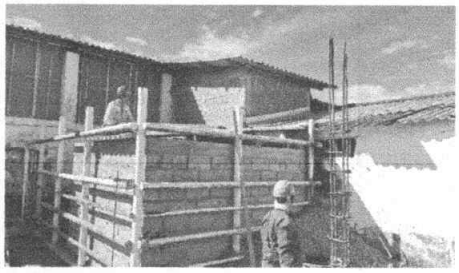



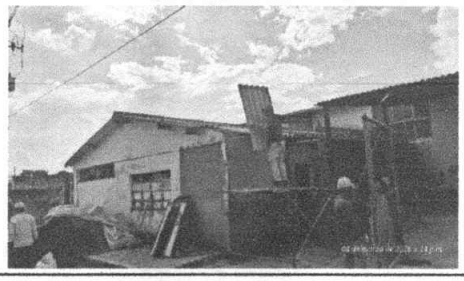

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

14,2	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION ENCHAPE EN PARED VESTIER							M2
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Area de procesos	Muro divisorio	1,82	1,1		1,00	2,00	2,00	
		1,82	0,8		1,00	1,46	3,46	
	Area limpia	1,82	5,35		1,00	9,74	13,20	
Patas y cabezas		1,82	3,44		1,00	6,26	19,46	
TOTAL							19,46	

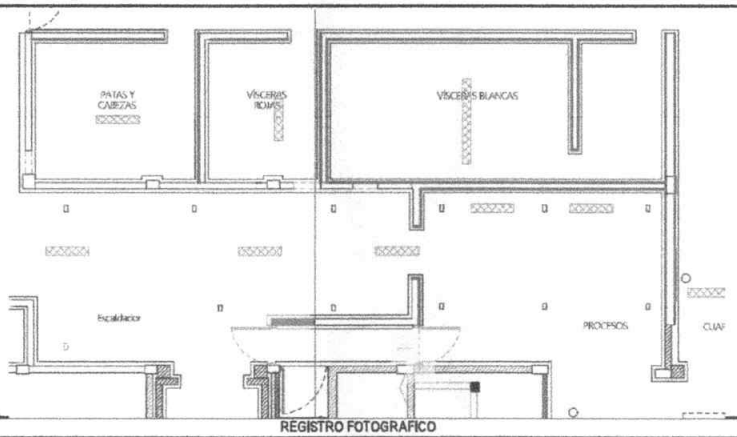

REGISTRO FOTOGRAFICO

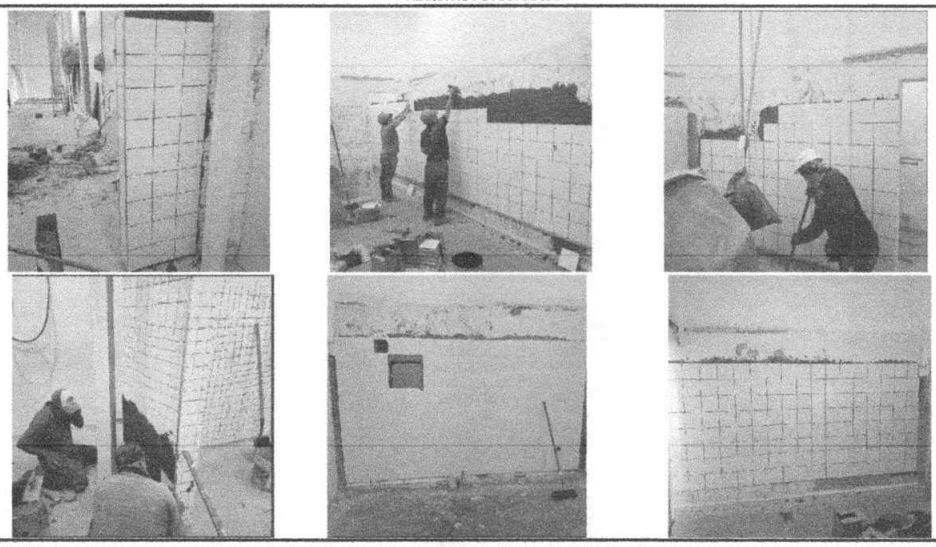

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS







ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

14,3	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON CABADO LISO, H=0,10 M							ML
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Alto	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Vísceras blancas				1,82	5,00	9,10	9,10	
Vísceras rojas				1,82	1,00	1,82	10,92	
TOTAL							10,92	

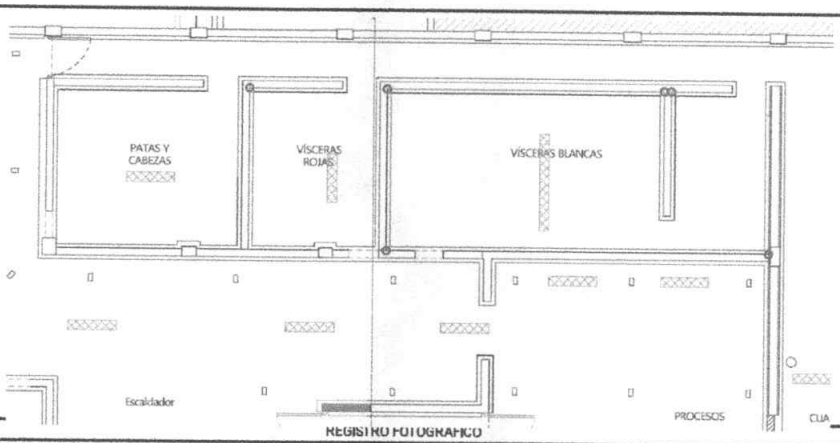

REGISTRO FOTOGRAFICO

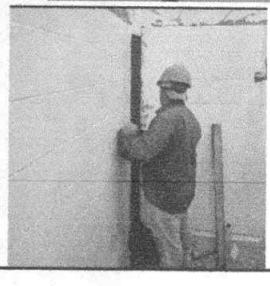Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-02 - M-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDAL O ACCIONAMIENTO MEDIANTE VÁLVULA DE RODILLA Y ESTERILIZADOR, INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y ANCLAJE A PLATAFORMAS	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Patas y Cabezas	Esterilizador				0,50	0,50	0,50	
Filtro Sanitario	Lavamanos				0,50	0,50	1,00	
Vísceras Rojas	Lavamanos y Esterilizador				1,00	1,00	2,00	
Vísceras Blancas	Lavamanos y Esterilizador				1,00	1,00	3,00	
Box de Porcinos	Lavamanos y Esterilizador				1,00	1,00	4,00	
Plataforma de transferencia	Lavamanos y Esterilizador				1,00	1,00	5,00	
TOTAL							5,00	

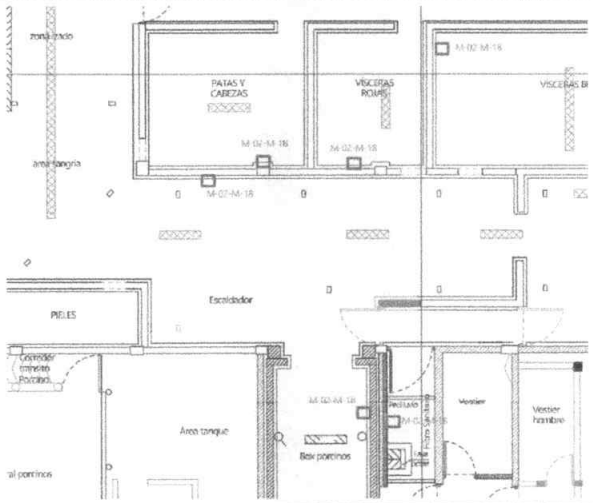

REGISTRO FOTOGRAFICO





Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESPARRANCADOR ELÉCTRICO PARA APERTURA DE ANIMAL DURANTE EL CORTE CON SIERRA DE CANAL	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Proceso porcinos				1,00	1,00	1,00	1,00	
						0,00	1,00	
TOTAL							1,00	

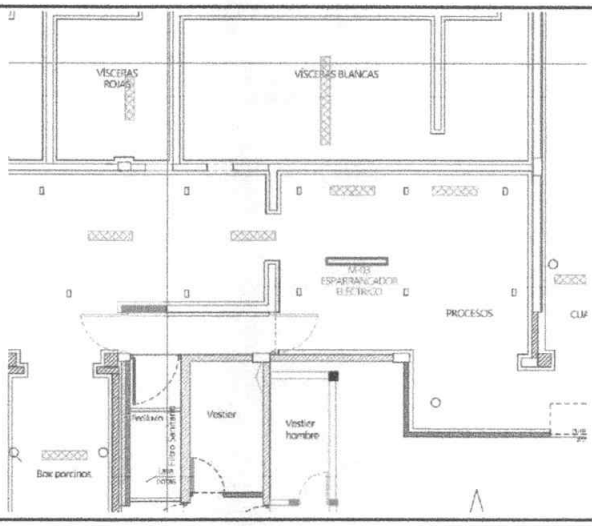

REGISTRO FOTOGRAFICO



Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría

Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoría


Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN EN "L" PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14, INCLUYE INSTALACIÓN	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Tobogán				1,00	1,00	1,00	1,00	
						0,00	1,00	
TOTAL							1,00	

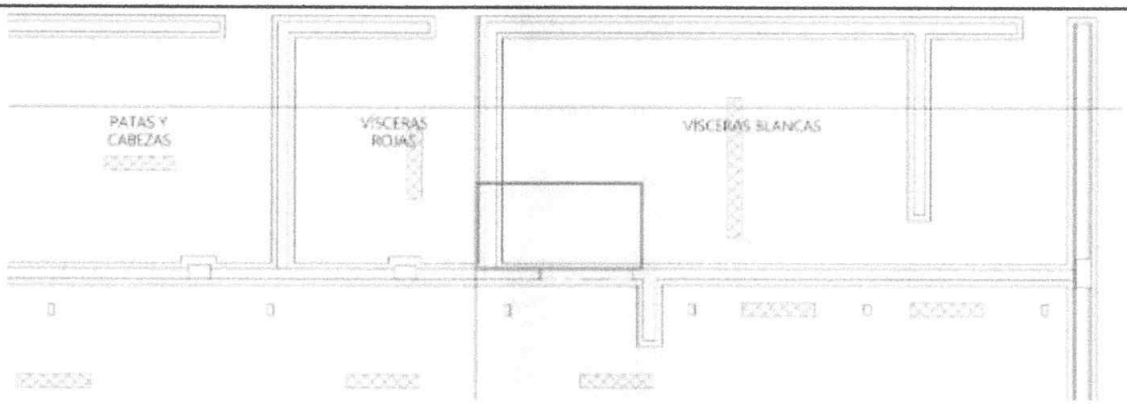

REGISTRO FOTOGRAFICO

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoria

Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LAVADOR DE PANZAS CONSTRUIDA EN ACERO INOX CAL. 18, INCLUYE DUCTO Y EXTRACTOR DE 14". DIMENSIONES: L: 2,10M A: 1,20 M, H: 0,50 M. LARGO DEL DUCTO: 5,0 M	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Visceras Blancas				1,00	1,00	1,00	1,00	
						0,00	1,00	
TOTAL							1,00	

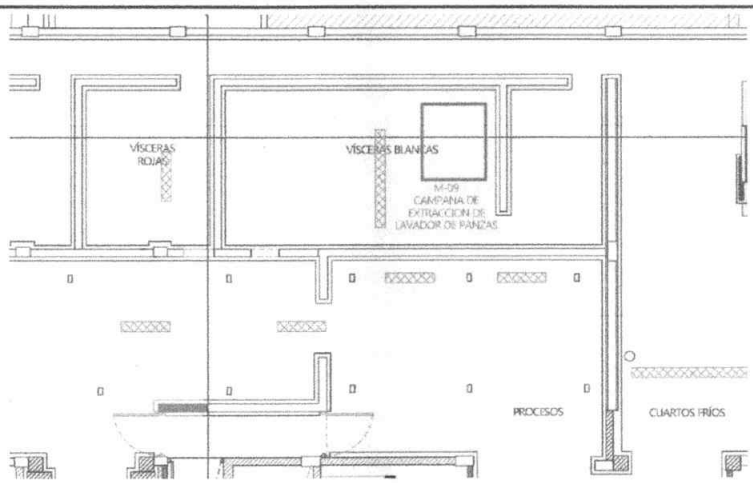

REGISTRO FOTOGRAFICO

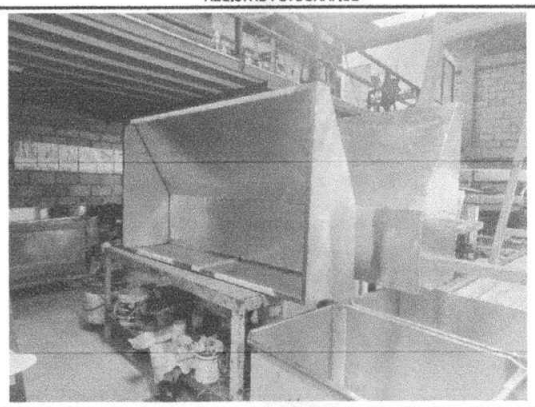

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA EVISCERACIÓN DE DOS NIVELES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, PARALES EN TUBERIA RED 6" SCH10 AISI 304, FLANCHE DE SUJECIÓN A PISO EN LAMINA 1/2 AISI 304, PLATAFORMA Y ESCALONES EN LAMINA DE ALFAJOR 1/8" AISI 304, MARCO DE ESCALERA CAL 16 AISI 304, BARANDAS EN TUBO DE 1 1/2 CAL 16 AISI 304 INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR DIMENSIONES: PLATAFORMA ALTA 1M ANCHO X 1M LARGO X 1,25M ALTO; PLATAFORMA BAJA 1M ANCHO X 1M LARGO X 0,60M ALTO	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Evisceración				1,00	1,00	1,00	1,00	
						0,00	1,00	
						0,00	1,00	
TOTAL							1,00	

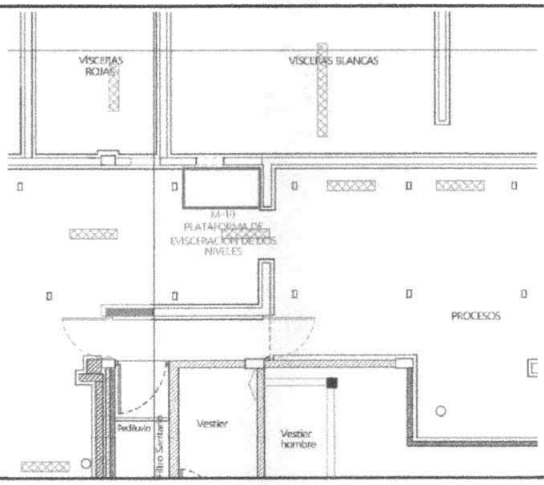

REGISTRO FOTOGRAFICO



Juan Sebastian Gomez C.

Juan Sebastian Gomez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra


Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría

Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE CARRO TIPO CUTTER PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.							UND
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Vísceras Blancas				1,00	1,00	1,00	1,00	
Vísceras Rojas				1,00	1,00	1,00	2,00	
Proceso				1,00	1,00	1,00	3,00	
Patas y cabezas				1,00	1,00	1,00	4,00	
TOTAL							4,00	

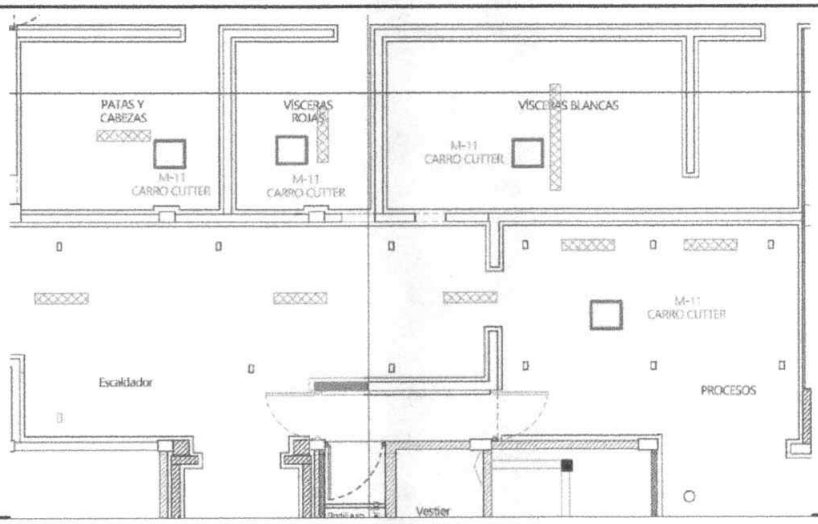

REGISTRO FOTOGRAFICO

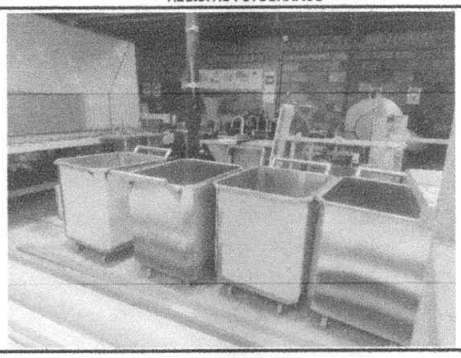

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría

Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVABOTAS EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS. INCLUYE MAGUERA Y CEPILLO PARA LAVADO	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Filtro sanitario				1,00	1,00	1,00	1,00	
						0,00	1,00	
						0,00	1,00	
TOTAL							1,00	

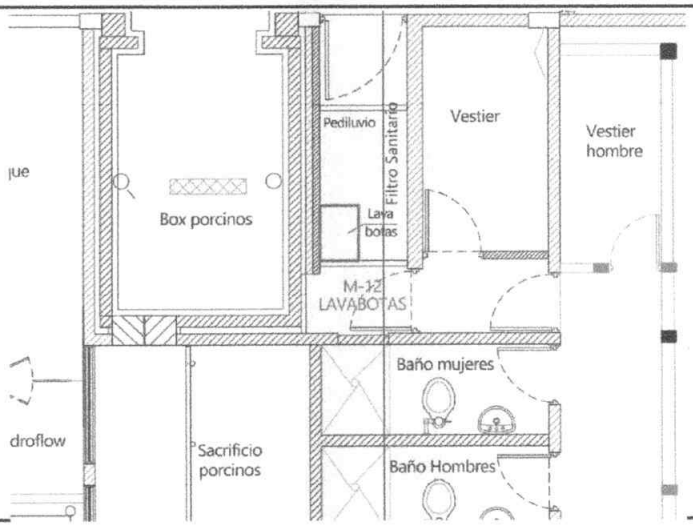

REGISTRO FOTOGRAFICO



Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTERILIZADOR DE SIERRA DE ESTERNÓN EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA CUADRADA , SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN. • CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304 • ESTRUCTURA EN TUBO CUAD 1"1/2 CAL 16 AISI 304 • FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH10 AISI 304 • NIVELADORES EN LAMINA ¼ AISI 304 CON ESPARRAGO AISI 304	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Sierra de esternon				1,00	1,00	1,00	1,00	
						0,00	1,00	
						0,00	1,00	
TOTAL							1,00	

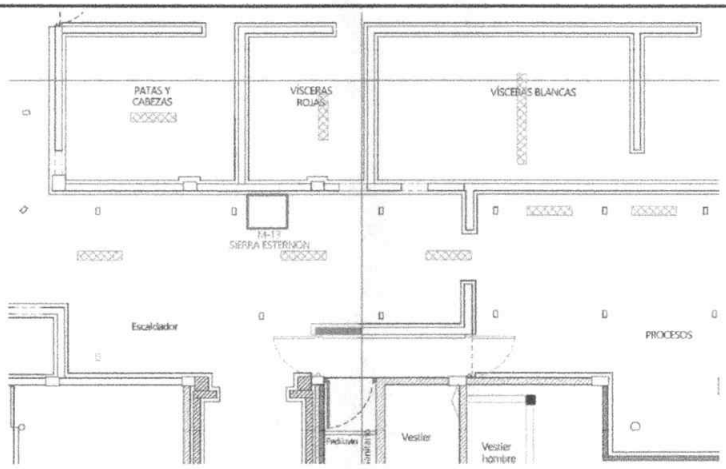

REGISTRO FOTOGRAFICO



Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría

Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA PARA RECIBO Y REPASO DE PORCINOS. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGUE TUBO RED 1" SCH 40 AISI 304, INCLUYE BANDEJA DE RECOLECCIÓN Y RODACHINAS DE 3". DIMENSION L: 2,20 M, A: 0,90 H: 0,90 M	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Box porcinos				1,00	1,00	1,00	1,00	
						0,00	1,00	
						0,00	1,00	
TOTAL							1,00	

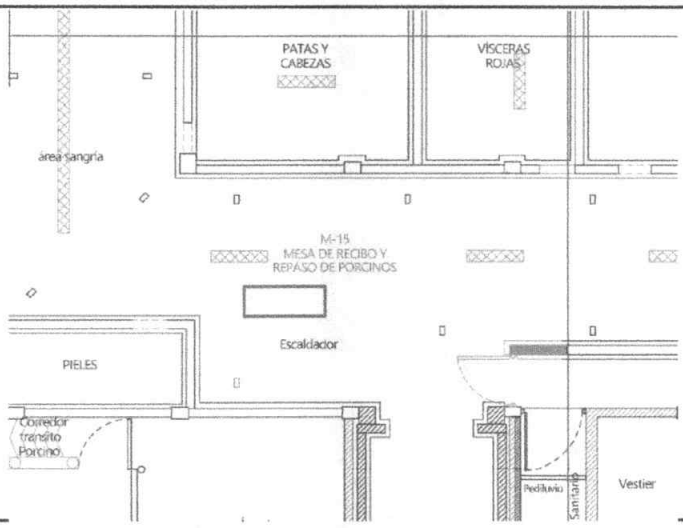

REGISTRO FOTOGRAFICO



Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE RECIPIENTE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CONSTRUÍDO EN ACERO INOX CAL. 14. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERÍA CUADRADA Y RODACHINAS DE 3". DIMENSIONES: L: 0,90M A: 0,70 M, H: 0,90 M	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Sangre				1,00	2,00	2,00	2,00	
						0,00	2,00	
TOTAL							2,00	

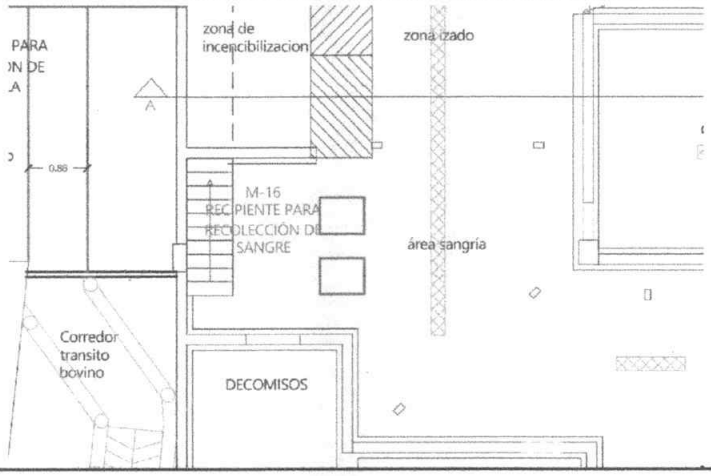

REGISTRO FOTOGRAFICO

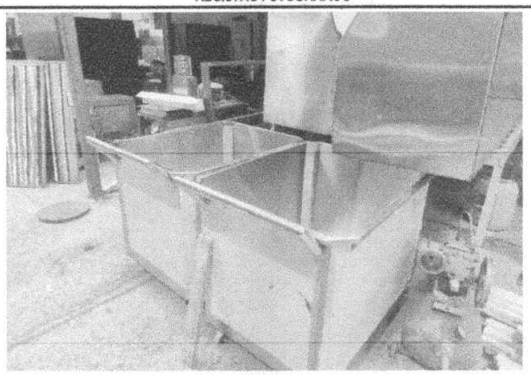

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO DIMENSIONES: 0,90M X 1,85M							UND
Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Duchas baños				1,00	2,00	2,00	2,00	
Cuarto adicional				1,00	1,00	1,00	3,00	
TOTAL							3,00	

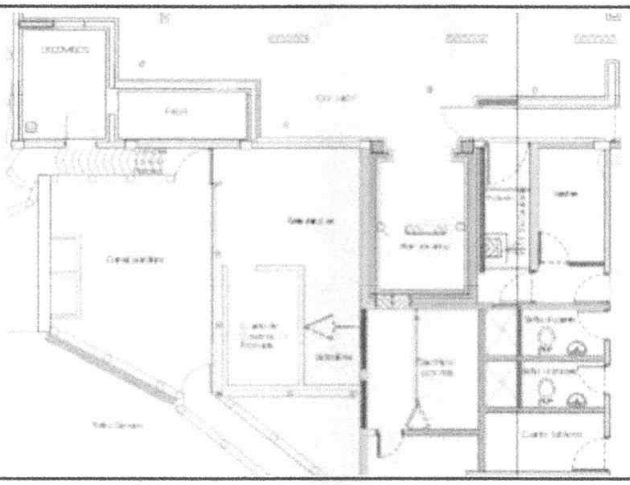

REGISTRO FOTOGRAFICO

Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría

Elaboró: Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria


Gobierno de CALDAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PRE ACTAS N°1

CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

M-33	**SUMINISTRO, TRANSPORTE GANCHOS PARA INSPECCIÓN DE VÍSCERAS ROJAS Y VÍSCERAS BLANCAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14 INCLUYE TUBERIA DE SOPORTE Y FIJACIÓN**	**UND**

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Visceras Rojas				1,00	9,00	9,00	9,00	
						0,00	9,00	
TOTAL							9,00	

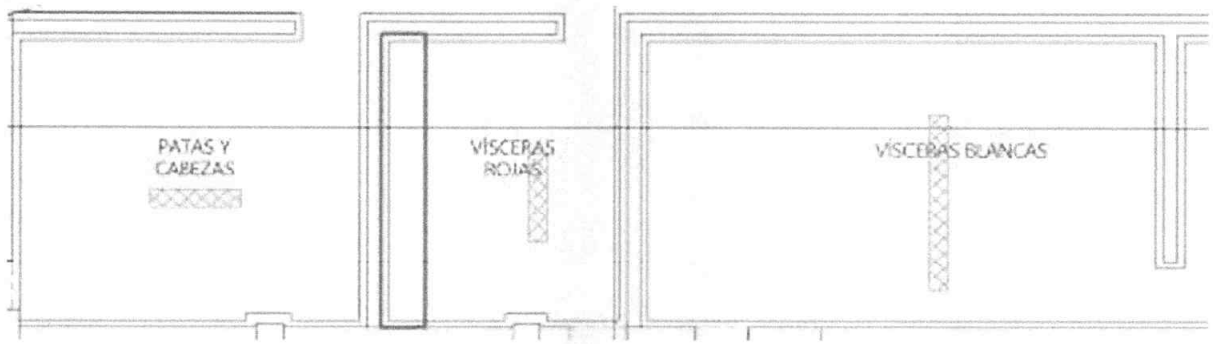

REGISTRO FOTOGRAFICO



Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría


Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PRE ACTAS N°1	


CONTRATO	205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DESOLLADORA DE RODILLO, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, RODILLO EN LAMINA DE 1/8 ACERO INOX, EJE DE 1 1/2 INOX, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA CUADRADA DE 4" ACERO INOX. MOTORREDUCTOR DE 5H, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y BOTONERA DE MANDO.	UND

Ubicación	Observaciones	Ancho	Largo	Avance	Unidad	Cant. Parcial	Cant. Acumulada	Cobro
Pieles	Desolladora			1,00	1,00	1,00	1,00	
						0,00	1,00	
						0,00	1,00	
TOTAL							1,00	

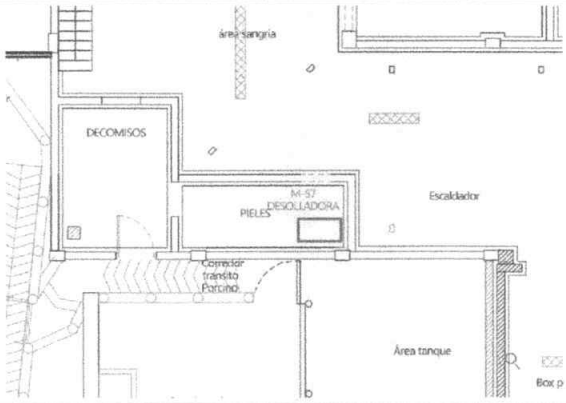

REGISTRO FOTOGRAFICO

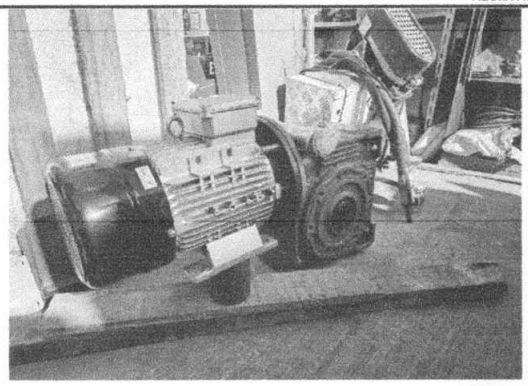



Juan Sebastián Gómez Castaño
Rep. Legal Fusión Ingeniería SAS
Contratista de Obra

Alexander Patiño Torres
Rep. Legal Consorcio Planta de Beneficio Palestina
Interventoría

Elaboró:Alejandro Uribe López-Auxiliar de residente de obra
Aprobó: Felipe Bucurú Patiño-Residente de Interventoria

Gobierno de CALDAS | Secretaría de PLANEACIÓN

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA




PROYECTO "PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE PALESTINA - CALDAS."

ACTA DE COBRO No. 1


LISTADO DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS


Equipo o herramienta	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Evidencias
Extintores de espuma	Un	0	$ 73.700	$ -	
Linternas	Un	0	$ 27.875	$ -	
Pitos	Un	0	$ 1.673	$ -	
Baterías de repuestos	Un	0	$ 13.289	$ -	
Camillas de emergencia polietileno 185x45 cm	Un	0	$ 189.550	$ -	
Megáfono	Un	0	$ 124.880	$ -	
Hachas	Un	0	$ 40.140	$ -	
Botiquín de primeros auxilios	Un	0	$ 72.475	$ -	
Líneas de vida	Un	1	$ 256.339	$ 256.339	
Total				**$ 256.339**	


KIT DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERAL

Equipo o herramienta	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
Casco	Unidad	6	$ 18.955	$ 113.730	   
Gafas	Unidad	20	$ 11.150	$ 223.000	
Tapón para oídos de silicona	Par	20	$ 10.600	$ 212.000	

Protector auditivo de Diadema para operador de la rana, operador del vibrador de concreto, operador de la regla vibratoria.	Par	2	$ 26.203	$ 52.405	
Guantes de seguridad	Par	20	$ 13.100	$ 262.000	
Guantes Impermeables	Par	1	$ 18.990	$ 18.990	
Chaleco reflectivo	Unidad	0	$ 24.600	$ -	
Botas punta y suela metálica	Par	0	$ 98.100	$ -	
Botas pantaneras	Par	0	$ 51.600	$ -	
Total				**$ 882.125**	

SEÑALIZACIÓN FUENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					
Elemento	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario Mes**	**Valor Total**	
Señalización con cinta de demarcación	ROLLO	2	$ 45.800	$ 91.600	  
Total				**$ 91.600**	

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA					
PROYECTO "PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE PALESTINA - CALDAS."					
ACTA DE COBRO No. 1					
COSTO MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES					
Elemento	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	
Residuos de demolición y construcción	m3	50,00	$ 3.750	$ 187.500	
Total				**$ 187.500**	

COSTO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OBRA					
Elemento	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario Mes**	**Valor Total**	
Cursos para personal de obra	Unidad	1	$ 100.000	$ 100.000	
Carteleras	Global	6	$ 80.000	$ 480.000	  
Total PGIO ACTA DE COBRO N°1				**$ 580.000**	
VALOR TOTAL PGIO PALESTINA				**$ 1.997.564**	
