Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
1		**COSTO DIRECTO**	**153 días**		**$ 8.059.390.079**	**5/01/26**	**30/07/26**
2		**0217-0074.2025.Multiple.LOS ALAMOS CM PRESUPUESTO EDS 37.5**	**82 días**		**$ 309.938.390**	**6/04/26**	**25/07/26**
3		0.GESTION DE OBRA	7 días		$ 18.378.998	6/04/26	14/04/26
4		1.PRELIMINARES	10 días	3	$ 50.533.226	14/04/26	27/04/26
5		2.ESTRUCTURA	10 días	4	$ 83.745.847	27/04/26	11/05/26
6		3.PINTURA	10 días	5FC+35 días	$ 20.018.269	30/06/26	11/07/26
7		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	6	$ 19.126.939	13/07/26	25/07/26
8		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	10 días	5	$ 14.322.637	11/05/26	25/05/26
9		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
10		99.Provision Ajustes	20 días	6CC	$ 17.817.862	30/06/26	25/07/26
11		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	3	$ 50.539.651	14/04/26	25/05/26
12		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	3	$ 35.454.961	14/04/26	25/05/26
13		**0293-0011.2026.Multiple.LA MERCED PRESUPUESTO EDS**	**80,5 días**		**$ 288.315.577**	**13/04/26**	**30/07/26**
14		0.GESTION DE OBRA	5 días		$ 16.590.373	13/04/26	17/04/26
15		1.PRELIMINARES	6 días	14	$ 49.011.509	18/04/26	25/04/26
16		2.ESTRUCTURA	10 días	15	$ 80.860.629	27/04/26	9/05/26
17		3.PINTURA	10 días	5FC+39 días	$ 19.242.434	4/07/26	16/07/26
18		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	17	$ 19.126.939	17/07/26	30/07/26
19		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	10 días	16	$ 1.114.014	11/05/26	23/05/26
20		6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	19CC+5 días	$ 1.164.935	16/05/26	29/05/26
21		99.Provision Ajustes	20 días	17CC	$ 16.574.801	4/07/26	30/07/26
22		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	14	$ 49.958.199	18/04/26	28/05/26
23		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	14	$ 34.671.744	18/04/26	28/05/26
24		**0294-0083.2025.Multiple.LA ISLA CM PRESUPUESTO EDS**	**69 días**		**$ 325.127.898**	**27/04/26**	**30/07/26**
25		0.GESTION DE OBRA	5 días		$ 24.971.173	27/04/26	4/05/26
26		1.PRELIMINARES	5 días	25	$ 63.392.898	4/05/26	9/05/26
27		2.ESTRUCTURA	10 días	26	$ 84.870.232	11/05/26	23/05/26
28		3.PINTURA	10 días	27FC+29 días	$ 20.331.629	3/07/26	16/07/26
29		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	28	$ 19.126.939	16/07/26	30/07/26
30		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	5 días	27CC+5 días	$ 609.718	16/05/26	23/05/26
31		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
32		99.Provision Ajustes	20 días	28CC	$ 18.691.083	3/07/26	30/07/26
33		ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	25	$ 54.410.978	4/05/26	29/05/26
34		ITEMS NO PREVISTOS	20 días	25	$ 38.723.248	4/05/26	29/05/26
35		~~0221-0016.2026.Multiple.CALIMA-PRESUPUESTO EDS~~	~~108,5 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~29/05/26~~
46		~~0503-0004.2026.Infantiles.GUAYACANE II PRESUPUESTO EDS~~	~~30 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~12/02/26~~
57		~~0503-0004.2026.Multiple.GUAYACANES II PRESUPUESTO EDS~~	~~30 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~12/02/26~~
68		~~0597-0032.2025.Infantiles.LOS ALMENDROS PRESUPUESTO EDS~~	~~153 días~~		~~$ 158.728.950~~	~~5/01/26~~	~~30/07/26~~
79		~~0610-0184.2026.Infantiles.CIUDADELA-FLORALIA-MULLER PRESUPUESTO EDS~~	~~30 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~12/02/26~~
90		~~0610-0184.2026.Multiple.CIUDADELA-FLORALIA-MULLER PRESUPUESTO EDS~~	~~30 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~12/02/26~~
101		**0697-0072.2025.Multiple.CALIMIO NORTE CM PRESUPUESTO EDS**	**76 días**		**$ 245.932.677**	**13/04/26**	**24/07/26**
102		0.GESTION DE OBRA	5 días		$ 15.586.172	13/04/26	17/04/26
103		1.PRELIMINARES	6 días	102	$ 39.692.338	18/04/26	25/04/26
104		2.ESTRUCTURA	5 días	103	$ 64.813.013	27/04/26	4/05/26
105		3.PINTURA	10 días	104FC+40 días	$ 14.879.174	27/06/26	10/07/26
106		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	105	$ 19.126.939	11/07/26	24/07/26
107		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	5 días	108	$ 3.592.614	11/05/26	15/05/26
108		6.CAMPO DE INFILTRACION	5 días	104	$ 1.681.290	4/05/26	9/05/26
109		~~7.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
110		99.Provision Ajustes	20 días	105CC	$ 14.138.276	27/06/26	24/07/26
111		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	102	$ 46.836.243	18/04/26	28/05/26
112		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	102	$ 25.586.618	18/04/26	28/05/26
113		**0707-0027.2026.Infantiles. SIETE DE AGOSTO PRESUPUESTO EDS**	**120 días**		**$ 138.779.336**	**11/02/26**	**24/07/26**
114		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 9.868.906	11/02/26	23/02/26
115		1.PRELIMINARES	10 días	114	$ 13.667.021	24/02/26	7/03/26
116		2.ESTRUCTURA	10 días	115	$ 25.926.650	9/03/26	20/03/26
117		3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	118	$ 34.269.414	11/07/26	24/07/26
118		4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	116FC+70 días	$ 37.373.882	27/06/26	10/07/26
119		5.DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACIÓI	10 días	116	$ 40.482	20/03/26	7/04/26
120		6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	119CC+5 días	$ 664.039	28/03/26	13/04/26
121		99.Provision Ajustes	20 días	118CC	$ 7.973.895	27/06/26	24/07/26
122		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	114	$ 5.636.184	24/02/26	7/04/26
123		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	114	$ 3.358.863	24/02/26	7/04/26
124		**0707-0027.2026.Multiple. SIETE DE AGOSTO PRESUPUESTO EDS**	**125 días**		**$ 328.713.777**	**9/02/26**	**29/07/26**
125		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 17.206.632	9/02/26	20/02/26
126		1.PRELIMINARES	10 días	125CC+5 días	$ 52.447.640	14/02/26	26/02/26




CONSORCIO CALI DEPORTES

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
127		2.ESTRUCTURA	10 días	126	$ 109.266.582	27/02/26	11/03/26
128		3.PINTURA	10 días	127FC+80 días	$ 22.637.090	2/07/26	15/07/26
129		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	128	$ 19.126.939	15/07/26	29/07/26
130		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	10 días	127	$ 797.082	12/03/26	25/03/26
131		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
132		99.Provision Ajustes	20 días	128CC	$ 19.481.141	2/07/26	29/07/26
133		ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	126	$ 57.048.267	27/02/26	25/03/26
134		ITEMS NO PREVISTOS	20 días	126	$ 30.702.404	27/02/26	25/03/26
135		**0915-0022.2026.Multiple.JUNIN CM PRESUPUESTO EDS**	**145 días**		**$ 290.871.767**	**5/01/26**	**21/07/26**
136		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 18.931.598	17/03/26	30/03/26
137		1.PRELIMINARES	10 días	136CC+5 días	$ 39.543.575	24/03/26	8/04/26
138		2.ESTRUCTURA	10 días	137	$ 86.567.462	9/04/26	21/04/26
139		3.PINTURA	10 días	138FC+45 días	$ 20.807.071	23/06/26	7/07/26
140		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	139	$ 19.126.939	7/07/26	21/07/26
141		~~5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
142		6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	141CC+5 días	$ 1.209.740	5/01/26	17/01/26
143		99.Provision Ajustes	20 días	139CC	$ 16.721.753	23/06/26	21/07/26
144		ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	137	$ 50.438.912	9/04/26	5/05/26
145		ITEMS NO PREVISTOS	20 días	137	$ 37.524.717	9/04/26	5/05/26
146		**1207-0151.2026.Multiple.NUEVA FLORESTA C.M PRESUPUESTO EDS**	**120 días**		**$ 251.603.670**	**17/02/26**	**30/07/26**
147		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 14.703.531	17/02/26	28/02/26
148		1.PRELIMINARES	10 días	147CC+5 días	$ 41.593.653	23/02/26	6/03/26
149		2.ESTRUCTURA	10 días	148	$ 68.047.457	7/03/26	19/03/26
150		3.PINTURA	10 días	149FC+75 días	$ 15.766.953	4/07/26	16/07/26
151		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	150	$ 19.126.939	17/07/26	30/07/26
152		5.CAÑUELA EN CONCRETO DRENAJE (	10 días	149	$ 11.149.198	20/03/26	6/04/26
153		6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	152CC+5 días	$ 2.031.277	27/03/26	13/04/26
154		99.Provision Ajustes	20 días	150CC	$ 14.459.985	4/07/26	30/07/26
155		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	147	$ 35.764.106	2/03/26	13/04/26
156		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	147	$ 28.960.571	2/03/26	13/04/26
157		**1301-0015.2025.Multiple.ULPIANO LLOREDA PRESUPUESTO EDS**	**115 días**		**$ 304.893.876**	**23/02/26**	**30/07/26**
158		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 14.152.358	23/02/26	6/03/26
159		1.PRELIMINARES	10 días	158CC+5 días	$ 41.066.499	28/02/26	12/03/26
160		2.ESTRUCTURA	10 días	159	$ 90.777.565	13/03/26	26/03/26
161		3.PINTURA	10 días	160FC+70 días	$ 18.395.283	3/07/26	16/07/26
162		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	161	$ 19.126.939	16/07/26	30/07/26
163		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	10 días	160	$ 10.127.441	27/03/26	11/04/26
164		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
165		7.PANTALLAS DE PROTECCIÓN CANCI	10 días	160CC+5 días	$ 2.397.859	19/03/26	6/04/26
166		99.Provision Ajustes	20 días	161CC	$ 17.527.861	3/07/26	30/07/26
167		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	158	$ 48.362.623	6/03/26	17/04/26
168		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	158	$ 42.959.448	6/03/26	17/04/26
169		**1303-0052.2025.Multiple.POBLADO I PRESUPUESTO EDS**	**44 días**		**$ 296.847.828**	**1/06/26**	**30/07/26**
170		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 19.770.159	1/06/26	13/06/26
171		1.PRELIMINARES	10 días	170CC+5 días	$ 49.892.171	6/06/26	22/06/26
172		2.ESTRUCTURA	10 días	171	$ 98.400.748	22/06/26	6/07/26
173		3.PINTURA	9 días	174	$ 19.501.766	18/07/26	30/07/26
174		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	172	$ 19.126.939	6/07/26	17/07/26
175		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	10 días	172CC	$ 1.872.587	22/06/26	6/07/26
176		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
177		~~7.TRATAMIENTO DE RAICES~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
178		99.Provision Ajustes	19 días	174CC	$ 17.065.307	6/07/26	30/07/26
179		ITEMS COMPLEMENTARIOS	15 días	170	$ 27.909.090	16/06/26	6/07/26
180		ITEMS NO PREVISTOS	15 días	170	$ 43.309.061	16/06/26	6/07/26
181		**1397-0006.2025.Sintetica.PPTO CANCHA SINTETICA PRESUPUESTO EDS**	**96 días**		**$ 1.070.715.746**	**19/03/26**	**30/07/26**
182		0.GESTION DE OBRA	30 días		$ 68.162.149	19/03/26	30/04/26
183		1.PRELIMINARES	30 días	182CC+5 días	$ 91.349.556	26/03/26	7/05/26
184		2.BASE DE CANCHA SINTETICA	35 días	183CC+5 días	$ 112.237.220	6/04/26	21/05/26
185		3.ATRAQUES BORDILLO	30 días	187CC+5 días	$ 1.985.667	17/04/26	28/05/26
186		4.REPOSICIONES	46 días	185	$ 247.861.306	28/05/26	30/07/26
187		5.DRENAJES	30 días	184CC+5 días	$ 110.518.128	11/04/26	21/05/26
188		7.ILUMINACION	35 días	186CC	$ 53.991.348	28/05/26	15/07/26
189		99.Provision Ajustes	45 días	186CC	$ 209.411.079	28/05/26	29/07/26
190		ITEMS COMPLEMENTARIOS	65 días	183CC	$ 61.881.677	26/03/26	25/06/26
191		ITEMS NO PREVISTOS	40 días	183CC	$ 113.317.616	26/03/26	21/05/26
192		**1401-0051.2026.Infantiles.PARQUE RECREATIVO CANDELARIA PRESUPUESTO EDS**	**115 días**		**$ 141.523.697**	**19/02/26**	**27/07/26**
193		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 10.701.742	19/02/26	3/03/26
194		1.PRELIMINARES	10 días	193CC+5 días	$ 15.240.652	25/02/26	10/03/26
195		2.ESTRUCTURA	10 días	194	$ 20.360.005	10/03/26	24/03/26
196		3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	197	$ 34.516.550	14/07/26	27/07/26




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
197		4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	195FC+70 días	$ 39.332.803	1/07/26	13/07/26
198		5.DRENAJES	10 días	195	$ 320.340	24/03/26	8/04/26
199		6.RED SANITARIA	10 días	198CC+5 días	$ 896.850	31/03/26	15/04/26
200		~~7.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
201		99.Provision Ajustes	20 días	197CC	$ 8.131.664	1/07/26	27/07/26
202		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	193	$ 7.433.738	4/03/26	15/04/26
203		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	193	$ 4.589.353	4/03/26	15/04/26
204		**1406-0176.2026.Infantiles.MARROQUI I PRESUPUESTO EDS**	**100 días**		**$ 163.098.095**	**11/03/26**	**28/07/26**
205		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 15.380.069	11/03/26	24/03/26
206		1.PRELIMINARES	10 días	205CC+5 días	$ 15.403.364	17/03/26	31/03/26
207		2.ESTRUCTURA	10 días	206	$ 20.242.904	31/03/26	15/04/26
208		3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	209	$ 34.269.414	14/07/26	28/07/26
209		4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	207FC+55 días	$ 39.332.803	1/07/26	14/07/26
210		5.DRENAJES	10 días	207	$ 758.360	16/04/26	28/04/26
211		6.RED SANITARIA	10 días	210CC	$ 1.001.000	16/04/26	28/04/26
212		~~7.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
213		8.ANDENES	10 días	210CC+5 días	$ 863.904	22/04/26	6/05/26
214		99.Provision Ajustes	20 días	209CC	$ 9.371.941	1/07/26	28/07/26
215		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	205	$ 12.571.029	25/03/26	6/05/26
216		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	205	$ 13.903.307	25/03/26	6/05/26
217		**1498-0189.2026.Infantiles.PUERTAS DEL SOL V PRESUPUESTO EDS**	**149,5 días**		**$ 147.543.552**	**5/01/26**	**27/07/26**
218		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 10.695.146	25/02/26	9/03/26
219		1.PRELIMINARES	10 días	218CC+5 días	$ 17.093.985	3/03/26	16/03/26
220		2.ESTRUCTURA	10 días	219	$ 20.486.567	16/03/26	30/03/26
221		3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	222	$ 34.516.550	13/07/26	27/07/26
222		4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	220FC+65 días	$ 39.332.803	30/06/26	13/07/26
223		5.DRENAJES	10 días	220CC+5 días	$ 1.574.870	24/03/26	8/04/26
224		6.RED SANITARIA Y CAMPO DE INFILT	10 días	223CC+5 días	$ 1.963.274	30/03/26	14/04/26
225		7.ATRAQUES BORDILLO	0 días		$ 0	5/01/26	5/01/26
226		99.Provision Ajustes	20 días	222CC	$ 8.477.735	30/06/26	27/07/26
227		ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	218	$ 11.175.576	10/03/26	14/04/26
228		ITEMS NO PREVISTOS	25 días	218	$ 2.227.046	10/03/26	14/04/26
229		**1504-0059.2025.Infantiles.EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA PRESUPUESTO EDS**	**127 días**		**$ 154.836.369**	**3/02/26**	**15/07/26**
230		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 11.250.970	3/02/26	14/02/26
231		1.PRELIMINARES	10 días	230CC+7 días	$ 14.908.261	11/02/26	24/02/26
232		2.ESTRUCTURA	10 días	231	$ 14.959.288	24/02/26	9/03/26
233		3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	234	$ 34.640.117	13/07/26	25/07/26
234		4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	232FC+80 días	$ 37.373.882	30/06/26	11/07/26
235		5.DRENAJES-FILTRO FRANCÉS	10 días	232	$ 321.610	9/03/26	20/03/26
236		6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	235	$ 6.343.230	21/03/26	7/04/26
237		99.Provision Ajustes	20 días	234CC	$ 8.187.040	30/06/26	25/07/26
238		ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	230	$ 33.875.167	16/02/26	18/03/26
239		ITEMS NO PREVISTOS	25 días	230	$ 2.976.804	16/02/26	18/03/26
240		**1504-0059.2025.Multiple.EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA PRESUPUESTO EDS**	**136 días**		**$ 287.960.834**	**26/01/26**	**29/07/26**
241		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 17.062.864	26/01/26	6/02/26
242		1.PRELIMINARES	10 días	241CC+6 días	$ 35.178.214	2/02/26	13/02/26
243		2.ESTRUCTURA	10 días	242	$ 95.034.895	14/02/26	26/02/26
244		3.PINTURA	10 días	243FC+90 días	$ 19.363.456	2/07/26	15/07/26
245		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	244	$ 19.126.939	15/07/26	29/07/26
246		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	10 días	243	$ 805.018	27/02/26	11/03/26
247		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
248		99.Provision Ajustes	20 días	244CC	$ 17.066.162	2/07/26	29/07/26
249		ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	241	$ 55.916.318	6/02/26	10/03/26
250		ITEMS NO PREVISTOS	25 días	241	$ 28.406.968	6/02/26	10/03/26
251		**1504-0114.2026.Infantiles.EL VALLADO PRESUPUESTO EDS**	**105 días**		**$ 144.590.463**	**3/03/26**	**15/07/26**
252		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 14.400.466	3/03/26	14/03/26
253		1.PRELIMINARES	10 días	252CC+5 días	$ 13.336.383	9/03/26	20/03/26
254		2.ESTRUCTURA	10 días	253	$ 20.003.188	21/03/26	7/04/26
255		3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	256	$ 34.269.414	13/07/26	25/07/26
256		4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	254FC+60 días	$ 43.378.693	30/06/26	11/07/26
257		5.DRENAJES	10 días	254	$ 335.969	8/04/26	20/04/26
258		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
259		99.Provision Ajustes	20 días	256CC	$ 8.307.967	30/06/26	25/07/26
260		ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	252	$ 6.045.079	16/03/26	20/04/26
261		ITEMS NO PREVISTOS	25 días	252	$ 4.513.304	16/03/26	20/04/26
262		**1598-0001.2026.Multiple.COMUNERO I EL FARO CM PRESUPUESTO EDS**	**105 días**		**$ 296.735.176**	**5/03/26**	**28/07/26**
263		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 16.358.561	5/03/26	17/03/26
264		1.PRELIMINARES	10 días	263CC+5 días	$ 49.745.961	11/03/26	25/03/26
265		2.ESTRUCTURA	10 días	264	$ 79.338.685	25/03/26	9/04/26
266		3.PINTURA	10 días	267	$ 16.830.097	15/07/26	28/07/26
267		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	265FC+60 días	$ 19.126.939	2/07/26	14/07/26

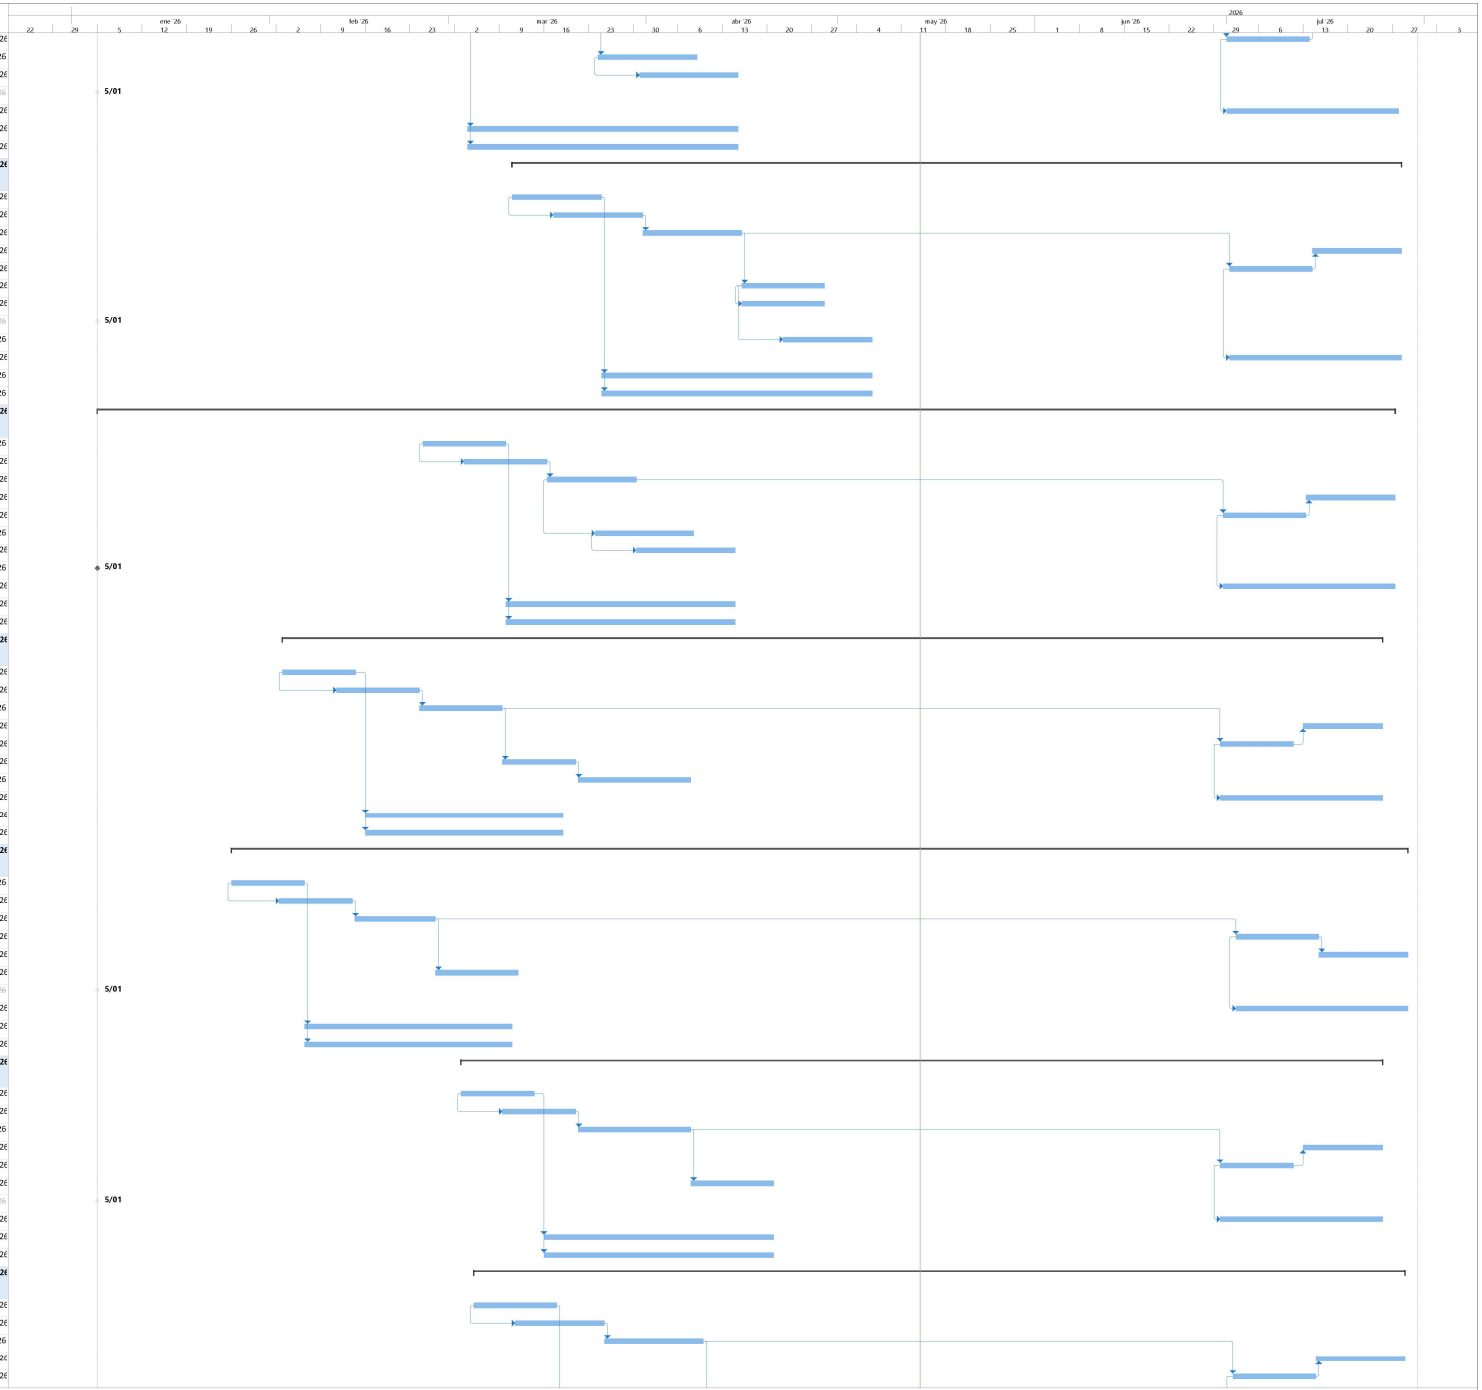

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
268		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	10 días	265	$ 3.729.989	10/04/26	22/04/26
269		6.CAMPO DE INFILTRACION	10 días	268CC+5 días	$ 2.157.508	16/04/26	29/04/26
270		~~7.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
271		99.Provision Ajustes	20 días	267CC	$ 17.058.831	2/07/26	28/07/26
272		ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	263	$ 52.910.837	18/03/26	22/04/26
273		ITEMS NO PREVISTOS	25 días	263	$ 37.477.768	18/03/26	22/04/26
274		**1598-0113.2025.Infantiles.MOJICA LAS GEMELAS PRESUPUESTO EDS**	**100 días**		**$ 156.591.695**	**9/03/26**	**24/07/26**
275		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 11.447.466	9/03/26	20/03/26
276		1.PRELIMINARES	10 días	275CC+5 días	$ 15.822.858	14/03/26	27/03/26
277		2.ESTRUCTURA	10 días	276	$ 20.381.569	28/03/26	13/04/26
278		3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	279	$ 34.516.550	11/07/26	24/07/26
279		4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	277FC+55 días	$ 43.985.863	27/06/26	10/07/26
280		5.DRENAJES	10 días	277CC+5 días	$ 294.145	7/04/26	20/04/26
281		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
282		99.Provision Ajustes	20 días	279CC	$ 8.347.285	27/06/26	24/07/26
283		ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	275	$ 16.458.836	20/03/26	20/04/26
284		ITEMS NO PREVISTOS	20 días	275	$ 5.337.123	20/03/26	20/04/26
285		**1599-0018.2026.Infantiles.BAJO CIUDAD CORDOBA 1 PRESUPUESTO EDS**	**125 días**		**$ 142.580.695**	**5/02/26**	**25/07/26**
286		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 10.780.928	5/02/26	17/02/26
287		1.PRELIMINARES	10 días	286CC+5 días	$ 13.571.807	11/02/26	24/02/26
288		2.ESTRUCTURA	10 días	287	$ 20.064.645	24/02/26	9/03/26
289		3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	290	$ 34.269.414	13/07/26	25/07/26
290		4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	288FC+80 días	$ 43.378.693	30/06/26	11/07/26
291		5.DRENAJES	10 días	288	$ 674.749	9/03/26	20/03/26
292		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
293		99.Provision Ajustes	20 días	290CC	$ 8.188.121	30/06/26	25/07/26
294		ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	286	$ 6.736.120	18/02/26	20/03/26
295		ITEMS NO PREVISTOS	25 días	286	$ 4.916.218	18/02/26	20/03/26
296		**1697-0023.2026.Infantiles.CIUDAD 2000 PRESUPUESTO EDS**	**87 días**		**$ 86.568.369**	**27/03/26**	**27/07/26**
297		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 4.836.951	27/03/26	11/04/26
298		1.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	299FC+60 días	$ 37.373.882	13/07/26	27/07/26
299		2.DRENAJES	10 días	297CC+7 días	$ 2.397.755	8/04/26	21/04/26
300		~~3.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
301		99.Provision Ajustes	10 días	298CC	$ 4.972.370	13/07/26	27/07/26
302		ITEMS COMPLEMENTARIOS	15 días	297	$ 33.287.890	13/04/26	30/04/26
303		ITEMS NO PREVISTOS	15 días	297	$ 3.699.521	13/04/26	30/04/26
304		**1778-0004.2026.Multiple.SANTA ANITA C.M PRESUPUESTO EDS**	**141 días**		**$ 255.953.080**	**15/01/26**	**24/07/26**
305		1.PRELIMINARES	11 días	312CC+5 días	$ 32.254.123	21/01/26	4/02/26
306		2.ESTRUCTURA	10 días	305	$ 78.410.445	4/02/26	17/02/26
307		3.PINTURA	10 días	308	$ 15.553.004	11/07/26	24/07/26
308		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	306FC+95 días	$ 19.126.939	27/06/26	10/07/26
309		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	10 días	306	$ 1.256.230	17/02/26	2/03/26
310		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
311		7.OBRAS DE TRATAMIENTO AMBIENT	10 días	306CC	$ 6.926.990	4/02/26	17/02/26
312		8.GESTION DE OBRA	10 días		$ 15.117.403	15/01/26	27/01/26
313		99.Provision Ajustes	20 días	308CC	$ 14.714.333	27/06/26	24/07/26
314		ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	312	$ 44.864.340	28/01/26	27/02/26
315		ITEMS NO PREVISTOS	25 días	312	$ 27.729.273	28/01/26	27/02/26
316		**1783-0024.2026.Multiple.CIUDAD CAPRI C.M PRESUPUESTO EDS**	**137 días**		**$ 294.466.223**	**22/01/26**	**27/07/26**
317		1.PRELIMINARES	10 días	325CC+5 días	$ 35.230.337	28/01/26	10/02/26
318		2.ESTRUCTURA	12 días	317FC+10 días	$ 18.826.756	23/02/26	10/03/26
319		3.PINTURA	10 días	320	$ 18.438.505	14/07/26	27/07/26
320		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	318FC+80 días	$ 19.126.939	1/07/26	13/07/26
321		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJI	10 días	318	$ 1.865.675	10/03/26	24/03/26
322		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
323		7.ANDENES (CUANDO APLIQUE)	10 días	321CC+5 días	$ 863.904	17/03/26	30/03/26
324		8.OBRAS DE TRATAMIENTO AMBIENT	10 días	317CC	$ 4.228.181	28/01/26	10/02/26
325		9.GESTION DE OBRA	10 días		$ 16.915.277	22/01/26	3/02/26
326		99.Provision Ajustes	20 días	320CC	$ 16.928.392	1/07/26	27/07/26
327		ITEMS COMPLEMENTARIOS	40 días	325	$ 121.421.192	4/02/26	27/03/26
328		ITEMS NO PREVISTOS	40 días	325	$ 40.621.065	4/02/26	27/03/26
329		**1791-0003.2026.Multiple.LA PLAYA C.M PRESUPUESTO EDS**	**85 días**		**$ 329.225.060**	**30/03/26**	**25/07/26**
330		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 22.272.934	30/03/26	14/04/26
331		1.PRELIMINARES	10 días	330CC+5 días	$ 41.308.723	8/04/26	20/04/26
332		2.ESTRUCTURA	10 días	331	$ 19.701.724	21/04/26	4/05/26
333		3.PINTURA	10 días	334	$ 20.305.696	13/07/26	25/07/26
334		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	332FC+40 días	$ 19.126.939	30/06/26	11/07/26
335		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	332	$ 2.632.710	5/05/26	16/05/26
336		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
337		7.ANDENES	10 días	335CC+5 días	$ 647.928	11/05/26	25/05/26

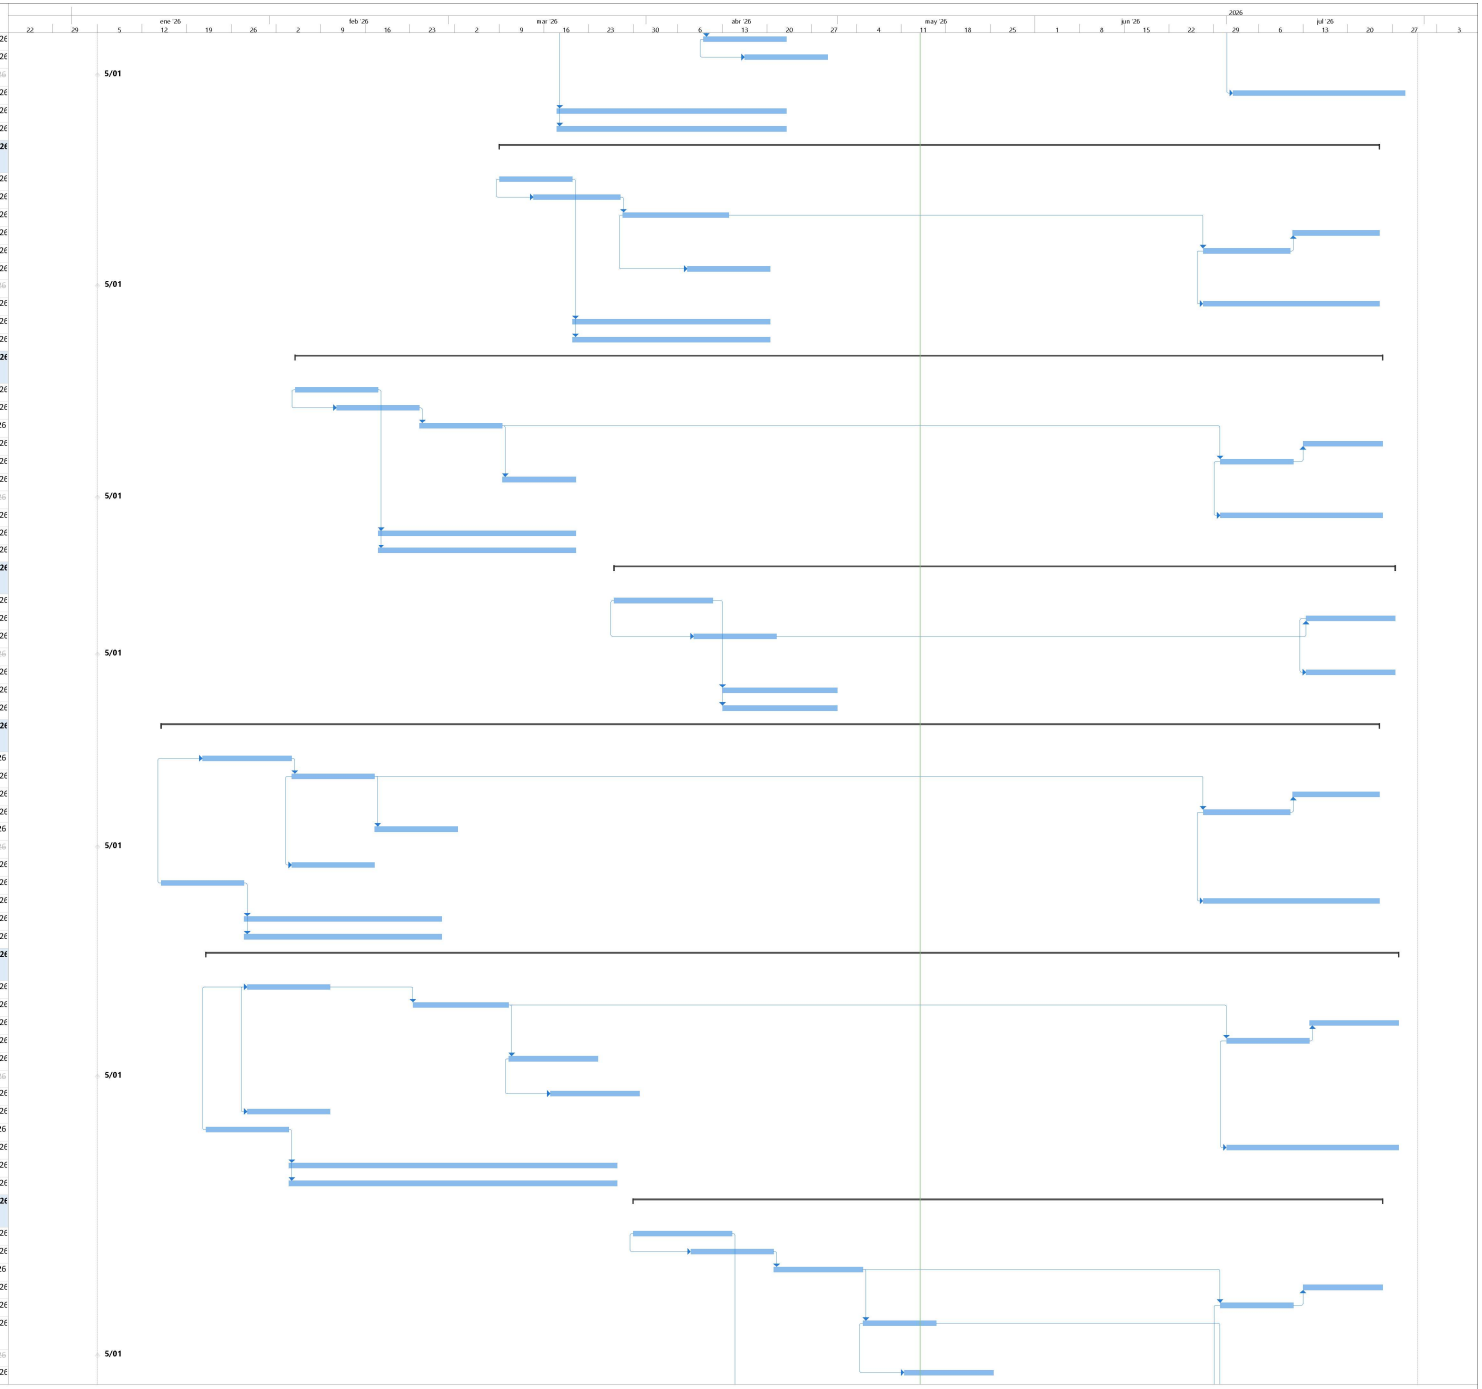


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
338		99.Provision Ajustes	20 días	334CC	$ 18.926.622	30/06/26	25/07/26
339		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	330	$ 125.036.680	14/04/26	25/05/26
340		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	330	$ 59.265.104	14/04/26	25/05/26
341		**1811-0004.2026.Infantiles.LOURDES PRESUPUESTO EDS**	**135 días**		**$ 139.139.326**	**28/01/26**	**30/07/26**
342		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 13.129.490	28/01/26	9/02/26
343		1.PRELIMINARES	10 días	342CC+5 días	$ 13.189.117	3/02/26	16/02/26
344		2.ESTRUCTURA	10 días	343	$ 20.626.163	16/02/26	27/02/26
345		3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	346	$ 34.640.117	16/07/26	30/07/26
346		4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	344FC+90 días	$ 37.373.882	3/07/26	16/07/26
347		5.DRENAJES	10 días	344CC+5 días	$ 1.583.257	23/02/26	6/03/26
348		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
349		99.Provision Ajustes	20 días	346CC	$ 7.994.590	3/07/26	30/07/26
350		ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	342	$ 7.667.961	10/02/26	12/03/26
351		ITEMS NO PREVISTOS	25 días	342	$ 2.934.749	10/02/26	12/03/26
352		**1811-0004.2026.Multiple.LOURDES PRESUPUESTO EDS**	**149 días**		**$ 371.137.406**	**5/01/26**	**15/07/26**
353		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 19.997.786	5/01/26	17/01/26
354		1.PRELIMINARES	10 días	353CC+7 días	$ 90.841.786	14/01/26	27/01/26
355		2.ESTRUCTURA	10 días	354CC+7 días	$ 82.128.927	23/01/26	4/02/26
356		3.PINTURA	10 días	357	$ 19.586.049	13/07/26	25/07/26
357		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	335FC+30 días	$ 19.126.939	30/06/26	11/07/26
358		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJ	10 días	355CC+7 días	$ 3.562.298	2/02/26	13/02/26
359		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
360		99.Provision Ajustes	20 días	357CC	$ 21.336.096	30/06/26	25/07/26
361		ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	353	$ 84.277.479	19/01/26	12/02/26
362		ITEMS NO PREVISTOS	20 días	353	$ 30.280.046	19/01/26	12/02/26
363		**1922-0014.2026.Multiple.LA CAROLINA CM PRESUPUESTO EDS**	**142 días**		**$ 355.551.942**	**20/01/26**	**30/07/26**
364		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 22.272.934	20/01/26	31/01/26
365		1.PRELIMINARES	10 días	364CC+5 días	$ 57.305.371	26/01/26	6/02/26
366		2.ESTRUCTURA	8 días	365FC+9 días	$ 74.391.526	19/02/26	28/02/26
367		3.PINTURA	10 días	368	$ 16.856.580	17/07/26	30/07/26
368		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	366FC+90 días	$ 19.126.939	4/07/26	16/07/26
369		5.CUNETA EN CONCRETO (DRENAJES	8 días	366CC+5 días	$ 3.095.957	25/02/26	6/03/26
370		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
371		99.Provision Ajustes	20 días	368CC	$ 20.433.064	4/07/26	30/07/26
372		ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	364	$ 86.421.680	2/02/26	4/03/26
373		ITEMS NO PREVISTOS	25 días	364	$ 55.647.891	2/02/26	4/03/26
374		**2002-0000.2026.Infantiles.BELISARIO PRESUPUESTO EDS**	**87 días**		**$ 134.800.115**	**24/03/26**	**22/07/26**
375		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 4.410.377	24/03/26	8/04/26
376		1.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES +	10 días	377FC+60 días	$ 33.481.323	9/07/26	22/07/26
377		2.DRENAJES	10 días	375CC+7 días	$ 8.024.224	1/04/26	16/04/26
378		~~3.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
379		99.Provision Ajustes	10 días	376CC	$ 7.745.136	9/07/26	22/07/26
380		ITEMS COMPLEMENTARIOS	10 días	375	$ 74.676.571	8/04/26	21/04/26
381		ITEMS NO PREVISTOS	10 días	375	$ 6.462.484	8/04/26	21/04/26
382		**2002-0000.2026.Multiple.BELISARIO PRESUPUESTO EDS**	**147 días**		**$ 299.300.096**	**13/01/26**	**30/07/26**
383		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 16.311.911	13/01/26	24/01/26
384		1.PRELIMINARES	10 días	383CC+5 días	$ 39.792.597	19/01/26	30/01/26
385		2.ESTRUCTURA	10 días	384FC+12 días	$ 81.480.923	16/02/26	27/02/26
386		3.PINTURA	10 días	387	$ 18.438.505	16/07/26	30/07/26
387		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	385FC+90 días	$ 19.126.939	3/07/26	16/07/26
388		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJ	10 días	385	$ 4.162.110	28/02/26	12/03/26
389		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
390		99.Provision Ajustes	20 días	387CC	$ 17.206.284	3/07/26	30/07/26
391		ITEMS COMPLEMENTARIOS	35 días	383	$ 69.826.606	26/01/26	10/03/26
392		ITEMS NO PREVISTOS	35 días	383	$ 32.954.221	26/01/26	10/03/26
393		**2003-0197.2026.Multiple.LA ESTRELLA SILOE-PREPLIEGOS**	**90 días**		**$ 306.047.344**	**25/03/26**	**28/07/26**
394		0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 16.090.621	25/03/26	9/04/26
395		1.PRELIMINARES	10 días	394CC+5 días	$ 54.709.636	31/03/26	15/04/26
396		2.ESTRUCTURA	10 días	395	$ 83.229.146	16/04/26	28/04/26
397		3.PINTURA	10 días	398	$ 19.181.924	14/07/26	28/07/26
398		4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	396FC+45 días	$ 19.126.939	1/07/26	14/07/26
399		5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJ	10 días	396	$ 414.524	29/04/26	12/05/26
400		~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/26~~	~~5/01/26~~
401		99.Provision Ajustes	20 días	398CC	$ 17.594.172	1/07/26	28/07/26
402		ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	394	$ 49.100.288	9/04/26	20/05/26
403		ITEMS NO PREVISTOS	30 días	394	$ 46.600.094	9/04/26	20/05/26

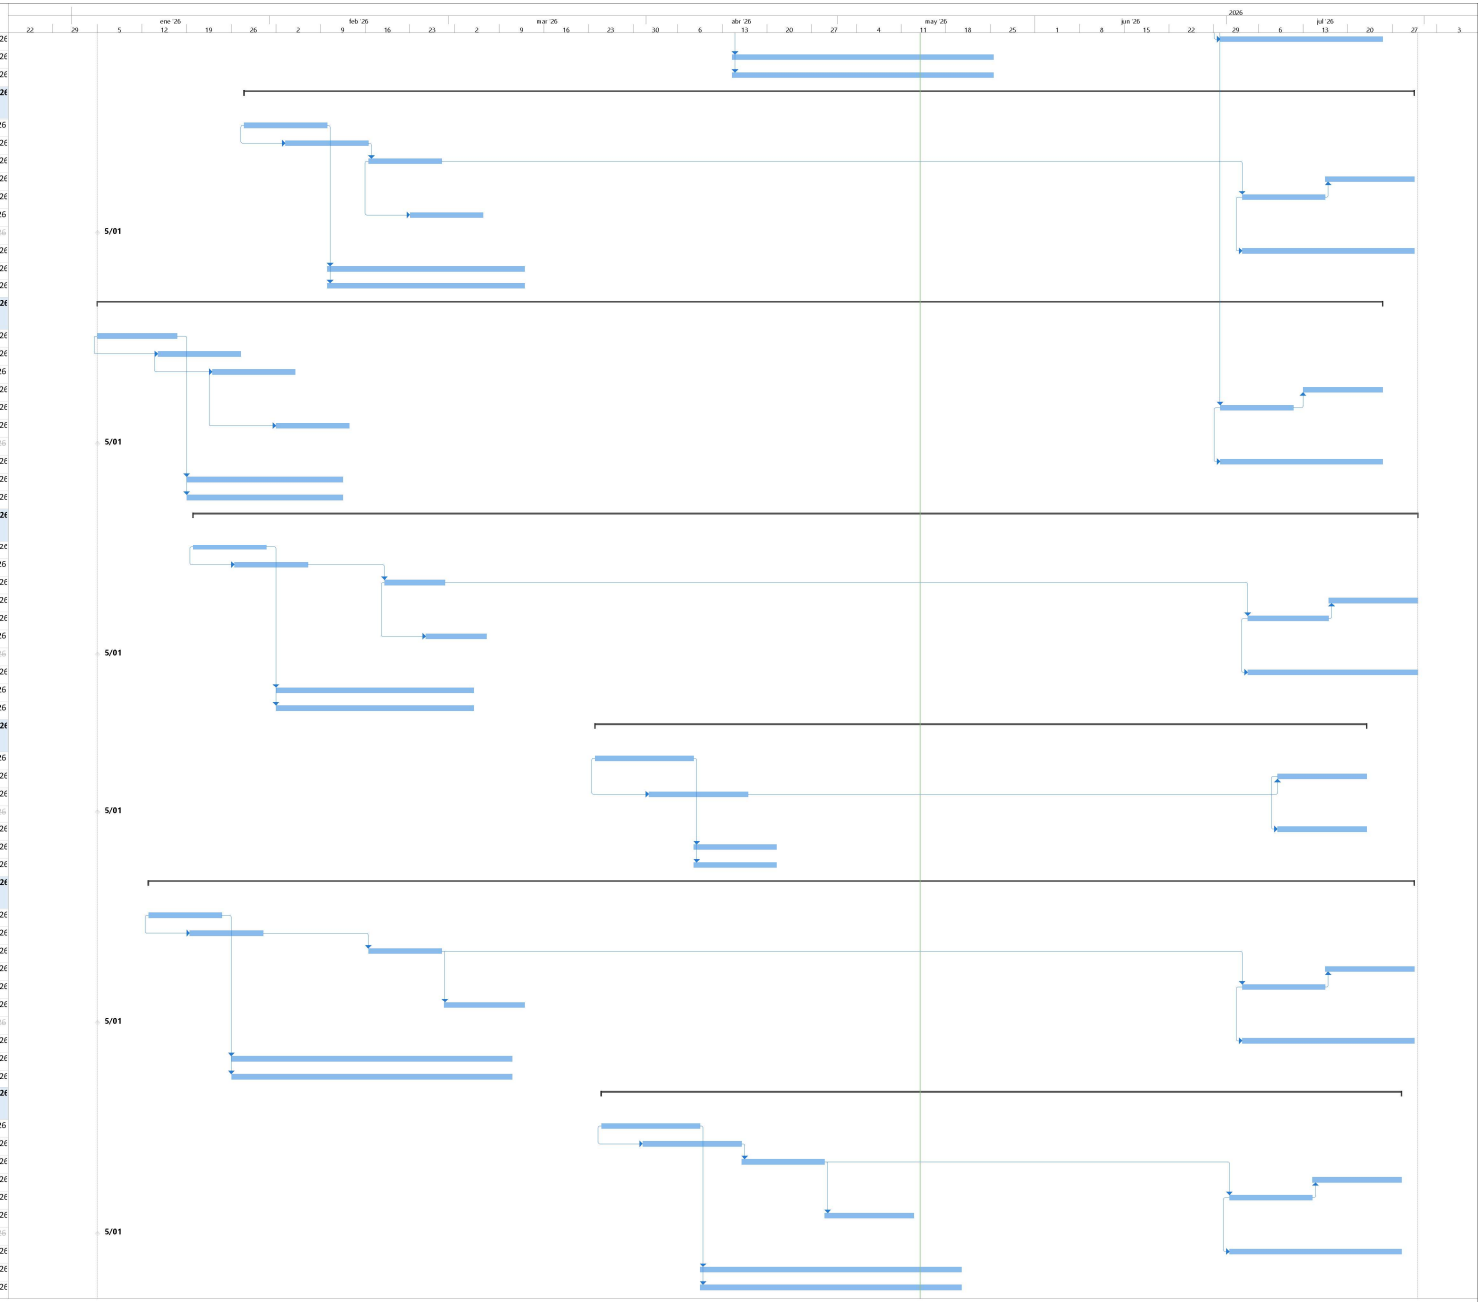


				CONTRACTUAL					MODIFICATORIO				
No.	CÓDIGO	INTERVENCION	ESCENARIO	VALOR SIN PROVISIÓN DE AJUSTES	PROVISIÓN DE AJUSTES	VALOR INC. PROV. AJUSTE SIN AU	VALOR AU	VALOR INC. PROV. AJUSTE + AU	VALOR SIN PROVISIÓN DE AJUSTES	PROVISIÓN DE AJUSTES	VALOR INC. PROV. AJUSTE SIN AU	VALOR AU	VALOR INC. PROV. AJUSTE + AU
	GRUPO 1												
1	0707-0027.2026	Infantiles	SIETE DE AGOSTO	$ 135.836.899	$ 7.973.895	$ 143.810.794	$ 49.013.498	$ 192.824.292	$ 130.805.441	$ 7.973.895	$ 138.779.336	$ 47.298.679	$ 186.078.015
2	0707-0027.2026	Multiple	SIETE DE AGOSTO	$ 278.816.045	$ 19.481.141	$ 298.297.186	$ 101.665.443	$ 399.962.629	$ 309.232.636	$ 19.481.141	$ 328.713.777	$ 112.032.006	$ 440.745.783
3	1207-0151.2026	Multiple	NUEVA FLORESTA	$ 232.979.419	$ 14.459.985	$ 247.439.404	$ 84.332.130	$ 331.771.534	$ 237.143.685	$ 14.459.985	$ 251.603.670	$ 85.751.392	$ 337.355.062
4	1301-0015.2025	Multiple	ULPIANO LLOREDA	$ 208.594.399	$ 17.527.861	$ 226.122.260	$ 77.066.835	$ 303.189.095	$ 287.366.015	$ 17.527.861	$ 304.893.876	$ 103.913.724	$ 408.807.600
5	1401-0051.2026	Infantiles	PARQUE RECREATIVO CANDELARIA	$ 145.554.857	$ 8.131.664	$ 153.686.521	$ 52.379.335	$ 206.065.856	$ 133.392.033	$ 8.131.664	$ 141.523.697	$ 48.234.010	$ 189.757.707
6	1498-0189.2026	Infantiles	PUERTAS DEL SOL V	$ 147.168.058	$ 8.477.735	$ 155.645.793	$ 53.047.093	$ 208.692.886	$ 139.065.817	$ 8.477.735	$ 147.543.552	$ 50.285.692	$ 197.829.244
7	1504-0059.2025	Infantiles	EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA	$ 146.641.102	$ 8.187.040	$ 154.828.142	$ 52.768.422	$ 207.596.564	$ 146.649.329	$ 8.187.040	$ 154.836.369	$ 52.771.226	$ 207.607.595
8	1504-0059.2025	Multiple	EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA	$ 234.586.709	$ 17.066.162	$ 251.652.871	$ 85.768.160	$ 337.421.031	$ 270.894.672	$ 17.066.162	$ 287.960.834	$ 98.142.615	$ 386.103.449
9	1504-0114.2026	Infantiles	POLIDEPORTIVO EL VALLADO	$ 145.785.334	$ 8.307.967	$ 154.093.301	$ 52.517.974	$ 206.611.275	$ 136.282.496	$ 8.307.967	$ 144.590.463	$ 49.279.223	$ 193.869.686
10	1598-0001.2026	Multiple	COMUNEROS I EL FARO	$ 222.614.790	$ 17.058.831	$ 239.673.621	$ 81.685.400	$ 321.359.021	$ 279.676.345	$ 17.058.831	$ 296.735.176	$ 101.133.080	$ 397.868.256
11	1598-0113.2025	Infantiles	MOJICA LAS GEMELAS	$ 148.237.935	$ 8.347.285	$ 156.585.220	$ 53.367.267	$ 209.952.487	$ 148.244.410	$ 8.347.285	$ 156.591.695	$ 53.369.475	$ 209.961.170
12	1599-0018.2026	Infantiles	BAJO CIUDAD CORDOBA 1	$ 146.047.924	$ 8.188.121	$ 154.236.045	$ 52.566.623	$ 206.802.668	$ 134.392.574	$ 8.188.121	$ 142.580.695	$ 48.594.256	$ 191.174.951
13	1778-0004.2026	Multiple	SANTA ANITA	$ 261.957.250	$ 14.714.333	$ 276.671.583	$ 94.295.020	$ 370.966.603	$ 241.238.747	$ 14.714.333	$ 255.953.080	$ 87.233.754	$ 343.186.834
14	1783-0024.2026	Multiple	CIUDAD CAPRI	$ 249.399.921	$ 16.928.392	$ 266.328.313	$ 90.769.835	$ 357.098.148	$ 277.537.831	$ 16.928.392	$ 294.466.223	$ 100.359.777	$ 394.826.000
15	1811-0004.2026	Infantiles	LOURDES UNIDAD RECREATIVA	$ 133.793.286	$ 7.994.590	$ 141.787.876	$ 48.324.047	$ 190.111.923	$ 131.144.736	$ 7.994.590	$ 139.139.326	$ 47.421.370	$ 186.560.696
16	1811-0004.2026	Multiple	LOURDES UNIDAD RECREATIVA	$ 250.752.159	$ 21.336.096	$ 272.088.255	$ 92.732.934	$ 364.821.189	$ 349.801.310	$ 21.336.096	$ 371.137.406	$ 126.490.798	$ 497.628.204
17	1922-0014.2026	Multiple	LA CAROLINA	$ 212.209.712	$ 20.433.064	$ 232.642.776	$ 79.289.152	$ 311.931.928	$ 335.118.878	$ 20.433.064	$ 355.551.942	$ 121.178.970	$ 476.730.912
18	2002-0000.2026	Multiple	BELISARIO	$ 221.915.883	$ 17.206.284	$ 239.122.167	$ 81.497.454	$ 320.619.621	$ 282.093.812	$ 17.206.284	$ 299.300.096	$ 102.007.255	$ 401.307.350
	GRUPO 2												
19	0915-0022.2026	Multiple	JUNIN	$ 260.484.362	$ 16.721.753	$ 277.206.115	$ 94.477.199	$ 371.683.314	$ 274.150.014	$ 16.721.753	$ 290.871.767	$ 99.134.717	$ 390.006.484
20	1397-0006.2025	Sintetica	VILLA DEL LAGO	$ 691.638.228	$ 61.881.677	$ 753.519.905	$ 256.814.140	$ 1.010.334.045	$ 1.008.834.069	$ 61.881.677	$ 1.070.715.746	$ 364.920.611	$ 1.435.636.357
21	1406-0176.2026	Infantiles	MARROQUIN I	$ 211.663.608	$ 9.371.941	$ 221.035.549	$ 75.333.185	$ 296.368.734	$ 153.726.154	$ 9.371.941	$ 163.098.095	$ 55.586.982	$ 218.685.077
22	1697-0023.2026	Infantiles	CIUDAD 2000	$ 48.909.594	$ 4.972.370	$ 53.881.964	$ 18.364.013	$ 72.245.977	$ 81.595.999	$ 4.972.370	$ 86.568.369	$ 29.504.172	$ 116.072.541
23	1791-0003.2026	Multiple	LA PLAYA	$ 290.442.293	$ 18.926.622	$ 309.368.915	$ 105.438.903	$ 414.807.818	$ 310.298.438	$ 18.926.622	$ 329.225.060	$ 112.206.260	$ 441.431.320
24	2002-0000.2026	Infantiles	BELISARIO	$ 44.612.913	$ 7.745.136	$ 52.358.049	$ 17.844.634	$ 70.202.683	$ 127.054.979	$ 7.745.136	$ 134.800.115	$ 45.942.483	$ 180.742.598
25	2003-0197.2026	Multiple	LA ESTRELLA SILOE	$ 211.911.935	$ 17.594.172	$ 229.506.107	$ 78.220.114	$ 307.726.221	$ 288.453.172	$ 17.594.172	$ 306.047.344	$ 104.306.846	$ 410.354.190
	GRUPO 3												
26	0217-0074.2025	Multiple	LOS ALAMOS	$ 257.147.884	$ 17.817.862	$ 274.965.746	$ 93.713.638	$ 368.679.384	$ 292.120.528	$ 17.817.862	$ 309.938.390	$ 105.632.990	$ 415.571.380
27	0293-0011.2026	Multiple	LA MERCED	$ 228.081.491	$ 16.574.801	$ 244.656.292	$ 83.383.591	$ 328.039.883	$ 271.740.776	$ 16.574.801	$ 288.315.577	$ 98.263.520	$ 386.579.097
	GRUPO 4												
28	0294-0083.2025	Multiple	LA ISLA	$ 240.620.553	$ 18.691.083	$ 259.311.636	$ 88.378.415	$ 347.690.051	$ 306.436.815	$ 18.691.083	$ 325.127.898	$ 110.809.868	$ 435.937.766
29	0421-0016.2026	Multiple	CALIMA	$ 232.308.852	$ -	$ 232.308.852	$ 79.175.345	$ 311.484.197	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
30	0503-0004.2026	Infantiles	GUAYACANES II	$ 157.514.308	$ -	$ 157.514.308	$ 53.683.918	$ 211.198.226	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
31	0503-0004.2026	Multiple	GUAYACANES II	$ 265.932.151	$ -	$ 265.932.151	$ 90.634.815	$ 356.566.966	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
32	0597-0032.2025	Infantiles	LOS ALMENDROS	$ 158.728.655	$ -	$ 158.728.655	$ 54.097.792	$ 212.826.447	$ 158.728.950	$ -	$ 158.728.950	$ 54.097.893	$ 212.826.843
33	0610-0184.2026	Infantiles	CIUDADELA FLORALIA-MULLER	$ 144.776.453	$ -	$ 144.776.453	$ 49.342.613	$ 194.119.066	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	0610-0184.2026	Multiple	CIUDADELA FLORALIA-MULLER	$ 319.230.477	$ -	$ 319.230.477	$ 108.799.914	$ 428.030.391	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
35	0697-0072.2025	Multiple	CALIMIO NORTE	$ 202.824.183	$ 14.138.276	$ 216.962.459	$ 73.944.997	$ 290.907.456	$ 231.794.401	$ 14.138.276	$ 245.932.677	$ 83.818.607	$ 329.751.284
36	1303-0052.2025	Multiple	POBLADO I	$ 265.077.961	$ 17.065.307	$ 282.143.268	$ 96.159.877	$ 378.303.145	$ 279.782.521	$ 17.065.307	$ 296.847.828	$ 101.171.475	$ 398.019.303
			PROVISION AJUSTES	$ 463.321.446	$ 463.321.446				$ 463.321.446	$ 463.321.446			
			COSTO DIRECTO DE LA OBRA	**$ 8.218.119.029**		**$ 8.218.119.029**			**$ 8.218.119.029**		**$ 8.218.119.029**		
	0,63233497%		POLIZAS	$ 51.966.040					$ 51.966.040				
	26,58844710%		DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	$ 2.185.070.231					$ 2.185.070.231				
	1,86114976%		GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 152.951.503					$ 152.951.503				
	5,00000000%		UTILIDAD	$ 410.905.951					$ 410.905.951				
	34,08193183%		**TOTAL AU**	**$ 2.800.893.725**			**$ 2.800.893.725**		**$ 2.800.893.725**			**$ 2.800.893.726**	
			VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**$ 11.019.012.754**				**$ 11.019.012.754**	**$ 11.019.012.754**				**$ 11.019.012.754**

MICHAEL R. SANDOVAL
REP. LEGAL
CONSORCIO CALI DEPORTES


Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
COSTO DIRECTO	**109 días**		**$ 5.282.554.615**	**5/01/2026**	**30/05/2026**
0217-0074.2025.Multiple.LOS ALAMOS CM PRESUPUESTO EDS 37.5	**82 días**		**$ 309.938.390**	**6/04/2026**	**25/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	7 días		$ 18.378.998	6/04/2026	14/04/2026
1.PRELIMINARES	10 días	3	$ 50.533.226	14/04/2026	27/04/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	4	$ 83.745.847	27/04/2026	11/05/2026
3.PINTURA	10 días	5FC+35 días	$ 20.018.269	30/06/2026	11/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	6	$ 19.126.939	13/07/2026	25/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	5	$ 14.322.637	11/05/2026	25/05/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	6CC	$ 17.817.862	30/06/2026	25/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	3	$ 50.539.651	14/04/2026	25/05/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	3	$ 35.454.961	14/04/2026	25/05/2026
0293-0011.2026.Multiple.LA MERCED PRESUPUESTO EDS	**80,5 días**		**$ 288.315.577**	**13/04/2026**	**30/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	5 días		$ 16.590.373	13/04/2026	17/04/2026
1.PRELIMINARES	6 días	14	$ 49.011.509	18/04/2026	25/04/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	15	$ 80.860.629	27/04/2026	9/05/2026
3.PINTURA	10 días	5FC+39 días	$ 19.242.434	4/07/2026	16/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	17	$ 19.126.939	17/07/2026	30/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	16	$ 1.114.014	11/05/2026	23/05/2026
6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	19CC+5 días	$ 1.164.935	16/05/2026	29/05/2026
99.Provision Ajustes	20 días	17CC	$ 16.574.801	4/07/2026	30/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	14	$ 49.958.199	18/04/2026	28/05/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	14	$ 34.671.744	18/04/2026	28/05/2026
0294-0083.2025.Multiple.LA ISLA CM PRESUPUESTO EDS	**69 días**		**$ 325.127.898**	**27/04/2026**	**30/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	5 días		$ 24.971.173	27/04/2026	4/05/2026
1.PRELIMINARES	5 días	25	$ 63.392.898	4/05/2026	9/05/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	26	$ 84.870.232	11/05/2026	23/05/2026
3.PINTURA	10 días	27FC+29 días	$ 20.331.629	3/07/2026	16/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	28	$ 19.126.939	16/07/2026	30/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	5 días	27CC+5 días	$ 609.718	16/05/2026	23/05/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	28CC	$ 18.691.083	3/07/2026	30/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	25	$ 54.410.978	4/05/2026	29/05/2026
ITEMS NO PREVISTOS	20 días	25	$ 38.723.248	4/05/2026	29/05/2026
~~0421-0016.2026.Multiple.CALIMA PRESUPUESTO EDS~~	~~108,5 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~29/05/2026~~
~~0503-0004.2026.Infantiles.GUAYACANES II PRESUPUESTO EDS~~	~~30 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~12/02/2026~~
~~0503-0004.2026.Multiple.GUAYACANES II PRESUPUESTO EDS~~	~~30 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~12/02/2026~~
~~0597-0032.2025.Infantiles.LOS ALMENDROS PRESUPUESTO EDS~~	~~153 días~~		~~$ 158.728.950~~	~~5/01/2026~~	~~30/07/2026~~
~~0610-0184.2026.Infantiles.CIUDADELA FLORALIA-MULLER PRESUPUESTO EDS~~	~~30 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~12/02/2026~~
~~0610-0184.2026.Multiple.CIUDADELA FLORALIA-MULLER PRESUPUESTO EDS~~	~~30 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~12/02/2026~~
0697-0072.2025.Multiple.CALIMIO NORTE CM PRESUPUESTO EDS	**76 días**		**$ 245.932.677**	**13/04/2026**	**24/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	5 días		$ 15.586.172	13/04/2026	17/04/2026
1.PRELIMINARES	6 días	102	$ 39.692.338	18/04/2026	25/04/2026
2.ESTRUCTURA	5 días	103	$ 64.813.013	27/04/2026	4/05/2026
3.PINTURA	10 días	104FC+40 días	$ 14.879.174	27/06/2026	10/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	105	$ 19.126.939	11/07/2026	24/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	5 días	108	$ 3.592.614	11/05/2026	15/05/2026
6.CAMPO DE INFILTRACION	5 días	104	$ 1.681.290	4/05/2026	9/05/2026
~~7.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	105CC	$ 14.138.276	27/06/2026	24/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	102	$ 46.836.243	18/04/2026	28/05/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	102	$ 25.586.618	18/04/2026	28/05/2026
0707-0027.2026.Infantiles. SIETE DE AGOSTO PRESUPUESTO EDS	**120 días**		**$ 138.779.336**	**11/02/2026**	**24/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 9.868.906	11/02/2026	23/02/2026
1.PRELIMINARES	10 días	114	$ 13.667.021	24/02/2026	7/03/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	115	$ 25.926.650	9/03/2026	20/03/2026
3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	118	$ 34.269.414	11/07/2026	24/07/2026
4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	116FC+70 días	$ 37.373.882	27/06/2026	10/07/2026
5.DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACIÓN	10 días	116	$ 40.482	20/03/2026	7/04/2026
6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	119CC+5 días	$ 664.039	28/03/2026	13/04/2026
99.Provision Ajustes	20 días	118CC	$ 7.973.895	27/06/2026	24/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	114	$ 5.636.184	24/02/2026	7/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	114	$ 3.358.863	24/02/2026	7/04/2026
0707-0027.2026.Multiple. SIETE DE AGOSTO PRESUPUESTO EDS	**125 días**		**$ 328.713.777**	**9/02/2026**	**29/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 17.206.632	9/02/2026	20/02/2026
1.PRELIMINARES	10 días	125CC+5 días	$ 52.447.640	14/02/2026	26/02/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	126	$ 109.266.582	27/02/2026	11/03/2026
3.PINTURA	10 días	127FC+80 días	$ 22.637.090	2/07/2026	15/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	128	$ 19.126.939	15/07/2026	29/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	127	$ 797.082	12/03/2026	25/03/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	128CC	$ 19.481.141	2/07/2026	29/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	126	$ 57.048.267	27/02/2026	25/03/2026
ITEMS NO PREVISTOS	20 días	126	$ 30.702.404	27/02/2026	25/03/2026
0915-0022.2026.Multiple.JUNIN CM PRESUPUESTO EDS	**145 días**		**$ 290.871.767**	**5/01/2026**	**21/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 18.931.598	17/03/2026	30/03/2026
1.PRELIMINARES	10 días	136CC+5 días	$ 39.543.575	24/03/2026	8/04/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	137	$ 86.567.462	9/04/2026	21/04/2026
3.PINTURA	10 días	138FC+45 días	$ 20.807.071	23/06/2026	7/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	139	$ 19.126.939	7/07/2026	21/07/2026
~~5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~

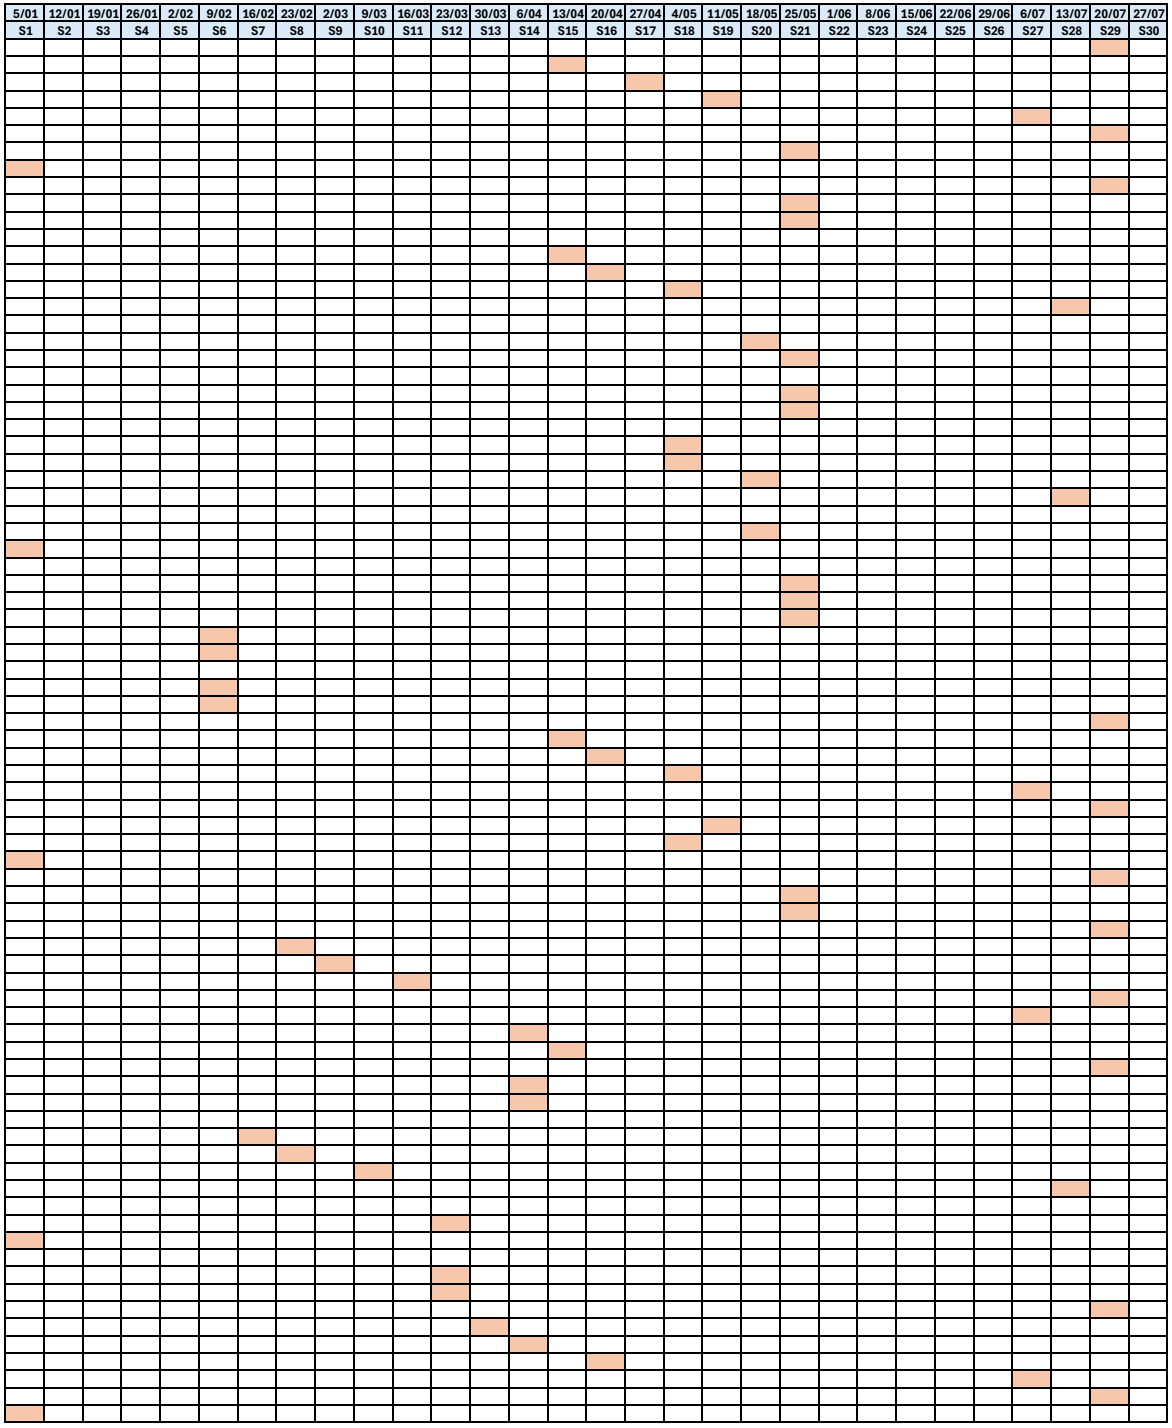


Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
COSTO DIRECTO	**109 días**		**$ 5.282.554.615**	**5/01/2026**	**30/05/2026**
6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	141CC+5 días	$ 1.209.740	5/01/2026	17/01/2026
99.Provision Ajustes	20 días	139CC	$ 16.721.753	23/06/2026	21/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	137	$ 50.438.912	9/04/2026	5/05/2026
ITEMS NO PREVISTOS	20 días	137	$ 37.524.717	9/04/2026	5/05/2026
1207-0151.2026.Multiple.NUEVA FLORESTA C.M PRESUPUESTO EDS	**120 días**		**$ 251.603.670**	**17/02/2026**	**30/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 14.703.531	17/02/2026	28/02/2026
1.PRELIMINARES	10 días	147CC+5 días	$ 41.593.653	23/02/2026	6/03/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	148	$ 68.047.457	7/03/2026	19/03/2026
3.PINTURA	10 días	149FC+75 días	$ 15.766.953	4/07/2026	16/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	150	$ 19.126.939	17/07/2026	30/07/2026
5.CAÑUELA EN CONCRETO DRENAJE CANCHA	10 días	149	$ 11.149.198	20/03/2026	6/04/2026
6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	152CC+5 días	$ 2.031.277	27/03/2026	13/04/2026
99.Provision Ajustes	20 días	150CC	$ 14.459.985	4/07/2026	30/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	147	$ 35.764.106	2/03/2026	13/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	147	$ 28.960.571	2/03/2026	13/04/2026
1301-0015.2025.Multiple.ULPIANO LLOREDA PRESUPUESTO EDS	**115 días**		**$ 304.893.876**	**23/02/2026**	**30/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 14.152.358	23/02/2026	6/03/2026
1.PRELIMINARES	10 días	158CC+5 días	$ 41.066.499	28/02/2026	12/03/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	159	$ 90.777.565	13/03/2026	26/03/2026
3.PINTURA	10 días	160FC+70 días	$ 18.395.283	3/07/2026	16/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	161	$ 19.126.939	16/07/2026	30/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	160	$ 10.127.441	27/03/2026	11/04/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
7.PANTALLAS DE PROTECCIÓN CANCHA MULTIPLE	10 días	160CC+5 días	$ 2.397.859	19/03/2026	6/04/2026
99.Provision Ajustes	20 días	161CC	$ 17.527.861	3/07/2026	30/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	158	$ 48.362.623	6/03/2026	17/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	158	$ 42.959.448	6/03/2026	17/04/2026
1303-0052.2025.Multiple.POBLADO I PRESUPUESTO EDS	**44 días**		**$ 296.847.828**	**1/06/2026**	**30/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 19.770.159	1/06/2026	13/06/2026
1.PRELIMINARES	10 días	170CC+5 días	$ 49.892.171	6/06/2026	22/06/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	171	$ 98.400.748	22/06/2026	6/07/2026
3.PINTURA	9 días	174	$ 19.501.766	18/07/2026	30/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	172	$ 19.126.939	6/07/2026	17/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	172CC	$ 1.872.587	22/06/2026	6/07/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
~~7.TRATAMIENTO DE RAICES~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	19 días	174CC	$ 17.065.307	6/07/2026	30/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	15 días	170	$ 27.909.090	16/06/2026	6/07/2026
ITEMS NO PREVISTOS	15 días	170	$ 43.309.061	16/06/2026	6/07/2026
1397-0006.2025.Sintetica.PPTO CANCHA SINTETICA PRESUPUESTO EDS	**96 días**		**$ 1.070.715.746**	**19/03/2026**	**30/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	30 días		$ 68.162.149	19/03/2026	30/04/2026
1.PRELIMINARES	30 días	182CC+5 días	$ 91.349.556	26/03/2026	7/05/2026
2.BASE DE CANCHA SINTETICA	35 días	183CC+5 días	$ 112.237.220	6/04/2026	21/05/2026
3.ATRAQUES BORDILLO	30 días	187CC+5 días	$ 1.985.667	17/04/2026	28/05/2026
4.REPOSICIONES	46 días	185	$ 247.861.306	28/05/2026	30/07/2026
5.DRENAJES	30 días	184CC+5 días	$ 110.518.128	11/04/2026	21/05/2026
7.ILUMINACION	35 días	186CC	$ 53.991.348	28/05/2026	15/07/2026
99.Provision Ajustes	45 días	186CC	$ 209.411.079	28/05/2026	29/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	65 días	183CC	$ 61.881.677	26/03/2026	25/06/2026
ITEMS NO PREVISTOS	40 días	183CC	$ 113.317.616	26/03/2026	21/05/2026
1401-0051.2026.Infantiles.PARQUE RECREATIVO CANDELARIA PRESUPUESTO EDS	**115 días**		**$ 141.523.697**	**19/02/2026**	**27/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 10.701.742	19/02/2026	3/03/2026
1.PRELIMINARES	10 días	193CC+5 días	$ 15.240.652	25/02/2026	10/03/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	194	$ 20.360.005	10/03/2026	24/03/2026
3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	197	$ 34.516.550	14/07/2026	27/07/2026
4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	195FC+70 días	$ 39.332.803	1/07/2026	13/07/2026
5.DRENAJES	10 días	195	$ 320.340	24/03/2026	8/04/2026
6.RED SANITARIA	10 días	198CC+5 días	$ 896.850	31/03/2026	15/04/2026
~~7.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	197CC	$ 8.131.664	1/07/2026	27/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	193	$ 7.433.738	4/03/2026	15/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	193	$ 4.589.353	4/03/2026	15/04/2026
1406-0176.2026.Infantiles.MARROQUIN I PRESUPUESTO EDS	**100 días**		**$ 163.098.095**	**11/03/2026**	**28/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 15.380.069	11/03/2026	24/03/2026
1.PRELIMINARES	10 días	205CC+5 días	$ 15.403.364	17/03/2026	31/03/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	206	$ 20.242.904	31/03/2026	15/04/2026
3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	209	$ 34.269.414	14/07/2026	28/07/2026
4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	207FC+55 días	$ 39.332.803	1/07/2026	14/07/2026
5.DRENAJES	10 días	207	$ 758.360	16/04/2026	28/04/2026
6.RED SANITARIA	10 días	210CC	$ 1.001.000	16/04/2026	28/04/2026
~~7.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
8.ANDENES	10 días	210CC+5 días	$ 863.904	22/04/2026	6/05/2026
99.Provision Ajustes	20 días	209CC	$ 9.371.941	1/07/2026	28/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	205	$ 12.571.029	25/03/2026	6/05/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	205	$ 13.903.307	25/03/2026	6/05/2026
1498-0189.2026.Infantiles.PUERTAS DEL SOL V PRESUPUESTO EDS	**149,5 días**		**$ 147.543.552**	**5/01/2026**	**27/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 10.695.146	25/02/2026	9/03/2026
1.PRELIMINARES	10 días	218CC+5 días	$ 17.093.985	3/03/2026	16/03/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	219	$ 20.486.567	16/03/2026	30/03/2026
3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	222	$ 34.516.550	13/07/2026	27/07/2026

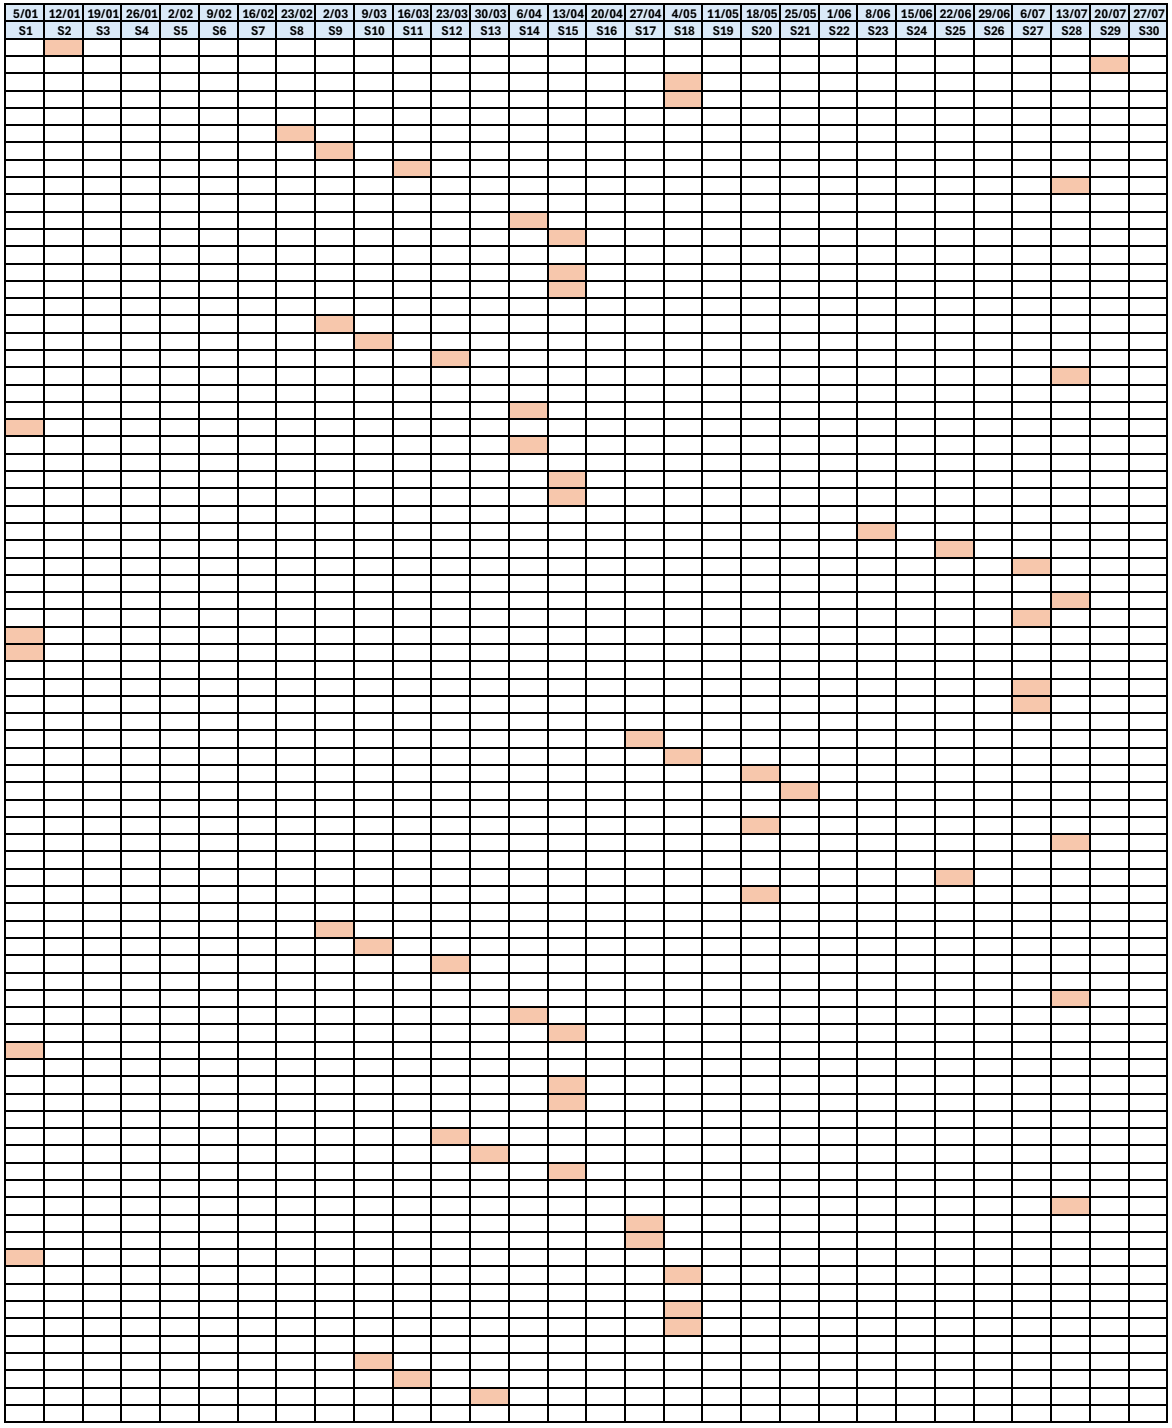

Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
COSTO DIRECTO	**109 días**		**$ 5.282.554.615**	**5/01/2026**	**30/05/2026**
4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	220FC+65 días	$ 39.332.803	30/06/2026	13/07/2026
5.DRENAJES	10 días	220CC+5 días	$ 1.574.870	24/03/2026	8/04/2026
6.RED SANITARIA Y CAMPO DE INFILTRACION	10 días	223CC+5 días	$ 1.963.274	30/03/2026	14/04/2026
7.ATRAQUES BORDILLO	0 días		$ 0	5/01/2026	5/01/2026
99.Provision Ajustes	20 días	222CC	$ 8.477.735	30/06/2026	27/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	218	$ 11.175.576	10/03/2026	14/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	25 días	218	$ 2.227.046	10/03/2026	14/04/2026
1504-0059.2025.Infantiles.EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA PRESUPUESTO EDS	**127 días**		**$ 154.836.369**	**3/02/2026**	**25/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 11.250.970	3/02/2026	14/02/2026
1.PRELIMINARES	10 días	230CC+7 días	$ 14.908.261	11/02/2026	24/02/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	231	$ 14.959.288	24/02/2026	9/03/2026
3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	234	$ 34.640.117	13/07/2026	25/07/2026
4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	232FC+80 días	$ 37.373.882	30/06/2026	11/07/2026
5.DRENAJES-FILTRO FRANCÉS	10 días	232	$ 321.610	9/03/2026	20/03/2026
6.ATRAQUES BORDILLO	10 días	235	$ 6.343.230	21/03/2026	7/04/2026
99.Provision Ajustes	20 días	234CC	$ 8.187.040	30/06/2026	25/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	230	$ 23.875.167	16/02/2026	18/03/2026
ITEMS NO PREVISTOS	25 días	230	$ 2.976.804	16/02/2026	18/03/2026
1504-0059.2025.Multiple.EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA PRESUPUESTO EDS	**136 días**		**$ 287.960.834**	**26/01/2026**	**29/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 17.062.864	26/01/2026	6/02/2026
1.PRELIMINARES	10 días	241CC+6 días	$ 35.178.214	2/02/2026	13/02/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	242	$ 95.034.895	14/02/2026	26/02/2026
3.PINTURA	10 días	243FC+90 días	$ 19.363.456	2/07/2026	15/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	244	$ 19.126.939	15/07/2026	29/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	243	$ 805.018	27/02/2026	11/03/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	244CC	$ 17.066.162	2/07/2026	29/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	241	$ 55.916.318	6/02/2026	10/03/2026
ITEMS NO PREVISTOS	25 días	241	$ 28.406.968	6/02/2026	10/03/2026
1504-0114.2026.Infantiles.EL VALLADO PRESUPUESTO EDS	**105 días**		**$ 144.590.463**	**3/03/2026**	**25/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 14.400.466	3/03/2026	14/03/2026
1.PRELIMINARES	10 días	252CC+5 días	$ 13.336.383	9/03/2026	20/03/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	253	$ 20.003.188	21/03/2026	7/04/2026
3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	256	$ 34.269.414	13/07/2026	25/07/2026
4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	254FC+60 días	$ 43.378.693	30/06/2026	11/07/2026
5.DRENAJES	10 días	254	$ 335.969	8/04/2026	20/04/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	256CC	$ 8.307.967	30/06/2026	25/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	252	$ 6.045.079	16/03/2026	20/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	25 días	252	$ 4.513.304	16/03/2026	20/04/2026
1598-0001.2026.Multiple.COMUNEROS I EL FARO CM PRESUPUESTO EDS	**105 días**		**$ 296.735.176**	**5/03/2026**	**28/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 16.358.561	5/03/2026	17/03/2026
1.PRELIMINARES	10 días	263CC+5 días	$ 49.745.961	11/03/2026	25/03/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	264	$ 79.338.685	25/03/2026	9/04/2026
3.PINTURA	10 días	267	$ 18.830.097	15/07/2026	28/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	265FC+60 días	$ 19.126.939	2/07/2026	14/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	265	$ 3.729.989	10/04/2026	22/04/2026
6.CAMPO DE INFILTRACION	10 días	268CC+5 días	$ 2.157.508	16/04/2026	29/04/2026
~~7.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	267CC	$ 17.058.831	2/07/2026	28/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	263	$ 52.910.837	18/03/2026	22/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	25 días	263	$ 37.477.768	18/03/2026	22/04/2026
1598-0113.2025.Infantiles.MOJICA LAS GEMELAS PRESUPUESTO EDS	**100 días**		**$ 156.591.695**	**9/03/2026**	**24/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 11.447.466	9/03/2026	20/03/2026
1.PRELIMINARES	10 días	275CC+5 días	$ 15.822.858	14/03/2026	27/03/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	276	$ 20.381.569	28/03/2026	13/04/2026
3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	279	$ 34.516.550	11/07/2026	24/07/2026
4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	277FC+55 días	$ 43.985.863	27/06/2026	10/07/2026
5.DRENAJES	10 días	277CC+5 días	$ 294.145	7/04/2026	20/04/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	279CC	$ 8.347.285	27/06/2026	24/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	275	$ 16.458.836	20/03/2026	20/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	20 días	275	$ 5.337.123	20/03/2026	20/04/2026
1599-0018.2026.Infantiles.BAJO CIUDAD CORDOBA 1 PRESUPUESTO EDS	**125 días**		**$ 142.580.695**	**5/02/2026**	**25/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 10.780.928	5/02/2026	17/02/2026
1.PRELIMINARES	10 días	286CC+5 días	$ 13.571.807	11/02/2026	24/02/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	287	$ 20.064.645	24/02/2026	9/03/2026
3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	290	$ 34.269.414	13/07/2026	25/07/2026
4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	288FC+80 días	$ 43.378.693	30/06/2026	11/07/2026
5.DRENAJES	10 días	288	$ 674.749	9/03/2026	20/03/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	290CC	$ 8.188.121	30/06/2026	25/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	286	$ 6.736.120	18/02/2026	20/03/2026
ITEMS NO PREVISTOS	25 días	286	$ 4.916.218	18/02/2026	20/03/2026
1697-0023.2026.Infantiles.CIUDAD 2000 PRESUPUESTO EDS	**87 días**		**$ 86.568.369**	**27/03/2026**	**27/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 4.836.951	27/03/2026	11/04/2026
1.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	299FC+60 días	$ 37.373.882	13/07/2026	27/07/2026
2.DRENAJES	10 días	297CC+7 días	$ 2.397.755	8/04/2026	21/04/2026
~~3.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	10 días	298CC	$ 4.972.370	13/07/2026	27/07/2026

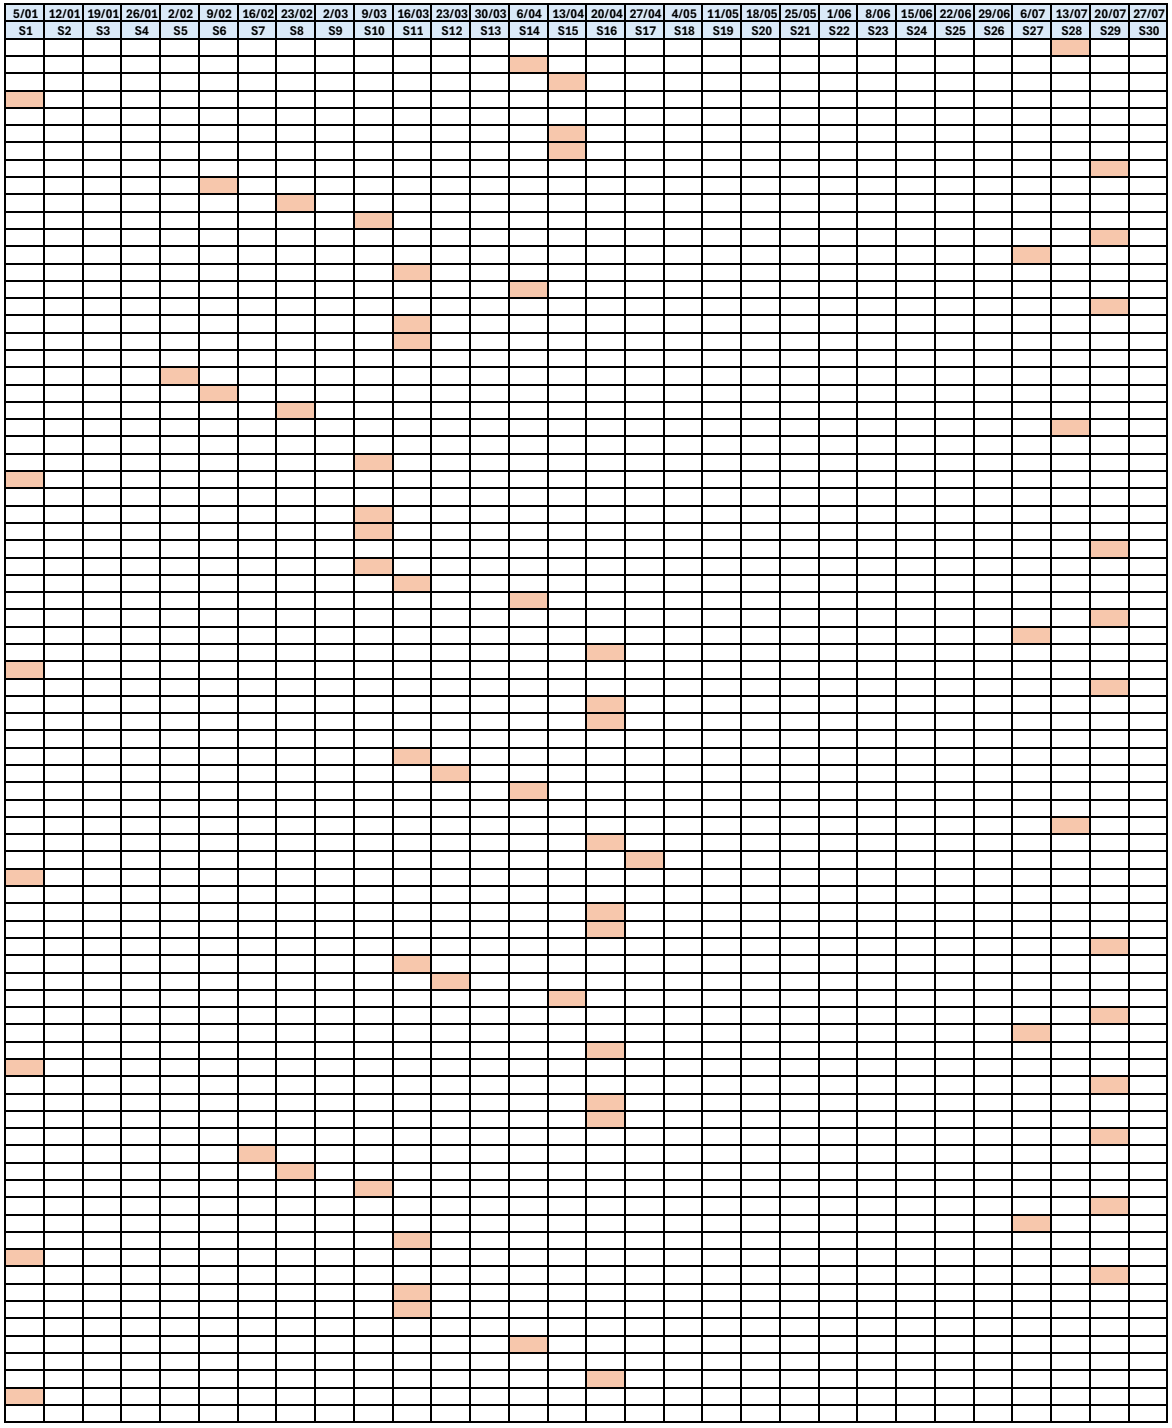

Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
COSTO DIRECTO	**109 días**		**$ 5.282.554.615**	**5/01/2026**	**30/05/2026**
ITEMS COMPLEMENTARIOS	15 días	297	$ 33.287.890	13/04/2026	30/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	15 días	297	$ 3.699.521	13/04/2026	30/04/2026
1778-0004.2026.Multiple.SANTA ANITA C.M PRESUPUESTO EDS	**141 días**		**$ 255.953.080**	**15/01/2026**	**24/07/2026**
1.PRELIMINARES	11 días	312CC+5 días	$ 32.254.123	21/01/2026	4/02/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	305	$ 78.410.445	4/02/2026	17/02/2026
3.PINTURA	10 días	308	$ 15.553.004	11/07/2026	24/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	306FC+95 días	$ 19.126.939	27/06/2026	10/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	306	$ 1.256.230	17/02/2026	2/03/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
7.OBRAS DE TRATAMIENTO AMBIENTAL	10 días	306CC	$ 6.926.990	4/02/2026	17/02/2026
8.GESTION DE OBRA	10 días		$ 15.117.403	15/01/2026	27/01/2026
99.Provision Ajustes	20 días	308CC	$ 14.714.333	27/06/2026	24/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	312	$ 44.864.340	28/01/2026	27/02/2026
ITEMS NO PREVISTOS	25 días	312	$ 27.729.273	28/01/2026	27/02/2026
1783-0024.2026.Multiple.CIUDAD CAPRI C.M PRESUPUESTO EDS	**137 días**		**$ 294.466.223**	**22/01/2026**	**27/07/2026**
1.PRELIMINARES	10 días	325CC+5 días	$ 35.230.337	28/01/2026	10/02/2026
2.ESTRUCTURA	12 días	317FC+10 días	$ 18.826.756	23/02/2026	10/03/2026
3.PINTURA	10 días	320	$ 18.438.505	14/07/2026	27/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	318FC+80 días	$ 19.126.939	1/07/2026	13/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	318	$ 1.865.675	10/03/2026	24/03/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
7.ANDENES (CUANDO APLIQUE)	10 días	321CC+5 días	$ 863.904	17/03/2026	30/03/2026
8.OBRAS DE TRATAMIENTO AMBIENTAL	10 días	317CC	$ 4.228.181	28/01/2026	10/02/2026
9.GESTION DE OBRA	10 días		$ 16.915.277	22/01/2026	3/02/2026
99.Provision Ajustes	20 días	320CC	$ 16.928.392	1/07/2026	27/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	40 días	325	$ 121.421.192	4/02/2026	27/03/2026
ITEMS NO PREVISTOS	40 días	325	$ 40.621.065	4/02/2026	27/03/2026
1791-0003.2026.Multiple.LA PLAYA C.M PRESUPUESTO EDS	**85 días**		**$ 329.225.060**	**30/03/2026**	**25/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 22.272.934	30/03/2026	14/04/2026
1.PRELIMINARES	10 días	330CC+5 días	$ 41.308.723	8/04/2026	20/04/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	331	$ 19.701.724	21/04/2026	4/05/2026
3.PINTURA	10 días	334	$ 20.305.696	13/07/2026	25/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	332FC+40 días	$ 19.126.939	30/06/2026	11/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	332	$ 2.632.710	5/05/2026	16/05/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
7.ANDENES	10 días	335CC+5 días	$ 647.928	11/05/2026	25/05/2026
99.Provision Ajustes	20 días	334CC	$ 18.926.622	30/06/2026	25/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	330	$ 125.036.680	14/04/2026	25/05/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	330	$ 59.265.104	14/04/2026	25/05/2026
1811-0004.2026.Infantiles.LOURDES PRESUPUESTO EDS	**135 días**		**$ 139.139.326**	**28/01/2026**	**30/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 13.129.490	28/01/2026	9/02/2026
1.PRELIMINARES	10 días	342CC+5 días	$ 13.189.117	3/02/2026	16/02/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	343	$ 20.626.163	16/02/2026	27/02/2026
3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	10 días	346	$ 34.640.117	16/07/2026	30/07/2026
4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	344FC+90 días	$ 37.373.882	3/07/2026	16/07/2026
5.DRENAJES	10 días	344CC+5 días	$ 1.583.257	23/02/2026	6/03/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	346CC	$ 7.994.590	3/07/2026	30/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	342	$ 7.667.961	10/02/2026	12/03/2026
ITEMS NO PREVISTOS	25 días	342	$ 2.934.749	10/02/2026	12/03/2026
1811-0004.2026.Multiple.LOURDES PRESUPUESTO EDS	**149 días**		**$ 371.137.406**	**5/01/2026**	**25/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 19.997.786	5/01/2026	17/01/2026
1.PRELIMINARES	10 días	353CC+7 días	$ 90.841.786	14/01/2026	27/01/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	354CC+7 días	$ 82.128.927	23/01/2026	4/02/2026
3.PINTURA	10 días	357	$ 19.586.049	13/07/2026	25/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	335FC+30 días	$ 19.126.939	30/06/2026	11/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	355CC+7 días	$ 3.562.298	2/02/2026	13/02/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	357CC	$ 21.336.096	30/06/2026	25/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	20 días	353	$ 84.277.479	19/01/2026	12/02/2026
ITEMS NO PREVISTOS	20 días	353	$ 30.280.046	19/01/2026	12/02/2026
1922-0014.2026.Multiple.LA CAROLINA CM PRESUPUESTO EDS	**142 días**		**$ 355.551.942**	**20/01/2026**	**30/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 22.272.934	20/01/2026	31/01/2026
1.PRELIMINARES	10 días	364CC+5 días	$ 57.305.371	26/01/2026	6/02/2026
2.ESTRUCTURA	8 días	365FC+9 días	$ 74.391.526	19/02/2026	28/02/2026
3.PINTURA	10 días	368	$ 16.856.580	17/07/2026	30/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	366FC+90 días	$ 19.126.939	4/07/2026	16/07/2026
5.CUNETA EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	8 días	366CC+5 días	$ 3.095.957	25/02/2026	6/03/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	368CC	$ 20.433.064	4/07/2026	30/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	25 días	364	$ 86.421.680	2/02/2026	4/03/2026
ITEMS NO PREVISTOS	25 días	364	$ 55.647.891	2/02/2026	4/03/2026
2002-0000.2026.Infantiles.BELISARIO PRESUPUESTO EDS	**87 días**		**$ 134.800.115**	**24/03/2026**	**22/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 4.410.377	24/03/2026	8/04/2026
1.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO	10 días	377FC+60 días	$ 33.481.323	9/07/2026	22/07/2026
2.DRENAJES	10 días	375CC+7 días	$ 8.024.224	1/04/2026	16/04/2026
~~3.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~

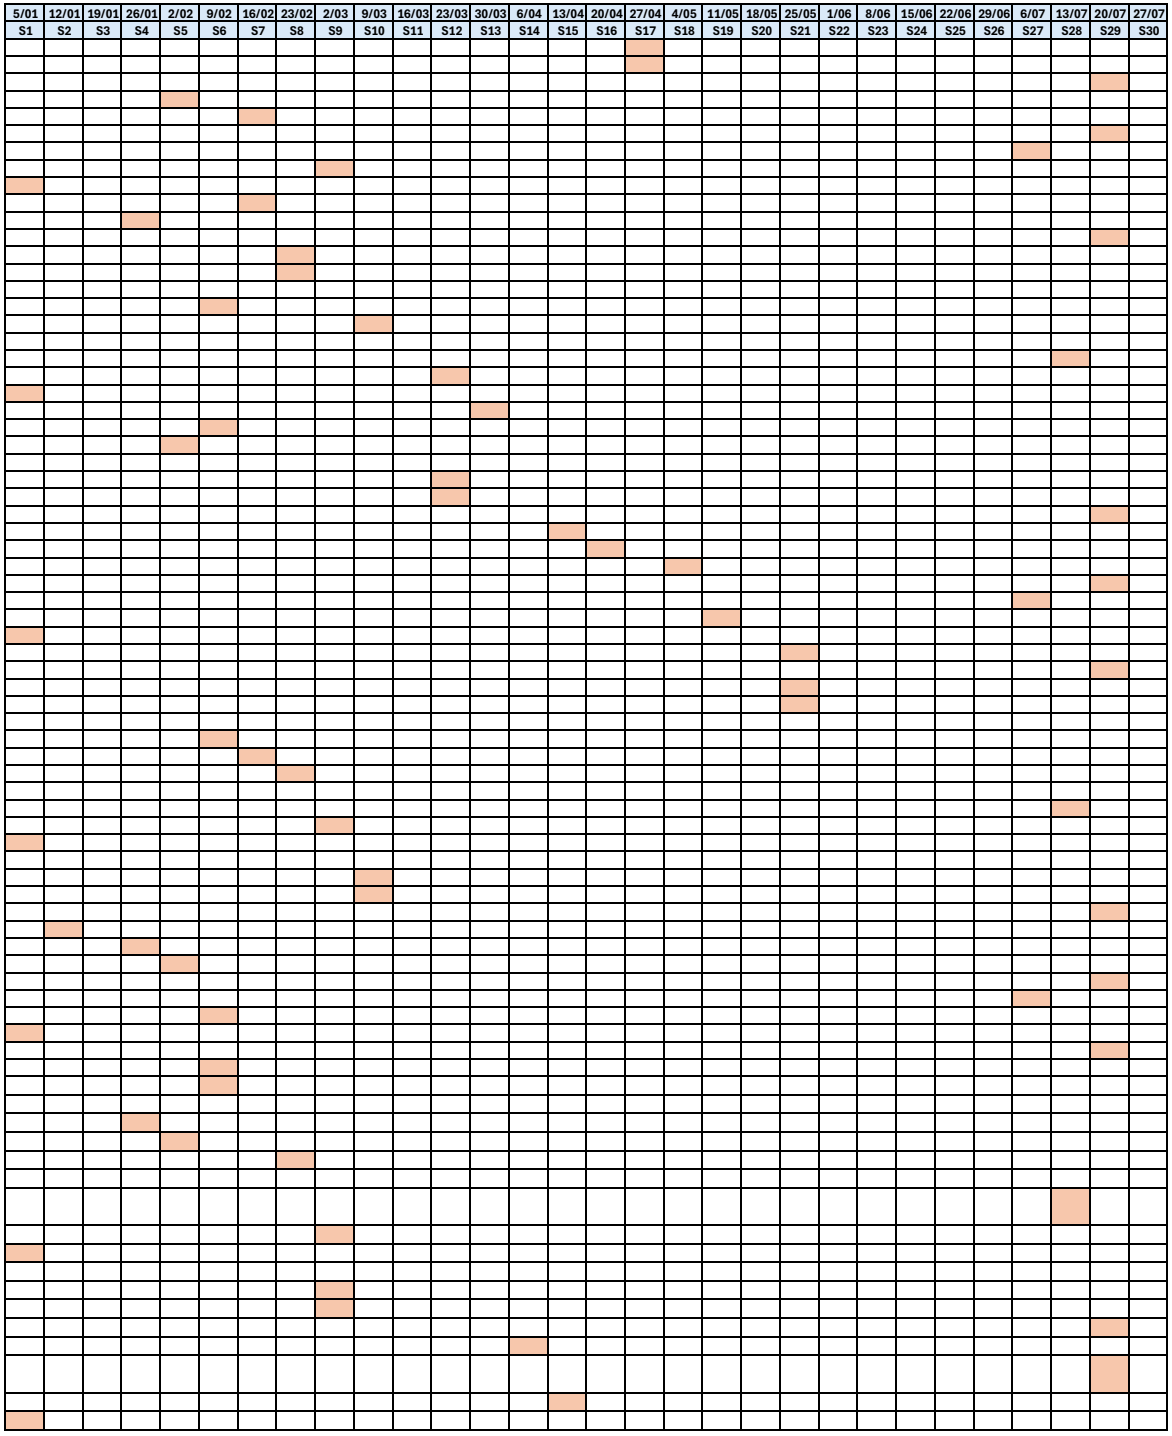

Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Costo	Comienzo	Fin
COSTO DIRECTO	**109 días**		**$ 5.282.554.615**	**5/01/2026**	**30/05/2026**
99.Provision Ajustes	10 días	376CC	$ 7.745.136	9/07/2026	22/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	10 días	375	$ 74.676.571	8/04/2026	21/04/2026
ITEMS NO PREVISTOS	10 días	375	$ 6.462.484	8/04/2026	21/04/2026
2002-0000.2026.Multiple.BELISARIO PRESUPUESTO EDS	**147 días**		**$ 299.300.096**	**13/01/2026**	**30/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 16.311.911	13/01/2026	24/01/2026
1.PRELIMINARES	10 días	383CC+5 días	$ 39.792.597	19/01/2026	30/01/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	384FC+12 días	$ 81.480.923	16/02/2026	27/02/2026
3.PINTURA	10 días	387	$ 18.438.505	16/07/2026	30/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	385FC+90 días	$ 19.126.939	3/07/2026	16/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	385	$ 4.162.110	28/02/2026	12/03/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	387CC	$ 17.206.284	3/07/2026	30/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	35 días	383	$ 69.826.606	26/01/2026	10/03/2026
ITEMS NO PREVISTOS	35 días	383	$ 32.954.221	26/01/2026	10/03/2026
2003-0197.2026.Multiple.LA ESTRELLA SILOE-PREPLIEGOS	**90 días**		**$ 306.047.344**	**25/03/2026**	**28/07/2026**
0.GESTION DE OBRA	10 días		$ 16.090.621	25/03/2026	9/04/2026
1.PRELIMINARES	10 días	394CC+5 días	$ 54.709.636	31/03/2026	15/04/2026
2.ESTRUCTURA	10 días	395	$ 83.229.146	16/04/2026	28/04/2026
3.PINTURA	10 días	398	$ 19.181.924	14/07/2026	28/07/2026
4.ELEMENTOS DE LA CANCHA	10 días	396FC+45 días	$ 19.126.939	1/07/2026	14/07/2026
5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	10 días	396	$ 414.524	29/04/2026	12/05/2026
~~6.ATRAQUES BORDILLO~~	~~0 días~~		~~$ 0~~	~~5/01/2026~~	~~5/01/2026~~
99.Provision Ajustes	20 días	398CC	$ 17.594.172	1/07/2026	28/07/2026
ITEMS COMPLEMENTARIOS	30 días	394	$ 49.100.288	9/04/2026	20/05/2026
ITEMS NO PREVISTOS	30 días	394	$ 46.600.094	9/04/2026	20/05/2026

5/01	12/01	19/01	26/01	2/02	9/02	16/02	23/02	2/03	9/03	16/03	23/03	30/03	6/04	13/04	20/04	27/04	4/05	11/05	18/05	25/05	1/06	8/06	15/06	22/06	29/06	6/07	13/07	20/07	27/07
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30



MICHAEL R. SANDOVAL
REP. LEGAL
CONSORCIO CALI DEPORTES

PROGRAMACIÓN PERSONAL

Descripción	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30
	9/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	6/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	4/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	1/06/2026	8/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	6/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	27/07/2026
	15/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	5/04/2026	12/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	3/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	7/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	5/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	30/07/2026
DIRECTOR DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESIDENTE DE OBRA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RTE. ADM. PROG. Y CONTROL DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROFESIONAL SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INSPECTOR SST	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PROFESIONAL SOCIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PERSONAL DE APOYO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PROFESIONAL AMBIENTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUX- AMBIENTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOPOGRAFO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CADENERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MAESTRO DE OBRA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
OBREROS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
FABRICACIÓN EQUIPAMIENTO Y JUEGOS													5	5	5	5	5	5	5	5	5
PINTURA CANCHAS													5	5	5	5	5	5	5	5	5
CAUCHO LIQUIDO													3	3	3	3	3	3	3	3	3
GRAMA SINTETICA													4	4	4	4	4	4	4	4	4
MAQUINARIA (MINICARGADOR)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MAQUINARIA (EXCAVADORA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

MICHAEL R. SANDOVAL
REP. LEGAL
CONSORCIO CALI DEPORTES

ÍTEM	ESCENARIO	TIPO DE OBRA	MATERIAL	PROVEEDOR	FECHA ENTREGA																				
					9/03/2026 15/03/2026	16/03/2026 22/03/2026	23/03/2026 29/03/2026	30/03/2026 5/04/2026	6/04/2026 12/04/2026	13/04/2026 19/04/2026	20/04/2026 26/04/2026	27/04/2026 3/05/2026	4/05/2026 10/05/2026	11/05/2026 17/05/2026	18/05/2026 24/05/2026	25/05/2026 31/05/2026	1/06/2026 7/06/2026	8/06/2026 14/06/2026	15/06/2026 21/06/2026	22/06/2026 28/06/2026	29/06/2026 5/07/2026	6/07/2026 12/07/2026	13/07/2026 19/07/2026	20/07/2026 26/07/2026	27/07/2026 30/07/2026
1	SIETE DE AGOSTO	Juegos Infantiles	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
2	SIETE DE AGOSTO	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
3	JUNÍN	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
4	NUEVA FLORESTA	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
5	ULPIANO LLOREDA	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
6	VILLA DEL LAGO	Cancha sintética	Sub base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Emulsión asfáltica	Asfalto y emulsiones S.A.S.																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
			Iluminación	Claudia Escallón																					
			Malla en Nylon	Nelson Eduardo Zuñiga																					
			Grama sintética	JC Industria Deportiva																					
7	CANDELARIA	Juegos Infantiles	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
			Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					

ÍTEM	ESCENARIO	TIPO DE OBRA	MATERIAL	PROVEEDOR	FECHA ENTREGA																				
					9/03/2026 15/03/2026	16/03/2026 22/03/2026	23/03/2026 29/03/2026	30/03/2026 5/04/2026	6/04/2026 12/04/2026	13/04/2026 19/04/2026	20/04/2026 26/04/2026	27/04/2026 3/05/2026	4/05/2026 10/05/2026	11/05/2026 17/05/2026	18/05/2026 24/05/2026	25/05/2026 31/05/2026	1/06/2026 7/06/2026	8/06/2026 14/06/2026	15/06/2026 21/06/2026	22/06/2026 28/06/2026	29/06/2026 5/07/2026	6/07/2026 12/07/2026	13/07/2026 19/07/2026	20/07/2026 26/07/2026	27/07/2026 30/07/2026
8	MARROQUÍN	Juegos Infantiles	Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
9	PUERTAS DEL SOL	Juegos Infantiles	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
10	UND. RECREAT. EL VALLADO	Juegos Infantiles	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
11	EL VALLADO	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
12	EL VALLADO	Juegos Infantiles	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
13	COMUNEROS	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
14	MOJICA LAS GEMELAS	Juegos Infantiles	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
15	BAJO CIUDAD CÓRDOBA	Juegos Infantiles	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
			Base	Volmak Sumitransportes																					

ÍTEM	ESCENARIO	TIPO DE OBRA	MATERIAL	PROVEEDOR	FECHA ENTREGA																				
					9/03/2026 15/03/2026	16/03/2026 22/03/2026	23/03/2026 29/03/2026	30/03/2026 5/04/2026	6/04/2026 12/04/2026	13/04/2026 19/04/2026	20/04/2026 26/04/2026	27/04/2026 3/05/2026	4/05/2026 10/05/2026	11/05/2026 17/05/2026	18/05/2026 24/05/2026	25/05/2026 31/05/2026	1/06/2026 7/06/2026	8/06/2026 14/06/2026	15/06/2026 21/06/2026	22/06/2026 28/06/2026	29/06/2026 5/07/2026	6/07/2026 12/07/2026	13/07/2026 19/07/2026	20/07/2026 26/07/2026	27/07/2026 30/07/2026
16	CIUDAD 2000	Juegos Infantiles	Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
17	SANTA ANITA	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
18	CIUDAD CAPRI	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
19	LA PLAYA	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
20	LOURDES	Juegos Infantiles	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
21	LOURDES	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
22	LA CAROLINA	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Pantallas de protección	Wilson Diaz																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
23	BELISARIO	Juegos Infantiles	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Piso en caucho líquido	Sportgreen Arquit. Deportiva																					

ÍTEM	ESCENARIO	TIPO DE OBRA	MATERIAL	PROVEEDOR	FECHA ENTREGA																				
					9/03/2026 15/03/2026	16/03/2026 22/03/2026	23/03/2026 29/03/2026	30/03/2026 5/04/2026	6/04/2026 12/04/2026	13/04/2026 19/04/2026	20/04/2026 26/04/2026	27/04/2026 3/05/2026	4/05/2026 10/05/2026	11/05/2026 17/05/2026	18/05/2026 24/05/2026	25/05/2026 31/05/2026	1/06/2026 7/06/2026	8/06/2026 14/06/2026	15/06/2026 21/06/2026	22/06/2026 28/06/2026	29/06/2026 5/07/2026	6/07/2026 12/07/2026	13/07/2026 19/07/2026	20/07/2026 26/07/2026	27/07/2026 30/07/2026
			Juegos infantiles	RM Ingeniería																					
24	BELISARIO	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Pantallas de protección	Wilson Diaz																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
25	LA ESTRELLA - SILOÉ	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
26	LOS ALAMOS	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
27	LA MERCED	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
28	LA ISLA	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
35	CALIMIO NORTE	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					
36	POBLADO I	Cancha múltiple	Base	Volmak Sumitransportes																					
			Roca muerta	Volmak Sumitransportes																					
			Geotextil	Distribuciones PVC																					
			Tubería PVC	Coval Comercial																					
			Cemento	Cementos Argos																					
			Arena	Volmak Sumitransportes																					
			Grava	Volmak Sumitransportes																					
			Acero y mallas	Hierros GyJ / Aceros y Mallas																					
			Recubrimiento en pintura	AyS Señalizaciones																					
			Dotación deportiva	RM Ingeniería																					

MICHAEL R. SANDOVAL

ÍTEM	ESCENARIO	TIPO DE OBRA	MATERIAL	PROVEEDOR	FECHA ENTREGA																		
					9/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	6/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	4/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	1/06/2026	8/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	6/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	27/07/2026
					15/03/2026	22/03/2026	29/03/2026	5/04/2026	12/04/2026	19/04/2026	26/04/2026	3/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	7/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	5/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	30/07/2026

REP. LEGAL
CONSORCIO CALI DEPORTES
