Domingo, 15 de marzo 2026

No se realizan actividades

Martes 17 de Marzo

Se evidencia que uno de los puntos de nivel para la fundida de la placa se encuentra caido. Siendo la 1:00 pm se solicita al contratista la verificación del nivel con manguera, para la correcta fundida. Desde la direcaón de interventoria se deja estableado que, en caso que el nivel de la cancha no cumpla con las especificaciones tecnicas regeridas, no se permitira la ejecución de un alistado como solución correctiva. En su lugar, se debera proceder con la demolición y reconstrucción para garantizar la correcta ejecución de la placa.

Paula Martinez
Residente de Interventoria

Inspectora.

Norma


Scanned with CamScanner

Durante la fundida de la placa, se presento un inconveniente, debido a que el concreto premezclado de planta no fue suficiente para completar el vaciado con el metodo inicialmente previsto. Por esta razon fue necesario ajustar el procedimiento y realizar para una parte de la placa preparación del concreto de manera manual en obra. Para ello se utilizó una dosificacion de 3 bultos de Mixto por 2 bultos de Cemento

- Observacion de obra: se realiza cuantificación de concreto con una relación 1:1:1 para una resistencia superior de ≈ 4000 PSI superando la resistencia de la placa.

Paula Residente Interventoria

Bryan Ins obra.

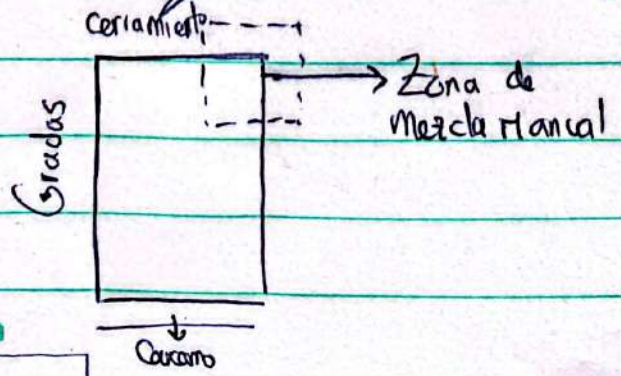

Norma

Miercoles 18 marzo 2026

personal: SST

2 ayudantes

Actividades:

se realiza desencofrado y limpieza de formaletas. se ejecuta limpieza del área externa donde estuvieron los vehiculos de concreto.

inspectora interventoría Diosmery García Muñoz

- Se realiza cimbrado de cortes de acuerdo a esquema enviado anteriormente se concilia y se muestra cortes con residente de interventoria.
- Se realiza retiro de helicoptero y formaleta.

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves 19 marzo, 2026.

No se encontraba personal y no se logro avanzar en las actividades.

inspector de intervenlaria.

Viernes 20 marzo, 2026

personal:

2 ayudantes.

Actividades:

se realiza la ejecución de juntas de dilatación en el área intervenida.

inspector intervenlaria.

Norma

Sabado 21 marzo 2026

no se avanzaron actividades, ya que no se encontraba en el sitio al personal de obra.

inspector de interventoria

Domingo 22 marzo 2026

NO se realizan actividades

Inspector de interventoria.

Lunes 23 marzo, 2026

NO se realizan actividades, ya que era día festivo.

Norma

Scanned with CamScanner

martes 24 de marzo, 2026.

No se registran actividades debido a la ausencia de personal en obra.

inspector de interventoria.

Miercoles 25 de marzo, 2026.

Durante la jornada no se ejecutaron actividades, ya que no se contó con personal en el sitio.

inspector interventoria.

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves 26 de marzo, 2026

No se evidencian actividades en obra por falta de personal.

inspector interventoria.

Viernes 27 de marzo, 2026

No se registran actividades durante la jornada, ya que no se encontraba personal en obra.

inspector interventoria.

sabado 28 de marzo, 2026.

No se avanzaron las actividades, ya que no habia personal de obra.

inspector interventoria.

Norma

Scanned with CamScanner

Domingo 29 de marzo, 2026

No se realizan actividades.

Lunes 30 de marzo, 2026.

No se realizan actividades, ya que no se encontraba personal de obra.

inspector interventoria.

martes 31 marzo, 2026.

ourante la jornada no se realizaron actividades.

inspector interventoria.

Norma

Miercoles 1 de abril, 2026.

No se realizaron actividades, ya que no se encontraba personal de obra.

inspector interventoria.

Jueves 2 de abril, 2026.

No se realizaron actividades en obra debido a ser festivo por semana santa.

inspector interventoria.

Viernes 3 de abril, 2026

No se adelantaron actividades, debido a la suspensión de labores por festivo correspondiente a semana santa.

inspector interventoria.

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes 2 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Ayudante de Obra

Se realiza inicio de actividad de nivelación en de sub base.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 3 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Oficial
1 Ayudante

Se continua con la actividad de nivelación de Sub base.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 4 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Oficial
1 Ayudante

Se continua con la actividad de nivelación de Sub base

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 5 de marzo de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de Obra.
1 Oficial
1 Ayudante

Se termina actividad de nivelación de Sob base y se procede a realizar la actividad de replanteo del urbanismo.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 6 de marzo de 2026

Personal de Obra. - Sin personal

No se labora por motivos de preparación del cdegio en elecciones de Congreso.

Res. Obra

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 8 de marzo de 2025

Personal de Obra: Sin personal

Preparación del colegio para elecciones del congreso

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 9 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Residente de Obra
1 Residente de Interventoria
1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventoria
1 Encargado de Obra.


Se realiza replanteo, con el fin de ubicar puntos de referencia, que garanticen la correcta ejecución de las actividades referidas a la zona dura en adoquin y la estructura de la cubierta.

Se plantea que el adoquin a instalar en la zona dura siga la secuencia del adoquin existente y no como se planteo en el diseño y se aprueba por el residente de interventoria y el residente de Obra.

Norma

Powered by CamScanner

Concha multiple.

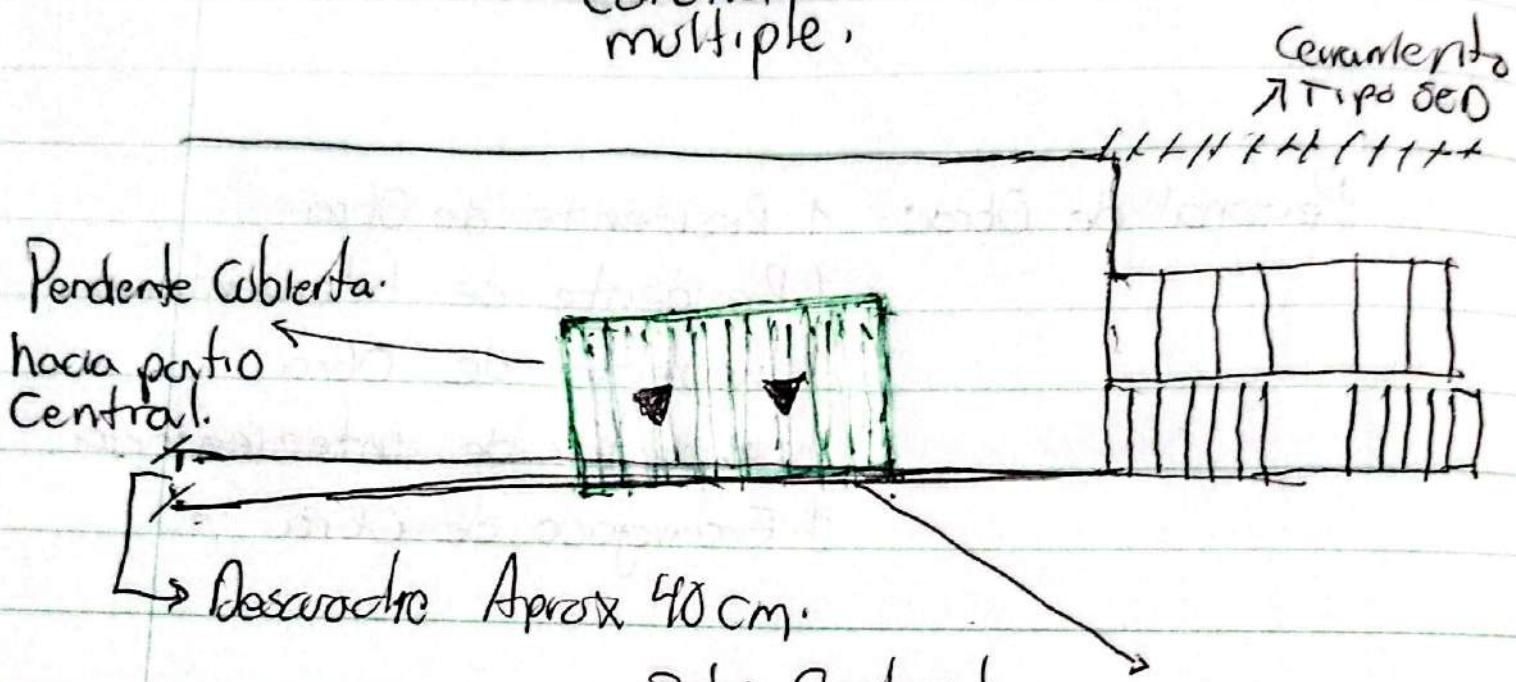

Ubicacion cubierta policarbonato. siguiendo la misma linea que trae. el adoquin existente del patio central.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 10 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventoría
1 Maestro
1 Ayudante

Partiendo de que se definio como se ejecutará la zona dura, se inicia el trasiego de arena de rio para nivelación del adoquín y se se empieza a instalar.

La lluvia afecta la continuidad de las actividades sin embargo se trabaja en la actividad.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 11 de marzo de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
1 Maestro de Obra
1 Ayudante.

Se continua con el trasiego de arena y adoquín a la zona de instalación y procede a su respectiva instalación.

Las lluvias afectan el rendimiento de las actividades.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 12 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
1 Ayudante

Se continua con las actividades correspondientes a la zona dura en adoquín.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 13 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventoria
1 Maestro
1 Ayudante

Se continuan con las actividades correspondientes a la zona dura en adoquín

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 14 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
1 Ayudante

Se continuan con las actividades correspondientes a la zona dura de adoquín.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 16 marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Intervención
1 Maestro

Se continua con la actividad de correspondiente a la zona dura en adoquín

Norma

Powered by CamScanner

Martes 17 de marzo de marzo

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro

Se continua con la actividad correspondiente a la zona dura en adoquín

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 18 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de interventoria
1 Maestro

Se continua con la actividad correspondiente a la zona dura en adoquin.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 19 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventoria
1 maestro

Se continua con la actividad correspondiente a la zona dura en adoquiny se finaliza esta actividad.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 10 de Abril de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventoria
1 Maestro.

Se inicia actividad de fundida de cintas de confinamiento adoquin

Norma


Powered by CamScanner

Sabado 21 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
1 Maestro
1 Oficial

Se continua con la actividad correspondiente a la fundida de cintas de confinamiento de adoquin.

Se realiza la actividad correspondiente a la fundida de pedestales en concreto armado de 3000 PSI.

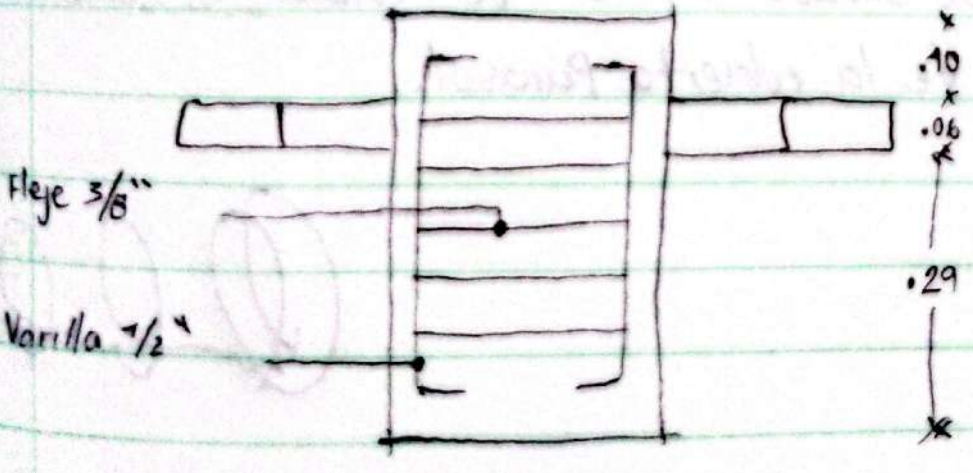

Powered by CamScanner

Martes 24 de Marzo de 2026

Personal de obras: 1 Inspector de obra
1 Inspector de interventoria
1 Maestro

Se continua con la actividad correspondiente a la fundida de cintas de confinamiento de adoquín.

Se realiza curado de pedestales en concreto y se plante en comite de obra dejar minimo 8 dias de secado antes de instalar la estructura metalica de la cobierta Parasol.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 25 de Marzo de 2026.

Personal de Obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de Obra
1 Maestro.

Se continua con la actividad correspondiente a la fundida de cintas de adoquin.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 26 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventoria
1 Maestro

Se continua con la actividad correspondiente a la fundida de cintas de confinamiento de adoquín

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 27 de marzo

Personal de obra. 1 inspector de Obra
1 Inspector de interventoria
1 maestro

Se continua con la actividad correspondiente a la fundida de cintas de confinamiento de adoquin y se finaliza.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 28 marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventoria
1 Maestro

Se realiza emboguillado de adoquin en toda el area ejecutada.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 30 de marzo de 2026

Personal de Obra: 2 Ornamentadores.
1 Inspector de Obra.

Se inicia actividad de estructura metalica para cubierta parasol, se dejan izados los perfiles de 70x70 cm CAL 14.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 31 de marzo de 2026

Personal de Obra: 2 Ornamentadores
1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventoria.

Se continua con la actividad de instacion de estructura metalica para cubierta parasol.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes, 2 de Marzo 2026
Personal en obra 2 oficiales

Se continua con instalacion de enchape en divisiones de baños.
Se continua con arreglo de filos

Martes 3 de Marzo 2026
personal en obra 1 oficial

Se continua con la instalacion de enchape en divisiones de baños.

Powered by CamScanner

Miercoles, 4 Marzo 2026
personal en obra 3 Oficiales

Se continua con instalación de enchape en divisiones de baño
Se inicia aplicacion de pañete de muros Externos de los baños.

Jueves, 5 Marzo 2026
personal en obra 3 oficiales.

Se continua con instalacion de enchape en divisiones de baño
Se continua con pañete de muros externos.

Powered by CamScanner

Viernes, 6 Marzo 2026
personal en obra 4 oficiales

Se continua con instalacion de enchape en divisiones de baño y pañete en muros Exteriores.

Sabado 7 de Marzo 2026
personal en obra 2 oficiales.

Se inicia instalacion de pañete en alberca ubicada fuera de los baños

Powered by CamScanner

LUNES 9 Marzo 2026
Personal en obra 3 Oficiales.

Se inicia con enchape de mora lavamanos baño de hombres.
Se continua con arreglo de filos y viga

Martes, 10 Marzo 2026

Se continua con enchape de alberca y divisiones de baño.
Se continua con el arreglo de filos.

Powered by CamScanner

Miercoles, 11 Marzo 2026
Personal en Obra 3 Oficiales.

Se continua con instalacion de pañete en baños.

Jueves 12 Marzo 2026
personal en obra. 3 Oficiales.

Se continua con Pañete en muros internos y externos de los baños.
Se continua con enchape de Alberca.

Powered by CamScanner

Viernes, 13 Marzo 2026
personal en obra 4 oficiales.

Se continua con enchape en la alberca
Se continua con arreglo de filos.
Se emboquilla la alberca.

Sabado, 14 Marzo 2026
Personal en obra. 4 oficiales.

Se inicia destronque de piso en baños
Se continua con arreglo de filos.

Powered by CamScanner

Lunes 16 Marzo 2026
personal en Obra 5 oficiales.

Se continua con destrongue de piso.
Se continua con el arreglo de filos

Martes, 17 Marzo 2026.
personal en Obra 4 oficiales.

Se continua con instalacion de pañete en filos.
Se continua con destrongue de piso.

Powered by CamScanner

Miercoles 18 marzo 2026
personal en obra. 4 oficiales.

Se continua con arreglo de filos.
Se continua con destiangue de pisos.

Jueves 19, Marzo 2026
personal en obra 4 oficiales.

Se continua con arreglo de filos
Se continua con pañete en muros
Se realiza aseo General del destiangue

Powered by CamScanner

Viernes, 20 marzo 2026
Personal en obra 3 Oficiales.

Se realiza verificacion de Vanos de Ventaneria y puertas.
Se continua con boñete de muros
Se inicia instalacion de estuco en muros internos

Sabado, 21 marzo 2026
Personal en obra 3 Oficiales.

Se continua con instalacion de estuco en muros internos de baños.

Powered by CamScanner

Martes, 24 Marto 2026
personal en obra 2Oficiales

Se continua con instalacion de pañete en muros externos de baños
Se continua con instalacion de pañete en muros interios de baños.

Miercoles, 25 Marto 2026
Personal en obra 3 Oficiales.
Se continua con estuco en muros interios de baños.

Powered by CamScanner

Jueves, 26 marzo 2026
personal en obra 3 Oficiales

Se continua con estuco en Muros internos de los baños.
Se realiza Verificacion de medidad de baños para instalacion de ventaneria.

Se realiza consulta en pintura en vinilo tipo 1 en baños en parte interna, donde se aprueba por parte de interventoria

Bryan Ing obra


Viernes 27 de Marzo de 2026.

Se realiza visita de verificación por parte del Ing. Estructural y la Directora de Interventoria, con el fin de definir el alcance de la intervención a la zona del Hall central esto en respuesta a que en los proximos dias el Contratista de Obra iniciará labores en la circulación lo que incluye Adecuación de la estructura existente y cambio de cubierta; una vez evidenciadas las condiciones existentes se recomienda:

1. Remplazo de cubierta en su totalidad.
2. Cambio de listones en madera apectados.
3. Instalacion de correas intermedias en perfileria 10 x 5 x 2mm calzado a nivel de la Cubierta.
4. Instalacion de lamina de 1/8" sobre soporter de cubierta existente.

Powered by CamScanner

5 Elemento tipo "U" en lamina de 1/8" incerlida instalada sobre los listones intermedios con varilla roscada y/o pernos de 3/8"

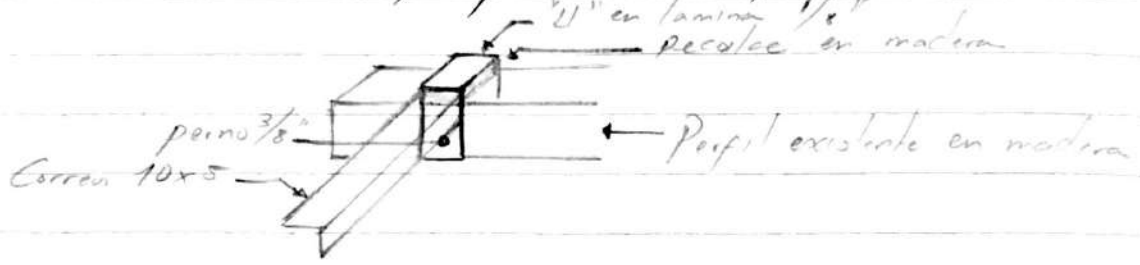

6. Aplicación de Revestimiento para madera para sellado y protección.

NOTA: Se aclara que la visita se realiza en Compañia del contratista de Ob

Firma

Lorena Rodriguez
Directora de Interventoria

Acompañamiento

Feiby López Paez
Residente Obra

Especialista Estructural Interv.

Sabado, 28 de Marzo 2026

Personal en obra: 2 oficiales
2 Ayudantes

Se continua con estucado y pintado de Muros internos del baño. Adicionalmente se realiza la extracción de residuo vegetal restante de la tala de arboles.

Powered by CamScanner

Lunes, 30 Marzo 2026
Personal en obra : 1 oficial
2 ayudantes

Se continua con el poretado en muros exteriores y remates de enchape en la parte interior de los baños

Martes, 31 Marzo 2026

No se evidencia personal realizando Actividades.

Powered by CamScanner

Miercoles, 01 Abril 2026

No se evidencia personal laborando.

Jueves, 02 Abril 2026

No se realizan actividades por dia festivo.

Powered by CamScanner

Lunes, 2 de Marzo 2026.

Personal: 2 oficiales
1 ayudante

Actividades:

Se realiza anclajes y amarrado de acero en columnetas y viguetas en ventana.

Se realiza excavación de placa en zona de circulación de shut-patio

Norma

Powered by CamScanner

Martes, 3 de Marzo 2026

Personal : 2 oficiales
1 Ayudante

Actividades:

- El día de hoy se realiza armado de acero y formaleteada de columnetas y viguetas.

- Se continuo con la fundida de Columnetas y vigueta en ventanas de cuarto de musica.

- Se continua con excavación de terreno natural en zona de circulación

Miercoles, 4 de Marzo 2026

Personal : 2 oficiales
1 Ayudante
1 Inspector obra

Actividades

- Se continua la excavacion en la zona de circulacion.

- Se finaliza la excavacion y inicia el extendido de geotextil NT1600

- Se procede a llenar con material de relleno de subbase granular en zona de circulacion.

Powered by CamScanner

Jueves, 5 marzo 2026

Personal: 1. oficial
2 ayudantes

Actividades:
- Se ingresa material de agregado y cemento para circulación.

- Se ingresa malla electrosoldada 5mm

- Se funde placa de circulación

Powered by CamScanner

Viernes 6 marzo de 2026

Personal : 1 oficial
1 ayudante

Actividades

- Se realiza descimbrado de placa de circulación.

- Se instala paneles de vanos en ventanas aula música

Powered by CamScanner

Sabado 7 marto 2026

Personal

1 ayudante
3 oficiales
1 SST

Actividades:

- Se realiza aseo de obra y rellena con material seleccionado a los costados de circulación.

Powered by CamScanner

Martes 10 marzo 2026

Personal

1 oficial
1 Ayudante

Actividades:

- Se realiza panete de puertas y continua en vanos en ventanas del espacio aula musica.

Miercoles, 11 Marzo 2026

No se encuentra personal debido a traslado y refuerzo de actividades en otra sede.

Powered by CamScanner

Jueves, 12 marzo 2026

A la hora 11:13 am del día, se evidencia el frente sin personal, sin avances, con botones actividades por ejecutar se efectúa el llamado atención al contratista de obra e interventoría, quien de el apoyo a la supervisión requiere en plaz no mayor a 1 Día, espacio reporte de avances (13 marzo de 2026). Incluya personal de obra. y se continue con la programación contenta de actividades.

Apoyo supervisión
Ocaee - SED

Se realiza visita de verificación y se evidencian ausencias de personal operativo / técnico; la Interventoría solicita al contratista. retomar labores y realizar trabajos de aseo, recolección y retiro de material

de Obra; labores en aula de Música lo que incluye pintura de estructuras de pintura sobre perfilería metálica; tabicación de ventanas; labores de mampostería de pared en pilar; rejas generales, labores de pintura. instalación de puerta de acceso: en la zona que comunica al shut. se requiere intervención y finalización de las obras de urbanismo y labores para la Conformación y construcción del shut. finalmente se le solicita al contratista retomar las labores en el bloque lo que incluye impermeabilización de la placa existente con manto asfáltico; no olvidar el Bordillo solicitado por la SED. ubicado como remate de la plazoleta Central de Juegos.

Arq. Jurema Rodríguez
Directora de Interventoría.

Viernes, 13 Marzo 2026

Personal: 1 oficial

Actividades:

Se realiza estuco de aula de musica.

Powered by CamScanner

Sabado, 14 marzo 2026

Personal 1 oficial

- Se continua con el estuco de pintura de aula de musica.

Powered by CamScanner

Lunes, 16 Marzo 2026

Clima: Lluvioso

Personal: 1 oficial
1 Ayudante

Se realiza estuco de vanos
en puertas.

Powered by CamScanner

Martes 17 Marzo 2026

Personal

2 Oficiales
1 Ayudante

Actividades

- Se realiza destroncado de piso en aula de musica.

- Se encera piso de aula de musica.

Powered by CamScanner

Miercoles, 18 Marzo 2026

Personal: 1 ayudante

Se realiza estucado en el interior del baño de profesores. Se realiza cobertura del pvc del Salon de Musica para realizar estucado y Pintado del mismo.

Powered by CamScanner

Jueves, 19 de Marzo 2026
personal: 1 oficial
1 Ayudante

Se realiza excavacion manual para acondiciona-miento en la zona del Shut.
Se realiza tañetado y afinado de la verbena del baño de profesores.

Vieines, 20 Marzo 2026
Personal: 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con excavación manual para la tuberia de Salida del shut, de aguas lluvias.

Powered by CamScanner

Sabado, 21 de Marzo 2026

Personal 2 Oficiales

Actividades:

- Se realiza excavación de tubería para bajante de aguas lluvias y aguas sanitarias del shut.

- Se instala tubería sanitaria con su cama de arena.

Powered by CamScanner

Lunes, 23 de Marzo 2026

No se laboro por ser un día festivo

Martes, 24 de Marzo 2026

Personal: 2 oficiales

- Se instala malla electrosoldad
- Se funde placa de contrapiso para shut.
- Se realiza desmonte puertas.

Powered by CamScanner

Miercoles, 25 de marzo 2026

Personal 2 oficiales

Actividades:

- Se realizan instalación de ventanería en aula de musica y baños de Profesores.

- Se continua con filos de puertas de baños de profesores, aulo de aseo y cuarto deportivo.

Powered by CamScanner

Jueves, 26 marzo 2026

Personal 2 oficiales

- Se realizan actividades de estuco y filos de puertas.

- Se realiza pintura de muros. en aula de musica.

Viernes, 27 de Marzo 2026
personal: 1 oficial y 1 ayudante

Se realiza lijado en el interior del salon de musica y se continuara con la aplicacion de la primer mano de pintura del mismo.

Powered by CamScanner

Sabado, 28 de Marzo 2026
Personal: 1 oficial y 1 ayudante

Se realiza instalación del Marco de la caja de inspeccion y se realiza la fundida de la tapa de la caja.
Se corrijen detalles de Pintura en el Salon de musica.

Lunes, 30 de Marzo 2026
Personal: 1 oficial y Ayudante.
Se realiza adecuacion del bordillo de la entrada al Salon de Musica.
Se realiza Jornada de aseo y limpieza.



Powered by CamScanner

Martes 31 Marzo 2026
Personal: 2 oficiales
2 Ayudantes

Se realiza Instalacion del Manto protector en las placas de las cubiertas del Salon auditorio y cuarto de Almacenamiento.
Se continua con estucado en los techos del baño de Profesores.

Miercoles, 1 de Abril 2026
Personal: 1 oficial y 1 ayudante

Se continua con la instalacion del Manto protector.

Powered by CamScanner

Jueves, 02 de Abril 2026

No se realizan actividades por día Festivo.

Powered by CamScanner

Lunes 2 de marzo de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
1 Oficial
1 Ayudante.

Se realiza desencofrado de los elementos estructurales fundidos, entre viernes y sabado.

Se termina encofrado de placa de contra piso para shut de basuras.

Se realiza excavación faltante para el bordillo fundido in situ, asi como tambien se realiza el armado de refuerzo para el bordillo.

Se realiza curado de concreto 3 veces por dia.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 3 de marzo de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoría
1 Oficial
1 Ayudante

Se extiende plastico Negro (Polietileno) en zanja para bordillo, se ancla a bordillo existente, el armado del nuevo bordillo mediante un anclaje epoxico.

Se realiza actividad de encofrado para bordillo y se funde con concreto de una resistencia de diseño de $f'c = 3000$ PSI con un espesor de 15 cm

Se realiza curado de concreto 3 veces por dia.

Norma


Powered by CamScanner

Miercoles 4 de marzo de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
1 Oficial
1 Ayudante

Se realiza extendido de malla electrosoldada en circulación que comunica a shut de basuras, en placa de contrapiso de shut y rampa.

Se realiza regata en circulación existente para conectar el tanque de reserva existente con el que se instalará, en una tubería de 1".



Norma

Lunes 2 de marzo de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
1 Oficial
1 Ayudante.

Se realiza desencofrado de los elementos estructurales fundidos, entre viernes y sabado.

Se termina encofrado de placa de contra piso para shut de basuras.

Se realiza excavación faltante para el bordillo fundido in situ, asi como tambien se realiza el armado de refuerzo para el bordillo.

Se realiza curado de concreto 3 veces por dia.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 3 de marzo de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
1 Oficial
1 Ayudante

Se extiende plastico Negro (Polietileno) en zanja para bordillo, se ancla a bordillo existente, el armado del nuevo bordillo mediante un anclaje epoxico.

Se realiza actividad de encofrado para bordillo y se funde con concreto de una resistencia de diseño de $f'c = 3000$ PSI con un espesor de 15 cm

Se realiza curado de concreto 3 veces por dia.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 4 de marzo de 2026

Personal de obra:
1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
1 Oficial
1 Ayudante

Se realiza extendido de malla electrosoldada en circulación que comunica a shut de basuras, en placa de contrapiso de shut y rampa.

Se realiza regata en circulación existente para conectar el tanque de reserva existente con el que se instalara, en una tubería de 1".

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 5 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria a
1 Inspector de SST
1 Maestro
2 Oficiales
1 Ayudante

Se realiza actividad de fundida de circulación que conecta al shot de basuras, rampa de acceso y placa de contrapiso para shot de basuras.

El mezclado se realiza en sitio mediante mezcladora mecánica (Trompo de 1 bolto). Durante el proceso se tomaron 3 testigos cilindricos de concreto para ensayos de resistencia a la compresión


Norma

Powered by CamScanner

Especificaciones Técnicas

Se realizo la fundición con un concreto con una resistencia de diseño de $f'c = 3000$ PSI, con espesor de 10 cm.

Para el refuerzo. Se utilizo malla electrosoldada

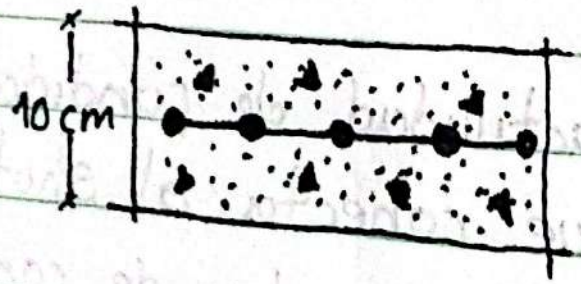

Powered by CamScanner

Viernes 6 marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
1 Oficial

Se realiza actividad de desencofrado de los elementos estructurales fundidos.
Se realiza enlonado de material sobrante para su salida de Obra.

Se realiza aseo de Obra.


De acuerdo a las actividades realizadas de estructura, se procede a contemplar el cerramiento en malla y la cubierta del tanque de reserva.

Norma

Powered by CamScanner

El cerramiento se contempla a una altura de 2.4 m en el perimetro del area de tanque de reserva.

La cubierta se contempla en la misma dirección de las cubiertas existentes.

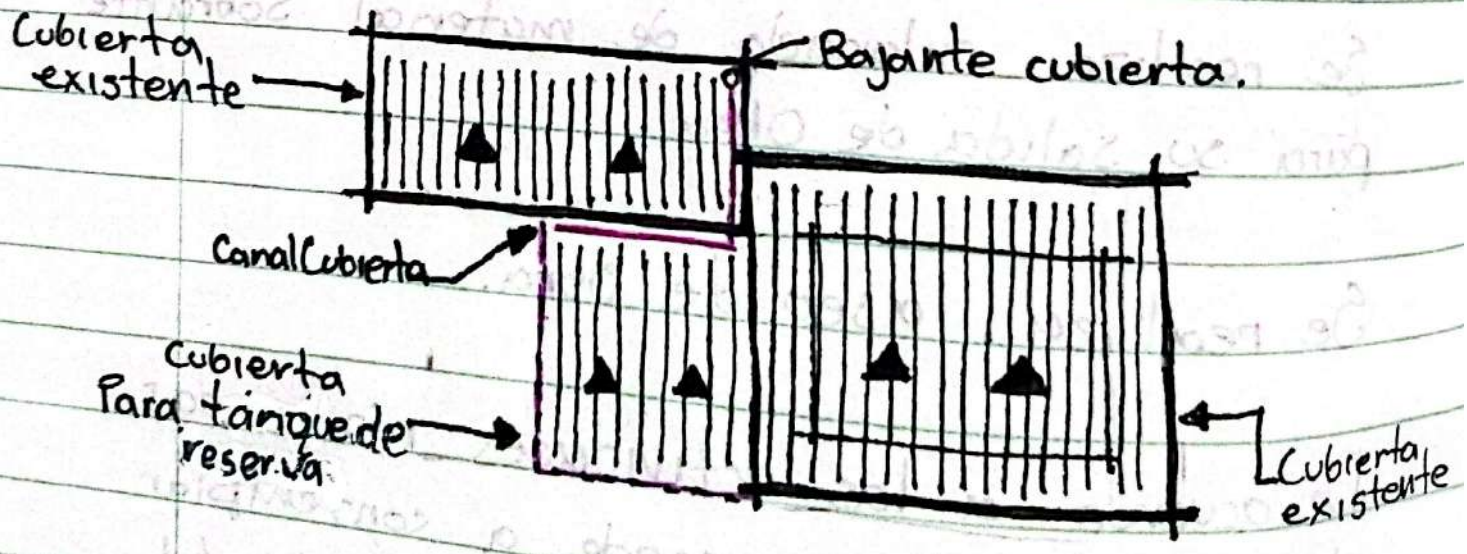



Norma

Powered by CamScanner

1

Esquema cerramiento para tanque de reserva

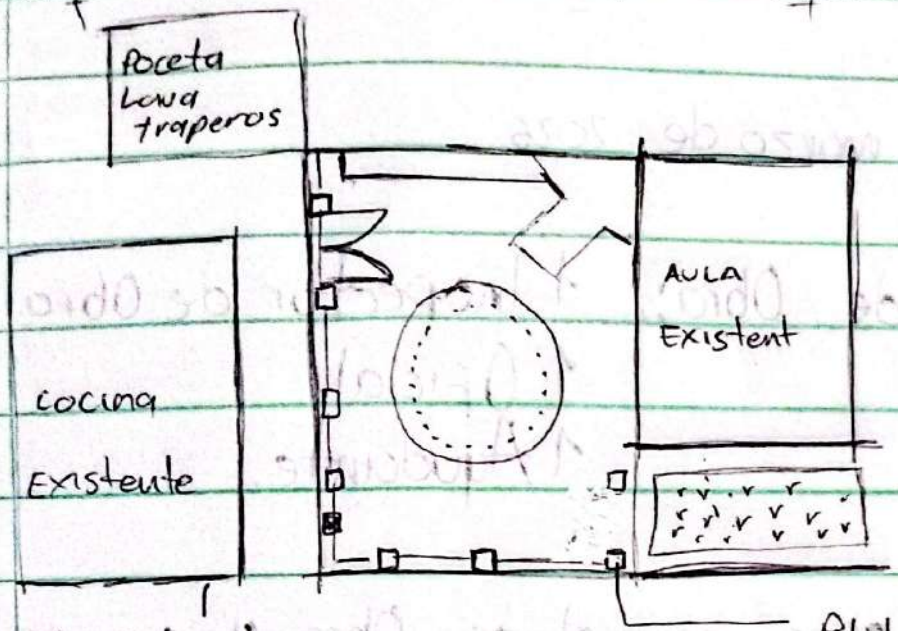

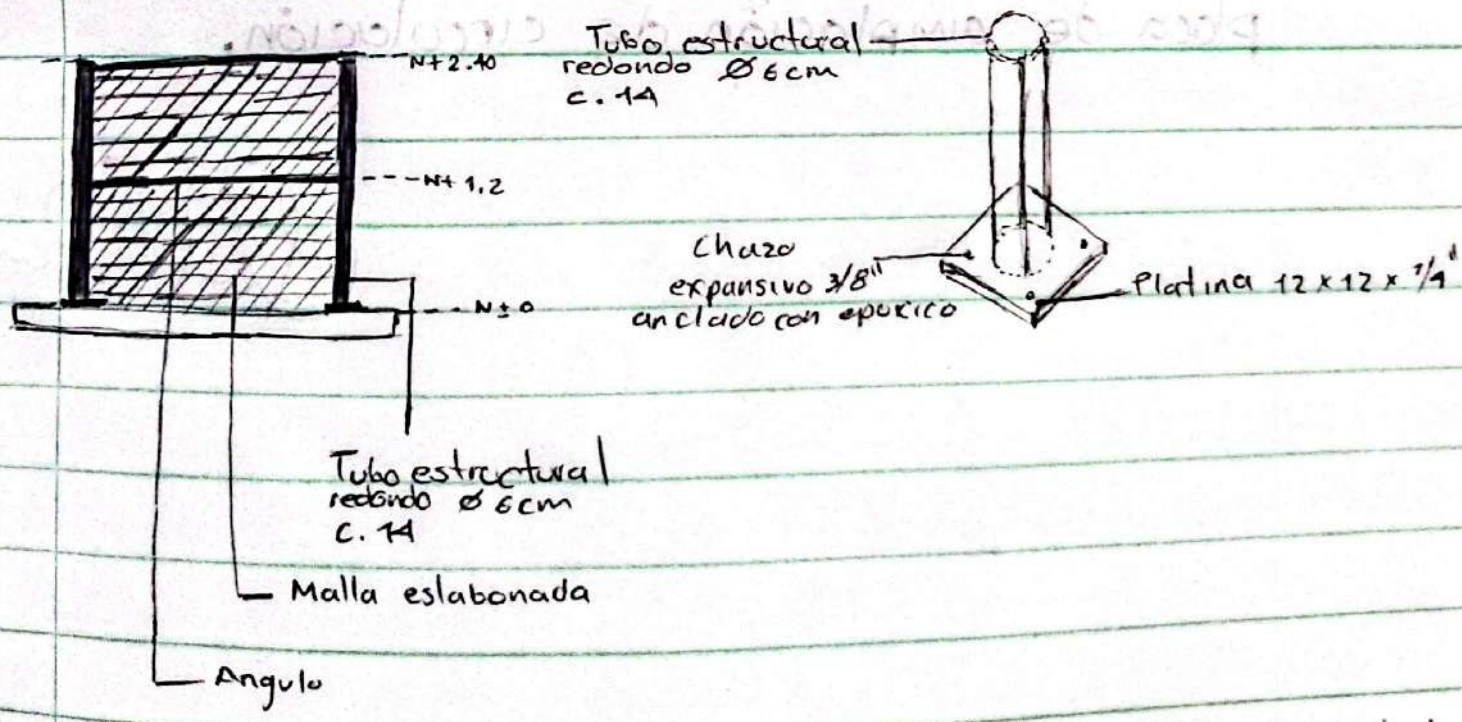

Se deja radicado este esquema, bajo la aprobación del residente de interventoria.

Sabado 7 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Oficial
1 Ayudante.

Se realiza aseo general de Obra y curado de placa de ampliación de circulación.

Powered by CamScanner

Lunes 9 de marzo de 2026.

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
1 Ornamentador

Llega estructura metalica a obra, se inicia actividad de aplicación de anticorrosivo en pefiles,

Se ven interrumpidas las actividades por lluvias, lo cual no ha dejado trabajar con el rendimiento esperado

Norma

Powered by CamScanner

Martes 10 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
1 Ornamentador

Se continua con la 2 mano de anticorrosivo en estructura metalica.

Se ven interrumpidas las actividades por lluvias, lo cual no ha permitido que se trabaje con el rendimiento adecuado

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 11 de marzo de 2026.

Personal de Obra: 1. Inspector de Obra
1 Inspector de interventaría
1 Ornamentador.

Se continua con la 3 mano de anticorrosivo en estructura metalica.

Se ven interrumpidas las actividades por lluvias, lo cual no ha permitido que se trabaje con el rendimiento adecuado.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 12 de marzo de 2026.

Personal de obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoría
1 Ornamentador.

Se realiza despece de elementos estructurales para shut de basuras, se procede a cortar tuberías a la medida y se perforan platinas para anclajes en placa contrapiso.

Por lluvias se interrumpe constantemente las actividades afectando el rendimiento.

Norma

Powered by CamScanner

(13)

Viernes 13 de marzo de 2026

Personal de Obra. 1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventa
1 Ornamentador

Al finalizar los cortes en estructura metalica para shut de basura, se inicia con la aplicación de anticorrosivo en estructura de tanque de reserva.

Por lluvias se interrumpe constantemente las actividades afectando el rendimiento

Norma

Powered by CamScanner

(14)

Sabado 14 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Interventor.
1 Ornamentador.

Se continua con la segunda mano de anticorrosivo en la estructura metalica de cubierta para tanque de reserva y su cerramiento.

Por lluvias se interrumpe constantemente las actividades afectando su rendimiento

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 16 de marzo de 2026

Personal de Obra: · 1: Inspector de obra
· 1 Inspector de interventoria
· 1 Ornamentador

Se aplica la 3 mano de anticorrosivo a la estructura metalica de la cubierta para tanque de reserva y su cerramiento.

Por lluvias se interrumpe constantemente las actividades afectando su rendimiento.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 17 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
1 Ornamentador

Se realiza despiece de elementos estructurales para cobierta de tanque de reserva y su cerramiento, se procede a cortar piezas a la medida.

Por lluvias se interrumpen constantemente las actividades afectando su rendimiento

Miercoles 18 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 ornamentador.

Se cancelan actividades por lluvia constante a las 11:00 am, desde el inicio de la jornada no paran y debido a eso se cancelan.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 19 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventor
2 Ornamentadores


Se inicia instalación de platinas en placa de contrapiso de shut de basuras y se procede a izar perfiles 8x4 empachados que servirán de refuerzo para los muros de soperboard.

Powered by CamScanner

Viernes 20 de marzo de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
2 Ornamentadores.

Se continua con la instalación de estructura metalica en shut de basuras y se contempla adicionalmente en la estructura de la cubierta del mismo un perfil de forma transversal para dar mayor rigidez a la cubierta,

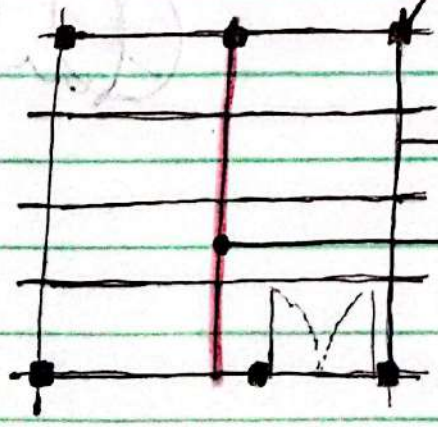


ESQUEMA ESTRUCTURA CUBIERTA


Sabado 21 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
2 Ornamentadores
1 Oficial

Se detalla cordones de soldadora en estructura de shut de basuras y se pule la escoria de los mismos.

Por otro lado se pañeta Bordillo de confinamiento para rampa de shut de basuras.



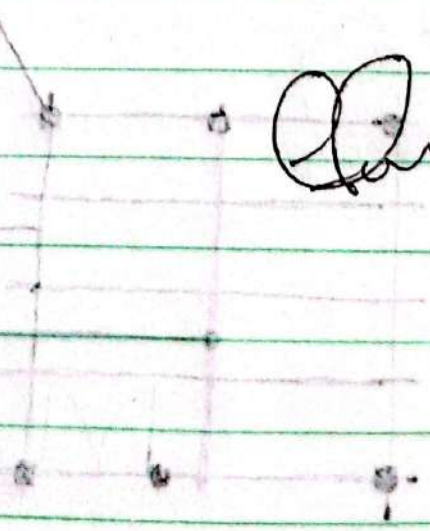

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 23 de marzo de 2026

Personal de Obra:

No se realizan actividades por lunes festivo.

Norma

Powered by CamScanner

(24)

Martes, 24 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de obra.
1 Inspector de Interventoría
1 Oficial.
2 Ornamentador.

Placa de circulación deteriorada en la zona media por agua de bajante. Colocada lona de arena para desviar agua, pero salpica y moja la placa, con humedad persistente y tonalidad oscura. Interventoría había solicitado corrección previa, se sugiere hacer corrección de lo contrario no se recibirá la circulación.

Firma:
Hugo ANDRES CABRERA.
Interventoría: H.C.

Observacion Inspector de Obra


De acuerdo a la solicitud de la interventoria se deja en bitacora que al recibir la primera solicitud de subsanar la gotera generada por la cancelación de la bajante de la cubierta de cocina, estas bajantes se cancelaron por motivo de ampliación de cubierta y se subsana la gotera puntual, dejando una lona de arena con el fin de que la gotera no caiga directamente en el concreto de la circulación que se amplio.

La tonalidad oscura no es causa de la humedad que genera por cancelación de bajante, es agua lluvia que na ha secado, la tonalidad oscura se debe al barro existente en obra que genera una mancha, la cual se labará al finalizar la obra.

Norma

Powered by CamScanner

Esquema Ampliación de cubierta para cocina.

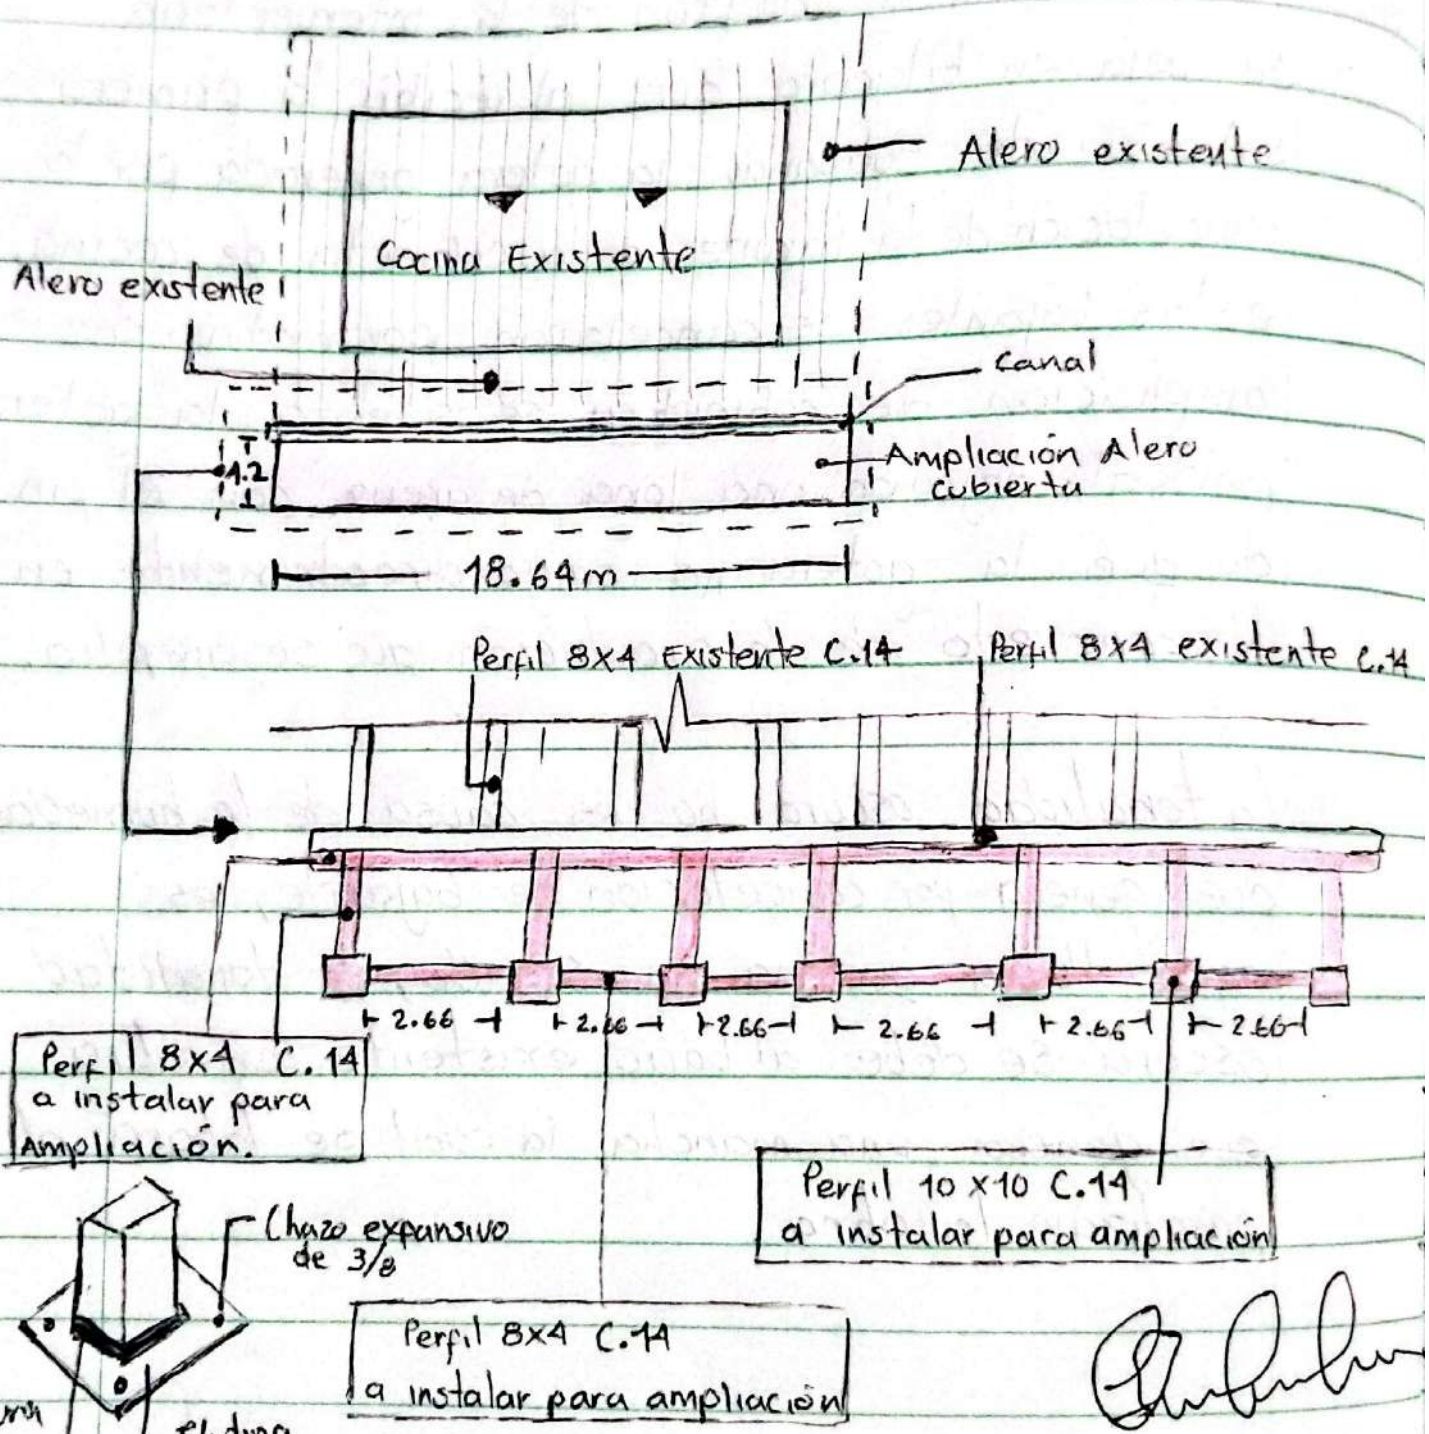

Powered by CamScanner

Se instalaran 7 perfiles cuadrados de 10x10 cm calibre 14 a cada 2.66 m, sobre una platina de 20x20 cm de un 1/4" de espesor con un chazo expansivo de 3/8" anclado con epoxico.


No se continua con la secuencia de los perfiles 10x10 de la cocina ya que estos estan diseñados para confinar los muros de la misma.



Norma

Powered by CamScanner

Esquema conexión Tanques de reserva

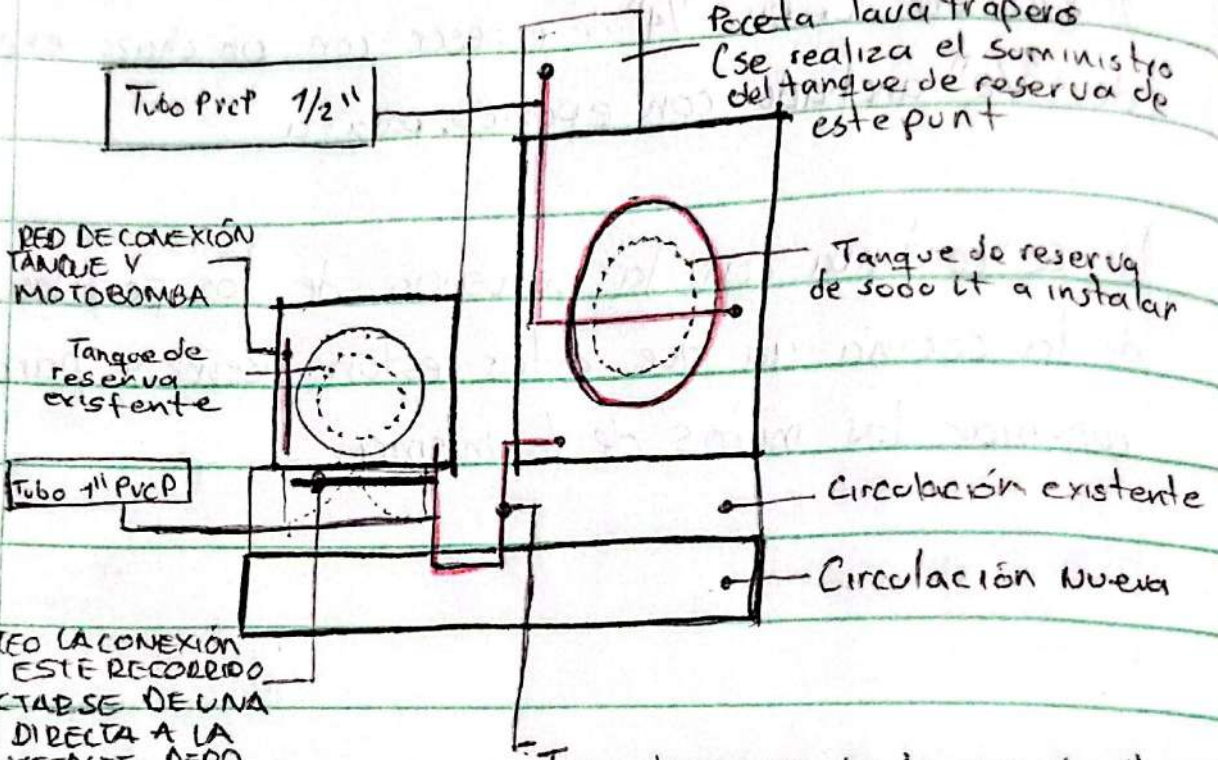

IMPREVISTO.

Al realizar la regata para comunicar los tanques, se corta un tubo de 1" PVCP el cual sale del tanque existente lo cual obliga a cambiar el punto de conexión.

Norma

Powered by CamScanner

Actividad de Estructura y cerramiento en tanque de reserva.

Se inicia anclaje de platinas de 12x12 cm de 1/4" en placa del tanque de reserva para izar el perfil tubular que amarra la malla eslabonada del cerramiento, segun el esquema radicado el viernes 6 de marzo de 2026.

Se realiza simbrado y dilatación en placa de tanque de reserva.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 25 de marzo de 2026

Personal de Obra: 2 ornamentadores
1 oficial
1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria

Se continua con la actividad de instalación de estructura metalica en zona de tanque de reserva por parte de los ornamentadores.

Se inicia actividad de limpieza de caja de inspección y se levanta 6 hiladas de ladrillo recocido en la misma caja, de igual manera se instala sobre las hiladas de ladrillo pañete impermeabilizado

Se vuelve a soldar tubería cortada por goteo.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 26 de marzo de 2026

Personal de Obra:

1 Oficial
1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria.

Se continua con la actividad de instalación de estructura metalica en tanque de reserva.

Se retira enchape existente de 7 piezas, para regatear el muro donde esta ubicado el punto de la red hidraulica, que servirá de suministro para el tanque de reserva y del Shut de basuras, asi mismo se conecta red a ponto existente.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 27 de marzo de 2026

Personal de obra: 2 Ornamentadores
1 Oficial
1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventor

Se da por terminada la instalación de estructura metalica para cubierta en tanque de reserva y se dejan izadas la perfilería tubular que servira de columna para soportar la malla eslabonada la cual se instalará cuando se conecte el tanque de reserva.

Se da inicio a la instalación de estructura metalica en la zona donde se plantea ampliar la cubierta existente de la co..., se empieza instalando platinas con chazos de 3/8 con epoxico Secador 32. Y se

Norma

Powered by CamScanner

procede a izar tubo cuadrado de 10x10 cm calibre 14 de acuerdo al esquema radicado el dia martes 24 de marzo de 2026.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 28 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
2 Ornamentadores.

Se continua con la actividad de instalación de estructura metalica en zona donde se ampliará la cobierta de la cocina existente.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 30 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoria
2 Ornamentadores.

Se termina de instalar estructura para ampliación de cubierta existente y se le da anticorrosivo a estructura de shut de basuras.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 31 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de Interventoría
1 Ornamentador

Se realizan detalles de pólida en estructura metálica en zona de ampliación de cubierta.

7

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 28 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Maestro
1 Oficial

Al realizar el registro correspondiente para el ingreso a la institución, se registra la novedad de que los permisos del personal para ingreso a obra no han sido radicados a trempo y por ello no es posible desarrollar las actividades de inicio de obra, no es posible el ingreso del material para placa de soporte para tanques de reserva por consiguiente se tuvo que devolver, la directora de interventoría llega al sitio para apoyar con el ingreso, pero no es posible, de igual manera genera

Powered by CamScanner

el permiso para ingresar el trompo mezclador de 1 bólto.

Finalmente no se pudo laborar por temas de permisos.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 30 de marzo de 2026.

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Maestro
1 Oficial
1 Ayudante.

Se genera inicio de obra por parte del contratista.

Llega Material para placa de soporte de tanques de reserva de 2000 Lts. se realiza su respectivo trasiego y se acopia en lugar propuesto.

Se realiza replanteo de placa y se dealiza simbrado y testereado de placa.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 31 de marzo de 2026

Personal de Obra: 1 inspector de Obra
1 Inspector de interventoria
1 Maestro
1 Oficial
1 Ayudante.


Se inicia el dia con comite de aprobación de placa de soporte para tanques, este se realiza entre el residente de interventoria residente de obra e inspector de obra, donde se aprueba su ubicación con la novedad de que el hidro acomulador se debe instalar fuera de placa de soporte propuesta para su mayor manejabilidad a los tanques y motobombas.

Se procede a realizar el vaciado de la placa con concreto de 3000 PSI


Norma

Powered by CamScanner

Esquema de placa de soporte.

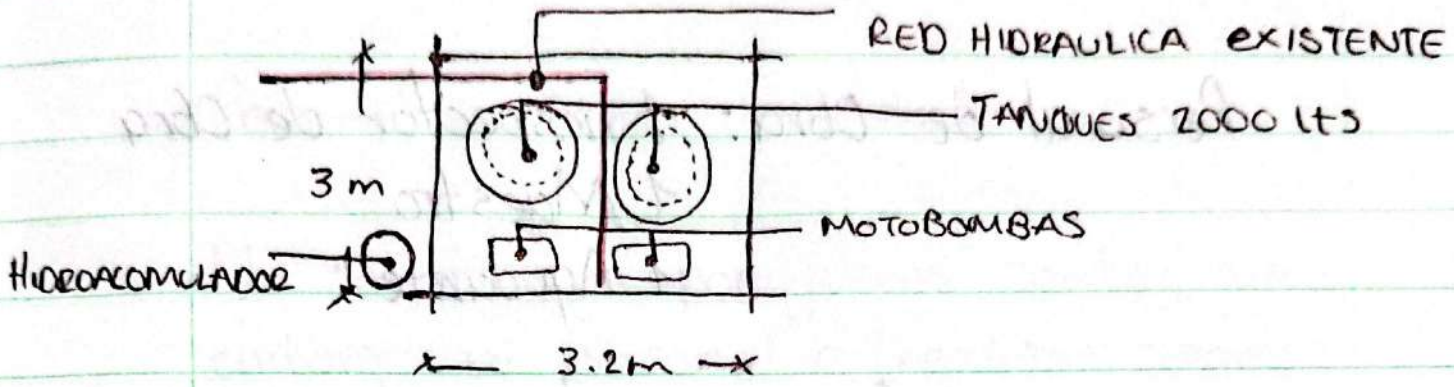

CORTE PLACA DE SOPORTE

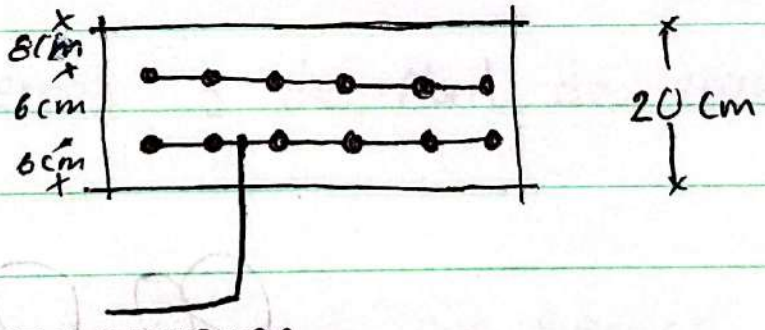

MALLA ELECTROSOLDADA
5 mm, CON SEPARACIÓN
DE 15 cm x 15 cm en
SU RETICULA DE REF.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 31 de Marzo de 2026

Personal de Obra: 2 Ornamentadores
1 Oficial
1 Ayudante

Se realiza desmonte de laminas metalicas que separan el predio del vecino afectado por el colegio Antonio Villavicencio Sede B. y se evidencia que la estructura de las laminas no estan sujetas al muro, cuentan con una estructura independiente.

Ferley Lopez Paos
Residente Obra

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 1 de abril de 2026

Personal de Obra: 2 Ornamentadores
1 Oficial
1 Ayudante.

Se realiza actividad de instalación de estructura metalica de refuerzo para muro de superboard.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 2 de abril 2026

Sin personal de obra por día Santo

Powered by CamScanner

Viernes 3 de abril de 2026

Sin personal de obra por día Santo

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 4 de abril de 2026

Personal de Obra: 2 ornamentadores
4 Oficial
1 Ayudante

Se continua con la actividad de instalación de estructura metalica para muro en superboard y se finaliza.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 6 de abril 2026

Personal de Obra: 2 oficiales
1 Ayudante.

Se inicia instalación de estructuva en vigueta y omega para muros de superboard.

Norma

Powered by CamScanner
