Martes 7 de abril de 2026

Personal de Obra: 2 Oficiales
1 Ayudante


Se continua con actividad de estructura en omega y vigueta para muro en superboard.

Norma

Powered by CamScanner

CRONOGRAMA IED COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE B

Id	Modo de	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0			**IED RODOLFO LLINAS V_01**			**106 días**	**vie 21/11/25**	**vie 27/03/26**	
1			INICIO			0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	
2		1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			105 días	vie 21/11/25	jue 26/03/26	
3		1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			105 días	vie 21/11/25	jue 26/03/26	
4		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	41.40	3 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	1
5		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	189.94	102 días	mar 25/11/25	jue 26/03/26	4
6		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	189.94	102 días	mar 25/11/25	jue 26/03/26	4
7		1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			17 días	vie 21/11/25	vie 12/12/25	
8		1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	9.00	5 días	lun 24/11/25	vie 28/11/25	4CC+2 días
9		1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	193.03	9 días	vie 21/11/25	mar 2/12/25	
10		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.35	3 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	8CC+1 día
11		1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	130.24	5 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	9FC+3 días
12		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.84	3 días	vie 28/11/25	mar 2/12/25	4CC+6 días
13		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.05	6 días	vie 28/11/25	vie 5/12/25	12CC+1 día
14		1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.96	3 días	vie 28/11/25	mar 2/12/25	10CC+3 días
15		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	151.36	3 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	9CC+3 días
16		1.3	MANTENIMIENTOS			24 días	vie 5/12/25	mar 6/01/26	
17		1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	241.23	10 días	mié 24/12/25	mar 6/01/26	11FC+10 días
18		1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	65.12	4 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	13
19		1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			12 días	vie 21/11/25	jue 4/12/25	
20		1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78.64	3 días	vie 28/11/25	mar 2/12/25	4FC+3 días
21		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	20.00	3 días	mar 2/12/25	jue 4/12/25	20
22		1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9.40	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	
23		2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			93.75 días	vie 21/11/25	jue 12/03/26	
24		2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			11 días	mar 6/01/26	lun 19/01/26	16
25		2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5.29	4 días	mar 6/01/26	sáb 10/01/26	
26		2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	5.29	3 días	sáb 10/01/26	mié 14/01/26	25
27		2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2.65	4 días	mié 14/01/26	lun 19/01/26	26
28		2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			51 días	vie 21/11/25	jue 22/01/26	
29		2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.14	4 días	sáb 10/01/26	jue 15/01/26	25
30		2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	14.70	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	29
31		2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	14.70	4 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	
32		2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0.14	3 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26	30
33		2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			20 días	mié 18/02/26	jue 12/03/26	28
34		2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CONCRETO PARA CÁRCAMO (A=83,5 CM E=14CM) TRÁNSITO VEHICULAR	M	130.24	20 días	mié 18/02/26	jue 12/03/26	
35		2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			4 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26	
36		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	212.40	4 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26	29
37		7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			57 días	mar 20/01/26	vie 27/03/26	
38		7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			25 días	mar 20/01/26	mié 18/02/26	
39		7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	151.36	20 días	mar 20/01/26	jue 12/02/26	36
40		7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	78.64	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	39
41		7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			12 días	vie 13/03/26	jue 26/03/26	33
42		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	151.36	12 días	vie 13/03/26	jue 26/03/26	31
43		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	85.46	8 días	vie 13/03/26	lun 23/03/26	36
44		9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5.25 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26	41
45		9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	
46		9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	15.84	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	36
47		9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	
48		9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATIN	M2	22.05	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	46
49		12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			101.75 días	vie 21/11/25	lun 23/03/26	47
50		12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			4 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	
51		12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	130.24	4 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	
52		12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26	
53		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	86.94	2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26	51
54		16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			13 días	vie 6/03/26	lun 23/03/26	
55		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	9.40	4 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	
56		16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4.00	5 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26	55
57		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4.80	4 días	mié 18/03/26	lun 23/03/26	56
58		16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	36.96	3 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	
59		18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			100 días	vie 21/11/25	vie 20/03/26	
60		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	334.50	100 días	vie 21/11/25	vie 20/03/26	
61		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	50.00	4 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	
62			FIN			0 días	vie 6/03/26	vie 6/03/26	

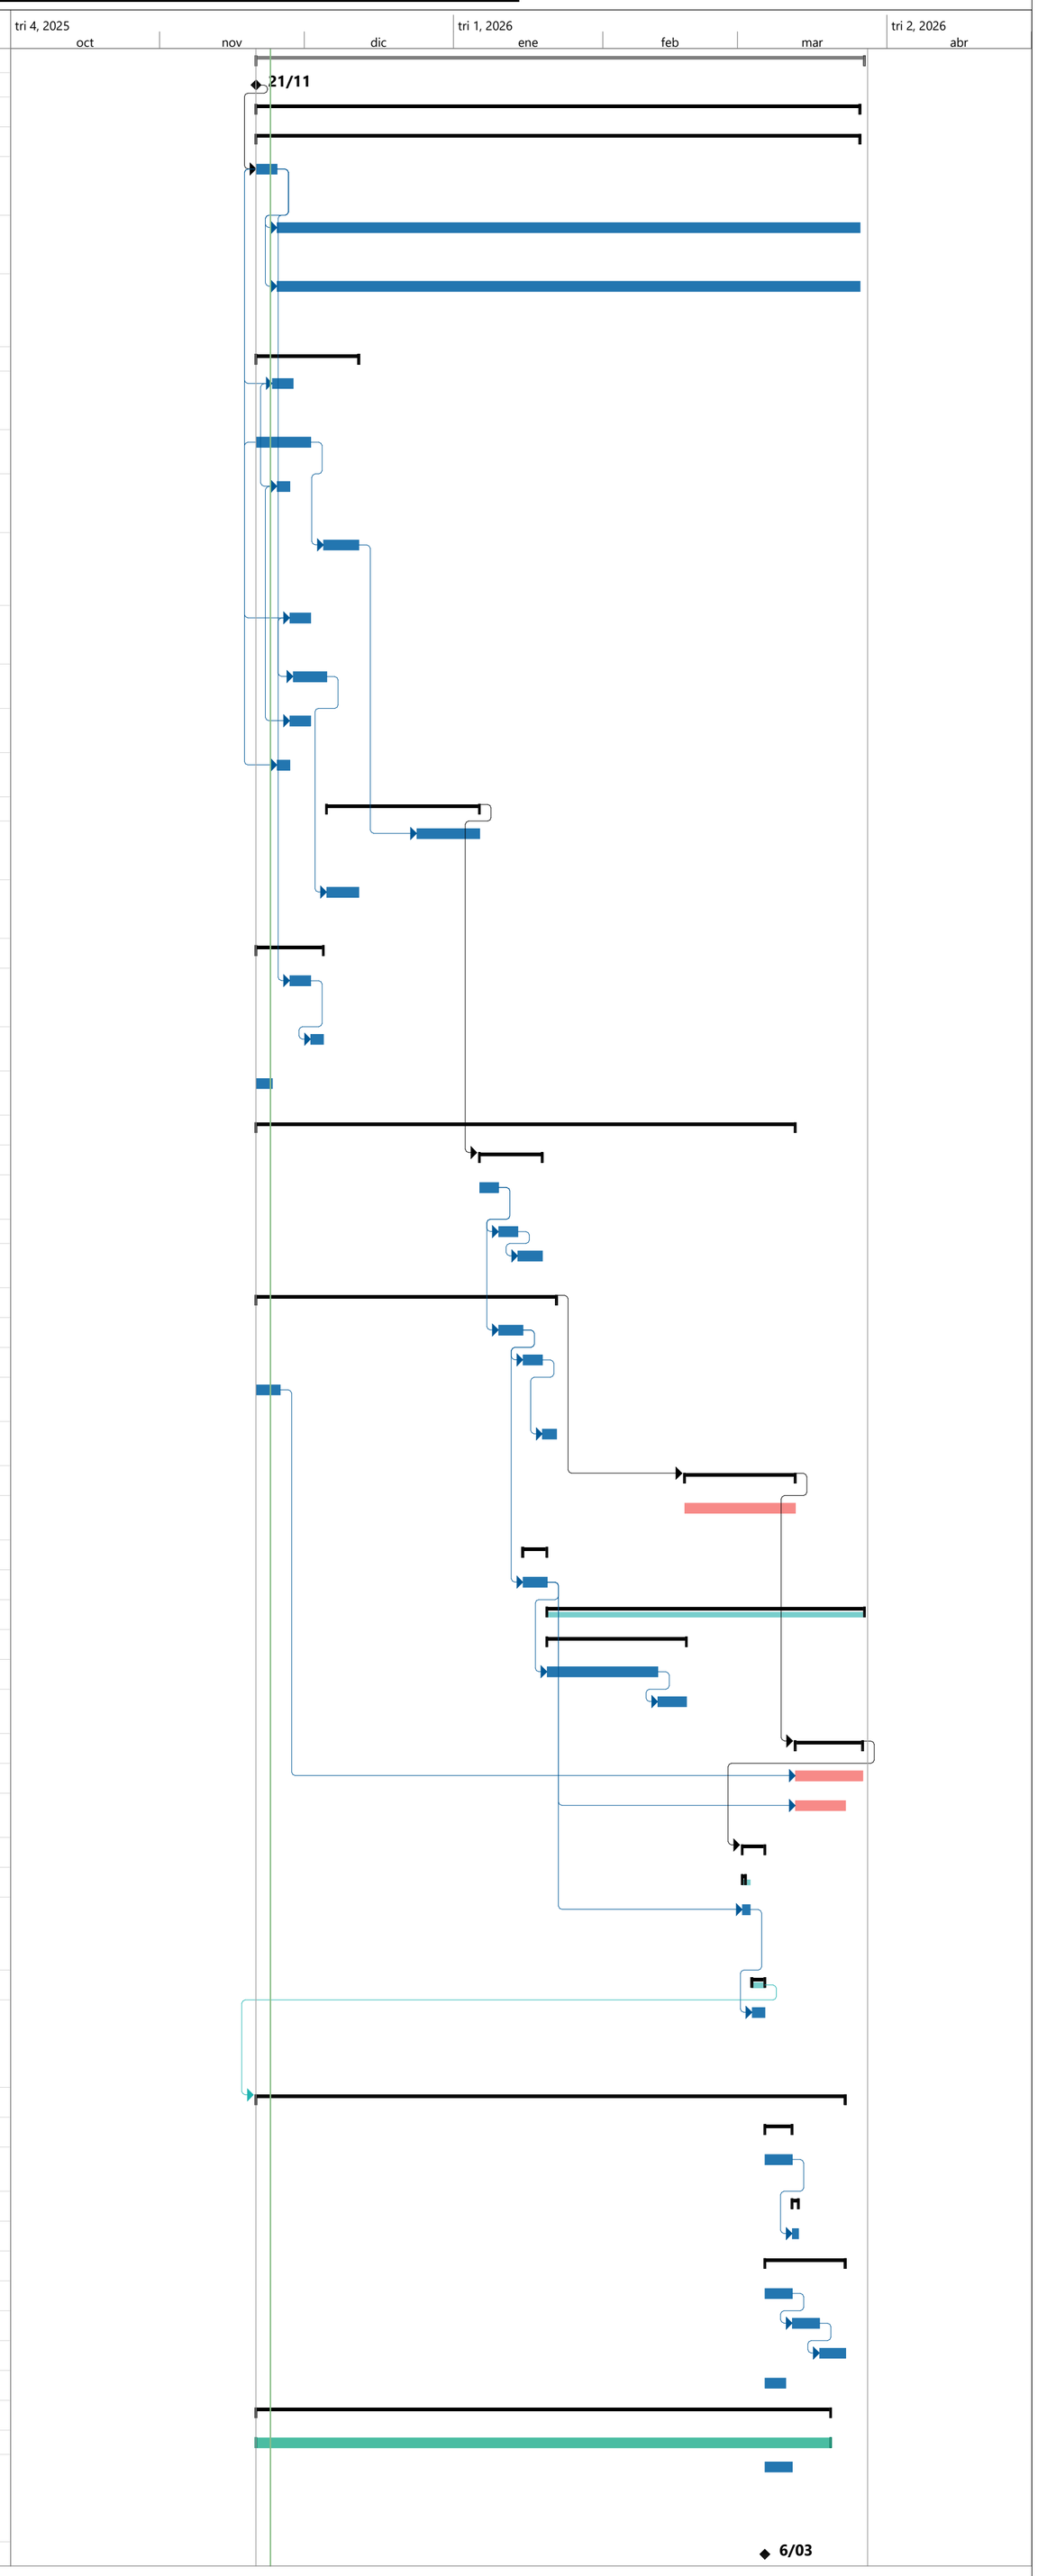


Proyecto: IED RODOLFO LLINA
Fecha: lun 24/11/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


COLEGIO IED MAGDALENA ORTEGA SEDE A

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
0			**IED MAGDALENA ORTEGA**			**146.5 días**	**lun 10/11/25**	**sáb 2/05/26**		**$383,739,952.72**
1			**INICIO DE OBRA**			**0 días**	**lun 10/11/25**	**lun 10/11/25**		**$0.00**
2		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**144.25 días**	**lun 10/11/25**	**sáb 2/05/26**		**$15,593,134.91**
3		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**12 días**	**lun 10/11/25**	**lun 24/11/25**		**$3,859,366.51**
4		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la	M2	26.58	5 días	lun 10/11/25	vie 14/11/25	1	$117,233.49
5		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión	ML	74.90	5 días	vie 14/11/25	vie 21/11/25	4	$2,427,178.53
6		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2,4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision	ML	8.82	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	5	$1,314,954.49
7		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**107.75 d**	**mar 25/11/25**	**mié 1/04/26**		**$9,020,895.40**
8		1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20.05	2 días	mar 25/11/25	mié 26/11/25	6	$1,443,139.92
9		1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SIT	M2	7.75	7 días	mar 20/01/26	mar 27/01/26		$874,770.09
10		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64.07	15 días	mar 27/01/26	vie 13/02/26	9	$2,214,021.07
11		1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.00	30 días	vie 13/02/26	vie 20/03/26	10	$33,926.39
12		1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	151.39	5 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26	11	$4,057,725.23
13		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	26.00	5 días	jue 26/03/26	mié 1/04/26	12	$397,312.70
14		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**70.5 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 2/05/26**		**$2,712,873.00**
15		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	75.00	70.5 días	mar 10/02/26	sáb 2/05/26		$2,712,873.00
16		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**50.25 días**	**lun 2/03/26**	**mar 28/04/26**		**$16,282,838.23**
17		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**20 días**	**mié 25/03/26**	**jue 16/04/26**		**$2,239,401.10**
18		2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	11.16	15 días	mié 25/03/26	vie 10/04/26		$1,069,349.08
19		2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	6.38	5 días	vie 10/04/26	jue 16/04/26	18	$1,170,052.02
20		**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10.5 días**	**jue 5/03/26**	**mar 17/03/26**		**$5,830,405.26**
21		2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	28.19	7 días	jue 5/03/26	jue 12/03/26		$3,384,662.57
22		2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	14.15	3.5 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26	21	$2,445,742.69
23		**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**50.25 días**	**lun 2/03/26**	**mar 28/04/26**		**$8,213,031.87**
24		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	170.63	15 días	vie 10/04/26	mar 28/04/26	18	$1,289,518.74
25		2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	70.00	8 días	vie 17/04/26	lun 27/04/26	19	$517,924.76
26		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**30 días**	**lun 2/03/26**	**sáb 4/04/26**		**$6,405,588.37**
27		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	288.53	30 días	lun 2/03/26	sáb 4/04/26		$6,405,588.37
28		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**20.88 días**	**sáb 4/04/26**	**mar 28/04/26**		**$2,189,241.65**
29		**3.2**	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15 días**	**sáb 4/04/26**	**mié 22/04/26**		**$1,995,719.01**
30		3.2.2	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	57.39	15 días	sáb 4/04/26	mié 22/04/26		$1,995,719.01
31		**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**jue 23/04/26**	**mar 28/04/26**		**$193,522.64**
32		3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	20.00	5 días	jue 23/04/26	mar 28/04/26	24CC+10 días	$193,522.64
33		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**25 días**	**jue 2/04/26**	**jue 30/04/26**		**$30,509,333.08**
34		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**vie 10/04/26**	**mar 14/04/26**		**$1,038,108.09**
35		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	10.00	2 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26	18	$954,056.51
36		4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2.00	2 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26	35CC	$84,051.58
37		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**2.5 días**	**mar 14/04/26**	**jue 16/04/26**		**$388,135.47**
38		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	24.86	2.5 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26	36	$388,135.47
39		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3.5 días**	**mar 14/04/26**	**vie 17/04/26**		**$255,593.18**
40		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1.00	1 día	jue 16/04/26	vie 17/04/26	38	$66,178.83
41		4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1.00	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/26	35	$189,414.35
42		**4.9**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**25 días**	**jue 2/04/26**	**jue 30/04/26**		**$28,827,496.34**
43		4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	148.00	25 días	jue 2/04/26	jue 30/04/26	13	$28,131,869.53
44		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	ML	120.00	15 días	mar 14/04/26	jue 30/04/26	43CC+10 días	$695,626.81
45		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**9 días**	**jue 16/04/26**	**lun 27/04/26**		**$3,798,774.14**
46		5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CON	UN	1.00	2 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26	26FC+10 días	$220,518.87
47		5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	40.00	2 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26	46CC	$971,448.52
48		5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	60.00	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	47	$1,299,366.32
49		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	3.00	1 día	mié 22/04/26	jue 23/04/26	48	$563,524.84
50		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00	3 días	jue 23/04/26	lun 27/04/26	49	$743,915.59
51		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**vie 10/04/26**	**jue 16/04/26**		**$431,219.87**
52		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**vie 10/04/26**	**jue 16/04/26**		**$431,219.87**
53		7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	3.00	3 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26		$141,526.42
54		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	11.07	2 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26	53	$289,693.45
55		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**jue 16/04/26**	**mar 21/04/26**		**$4,377,780.81**
56		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	11.07	2 días	jue 16/04/26	vie 17/04/26	52	$2,427,713.96
57		7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN	ML	22.78	2 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	56	$1,950,066.85
58		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**16 días**	**mar 24/03/26**	**vie 10/04/26**		**$11,107,835.60**
59		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	33.38	6 días	vie 3/04/26	vie 10/04/26	60	$3,735,980.61
60		8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	33.38	10 días	mar 24/03/26	vie 3/04/26		$7,371,854.99
61		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**12 días**	**mié 15/04/26**	**mar 28/04/26**		**$9,867,654.43**
62		**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**mié 15/04/26**	**lun 20/04/26**		**$5,987,664.12**

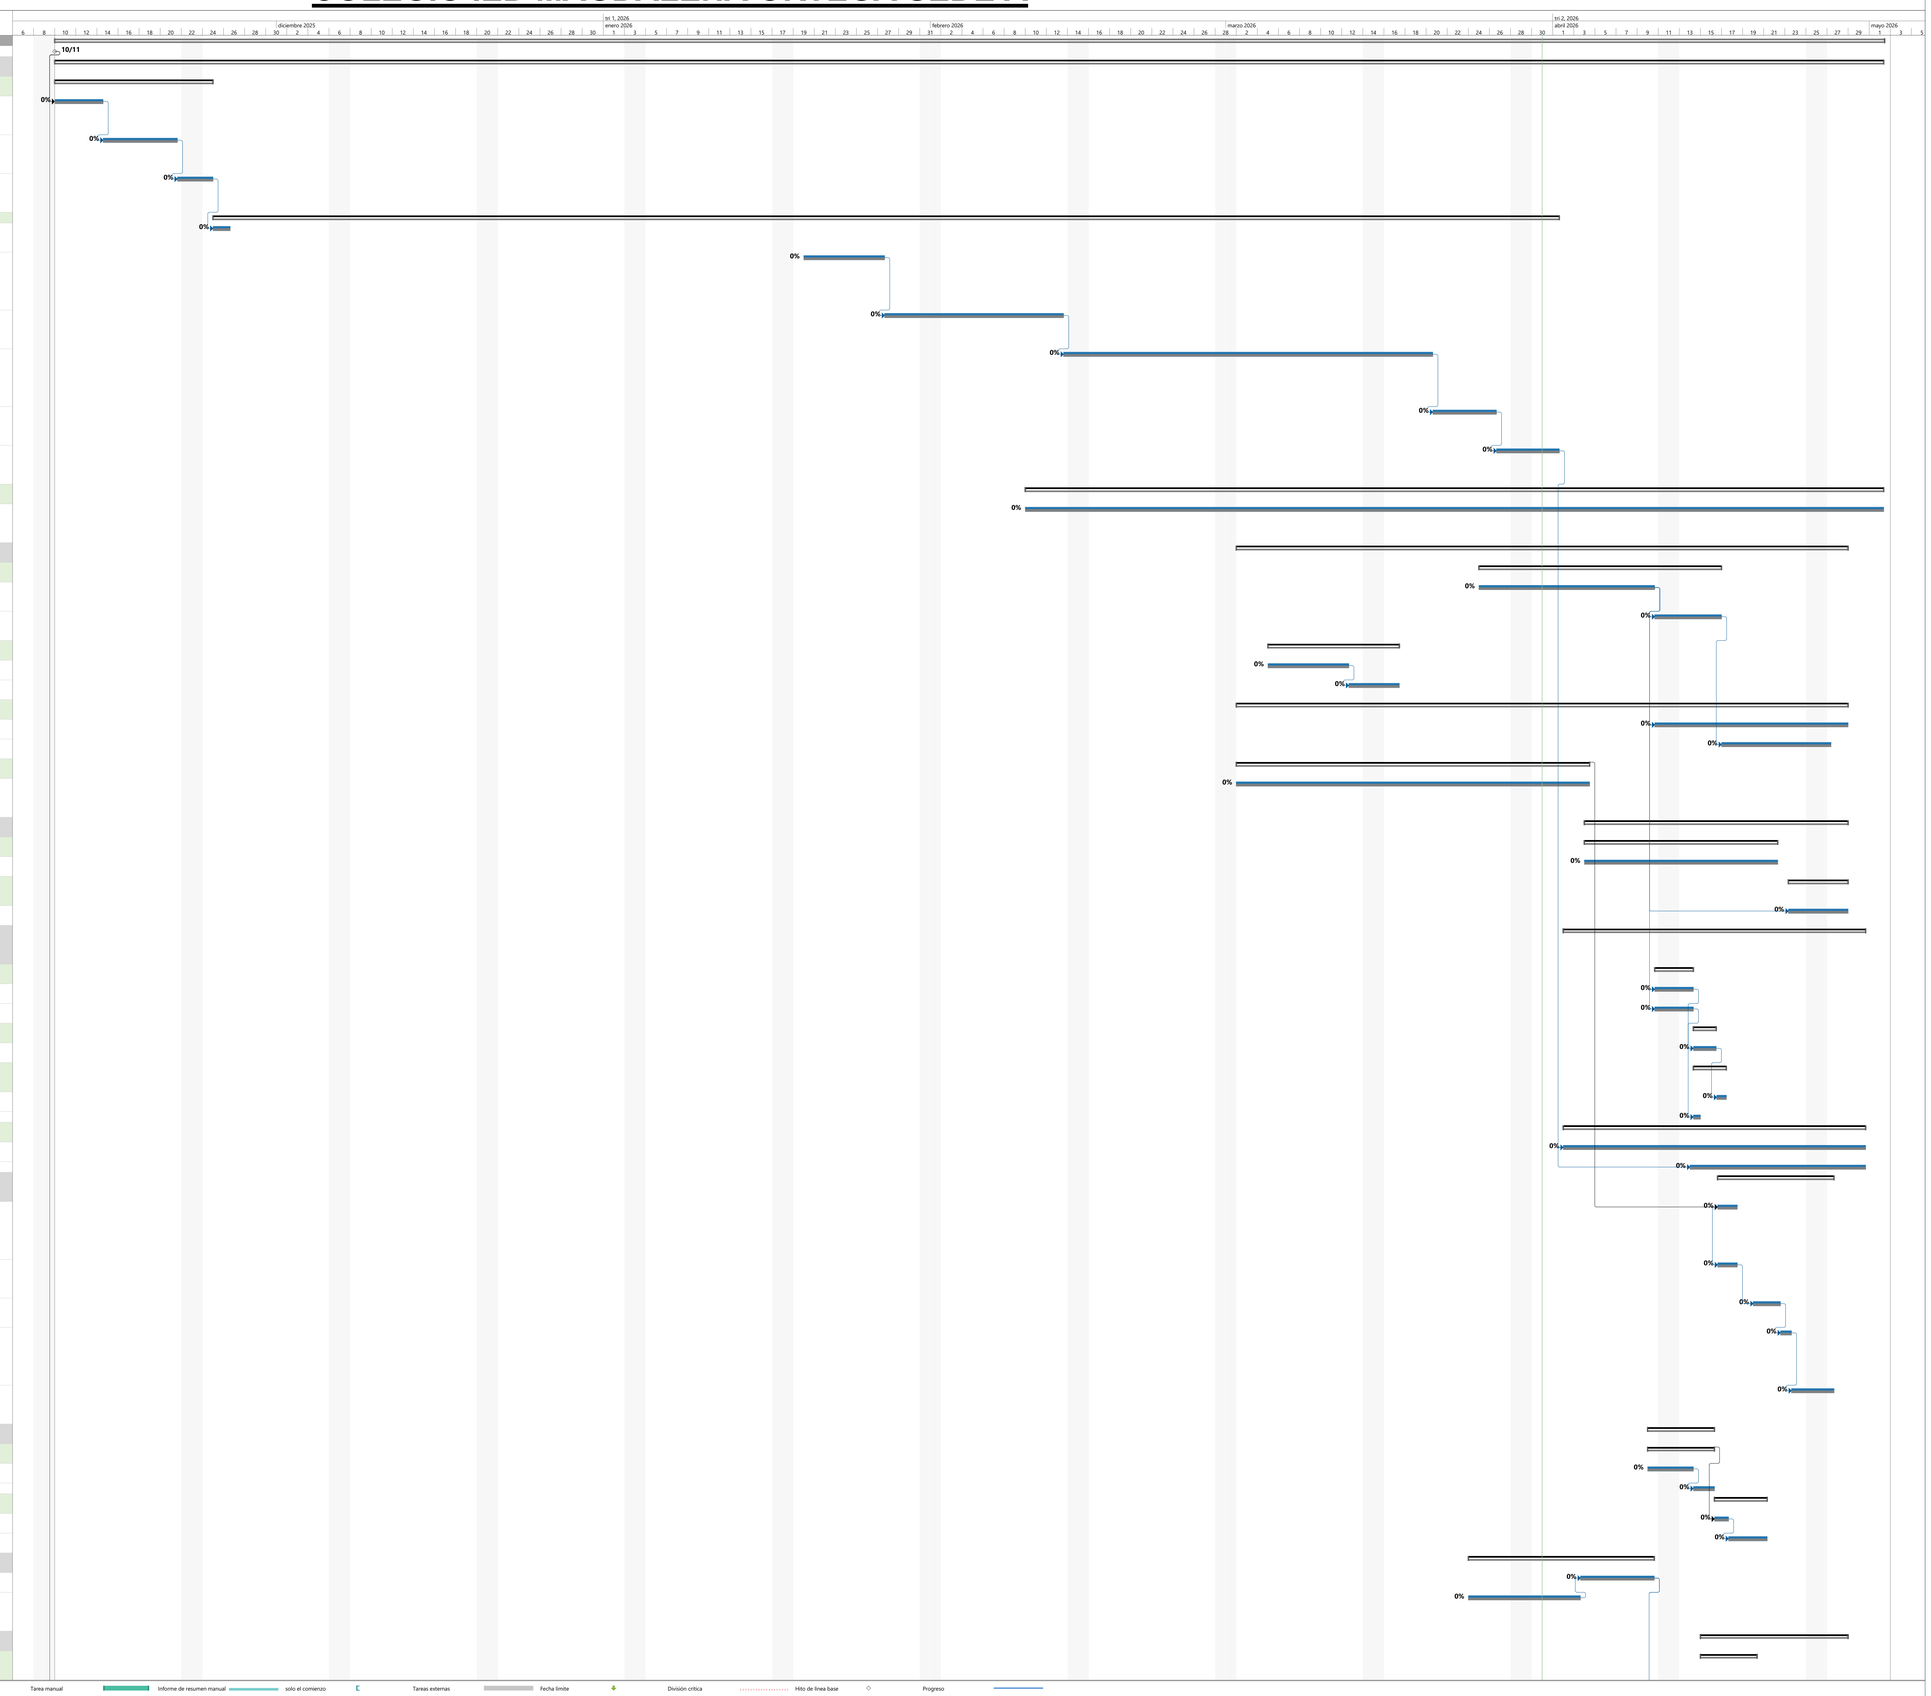

COLEGIO IED MAGDALENA ORTEGA SEDE A

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
63		9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	7.20	4 días	mié 15/04/26	lun 20/04/26		$5,987,664.12
64		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**6 días**	**lun 20/04/26**	**lun 27/04/26**		**$3,629,758.82**
65		9.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS BASCULANTES SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA	M2	3.24	3 días	lun 20/04/26	jue 23/04/26	63	$1,973,745.92
66		9.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO CON ALFAJIA Y REFUERZOS ANTI FLEXIÓN CADA 50CM. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.00	3 días	jue 23/04/26	lun 27/04/26	65	$1,656,012.90
67		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**lun 27/04/26**	**mar 28/04/26**		**$250,231.49**
68		9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	3.78	2 días	lun 27/04/26	mar 28/04/26	64	$250,231.49
69		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**vie 10/04/26**	**jue 16/04/26**		**$11,035,920.42**
70		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	26.00	5 días	vie 10/04/26	jue 16/04/26	59	$10,958,109.19
71		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00	2 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	59	$42,843.45
72		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	1.00	2 días	mar 14/04/26	mié 15/04/26	71	$34,967.78
73		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**35 días**	**mié 25/02/26**	**mar 7/04/26**		**$244,055,027.75**
74		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	245.34	30 días	mié 25/02/26	mar 31/03/26		$233,873,173.74
75		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	9.88	15 días	vie 20/03/26	mar 7/04/26	74CC+20 días	$10,181,854.01
76		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**19.5 días**	**mié 8/04/26**	**jue 30/04/26**		**$26,661,655.71**
77		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1.5 días**	**mié 8/04/26**	**jue 9/04/26**		**$42,804.30**
78		12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CUILATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	1.80	1.5 días	mié 8/04/26	jue 9/04/26	87	$42,804.30
79		**12.2**	**PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**18 días**	**jue 9/04/26**	**jue 30/04/26**		**$26,618,851.41**
80		12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	251.83	10 días	jue 9/04/26	mar 21/04/26	78	$4,513,972.67
81		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	256.82	10 días	jue 9/04/26	mar 21/04/26	80CC	$8,567,715.63
82		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33.44	4 días	mar 21/04/26	sáb 25/04/26	81CC+10 días	$1,037,507.65
83		12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	251.83	10 días	sáb 18/04/26	jue 30/04/26	80CC+8 días	$6,735,745.99
84		12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	245.49	10 días	sáb 18/04/26	jue 30/04/26	83CC	$5,763,909.47
85		**13**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 día**	**lun 10/11/25**	**lun 10/11/25**		**$126,424.94**
86		13.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1.00	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25		$126,424.94
87		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**16 días**	**vie 20/03/26**	**mar 7/04/26**		**$4,928,485.89**
88		16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.63	3 días	mié 1/04/26	vie 3/04/26	90	$186,606.33
89		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.44	3 días	vie 3/04/26	mar 7/04/26	88	$181,131.65
90		16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TE3A TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	12.12	5 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	91	$1,686,280.09
91		16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	11.07	5 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26		$2,874,467.82
92		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**146.5 días**	**lun 10/11/25**	**sáb 2/05/26**		**$2,774,625.29**
93		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	546.36	146.5 días	lun 10/11/25	sáb 2/05/26	1	$2,654,239.61
94		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE,	KG	50.00	60 días	vie 20/02/26	jue 30/04/26		$120,385.68
95			**FIN**			**0 días**	**mié 4/03/26**	**mié 4/03/26**		**$0.00**

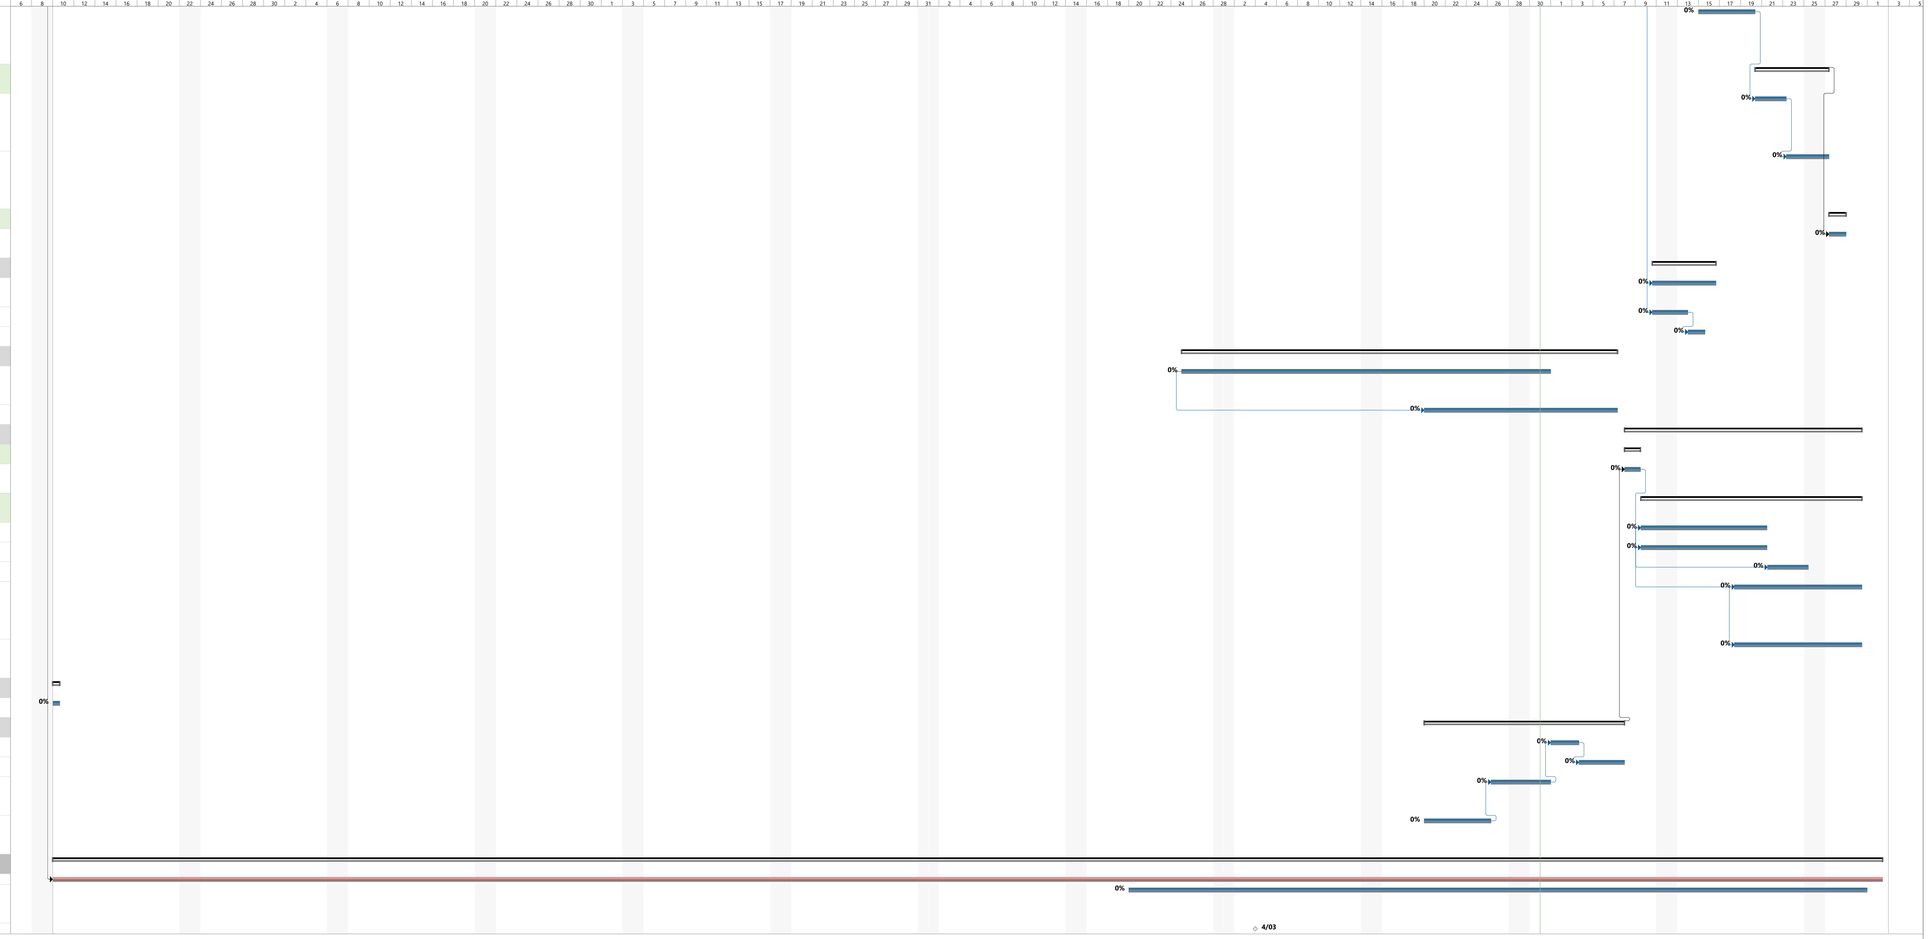

Proyecto: IED MAGDALENA OR
Fecha: mar 31/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

COLEGIO IED MAGDALENA ORTEGA SEDE A

tri 3, 2026 | tri 4, 2026

junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | diciembre 2026

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Proyecto: IED MAGDALENA OR
Fecha: mar 31/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

COLEGIO IED MAGDALENA ORTEGA SEDE A

tri 3, 2026 | tri 4, 2026

junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | diciembre 2026


5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Proyecto: IED MAGDALENA OR
Fecha: mar 31/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

COLEGIO IED TABORA SEDE A

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**IED TABORA V_01**			**106 días**	**vie 21/11/25**	**vie 27/03/26**		**$158,125,361.00**
1			INICIO			0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25		$0.00
2		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**105.75 días**	**vie 21/11/25**	**jue 26/03/26**		**$28,118,982.00**
3		1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			105.75 días	vie 21/11/25	jue 26/03/26		$14,966,393.00
4		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	35.49	5 días	vie 21/11/25	jue 27/11/25	1	$156,532.00
5		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	81.60	77 días	vie 26/12/25	jue 26/03/26	4	$2,644,295.00
6		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	81.60	78 días	vie 26/12/25	jue 26/03/26	4	$12,165,566.00
7		1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			69 días	vie 21/11/25	jue 12/02/26		$5,209,451.00
8		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.40	5 días	vie 21/11/25	jue 27/11/25		$137,029.00
9		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18.94	5 días	jue 27/11/25	mar 2/12/25	8	$654,357.00
10		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	67.24	5 días	vie 6/02/26	jue 12/02/26	54	$2,381,052.00
11		1.2.28	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	4 días	vie 28/11/25	mar 2/12/25	9CC+1 día	$1,692,482.00
12		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5.00	3 días	mié 3/12/25	vie 5/12/25	11	$38,906.00
13		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	20.00	4 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	12CC+3 días	$305,625.00
14		1.3	MANTENIMIENTOS			8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25		$6,134,556.00
15		1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M	560.00	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	11	$6,134,556.00
16		1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			30 días	mié 3/12/25	vie 9/01/26		$1,808,582.00
17		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	50.00	30 días	mié 3/12/25	vie 9/01/26	22	$1,808,582.00
18		2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			30 días	vie 21/11/25	lun 29/12/25		$16,081,685.00
19		2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			23 días	vie 21/11/25	vie 19/12/25		$5,396,946.00
20		2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	21.22	5 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	12	$2,032,817.00
21		2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	20.50	5 días	sáb 13/12/25	vie 19/12/25	20	$1,143,639.00
22		2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	12.73	10 días	vie 21/11/25	mar 2/12/25		$2,220,490.00
23		2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	sáb 13/12/25	mar 23/12/25	20	$532,916.00
24		2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.50	8 días	sáb 13/12/25	mar 23/12/25		$532,916.00
25		2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			15 días	mié 10/12/25	lun 29/12/25		$8,262,474.00
26		2.3.11	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 X 35 (INCLUYE ACERO DE	M	66.60	15 días	mié 10/12/25	lun 29/12/25	22FC+5 días	$8,262,474.00
27		2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5 días	mié 3/12/25	mié 10/12/25		$1,889,349.00
28		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	250.00	5 días	mié 3/12/25	mié 10/12/25	22	$1,889,349.00
29		3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			32 días	lun 29/12/25	mié 4/02/26		$5,487,188.00
30		3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			10 días	lun 29/12/25	vie 9/01/26		$4,861,244.00
31		3.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN ANDENES EXTERIORES - INCLUYE BASE EN ARENA DE 5CM, DISPOSICIÓN DE ADOQUINES EN ARCILLA 10X20X6 CMS Y SELLO ENTRE JUNTAS	M2	40.99	10 días	lun 29/12/25	vie 9/01/26	26	$4,861,244.00
32		3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			6 días	mié 28/01/26	mié 4/02/26		$625,944.00
33		3.2.2	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	18.00	6 días	mié 28/01/26	mié 4/02/26	44	$625,944.00
34		4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	vie 9/01/26	mar 27/01/26		$9,633,512.00
35		4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	vie 9/01/26	mar 27/01/26		$8,145,681.00
36		4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	42.00	15 días	vie 9/01/26	mar 27/01/26	31	$7,983,368.00
37		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	28.00	8 días	vie 9/01/26	lun 19/01/26	31	$162,313.00
38		5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26		$1,487,831.00
39		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS	UN	6.00	3 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26	37	$1,487,831.00
40		7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			29 días	lun 19/01/26	sáb 21/02/26		$6,626,864.00
41		7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	mié 4/02/26	sáb 21/02/26		$5,462,868.00
42		7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	81.13	15 días	mié 4/02/26	sáb 21/02/26	33	$5,462,868.00
43		8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	lun 19/01/26	mié 28/01/26		$1,163,996.00
44		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	10.40	8 días	lun 19/01/26	mié 28/01/26	37	$1,163,996.00
45		9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			39.13 días	mar 10/02/26	jue 26/03/26		$27,764,644.00
46		10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			32 días	mar 10/02/26	mié 18/03/26	44	$8,600,689.00
47		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00	15 días	mar 10/02/26	jue 26/02/26		$8,429,315.00
48		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	8 días	mar 10/03/26	mié 18/03/26		$171,374.00
49		11	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			30 días	vie 20/02/26	jue 26/03/26		$19,163,955.00
50		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	18.94	30 días	vie 20/02/26	jue 26/03/26		$18,050,959.00
51		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISION DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.08	15 días	jue 26/02/26	lun 16/03/26		$1,112,996.00
52		12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	mié 28/01/26	vie 6/02/26		$5,339,935.00
53		12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	mié 28/01/26	vie 6/02/26		$5,339,935.00
54		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO	M2	160.07	8 días	mié 28/01/26	vie 6/02/26	44	$5,339,935.00
55		14	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	jue 19/03/26	lun 23/03/26		$925,639.00
56		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4.48	3 días	jue 19/03/26	lun 23/03/26		$925,639.00
57		15	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			20 días	lun 19/01/26	mié 11/02/26		$6,834,386.00
58		15.1.15	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	12.00	20 días	lun 19/01/26	mié 11/02/26	31FC+8 días	$6,834,386.00
59		16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL			30 días	vie 20/02/26	vie 27/03/26		$50,272,222.00
60		16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	66.56	12 días	vie 13/03/26	vie 27/03/26	61	$17,283,159.00
61		16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	121.84	18 días	vie 20/02/26	vie 13/03/26	10FC+7 días	$32,989,063.00
62		18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			104 días	vie 21/11/25	mié 25/03/26		$1,040,304.00
63		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	189.36	104 días	vie 21/11/25	mié 25/03/26		$919,918.00
64		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	50.00	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	61	$120,386.00
65			FIN			0 días	lun 16/03/26	lun 16/03/26	64	$0.00

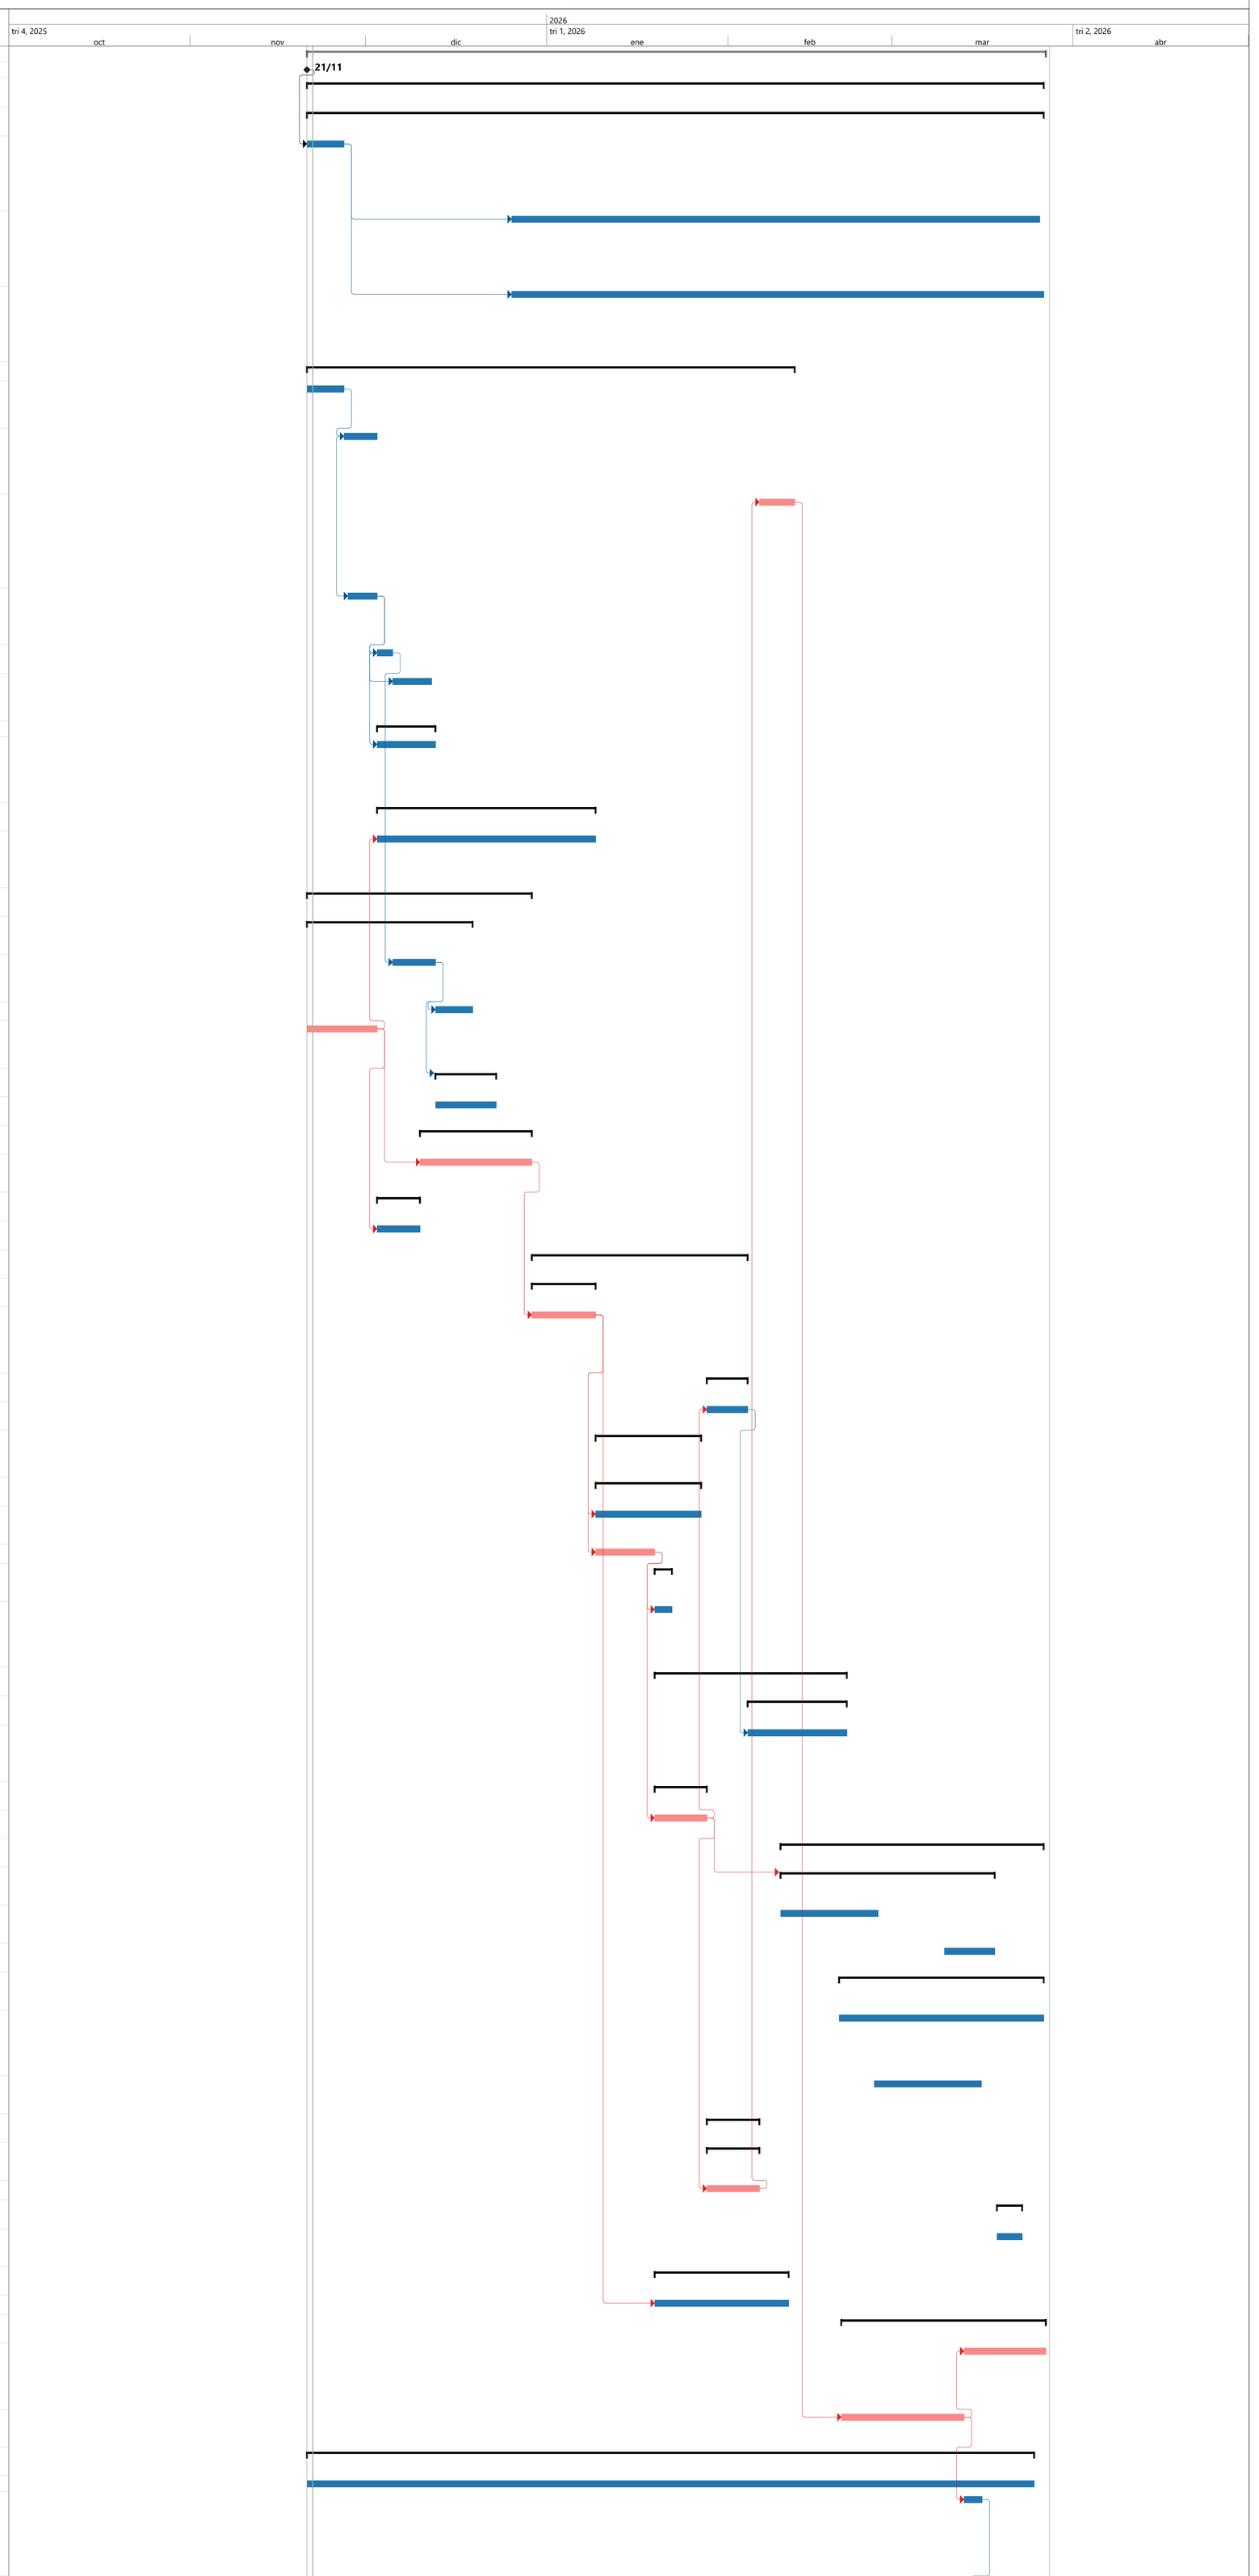


Proyecto: IED TABORA V_01
Fecha: sáb 22/11/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

COLEGIO (ITI) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	Costo
0			**IED FRANCISCO JOSE CALDAS A V_07**			**149.5 días?**	**jue 6/11/25**	**sáb 2/05/26**		**$357,447,210.48**
1			**INICIO DE OBRA**			**0 días**	**jue 6/11/25**	**jue 6/11/25**		**$0.00**
2		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**149.5 días**	**jue 6/11/25**	**sáb 2/05/26**		**$64,224,124.73**
3		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**137.51 días**	**jue 6/11/25**	**lun 20/04/26**		**$45,858,284.49**
4		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	341.27	26.88 días	jue 6/11/25	lun 20/04/26	1	$1,505,202.19
5		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	247.50	18.75 días	jue 13/11/25	vie 10/04/26	1FC+2 días	$8,020,382.98
6		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	243.70	18.76 días	jue 13/11/25	vie 10/04/26	5CC	$36,332,699.32
7		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**122 días**	**lun 1/12/25**	**vie 24/04/26**		**$16,786,051.72**
8		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94.01	7 días	lun 1/12/25	mié 10/12/25	4CC+20 días	$1,238,660.70
9		1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M	27.82	4 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26	8FC+100 días	$776,116.33
10		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	27.30	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25	8	$943,386.53
11		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.72	4 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	10	$481,280.11
12		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	341.27	15 días	mar 7/04/26	vie 24/04/26	9CC	$12,084,792.07
13		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14.00	7 días	jue 18/12/25	sáb 27/12/25	14	$174,524.61
14		1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN	1.00	3 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25	10	$66,232.10
15		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6.00	4 días	jue 18/12/25	mar 23/12/25	14	$46,686.74
16		1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	86.34	8 días	mar 23/12/25	vie 2/01/26	15	$394,952.79
17		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	25.00	3 días	mié 10/12/25	vie 12/12/25	8	$382,031.44
18		1.2.42	DEMOLICIÓN DE DINTEL EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M	11.40	2 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25	17	$197,388.30
19		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**119.5 días**	**sáb 13/12/25**	**sáb 2/05/26**		**$1,579,788.52**
20		1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	34.70	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	12	$675,497.63
21		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	25.00	119.5 días	sáb 13/12/25	sáb 2/05/26	17	$904,290.89
22		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**mar 16/12/25**	**lun 29/12/25**		**$19,839,885.24**
23		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**mar 16/12/25**	**lun 29/12/25**		**$19,839,885.24**
24		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	893.66	10 días	mar 16/12/25	lun 29/12/25	18	$19,839,885.24
25		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**8 días**	**mié 22/04/26**	**vie 1/05/26**		**$2,372,101.08**
26		**3.2**	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**mié 22/04/26**	**mar 28/04/26**		**$398,170.11**
27		3.2.2	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	11.45	5 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	55	$398,170.11
28		**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**mar 28/04/26**	**vie 1/05/26**		**$1,973,930.97**
29		3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y	CM	204.00	3 días	mar 28/04/26	vie 1/05/26	27	$1,973,930.97

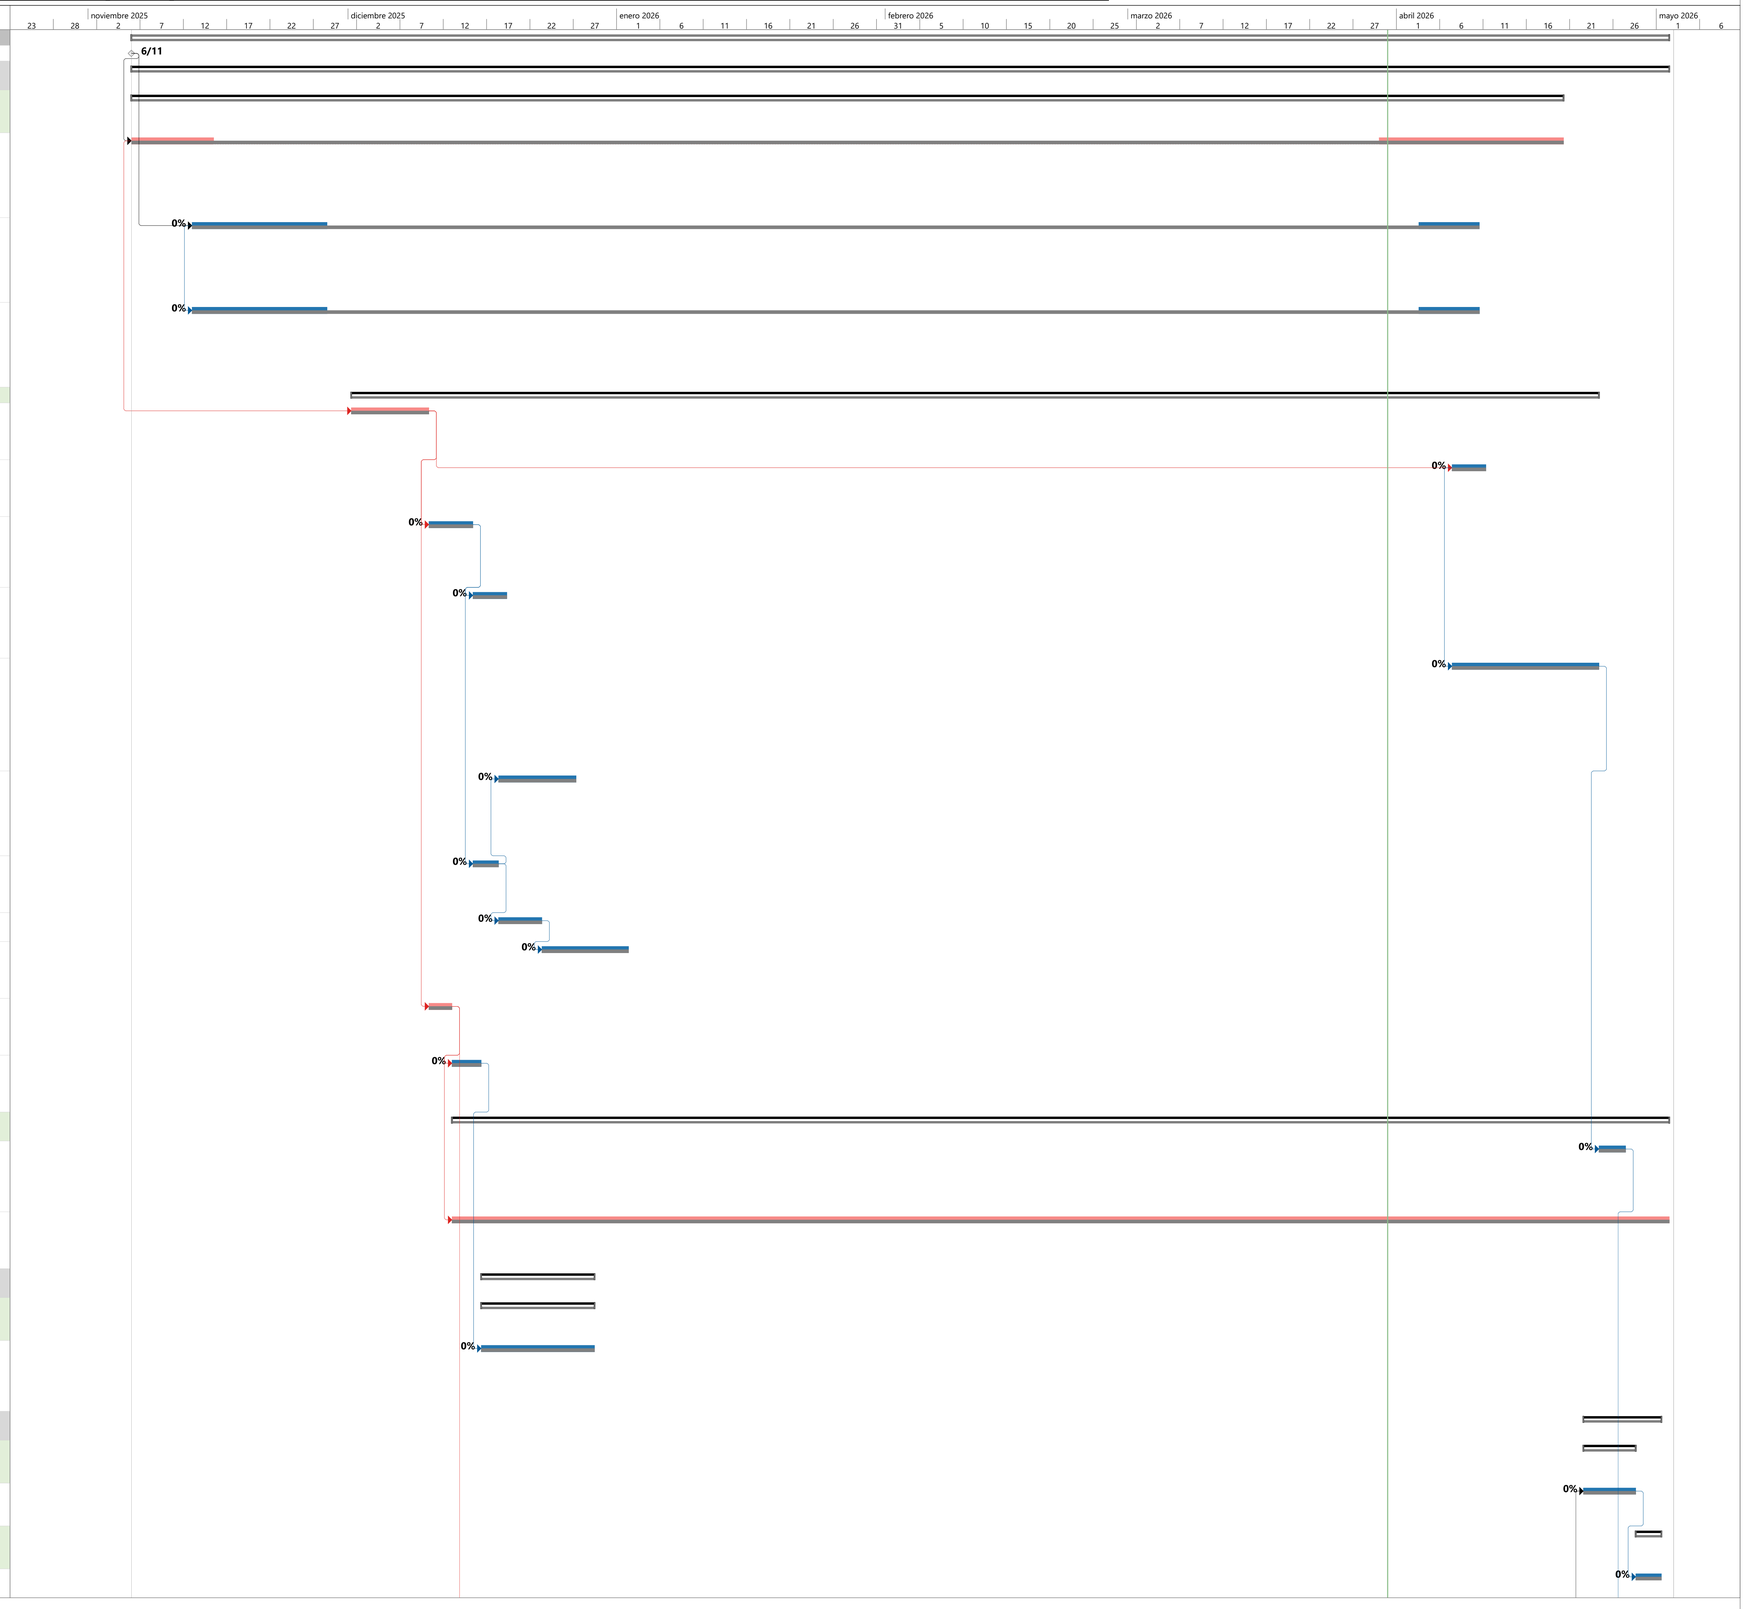


Proyecto: IED FRANCISCO JOSE
Fecha: mar 31/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

COLEGIO (ITI) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	Costo
30		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**113.5 días**	**mar 16/12/25**	**mar 28/04/26**		**$8,989,761.99**
31		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1.5 días**	**lun 27/04/26**	**mar 28/04/26**		**$240,797.99**
32		4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	2.00	1.5 días	lun 27/04/26	mar 28/04/26	20	$240,797.99
33		**4.9**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**19 días**	**mar 16/12/25**	**jue 8/01/26**		**$8,748,964.00**
34		4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	45.00	10 días	mar 16/12/25	lun 29/12/25	17FC+2 días	$8,553,609.00
35		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	33.70	7 días	mié 31/12/25	jue 8/01/26	34FC+2 d	$195,355.00
36		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15 días**	**lun 6/04/26**	**mié 22/04/26**		**$10,499,235.20**
37		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	2.00	2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26		$264,385.06
38		5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA	UN	4.00	3 días	mar 7/04/26	vie 10/04/26	37	$841,314.79
39		5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	5.00	2 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	38	$152,732.67
40		5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	52.06	4 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	39	$1,264,340.24
41		5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	52.06	4 días	vie 17/04/26	mié 22/04/26	40	$871,456.76
42		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	18.00	3 días	lun 13/04/26	jue 16/04/26	39	$3,381,149.00
43		5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	18.00	3 días	jue 16/04/26	lun 20/04/26	42	$3,723,856.68
44		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**jue 22/01/26**	**lun 2/02/26**		**$5,561,176.76**
45		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**jue 22/01/26**	**lun 2/02/26**		**$5,561,176.76**
46		7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO)	M2	82.59	10 días	jue 22/01/26	lun 2/02/26		$5,561,176.76
47		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 día**	**mar 3/02/26**	**mar 3/02/26**		**$10,521,855.52**
48		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	94.01	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	46	$10,521,855.52
49		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**12 días**	**mar 14/04/26**	**mar 28/04/26**		**$16,747,108.66**
50		**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**mar 14/04/26**	**vie 17/04/26**		**$3,767,238.67**
51		9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.53	3 días	mar 14/04/26	vie 17/04/26	48FC+6C días	$3,767,238.67
52		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**9 días**	**vie 17/04/26**	**mar 28/04/26**		**$12,979,869.99**
53		9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA M	M2	15.20	7 días	vie 17/04/26	lun 27/04/26	51	$8,492,075.04
54		9.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO CON ALFAJIA Y REFUERZOS ANTI FLEXIÓN CADA 50CM. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O	M2	8.13	2 días	lun 27/04/26	mar 28/04/26	53	$4,487,794.95
55		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15 días**	**lun 6/04/26**	**mié 22/04/26**		**$55,068,844.52**
56		10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00	7 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26		$10,261,366.41

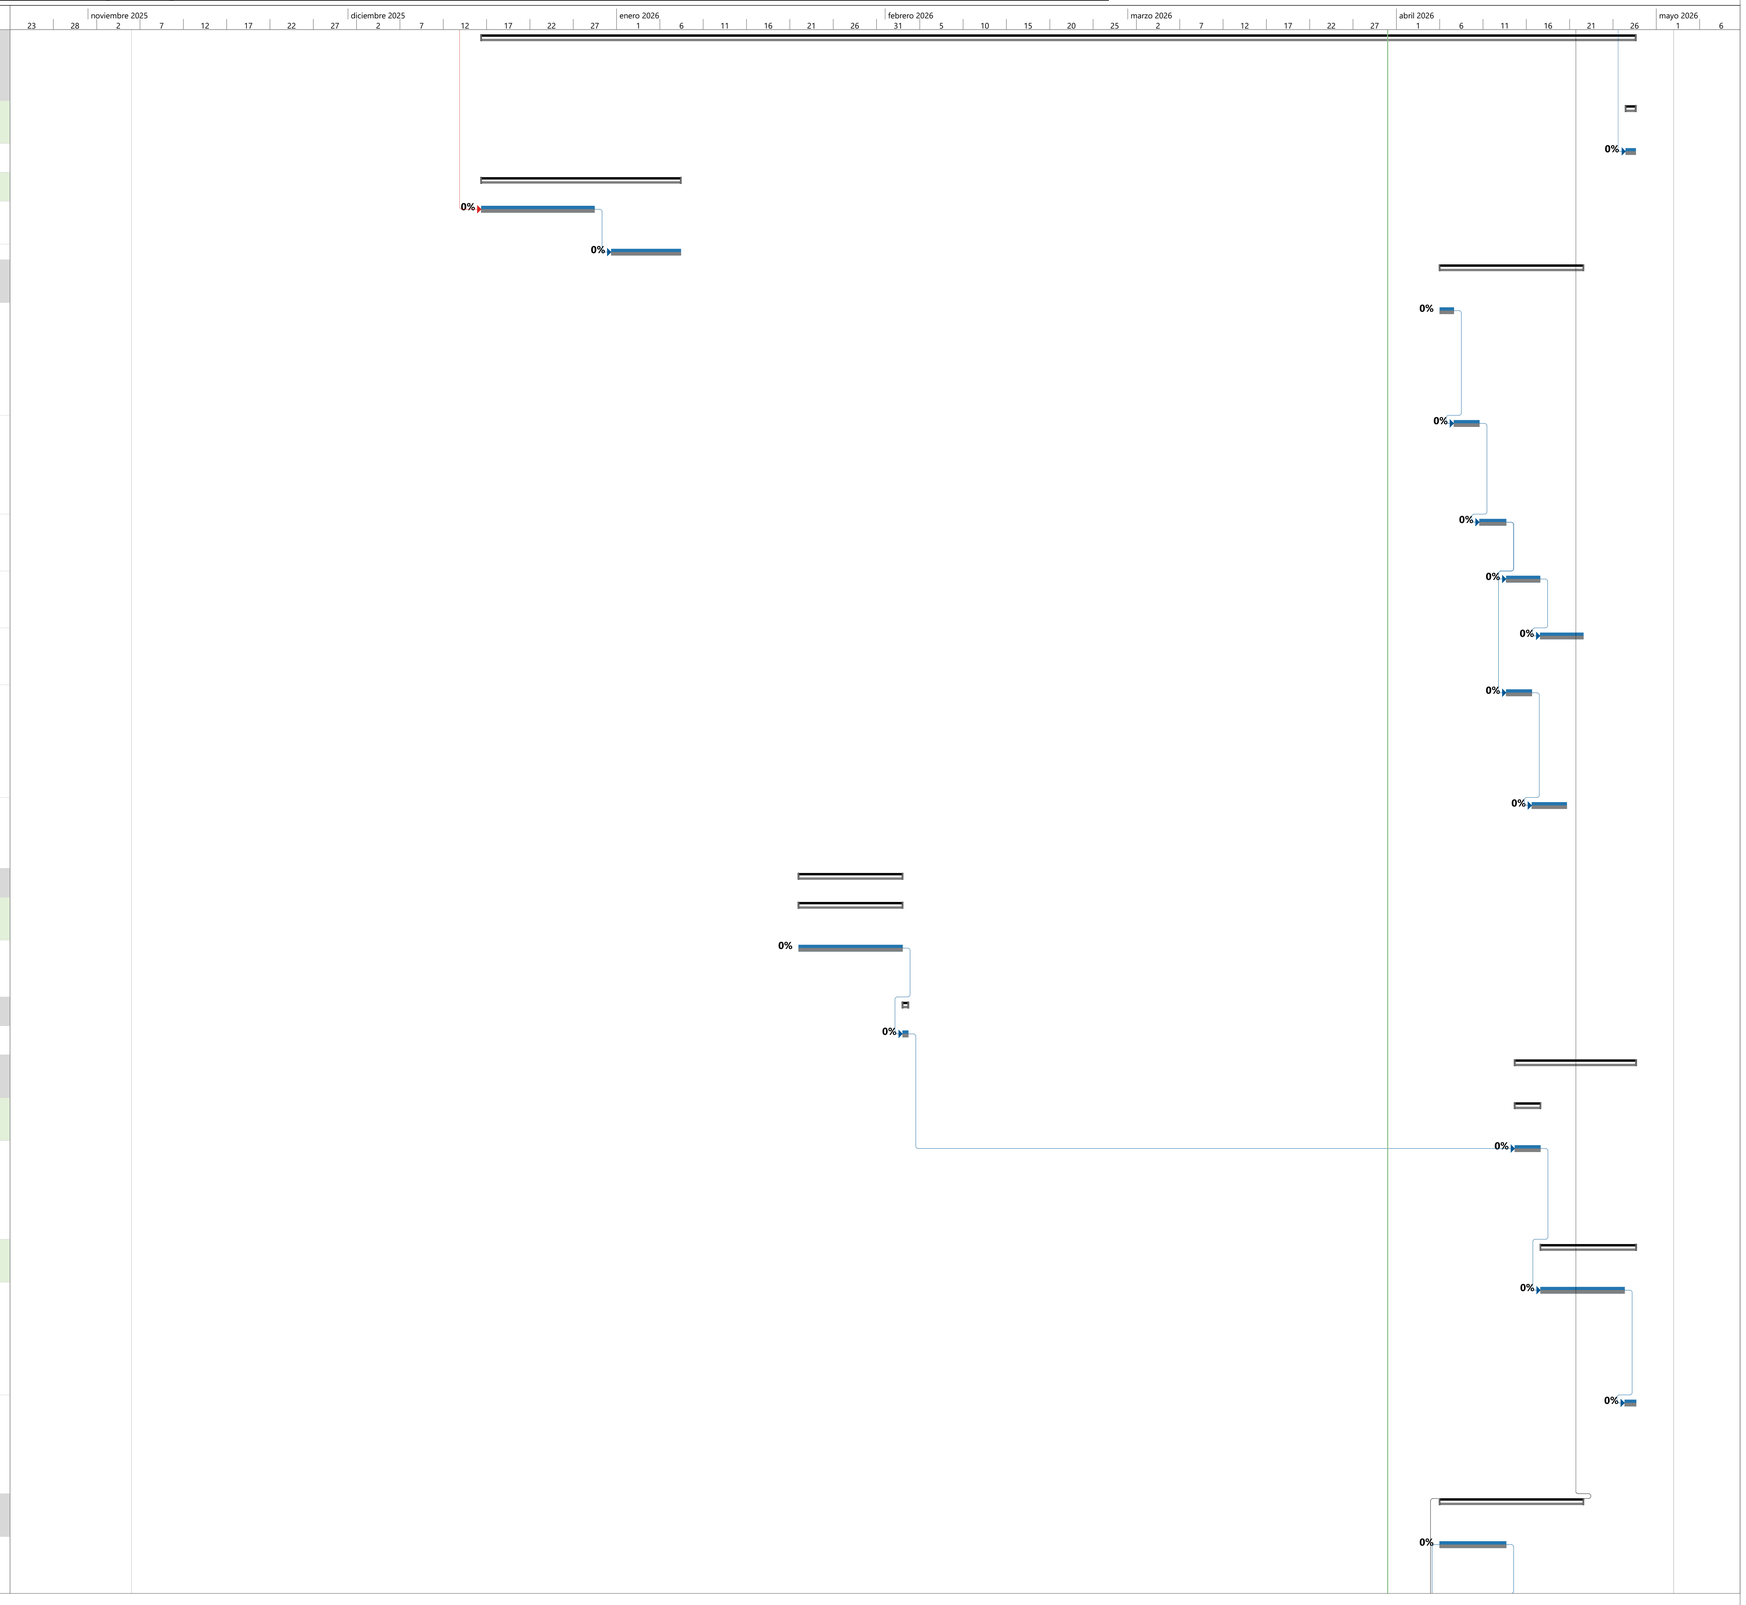


Proyecto: IED FRANCISCO JOSE
Fecha: mar 31/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

COLEGIO (ITI) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	Costo
57		10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	20.00	8 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	56CC	$23,152,510.00
58		10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	13.00	5 días	mié 8/04/26	mar 14/04/26	57CC+3 días	$10,459,867.00
59		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	15.00	7 días	lun 13/04/26	mar 21/04/26	56	$6,321,986.00
60		10.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	13.00	5 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26	58	$4,701,741.30
61		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	1 día	mar 21/04/26	mié 22/04/26	59	$171,373.81
62		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15 días**	**vie 10/04/26**	**mar 28/04/26**		**$28,594,748.98**
63		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	25.24	12 días	vie 10/04/26	vie 24/04/26	55CC+5 días	$24,060,319.98
64		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	4.40	8 días	lun 20/04/26	mar 28/04/26	63CC+7 días	$4,534,429.00
65		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**61 días?**	**vie 20/02/26**	**vie 1/05/26**		**$37,457,766.68**
66		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15 días**	**vie 20/02/26**	**mar 10/03/26**		**$16,987,482.74**
67		12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	99.51	5 días	vie 20/02/26	jue 26/02/26		$4,271,037.96
68		12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	99.51	5 días	jue 26/02/26	mar 3/03/26	67	$1,298,406.14
69		12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	340.01	5 días	jue 26/02/26	mar 3/03/26	68CC	$3,332,544.09
70		12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	340.01	10 días	jue 26/02/26	mar 10/03/26	67	$8,085,494.55
71		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**13 días?**	**mié 15/04/26**	**jue 30/04/26**		**$13,747,064.48**
72		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	99.51	1 día?	mié 15/04/26	jue 16/04/26		$3,319,695.07
73		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	124.41	11 días	vie 17/04/26	jue 30/04/26	72CC+2 días	$3,859,891.00
74		12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	170.01	11 días	vie 17/04/26	jue 30/04/26	73CC	$3,516,933.59
75		12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	170.01	11 días	vie 17/04/26	jue 30/04/26	74CC	$3,050,544.82
76		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**jue 30/04/26**	**vie 1/05/26**		**$6,723,219.46**
77		12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CE	M	704.03	2 días	jue 30/04/26	vie 1/05/26	75	$6,723,219.46
78		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3.5 días**	**mié 29/04/26**	**sáb 2/05/26**		**$1,636,691.26**
79		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	6.40	3 días	mié 29/04/26	vie 1/05/26		$1,322,341.88
80		14.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS	M2	6.40	0.5 días	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	79	$314,349.38
81		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15 días**	**mié 15/04/26**	**vie 1/05/26**		**$61,536,377.34**
82		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	38.85	7 días	vie 24/04/26	vie 1/05/26	83	$4,300,445.09
83		16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2	341.20	8 días	mié 15/04/26	jue 23/04/26		$57,235,932.25
84		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**149 días**	**jue 6/11/25**	**sáb 2/05/26**		**$34,397,532.52**
85		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	339.11	149 días	jue 6/11/25	sáb 2/05/26		$1,647,410.49
86		18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	9354.40	15 días	mié 15/04/26	vie 1/05/26		$32,750,122.03
87			FIN DE OBRA			0 días	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	85	$0.00

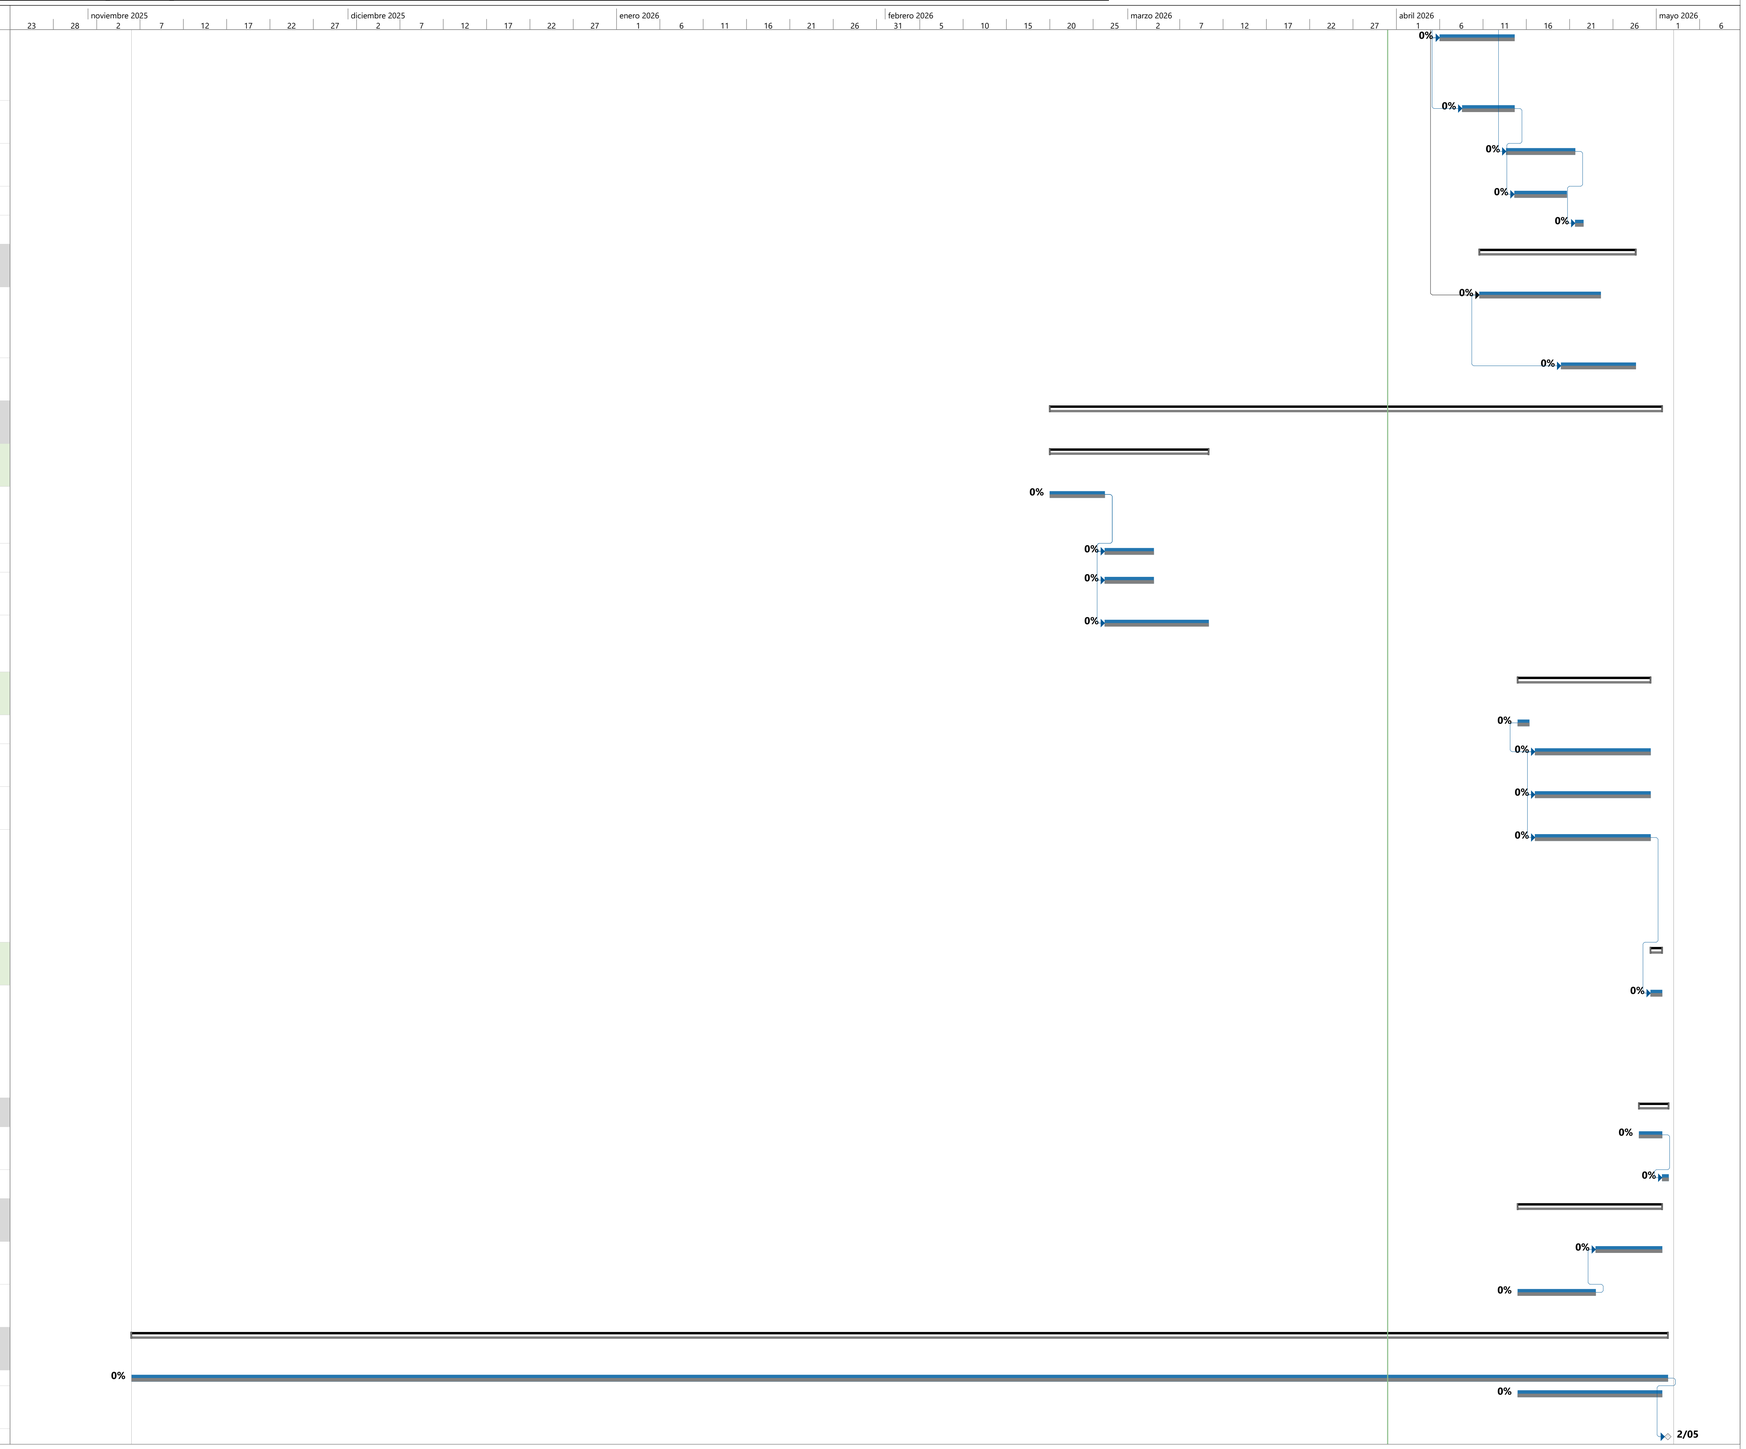

Proyecto: IED FRANCISCO JOSE
Fecha: mar 31/03/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

COLEGIO IED (ITI) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE C


N	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo
1		**IED FRANCISCO JOSE DE CALDAS C**			**577.0 días**	**vie 21/11/25**	**sáb 2/5/26**		**$680,358,705.32**
2		**PRELIMINARES**			**577 días**	**vie 21/11/25**	**sáb 2/5/26**		**$43,771,105.42**
3		**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**			**577 días**	**vie 21/11/25**	**sáb 2/5/26**		**$43,771,105.42**
4	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**			**126 días**	**vie 21/11/25**	**vie 1/5/26**		**$15,970,327.61**
5	1.1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 H=2.44 M INCLUYE PUERTAS DE ACCESO, ANDENES DE PROTECCION, ILUMINACION, SEÑALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y ESCOMBROS. INCLUYE: ACTA DE VECINDAD, PERMISOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO. INCLUYE: ACTA DE VECINDAD, PERMISOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO.	M2	40.000	9 días	vie 21/11/25	jue 27/11/25	3	$176,423.62
6	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA Construir paredes de madera 5"x5" anclarlas al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ACTURA DEL CERRAMIENTO: Se debe pintar y retocar nuevamente pintura de la estatal	M	111.00	170 días	vie 28/11/25	vie 1/05/26	4	$3,597,020.25
7	1.1.4	CERRAMIENTO EN TELA DE ZINC Construir paredes de madera 5"x5" anclarlas al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 pulg - ACTURA DEL CERRAMIENTO: Se debe pintar y retocar nuevamente pintura de la estatal	M	81.81	99 días	vie 28/11/25	jue 26/3/26	4	$12,196,871.74
8	**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**92.5 días**	**vie 28/11/25**	**jue 30/3/26**		**$9,512,323.62**
9	1.2.6	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.42	8 días	vie 28/11/25	mar 9/12/25	5	$982,475.05
10	1.2.8	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL DE PESO E= 0,36 A 0,50M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	43.05	10 días	mar 9/12/25	vie 19/12/25	8	$1,286,936.77
11	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL DESDE E= 0,51M HASTA E= 0,75M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20.10	4 días	lun 9/12/25	vie 12/12/25	14	$675,998.09
12	1.2.11	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.01	6 días	vie 12/12/25	vie 26/12/25	10	$344,383.58
13	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.36	3 días	mar 23/12/25	mar 24/12/25	11	$758,122.21
14	1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.33	4 días	mar 24/12/25	sáb 26/12/25	12	$103,350.56
15	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA INCLUYE: TEJA, ENTRETECHO, CIELORRASO, ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, CANALONES, BAJANTES, ACCESORIOS HIDRÁULICOS METÁLICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	322.53	25 días	lun 12/01/26	lun 9/02/26		$4,338,838.59
16	1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE EN DRYWALL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.66	4 días	lun 9/02/26	vie 13/02/26	14	$413,957.23
17	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 W DE CABLEADO (INCLUYE CANALIZACIÓN, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26	15	$74,796.26
18	1.2.32	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE CANALIZACIÓN Y CABLEADO)	UN	4.00	4 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26	13	$33,124.49
19	1.2.36	RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51.36	10 días	jue 5/02/26	mar 17/02/26	17	$2,002,836.97
20	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL SOLIDO CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.13	2 días	sáb 21/12/25	mar 23/12/25	9	$73,759.16
21	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES (INCLUYE: LAVAMANOS, LAVAPLATOS, LAVAMANOS Y DERIVADOS COMPUOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MEZAMS)	UN	1.00	2 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	18	$15,281.26
22	**1.3**	**MANTENIMIENTOS**			**19 días**	**jue 5/03/26**	**jue 26/03/26**		**$14,755,560.32**
23	1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO (INCLUYE: RETIRO DE PINTURA, SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	263.50	19 días	jue 5/03/26	jue 26/03/26		$14,755,560.32
24	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**			**66.38 días**		**mar 25/05/26**	**sáb 1/05/26**	**$3,513,794.37**
25	1.4.4	PEGADO DE PISO CERAMICO EN PARED CON ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31.07	4 días	mar 31/03/26	vie 3/04/26		$909,716.32
26	1.4.5	TRASLEDO CARRETILLA UNIDIMENTE (INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS)	M3	80.00	53.5 días	lun 2/03/26	sáb 2/05/26		$2,893,730.83
27	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	8.00	2 días	vie 21/03/26	lun 30/03/26	24	$130,272.22
28	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**			**92.13 días**	**mar 21/12/25**	**vie 10/04/26**		**$30,652,848.28**
29	**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**29.88 días**	**mie 2/03/26**	**vie 6/03/26**		**$4,454,445.27**
30	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	39.08	4 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	9	$1,919,242.00
31	2.1.8	RELLENO CON (INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO ESI (SUMINISTRO, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y	M3	34.32	8 días	vie 2/01/26	vie 9/01/26	33	$2,626,198.27
32	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**			**50 días**	**mar 23/12/25**	**mar 17/03/26**		**$5,385,763.57**
33	2.2.2	LOSETA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0.0320	10 días	vie 9/01/26	jue 22/01/26	30	$2,115.66
34	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 22 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	11.80	9 días	mar 23/12/25	vie 2/01/26		$1,093,506.00
35	2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y REFUERZO	M2	34.90	10 días	mié 14/01/26	mar 27/01/26	37	$4,390,305.91
36	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**			**13 días**	**vie 9/01/26**	**jue 29/01/26**		**$441,664.87**
37	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	0.000k	3 días	jue 22/01/26	jue 29/01/26	32	$3.00
38	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, 0E 0.15 A 0.25	KG	59.68	3 días	vie 9/01/26	mar 13/01/26	30	$441,661.87
39	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**sáb 6/06/26**	**vie 20/06/26**		**$6,370,999.57**
40	2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA ESTRUCTURAL EN ACERO SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA	KG	286.97	5 días	sáb 6/06/26	vie 20/06/26		$6,370,999.57
41	**3**	**MAMPOSTERÍAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**vie 10/04/26**	**lun 13/04/26**		**$387,043.29**
42	**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**			**2 días**	**vie 10/04/26**	**lun 13/04/26**		**$387,043.29**
43	3.3.2	ANCLAJES VARILLA 3/4" L=0,45 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y DEMÁS)	CM	40.00	2 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	39	$387,043.29
44	**4**	**INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS, GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**			**15 días**	**lun 13/04/26**	**vie 30/04/26**	**42**	**$9,268,875.02**
45	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**			**15 días**	**lun 13/04/26**	**vie 30/04/26**		**$1,958,113.03**
46	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-U INCLUYE ACCESORIOS	M	20.00	15 días	lun 13/04/26	jue 30/04/26		$1,958,113.03
47	**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**3 días**	**lun 13/04/26**	**jue 16/04/26**		**$390,321.00**
48	**4.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRES Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**			**4 días**	**lun 13/04/26**	**vie 17/04/26**		**$255,593.00**
49	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO PARA LAVATANC TANQUE 10"	UN	1.00	4 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26		$66,179.00
50	4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1.00	4 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26		$189,414.00
51	**4.7**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**lun 13/04/26**	**jue 16/04/26**		**$952,438.00**
52	4.7.3	CAJA DE INSPECCION RD 3 BD EN CONCRETO 3000, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	3 días	lun 13/04/26	jue 16/04/26		$952,438.00
53	**4.9**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**			**3 días**	**lun 13/04/26**	**jue 16/04/26**		**$5,702,405.99**
54	4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS EXISTENTES Y MONTAJE DE APARATOS	UN	30.00	3 días	lun 13/04/26	jue 16/04/26	20	$5,702,405.99
55	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**17 días**	**vie 10/04/26**	**jue 30/04/26**		**$3,694,585.62**
56	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE 12 AWG (2.5 MM2) TW, TUBERIA EMT ½" THHN Y TUBERIA PVC ½" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	1.00	2 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	39	$132,353.00
57	5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A, 125V, NACIONAL S. DA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 10 AWG (5.26 MM2) TW, 90°C (194°F) THHN Y TUBERIA PVC ½" HASTA 4M. INCLUYE ACCESORIOS, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CON	UN	1.00	2 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	56	$205,519.00
58	5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ½" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	6.50	3 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26	57	$357,861.00
59	5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1/0AWG DE 4 HILOS (3 FASE + NEUTRO) + HFTP (72 AWG THHN	M	6.50	6 días	sáb 18/04/26	jue 23/04/26	58	$140,765.00
60	5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE 12 AWG (2.5 MM2) TW, 90°C (194°F) THHN Y TUBERIA EMT ½" HASTA 4M. INCLUYE PRESEA ESTIRA, CAJA RAWEL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	3.00	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26	59	$563,525.00
61	5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	10.00	4 días	sáb 25/04/26	jue 30/04/26	60	$2,479,718.62
62	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**16 días**	**jue 16/04/26**	**vie 1/05/26**		**$9,029,447.02**
63	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**jue 16/04/26**	**vie 24/04/26**		**$3,324,953.22**
64	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZA EN MORTERO 1:3 E= 0,0a CM (PROMEDIO), INCLUYE ESTRIADO, PULIDO Y ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	31.07	4 días	jue 16/04/26	mar 21/04/26	55Cl + 5 días	$2,255,111.71
65	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 (INCLUYE ESTRIADO)	M	40.88	3 días	mar 21/04/26	vie 24/04/26	64	$1,069,788.43
66	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**mar 21/04/26**	**vie 1/05/26**		**$5,704,494.91**
67	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERAMICA 30X30 CM, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	6.97	5 días	mar 21/04/26	lun 27/04/26	64	$1,528,560.64
68	7.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO EN CERAMICA	M	35.00	4 días	lun 27/04/26	vie 1/05/26	67	$2,772,036.78
69	7.2.35	VESTIDENQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CARA (CURVO	M2	20.85	5 días	lun 27/04/26	vie 1/05/26	67	$1,403,929.48
70	**8**	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**vie 24/04/26**	**vie 1/05/26**		**$8,342,523.62**
71	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	25.67	4 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26		$2,805,902.75
72	8.1.2	MURO DE DRYWALL DOBLE CARA E= 12 CM, LAMINA DE YESO CEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E	M2	25.07	7 días	vie 24/04/26	vie 1/05/26	71CC	$5,536,620.87
73	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3.5 días**	**mié 29/04/26**	**sáb 2/05/26**		**$20,254,044.25**
74	**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN CELL ROLLIZO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3.5 días**	**mié 29/04/26**	**sáb 2/05/26**	**71**	**$27,844,609.27**
75	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA CEL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADO, INCLUYE ENTANG, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TESI	M2	13.03	2 días	mié 29/04/26	jue 30/04/26		$1,059,057.37
76	9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA CEL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON ENTAMBORADO, INCLUYE CERRADUR CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN	M2	12.04	2 días	mié 29/04/26	jue 30/04/26	75CC	$10,152,704.99
77	9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTAS EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 EN TUBO DE 3	M	15.00	3.5 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26		$6,777,886.91
78	**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3.5 días**	**mié 29/04/26**	**sáb 2/05/26**		**$3,354,434.98**
79	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON VIDRIO INCOLORO DE 4 MM EXTERIOR Y ALPAJA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE AGUA Y POLVO	M2	6.70	3.5 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26	77CC	$3,354,434.98
80	**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10.38 días**	**lun 16/03/26**	**jue 26/03/26**		**$568,252.53**
81	10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ACERO Y SIFÓN)	UN	1.00	2 días	lun 16/03/26	mar 17/03/26		$425,445.74
82	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TANQUE DE 10" A 12"	UN	1.00	2 días	sáb 21/06/26	mar 23/06/26		$42,864.65
83	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOPORTE DE 4 X 2	UN	3.00	2 días	mar 24/06/26	jue 26/06/26	82	$104,302.34
84	**11**	**APARATOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 28/03/26**		**$2,999,605.82**
85	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHADOR PARA MANO CON OTRA COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTICROS, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 17	M2	1.71	6 días	mar 17/03/26	mar 24/03/26	81	$2,630,077.05
86	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA CEDING	M2	1.32	4 días	mar 24/03/26	sáb 28/03/26	85	$1,369,528.67
87	**12**	**PINTURA DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**32 días**	**lun 23/03/26**	**sáb 2/05/26**		**$8,303,601.30**

COLEGIO IED (ITI) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE C

N°	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo
89	**12.2**	**PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**12 días**	**lun 25/04/26**	**sáb 2/05/26**		**$7,521,727.82**
89	12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	194.55	3 días	lun 25/04/26	lun 27/04/26		$4,365,044.86
90	12.2.2	PINTURA ESTUCO A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	39.61	4 días	lun 25/04/26	sáb 25/04/26	89CC	$1,321,106.11
91	12.2.a	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33.44	6 días	lun 27/04/26	sáb 2/05/26	90	$777,820.48
92	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ANTIGRAFITI EN VIGAS, COLUMNAS Y CARTERAS, (CUATRO, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,60 M HASTA 1,5 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	31.85	5 días	lun 27/04/26	vie 1/05/26	91CC	$1,059,456.37
93	**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5.5 días**	**lun 27/04/26**	**sáb 2/05/26**		**$1,397,873.48**
94	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE SOBRE SUPERFICIES METALICAS ESTRUCTURALA A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS (INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y ELEMENTOS DE UNION HASTA UNA DE 12 M2 (INCLUYE ANDAMIOS CE	M	148.38	5.5 días	lun 27/04/26	sáb 2/05/26	92CC	$1,397,873.48
95	**15**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**3 días**	**sáb 25/04/26**	**mié 29/04/26**		**$2,050,065.02**
96	15.1.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	15.82	3 días	sáb 25/04/26	mié 29/04/26		$2,050,065.02
97	**16**	**CUBIERTAS Y IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**21 días**	**sáb 6/06/26**	**mié 30/06/26**		**$37,150,382.71**
98	16.1.1	RETIRO DE CANALES EXISTENTES INCLUYE LIMPIA SALVAMACHOS CL. 23 - DESARROLLO 80 CM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	24.00	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	101	$2,656,643.60
99	16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.85	2 días	vie 2/x/26	lun 27/04/26	102	$202,235.98
100	16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4.40	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	99	$106,631.00
101	16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA)	M2	28.00	2 días	vie 2x/04/26	lun 27/04/26	102	$2,706,161.93
102	16.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CABALLETE ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	8.00	2 días	mié 22/04/26	vie 2x/04/26	103	$2,077,302.85
103	16.1.17	SUMINISTRO Y MONCAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (CORREAS PARA CUBIERTA, (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, TORNILLERIA, PERFILES ALINZ	M2	90.95	15 días	sáb 4/04/26	mié 22/04/26		$24,625,375.79
104	16.1.2a	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EDROSF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y ACCESORIOS)	M2	27.03	5 días	sáb 4/04/26	vie 10/04/26	103CC	$4,524,253.37
105	**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**81.5 días**	**vie 21/11/25**	**jue 26/02/26**		**$2,754,264.20**
106	**IMP**	**ITEMS NO CONTEMPLADOS**			**3 días**	**lun 25/04/26**	**vie 29/04/26**		**$3,889,107.72**
107	IMP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACESCBA TIPO PAYANDE			3 días	lun 25/04/26	vie 2x/04/26		$3,889,107.72
112		**FIN DE OBRA**			**0 días**	**sáb 2/05/26**	**sáb 2/05/26**	**25**	**$0.00**

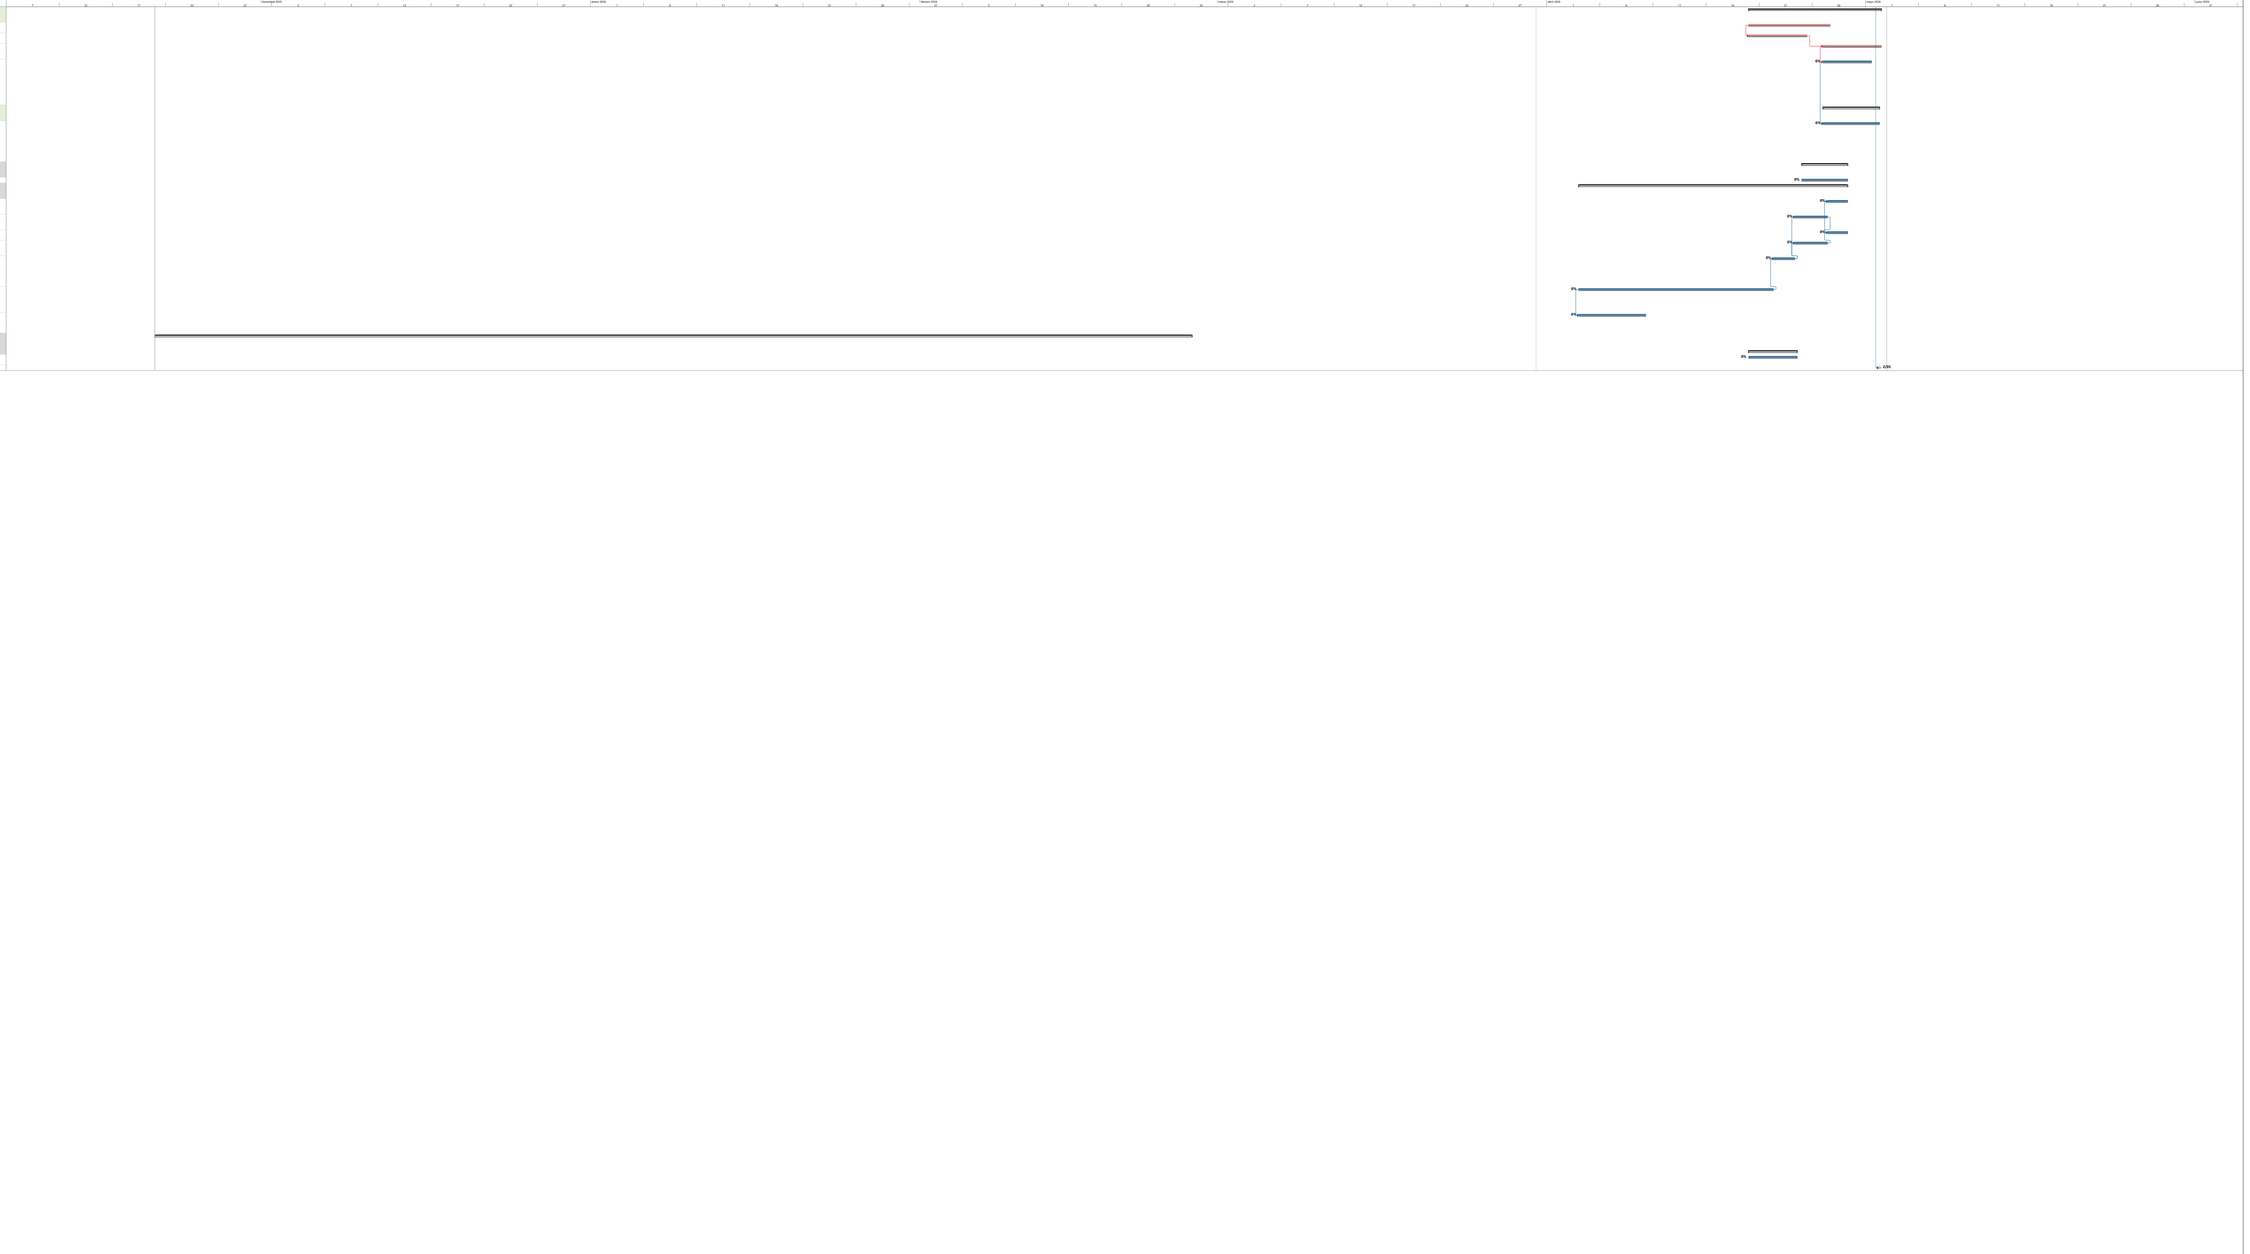
diciembre 2025
ene 2026
febrero 2026
marzo 2026
abril 2026
mayo 2026
junio 2026
0%
0%
0%

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1			**PROGRAMACION ABEL RODRIGUEZ**			**74,13 días?**	**lun 16/02/26**	**sáb 2/05/26**		**$ 99.999.999,00**
2			**INICIO PROYECTO**			**74,13 días?**	**lun 16/02/26**	**sáb 2/05/26**		**$ 99.999.999,00**
3		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**20 días**	**jue 26/02/26**	**jue 19/03/26**		**$ 11.000.594,00**
4		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	495,51	20 días	jue 26/02/26	jue 19/03/26	7	$ 11.000.594,00
5		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**sáb 21/02/26**	**jue 26/02/26**		**$ 1.257.897,00**
6		**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**sáb 21/02/26**	**jue 26/02/26**		**$ 1.257.897,00**
7		3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	130,00	5 días	sáb 21/02/26	jue 26/02/26	10	$ 1.257.897,00
8		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**8 días**	**lun 16/02/26**	**mar 24/02/26**		**$ 2.411.000,00**
9		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**8 días**	**lun 16/02/26**	**mar 24/02/26**		**$ 2.411.000,00**
10		4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45,00	6 días	lun 16/02/26	sáb 21/02/26		$ 695.147,00
11		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	109,90	8 días	lun 16/02/26	mar 24/02/26		$ 1.715.853,00
12		**4.4**	**RED DE AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**mar 24/02/26**	**mié 25/02/26**		**$ 132.358,00**
13		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**mar 24/02/26**	**mié 25/02/26**		**$ 132.358,00**
14		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	2,00	2 días	mar 24/02/26	mié 25/02/26	11	$ 132.358,00
15		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**62,38 días**	**sáb 21/02/26**	**lun 27/04/26**		**$ 1.289.381,00**
16		4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	4,00	3 días	sáb 21/02/26	mar 24/02/26	10	$ 339.008,00
17		4.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3/4"	UN	4,00	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	16	$ 537.634,00
18		4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	2,00	2 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	21	$ 412.739,00
19		**4.9**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**32 días**	**jue 26/02/26**	**mié 1/04/26**		**$ 6.661.230,00**
20		4.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 5000 LTS	UN	1,00	16 días	jue 26/02/26	sáb 14/03/26	17	$ 5.016.517,00
21		4.9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1,00	16 días	lun 16/03/26	mié 1/04/26	20	$ 1.644.713,00
22		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**25 días?**	**lun 16/03/26**	**vie 10/04/26**		**$ 9.254.735,00**
23		5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	2,00	3 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	24	$ 325.481,00
24		5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L	UN	2,00	1 día?	lun 16/03/26	lun 16/03/26	26	$ 528.581,00
25		5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN	2,00	1 día?	vie 3/04/26	sáb 4/04/26	27	$ 384.414,00
26		5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA IMC DE 1"	M	35,00	9 días	jue 19/03/26	sáb 28/03/26	4	$ 3.001.745,00
27		5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	92,91	6 días	sáb 28/03/26	vie 3/04/26	26	$ 2.012.068,00
28		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	2,00	3 días	vie 3/04/26	mar 7/04/26	27	$ 375.683,00
29		5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2,00	3 días	mar 7/04/26	vie 10/04/26	28	$ 520.340,00
30		5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	35,00	8 días	sáb 28/03/26	lun 6/04/26	26	$ 2.106.423,00
31		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**sáb 4/04/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 811.718,00**
32		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**sáb 4/04/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 811.718,00**
33		12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CE	M	85,00	7 días	sáb 4/04/26	sáb 11/04/26	36	$ 811.718,00
34		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**33 días**	**jue 19/03/26**	**mié 22/04/26**		**$ 5.271.902,00**
35		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	10,50	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	37	$ 1.162.282,00
36		16.1.10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	15,00	16 días	jue 19/03/26	sáb 4/04/26	4	$ 1.593.386,00
37		16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF LIPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2	15,00	14 días	sáb 4/04/26	lun 20/04/26	36	$ 2.516.234,00
38		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**73 días**	**mar 17/02/26**	**sáb 2/05/26**		**$ 121.451,00**
39		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	25,00	73 días	mar 17/02/26	sáb 2/05/26		$ 121.451,00
40			**ITEM NO PREVISTOS**			**31 días**	**lun 30/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 61.787.733,00**
41										
42		NP	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO DE PRESIÓN PRE-ENSAMBLADO MARCA PEARL O SIMILAR CON DOS (2) ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE 3,0HP 220/440V/3v -ADT = 53mca(75psi) - Q=80GPM- SXD 1 1/2"X1" - 1 ETAPA CONEXIÓN A BY-PASS CON CONEXIÓN PRUEBA EQ	UN	1	30 días	lun 30/03/26	mié 29/04/26		$ 61.787.733,00

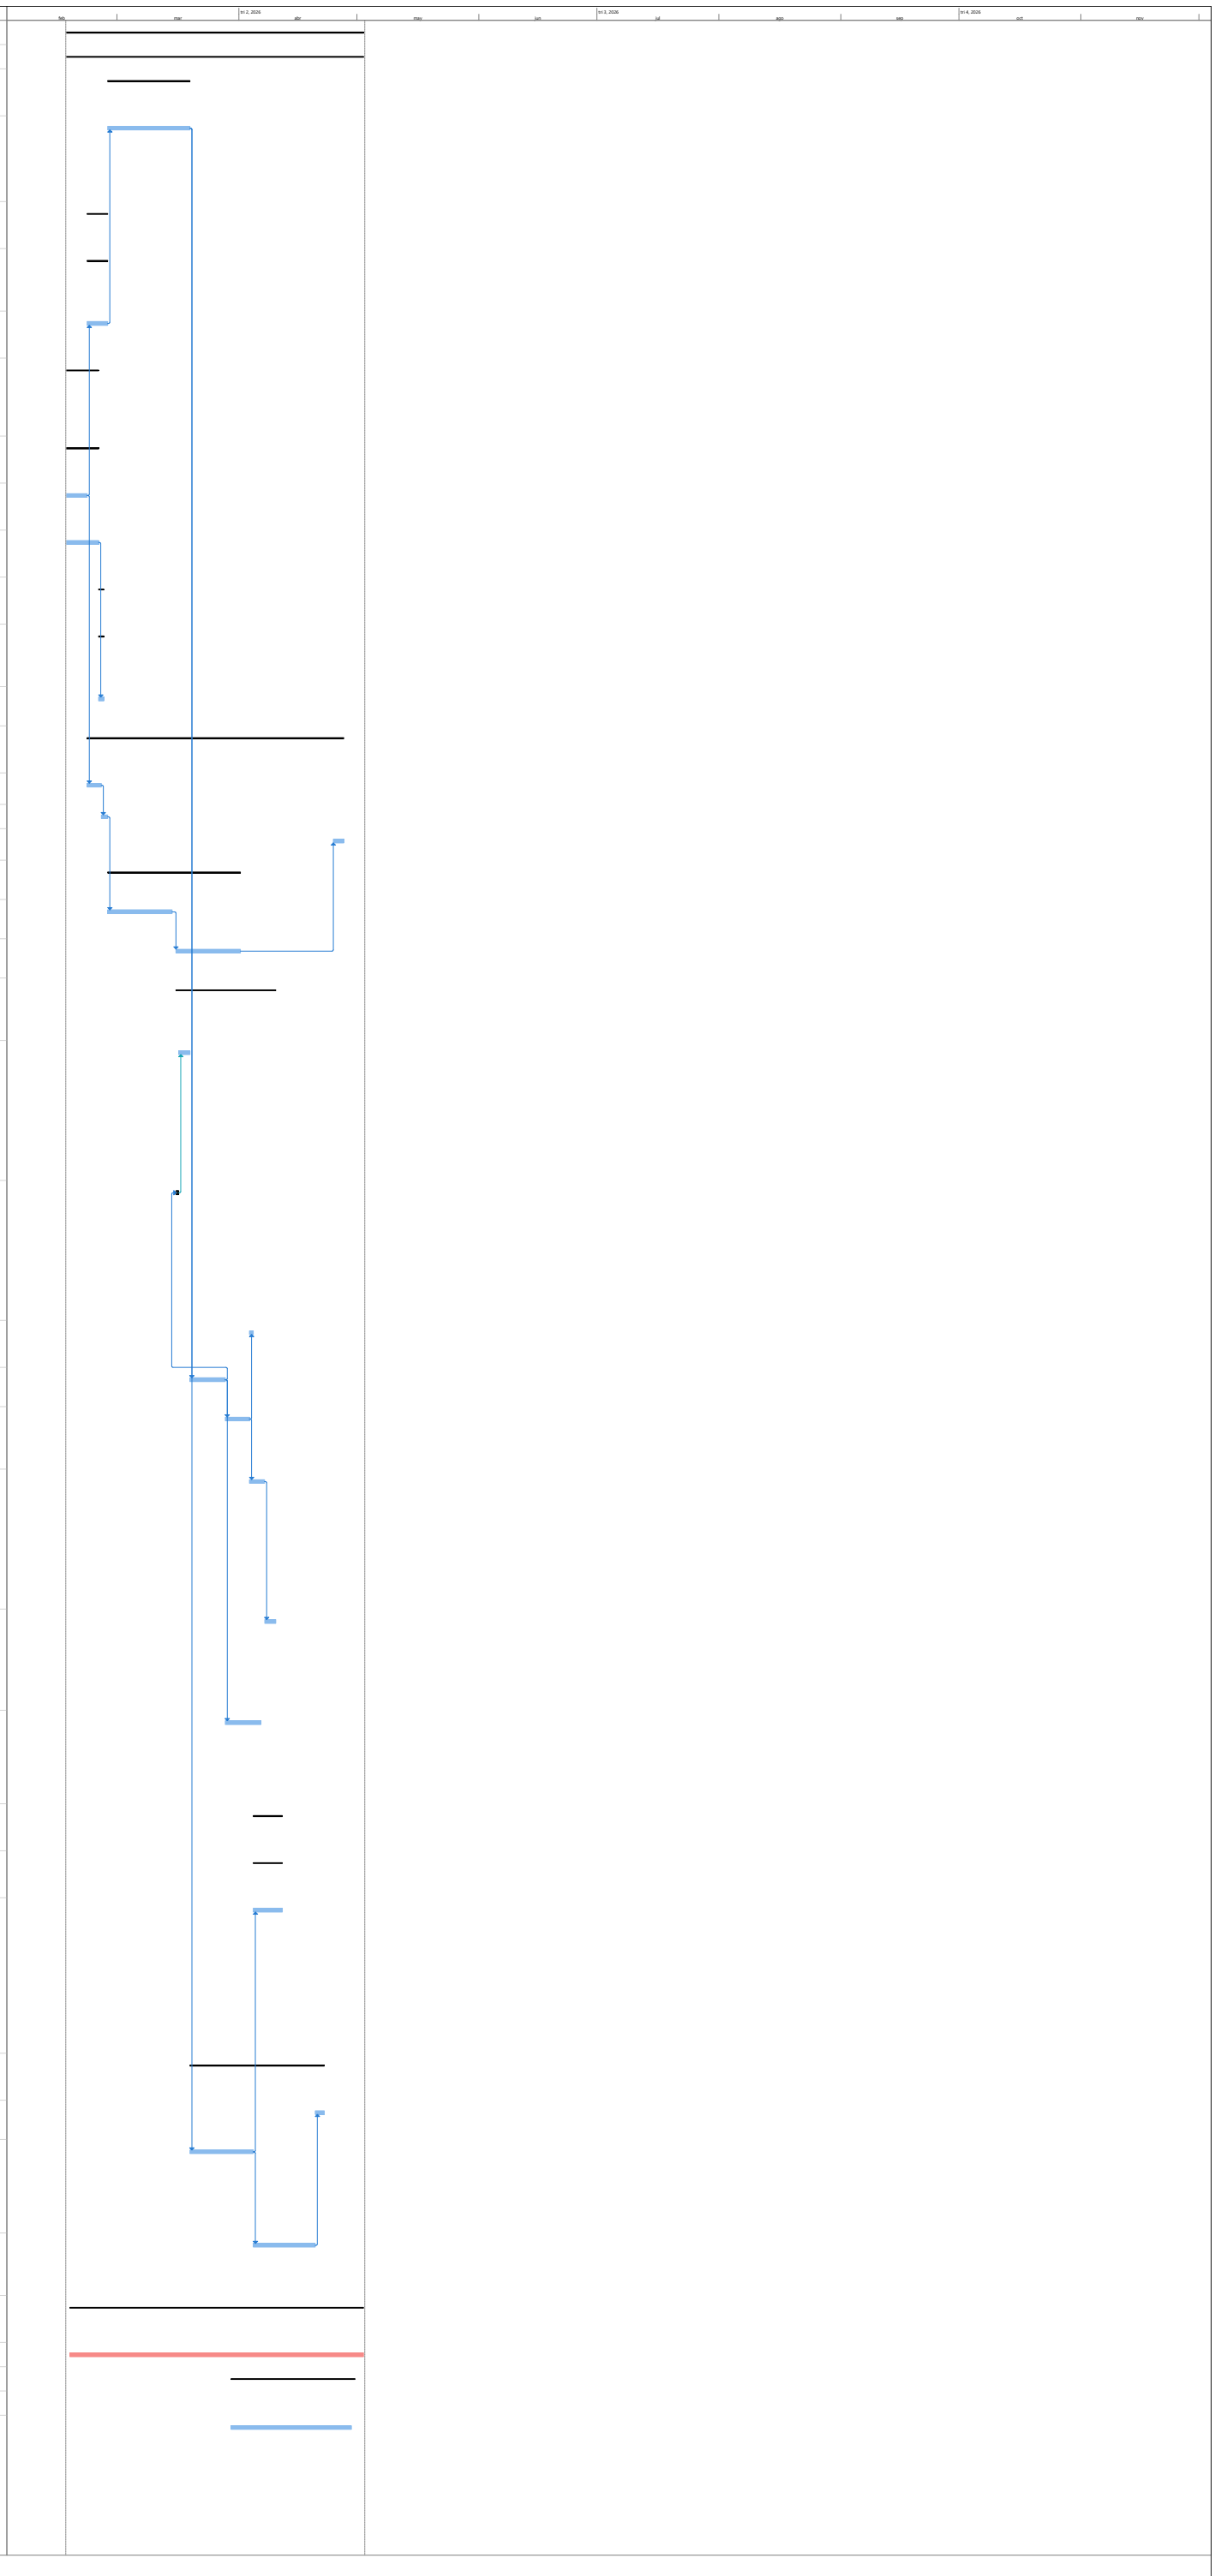

Proyecto: PROGRAMACION AB
Fecha: mié 3/12/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tarea resumida · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Costo
1			**PROGRAMACION ANTONIO VILLAVICENCIO**			**73 días**	**mar 17/02/26**	**sáb 2/05/26**		**$ 90,000,001.00**
2			**INICIO**			**73 días**	**mar 17/02/26**	**sáb 2/05/26**		**$ 90,000,001.00**
3		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			1 día	mar 17/02/26	**mar 17/02/26**		$ 0.00
4		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**73 días**	**mar 17/02/26**	**sáb 2/05/26**		**$ 4,647,600.00**
5		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	25.00	10 días	mar 17/02/26	jue 26/02/26		$ 110,265.00
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	25.00	63 días	jue 26/02/26	sáb 2/05/26	5	$ 810,140.00
7		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	25.00	63 días	jue 26/02/26	sáb 2/05/26	5	$ 3,727,195.00
8		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**30 días**	**mar 17/02/26**	**jue 19/03/26**		$ 7,795,624.00
9		1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.00	5 días	jue 26/02/26	mié 4/03/26	17	$ 3,128,765.00
10		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.60	5 días	sáb 14/03/26	jue 19/03/26	11	$ 350,477.00
11		1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	14.00	5 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26	13	$ 390,569.00
12		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	M	4.00	2 días	sáb 14/03/26	lun 16/03/26	14	$ 86,289.00
13		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O	M2	49.00	5 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26	15	$ 1,735,151.00
14		1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	38.40	5 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26	13	$ 1,029,240.00
15		1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M	45.00	5 días	jue 26/02/26	mié 4/03/26	5	$ 205,848.00
16		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	28.00	5 días	mar 17/02/26	sáb 21/02/26		$ 659,468.00
17		1.2.47	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.00	5 días	sáb 21/02/26	jue 26/02/26	16	$ 209,817.00
18		**1.3**	**MANTENIMIENTOS**			**10 días**	**mar 17/02/26**	**jue 26/02/26**		$ 966,192.00
19		1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M	88.20	10 días	mar 17/02/26	jue 26/02/26		$ 966,192.00
20		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**12 días**	**mar 17/02/26**	**sáb 28/02/26**		$ 6,086,258.00
21		1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE,	M	14.00	12 días	mar 17/02/26	sáb 28/02/26		$ 318,548.00
22		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA	M3	150.00	12 días	mar 17/02/26	sáb 28/02/26		$ 5,425,745.00
23		1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	21.00	12 días	mar 17/02/26	sáb 28/02/26		$ 341,965.00
24		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**24 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 28/03/26**		$ 12,775,716.00
25		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**24 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 28/03/26**		$ 12,775,716.00
26		2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M3	33.60	5 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26	9	$ 4,738,777.00
27		2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.60	5 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26	26	$ 1,874,910.00
28		2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	33.60	5 días	mar 24/03/26	sáb 28/03/26	31	$ 6,162,029.00
29		**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**24 días**	**lun 9/03/26**	**vie 3/04/26**		$ 8,675,951.00
30		2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	1.50	7 días	lun 9/03/26	lun 16/03/26	26	$ 1,598,746.00
31		2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	14.00	7 días	mar 17/03/26	mar 24/03/26	30	$ 2,237,573.00
32		2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	28.00	10 días	mar 24/03/26	vie 3/04/26	31	$ 4,839,632.00
33		**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**27 días**	**lun 9/03/26**	**lun 6/04/26**		$ 6,441,806.00
34		**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**27 días**	**lun 9/03/26**	**lun 6/04/26**		$ 6,441,806.00
35		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE	KG	755.00	3 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26	26	$ 5,705,835.00
36		2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	99.47	3 días	vie 3/04/26	lun 6/04/26	32	$ 735,971.00
37		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**18 días**	**sáb 21/03/26**	**jue 9/04/26**		$ 16,737,316.00
38		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE	KG	753.91	18 días	sáb 21/03/26	jue 9/04/26	65	$ 16,737,316.00
39		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
40		**3.1**	**MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
41		**3.2**	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
42		**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**1 día**	**vie 6/03/26**	**vie 6/03/26**		$ 1,161,136.00
43		3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	120.00	1 día	vie 6/03/26	vie 6/03/26	65	$ 1,161,136.00
44		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
45		**4.1**	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
46		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**mar 24/03/26**	**vie 27/03/26**		$ 1,717,302.00
47		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.00	4 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	31	$ 1,717,302.00
48		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**							$ 0.00
49		**4.4**	**RED DE AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
50		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
51		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
52		**4.7**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
53		**4.8**	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
54		**4.9**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
55		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**jue 9/04/26**	**sáb 11/04/26**		$ 280,349.00
56		5.1.45	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	8.00	2 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26	38	$ 280,349.00
57		**6**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
58		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
59		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**mar 21/04/26**	**jue 30/04/26**		$ 1,150,658.00
60		7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	28.00	10 días	mar 21/04/26	jue 30/04/26	82	$ 1,150,658.00
61		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 2/05/26**		$ 4,374,432.00
62		7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	28.00	1 día	vie 1/05/26	vie 1/05/26	60	$ 3,540,383.00
63		7.2.38	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA No 3 LAVADA. INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA H=10 CM Y ESPESOR=1 CM	M	14.00	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	62	$ 834,049.00
64		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**sáb 14/03/26**	**sáb 21/03/26**		$ 7,461,696.00
65		8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE	M2	38.40	7 días	sáb 14/03/26	sáb 21/03/26	32	$ 7,461,696.00
66		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
67		**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EM COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
68		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
69		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
70		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
71		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
72		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
73		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
74		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**mié 25/03/26**	**lun 30/03/26**		$ 1,313,946.00
75		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58.40	5 días	mié 25/03/26	lun 30/03/26	65	$ 1,313,946.00
76		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
77		**12.4**	**PINTURA DE DEMARCACIÓN Y SENALIZACIÓN**							$ 0.00
78		**13**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
79		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00
80		**15**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**							$ 0.00
81		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**11 días**	**jue 9/04/26**	**mar 21/04/26**		$ 8,219,697.00
82		16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2.5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2	49.00	11 días	jue 9/04/26	mar 21/04/26	38	$ 8,219,697.00
83		**17**	**TRANSPORTE**							$ 0.00
84		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**62 días**	**mié 25/02/26**	**jue 30/04/26**		$ 194,322.00
85		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZ	M2	40.00	62 días	mié 25/02/26	jue 30/04/26	5	$ 194,322.00
86		**19**	**MANTENIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							$ 0.00

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO – COLEGIO RODOLFO LLINAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2026.

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias



Instalación de formaleta para columna en muro de cerramiento perimetral



Instalación de formaleta para columna en muro de cerramiento perimetral




Instalación de formaleta para columna en muro de cerramiento perimetral



Suministro e instalación de puerta persiana - shut de basuras.



Suministro e instalación de puerta persiana - shut de basuras.

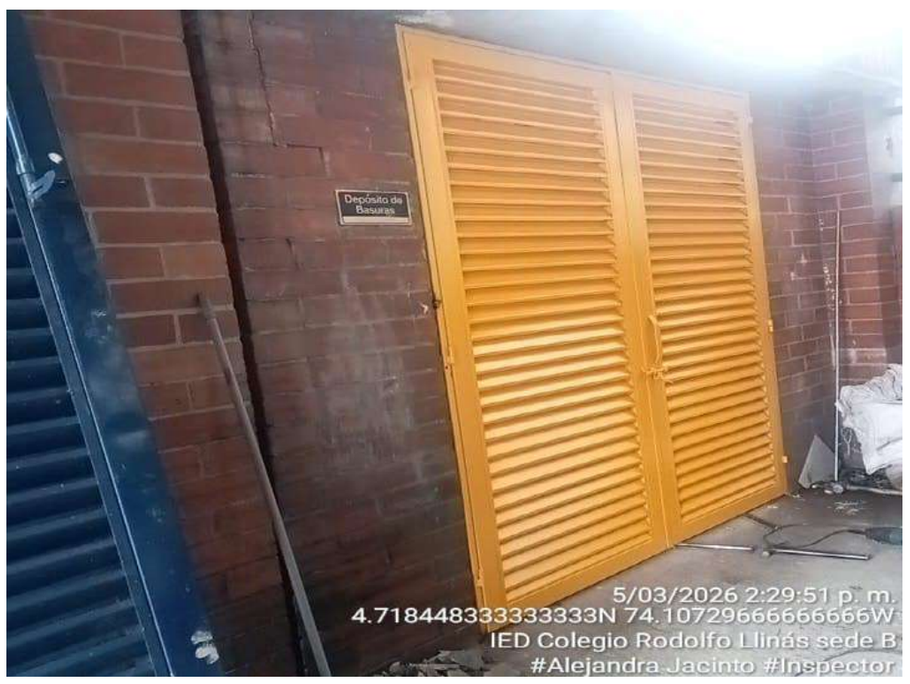

Suministro e instalación de puerta persiana - shut de basuras.

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para columna - Cerramiento perimetral.



Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para columna - Cerramiento perimetral.



Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para columna - Cerramiento perimetral.



Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para columna - Cerramiento perimetral.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de ladrillo para muro de antepecho - Cerramiento perimetral.



Instalación de ladrillo para muro de antepecho - Cerramiento perimetral.

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de ladrillo para antepecho en mampostería - Cerramiento perimetral.



Instalación de ladrillo para antepecho en mampostería - Cerramiento perimetral.



Instalación de platina para anclaje de perfil - Cerramiento perimetral.



Instalación de ladrillo para antepecho en mampostería - Cerramiento perimetral.



Instalación de platina para anclaje de perfil - Cerramiento perimetral.



Instalación de ladrillo para antepecho en mampostería - Cerramiento perimetral.

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de mampostería para columna - Cerramiento perimetral.



Instalación de mampostería para columna - Cerramiento perimetral.



Instalación de mampostería para columna - Cerramiento perimetral.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de reja para cerramiento perimetral.



Instalación de reja para cerramiento perimetral.



Instalación de reja para cerramiento perimetral.



Instalación de reja para cerramiento perimetral.



Retiro de cerramiento



Recolección de escombros y retiro de cerramiento.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A





Pulida de baldosa



Emboquillada para juntas de enchape



Residuo de rasqueteado de pared



Estucado de muro



Estucado de antepecho

Estucado de vanos

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Rasqueteado de pared. Limpeiza



Estucado de muro(1 capa)

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Destronque de pioso con pulidora en salon 2



Actividad de pulida de piso en salon 2 finalizada



Inicio de instalacion de baldosa en salon 1



Corte de baldosas de enchape para agunlos del salon



Corte de baldosas para guardaescobas salon 1



Uso de boquillera para asegurar la correcta instalacion del enchape del salon 1

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Fundida de dados esquineros



Trazado de ejes y exvacacion para dados



Mezcla para la instalación de baldosa



Instalacion de baldosas



Corte de baldosas para guardaescobas



Uso de boquillera y nivel de burbuja para la correcta inslacion de la baldosa

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Emboquillado de juntas



Limpieza de piso



Instalacion de teja tipo sandwich



Acopio de material para cubierta (poliuretano)

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Excavacion para dados de aula modular



Perfiles metalicos soporte de cubierta y pañetes



Armado de dados



Figurado de varilla



Fundicion de dados



Fundicion de dados

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A





Mezcla para pañete de muro



Pañete de antepecho en muro de fachada



Pañete de filos de columnas



Aplicación de pintura para perfileria de cubierta



Instalacion de platinas

Instalacion de perfileria metalica

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Replanteo en el terreno para salon moadular



Excavacion para cimentacion

Estucado de vigas

Pintura muros

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO – COLEGIO MAGDALENA ORTEGA – SEDE A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2026.

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Retiro de material proveniente de la excavación.



Retiro de material proveniente de la excavación.



Instalación de geotextil - Zona shut de basuras.



Instalación de geotextil - Sendero peatonal.



Instalación de geotextil - Sendero peatonal.



Instalación de geotextil - Sendero peatonal.

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.

Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de malla electrosoldada para placa - Sendero peatonal.



Instalación de malla electrosoldada para placa - Sendero peatonal.

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Shut de basura.



Instalación de malla electrosoldada para placa - Sendero peatonal.



Instalación de malla electrosoldada para placa - Sendero peatonal.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa/rampa - Shut de basuras.



Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Sendero peatonal.




Instalación de concreto de 3000 psi para placa - Sendero peatonal.

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de estructura metálica - Shut de basura.

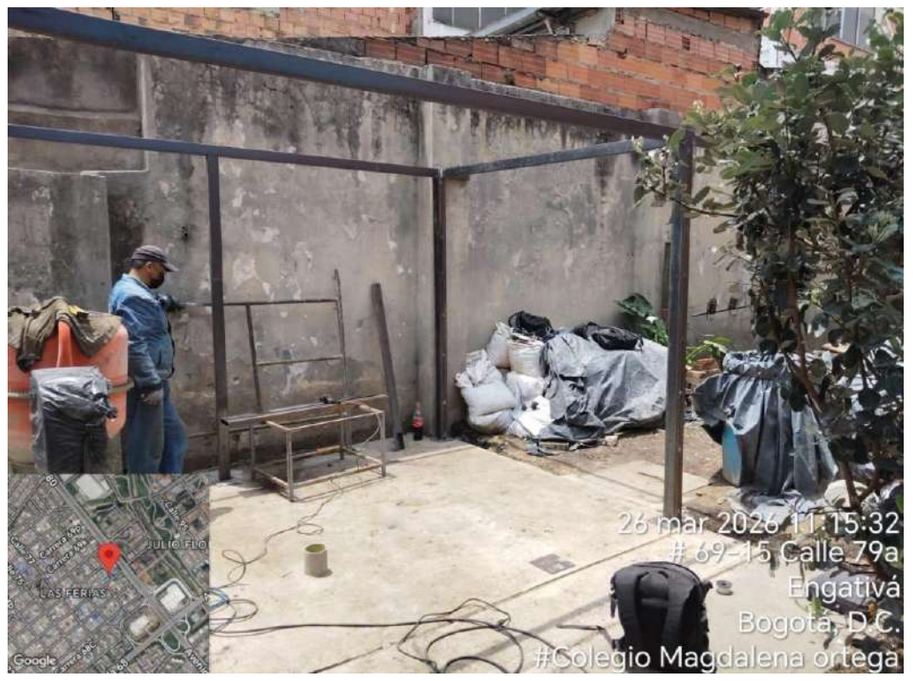

Instalación de estructura metálica - Shut de basura.



Instalación de estructura metálica - Shut de basura.



Instalación de estructura metálica - Shut de basura.

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de estructura para muro en drywall - shut de basuras.



Instalación de estructura para muro en drywall - shut de basuras.



Instalación de estructura para muro en drywall - shut de basuras.



Instalación de muro en drywall - shut de basuras.



Instalación de cubierta - shut de basuras.



Instalación de muro en drywall - shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 26 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Vista general de la obra sin actividades.



Vista general de la obra sin actividades.

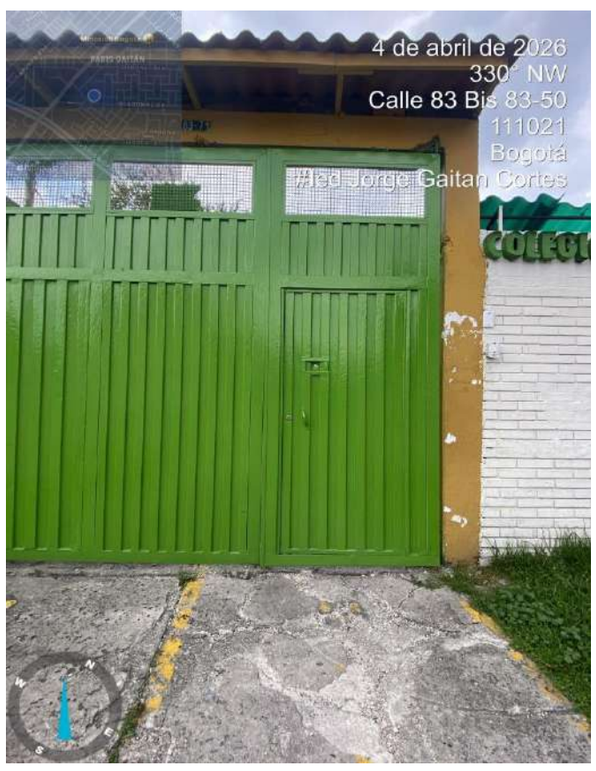

Puerta Institución



Vista general de la obra sin actividades.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 25 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Vista general de la obra sin actividades.

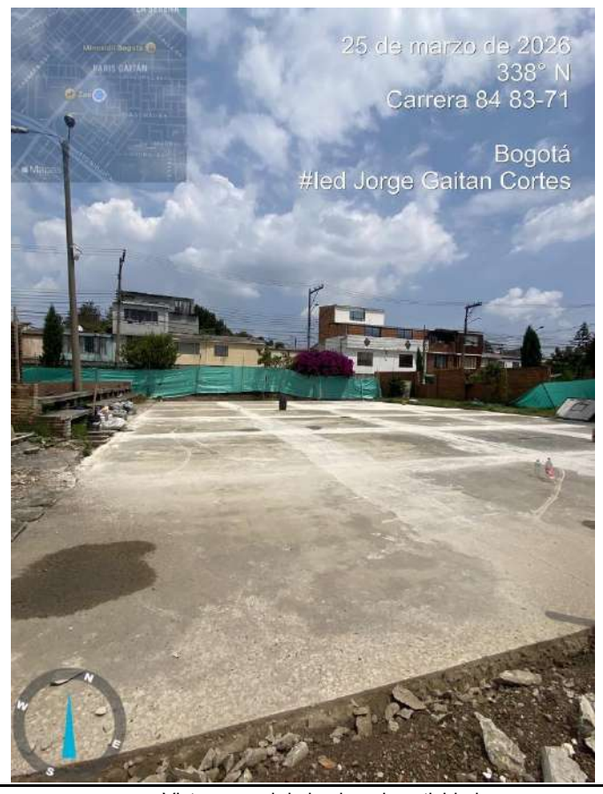

Vista general de la obra sin actividades.



Vista general de la obra sin actividades.



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 24 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B







Encofrado e intalación de la malla.



Fundida de la placa.



Fundida de placa



Retiro de material sobrante subbase



Registro de obra sin actividades

Dilataciones de placa

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

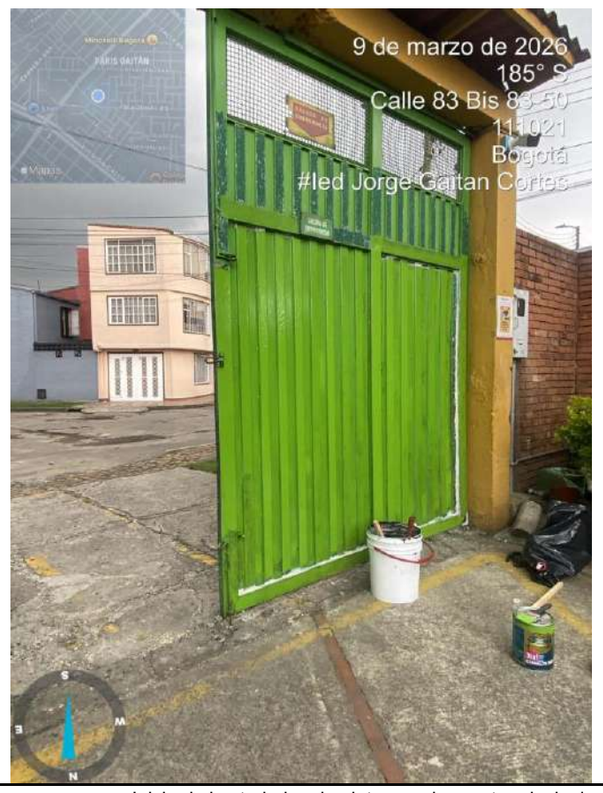

Inicio de los trabajos de pintura en la puerta principal.

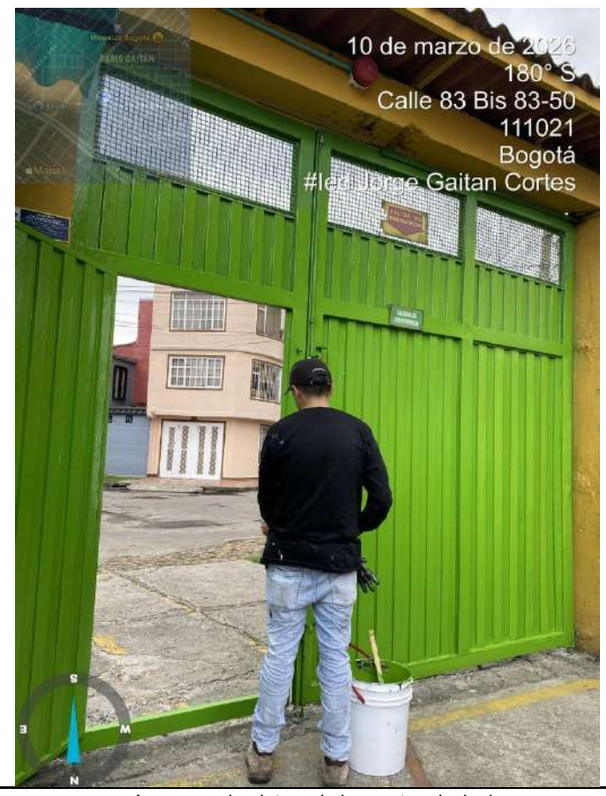

Avance en la pintura de la puerta principal.



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

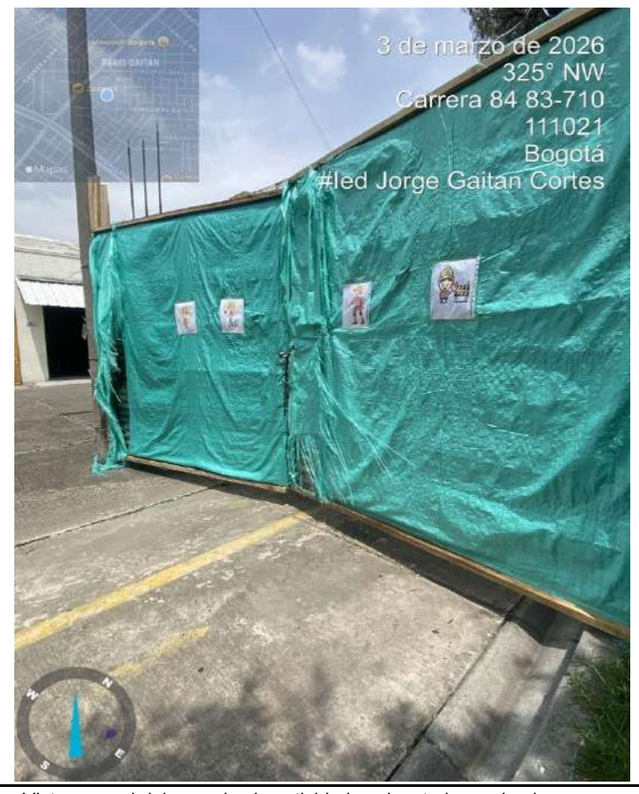

Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

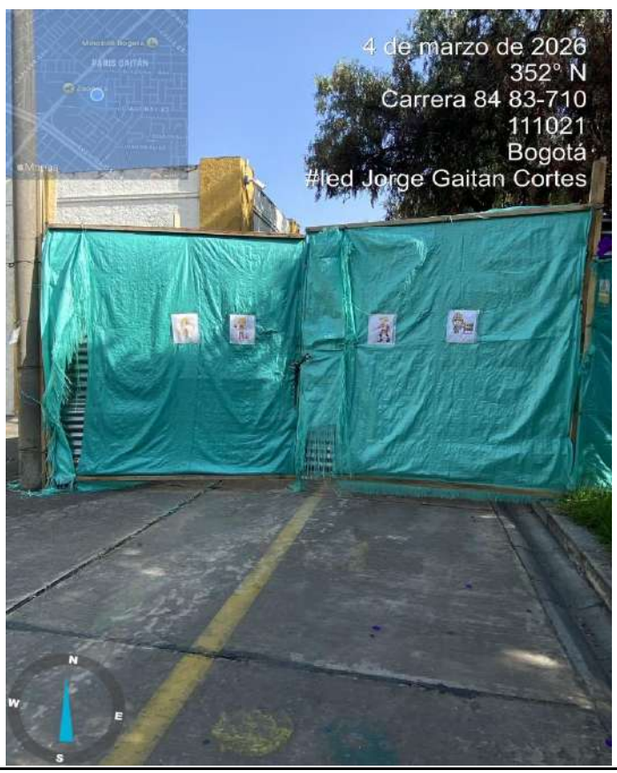

Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

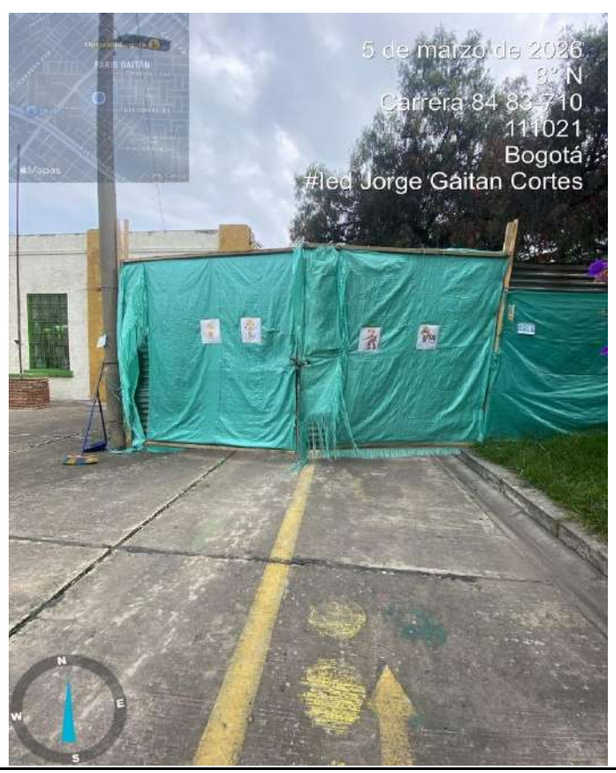

Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO – TABORA – SEDE A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2026.

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Trasiego del material.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.




Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.

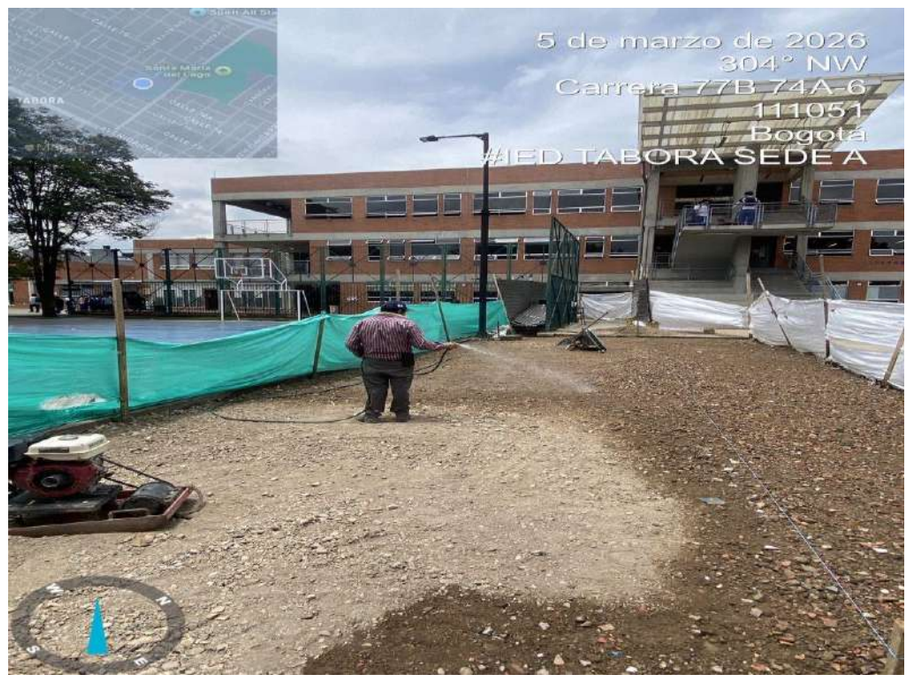

Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.




Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.

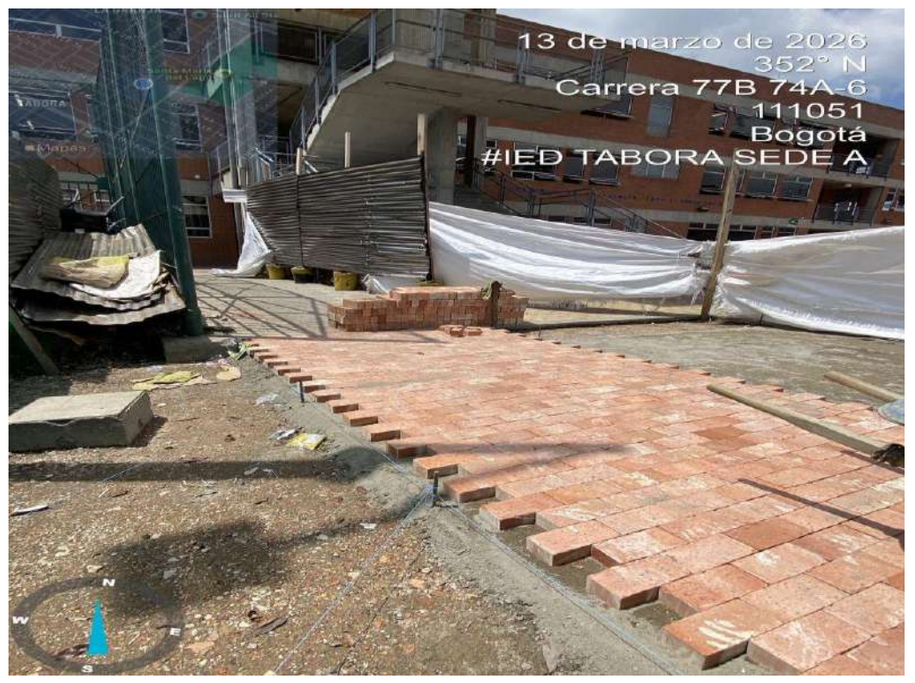

Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de concreto para viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de concreto para viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de dado en concreto reforzado - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de viga cinta - Zona lateral izquierda de la cancha.

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de tierra negra para jardín - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de estructura para domo - Zona lateral izquierda de la cancha.

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO – INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – SEDE A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2026.

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de pañete en muros exteriores - zona de baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de pañete en muros exteriores - zona de baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de pañete en muros exteriores - zona de baños.



Instalación de enchape - Zona baños.

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de enchape en la pileta exterior - zona de baños.



Instalación de pañete muros internos - Zona baños.

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Destronque y pulida de pisos - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 16/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 170 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Destronque y pulida de pisos - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Destronque y pulida de pisos - Zona baños.

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 23/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 29/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 177 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.



Aplicación de pintura muros internos - Zona baños.

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 30/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 184 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Aplicación de pintura en muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Aplicación de pintura en muros interiores - Zona baños.



Aplicación de pintura en muros interiores - Zona baños.
