Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
COLUMNETAS								
INTERNO								
BLOQUE E PRIMER PISO						Subtotal		**0,22**
DORMITORIO 2								
BAÑO 2								
SUR								
Columneta 6	CT6	1,00		3,45	0,33	0,10		0,11
DORMITORIO 6								
BAÑO 6								
NORTE								
Columneta 6	CT6	1,00		3,45	0,33	0,10		0,11
BLOQUE E SEGUNDO PISO						**Subtotal**		**0,22**
DORMITORIO 10								
SUR								
Columneta 6	CT6	1,00		3,45	0,33	0,10		0,11
BAÑO 14								
NORTE								
Columneta 6	CT6	1,00		3,45	0,33	0,10		0,11

Esquema




Ítem:	5.2.3	Unidad:	m³	Magnitud total:	0,44

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Planos y Detalles

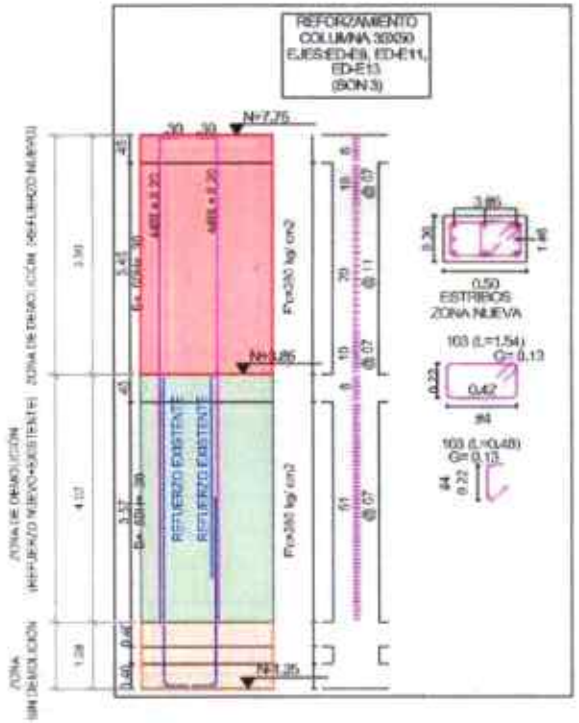

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE D.. TANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
VIGAS CORONA							
BLOQUE E PRIMER PISO					Subtotal		0,15
SUR							
Dintel superior	1,00		2,48	0,50	0,10		0,12
Viga Corona	1,00		0,49	0,25	0,10		0,01
Viga Corona	1,00		0,78	0,25	0,10		0,02

Esquema




Ítem:	5.2.7	Unidad:	m^3	Magnitud total:	0,15

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE D ITANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Planos y Detalles

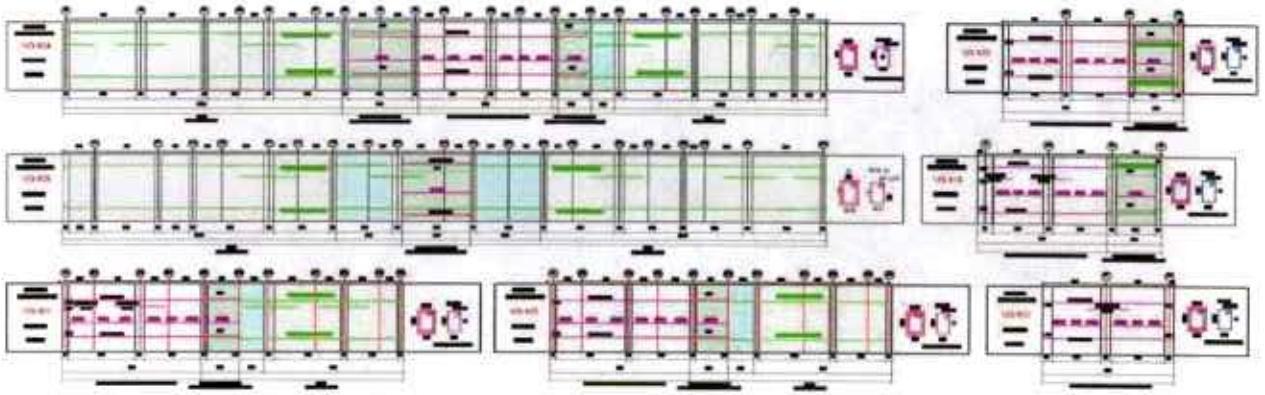

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible]N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE D[illegible]ITANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BAÑO 6						Subtotal		17,48
Muro debajo Mesón		1,00		1,97	0,95			1,87
ESTE								
Division Interna		1,00		1,38	2,15			2,96
Columneta 4	CT1	-2,00		0,20	1,90			-0,76
Viga Corona		-1,00		1,38	0,25			-0,35
Division Interna		1,00		1,68	3,78			6,33
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Columneta 5	CT5	-1,00		0,20	2,90			-0,58
Viga Corona		-1,00		1,48	0,25			-0,37
Vano cielo raso		-1,00		1,48	0,63			-0,93
OESTE								
Division Interna		1,00		1,10	2,15			2,37
Columneta 4	CT1A	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Columneta 4	CT1A	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Viga Corona		-1,00		1,10	0,25			-0,28
Division Interna		1,00		1,10	2,15			2,37
Columneta 4	CT4	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Columneta 4	CT4	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Viga Corona		-1,00		1,10	0,25			-0,28
Division Interna		1,00		1,04	2,15			2,24
Columneta 4	CT1A	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Columneta 4	CT1A	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Viga Corona		-1,00		1,04	0,25			-0,26

Esquema

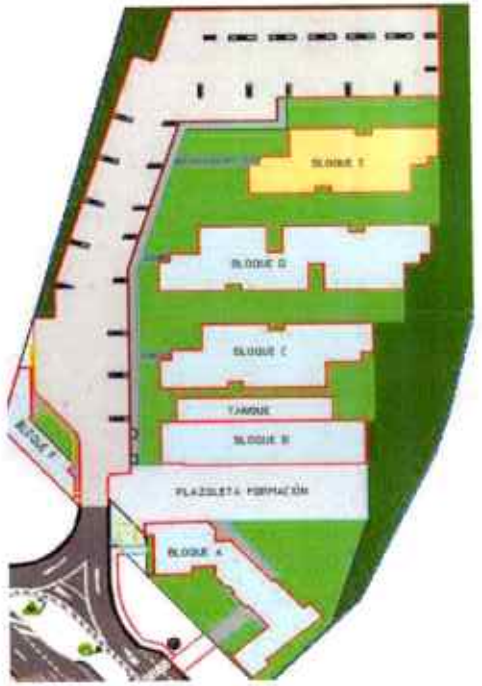


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m^2

Planos y Detalles

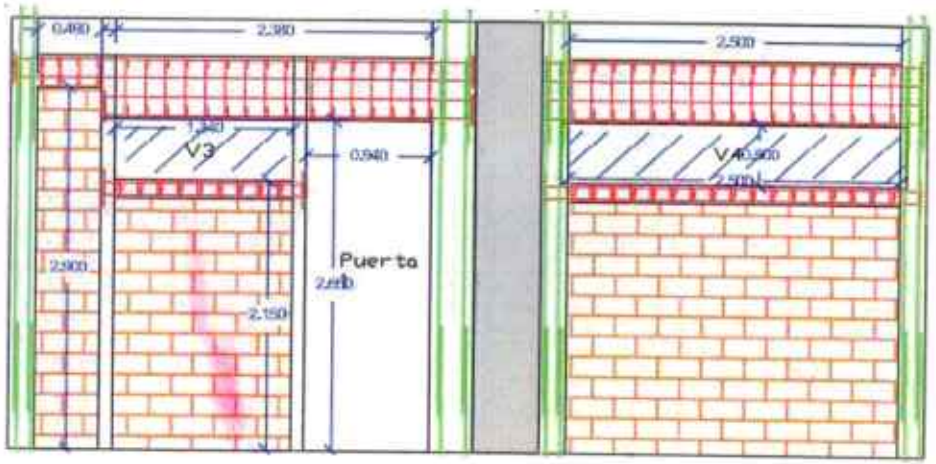

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO , EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE L ITANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
DORMITORIO PATRULLEROS (SUR ESTE) - Z9								
BAÑO 15								
NORTE		1,00		3,50	3,45			12,08
Columneta 3	CT3	-2,00		0,10	2,65			-0,53
Columneta 1	CT1	-1,00		0,20	3,45			-0,69
Columneta 6	CT6	-1,00		0,33	3,45			-1,14
Ventana 3	VT3	-1,00		1,30	0,50			-0,65
Dintel superior		-1,00		2,48	0,50			-1,24
Dintel infeior		-1,00		1,30	0,15			-0,20
Puerta	P1	-1,00		0,90	2,65			-2,39
Viga Corona		-1,00		0,49	0,25			-0,12
Vano cielo raso		-1,00		2,97	0,30			-0,89
ESTE								
Division Interna		1,00		1,38	2,15			2,96
Columneta 4	CT1	-2,00		0,20	1,90			-0,76
Viga Corona		-1,00		0,98	0,25			-0,24

Esquema




Ítem:	5.4.1	Unidad:	m²	Magnitud total:	17,48

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C . MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles

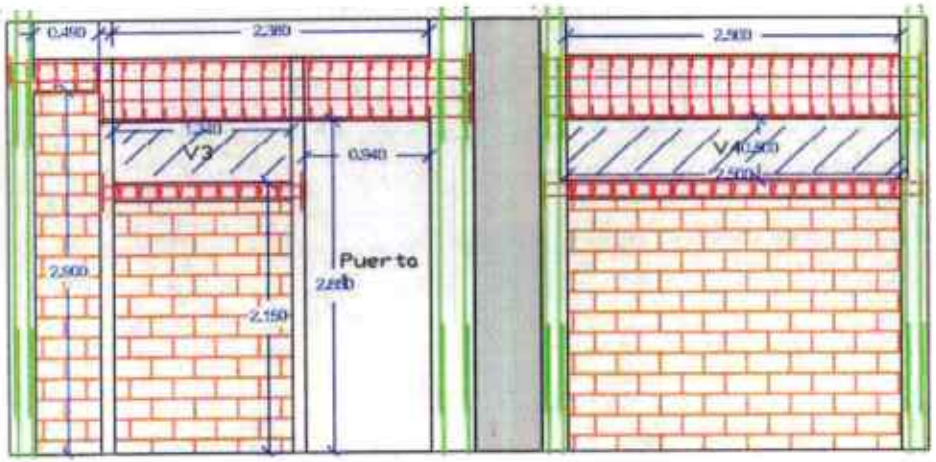

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C _ MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE . ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
ANTEPECHOS						Subtotal		7,09
E9-E17 SUR	E9-E17 (EF)	1,00		10,72	0,80			8,58
Viga antepecho	E9-E17 (EF)	-1,00		10,12	0,10	0,24		-1,01
Columneta 1	E9-E17 (EF)	-3,00		0,12	0,80	0,24		-0,29
Columneta 2	E9-E17 (EF)	-1,00		0,24	0,80	0,24		-0,19

Esquema




Ítem:	5.4.2	Unidad:	m²	Magnitud total:	7,09


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Planos y Detalles

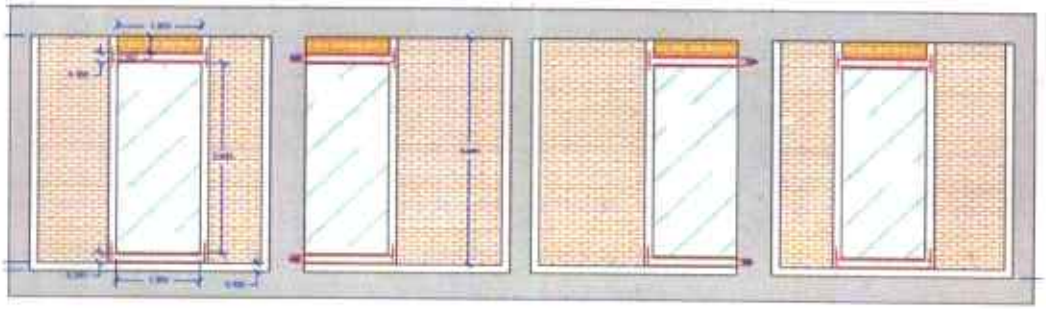



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C .. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		59,22
Pasillo principal							
Norte	1,00		10,90	3,15			34,34
Desc. Ventana 3	-1,00		1,30	0,50			-0,65
Desc. Ventana 4	-2,00		2,50	0,50			-2,50
Desc. Puerta P1	-1,00		0,90	2,65			-2,39
Sur	1,00		12,17	3,15			38,34
Desc. Ventana 3	-1,00		1,30	0,50			-0,65
Desc. Ventana 4	-2,00		2,50	0,50			-2,50
Desc. Puerta P1	-2,00		0,90	2,65			-4,77

Esquema




Item:	5.4.4	Unidad:	m²	Magnitud total:	59,22

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO _L MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE D_ _TANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m^2

Planos y Detalles

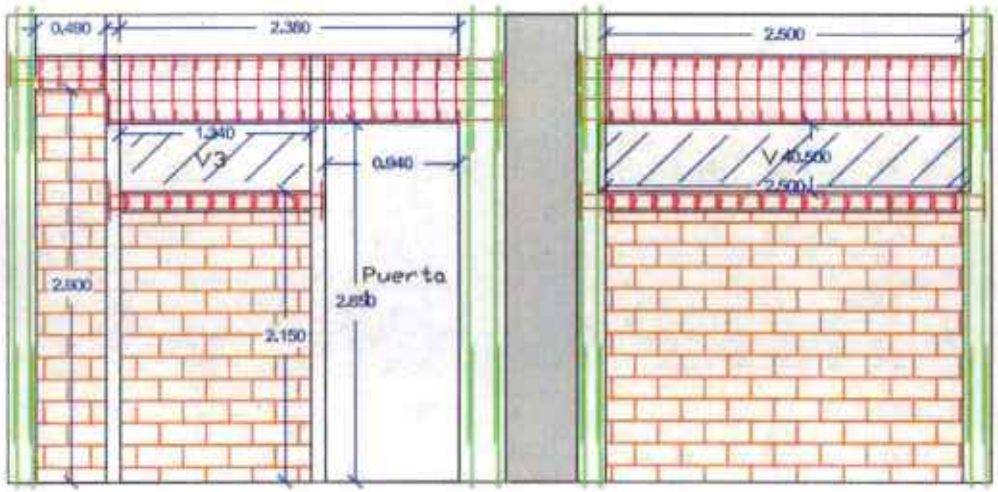

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C .L MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E PRIMER PISO						Subtotal		14,79
Columneta 1	CT1	1,00		3,45				3,45
Division Interna								
Columneta 2	CT2	1,00		3,78				3,78
Division Interna								
Columneta 2	CT2	1,00		3,78				3,78
BAÑO 5								
Division Interna								
Columneta 2	CT2	1,00		3,78				3,78
BLOQUE E SEGUNDO PISO						**Subtotal**		**95,24**
DORMITORIO 10								
SUR								
Columneta 1	CT1	2,00		3,45				6,90
BAÑO 10								
Division Interna								
Columneta 4	CT1A	1,00		1,90				1,90
Columneta 4	CT1A	1,00		1,90				1,90
Division Interna								
Columneta 4	CT4	1,00		1,90				1,90
Columneta 4	CT4	1,00		1,90				1,90
Division Interna								
Columneta 4	CT1A	1,00		1,90				1,90
Columneta 4	CT1A	1,00		1,90				1,90
SUR								
Columneta 3	CT3	2,00		2,65				5,30
Columneta 1	CT1	1,00		3,45				3,45

Esquema

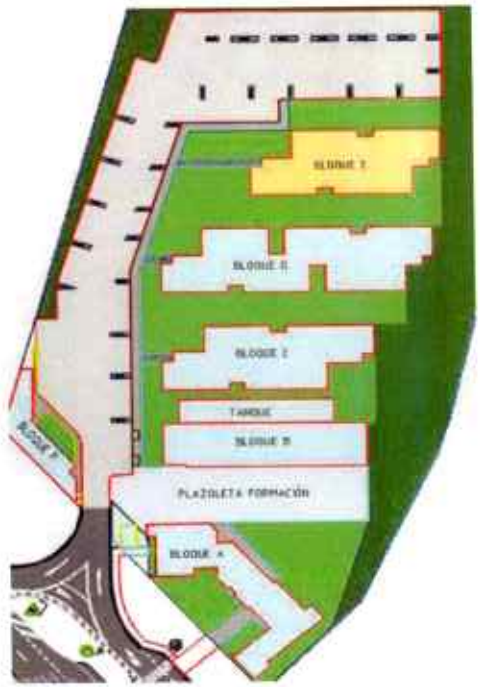


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Planos y Detalles

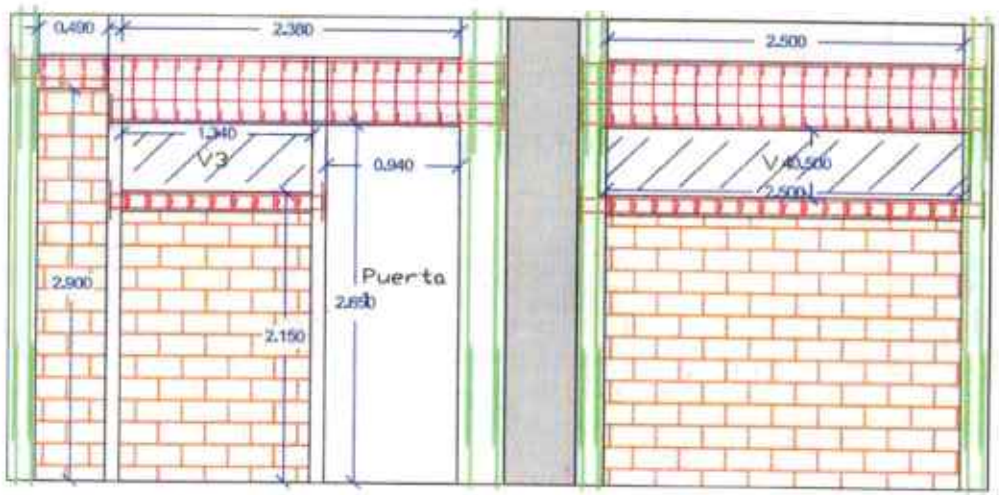

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C L MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE 'ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Division Interna								
Columneta 2	CT2	1,00		3,78				3,78
ESTE								
Division Interna								
Columneta 4	CT1	2,00		1,90				3,80
Division Interna								
Columneta 2	CT2	1,00		3,78				3,78
Columneta 5	CT5	1,00		2,90				2,90
NORTE								
Columneta 1	CT1	2,00		3,45				6,90
DORMITORIO 14								
NORTE								
Columneta 1		2,00		3,45				6,90
ESTE								
Columneta 1		4,00		3,45				13,80
BAÑO 14								
NORTE								
Columneta 3	CT3	2,00		2,65				5,30
Columneta 1	CT1	1,00		3,45				3,45
Division Interna								
Columneta 2	CT2	1,00		3,78				3,78
SURESTE	ED-EF (E9)							
Columneta 1	ED-EF (E9)	4,00		3,45				13,80
Ítem:	5.4.7	**Unidad:**	m	**Magnitud total:**				110,03

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C .L MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Planos y Detalles

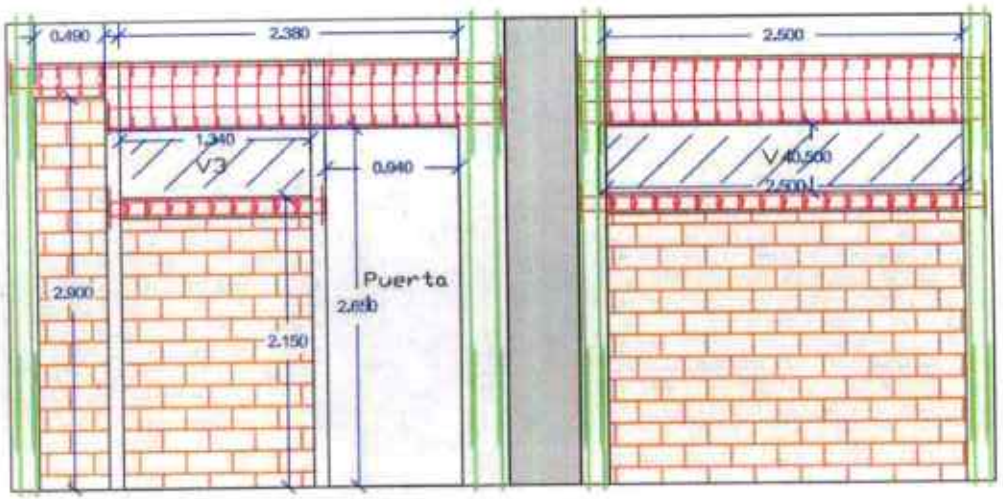

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria R/L. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C _ MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.5.1	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					Subtotal		121,60
Cubierta							
Zona1	1,00		14,67	8,11	0,08		119,00
Media caña	1,00		17,33	0,15	0,08		2,60

Esquema




Ítem:	5.5.1	Unidad:	m²	Magnitud total:	121,60

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.5.1	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m²

Planos y Detalles

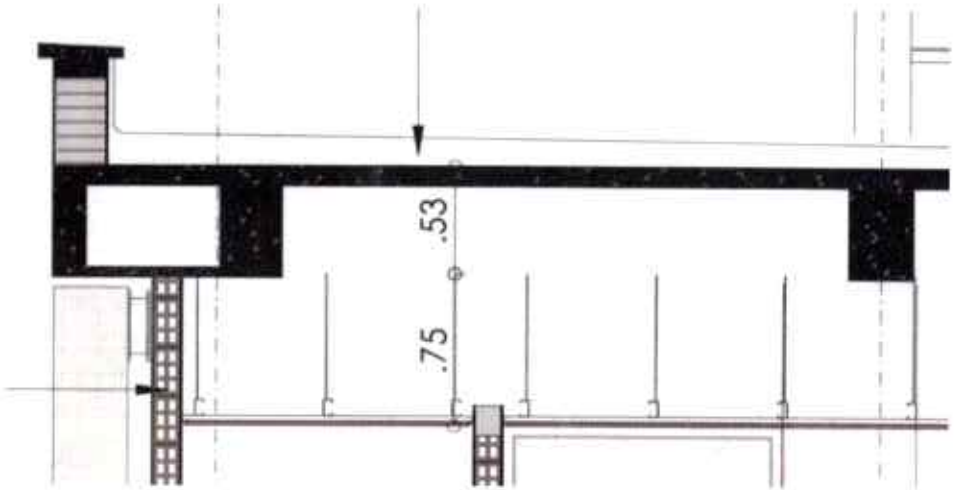

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C .L MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.5.1	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.1	Sum./inst. tuberia PVC-conduit ø 3/4plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
					Subtotal		19,05
BLOQUE E	1,00		19,05				19,05

Esquema



Ítem:	5.9.1	Unidad:	m	Magnitud total:	19,05

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C .. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE 'ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.1	Sum./inst. tuberia PVC-conduit ø 3/4plg.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.1	Sum./inst. tubería PVC-conduit ø 3/4plg.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria R/L. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE TANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.2	Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
					Subtotal		**60,00**
BLOQUE E	1,00		60,00				60,00

Esquema




Ítem:	5.9.2	Unidad:	m	Magnitud total:	60,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.2	Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.	m

Planos y Detalles

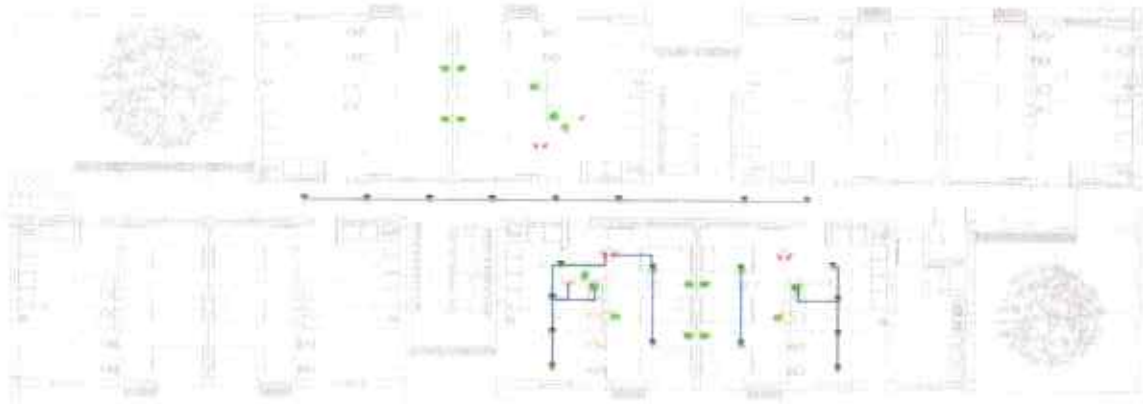

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE [illegible] TANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.2	Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.3 NP	Salida de toma común.Reparación.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
					Subtotal		8,00
BLOQUE E	8,00						8,00

Esquema




Item:	5.9.3 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	8,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO L EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE TANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.3 NP	Salida de toma común.Reparación.	und

Planos y Detalles

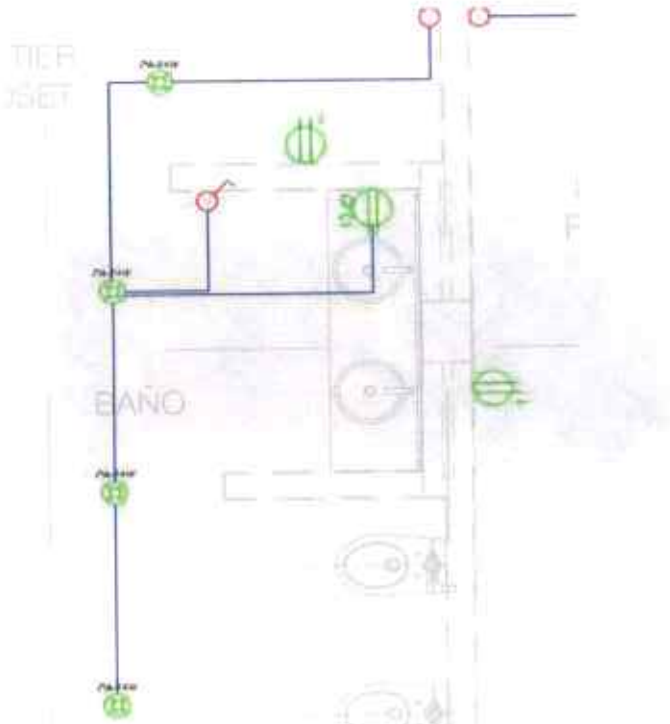

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.3 NP	Salida de toma común.Reparación.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE TANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.4 NP	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.Reparación.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
					Subtotal		14,00
BLOQUE E	14,00						14,00

Esquema




Ítem:	5.9.4 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	14,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.4 NP	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.Reparación.	und

Planos y Detalles

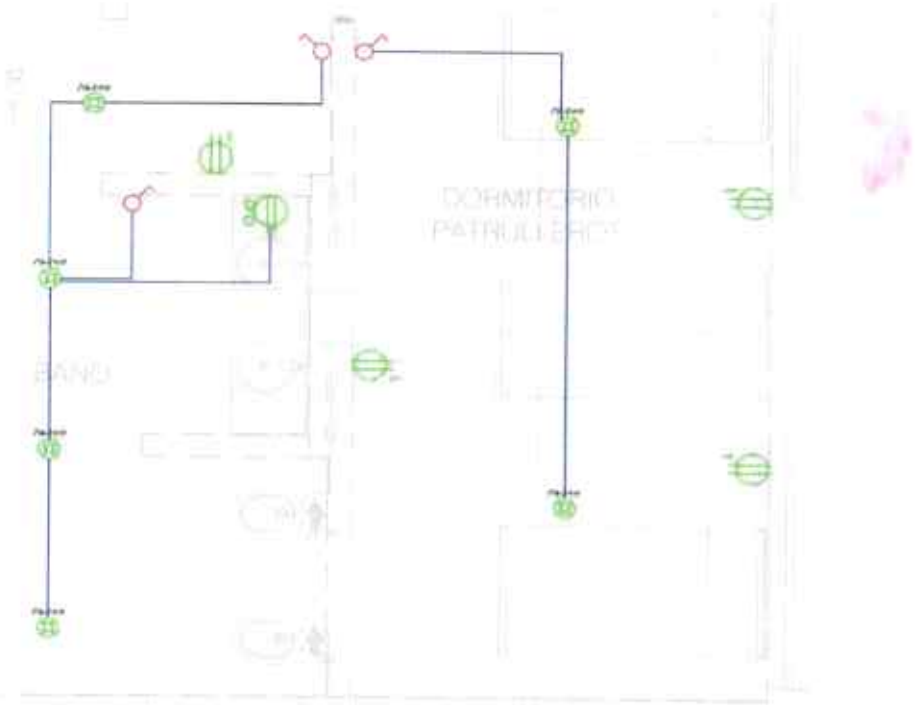

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C .L MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE ANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.4 NP	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.Reparación.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría R/L. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

COPIA POLIZAS Y APROBACIONES

SEGÚN CONTRATO INICIAL

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

GENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:	**LP-SG-01362-2021 DE** 10 DE JUNIO DEL 2021			
VALOR INICIAL (En números):	**$22.982.010.588.**			
PLAZO:	**17 MESES**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2246 DEL 06 DE JULIO DEL 2021 2247 DEL 06 DE JULIO DEL 2021			
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad de los bienes y equipos suministrados.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato.				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	5		
Otros amparos.				
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES(si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)				
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)				
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)				
VALOR TOTAL(En números):	**$22.982.010.588.**			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL			
POLIZA DE GARANTIA Nº:	No. NB-100176880 DEL 08/09/2021			
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Nº:	No. NB-100037857 DEL 08/09/2021			
VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	CUMPLIMIENTO 08/09/2021 AL 08/05/2023 PRESTACIONES SOCIALES 08/09/2021 AL 30/12/2025 ESTABILIDAD DE LA OBRA 30/12/2022 AL 30/12/2027	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	08/09/2021 AL 30/12/2022	

En San José de Cúcuta, a los 10 días del mes de septiembre del año 2021, en LA SECRETARIA DE GOBIERNO, se reunieron Los suscritos: La Doctora **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES**, Secretaria de Gobierno, y **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA 0CO. CCC** / Representante Legal **FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA**, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

Secretaria De Gobierno

Firma De Contratista

Reviso

1090407083

C.C

seguros mundial®

tu compañia siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71082926	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	08/09/2021	24:00 Horas del	30/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO – CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	TELÉFONO	3114568231
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	TELÉFONO	3114568231

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA JBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA EL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 08/09/2021	24:00 Horas del 08/05/2023	2,298,201,059.00	6,879,492.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 08/09/2021	24:00 Horas del 30/12/2025	3,447,301,588.00	22,298,847.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 30/12/2022	24:00 Horas del 30/12/2027	6,894,603,176.00	58,636,239.00
		TOTAL ASEGURADO	12,640,105,823.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	87,814,577.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	87,814,577.00
GASTOS EXP.	$	7,800.00
IVA	$	16,686,252.00
TOTAL A PAGAR	$	104,508,629.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 08/09/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

IMPRESO EN LA CIUDAD DE COLOMBIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - ART

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71082922	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	08/09/2021	24:00 Horas del	30/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO – CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO – CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR

ACLARACIONES:LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES, LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574,550,265.00	1,149,100,529.00	1,149,100,529.00	2,708,729.00
PATRONAL	344,730,158.00	344,730,158.00	344,730,158.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344,730,158.00	344,730,158.00	344,730,158.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344,730,158.00	344,730,158.00	344,730,158.00	0.00
		TOTAL ASEGURADO	1,149,100,529.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100.0

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	2,708,729.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2,708,729.00
GASTOS EXP.	$	5,000.00
IVA	$	515,609.00
TOTAL A PAGAR	$	3,229,338.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 08/09/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO POR LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIGILADO SIPLAFT

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71082922	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	08/09/2021	24:00 Horas del	30/12/2022					

CONDICIONES PARTICULARES

VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLE
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

SEGÚN ACTA DE INICIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2021.11.03 10:43:05 -05:00

Código de Seguridad: +eE3yOOFbQPNI9TU85263g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2831220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2000000059-DORI

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121360	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	TELÉFONO	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	TELÉFONO	5755656

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2021, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

HOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 18/06/2023	2.298.201.059,00	6.879.491,72
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 09/02/2026	3.447.301.588,00	22.298.846,71
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/02/2023	24:00 Horas Del 09/02/2028	6.894.603.176,00	58.636.238,85
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.640.105.823,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	87.814.577,28
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	87.814.577,28
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	16.686.251,68
TOTAL A PAGAR	$	104.508.628,96

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/11/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PROSACTO.MUNDIALSEGUROS.COM O DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

ORIGINAL

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121360	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGILADO

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2021.11.03 10:45:17 -05:00

Código de Seguridad: nK55dHb7uc2bSpSs8p36XQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSLS#00000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121362	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2021, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574,550,265.00	1,149,100,529.00	1.149.100.529,00	2.708.729,03
PATRONAL	344,730,158.00	344,730,158.00	344.730.158,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344,730,158.00	344,730,158.00	344.730.158,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344,730,158.00	344,730,158.00	344.730.158,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.149.100.529,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	2.708.729,03
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.708.729,03
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	515.608,52
TOTAL A PAGAR	$	3.229.337,55

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/11/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A [illegible] CON EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidemos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121362	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/01/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGÚN OTROSI Nº1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.24 15:43:32 -05:00

Código de Seguridad: KoX0C4IBP0BmRXSQ6A5BJw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2H0000000010-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799630	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	TELÉFONO	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	TELÉFONO	5755656

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA POR (17) MESES MÁS ES DECIR HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL OTROSI ADICIONAL N 01 RECONOCIDO POR LA ENTIDAD ASEGURADA VIA SECOP EL 29/12/2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2022	24:00 Horas Del 01/10/2024	2.298.201.058,00	5.338.122,90
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2022	24:00 Horas Del 31/05/2027	3.447.301.588,20	6.743.488,59
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2024	24:00 Horas Del 31/05/2029	6.894.603.176,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.640.105.823,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	12.081.611,49
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	12.081.611,49
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	2.295.506,18
TOTAL A PAGAR	$	14.377.117,67

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.046.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799630	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta retribuyendo responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

IMPRESO EN COLOMBIA POR CARVAJAL PRINTECH S.A. - PAGINA 4/4

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.24 15:58:44 -05:00

Código de Seguridad: x3inXh5zYBr1h1HUzicovg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 38-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799634	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 9 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA POR (17) MESES MÁS ES DECIR HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL OTROSI ADICIONAL N 01 RECONOCIDO POR LA ENTIDAD ASEGURADA VIA SECOP EL 29/12/2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574.550.265,00	1.149.100.529,00	1.149.100.529,40	2.703.062,23
PATRONAL	344.730.159,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344.730.159,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344.730.159,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.149.100.529,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	2.703.062,23
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.703.062,23
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	513.581,82
TOTAL A PAGAR	$	3.216.644,05

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURILLO - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidemos los suelos de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799634	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

SEGÚN REINICIO 1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.28 09:09:00 -05:00

Código de Seguridad: SbHOdeQZK6@sdj@r3oe@VA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2851800 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-01-PPSUS2000000010-0001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71801968	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	**TELÉFONO**	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	**TELÉFONO**	5755656

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 14/02/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 03/11/2023

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (14/02/2023) HASTA (03/11/2023).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 17/06/2025	2.298.201.058,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 17/02/2028	3.447.301.588,20	3.711.752,12
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/02/2025	24:00 Horas Del 17/02/2030	6.894.603.176,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.640.105.823,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	3.711.752,12
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.711.752,12
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	705.233,00
TOTAL A PAGAR	$	4.416.985,12

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS CON LO DIGITA EL NÚMERO DE CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MURIEL - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71001968	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

"LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.28 09:09:51 -05:00

Código de Seguridad: 11+vWwnbxC8OTzrELrRv0w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71801969	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 14/02/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 03/11/2023

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (14/02/2023) HASTA (03/11/2023).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574.550.265,00	1.149.100.529,00	1.149.100.529,40	1.484.700,85
PATRONAL	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.149.100.529,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.484.700,85
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.484.700,85
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	282.093,16
TOTAL A PAGAR	$	1.766.794,01

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE ESTA. ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935, O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MURIAN - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

ESPECIALIZADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71801969	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-5G-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

SEGÚN ADICIONAL Nº2

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

VaGENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:	**LP-SG-01362-2021 del 10 de JUNIO del 2021**			
VALOR INICIAL (En números):	**$22.982.010.588**			
PLAZO:	**17 meses**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2246 del 06 de julio del 2021 2247 del 06 de julio del 2021			
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad de los bienes y equipos suministrados.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato.				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	5		
Otros amparos.				

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ampos)	ADICIONAL Y PRORROGA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	1371 DEL 12 DE ABRIL DEL 2024
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	**$11.490.240.893.09**
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	**12 MESES**
VALOR TOTAL (En números)	**$34.472.251.481.09**
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA DE GARANTIA Nº:	NB-100176860 DEL 16 abril de 2024
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Nº:	NB-100037657 DEL 16 abril de 2024

VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	CUMPLIENTO 16/04/2024 AL 30/09/2025 PRESTACIONES SOCIALES 16/04/2024 AL 31/05/2028 ESTABILIDAD DE LA OBRA 31/05/2025 AL 31/05/2030	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	19/10/2021 AL 31/05/2025

En San José de Cúcuta, el 16 de abril del 2024, en LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CUIDADANA, se reunieron Los suscritos **CR (RP) GORGE QUINTERO MEDINA**, secretario de Seguridad Ciudadana, y **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO – CCC**/ Representante Legal **FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA**, actuando como contratista, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

Secretaria De Seguridad Ciudadana

Firma De Contratista

Reviso

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.16 11:53:45 -05:00

Código de Seguridad: /9fO8WaY+s/1QnJp2FUI8w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS20000000059-0001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930771	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	**TELÉFONO**	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	**TELÉFONO**	5755656

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL OTRO SI ADICIONAL N°2 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS Y VALOR ASEGURADO.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01363-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/04/2024	24:00 Horas Del 30/09/2025	3.447.225.148,10	4.204.563,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 16/04/2024	24:00 Horas Del 31/05/2028	5.170.837.722,15	12.148.483,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2025	24:00 Horas Del 31/05/2030	10.341.675.444,30	32.623.600,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	48.968.656,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	48.968.656,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.304.044,64
TOTAL A PAGAR	$	58.272.700,64

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PEGUROS MUNDIAL SEGUROS.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DE CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MIRIAM - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.640.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930771	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta retribuyendo responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFIANZADO: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - NIT: APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.16 11:51:21 -05:00

Código de Seguridad: Vp/WTo8F27ID8Eb1Pgg74w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUSAR000000827-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930786	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL OTRO SI ADICIONAL N°2 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS Y VALOR ASEGURADO.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	1.745.296,24
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.745.296,24
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.745.296,24
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	331.606,29
TOTAL A PAGAR	$	2.076.902,53

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURIEL - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930766	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACION ... DE LA INSTRUCCION ... VIGIA ART

SEGÚN SUSPENSION 2

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS

GENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO N° Y FECHA:	CONTRATO OBRA PÚBLICA No LP-SG-01362-2021 (DE 31-08-2021)			
VALOR INICIAL (En números):	$22.982.010.588,00			
PLAZO:	17 MESES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	002246 DE 06-07-2021 002247 DE 06-07-2021			
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	5		
Otros amparos.				

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	MODIFICATORIO Y PRORROGA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)	1371 DEL 12 DE ABRIL DEL 2024
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	$11.490.240.893.09
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	OTROSÍ No. 1 ADICIONA 17 MESES, HASTA 31 DE MAYO DE 2024 OTROSÍ No. 2 ADICIONA 12 MESES, HASTA 31 DE MAYO DE 2025 **MODIFICACIÓN DE 07-01-2022 MODIFICA FECHA TERMINACIÓN A 12-06-2025**
VALOR TOTAL(En números):	$34.472.251.481 .09
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA DE GARANTIA N°:	NB-100176880 - – ANEXO No 9, DE 16-01-2025
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°:	NB-100037857 – ANEXO No 9, DE 16-01-2025

VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	**CUMPLIMIENTO:** DE 26-12-2024 AL 12-10-2025 **SALARIOS Y P.S.:** DE 26-12-2024 AL 12-06-2028 **ESTAB. OBRA:** DE 12-06-2025 AL 12-06-2030	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	DE 19-10-2021 AL 12-06-2025

En San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de enero de 2025, en la SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, se reunieron Los suscritos: El Doctor **GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA,** Secretario de Seguridad Ciudadana del Departamento; El Sr. **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA,** en condición de R/L. de la **U.T. ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC,** actuando como contratista, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

GEROGE EDISON QUINTERO MEDINA
Secretario de Seguridad ciudadana de Norte de Santander

FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
R.L. U.T. Estación La Parada OCO - CCC

CARLOS ALBERTO BRAHÍM CASTRO
Supervisor

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 17:43:51 -05:00

Código de Seguridad: Z3IgGRHqYX0xLagk951FVQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855400 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-84-3821-1317-F-05-PPSUS2N0000000059-D002

No. PÓLIZA	NB-100176888	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246074	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION SE DA CONOCIMIENTO AL PRESENTE DOCUMENTO DE FECHA 26/12/2024 Y FECHA DE REINICIO 07/01/2025.

FECHA DE TERMINACION ACTUAL : 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 30/09/2025	3.447.225.148,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 31/05/2028	5.170.837.722,15	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2025	24:00 Horas Del 31/05/2030	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 10.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A [illegible] DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR SEGURO CON EL MEJOR DE LOS MUNDOS. CANCELA TU PÓLIZA LLAMANDO A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MIRIAM - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246974	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **8** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **30/12/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.027.012-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 17:44:22 -05:00

Código de Seguridad: 65XpnUWtISBHhS+DbyXqQw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 50-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000827-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246951	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION SE DA CONOCIMIENTO AL PRESENTE DOCUMENTO DE FECHA 26/12/2024 Y FECHA DE REINICIO 07/01/2025.

HA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	0,00
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PREGUNTE SU ASESOR EN SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL SEGURO DE SOLIDARIDAD. TAMBIEN PUEDES LLAMARNOS A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.686.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidemos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU58R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246951	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"E AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

SEGÚN REINICIO 2

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.16 09:40:45 -05:00

Código de Seguridad: cIc85/07qw8wGURut9MyWQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS20000000059-0002

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263473	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE REINICIO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE FECHA DE FIRMA 26/12/2024.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 12/06/2025

- DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 12/10/2025	3.447.225.148,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 12/06/2028	5.170.837.722,15	255.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/06/2025	24:00 Horas Del 12/06/2030	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	255.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	255.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	48.450,00
TOTAL A PAGAR	$	303.450,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA DIGITANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/ DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.E. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263473	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007877 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111035"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **9** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **16/01/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **16** días del mes **ENERO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.16 09:35:56 -05:00

Código de Seguridad: AQ1d9MsTgBKBBKRIpUGwJw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263476	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE REINICIO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE FECHA DE FIRMA 26/12/2024.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 12/06/2025

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	102.000,09
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	102.000,09
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	102.000,09
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	19.388,02
TOTAL A PAGAR	$	121.388,11

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PÁGINA SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263476	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

SEGÚN SUSPENSION 3

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: mR1JGQGTYzUGSuo3sBihyg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2835600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 00-04-2021-1317-P-05-PPSU52000000055-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72324349	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION N°3 SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE EL DOCUMENTO DE FECHA 24/02/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONE NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/02/2025	24:00 Horas Del 12/10/2025	3.447.225.148,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/02/2025	24:00 Horas Del 12/06/2028	5.170.837.722,15	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/06/2025	24:00 Horas Del 12/06/2030	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 660.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176888	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72324349	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta retirando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ARTIFICIOS LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - HOJA 4/4

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **10** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **27/02/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **27** días del mes **FEBRERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 2AwnfhJwAFqV4MCgQvIq6A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855400 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 50-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72324338	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION N°3 SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE EL DOCUMENTO DE FECHA 24/02/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONE NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	0,00
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MIRIAM - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72324338	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

5 INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGÚN REINICIO 3

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-09	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACIÓN	FECHA: 12/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	PÁGINA 1 DE 1	

CONTRATO / CONVENIO N.° Y FECHA:	**LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021**				
VALOR INICIAL (En números):	**($22.982.010.588)**				
PLAZO:	**17 MESES**				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**2246 del 06 de junio del 2021** **2247 del 06 de julio de 2021**				
GARANTÍAS:	**INICIALES**	**(%)**	**NUEVAS (Si aplica)**	**(%)**	
Garantía de seriedad del ofrecimiento					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					
Pago anticipado					
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	X	10			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes para fiscales	X	15			
Estabilidad de la obra	X	30			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes					
Correcto funcionamiento de los equipos					
Calidad del servicio					
Provisión de repuestos y accesorios					
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria					
Responsabilidad civil extracontractual	X	5			
Otros amparos					
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si aplica y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	REINICIO				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A				
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A				
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A				
VALOR TOTAL (En números):	**34.472.251.481,09**				
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL				
POLIZA DE GARANTIA N.°:	**NB-100176800**		**P. RESPONSABILIDAD CIVIL N°:**	**NB-100037857**	
VIGENCIA G. (21/10/2025):	10/10/2025 al 26/01/2026 10/10/2025 al 26/05/2029 10/10/2025 al 26/01/2031		**VIGENCIA RC. (21/10/2025):**	19/10/2021 al 26/01/2026	

En San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de octubre de 2025, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reunieron, **CR (RP) GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA** secretario de despacho, en calidad de ordenador del gasto y **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** representada legalmente por **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA**, actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

Cr GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA
SECRETARIO DE DESPACHO
Secretaría de Seguridad Ciudadana

FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C 1.090.407.083
CONTRATISTA

Revisó	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Revisó	Nora Cecilia Pinto Muñoz	Profesional Universitario adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Revisó	Nora Lucía Ruiz Vallejo	Profesional Universitario adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Revisó	Olga Sánchez	Profesional Universitario adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Revisó	Nora Cecilia Pinto Muñoz	Profesional Universitario adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana	

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.22 09:03:04 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2815600 FAX 2811220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2000000059-0001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Iva RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Codigo de Seguridad: 1F7Vt0aFxgrwaX2GN4DoOQ==

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	72629755	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/10/2025	24:00 Horas Del	26/01/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113569484
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LOS PRESENTES DOCUMENTOS SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE LOS SIGUEINTE DOCUMENTOS Y ASI MISMO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS:

** ACTA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 24/06/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 2 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/08/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/09/2025
**ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS N° 03 SE AJUSTA LA VIGENCIA COMO NUEVA DE TERMINACION 26/01/2026 DE FECHA DE REINICIO 10/10/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 26/01/2026	3.447.225.148,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 26/05/2029	5.170.837.722,15	4.845.004,11
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 26/01/2031	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	4.845.004,11
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	4.845.004,11
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	920.550,78
TOTAL A PAGAR	$	5.765.554,89

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada : Compañía Mundial De Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidemos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege al medio ambiente evitando la impresión de este documento

Hoja No

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN. AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	72629755	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	26/01/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 3 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta realizando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

LA BANCA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

Asociación Panamericana de Fianzas

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **11** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **21/10/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **22** días del mes **OCTUBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.21 18:05:48 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-01-2021-1317-P-86-PPSUSER000000277-0001

NIT 860 027 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad VFLRnYr0z+zT8ALrziAldZA==

No. PÓLIZA	NB-100037857	**No. ANEXO**	11	**No. CERTIFICADO**	72629761	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	21/10/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	26/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LOS PRESENTES DOCUMENTOS SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE LOS SIGUEINTE DOCUMENTOS Y ASI MISMO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS:

** ACTA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 24/06/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 2 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/08/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/09/2025
**ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS N° 03 SE AJUSTA LA VIGENCIA COMO NUEVA DE TERMINACION 26/01/2026 DE FECHA DE REINICIO 10/10/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	1.938.881,64
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.938.881,64
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.938.881,64
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	368.220,31
TOTAL A PAGAR	$	2.306.221,95

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A
ANGELA MUÑAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSU58R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	72629761	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	26/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta resolviendo responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

SEGÚN ADICIONAL 3

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.13 15:18:19 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad YER1q/52n84VFTO4wD/ny/Q==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO 2833600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2900000059-0001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	72663210	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL OTRO SI NO 3 AL PROCESO LICITACION PUBLICA LP-SG-01362-2021, SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA:

-CUMPLIMIENTO 10/10/2025 31/03/2026
-PRESTACIONES 10/10/2025 31/07/2029
-ESTABILIDAD 31/03/2026 31/03/2031

-LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 31/03/2026	3.705.554.640,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 31/07/2029	5.558.331.961,05	1.507.602,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/03/2026	24:00 Horas Del 31/03/2031	11.116.663.922,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 20.380.550.523,85	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.507.602,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.507.602,00
GASTOS EXP	$	0,00
IVA	$	286.444,38
TOTAL A PAGAR	$	1.794.046,38

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASE - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855680 FAX: 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	72663210	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®

Aliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **13** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **13/11/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **13** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72663210

Fecha de Facturación	13/11/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB-100176880
Periodo Facturado	19/10/2021 — 30/04/2031

Fecha Limite de Pago	13/12/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	1.507.602,00
IVA	286.444,38
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.794.046,38

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL ESTACION LA
CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	901514217
Intermediario	X CONSULTORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago en las oficinas del canal de recaudo **UNICAMENTE** se debe exhibir este recibo con el sello de recaudo para efectos de información del pago.
3. Si no realiza el pago en la fecha establecida en el presente recibo, la cobertura de la póliza quedará suspendida automáticamente hasta tanto se haga efectivo el pago de la prima y se expida el endoso correspondiente.
4. El medio de pago de cheque debe ser girado únicamente a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 830531230 7**, el cheque debe ser girado por el valor exacto de la factura. En caso de presentación de cheque de menor cuantía, se aplicará un 10% de descuento en el precio del valor de cheque. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago en línea, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la opción de PSE, haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72663210

Fecha de Facturación	13/11/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB-100176880
Periodo Facturado	19/10/2021 — 30/04/2031

Fecha Limite de Pago	13/12/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	1.507.602,00
IVA	286.444,38
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.794.046,38

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL ESTACION LA
CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	901514217
Intermediario	X CONSULTORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000726632 10(3900)1794046 38(96)20251213

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229000000726632 10(3900)1794046 38(96)20251213

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO

Tu compañía siempre

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.05 17:01:11 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: LDDSPUhUbhTVe0n7x23mdQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSU580000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	12	No. CERTIFICADO	72653216	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LOS PRESENTES DOCUMENTOS SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE EL OTRO SI NO 3 AL PROCESO LICITACION PUBLICA LP SG 01362 2021 EL CUAL ADICIONAL AL VALOR DE CONTRATO $ 2.583.294.926 MODIFICA EL VALOR DE CONTRATO A $37.055.546.407, ASI MISMO MODIFICA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA 31/03/2026
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.852.777.320,00	1.852.777.320,35	653.560,48
PATRONAL	517.083.772,00	926.388.660,00	926.388.660,18	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	926.388.660,00	926.388.660,18	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	926.388.660,00	926.388.660,18	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.852.777.320,35	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	653.560,48
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	653.560,48
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	124.176,49
TOTAL A PAGAR	$	777.736,97

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIGILADO POR

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	12	No. CERTIFICADO	72653216	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la pólira se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA ANI

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72653216

Fecha de Facturación	05/11/2025		Fecha Límite de Pago	05/12/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Prima (Incluye gastos de expedición)	653.560,48
Póliza No.	NB-100037857		IVA	124.176,49
Periodo Facturado	19/10/2021	31/03/2026	VALOR TOTAL A PAGAR $	777.736,97

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCC
CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	901514217
Intermediario	X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago en forma presencial tenga en cuenta que el banco ÚNICAMENTE recaudará este bono de recaudo para garantizar la correcta diferenciación del pago.
3. Si esta factura ha sido refacturada el día 01/11/2025 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la circular de esta (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque para la cuenta de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, el respaldo en dinero corriente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta factura. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72653216

Fecha de Facturación	05/11/2025		Fecha Límite de Pago	05/12/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Prima (Incluye gastos de expedición)	653.560,48
Póliza No.	NB-100037857		IVA	124.176,49
Periodo Facturado	19/10/2021	31/03/2026	VALOR TOTAL A PAGAR $	777.736,97

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCC
CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	901514217
Intermediario	X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)770999843421 9(8020)0000072653216(3900)000000777736(96)20251205

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)770999803993 3(8020)031594(8020)2299007265321 6(3900)000000777736(96)20251205

VIGILADO

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO

Tu compañía siempre

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-09	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACIÓN	FECHA: 12/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	PÁGINA 1 DE 1	

CONTRATO / CONVENIO N.° Y FECHA:	**LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021**				
VALOR INICIAL (En números):	**($34.472.251.481,09)**				
PLAZO:	**1.096 DIAS**				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**2246 del 06 de junio del 2021** **2247 del 06 de julio de 2021** **1371 del 12 de abril de 2024**				
GARANTÍAS:	**INICIALES**	**(%)**	**NUEVAS (Si aplica)**	**(%)**	
Garantía de seriedad del ofrecimiento					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.					
Pago anticipado.					
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes para fiscales	X	15			
Estabilidad de la obra.	X	30			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.					
Correcto funcionamiento de los equipos.					
Calidad del servicio.					
Provisión de repuestos y accesorios.					
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria					
Responsabilidad civil extracontractual.	X	5			
Otros amparos.					
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si aplica y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	ADICIONAL EN DINERO y EN TIEMPO				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N° 00 005031del 15/10/2025				
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	$2.583.294.926				
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	HASTA EL 31/03/2026				
VALOR TOTAL (En números):	**$37.055.546.407,09**				
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL.				
POLIZA DE GARANTIA N.°:	**NB-100176880**		**P. RESPONSABILIDAD CIVIL N°:**	**NB-100037857**	
VIGENCIA G. (31/03/2026):	10/10/2025 al 31/03/2026 10/10/2025 al 31/03/2026 10/10/2025 al 31/03/2031		**VIGENCIA RC. (31/03/2026):**	19/10/2021 al 31/06/2026	

En San José de Cúcuta, a los 18 días del mes de noviembre de 2025, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reunieron, **CR (RP) GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA** secretario de despacho, en calidad de ordenador del gasto y **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** representada legalmente por **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA**, actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

Cr ®GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA
SECRETARIO DE DESPACHO
Secretaría de Seguridad Ciudadana

FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C 1.090.407.083
CONTRATISTA

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó	Nayra Carolina Pérez Montejo	Profesional Contratista Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Aprobó	Diana Patricia Contreras Colmenares	Profesional Especializado Secretaría de Seguridad Ciudadana	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma.

SEGÚN ADICIONAL 4

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad IEU187AUmfBo24uQOThQPw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2853600 FAX 2853720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUSR000000059-0001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	14	No. CERTIFICADO	72810573	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO COMO NUEVO VALOR $39.894.452.272 Y ASI MISMA LAS VIGENCIAS QUEDANDO CON FECHA DE TERMINACION 31/05/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 30/09/2026	3.989.445.227,20	5.873.951,29
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 31/05/2029	5.984.167.840,80	6.260.169,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2026	24:00 Horas Del 31/05/2031	11.968.335.681,60	7.243.176,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 21.941.948.749,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	19.377.296,29
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	19.377.296,29
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.681.686,30
TOTAL A PAGAR	$	23.058.982,59

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/02/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2859600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	14	No. CERTIFICADO	72810973	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **14** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **18/02/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **18** días del mes **FEBRERO** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 7qr1Rs3a+xhanRYCpsH89A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2815600 FAX (051)20 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSLSRR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037057	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	72810959	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 0 0 0 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 0 0 0 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO COMO NUEVO VALOR $39.894.452.272 Y ASI MISMA LAS VIGENCIAS QUEDANDO CON FECHA DE TERMINACION 31/05/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1.994.722.613,60	1.994.722.613,60	1.994.722.613,60	1.736.863,08
PATRONAL	997.361.306,80	997.361.306,80	997.361.306,80	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	997.361.306,80	997.361.306,80	997.361.306,80	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	997.361.306,80	997.361.306,80	997.361.306,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.994.722.613,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.736.863,08
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.736.863,08
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	330.003,99
TOTAL A PAGAR	$	2.066.867,07

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/02/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PYME - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	72810959	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APP

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

COPIA RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal

CL 21 B Y 22 AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

42. Correo electrónico utestacionlaparada@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 5 4 9 4 0 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 1 0 8 2 3	7 1 1 2	2 0 2 2 0 1 3 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	1 6	4 8	5 2	5 5																				

7- Retención en la fuente a título de rent

Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2026-03-24 / 02:56:19PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TRUJILLO AMAYA FELIX ANDRES

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-05-2026 10:56:12AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta	7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 7 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 3 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 7 3 0	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta 7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 7 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 9 0 4 0 7 0 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TRUJILLO	AMAYA	FELIX	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 1 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 2 7 3 2 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARADA	REYES	NELSON	YOEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 6 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	18. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 3 7 2 6	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CCC S.A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 7 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 2 1 3 8 6	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 9	2 0 2 1 0 7 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 4 5 1 4 3	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PEDELTA COLOMBIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 2 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	7 1 1 8 5 7 4 7	5	COLOMBIA 1 6

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GALAN	VILLAMIZAR	JAIME	ALBERTO

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 7 3 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 4 5 1 1 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8	2 0 2 1 0 7 3 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 5 de 6 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cucuta	7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 3 4 5 8 4 8 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BERBESI	BARROSO	GERMAN	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 1 2 0 2 1 0 7 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212469984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 1 0 6 0 3 6 0		2 7 4 1 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MOGOLLON	BAUTISTA	DAYVEL	DARILIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 6 3 9 3 2	8	LUNA ASESORES & CONSULTORES S.A.S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 8 3 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DEL CONTRATISTA MANIFESTANDO QUE NO TIENE INHABILIDAD

San José de Cúcuta, 25 de mayo de 2026

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

PERSONA JURÍDICA

NELSON YOEL PARADA REYES, identificado con cedula de ciudadanía N° **88.273.256** y **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA**, identificada con cedula de ciudadanía N° **1.091.060.360** de **CHITAGA**, con tarjeta profesional N° **274197-T** de la Junta de Central de Contadores, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** y **CONTADOR PUBLICO** respectivamente de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6**, **CERTIFICAMOS** que la **UNIÓN TEMPORAL NO TIENE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE TIPO TRIBUTARIA**, para contratar con las entidades estatales de conformidad con lo establecido en la constitución nacional, así como en el artículo 8 de la ley 80 de 1993. Adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007, los artículos 1, 2 y 4 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes de las sanciones por transgresión a la misma, establecida en el artículo 26 numeral 7 y 52 de la ley 80 de 1993, así como los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral 1 de la norma precitada y declaro bajo la gravedad de juramento que la UNIÓN TEMPORAL NO se encuentra incursos en ninguna de ellas.

Cordialmente:

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256 de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274197-T



DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295337 308328

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360

MOGOLLON BAUTISTA

APELLIDOS

DAYVEL DARILIANA

NOMBRES

Dayvel Mogollón

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503100-00756956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BEA90328CAB42DBC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-08
FECHA DE PAGO:	2026-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36996497
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36996497
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	2	$ 0	$ 0	$ 700	$ 159.300	$ 160.000
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 530.300	$ 532.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 867.000	$ 870.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 400.000	$ 401.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	8	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 663.300	$ 666.000
Subtotal Salud		5	31	$ 0	$ 0	$ 10.900	$ 2.619.900	$ 2.630.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 640.000	$ 642.600
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 0	$ 0	$ 27.700	$ 6.803.100	$ 6.830.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 0	$ 12.400	$ 3.042.600	$ 3.055.000
Pensión		3	31	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 10.485.700	$ 10.528.400
14-11	890903790	ARL SURA	31	$ 0	$ 0	$ 18.200	$ 4.463.900	$ 4.482.100
Subtotal ARL		1	31	$ 0	$ 0	$ 18.200	$ 4.463.900	$ 4.482.100
CCF37	890500516	COMFANORTE	31	$ 0	$ 0	$ 10.600	$ 2.589.400	$ 2.600.000
Subtotal CCF		1	31	$ 0	$ 0	$ 10.600	$ 2.589.400	$ 2.600.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 82.400	$ 20.158.900	$ 20.241.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/05/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

EMPLEADO				NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Total
N°	ID	EMPLEADO	SALARIO													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPLEA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ARL SURA - 14-11	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SUC-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1	[redacted]		[redacted]		[redacted]		N	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SAL.ud.	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SALDO PAGO	INTERES A MORA	ENTIDAD FISCALIZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	E	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Nº APLIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
31 de 31	[redacted]		Pagada							

TOTALES BIC				
BIC PENSIÓN	BIC SALUD	BIC RIESGOS	BIC CAJAS	BIC PARAF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				31	10.485.700	0	42.700	0	10.528.400
PROTECCION	230301	800224739	0	2	840.000	0	2.800	0	842.800
PORVENIR	230301	800224808	8	19	6.805.100	0	27.700	0	6.805.800
COLPENSIONES	25-14	800138188	7	10	3.040.600	0	12.400	0	3.053.000
EPS(Administradoras: 6)				31	2.819.903	0	10.900	0	2.830.803
SANITAS	EPS008	800251440	6	6	530.300	0	2.200	0	532.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	800232175	3	8	883.300	0	3.700	0	886.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	450.000	0	1.700	0	451.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	10	867.000	0	3.600	0	870.600
COMFAORIENTE	CCFC60	890500675	6	2	104.300	0	700	0	105.000
ARP(Administradoras: 1)				31	4.463.900	0	18.200	0	4.482.100
ARL SURA	14-11	830002700	3	31	4.463.900	0	18.200	0	4.482.100
CCF(Administradoras: 1)				31	2.809.400	0	10.600	0	2.820.000
COMFANORTE	CCF37	890900816	3	31	2.389.400	0	10.600	0	2.800.000
Gran Total					20.158.903	0	82.400	0	20.241.300

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-05-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37306211
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37306211
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	2	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 159.200	$ 161.000
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 527.400	$ 533.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 854.900	$ 864.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 398.000	$ 402.300
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	8	$ 0	$ 0	$ 7.100	$ 661.700	$ 668.800
Subtotal Salud		5	31	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 2.601.200	$ 2.629.300
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 636.800	$ 643.700
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 0	$ 0	$ 72.200	$ 6.731.500	$ 6.803.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 0	$ 32.600	$ 3.034.400	$ 3.067.000
Subtotal Pensión		3	31	$ 0	$ 0	$ 111.700	$ 10.402.700	$ 10.514.400
	890903790	ARL SURA	31	$ 0	$ 0	$ 47.500	$ 4.422.500	$ 4.470.000
Subtotal ARL		1	31	$ 0	$ 0	$ 47.500	$ 4.422.500	$ 4.470.000
CCF37	890500516	COMFANORTE	31	$ 0	$ 0	$ 27.600	$ 2.565.200	$ 2.592.800
Subtotal CCF		1	31	$ 0	$ 0	$ 27.600	$ 2.565.200	$ 2.592.800
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 214.900	$ 19.991.600	$ 20.206.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	P. PRESENTACIÓN	ACT. CCO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SAL. Y OTROS	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (TIA)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

EMPLEADO				NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	Total
Nº	ID	NOMBRE	SALARIO								
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ARL SURA + 14-11	SUCURSAL	4221	Jurídica
MAN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	[redacted]		[redacted]		[redacted]			N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	97208311	E	2026-05-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	$5,038,600	$14,900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / Nº RADICADO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
31 de 31	97208311		Pagada						

TOTALES BIC				
BIC PENSIÓN	BIC SALUD	BIC RIESGOS	BIC CAJAS	BIC PARAF
$2,000,570	$2,000,570	$1,000,570	$4,113,270	$

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				31	10,402,700	0	111,700	0	10,514,400
PORVENIR	230301	800224808	8	19	6,731,500	0	72,200	0	6,803,700
PROTECCIÓN	230201	800138188	9	2	836,800	0	6,900	0	843,700
COLPENSIONES	25-18	900336004	7	19	3,034,400	0	32,900	0	3,067,300
EPS(Administradoras: 5)				31	2,601,200	0	28,100	0	2,629,300
EPS-S-COOSALUD	ESSC24	900336715	3	8	661,700	0	7,100	0	668,800
COMFAORIENTE	CCF030	890500675	6	2	159,200	0	1,900	0	161,000
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	627,400	0	5,700	0	633,100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	3	10	954,300	0	9,800	0	964,100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	9	398,300	0	4,300	0	402,300
ARP(Administradoras: 1)				31	4,422,600	0	47,500	0	4,470,000
ARL SURA	14-11	860003740	6	31	4,422,600	0	47,500	0	4,470,000
CCF(Administradoras: 1)				31	2,565,200	0	27,600	0	2,592,800
COMFAORTE	CCF37	890500516	3	31	2,565,200	0	27,600	0	2,592,800
Gran Total					19,991,600	0	214,900	0	20,206,500

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	I001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ESPECIALISTAS I
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-05-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37079231
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37079231
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 365.700	$ 369.700
				Total a pagar:	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 365.700	$ 369.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37133302
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-05-19

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOSE RAFAEL CACERES RUBIO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88251310	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 2 N 7E 07 LC 3 BR QUINTA ORIENTAL	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	LIBAR933@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3002900323
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE CONTRATISTA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		37133302

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88251310	59	No	No	No	54	1	5429001	Salario	CACERES RUBIO JOSE RAFAEL	$2.950.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88251310																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88251310	COLPENSIONES	30	$2.950.000	0.1600000	$472.000	$0	$0	$472.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88251310	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.950.000	0.1250000	$368.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.950.000	1	0.0052200	$15.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88251310	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$472.000	$0	$0	$0	$0	13	$4.400	$0	$0	$476.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$368.800	$0	0	$0	0	$0	$368.800	13	$3.500	$0	$372.300	$0	0	$0	$0	$372.300	$0	$0	$372.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$15.400	0	$0	$0	$15.400	13	$200	$15.600	0	$0	$156	$15.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	13	$0	$0
SENA	0	$0	13	$0	$0
ICBF	0	$0	13	$0	$0
ESAP	0	$0	13	$0	$0
MinEdu	0	$0	13	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$372.300
PENSIONES	1	$476.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$15.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$864.300

RESUMEN PL' PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 88248537	0	NELSON JAVIER CELY CALIXTO	1	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	23 3 URB BRISAS DEL NORTE		5865836		ILEANASEGURIDADSOCIAL@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37092466	I	2026-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	509.600	1.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37092466	2026-05-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRET	IVTS	ITDE	ITAE	ITDP	ITAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS?	AFP?	AFP	DPE	DPS	DTP	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FSPC%	FSPS%	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	APL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 88248537	CELY CALIXTO NELSON JAVIER	1.750.905																			30	30	0	30	1 COLPENSIONES 25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS - EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF - SENCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	4	0	0	0	0	59	0	536.300	N	4411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 88248537	0	NELSON JAVIER CELY CALIXTO	1	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	23 3 URB BRISAS DEL NORTE		5865836		ILEANASEGURIDADSOCIAL@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37092466	I	2026-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	509.600	1.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37092466	2026-05-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	700	0	280.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	700	0	280.900
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	500	0	219.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	500	0	219.400
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	100	0	9.300
ARL SURA	14-11	830903790	5	1	9.200	0	100	0	9.300
Gran Total					508.300	0	1.300	0	509.600

RESUMEN PLA A PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901364384	3	BIGG SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 9 # 39 APTO 203 BARRIO COMUNEROS		3112769885		INFOBIGCOSAS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37448236	E	2026-05-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37448236	2026-05-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INT	ELE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNS/L	FNS/SUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 84116872	MENDOZA CACERES LUIS FERNANDO	1.750.905	F											0			30	30	30	30	PORVENIR-EMMU	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,006962	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	311.001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901364384	3	BIGG SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 9 # 39 APTO 203 BARRIO COMUNEROS		3112769885		INFOBIGCOSAS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37448236	E	2026-05-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37448236	2026-05-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
ARL SURA	14-11	830903790	5	1	121.900	0	0	0	121.900
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	70.100	0	0	0	70.100
Gran Total					542.300	0	0	0	542.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / PIN	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / PIN	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	5.252.718	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	365.700	0	4.000	0	369.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	365.700	0	4.000	0	369.700
Gran Total					365.700	0	4.000	0	369.700

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSTRUCTORA MALLTRU SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900674003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	006
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PROFESIONALES CONTRATISTAS
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-06
FECHA DE PAGO:	2026-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36971447
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36971447
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 80.000	$ 80.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 120.000	$ 120.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 80.000	$ 80.200
Subtotal Salud		3	3	$ 0	$ 0	$ 600	$ 280.000	$ 280.600
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 800.000	$ 801.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 320.000	$ 320.500
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 1.120.000	$ 1.121.600
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 700	$ 487.200	$ 487.900
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 700	$ 487.200	$ 487.900
[illegible]	890500516	COMFANORTE	3	$ 0	$ 0	$ 400	$ 280.000	$ 280.400
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 400	$ 280.000	$ 280.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 2.167.200	$ 2.170.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SEN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (TPO)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAF
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SEN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (TPO)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	1.120.000	0	1.800	0	1.121.800
COLPENSIONES	25-14	[illegible]	7	1	320.000	0	600	0	320.600
PORVENIR	230301	[illegible]	8	2	800.000	0	1.100	0	801.100
EPS(Administradoras: 3)				3	280.000	0	600	0	280.600
COMFAORIENTE	CCFC50	[illegible]	6	1	80.000	0	200	0	80.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	[illegible]	2	1	120.000	0	200	0	120.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	[illegible]	3	1	80.000	0	200	0	80.200
ARP(Administradoras: 1)				3	487.200	0	700	0	487.900
ARL SURA	14-11	[illegible]	5	3	487.200	0	700	0	487.900
CCF(Administradoras: 1)				3	280.000	0	400	0	280.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFANORTE	CCF37	8905005116	3	3	390.000	0	400	0	390.400
Gran Total					2.167.350	0	3.500	0	2.170.850

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSTRUCTORA MALLTRU SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900674003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	006
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PROFESIONALES CONTRATISTAS
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37298033
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37298033
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	2	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 128.000	$ 129.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 205.900	$ 208.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 286.800	$ 290.300
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 48.400	$ 49.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 75.700	$ 76.700
Subtotal Salud		5	11	$ 0	$ 0	$ 9.300	$ 744.600	$ 754.100
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 8.300	$ 512.000	$ 518.300
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 20.500	$ 1.680.100	$ 1.700.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 814.800	$ 824.800
Subtotal Pensión		3	11	$ 0	$ 0	$ 36.800	$ 3.006.900	$ 3.043.700
*	890903790	ARL SURA	11	$ 0	$ 0	$ 15.800	$ 1.295.800	$ 1.311.600
S: tal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 15.800	$ 1.295.800	$ 1.311.600
CCF37	890500516	COMFANORTE	11	$ 0	$ 0	$ 9.100	$ 744.800	$ 753.900
Subtotal CCF		1	11	$ 0	$ 0	$ 9.100	$ 744.800	$ 753.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 71.000	$ 5.792.300	$ 5.863.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SAL - ...	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS Y MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA / PARAFISCALES	Total
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	D	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO TYU	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	3,008,900	0	36,800	0	3,043,700
PROTECCION	230301	800256706	2	2	813,000	0	5,300	0	818,300
COLPENSIONES	25-14	800306004	7	3	814,800	0	10,000	0	824,800
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1,680,100	0	20,500	0	1,700,600
EPS(Administradoras: 5)				11	744,800	0	9,300	0	754,100
COMFAORIENTE	COFC50	890500675	0	1	126,000	0	1,800	0	128,800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800130907	2	3	305,800	0	2,900	0	308,700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS081	800130907	2	4	299,800	0	5,000	0	304,800
COOSALUD	EPS042	800226715	3	1	82,400	0	600	0	83,000
EPS-S COOSALUD	CSSC24	800226715	3	1	75,700	0	1,000	0	76,700
ARP(Administradoras: 1)				11	1,235,800	0	15,800	0	1,311,600
ARL SURA	14-11	830031760	6	11	1,295,800	0	15,800	0	1,311,600
CCF(Administradoras: 1)				11	744,800	0	8,100	0	753,000
COMFANORTE	CCF37	890500515	3	11	744,800	0	8,100	0	753,000
Gran Total					5,792,300	0	71,000	0	5,863,300

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSTRUCTORA MALLTRU SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900674003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	004
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	HACIENDA SANTA CRUZ
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-06
FECHA DE PAGO:	2026-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36970635
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36970635
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$ 0	$ 0	$ 400	$ 239.600	$ 240.000
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 400	$ 239.600	$ 240.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 320.000	$ 320.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 320.000	$ 320.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 318.400	$ 318.900
Subtotal Pensión		3	3	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 958.400	$ 959.900
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 600	$ 416.900	$ 417.500
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 600	$ 416.900	$ 417.500
CCF37	890500516	COMFANORTE	3	$ 0	$ 0	$ 400	$ 239.600	$ 240.000
CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 400	$ 239.600	$ 240.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 1.854.500	$ 1.857.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	958.400	0	1.500	0	959.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	320.000	0	500	0	320.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	500	0	320.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	318.400	0	500	0	318.900
EPS(Administradoras: 1)				3	239.600	0	400	0	240.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	239.600	0	400	0	240.000
ARP(Administradoras: 1)				3	416.900	0	600	0	417.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	416.900	0	600	0	417.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3	239.600	0	400	0	240.000
COMFANORTE	CCF37	890500816	3	3	239.600	0	400	0	240.000
Gran Total					1.854.320	0	2.900	0	1.857.420

PAGO:
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSTRUCTORA MALLTRU SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900674003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	005
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CUADRILLA MANUELITO
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-06
FECHA DE PAGO:	2026-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36971234
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36971234
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 132.400	$ 132.600
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 132.400	$ 132.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 545.500	$ 546.300
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 545.500	$ 546.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 230.400	$ 230.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 230.400	$ 230.800
CCF37	890500516	COMFANORTE	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 132.400	$ 132.600
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 132.400	$ 132.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 1.040.700	$ 1.042.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	D.V.	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	P. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SAL. (1)	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Total
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	D.V.	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	P. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SAL. (1)	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	545.500	0	800	0	546.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	545.500	0	800	0	546.300
EPS(Administradoras: 1)				1	132.400	0	200	0	132.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	132.400	0	200	0	132.600
ARP(Administradoras: 1)				1	230.400	0	400	0	230.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	230.400	0	400	0	230.800
CCF(Administradoras: 1)				1	132.400	0	200	0	132.600
COMFANORTE	CCF07	890500516	3	1	132.400	0	200	0	132.600
Gran Total					1.040.700	0	1.600	0	1.042.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSTRUCTORA MALLTRU SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900674003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	005
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CUADRILLA MANUELITO
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37283838
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37283838
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 131.000	$ 132.600
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 131.000	$ 132.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 523.700	$ 530.100
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 523.700	$ 530.100
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 213.900	$ 216.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 213.900	$ 216.500
CCF37	890500516	COMFANORTE	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 123.000	$ 124.500
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 123.000	$ 124.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 12.100	$ 991.600	$ 1.003.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / PAG	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			Total
No	ID	EMPLEADO	SALARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	TARIFA	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PORVENIR [illegible]	[illegible]	[illegible]	NUEVA E.P.S. S.A. [illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFANORTE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PORVENIR [illegible]	[illegible]	[illegible]	NUEVA E.P.S. S.A. [illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFANORTE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / PAG	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.272.727	3.272.727	3.272.727	3.272.727	

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	523.700	0	6.400	0	530.100
PORVENIR	230301	[illegible]	8	1	523.700	0	6.400	0	530.100
EPS(Administradoras: 1)				1	131.000	0	1.600	0	132.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	[illegible]	2	1	131.000	0	1.600	0	132.600
ARP(Administradoras: 1)				1	213.900	0	2.600	0	216.500
ARL SURA	14-11	[illegible]	3	1	213.900	0	2.600	0	216.500
CCF(Administradoras: 1)				1	123.000	0	1.500	0	124.500
COMFANORTE	CCF37	[illegible]	3	1	123.000	0	1.500	0	124.500
Gran Total					991.600	0	12.100	0	1.003.700

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900221386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	003
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CEEI
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-22
FECHA DE PAGO:	2026-04-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37110429
TOTAL COTIZANTES:	55
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37110429
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 155.500	$ 155.700
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 600	$ 776.400	$ 777.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 1.495.400	$ 1.496.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$ 0	$ 0	$ 700	$ 913.700	$ 914.400
EPS042	900226715	COOSALUD	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 181.800	$ 181.800
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	7	$ 0	$ 0	$ 400	$ 532.000	$ 532.400
Subtotal Salud		6	55	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 4.054.600	$ 4.057.800
230201	800229739	PROTECCION	13	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 4.247.800	$ 4.250.700
230301	800224808	PORVENIR	29	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 8.244.300	$ 8.249.900
	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 315.200	$ 315.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 3.596.200	$ 3.598.700
Subtotal Pensión		4	55	$ 0	$ 0	$ 11.300	$ 16.403.500	$ 16.414.800
14-11	890903790	ARL SURA	55	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 6.059.400	$ 6.063.500
Subtotal ARL		1	55	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 6.059.400	$ 6.063.500
CCF37	890500516	COMFANORTE	55	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 3.577.800	$ 3.580.300
Subtotal CCF		1	55	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 3.577.800	$ 3.580.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 21.100	$ 30.095.300	$ 30.116.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2026


RESUMEN PLANILLA PAGADA


DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

EMPLEADO	NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	Total	Días de Parafiscales	Actividad Económica
1	[illegible]									
2	[illegible]									
3	[illegible]									
4	[illegible]									
5	[illegible]									
6	[illegible]									
7	[illegible]									
8	[illegible]									
9	[illegible]									
10	[illegible]									
11	[illegible]									
12	[illegible]									
13	[illegible]									
14	[illegible]									
15	[illegible]									
16	[illegible]									
17	[illegible]									
18	[illegible]									
19	[illegible]									
20	[illegible]									
21	[illegible]									

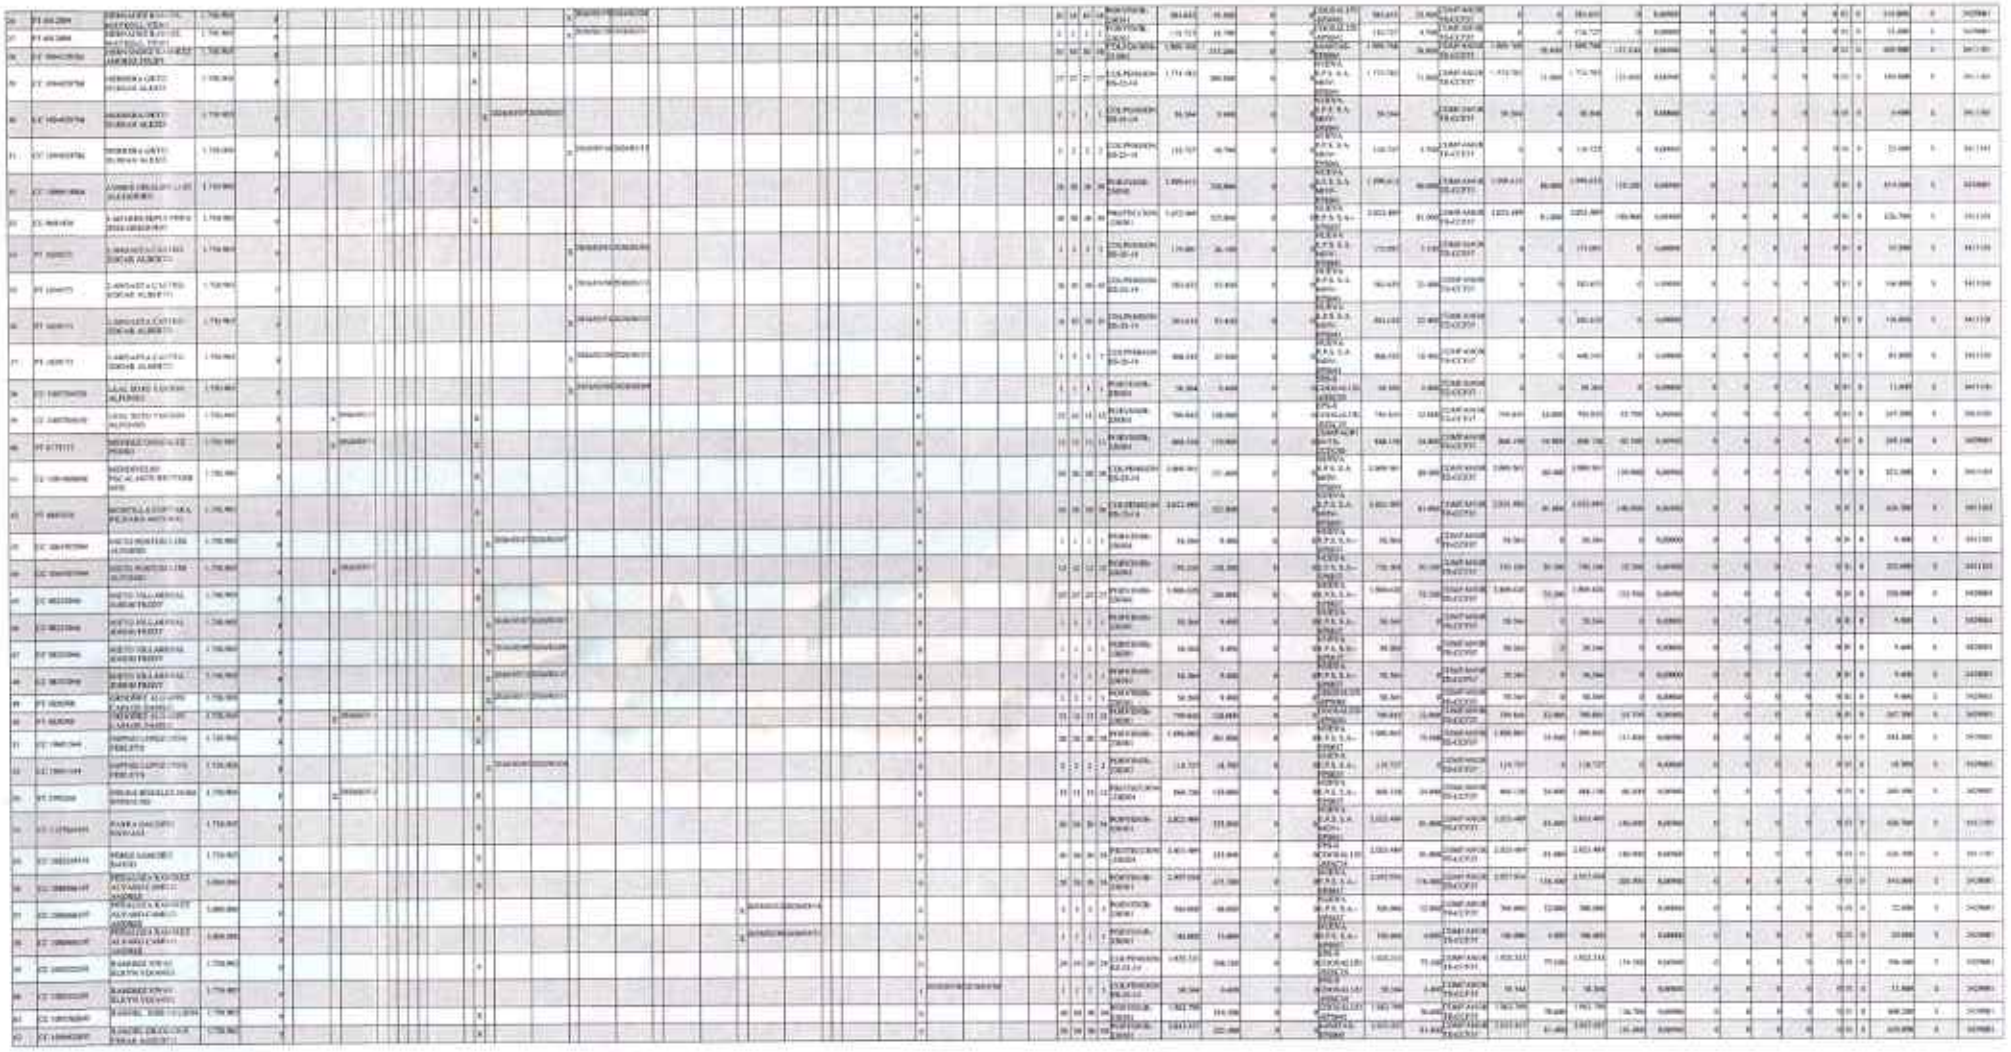

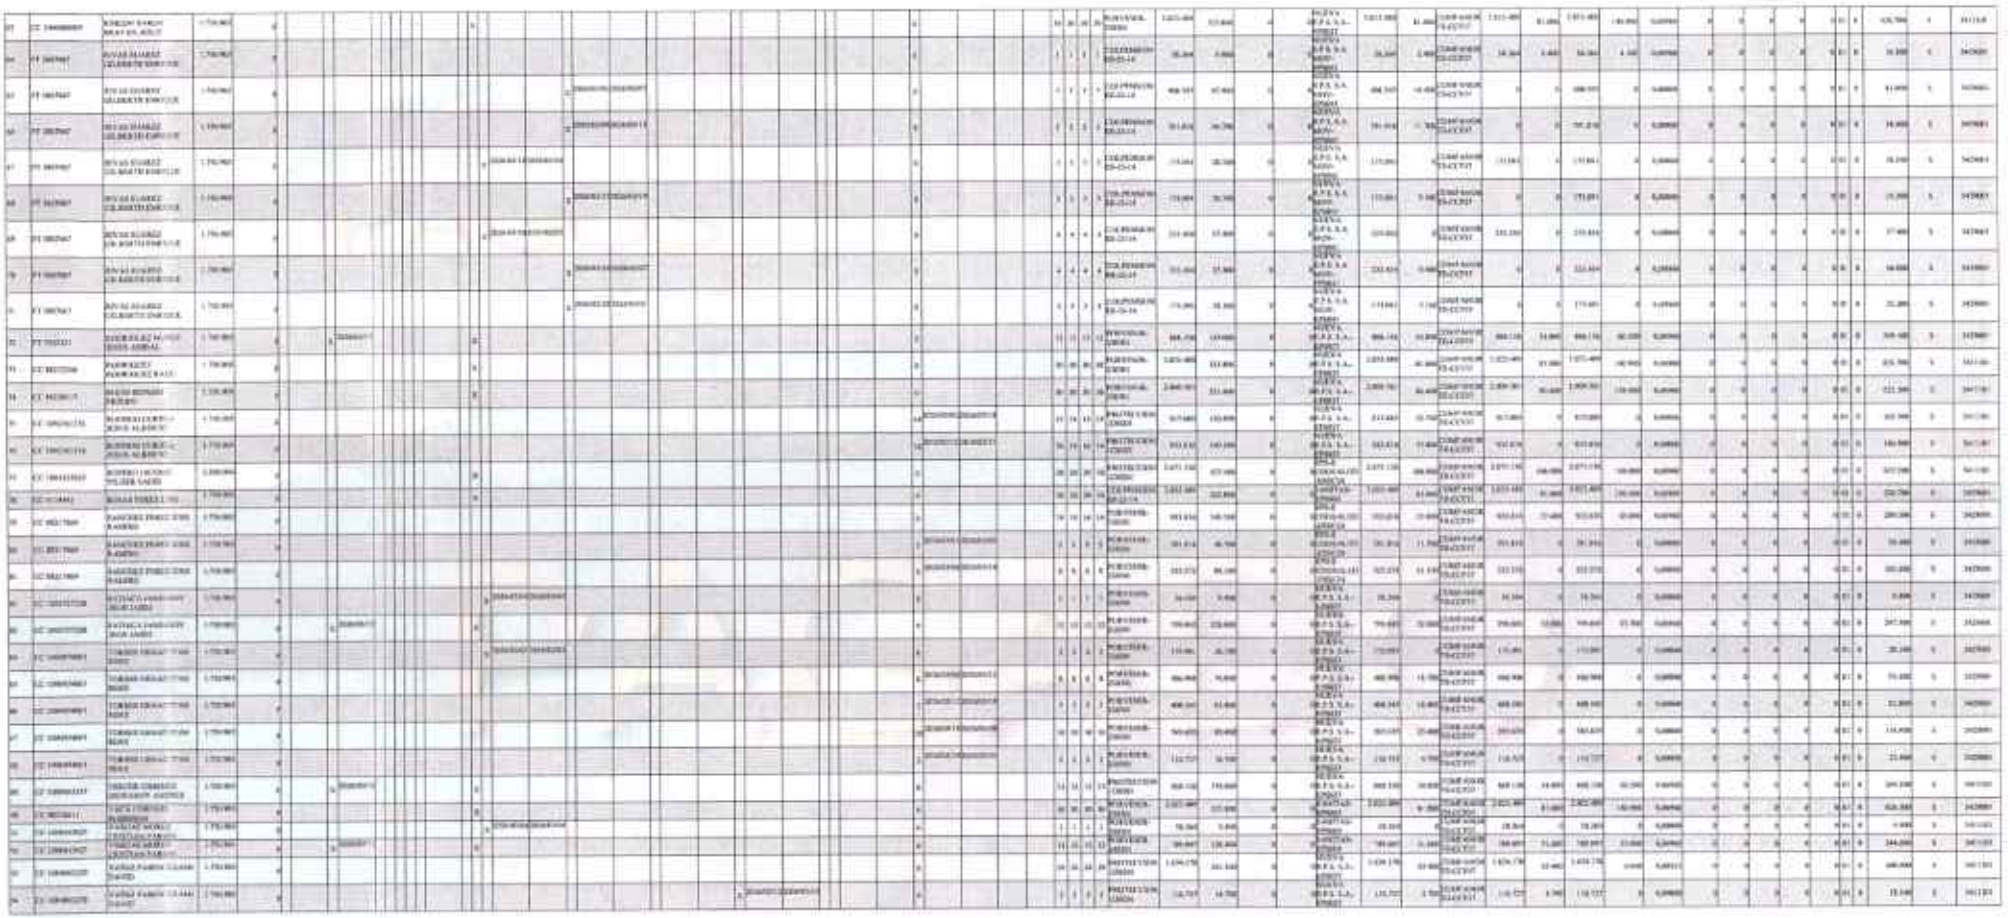

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SAL. ID.	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		[illegible]							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
102.604.143	102.604.143	102.604.143	67.706.924	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				55	16.403.500	0	11.300	0	16.414.800
PROTECCION	23201	800230739	0	13	4.247.800	0	2.900	0	4.250.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	3.846.200	0	1.900	0	3.848.100
PORVENIR	23301	800144808	6	29	8.244.300	0	5.800	0	8.248.900
COLFONDOS	23101	800227940	8	1	315.200	0	900	0	316.100
EPS(Administradoras: 6)				55	4.054.600	0	3.200	0	4.057.800
COMFACHOCO	CCF130	890900879	0	2	105.300	0	600	0	105.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	22	1.406.400	0	1.100	0	1.406.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	13	913.700	0	700	0	914.400
EPS-S COOSALUD	ESS024	900226715	3	7	332.300	0	400	0	332.700
COOSALUD	EPS042	8002267152	3	3	181.800	0	200	0	182.000
SANITAS	EPS005	830031448	6	8	776.400	0	900	0	777.300
ARP(Administradoras: 1)				55	8.060.400	0	4.100	0	8.063.300
ARL SURA	14-17	830357750	5	55	8.060.400	0	4.100	0	8.063.300
CCF(Administradoras: 1)				55	3.577.800	0	2.500	0	3.580.300
COMFASORTE	CCF37	890800319	3	55	3.577.800	0	2.500	0	3.580.300
Gran Total					32.096.300	0	21.100	0	32.116.400

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900221386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	003
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CEEI
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
FECHA DE PAGO:	2026-05-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37327428
TOTAL COTIZANTES:	42
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37327428
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 729.000	$ 729.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.286.900	$ 1.286.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 764.100	$ 764.100
EPS042	900226715	COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.500	$ 156.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.700	$ 422.700
Subtotal Salud		5	42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.359.200	$ 3.359.200
230201	800229739	PROTECCION	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.434.300	$ 3.434.300
230301	800224808	PORVENIR	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.509.400	$ 6.509.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.600	$ 294.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.428.000	$ 3.428.000
Pensión		4	42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.666.300	$ 13.666.300
	890903790	ARL SURA	42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.206.500	$ 5.206.500
Subtotal ARL		1	42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.206.500	$ 5.206.500
CCF37	890500516	COMFANORTE	42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.072.900	$ 3.072.900
Subtotal CCF		1	42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.072.900	$ 3.072.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.304.900	$ 25.304.900


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA PARAF.	TOTAL
N°	ID	EMPLEADO	SALARIO	[illegible]								
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

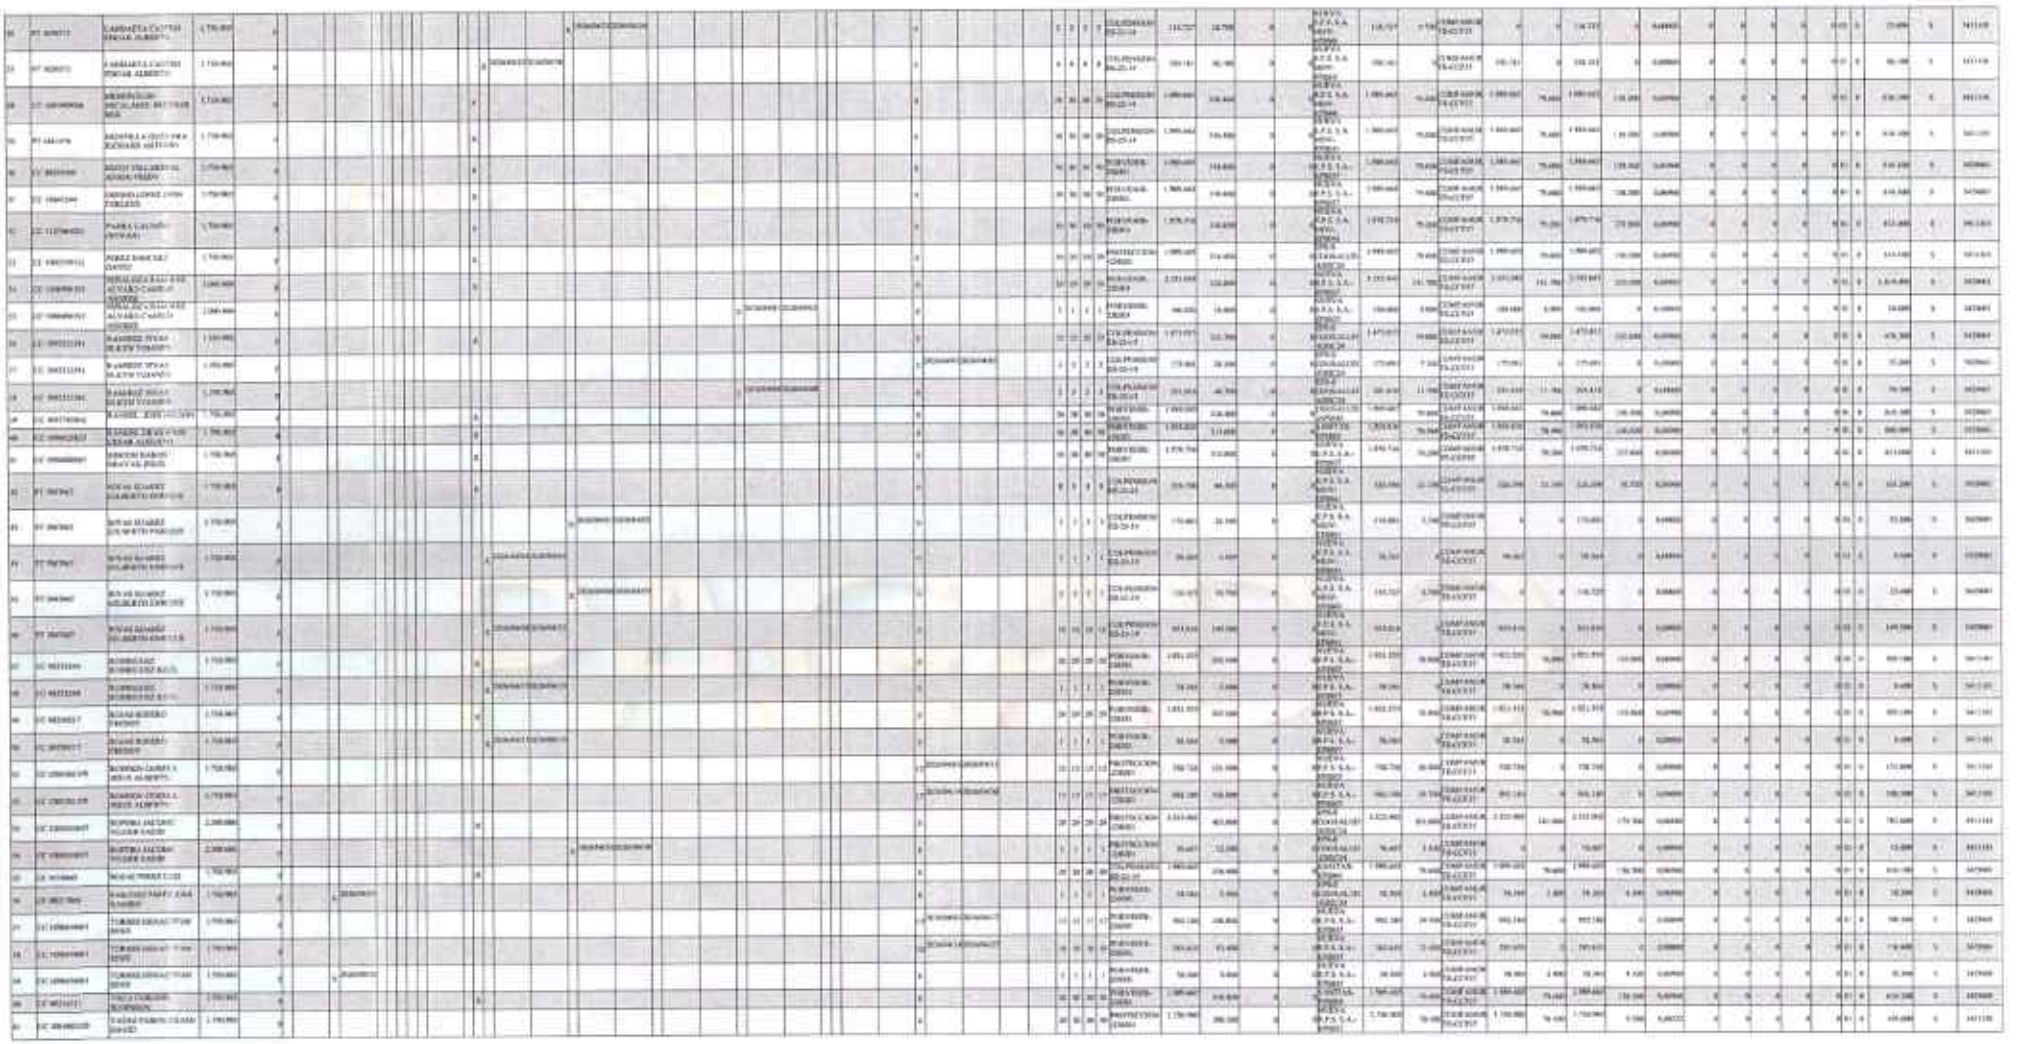

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / PIN	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		[illegible]							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COLPENSIONES	39-14	[illegible]	7	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PORVENIR	230301	[illegible]	8	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COLFONDOS	231001	[illegible]	5	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PROTECCION	230201	[illegible]	0	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EPS(Administradoras: 5)				42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SANITAS	EPS008	[illegible]	6	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EPS-S COOSALUD	ESSC24	[illegible]	3	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COOSALUD	EPS042	[illegible]	5	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	[illegible]	2	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	[illegible]	2	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ARP(Administradoras: 1)				42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ARL SURA	14-11	[illegible]	5	42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CCF(Administradoras: 1)				42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COMFANORTE	CCF37	[illegible]	3	42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gran Total					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900221386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	009
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ESTACION
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-22
FECHA DE PAGO:	2026-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37056163
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37056163
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
EPS042	900226715	COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.500	$ 210.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
Subtotal Salud		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.500	$ 610.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 521.700	$ 521.700
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 960.000
Subtotal Pensión		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.441.700	$ 2.441.700
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.062.200	$ 1.062.200
ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.062.200	$ 1.062.200
[illegible]	890500516	COMFANORTE	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.500	$ 610.500
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.500	$ 610.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.724.900	$ 4.724.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	MES DE PAGO (PAG)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

#	ID	EMPLEADO	SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUNREP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERESES MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.724.900	[illegible]	BANCO DAVIVIENDA
Nº ATENDIDO	REF. DE PAGO (TRX)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	2.441.703	0	0	0	2.441.703
PORVENIR	23301	800234808	8	3	980.000	0	0	0	980.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	980.000	0	0	0	980.000
PROTECCION	23201	800230739	0	1	521.700	0	0	0	521.700
EPS(Administradoras: 3)				7	810.500	0	0	0	810.500
NUEVA E.P.S. S.A	EPS037	900156264	2	3	240.000	0	0	0	240.000
COOSALUD	EPS043	900226715	5	3	210.000	0	0	0	210.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	5	1	160.000	0	0	0	160.000
ARP(Administradoras: 1)				7	1.082.200	0	0	0	1.082.200
ARL SURA	14-11	830031587	5	7	1.082.200	0	0	0	1.082.200
CCF(Administradoras: 1)				7	510.500	0	0	0	510.500
COMFAMETA	CCF37	890500518	3	7	510.500	0	0	0	510.500
Gran Total					4.724.903	0	0	0	4.724.900

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900221386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	009
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ESTACION
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
FECHA DE PAGO:	2026-05-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37325312
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37325312
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.700	$ 230.700
EPS042	900226715	COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.400	$ 209.400
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.500	$ 156.500
Subtotal Salud		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.600	$ 596.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.100	$ 519.100
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 950.600	$ 950.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 953.700	$ 953.700
Subtotal Pensión		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.423.400	$ 2.423.400
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.038.000	$ 1.038.000
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.038.000	$ 1.038.000
[illegible]	890500516	COMFANORTE	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.600	$ 596.600
[illegible] CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.600	$ 596.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.654.600	$ 4.654.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN/DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	DÍAS	PENSIÓN NOMBRE	PENSIÓN IBC	PENSIÓN Cot	SALUD NOMBRE	SALUD IBC	SALUD Cot	CCF NOMBRE	CCF IBC	CCF Cot	RIESGOS IBC	RIESGOS Cot	Total
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	AUT. ESQ.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / FAC	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		[illegible]							

TOTALES BC				
BC PENSIÓN	BC SALUD	BC RIESGOS	BC CAJAS	BC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	2.423.400	0	0	0	2.423.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	959.700	0	0	0	959.700
PORVENIR	230301	900224808	8	3	900.800	0	0	0	900.800
PROTECCION	230301	900228739	0	1	519.100	0	0	0	519.100
EPS(Administradoras: 3)				7	596.800	0	0	0	596.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	901136264	2	3	233.700	0	0	0	233.700
EPS-S COOMULUD	ESSC24	900338715	3	2	158.500	0	0	0	158.500
COOSALUD	EPS040	900338715	3	2	204.400	0	0	0	204.400
ARP(Administradoras: 1)				7	1.238.000	0	0	0	1.238.000
ARL SURA	14-11	830031790	5	7	1.238.000	0	0	0	1.238.000
CCF(Administradoras: 1)				7	596.800	0	0	0	596.800
COMFANORTE	CCF37	890300518	3	7	596.800	0	0	0	596.800
Gran Total					4.654.800	0	0	0	4.654.800

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900221386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	010
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PERSONAL DE OBRA ROTATIVO
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-22
FECHA DE PAGO:	2026-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37056623
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37056623
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.700	$ 66.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.700	$ 523.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.700	$ 61.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.400	$ 71.400
Subtotal Salud		4	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 723.500	$ 723.500
230201	800229739	PROTECCIÓN	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.900	$ 561.900
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.513.200	$ 1.513.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.200	$ 886.200
Subtotal Pensión		3	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.961.300	$ 2.961.300
-	890903790	ARL SURA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.243.700	$ 1.243.700
ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.243.700	$ 1.243.700
CCF37	890500516	COMFANORTE	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714.800	$ 714.800
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714.800	$ 714.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.643.300	$ 5.643.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2020-04-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

N°	ID	EMPLEADO	SALARIO	NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TOTAL
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (TSS)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[redacted]	[redacted]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18,503,704	18,503,704	18,503,704	18,503,704	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	2,961,303	0	0	0	2,961,303
PROTECCIÓN	230201	800229739	0	2	981,880	0	0	0	981,880
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1,015,200	0	0	0	1,015,200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	965,200	0	0	0	965,200
EPS(Administradoras: 4)				9	723,503	0	0	0	723,503
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	81,700	0	0	0	81,700
SANITAS	EPS008	800251440	6	1	66,700	0	0	0	66,700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	523,700	0	0	0	523,700
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	71,400	0	0	0	71,400
ARP(Administradoras: 1)				9	1,243,700	0	0	0	1,243,700
ARL SURA	14-11	830031790	5	9	1,243,700	0	0	0	1,243,700
CCF(Administradoras: 1)				9	714,800	0	0	0	714,800
COMFAHORTE	CCF37	890500618	3	9	714,800	0	0	0	714,800
Gran Total					5,643,303	0	0	0	5,643,303

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900221386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	010
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PERSONAL DE OBRA ROTATIVO
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
FECHA DE PAGO:	2026-05-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37326303
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37326303
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.200	$ 74.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.200	$ 708.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.900	$ 142.900
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.000	$ 212.000
Subtotal Salud		4	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.137.300	$ 1.137.300
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.500	$ 997.500
230301	800224808	PORVENIR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.436.800	$ 2.436.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.700	$ 182.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.400	$ 997.400
Subtotal Pensión		4	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.614.400	$ 4.614.400
[illegible]	890903790	ARL SURA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.951.300	$ 1.951.300
[illegible] ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.951.300	$ 1.951.300
CCF37	890500516	COMFANORTE	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.121.500	$ 1.121.500
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.121.500	$ 1.121.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.824.500	$ 8.824.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible] S.A.S	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - [illegible]	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	AV [illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	NRO. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA / PARAF / SENA / ICBF / ESAP / MEN	Total
#	ID	EMPLEADO	SALARIO								
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		CADRITO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ESTADO RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / FIN	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		[illegible]							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				16	4,814,400	0	0	0	4,814,400
PORVENIR	230301	800224808	8	9	3,439,800	0	0	0	3,439,800
COLFONDOS	231001	800227940	5	1	182,700	0	0	0	182,700
PROTECCION	230201	800229739	0	4	867,900	0	0	0	867,900
COLPENSIONES	05-14	900336004	7	2	867,900	0	0	0	867,900
EPS(Administradoras: 4)				10	1,137,300	0	0	0	1,137,300
SANITAS	EPS005	800251440	8	1	74,200	0	0	0	74,200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800130907	2	6	709,200	0	0	0	709,200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	142,000	0	0	0	142,000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	1	4	212,000	0	0	0	212,000
ARP(Administradoras: 1)				10	1,051,300	0	0	0	1,051,300
ARL SURA	14-11	830003780	5	10	1,051,300	0	0	0	1,051,300
CCF(Administradoras: 1)				10	1,121,500	0	0	0	1,121,500
COMFANORTE	CCF37	890300519	3	10	1,121,500	0	0	0	1,121,500
Gran Total					8,024,500	0	0	0	8,024,500

PAGADO

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA MANIFESTANDO LA VERACIDAD DE LOS APORTES

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER".

CERTIFICA

Que, FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC** Nit. 901.514.217-6, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato de obra pública No. LP-SG-01362-2021 del 31 de agosto del 2021 para el pago de acta de recibo parcial No. 13, que presento pagos de pensión, salud y riesgos profesionales correspondientes al periodo establecido entre el 16 de abril del 2026 al 24 de mayo del 2026; al igual se dio cumplimiento en las actividades establecidas en dicho periodo.

San José de Cúcuta, mayo 25 del 2026.

Ing. Lidia Shirley Parra García
Representante Legal Interventoría
Unión Temporal Inter Seguridad

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DEL CONTADOR MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES, CON COPIA DE DOCUMENTOS DEL CONTADOR

San José de Cúcuta,25 de mayo de 2026

CON EL FIN DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 50 DE LA LEY 789 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002 Y LA LEY 228 DE 2003, SE INDICA LO SIGUIENTE:

CERTIFICAMOS LOS ABAJO FIRMANTES QUE:

El **ESTACIÓN LA PARADA LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6,** con Representación legal de **NELSON YOEL PARADA REYES,** identificado con C.C. **88.273.256** expedida en **CÚCUTA,** ha realizado el pagos de los aportes del personal en el periodo comprendido **16 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2026**, dando así cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones que le corresponde respecto al Sistema de Seguridad Social, los correspondiente a SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES DE PENSIÓN y al momento de esta certificación se encuentra al día y a paz y salvo con estas entidades.

Se expide la presente certificación con destino al **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - NIT 800.103.927-7**, para realizar el cobro del **ACTA PARCIAL N° 013** del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Atentamente,

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC **88.273.256** de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
274197-T
DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734
DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
295337
308328


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360

MOGOLLON BAUTISTA

APELLIDOS

DAYVEL DARILIANA

NOMBRES

Dayvel Mogollón

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503100-00756956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BEA30328CAB42DBC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

COPIA DE ACTAS DE SUSPENSION, REINICIO, APROBACION APU NO PREVISTOS, MODIFICACION DE CANTIDADES (SI APLICA)

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA DEL ACTA	FEBRERO 14 DEL 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE GOBIRNO
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO TOTAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	N/A.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

OBSERVACIONES:
Información soporte consignada en acta de reunión 14 de febrero del 2023 adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Especiales, se reunieron los suscritos a saber: **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES** – Secretaria De Gobierno Ordenadora del Gasto - **ING FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR**, Asesor de proyectos - Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de suspender el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **14 DE FEBRERO DEL 2023**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta, hasta superar las circunstancias que originaron la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
Supervisor
Asesor de Proyectos Especiales

TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES
Secretaria De Gobierno
Ordenadora del Gasto

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

PROYECTÓ: ING WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA – PROFESIONAL CONTRATADO

REVISÓ: VIVIAN CAMILA CHACÓN – ABOGADO EXTERNA SG

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

FECHA DEL ACTA	NOVIEMBRE 03 DE 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 AGOSTO 31 DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217 - 6
REPRESENTANTE	FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C. o N.I.T.	1.090.407.083 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	$22.982.010.588,00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DIESISIETE MESES (17) - PRÓRROGA
GARANTIAS	NB–100176880
FECHA DE APROBACIÓN	
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR** Enero 01 de 2022
INTERVENTOR **(Externo)**	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	FEBRERO 14 DE 2023

En San José de Cúcuta, en las oficinas de secretaria de gobierno, se reunieron los suscritos a saber **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES**, Ordenador del Gasto, **ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR**, Supervisor, **LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA** representante legal **UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD** Interventor (Externo) y **FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA** representante legal **UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato No. LP-SG-01362-2021 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA
OCO-CCC
Contratista

ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
Supervisor

ING. LIDJA SHIRLEY PARRA GARCÍA
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD
Interventoría

TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES
Ordenador del Gasto

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

Proyectó: ING. WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA – APOYO A LA SUPERVISIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

FECHA DEL ACTA	DICIEMBRE 26 DEL 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

Y REINICIACIÓN	2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OBSERVACIONES:
Información soporte consignada en acta de reunión 26 de diciembre del 2024 adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Espaciales, se reunieron los suscritos a saber: **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de suspender el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **26 DE DICIEMBRE DEL 2023**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta, hasta superar las circunstancias que originaron la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo*

PROYECTÓ: ING WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA – PROFESIONAL CONTRATADO

Vo Bo: GEORGE QUINTERO – SECRETARIA SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 02

FECHA DEL ACTA	ENERO 07 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
GARANTIAS	NB-100176880
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Especiales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE QUINTERO,** ordenador del gasto. **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato **No. LP-SG-01362-2021** a partir de la fecha de suscripción de la

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 02

presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión el día 26 de diciembre de 2024.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

GEORGE QUINTERO
Ordenador del Gasto
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03

FECHA DEL ACTA	FEBRERO 24 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CUCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03

Y REINICIACIÓN	2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ACTA DE REINICIO No 2 DEL 07 DE ENERO DE 2025

OBSERVACIONES:
Información soporte consignada en acta de reunión 24 de febrero del 2025 adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Espaciales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE EDINSON QUINTERO MEDINA,** ordenador del gasto, **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de suspender por un termino de 4 meses el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **24 DE FEBRERO DEL 2025**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta, hasta superar las circunstancias que originaron la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

CR (RP) GEORGE EDINSON QUINTERO M
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: Toda suspensión ~~y reiniciación que afecte el contrato~~ debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 03

FECHA DEL ACTA	OCTUBRE 10 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
GARANTIAS	NB-100176880
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ACTA DE REINICIO No 2 DEL 07 DE ENERO DE 2025. ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 03

	ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No 3 DEL 24 JUNIO DE 2025 ACTA DE PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 3 DE 25 AGOSTO DEL 2025 ACTA DE PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No 3 DE 25 SEPTIEMBRE DEL 2025

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Especiales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE QUINTERO,** ordenador del gasto. **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato **No. LP-SG-01362-2021** a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión el día 24 de febrero del 2025.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

GEORGE QUINTERO
Ordenador del Gasto
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA MANIFESTANDO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA EL COBRO DE ACTA PARCIAL

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA E INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LAPARADA OCO – CCC

INFORME DE OBRA PARA PARCIAL No.13

CONTRATO DE OBRA
LP-SG-01362-2021

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LAPARADA OCO-CCC
NIT: 901514217-6
NELSON YOEL PARADA REYES R/L.

INTERVENTOR
UNION TEMPORAL INTER-SEGURIDAD
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA R/L.

OBJETO DEL CONTRATO
"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)."

PERIODO
16 DE ABRIL DE 2026 AL 24 DE MAYO DEL 2026

CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 7
1.3 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 8
1.4 JUSTIFICACIÓN 8
2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL 9
2.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA 9
2.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 10
3 OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO 15
4 DESARROLLO DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO 19

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Condiciones del Contrato de Obra 9
Tabla 2 Pólizas suscripción del contrato 10
Tabla 3 Pólizas acta de inicio 10
Tabla 4 Pólizas Otrosí prorroga No.1 11
Tabla 5 Pólizas suspensión No.1 y reinicio No. 1 11
Tabla 6 Pólizas Otrosí Adicional No. 1 y prorroga No.2 12
Tabla 7 Pólizas suspensión No.2 y reinicio No. 2 12
Tabla 8 Pólizas suspensión No.3 y reinicio No. 3 13
Tabla 9 Pólizas Otrosí adicional No.2 y prorroga No.3 13
Tabla 10 Pólizas Otrosí adicional No.3 y prorroga No.4 14
Tabla 10. Obras ejecutadas durante el periodo de cobro 15

LISTA DE IMÁGENES

Ilustración 1 - Localización del proyecto. 6
Ilustración 2 Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. 19
Ilustración 3 Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. 19
Ilustración 4 Filos y dilataciones. 20
Ilustración 5 Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. 20
Ilustración 6 Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. 21
Ilustración 7 Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. 21
Ilustración 8 Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. 22
Ilustración 9 Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. 22
Ilustración 10 Sum./inst. Tubería PVC - Presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. 23
Ilustración 11 Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. 23
Ilustración 12 Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. 24
Ilustración 13 Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. 24
Ilustración 14 Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. 25
Ilustración 15 Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. 25
Ilustración 16 Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. 26
Ilustración 17 Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. 26
Ilustración 18 Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. 27
Ilustración 19 Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. 27
Ilustración 20 Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm. 28
Ilustración 21 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg. 28
Ilustración 22 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg. 29
Ilustración 23 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg. 29
Ilustración 24 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg. 30
Ilustración 25 Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. 30
Ilustración 26 Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI. 31
Ilustración 27 Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. 31
Ilustración 28 Salida de toma común. 32
Ilustración 29 Salida de toma GFCI. 32
Ilustración 30 Salida de toma regulado color Naranja. 33
Ilustración 31 Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción. 33
Ilustración 32 Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico. 34
Ilustración 33 Rejillas para cunetas pluviales. 34
Ilustración 34 PATOLOGIA_Excavación manual. 35
Ilustración 35 PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 35
Ilustración 36 PATOLOGIA_Acero de refuerzo. 36
Ilustración 37 PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. 36
Ilustración 38 PATOLOGIA_Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 37
Ilustración 39 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 37
Ilustración 40 PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg. 38
Ilustración 41 PATOLOGIA_Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg. 38
Ilustración 42 PATOLOGIA_Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. 39
Ilustración 43 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg. 39
Ilustración 44 PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación. 40

Ilustración 45 PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales. 40
Ilustración 46 PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). 41
Ilustración 47 PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. 41
Ilustración 48 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 42
Ilustración 49 PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. 42
Ilustración 50 PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales. (21,46 m²). 43
Ilustración 51 PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 43
Ilustración 52 PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 44
Ilustración 53 PATOLOGIA_Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m. 44
Ilustración 54 PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. 45
Ilustración 55 PATOLOGIA_Pañete liso para muro en mortero 1:4. 45
Ilustración 56 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. 46
Ilustración 57 PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. 46
Ilustración 58 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg. 47
Ilustración 59 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg. 47
Ilustración 60 PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación. 48
Ilustración 61 PATOLOGIA_Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación. 48

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto de ejecución denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)" Se encuentra localizado en el municipio de Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander en el nororiente de Colombia, en zona fronteriza con Venezuela, sobre la Ruta Nacional 7010, a 840 m del Puente Internacional Simón Bolivar, con coordenadas Geográficas 7°49'22.09"N y 72° 27'24.52"O.

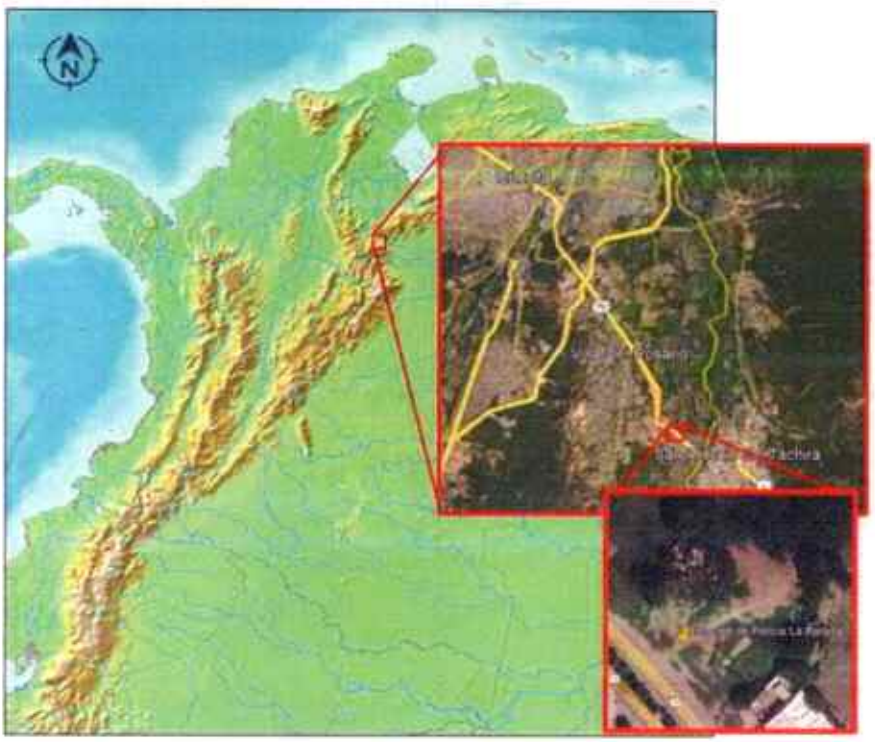


Ilustración 1 - Localización del proyecto.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Villa del Rosario es un municipio fronterizo del Departamento Norte de Santander, está ubicado en la subregión Oriental, con una población aproximada de 111.254 Habitantes (DANE,2020), de los cuales la población urbana es el 97.1%, y la gran mayoría de la población pertenece a los estratos I y II.

La seguridad ciudadana ha adquirido una importancia creciente en las capitales de los departamentos como respuesta al temor creciente de la población frente a los actuales niveles inéditos de delincuencia, el incremento constante de violencias en el ámbito privado y al impacto de temas de carácter social en la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos; violaciones de derechos humanos, amenazas al medio ambiente, problemas de convivencia, accesibilidad a los servicios básicos, ineficiente provisión de servicios sociales y demás inseguridades económicas y sociales que afectan el pleno desarrollo de los individuos. Es por lo tanto el principal tema del debate público y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, referenciando los siguientes datos estadísticos Secuestros 13 de personas a 2017, Tasa de homicidios 47.5, Tasa de hurtos 179 2017, Tasa de violencia intrafamiliar 124.1.

Durante el año 2015 la dirección general de la policía nacional de Colombia y el comando de policía metropolitana de Cúcuta, han ordenado el apoyo de manera temporal, permanente efectiva y de impacto jurisdicción del Municipio de Villa del Rosario que por alguna circunstancia se ha dificultado el cumplimiento de los objetivos trazados en su lucha

En el sector la parada municipio de villa del rosario, se exterioriza por la presencia de bandas criminales quienes por la situación de zona fronteriza del municipio con la república bolivariana de Venezuela y en su afán de controlar la actividad ilicita, del contrabando, transporte ilegal, extensión, el hurto en todas sus modalidades y el tráfico de estupefacientes, generan los homicidios y las lesiones personales, en esta zona de frontera se tiene injerencia y control de los grupos de delincuencia común organizada- GDCO y del bloque CARLOS GERMAN VELAZCO VILLAMIZAR del ELN.

Los hechos se estarían presentando por el control de los pasos no habilitados entre la zona de frontera de Colombia y Venezuela en las trochas conocidas como el Tomito, La Playita y Los Mangos, con el propósito de obtener un control que permita fortalecer las rentas criminales de las estructuras.

En las zona limítrofe o fronteriza, se encuentran ubicadas las trochas que comunican con el vecino país, las cuales son utilizadas para el transporte ilegal de mercancía e hidrocarburos, asimismo, esto es aprovechado por grupos al margen de la Ley para el cobro de cuotas extorsivas, en los 31 kilómetros de frontera, que están siendo disputados por grupos de delincuencia común organizada.

1.3 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

Por lo anterior, el Departamento Norte de Santander a través de la Secretaría de Gobierno, está interesada en contratar por el sistema de precios unitarios fijos, por medio del proceso de Licitación Pública, las obras para el proceso de ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

1.4 JUSTIFICACIÓN

En virtud de lo consagrado por el artículo 2 la ley 1150 de 2007 y lo adicionado por el numeral 1 del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, "(...) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo" No tratándose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el mercado, es conclusión que no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de selección de contratación directa señaladas en el artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007.

No siendo aplicable las causales establecidas en artículo 2, numeral 2, literal a, c, d, e, f, g, h, i, de la ley 1150 de 2007, por tratarse de un contrato con objeto complejo como lo es la obra pública, es consecuencia, que la escogencia del contratista debe efectuarse bien por la modalidad de selección a aplicar es la de LICITACIÓN PÚBLICA, de acuerdo con lo consagrado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, decreto 1082 de 2015 y la ley 1882 de 2018; de acuerdo con la cuantía del contrato y los parámetros legales para determinar la menor cuantía.

Teniendo como parámetro el monto del presupuesto LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER para la vigencia 2021, así como el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, el presupuesto oficial se establece en la suma de VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 23.057.009.317,00), en el cual se encuentran incluidos todos los costos de diseños y obras.

Que, el Gobernador del Departamento Norte de Santander, mediante decreto No. 00252 del 11 de febrero de 2020 del departamento, delegó a los secretarios de despacho de la administración Departamental la competencia de expedir los actos administrativos y en general, ejecutar la actividad precontractual, contractual y postcontractual desde la generación de la necesidad, elaboración estudios previos, convocatoria, suscripción de contratos y acta e inicio, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la normatividad contractual vigente y el Manual de Contratación.

2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC
C.C. o N.I.T.	901514217-6
REPRESENTANTE	NELSON YOEL PARADA REYES
CEDULA	1090407083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)"
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2246 del 06 de Julio del 2021 No. 00 2247 del 06 de Julio del 2021 No. 00 001371 del 12 de Abril del 2024 No. 00 005031 del 15 de Octubre del 2025 No. 00 001367 del 12 de Enero del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3572 del 31 de Agosto del 2021 No. 00 001232 del 15 de Abril del 2024 No. 00 005393 del 31 de Octubre del 2025 No. 00 002851 del 11 de Febrero del 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($22.982.010.588,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.1	($11.490.240.893,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.2	($2.583.294.926,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.3	($2.838.905.865,00) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO	($39.894.452.272,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	DIECISIETE (17) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL NORORIENTE DE COLOMBIA, EN ZONA FRONTERIZA CON VENEZUELA, SOBRE LA RUTA NACIONAL 7010, A 840 M DEL PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 7°49'22.09"N Y 72°27'24.52"O
FECHA DE INICIO	19/10/2021
PRORROGA	No.1 del 29 de Diciembre del 2022 (DIECISIETE (17) MESES) No.2 del 15 de Abril del 2024 (DOCE (12) MESES) No. 3 del 31 de Octubre del 2025 (DOS (2) MESES) No. 4 del 11 de Febrero del 2026 (DOS (2) MESES)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/05/2026
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD
REPRESENTANTE	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO BRAHIM

Tabla 1. Condiciones del Contrato de Obra

2.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 0 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 08/09/2021	Cumplimiento	$ 2,298,201,059.00	08/09/2021 a 08/05/2023
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.00	08/09/2021 a 30/12/2025
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.00	30/12/2022 a 30/12/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 0 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 08/09/2021	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.00	08/09/2021 a 30/12/2022
	Patronal	$ 344,730,158.00	08/09/2021 a 30/12/2022
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.00	08/09/2021 a 30/12/2022
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.00	08/09/2021 a 30/12/2022

Tabla 2 Pólizas suscripción del contrato

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 4 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 03/11/2021	Cumplimiento	$ 2,298,201,059.00	19/10/2021 a 18/06/2023
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.00	19/10/2021 a 09/02/2026
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.00	09/02/2023 a 09/02/2028
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 4 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 03/11/2021	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.00	19/10/2021 a 09/02/2023
	Patronal	$ 344,730,158.00	19/10/2021 a 09/02/2023
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.00	19/10/2021 a 09/02/2023
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.00	19/10/2021 a 09/02/2023

Tabla 3 Pólizas acta de inicio

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 5 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 24/11/2023	Cumplimiento	$ 2,298,201,058.80	29/12/2022 a 01/10/2024
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.20	29/12/2022 a 31/05/2027
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.40	31/05/2024 a 31/05/2029
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 5 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 24/11/2023	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.40	19/10/2021 a 31/05/2024
	Patronal	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 31/05/2024
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 31/05/2024
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 31/05/2024

Tabla 4 Pólizas Otrosí prorroga No.1

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 6 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 28/11/2023	Cumplimiento	$ 2,298,201,058.80	03/11/2023 a 17/06/2025
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.20	03/11/2023 a 17/02/2028
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.40	17/02/2025 a 17/02/2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 6 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 28/11/2023	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.40	19/10/2021 a 17/02/2025
	Patronal	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 17/02/2025
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 17/02/2025
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 17/02/2025

Tabla 5 Pólizas suspensión No.1 y reinicio No. 1

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 7 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/04/2024	Cumplimiento	$ 3,447,225,148.10	16/04/2024 a 30/09/2025
	Prestaciones Sociales	$ 5,170,837,722.15	16/04/2024 a 31/05/2028
	Estabilidad de la Obra	$ 10,341,675,444.30	31/05/2025 a 31/05/2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 7 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/04/2024	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 31/05/2025
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/05/2025
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/05/2025
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/05/2025

Tabla 6 Pólizas Otrosí Adicional No. 1 y prorroga No.2

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 9 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/01/2025	Cumplimiento	$ 3,447,225,148.10	26/12/2024 a 12/10/2025
	Prestaciones Sociales	$ 5,170,837,722.15	26/12/2024 a 12/06/2028
	Estabilidad de la Obra	$ 10,341,675,444.30	12/06/2025 a 12/06/2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 9 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/01/2025	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 12/06/2025
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 12/06/2025
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 12/06/2025
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 12/06/2025

Tabla 7 Pólizas suspensión No.2 y reinicio No. 2

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 11 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 21/10/2025	Cumplimiento	$ 3,447,225,148.10	10/10/2025 a 26/01/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,170,837,722.15	10/10/2025 a 26/05/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 10,341,675,444.30	26/01/2026 a 26/01/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 11 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 21/10/2025	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 26/01/2026
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 26/01/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 26/01/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 26/01/2026

Tabla 8 Pólizas suspensión No.3 y reinicio No. 3

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 13 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 13/11/2025	Cumplimiento	$ 3,705,554,640.70	10/10/2025 a 31/03/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,558,331,961.05	10/10/2025 a 31/07/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 11,116,663,922.10	31/03/2026 a 31/03/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 12 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 05/11/2025	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 31/03/2026
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/03/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/03/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/03/2026

Tabla 9 Pólizas Otrosí adicional No.2 y prorroga No.3

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 14 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 18/02/2026	Cumplimiento	$ 3,989,445,227.20	19/10/2021 a 30/09/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,984,167,840.80	19/10/2025 a 31/05/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 11,968,335,681.60	31/05/2026 a 31/05/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 12 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 18/02/2026	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,994,722,613.60	19/10/2021 a 31/05/2026
	Patronal	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/05/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/05/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/05/2026

Tabla 10 Pólizas Otrosí adicional No.3 y prorroga No.4

3 OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO

Tabla 11. Obras ejecutadas durante el periodo de cobro

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.
2	***MOVIMIENTO DE TIERRAS***				
2,005	Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente.	m³	10,12	$ 131.419	$ 1.329.960
2,005AP	Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. Incremento de precios 2025	m³	10,12	$ 42.500	$ 430.100
2,006	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³	138,71	$ 58.660	$ 8.136.729
2,006AP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. Incremento de precios 2025	m³	138,71	$ 10.741	$ 1.489.884
7	***PISOS Y MAMPOSTERIA***				
7,004	Filos y dilataciones.	m	1531,12	$ 10.759	$ 16.473.320
7,004AP	Filos y dilataciones. Incremento de precios 2025	m	1531,12	$ 1.958	$ 2.997.933
7,008	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.	m	113,61	$ 58.094	$ 6.600.059
7,008AP	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. Incremento de precios 2025	m	113,61	$ 6.369	$ 723.582
17	***SISTEMA DE ACUEDUCTO***				
17,003	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	8,86	$ 81.249	$ 719.866
17,003AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	8,86	$ 8.057	$ 71.385
17,004	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	20,65	$ 52.869	$ 1.091.744
17,004AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	20,65	$ 7.326	$ 151.262
20	***INSTALACIONES HIDRÁULICAS***				
20,001	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	6,20	$ 58.283	$ 361.354
20,001AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	6,20	$ 6.715	$ 41.633
20,002	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	19,35	$ 34.142	$ 660.648
20,002AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	19,35	$ 4.685	$ 90.654
20,003	Sum./inst. Tubería PVC - Presion RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	24,61	$ 28.698	$ 706.258
20,003AP	Sum./inst. Tubería PVC - Presion RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	24,61	$ 4.685	$ 115.298
20,004	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	27,38	$ 36.501	$ 999.397
20,004AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	27,38	$ 4.685	$ 128.275
20,006	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.	und	72,00	$ 64.121	$ 4.616.712

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.
20,006AP	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. Incremento de precios 2025	und	72,00	$ 7.460	$ 537.120
20,008	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.	und	15,00	$ 334.210	$ 5.013.150
20,008AP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	15,00	$ 40.289	$ 604.335
20,011	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.	und	12,00	$ 378.640	$ 4.543.680
20,011AP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	12,00	$ 40.289	$ 483.468
20,012	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.	und	1,00	$ 396.238	$ 396.238
20,012AP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 40.289	$ 40.289
21	***INSTALACIONES SANITARIAS***				
21,002	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg.	m	13,17	$ 76.783	$ 1.011.232
21,002AP	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg. Incremento de precios 2025	m	13,17	$ 8.207	$ 108.066
21,006	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und	5,00	$ 215.982	$ 1.079.910
21,006AP	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria. Incremento de precios 2025	und	5,00	$ 16.057	$ 80.285
22	***INSTALACIONES PLUVIALES***				
22,001	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg.	m	7,55	$ 42.137	$ 318.134
22,001AP	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. Incremento de precios 2025	m	7,55	$ 4.477	$ 33.801
22,002	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.	m	20,53	$ 55.955	$ 1.148.756
22,002AP	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. Incremento de precios 2025	m	20,53	$ 5.036	$ 103.389
22,006	Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm.	m	26,44	$ 200.371	$ 5.297.809
22,006AP	Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm. Incremento de precios 2025	m	26,44	$ 14.771	$ 390.545
26	***DUCTERÍA ELECTRICA***				
26,001	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg.	m	753,92	$ 85.287	$ 64.299.575
26,001AP	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg. Incremento de precios 2025	m	753,92	$ 6.156	$ 4.641.132
26,002	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg.	m	181,72	$ 54.318	$ 9.870.667
26,002AP	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg. Incremento de precios 2025	m	181,72	$ 6.156	$ 1.118.668
26,003	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg	m	178,32	$ 52.031	$ 9.278.168
26,003AP	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg Incremento de precios 2025	m	178,32	$ 6.156	$ 1.097.738
26,005	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg.	m	91,95	$ 31.711	$ 2.915.827
26,005AP	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	91,95	$ 5.682	$ 522.460
26,009	Sum./inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.	m	605,30	$ 49.593	$ 30.018.643
26,009AP	Sum./inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	605,30	$ 5.682	$ 3.439.314
28	***RED DE BAJA TENSION***				
28,011	Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI.	und	1,00	$ 241.482	$ 241.482

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.
28,011AP	Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 19.185	$ 19.185
29	***REDES INTERNAS Y URBANISMO***				
29,001	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.	und	337,00	$ 135.609	$ 45.700.233
29,001AP	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Incremento de precios 2025	und	337,00	$ 10.072	$ 3.394.264
29,012	Salida de toma común.	und	79,57	$ 144.850	$ 11.525.714
29,012AP	Salida de toma común. Incremento de precios 2025	und	79,57	$ 10.889	$ 866.438
29,013	Salida de toma GFCI.	und	13,00	$ 263.975	$ 3.431.675
29,013AP	Salida de toma GFCI. Incremento de precios 2025	und	13,00	$ 10.889	$ 141.557
29,014	Salida de toma regulado color Naranja.	und	36,00	$ 179.063	$ 6.446.268
29,014AP	Salida de toma regulado color Naranja. Incremento de precios 2025	und	36,00	$ 10.889	$ 392.004
41	***ITEMS NO PREVISTOS***				
41,001	Sum./Inst. valvulas admisora y expulsora de aire doble accion	und	12,00	$ 208.453	$ 2.501.436
41,016	Caja de inspección en mamposteria 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico	und	20,00	$ 579.043	$ 11.580.860
41,020	Rejillas para cunetas pluviales	m²	36,20	$ 1.214.646	$ 43.970.185

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.
2,0	***BLOQUE B***				
2,1	***PRELIMINARES***				
2.1.10	Excavación manual.	m³	0,10	$ 108.087	$ 10.809
2,2	***ESTRUCTURAS EN CONCRETO***				
2.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	0,84	$ 1.482.151	$ 1.245.007
2.2.4	Acero de refuerzo.	kg	282,88	$ 9.983	$ 2.823.991
2,4	***MAMPOSTERIA Y PAÑETES***				
2.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²	16,44	$ 133.510	$ 2.194.904
2.4.3	Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	5,72	$ 75.412	$ 431.357
2.4.5	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	42,29	$ 104.852	$ 4.434.191
2.4.6 NP	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg.	m³	1,47	$ 1.761.098	$ 2.588.814
2,6	***SANITARIO***				
2.6.2 NP	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.	m	9,60	$ 51.967	$ 498.883
2.6.3 NP	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und	4,00	$ 156.887	$ 627.548
2,7	***ELECTRICO***				
2.7.1 NP	Sum./inst. tuberia PVC-conduit ø 3/4plg.	m	42,00	$ 34.761	$ 1.459.962
2.7.2 NP	Salida de toma común. Reparación	und	7,00	$ 81.040	$ 567.280
3,0	***BLOQUE C***				
3,1	***PRELIMINARES***				
3.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m³	9,20	$ 35.714	$ 328.569
3,4	***MAMPOSTERIA Y PAÑETES***				
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²	27,20	$ 322.418	$ 8.769.770
3.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	8,80	$ 104.852	$ 922.698
3,5	***IMPERMEABILIZACIONES***				

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.
3.5.1	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m³	195,36	$ 69.950	$ 13.665.432
5,0	*BLOQUE E*				
5,2	*ESTRUCTURAS EN CONCRETO*				
5.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	0,44	$ 1.482.151	$ 652.146
5.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	0,15	$ 1.761.098	$ 264.165
5,4	*MAMPOSTERIA Y PAÑETES*				
5.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²	17,48	$ 133.510	$ 2.333.755
5.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²	7,09	$ 322.418	$ 2.285.943
5.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²	59,22	$ 39.343	$ 2.329.892
5.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa, incluye acero de refuerzo.	m	110,03	$ 104.852	$ 11.536.865
5,5	*IMPERMEABILIZACIONES*				
5.5.1	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m³	121,60	$ 69.950	$ 8.505.920
5,9	*ELECTRICO*				
5.9.1	Sum./inst. tubería PVC-conduit ø 3/4plg.	m	19,05	$ 34.761	$ 662.197
5.9.2	Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.	m	60,00	$ 53.975	$ 3.238.500
5.9.3 NP	Salida de toma común.Reparación.	und	8,00	$ 81.040	$ 648.320
5.9.4 NP	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.Reparación.	und	14,00	$ 70.739	$ 990.346

De acuerdo con lo indicado en la tabla 11, las actividades ejecutadas en el acta parcial No.13 corresponden al 1.33 %, lo cual es equivalente a la suma de **QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. $529.537.598** A la fecha de la presente acta se tiene un avance acumulado de 62.15% equivalente **VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE. $24.795.806.713** Teniendo un tiempo de obra transcurrido al 24 de mayo del 2026 de 99.52% del plazo contractual.

4 DESARROLLO DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026) hasta el día veinticuatro (24) de mayo del dos mil veintiséis (2026).

2.005 y 2.005AP) Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. (10,12 m³). Se realizan actividades de Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. En estación de bombeo y en bloque A de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 2 Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente.

2.006 y 2.006AP) Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. (138,71 m³). Se realizan actividades de Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. Para urbanismo interno de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 3 Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.

7.004 y 7.004AP) Filos y dilataciones. (1531,12 m). Se realizan actividades de filos y dilataciones en el bloque A,D, y E de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas dentro de los detalles del proyecto.



Ilustración 4 Filos y dilataciones.

7.008 y 7.008AP) Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. (113,61 m). Se realizan actividades de Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo, en el bloque A,D y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 5 Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.

17.003 y 17.003AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (8,86 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios, en el bloque D y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 6 Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

17.004 y 17.004AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. (20,65 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios, en el bloque A, D y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 7 Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.001 y 21.001AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (6,20 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios en el tanque de acuerdo con directrices, en los bloques A, D y E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 8 Sum. /inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.002 y 20.002AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. (19,35 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios en el bloque B y F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 9 Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.003 y 20.003AP) Sum./inst. Tubería PVC - Presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (24,61 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. y accesorios en el bloque D en el área de jardines de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 10 Sum./inst. Tubería PVC - Presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.004 y 20.004AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. (27,38 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios en el bloque A y D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 11 Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.006 y 20.006AP) Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. (72,00 und). Se realizan actividades de Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg en el bloque A, B, C, D, E, F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 12 Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.

20.008 y 20.008AP) Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. (15,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. En el bloque A, B, C, D, E y F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

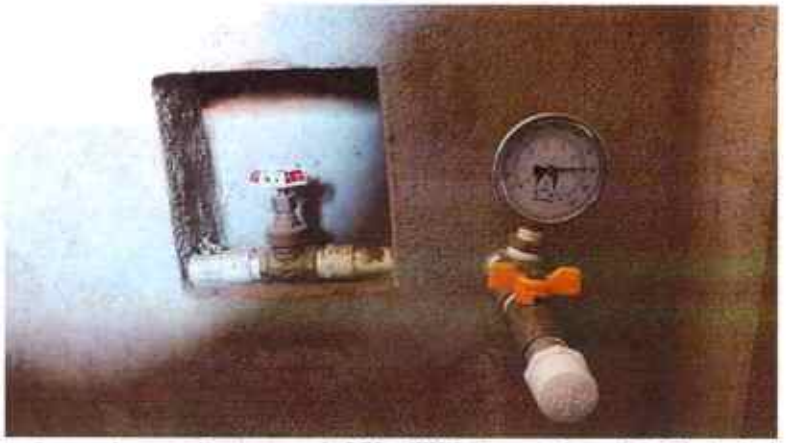


Ilustración 13 Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.

20.011 y 20.011AP) Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. (12,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro en el bloque A, B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 14 Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.

20.012 y 20.012AP) Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. (1,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro en el bloque F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 15 Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.

21.002 y 21.002AP) Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. (13,17 m). Se realizan actividades Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria en el bloque A de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 16 Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.

21.006 y 21.006AP) Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. (5,00 und). Se realizan actividades Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria en el bloque A de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

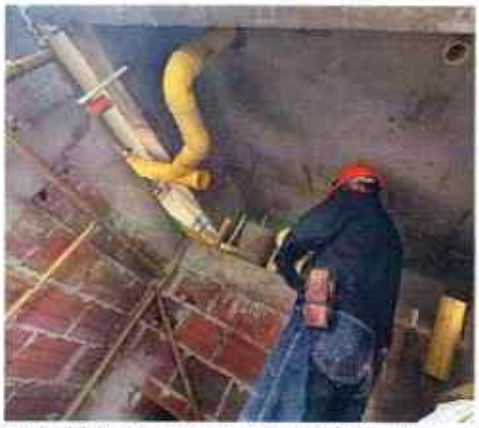


Ilustración 17 Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.

22.001 y 22.001AP) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. (7,55 m). Se realizan actividades de línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg en los bloques C y D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 18 Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg

22.002 y 22.002AP) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. (20,53 m). Se realizan Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg en el bloque F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 19 Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.

22.006 y 22.006 AP) Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm. (26,44 und). Se realizan bajantes de desagüe pluvial PVC Ø 4plg en la zona externa para un cárcamo - canal de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 20 Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm.

26.001 y 26.001AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg. (753,92 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg en la zona externa media tensión, voz y datos, eléctrico baja tensión y detección incendios de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 21 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg.

26.002 y 26.002AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg. (181,72 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg en la zona eléctrico de baja tensión y redes de gas de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 22 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg.

26.003 y 26.003AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg. (178,32 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg en la zona externa de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 23 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg.

26.005 y 26.005AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg. (91,95 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg en los bloques A, B, C, D, E, F de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 24 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg.

26.009 y 26.009AP) Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. (605,30 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg en el bloque D de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 25 Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.

28.011 y 28.011AP) Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI. (1,00 und). Se realizan actividades de Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI en el tanque de almacenamiento de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 26 Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI.

29.001 y 29.001AP) Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. (337,00 und). Se realizan actividades de Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF en los bloques A, D, E y F de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 27 Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.

29.012 y 29.012AP) Salida de toma común. (79,57 und). Se realizan actividades de Salida de toma común en los bloques B y D de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 28 Salida de toma común.

29.013 y 29.013AP) Salida de toma GFCI. (13,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma GFCI en los bloques B y D de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 29 Salida de toma GFCI.

29.014 y 29.014AP) Salida de toma regulado color Naranja. (36,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma regulado color Naranja en los bloques A y B de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 30 Salida de toma regulado color Naranja.

41.001) Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción (12,00 und). Se realizan actividades de Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción en el bloque D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 31 Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción

41.016) Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico. (20.00 und). Se realizan actividades de Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico en el bloque E y redes de servicio de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 32 Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico.

41.020) Rejillas para cunetas pluviales (36.20 m²). Se realizan actividades de Rejillas para cunetas pluviales en el bloque A de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 33 Rejillas para cunetas pluviales

- 2.1.10) PATOLOGIA_Excavación manual. (0,10 m³). Se realizan actividades de Excavación manual en el bloque B según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.



Ilustración 34 PATOLOGIA_Excavación manual.

- 2.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,84 m³). Se realizan actividades de Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg en el bloque B según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.



Ilustración 35 PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.

- 2.2.4) PATOLOGIA Acero de refuerzo. (282.88 kg). Se realizan actividades de suministro e instalación de acero de refuerzo en columnetas en el bloque B según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.



Ilustración 36 PATOLOGIA_Acero de refuerzo.

-2.4.1) PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (16,44 m²). Se realizan actividades de Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 37 PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.

-2.4.3) PATOLOGIA Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (5.72 m). Se realizan actividades de Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 38 PATOLOGIA_Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-2.4.5) PATOLOGIA Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (42.29 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 39 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-2.4.6 NP) PATOLOGIA Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg. (1.47 m³). Se realizan actividades de Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 40 PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg

-2.6.2 NP) PATOLOGIA Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg. (9,60 m). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 41 PATOLOGIA_Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.

-2.6.3 NP) PATOLOGIA Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. (4,00 und). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 42 PATOLOGIA_Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria

-2.7.1 NP) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg. (42,00 m). Se realizan actividades de Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 43 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg

-2.7.2 NP) PATOLOGIA Salida de toma común. Reparación (7,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma común. Reparación, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 44 PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación

-3.1.3 NP) PATOLOGIA Demolicion de muros con elementos no estructurales. (9,20 m³). Se realizan actividades de Demolición de muros con elementos no estructurales, en el bloque C de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 45 PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales.

-3.3.3 NP) PATOLOGIA Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). (3,00 und). Se realizan actividades de puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 46 PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).

-3.4.2 NP) PATOLOGIA Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. (27,20 m³). Se realizan actividades de Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 47 PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.

-3.4.7 NP) PATOLOGIA Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (8,80 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 48 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-3.5.1 NP) PATOLOGIA Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. (195.36 m). Se realizan actividades de Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 49 PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.

-5.1.3) PATOLOGIA Demolicion de muros con elementos no estructurales. (21,46 m²). Se realizan actividades de Demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque E de acuerdo con las directrices propuestas en la patologia.



Ilustración 50 PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales. (21,46 m²).

-5.2.3) PATOLOGIA Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,44 m³). Se realizan actividades de concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg en el bloque E de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de diseño.



Ilustración 51 PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.

-5.2.7) PATOLOGIA Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,15 m³). Se realizan actividades de concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa en el bloque E según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.



Ilustración 52 PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg

-5.4.1) PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (17,48 m²). Se realizan actividades de instalación de mampostería en bloque No.4 con espesor de 0,10 m en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 53 PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m

-5.4.2) PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. (7,09 m²). Se realizan actividades de instalación de muro perimetral doble en ladrillo de obra común con espesor de 0,24 m en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 54 PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.

-5.4.4) PATOLOGIA_Pañete liso para muro en mortero 1:4. (59,22 m²). Se realizan actividades de dintel de 0,15x0,15 en concreto de 21Mpa en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 55 PATOLOGIA_Pañete liso para muro en mortero 1:4

-5.4.7) PATOLOGIA Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (110,03 m). Se realizan actividades columnetas en concreto de 21 Mpa con acero de refuerzo en el bloque E de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 56 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa.

-5.5.1) PATOLOGIA Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. (121,60 m²). Se realizan actividades de Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m para el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 57 PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.

-5.9.1) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg. (19,05 m). Se realizan actividades de Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 58 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg.

-5.9.2) PATOLOGIA Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg. (60,00 m). Se realizan actividades de Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 59 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.

-5.9.3 NP) PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación. (8,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma común. Reparación. en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 60 PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación.

-5.9.4 NP) PATOLOGIA_Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación. (14,00 und). Se realizan actividades de Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación. en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 61 PATOLOGIA_Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación.

R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LAPARADA OCO – CCC

INFORME CONTROL DE CALIDAD

16 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2026

CONTRATO No. LP-SG-01362-2021

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

UT. ESTACIÓN LAPARADA

PRESENTADO UT. ESTACIÓN LAPARADA

MAYO
2026

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3. LOCALIZACIÓN 7
4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 8

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

Lista de fotografías

Ilustración 1 - Ubicación del proyecto. 6
Ilustración 2 - Localización del proyecto. 7
Ilustración 3 - Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. 8
Ilustración 4 - Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. 8
Ilustración 5 - Filos y dilataciones. 9
Ilustración 6 - Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. 9
Ilustración 7 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. 10
Ilustración 8 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. 10
Ilustración 9 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. 11
Ilustración 10 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. 11
Ilustración 11 Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. 12
Ilustración 12 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. 12
Ilustración 13 Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. 13
Ilustración 14 Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. 13
Ilustración 15 Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. 14
Ilustración 16 Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. 14
Ilustración 17 Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. 15
Ilustración 18 Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. 15
Ilustración 19 Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. 16
Ilustración 20 Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. 16
Ilustración 21 Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm. 17
Ilustración 22 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg. 17
Ilustración 23 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg. 18
Ilustración 24 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg. 18
Ilustración 25 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg. 19
Ilustración 26 Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. 19
Ilustración 27 Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI. 20
Ilustración 28 Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF 20
Ilustración 29 Salida de toma común. 21
Ilustración 30 Salida de toma GFCI. 21
Ilustración 31 Salida de toma regulado color Naranja. 22
Ilustración 32 Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción 22
Ilustración 33 Caja de inspección en mamposteria 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico. 23

Ilustración 34 Rejillas para cunetas pluviales 23
Ilustración 35 PATOLOGIA_Excavación manual..... 24
Ilustración 36 PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 24
Ilustración 37 PATOLOGIA_Acero de refuerzo. 25
Ilustración 38 PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. 25
Ilustración 39 PATOLOGIA_Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 26
Ilustración 40 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo..... 26
Ilustración 41 PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg. 27
Ilustración 42 PATOLOGIA_Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg..... 27
Ilustración 43 PATOLOGIA_Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria..... 28
Ilustración 44 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-conduit ø 3/4plg. 28
Ilustración 45 PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación 29
Ilustración 46 PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales. 29
Ilustración 47 PATOLOGIA_Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). 30
Ilustración 48 PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. 30
Ilustración 49 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo..... 31
Ilustración 50 PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. 31
Ilustración 51 PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales. 32
Ilustración 52 PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 32
Ilustración 53 PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 33
Ilustración 54 PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. 33
Ilustración 55 PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. 34
Ilustración 56 PATOLOGIA_Pañete liso para muro en mortero 1:4. 34
Ilustración 57 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo..... 35
Ilustración 58 PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. 35
Ilustración 59 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg..... 36
Ilustración 60 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg. 36
Ilustración 61 PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación. 37
Ilustración 62 PATOLOGIA_Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación..... 37

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que ya se adelantan por parte del señor NELSON YOEL PARADA REYES quien actúa en función de contratista del contrato No. LP-SG-01362-2021 cuyo objeto es el "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

El presente informe describe las actividades ejecutadas durante el periodo del 16 de abril al 24 de mayo de 2026

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto tiene un área total aproximada de 8000 m2 y consta de varias edificaciones de uno y dos pisos, en las que se prestarán diferentes servicios a la población de oficiales de la Policía Nacional que la habitarán. Estas edificaciones son complementadas por un patio de formación y una zona de maniobras y parqueo. Se proyectan cinco edificaciones: el Bloque 1, un edificio de un piso donde funcionarán la zona técnica y zona segura de la estación. El Bloque A, un edificio de dos pisos que prestará atención a la comunidad, por lo que tendrá oficinas, una sala de crisis y un salón múltiple. El bloque B, funcionará como edificio recreativo para los oficiales que habiten la estación de policía; este edificio también se desarrolla en dos niveles. Por último, los Bloques C, D y E, de dos pisos de altura, contendrán dormitorios y un apartamento fiscal para el personal de la Policía de la estación.



Ilustración 1 - Ubicación del proyecto.

3. LOCALIZACIÓN

La estación base tipo C de la policía queda ubicada en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander en el nororiente de Colombia, en zona fronteriza con Venezuela, sobre la Ruta Nacional 7010, a 840 m del Puente Internacional Simón Bolívar, con coordenadas Geográficas 7°49'22.09"N y 72° 27'24.52"O. En la Figura se presenta la localización general del proyecto.

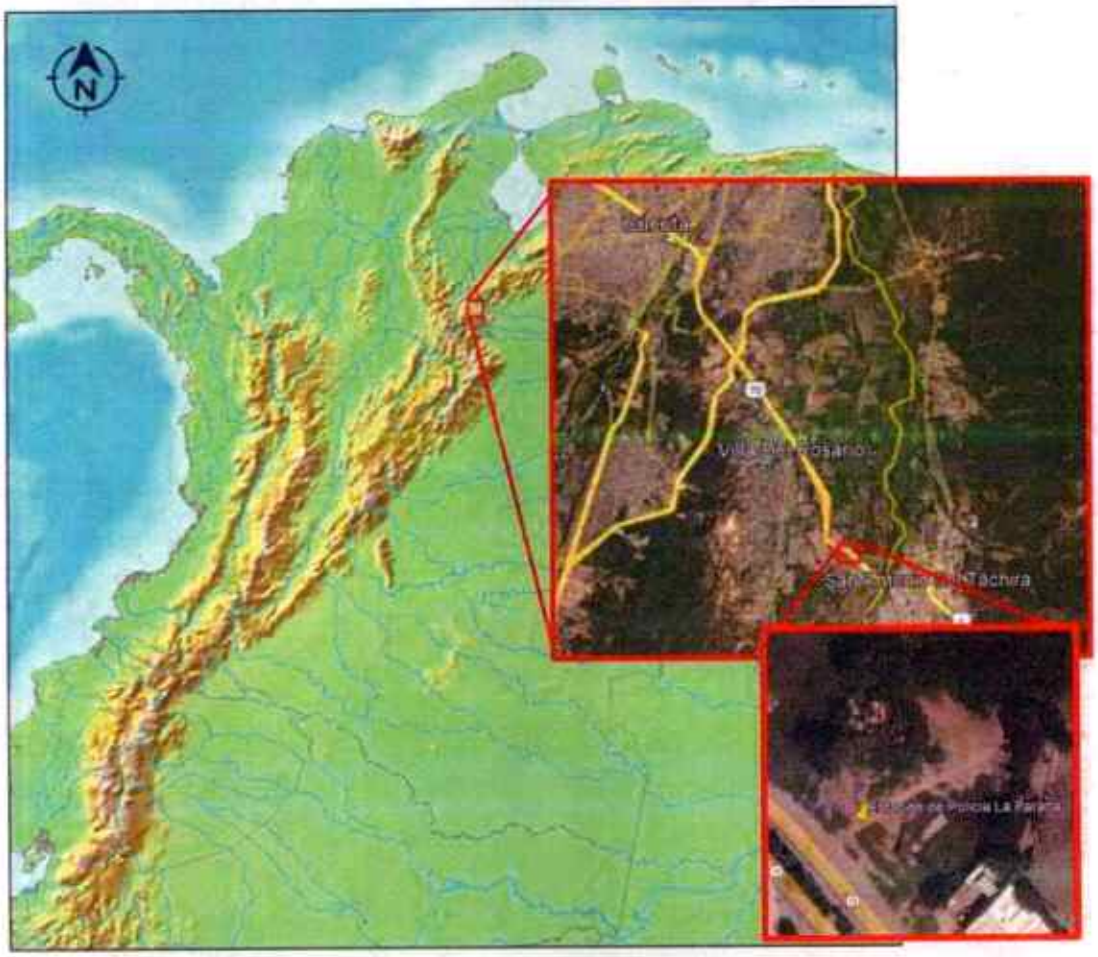


Ilustración 2 - Localización del proyecto.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

2.005 y 2.005AP) Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. (10,12 m³). Se realizan actividades de Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. En estación de bombeo y en bloque A de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 3 - Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente.

2.006 y 2.006AP) Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. (138,71 m³). Se realizan actividades de Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. Para urbanismo interno de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 4 - Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.

7.004 y 7.004AP) Filos y dilataciones. (1531.12 m). Se realizan actividades de filos y dilataciones en el bloque A,D, y E de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas dentro de los detalles del proyecto.

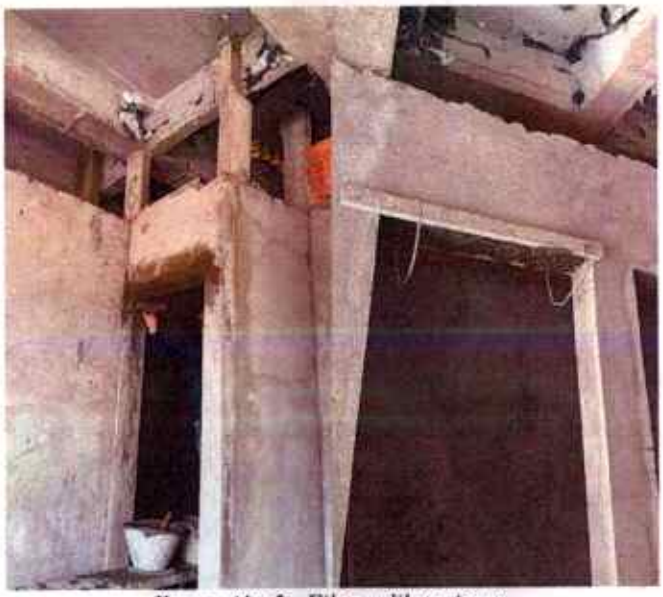


Ilustración 5 - Filos y dilataciones.

7.008 y 7.008AP) Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. (113,61 m). Se realizan actividades de Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo, en el bloque A,D y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 6 - Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.

17.003 y 17.003AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (8,86 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios, en el bloque D y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 7 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

17.004 y 17.004AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. (20,65 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios, en el bloque A, D y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 8 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.001 y 21.001AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (6,20 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios en el tanque de acuerdo con directrices, en los bloques A, D y E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 9 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.002 y 20.002AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. (19,35 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios en el bloque B y F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

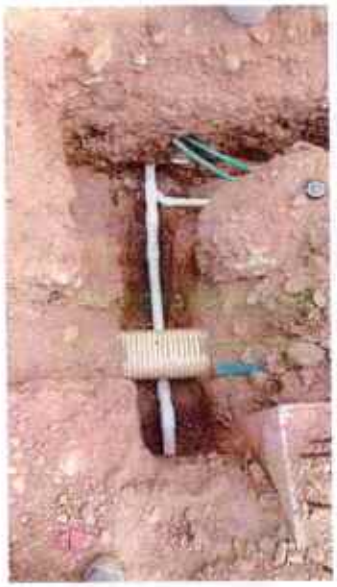


Ilustración 10 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.003 y 20.003AP) Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (24,61 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. y accesorios en el bloque D en el área de jardines de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 11 Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.004 y 20.004AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. (27,38 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios en el bloque A y D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 12 Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.006 y 20.006AP) Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. (72,00 und). Se realizan actividades de Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg en el bloque A, B, C, D, E, F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 13 Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.

20.008 y 20.008AP) Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. (15,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. En el bloque A, B, C, D, E y F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 14 Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.

20.011 y 20.011AP) Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. (12,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro en en el bloque A, B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 15 Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.

20.012 y 20.012AP) Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. (1,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro en el bloque F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 16 Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.

21.002 y 21.002AP) Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. (13,17 m). Se realizan actividades Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria en el bloque A de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 17 Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.

21.006 y 21.006AP) Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. (5,00 und). Se realizan actividades Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria en el bloque A de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 18 Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.

22.001 y 22.001AP) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. (7,55 m). Se realizan actividades de línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg en los bloques C y D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 19 Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg.

22.002 y 22.002AP) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. (20,53 m). Se realizan Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg en el bloque F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 20 Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.

22.006 y 22.006 AP) Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm. (26,44 und). Se realizan bajantes de desagüe pluvial PVC Ø 4plg en la zona externa para un cárcamo - canal de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 21 Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm.

26.001 y 26.001AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg. (753,92 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg en la zona externa media tensión, voz y datos, eléctrico baja tensión y detección incendios de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 22 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg.

26.002 y 26.002AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg. (181,72 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg en la zona eléctrico de baja tensión y redes de gas de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 23 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg.

26.003 y 26.003AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg. (178,32 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg en la zona externa de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 24 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg.

26.005 y 26.005AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg. (91,95 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg en los bloques A, B, C, D, E, F de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 25 Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg.

26.009 y 26.009AP) Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. (605,30 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg en el bloque D de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 26 Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.

28.011 y 28.011AP) Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI. (1,00 und). Se realizan actividades de Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI en el tanque de almacenamiento de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 27 Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI.

29.001 y 29.001AP) Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. (337,00 und). Se realizan actividades de Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF en los bloques A, D, E y F de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 28 Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.

29.012 y 29.012AP) Salida de toma común. (79,57 und). Se realizan actividades de Salida de toma común en los bloques B y D de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 29 Salida de toma común.

29.013 y 29.013AP) Salida de toma GFCI. (13,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma GFCI en los bloques B y D de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 30 Salida de toma GFCI.

29.014 y 29.014AP) Salida de toma regulado color Naranja. (36,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma regulado color Naranja en los bloques A y B de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 31 Salida de toma regulado color Naranja.

41.001) Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción (12,00 und). Se realizan actividades de Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción en el bloque D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 32 Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción

41.016) Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico. (20,00 und). Se realizan actividades de Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico en el bloque E y redes de servicio de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 33 Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico.

41.020) Rejillas para cunetas pluviales (36,20 m²). Se realizan actividades de Rejillas para cunetas pluviales en el bloque A de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 34 Rejillas para cunetas pluviales

- 2.1.10) PATOLOGIA_Excavación manual. (0,10 m³). Se realizan actividades de Excavación manual en el bloque B según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.



Ilustración 35 PATOLOGIA_Excavación manual.

- 2.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,84 m³). Se realizan actividades de Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg en el bloque B según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.

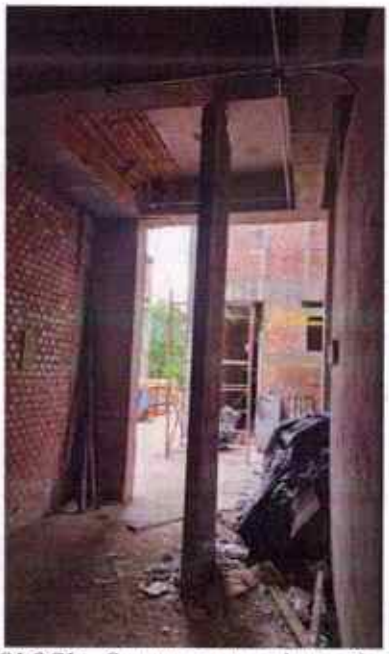


Ilustración 36 PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.

- 2.2.4) PATOLOGIA Acero de refuerzo. (282.88 kg). Se realizan actividades de suministro e instalación de acero de refuerzo en columnetas en el bloque B según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.



Ilustración 37 PATOLOGIA_Acero de refuerzo.

-2.4.1) PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (16,44 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 38 PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.

-2.4.3) PATOLOGIA Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (5,72 m). Se realizan actividades de Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patologia.



Ilustración 39 PATOLOGIA_Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-2.4.5) PATOLOGIA Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (42.29 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patologia.



Ilustración 40 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-2.4.6 NP) PATOLOGIA Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg. (1.47 m³). Se realizan actividades de Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 41 PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg.

-2.6.2 NP) PATOLOGIA Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg. (9,60 m). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 42 PATOLOGIA_Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.

-2.6.3 NP) PATOLOGIA Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria. (4,00 und). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

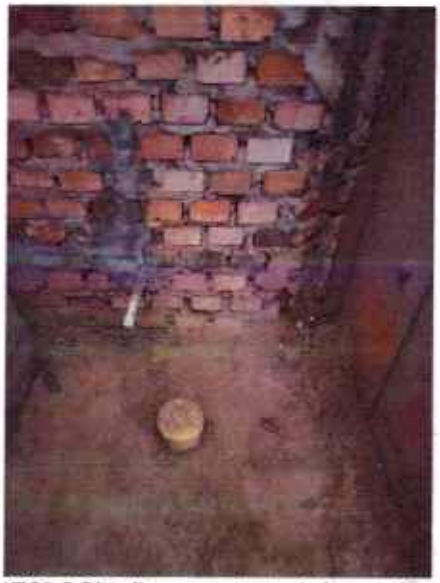


Ilustración 43 PATOLOGIA_Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.

-2.7.1 NP) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC-conduit ø 3/4plg. (42,00 m). Se realizan actividades de Sum./inst. tubería PVC-conduit ø 3/4plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 44 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-conduit ø 3/4plg.

-2.7.2 NP) PATOLOGIA Salida de toma común. Reparación (7,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma común. Reparación, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 45 PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación

-3.1.3 NP) PATOLOGIA Demolicion de muros con elementos no estructurales. (9,20 m²). Se realizan actividades de Demolición de muros con elementos no estructurales, en el bloque C de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 46 PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales.

-3.3.3 NP) PATOLOGIA Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). (3,00 und). Se realizan actividades de puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 47 PATOLOGIA_Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).

-3.4.2 NP) PATOLOGIA Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. (27,20 m²). Se realizan actividades de Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 48 PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.

-3.4.7 NP) PATOLOGIA Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (8,80 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 49 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-3.5.1 NP) PATOLOGIA Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. (195,36 m). Se realizan actividades de Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 50 PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.

-5.1.3) PATOLOGIA Demolicion de muros con elementos no estructurales. (21,46 m³). Se realizan actividades de Demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque E de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.



Ilustración 51 PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales.

-5.2.3) PATOLOGIA Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,44 m³). Se realizan actividades de concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg en el bloque E de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de diseño.



Ilustración 52 PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.

-5.2.7) PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,15 m³). Se realizan actividades de concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa en el bloque E según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.



Ilustración 53 PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.

-5.4.1) PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (17,48 m²). Se realizan actividades de instalación de mampostería en bloque No.4 con espesor de 0,10 m en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 54 PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.

-5.4.2) PATOLOGIA Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. (7,09 m²). Se realizan actividades de instalación de muro perimetral doble en ladrillo de obra común con espesor de 0,24 m en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 55 PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.

-5.4.4) PATOLOGIA Pañete liso para muro en mortero 1:4. (59,22 m²). Se realizan actividades de dintel de 0,15x0,15 en concreto de 21Mpa en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 56 PATOLOGIA_Pañete liso para muro en mortero 1:4.

-5.4.7) PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (110,03 m). Se realizan actividades columnetas en concreto de 21 Mpa con acero de refuerzo en el bloque E de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 57 PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-5.5.1) PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. (121,60 m²). Se realizan actividades de Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m para el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 58 PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.

-5.9.1) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg. (19,05 m). Se realizan actividades de Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 59 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg.

-5.9.2) PATOLOGIA Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg. (60,00 m). Se realizan actividades de Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 60 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.

-5.9.3 NP) PATOLOGIA Salida de toma común. Reparación. (8,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma común. Reparación. en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 61 PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación.

-5.9.4 NP) PATOLOGIA Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación. (14,00 und). Se realizan actividades de Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación. en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

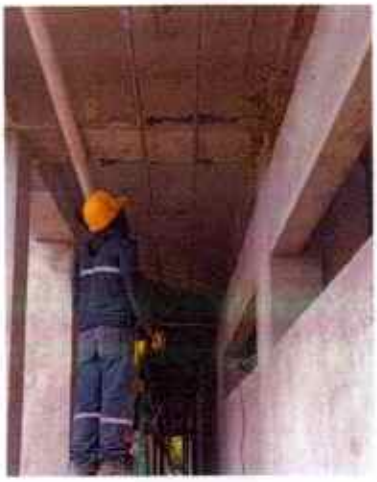


Ilustración 62 PATOLOGIA_Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación.

ANEXOS

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

ACERO

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LAPARADA OCO – CCC

MC SOLID 1300

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

CONCRETO

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

TUBERÍA

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

ANEXOS

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

ACERO

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15508**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187020260** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 2**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.28	0.005	0.023	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.010

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF ST
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71376.0	95239.0	15.800	SinGrieta	1.33

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15508**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187020260**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 2**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
					Kg/m	mm	mm	mm
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.002	0.690	2.510	8.500

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15509**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021757**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**1 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013664	A011279718	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.10	0.20	0.017	0.014	0.000	0.49	0.225	0.055	0.130
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	100013664	BHP0102622	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.08	0.24	0.018	0.015	0.004	0.47	0.022	0.010	0.02
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJC0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.10	0.17	0.018	0.013	0.001	0.46	0.011	0.013	0.01
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJC010204U	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.016	0.014	0.002	0.46	0.015	0.011	0.01
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15509**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021757**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013664	A011279716	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.032
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	100013664	BHP0102822	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.004
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJO0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJO010204U	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.001
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320416	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15509**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021757**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013664	A011279718	NTC 2289 GR60	Ternium	70042	95157	18	SinGrieta	1.36
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	100013664	BHP0102822	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68444	96333	15	SinGrieta	1.41
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJO0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71073	103288	15	SinGrieta	1.45
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJO010204U	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68858	99696	15	SinGrieta	1.45
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	**Ternium Colombia S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**890932389-8**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15509**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021757**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013664	A011279718	NTC 2289 GR60	Ternium	3.051	2.01	5.6	15.3
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	100013664	BHP0102822	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.957	0.60	1.9	8.2
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJO0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.560	0.89	3.7	10.5
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJO0102041J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.573	0.55	1.9	5.9
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15510**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187021758** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 4**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.97	0.16	0.020	0.009	0.001	0.46	0.131	0.059	0.135
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.96	0.18	0.030	0.009	0.001	0.45	0.174	0.055	0.132
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	0.29	0.95	0.15	0.024	0.009	0.001	0.47	0.161	0.080	0.144
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP009431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.19	0.019	0.009	0.002	0.44	0.017	0.013	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.24	0.012	0.010	0.003	0.45	0.011	0.008	0.02
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.24	0.012	0.010	0.003	0.45	0.011	0.008	0.02
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011288107	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.93	0.19	0.023	0.015	0.000	0.45	0.153	0.064	0.186
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	0.26	0.99	0.19	0.020	0.020	0.001	0.45	0.195	0.053	0.155

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15510**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021758**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.030
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.028
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP009431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.001
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.001
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011288107	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.029
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.023

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15510**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021758**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	72723	93873	17	SinGrieta	1.29
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	69691	90035	17	SinGrieta	1.29
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	69653	91046	19	SinGrieta	1.31
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP009431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	70088	100496	17	SinGrieta	1.43
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71304	103365	16	SinGrieta	1.45
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71304	103365	16	SinGrieta	1.45
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011288107	NTC 2289 GR60	Ternium	70633	91456	18	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	70307	93475	18	SinGrieta	1.33

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15510**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021758**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	3.070	1.97	5.9	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	3.042	2.02	5.7	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	2.989	1.82	6.2	14.7
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP009431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.556	0.57	1.7	6.2
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.586	0.60	2.2	6.0
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.586	0.60	2.2	6.0
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011288107	NTC 2289 GR60	Ternium	2.256	1.53	4.2	12.5
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	2.238	1.17	4.8	12.5

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excep si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **BODEGA BARRIO SEVILLA**
Dirección: **AV 7A 15N 66 CUCUTA**
Teléfono: **5888777**

Fecha Impresión **24/06/25**
No. Remisión: **187022362**
Página: **1 de 5**

Informe N°: **14217**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	% Nb	% CE
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **BODEGA BARRIO SEVILLA**
Dirección: **AV 7A 15N 66 CUCUTA**
Teléfono: **5888777**

Fecha Impresión **24/06/25**
No. Remisión: **187022362**
Página: **2 de 5**

Informe N°: **14217**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% Nb	% CE
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **BODEGA BARRIO SEVILLA**
Dirección: **AV 7A 15N 66 CUCUTA**
Teléfono: **5888777**

Fecha Impresión **24/06/25**
No. Remisión: **187022362**
Página: **3 de 5**

Informe N°: **14217**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**BODEGA BARRIO SEVILLA**	Fecha Impresión	**24/06/25**	Informe N°:	**14217**
Dirección:	**AV 7A 15N 66 CUCUTA**	No. Remisión:	**187022362**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 5**		

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excep se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio r.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance d reditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**BODEGA BARRIO SEVILLA**	Fecha Impresión	**24/06/25**	Informe N°:	**14217**
Dirección:	**AV 7A 15N 66 CUCUTA**	No. Remisión:	**187022362**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**5 de 5**		

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2022
* Doblado: NTC 1.2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 477.4psi / ± 3.292 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 477.4psi / ± 3.292 Mpa
Alargamiento	± 0.486651 %
Altura Resalte	± 0.014965 mm
Separación entre extremos	± 0.028704 mm
Espaciamiento	± 0.020434 mm
Angulo de Resalte	± 0.285355 °
Peso metro (masa)	± 0.004056 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15571**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187023392** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 2**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.015	0.015	0.003	0.45	0.018	0.013	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.21	0.012	0.014	0.002	0.46	0.022	0.018	0.03

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71974	103121	16	SinGrieta	1.43
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69980	102899	18	SinGrieta	1.47

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excep[illegible] se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio [illegible].

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15571**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023392**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 2**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.580	0.59	2.2	5.8
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.582	0.67	2.2	5.9

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15572**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187023547** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 3**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.014	0.013	0.002	0.45	0.010	0.010	0.01
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0098669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.20	0.017	0.017	0.002	0.46	0.013	0.013	0.01
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.015	0.015	0.003	0.45	0.018	0.013	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.015	0.015	0.003	0.45	0.018	0.013	0.03

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.007	0.001
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0098669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.002

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excep[illegible] se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio [illegible].

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15572**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023547**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 3**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	70398	100327	15	SinGrieta	1.43
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0098669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	73283	105860	15	SinGrieta	1.44
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71974	103121	16	SinGrieta	1.43
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71974	103121	16	SinGrieta	1.43

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15572**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023547**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 3**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.557	0.82	3.0	10.6
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0098669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.656	0.92	3.8	10.6
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.580	0.59	2.2	5.8
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.580	0.59	2.2	5.8

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excep' se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio r.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**1 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.21	0.012	0.014	0.002	0.46	0.022	0.018	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.016	0.014	0.002	0.46	0.015	0.011	0.01
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.016	0.014	0.002	0.46	0.015	0.011	0.01
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013665	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013665	BJO0103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.10	0.17	0.018	0.013	0.001	0.46	0.011	0.013	0.01
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.10	0.17	0.018	0.013	0.001	0.46	0.011	0.013	0.01

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.001
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.001
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.002
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.002

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excep se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio r.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69980	102899	18	SinGrieta	1.47
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68858	99696	15	SinGrieta	1.45
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68858	99696	15	SinGrieta	1.45
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71073	103288	15	SinGrieta	1.45
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71073	103288	15	SinGrieta	1.45

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.582	0.67	2.2	5.9
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.573	0.55	1.9	5.9
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.573	0.55	1.9	5.9
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.560	0.89	3.7	10.5
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.560	0.89	3.7	10.5

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excep se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio r.

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LAPARADA OCO – CCC

MC SOLID 1300

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

CONSTRUIR ES CUIDAR

CERTIFICADO DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO : **MC SOLID 1300**
FORMATO : KIT CAJA 6 UN.
COLOR : GRIS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE : **MSN INVERSIONES LTDA.**
ORIGEN : CUCUTA / COLOMBIA

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO

ANÁLISIS

ANÁLISIS	**PARÁMETROS**	**RESULTADO**
Componente A		
OP - 00716901001		**LOTE:82**
Fecha fabricación: 25-08-2023		
Aspecto	Resina color gris	Resina color gris
Densidad	1,46 a 1,54 [Kg/L]	1,46 [Kg/L]
OP - 00715201001		
Fecha fabricación: 25-08-2023		**LOTE:78**
Componente B		
Aspecto	Catalizador ámbar	CUMPLE
Densidad	1,07 a 1,10 [Kg/L]	1,07 [Kg/L]
Aspecto de A+B	Mezcla fluida	Mezcla fluida

FECHA DE EMISIÓN : 11/07/2024

Gerente R&D / Control de Calidad QC
Marta Salim-Hanna S.
Químico. Licenciado en Química
P. Universidad Católica de Chile

Químico de Desarrollo
Maritza Adasme Huenchún
Químico Laboratorista
Universidad de Tarapacá

CONCRETO

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: ABRIL 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Días)	(PLG)	(cm)	(cm)	(gra)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
324	345	COLUMNETAS, VIGA CORONA BLOQUE E SUR RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	16,04,26	23,04,26	7		30,5	15,5	12580	2,186	46790	24,8	3527	117,6	Normal
325	345		16,04,26	23,04,26	7		31,0	15,5	12680	2,168	46610	25,8	3664	122,1	Normal






326	345	COLUMNETAS, VIGA CORONA BLOQUE E SUR RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	16,04,26	14,05,26	28		30,5	15,5	12350	2,146	59730	31,7	4502	150,1	Normal
327	345		16,04,26	14,05,26	28		30,6	15,4	12240	2,147	55430	29,8	4233	141,1	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodrig

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: ABRIL 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaboración	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
342	348	DINTEL SUPERIOR Y COLUMNETA BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	18.04.26	25.04.26	7	7"	30,5	15,5	12570	2,184	39800	21,1	3000	100,0	Normal
343	348		18.04.26	25.04.26	7	7"	30,7	15,4	12490	2,184	40800	21,9	3115	103,8	Normal






344	348	DINTEL SUPERIOR Y COLUMNETA BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	18.04.26	16.05.26	28	7"	30,4	15,6	12600	2,168	57130	29,9	4251	141,7	Normal
345	348		18.04.26	16.05.26	28	7"	30,5	15,4	12420	2,186	59310	31,8	4529	151,0	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: ABRIL 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
346	349	COLUMNETAS SEGUNDO PISO BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	20,04,26	27,04,26	7	6" 2/4	30,5	15,5	12350	2,146	31650	16,8	2386	79,5	Normal
347	349		20,04,26	27,04,26	7	6" 2/4	30,6	15,6	12606	2,155	35540	18,6	2645	88,2	Normal






348	349	COLUMNETAS SEGUNDO PISO BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	20,04,26	18,05,26	28	6" 2/4	30,6	15,4	12470	2,188	47890	25,7	3657	121,9	Normal
349	349		20,04,26	18,05,26	28	6" 2/4	30,4	15,5	12210	2,129	48030	25,5	3620	120,7	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

Tomas Ubaud

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodrig

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: ABRIL 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
360	351	COLUMNETAS SEGUNDO PISO BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	21,04,26	28,04,26	7	7"	30,5	15,4	12780	2,250	31800	17,1	2428	80,9	Normal
361	351		21,04,26	28,04,26	7	7"	30,4	15,5	12730	2,219	29100	15,4	2193	73,1	Normal






362	351	COLUMNETAS SEGUNDO PISO BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	21,04,26	19,05,26	28	7"	30,6	15,5	12790	2,215	41950	22,2	3162	105,4	Normal
363	351		21,04,26	19,05,26	28	7"	30,5	15,6	12970	2,225	40980	21,4	3049	101,6	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: ABRIL 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
374	353	COLUMNETAS, VIGA CORONA SEGUNDO PISO BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	23,04,26	30,04,26	7	6" 1/2	30,3	15,5	12020	2,102	34420	18,2	2594	86,5	Normal
375	353		23,04,26	30,04,26	7	6" 1/2	30,2	15,5	11970	2,101	26930	14,3	2030	67,7	Normal






376	353	COLUMNETAS, VIGA CORONA SEGUNDO PISO BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	23,04,26	21.05.26	28	6" 1/2									
377	353		23,04,26	21.05.26	28	6" 1/2									

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodrig

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: ABRIL 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Días)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
374	353	COLUMNETAS, VIGA CORONA SEGUNDO PISO BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	23,04,26	30,04,26	7	6" 1/2	30,3	15,5	12020	2,102	34420	18,2	2594	86,5	Normal
375	353		23,04,26	30,04,26	7	6" 1/2	30,2	15,5	11970	2,101	26930	14,3	2030	67,7	Normal






376	353	COLUMNETAS, VIGA CORONA SEGUNDO PISO BLOQUE E RES 3000Psi CONCRETO DE OBRA	23,04,26	21,05,26	28	6" 1/2									
377	353		23,04,26	21,05,26	28	6" 1/2									

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS

CONCRETO PROCEDENTE DE: NORMIX

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S

NIT: 901379067-9

FECHA: ABRIL 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
378	354	LOSA ESTACION DE BOMBEO RES 4000Psi CONCRETO PREMEZCLADO	07.04.26	14.04.26	7	6" 1/2	30,5	15,4	13270	2,338	32780	17,6	2503	62,6	Normal
379	354		07.04.26	14.04.26	7	6" 1/2	30,4	15,6	13210	2,273	38220	20,0	2844	71,1	Normal






OBSERVACIONES

MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodr

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: NORMIX

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: ABRIL 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(Plg)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
382	355	MURO ESTACION DE BOMBEO RES 4000Psi CONCRETO PREMEZCLADO	10,04,26	17,05,26	7	5"	30,5	15,4	12980	2,285	35940	19,3	2744	68,6	Normal
383	355		10,04,26	17,05,26	7	5"	30,6	15,4	13160	2,309	39900	21,4	3047	76,2	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS

CONCRETO PROCEDENTE DE: NORMIX

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S

NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
386	356	ANDENES, COLUMNETAS BLOQUE E SEGUNDO PISO RES 3000Psi CONCRETO PREMEZCLADO	11.04.26	18.04.26	7	6"	30,7	15,6	12390	2,112	26790	14,0	1994	66,5	Normal
387	356		11.04.26	18.04.26	7	6"	30,8	15,5	13350	2,297	31190	16,5	2351	78,4	Normal






OBSERVACIONES

MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodri

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: NORMIX

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
390	357	TAPA ESTACION DE BOMBEO, CARCAMO. RES 4000Psi CONCRETO PREMEZCLADO	15,04,26	22,04,26	7	5" 2/4	30,8	15,5	13320	2,292	33350	17,7	2514	62,8	Normal
391	357		15,04,26	22,04,26	7	5" 2/4	30,5	15,6	13050	2,239	35930	18,8	2674	66,8	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS

CONCRETO PROCEDENTE DE: NORMIX

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S

NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Días)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
394	358	PLACA CARCAMO. RES 4000Psi CONCRETO PREMEZCLADO	10,04,26	17,04,26	7	6"	30,3	15,5	12900	2,256	34240	18,1	2581	64,5	Normal
395	356		10,04,26	17,04,26	7	6"	30,0	15,5	12680	2,275	42560	22,6	3208	80,2	Normal






OBSERVACIONES

MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodri

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379087-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
398	359	ASURAS, AREA DE COMEDOR, COCINA, ARMERILLO, ORATORIO. -BLOQUE B. OFICINA ABIERTA 14 PUESTOS. - BLOQUE A. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	06,05,26	13,05,26	7	6" 1/2	30,7	15,4	12820	2,242	37160	20,0	2837	70,9	Normal
399	359		06,05,26	13,05,26	7	6" 1/2	30,9	15,3	12560	2,211	36180	19,7	2799	70,0	Normal

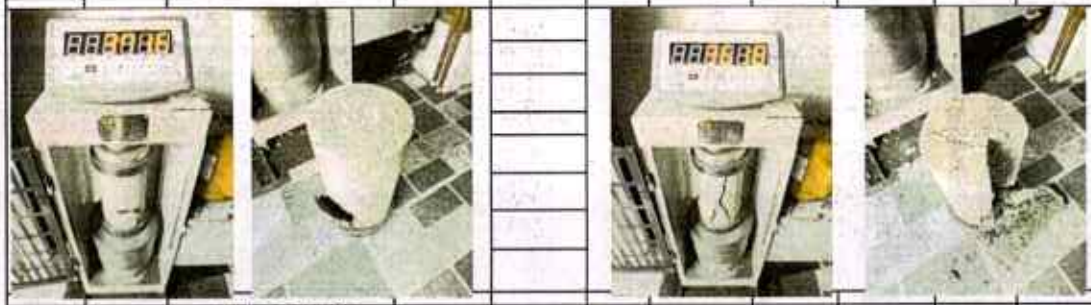

400	359	ASURAS, AREA DE COMEDOR, COCINA, ARMERILLO, ORATORIO. -BLOQUE B. OFICINA ABIERTA 14 PUESTOS. - BLOQUE A. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	06,05,26	03,06,26	28	6" 1/2									
401	359		06,05,26	03,06,26	28	6" 1/2									

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS

CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S

NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
408	360	ALFAJIA CUBIERTA BLOQUE E. DINTEL SUPERIOR BLOQUE E. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	07,05,26	14,05,26	7	6" 3/4	30,7	15,5	12760	2,203	53100	28,1	4003	100,1	Normal
409	360		07,05,26	14,05,26	7	6" 3/4	31,0	15,5	13100	2,240	52470	27,8	3955	98,9	Normal






410	360	ALFAJIA CUBIERTA BLOQUE E. DINTEL SUPERIOR BLOQUE E. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	07,05,26	04,06,26	28	6" 3/4									
411	360		07,05,26	04,06,26	28	6" 3/4									

OBSERVACIONES

MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodrig

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: NORMIX

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
412	361	MUROS DEL CARCAMO, RES 4000Psi CONCRETO PREMEZCLADO	14,04,26	21,04,26	7	6" 3/4	30,3	15,5	12840	2,246	42880	22,7	3232	80,8	Normal
413	361		14,04,26	21,04,26	7	6" 3/4	30,9	15,4	13070	2,271	40130	21,5	3064	76,6	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE LA ESTACIÒN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS

CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S

NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
421	362	COLUMNETAS SEGUNDO PISO BLOQUE E. RES 3000Psi CONCRETO EN OBRA	11,05,26	18,05,26	7	7"	30,5	15,4	12400	2,183	42930	23,0	3278	109,3	Normal
422	362		11,05,26	18,05,26	7	7"	30,4	15,3	12190	2,181	35590	19,4	2753	91,8	Normal






423	362	COLUMNETAS SEGUNDO PISO BLOQUE E. RES 3000Psi CONCRETO EN OBRA	11,05,26	08,06,26	28	7"									
424	362		11,05,26	08,06,26	28	7"									

OBSERVACIONES

MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodrig

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTG 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
431	383	PLACA CARCAMO: RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	10,04,26	17,04,26	7	6" 3/4	30,6	15,5	12610	2,184	37200	19,7	2804	70,1	Normal
432	383		10,04,26	17,04,26	7	6" 3/4	30,5	15,4	12210	2,149	35890	19,3	2741	68,5	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS

CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S

NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
435	364	DINTELES 2DO PISO BLOQUE E. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	12.05.26	19.05.26	7	2,5"	30,7	15,4	12860	2,249	43540	23,4	3325	83,1	Normal
436	364		12.05.26	19.05.26	7	2,5"	30,6	15,6	12360	2,113	46220	24,2	3439	86,0	Normal






437	364	DINTELES 2DO PISO BLOQUE E. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	12.05.26	09.06.26	28	2,5"									
438	364		12.05.26	09.06.26	28	2,5"									

OBSERVACIONES

MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodrig

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: NORMIX

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(Pulg)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
445	365	MURO CARCAMOS Y CAJAS No. 5 Y 7. RES 4000Psi CONCRETO PREMEZCLADO	14,04,26	21,04,26	7	7 3/4"	30,8	15,2	12580	2,251	42240	23,3	3311	82,8	Normal
446	365		14,05,26	21,04,26	7	7 3/4"	31,0	15,1	12660	2,280	39640	22,2	3164	79,1	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS

CONCRETO PROCEDENTE DE: NORMIX

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S

NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
448	366	ANDENES. RES 3000Psi CONCRETO PREMEZCLADO	11.04.26	18.04.26	7	6,5 3/4"	30,9	15,1	12640	2,284	33370	18,6	2650	88,3	Normal
449	366		11.04.26	18.04.26	7	6,5 3/4"	31,1	15,5	13100	2,232	29510	15,6	2224	74,1	Normal






OBSERVACIONES

MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodrig

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(Pulg)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
451	76A	PAÑETE FACHADA SUR, PAÑETE INTERNO FILOS BLOQUE E. RES 2500Psi CONCRETO EN OBRA	14,05,26	21,05,26	7		15,5	8,0	1660	2,131	8740	17,4	2473	98,9	Normal
452	76A		14,05,26	21,05,26	7		15,3	8,0	1600	2,080	8090	16,1	2289	91,6	Normal
453	76A		14,05,26	21,05,26	7		15,2	8,0	1640	2,146	8580	17,1	2428	97,1	Normal








454	76A	PAÑETE FACHADA SUR, PAÑETE INTERNO FILOS BLOQUE E. RES 2500Psi CONCRETO EN OBRA	14,05,26	11,06,26	28										
455	76A		14,05,26	11,06,26	28										

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
456	367	DINTELES 1ER PISO Y 2DO PISO, BLOQUE E. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	14,05,26	21,05,26	7	6 2/4"	30,4	15,3	12280	2,197	39150	21,3	3029	101,0	Normal
457	367		14,05,26	21,05,26	7	6 2/4"	30,7	15,5	12430	2,146	37220	19,7	2806	93,5	Normal






458	367	DINTELES 2DO PISO BLOQUE E. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	14,05,26	11,06,26	28	6 2/4"									
459	367		14,05,26	11,06,26	28	6 2/4"									

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodr

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: MAYO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(Plg)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
460	368	E. B. DINTELES SUPERIORES 1ER PISO Y 2DO PISO. BLOQUE E. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	15,05,26	22,05,26	7	6 1/4"	30,5	15,3	12300	2,193	29730	18,2	2300	76,7	Normal
461	368		15,05,26	22,05,26	7	6 1/4"	30,3	15,3	12260	2,201	36530	19,9	2826	94,2	Normal






462	368	E. B. DINTELES SUPERIORES 1ER PISO Y 2DO PISO. BLOQUE E. RES 4000Psi CONCRETO EN OBRA	15,05,26	12,06,26	28	6 1/4"									
463	368		15,05,26	12,06,26	28	6 1/4"									

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

TUBERÍA

Dirección: Avenida 0C N.º 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
PRODUCT CERTIFICATION BODY

CIDET

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Model 5

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

No. 02303

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TUBOS DE PVC RÍGIDO MARCAS PLASTIMEC Y RALCO	LISO PESADO (DB) LISO LIVIANO (EB)	DB 2", 3", 4" Y 6" Y EB 3" Y 4"

CÓDIGO IAF:	14, 19	CÓDIGO NACE:	22.21, 27.33	CÓDIGO ICS:	-

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.

The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:

Manufactured by:

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S. - IMEC S.A.S.

Carrera 37 No. 10-07 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 1630/2006 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.6.1)

Fecha de Certificación: 2006 / 04 / 20
Fecha de renovación: 2021 / 09 / 24
Fecha de Vencimiento: 2024 / 09 / 24

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 09 / 24 y 2023 / 09 / 24

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
PRODUCT CERTIFICATION BODY

CIDET

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02303

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2006 / 04 / 20
FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 09 / 24
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 09 / 24

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TUBOS DE PVC RÍGIDO MARCAS PLASTIMEC Y RALCO

Tipo	Liso pesado (DB), Liso liviano (EB)					
Referencia	DB de 2", 3", 4" y 6" y EB de 3", 4"					
	DB 2"	DB 3"	DB 4"	DB 6"	EB 3"	EB 4"
Diámetro exterior máximo (mm)	60,48	89,10	114,53	168,56	89,10	114,53
Diámetro exterior mínimo (mm)	60,18	88,70	114,07	168,00	88,70	114,07
Diámetro interno mínimo (mm)	50,80	76,20	101,60	152,40	76,20	101,60
Espesor pared mínimo (mm)	1,52	2,34	3,07	4,62	1,55	2,08
Ovalamiento máximo (mm)	1,52	1,52	2,54	2,54	1,52	2,54
Diámetro entrada máximo (mm)	61,11	90,07	115,65	170,13	90,07	115,65
Diámetro entrada mínimo (mm)	60,81	89,67	115,19	169,57	89,67	115,19
Ovalamiento (mm)	1,52	1,52	2,54	2,54	1,52	2,54
Diámetro fondo máximo (mm)	60,45	89,07	114,50	168,53	89,07	114,50
Diámetro fondo mínimo (mm)	60,15	88,67	114,04	167,97	88,67	114,04
Ovalamiento (mm)	1,52	1,52	2,54	2,54	1,52	2,54
Longitud mínima campana (mm)	45,00	73,00	86,00	127,00	73,00	86,00
Referencial	NTC 1630/2006 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6.1)					

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS

Fabricado por **CELTA S.A.S**, en la **Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia** identificada con **número de NIT 800.164.590-1**

Manufactured by **CELTA S.A.S**, in the **Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia** identified with **NIT number 800.164.590-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 - Cap. 3, Art. 20.6 y 20.6.1.1

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 - Capitulo 3, Articulo 20.6 y 20.6.1.1

Resolution No. 90708 of 2013 the Ministry of Mines and Energy. Technical Regulations for Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Sections 20.6 y 20.6.1.1

SECTOR ICS 29.120.10 - 83.080,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER605026
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2018-04-20	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2024-04-17	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2027-04-19

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accredited by

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB
ACCREDITED

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC, y debe ser devuelto cuando así lo solicite
ICONTEC, Calle 24 # 69-76, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Arrecife", Bogotá D.C., Colombia

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIOS CONDUIT

Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S**, en la **km 27 Vía Fontibón - Facatativá - Los Alpes, Vía Barley de Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,** identificada con **número de NIT 800.033.159-6**

Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S**, in the **km 27 Vía Fontibón - Facatativá - Los Alpes, Vía Barley de Colegio - Vereda , Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,** identified with **NIT number 800.033.159-6**

Fabricado por **IPEX INC**, en la **11 Bermondsey Road Toronto, Ontario, M4B1Z3; 247 rue St- Jacques. Saint Jacques de Montcalm Québec JOK 2RO, Joliette, Quebec, Canadá**

Manufactured by **IPEX INC**, in the **11 Bermondsey Road Toronto, Ontario, M4B1Z3; 247 rue St- Jacques. Saint Jacques de Montcalm Québec JOK 2RO, Joliette, Quebec, Canadá**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energia: 2013

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Resolución 90708. Capitulo 3 Articulo 20.6 y 20.6.1.1
Technical Regulation for Electrical Instalations RETIE – Resolution 90708 of 2013. Chapter 3 – Section 20.6 and 20.6.1.1

SECTOR ICS 23.04.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER1033390
Certificate

Fecha de Aprobación: 2023-12-06
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2024-02-01
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2026-12-05
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por ONAC y cumple con los requisitos de la norma ISO/IEC 17065:2012 bajo el CRP-002

ANAB ACCREDITED ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC Calle 24 # 59-70 Torre 4 "Agua" Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C. Colombia

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

Tubos de PVC para Alojar y Proteger Conductores Eléctricos Aislados, Ducto Telefónico y Eléctrico de PVC

Fabricado por **INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S- IMEC S.A.S**, en la **Carrera 37 No 10-07 Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.**

.anufactured by **INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S- IMEC S.A.S**, in the **Carrera 37 No 10-07 Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia,**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 90708:2013 Minminas. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013 – Capítulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1.1

Technical Regulation for Electrical Installations – RETIE 2013, Chapter 3, article 20.6 y 20.6.1.1

SECTOR ICS 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER844704
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2021-05-14	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-07-07	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2026-07-06

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ONAC ACREDITADO

ANAB

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando así se solicite
ICONTEC, carrera 37 no. 52 – 95, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

Sistema 5

No. 02000

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	ENTERA	CC-E de 12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m (½" A 1" x 2.40 m a 3.05 m)

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of the CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por

Commercialized and fabricated by

COBRES DE COLOMBIA S.A.S.

Carrera 40 No. 11-33 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 2206/2001 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE **(Numeral 15.3)**

Fecha de Certificación: 2005/10/28
Fecha de Renovación: 2023/07/18
Fecha de Vencimiento: 2026/07/17

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2024/07/17 y 2025/07/17

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. **Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.**

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02000

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/07/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/07/17

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

Tipo	Entera
Referencia	CC-E de 12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m (½" A 1" x 2.40 m a 3.05 m)
Contenido de cobre (%)	> 80
Conductividad a 20°C % IACS	> 97.4
Dureza HRF	> 80
Resistencia a la tracción	> 18
Resistencia en cámara salina	1000 horas mínimo
Marcación	Las varillas de puesta a tierra llevarán la siguiente información: Razón social o marca del fabricante y sus dimensiones, dentro de los primeros 30 centímetros desde la parte superior
Referencial	NTC 2206/2001 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 15.3)

Nota: Este certificado se unifica con el 00140.

Fábrica	Planta
COBRES DE COLOMBIA S.A.S.	YUMBO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las caracteristicas del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. **Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.**

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

No. 07925

Sistema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por

Commercialized and fabricated by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S.

Calle 10 # 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

IEC 60228/2004 y RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2021/12/21
Fecha de Actualización: 2023/09/25
Fecha de Vencimiento: 2024/12/21

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2024/12/21

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2021/12/21
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/09/25
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/21

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables de cobre y aluminio desnudo	
Referencia	Cobre: Calibres desde 0.5 mm^2 hasta 800 mm^2 Aluminio: Calibres desde 10 mm^2 hasta 800 mm^2	Calibres desde 0.5 mm^2 hasta 630 mm^2
Marca	CENTELSA y CENTELSA by NEXANS	
Conductor	Cobre suave y Aluminio 1350	Cobre suave
Cableado	Clase 2	Clase 5
Aplicación	Transmisión y distribución de energía eléctrica, en instalación aérea y para sistemas de puesta a tierra.	
Referencial	IEC 60228/2004 y RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)	

Fábrica	Planta
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S	YUMBO, COLOMBIA

Atentamente,



Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA -TUBERÍA PRESIÓN EXTREMO LISO - TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO - ACCESORIOS TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO - TUBO SANITARIO

Fabricado y Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el Kilometro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F - 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Colombia, identificada con número de NIT 800.033.159-6

Manufactured and Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the Kilometro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca; Calle 4A No. 1F - 93 Barrio El Tesoro, Malambo, Atlántico, Colombia, identified with NIT number 800.033.159-6

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Expide los requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deban cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas

It issues the technical requirements related to chemical composition and information, which must be met by the aqueduct and sewerage pipes, ducts and accessories, those for sanitary use and those of rainwater, acquired by the people providing water and sewage services, as well as hydro-sanitary installations inside the homes

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER660061

Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2019-01-04	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2019-12-31
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date	2025-01-03

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: [illegible]@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ES-R-PD-01 Rev. [illegible]

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA -TUBERÍA PRESIÓN EXTREMO LISO – TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO - ACCESORIOS TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO – TUBO SANITARIO

hricado y Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,**
identificada con **número de NIT 800.033.159-6**

Manufactured and Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca,** identified with **NIT number 800.033.159-6**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Expide los requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas

It issues the technical requirements related to chemical composition and information, which must be met by the aqueduct and sewerage pipes, ducts and accessories, those for sanitary use and those of rainwater, acquired by the people providing water and sewage services, as well as hydro-sanitary installations inside the homes

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER660061
Certificate

Fecha de Aprobación: 2019-01-04
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-02-08
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2025-01-03
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
PR CPR 002

ANAB
ACCREDITED
ISO/IEC 17065:2012

Este certificado es propiedad de ICONTEC y está protegido por derechos cuando sea aplicado
ICONTEC, carrera 37 No. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍAS Y ACCESORIOS CON UNIÓN ELASTOMÉRICA

Fabricado y Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.,** en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F – 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Col...**

Manufactured and Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.,** in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F – 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 2295 (2008)

Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados para el transporte de fluidos a presión

Joints for plastics pressure pipes using flexible elastomeric seals

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado está sujeto a que la institución y el servicio cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial de certificación y en el documento "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos", lo cual será verificado por ICONTEC.

This Certificate is subject to the company's and service's permanent fulfillment of the requirements set forth in the technical document and the "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos" document, which will be verified by ICONTEC

Certificado CSC-0042-3
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1995-02-02	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	2023-10-25	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	2024-03-19
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	2029-10-25		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC cuenta con reconocimiento de idoneidad y reconocimiento por ICONTEC es un organismo de certificación acreditado por ONAC y ANAB

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID 2607

F-PS-632
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando se solicite. ICONTEC Calle 26 # 69 D Torre 2 "Aqua" Centro Empresarial Arrecife" Bogotá D.C. Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA DRENAJE SUBTERRANEO Y ALCANTARILLADO.

Fabricado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón – Facatativá,**

Los Alpes, Vía Barley del Colegio – Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.,** in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón – Facatativá,**

Los Alpes, Vía Barley del Colegio – Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia
El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 3722-3 (2012)

Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra). Sistemas de tuberías de pared estructural de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: tuberías y accesorios con superficie externa no lisa, tipo B.

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (pp) and polyethylene (PE). Part 3: pipes and fittings with non-smooth external surface, type B.

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product *are included in annexed document and it is integral part of this certified*

Certificado CSC-CER411921
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2015-08-28	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	2021-08-27	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	2021-09-03
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	2027-08-26		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

F-PS-628
Versión 00

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO SANITARIO - TUBO VENTILACIÓN

Fabricado y Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F - 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Colombia**

Manufactured and Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F - 93**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1087 (2016)

Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) rigido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación

Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent pipe

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado está sujeto a que la institución y el servicio cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial de certificación y en el documento "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos", lo cual será verificado por ICONTEC.

This Certificate is subject to the company's and service's permanent fulfillment of the requirements set forth in the technical document and the "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos" document, which will be verified by ICONTEC

Certificado CSC-0042-1
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1995-02-02	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	2023-10-25	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	2024-03-19
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	2029-10-25		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-632
Versión 00

ICONTEC es la organismo de Certificación acreditado por ICONTEC is a certification body accredited by

ISO/IEC 17065:2012
CO-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado. ICONTEC Calle 26 # 69 - 76, Torre 4 "Agua" - Centro Empresarial Elemento" Bogotá D.C. Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA AGUA POTABLE EXTREMO LISO - TUBERÍA AGUA POTABLE UNIÓN MECÁNICA - TUBERÍA PRESIÓN AGUA POTABLE

Fabricado y Comercializado **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F - 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Colombia**

Manufactured and Trader **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F - 93**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Plásticos. Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) clasificados según la presión (Serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series)

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado está sujeto a que la institución y el servicio cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial de certificación y en el documento "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos", lo cual será verificado por ICONTEC.

This Certificate is subject to the company's and service's permanent fulfillment of the requirements set forth in the technical document and the "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos" document, which will be verified by ICONTEC

Certificado CSC-0042-6
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1995-02-02	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	2023-10-25	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	2024-03-19
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	2029-10-25		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-632
Versión 00

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accredited by

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
ICONTEC Calle 26 # 69-76 Torre 4 "Agua" Centro Empresarial Elemento Bogotá D.C. Colombia

INFORME DE INTERVENTORÍA
CUENTA DE COBRO No. 13 DEL CONTRATO DE OBRA
Periodo corte del acta parcial de obra No. 13 del 16 de abril al 24 de mayo del 2026
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-01362-2021
OBJETO: Estudio, diseño y construcción de estación base tipo c en el municipio de villa del rosario (la parada) norte de Santander, (convenio interadministrativo suscrito entre la nación ministerio del interior fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana fonsecon y el departamento norte de Santander).

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
R/L. FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-SG-1568-2021
OBJETO: Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra resultante del proceso licitatorio No. LP-SEG-001 de 2021 "Elaboración de estudios y diseños y construcción distrito de policía tipo c en el municipio de villa del rosario, sector la parada norte de Santander".

Contratista: UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD
R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
MAYO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

2.2. Características técnicas del proyecto

2.3. Actividades a ejecutar

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Datos generales

3.2. Aspectos financieros

3.2.1. Estado financiero del contrato de obra

3.3. Aspectos administrativos contractuales

3.3.1. Relación de documentos contractuales

3.4. Garantías

4. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DE OBRA

4.1. Actividades realizadas por el contratista

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Datos generales

5.2. Aspectos financieros

5.2.1. Estado financiero del contrato de interventoría

5.3. Aspectos administrativos contractuales

5.3.1. Relación de documentos contractuales

5.4. Garantías

6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA

6.1. Interventoría técnica

6.1.1. Actividades desarrolladas por la interventoria

6.2. Personal de la interventoria

6.3. Equipos de la interventoría

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCIÓN

Villa del Rosario es un municipio fronterizo del Departamento Norte de Santander, está ubicado en la subregión Oriental, con una población aproximada de 111.254 Habitantes (DANE,2020), de los cuales la población urbana es el 97.1%, y la gran mayoría de la población pertenece a los estratos I y II.
La seguridad ciudadana ha adquirido una importancia creciente en las capitales de los departamentos como respuesta al temor creciente de la población frente a los actuales niveles inéditos de delincuencia, el incremento constante de violencias en el ámbito privado y al impacto de temas de carácter social en la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos; violaciones de derechos humanos, amenazas al medio ambiente, problemas de convivencia, accesibilidad a los servicios básicos, ineficiente provisión de servicios sociales y demás inseguridades económicas y sociales que afectan el pleno desarrollo de los individuos. Es por lo tanto el principal tema del debate público y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, referenciando los siguientes datos estadísticos Secuestros 13 de personas a 2017, Tasa de homicidios 47.5, Tasa de hurtos 179 2017, Tasa de violencia intrafamiliar 124.1.

Durante el año 2015 la dirección general de la policía nacional de Colombia y el comando de policía metropolitana de Cúcuta, han ordenado el apoyo de manera temporal, permanente efectiva y de impacto jurisdicción del Municipio de Villa del Rosario que por alguna circunstancia se ha dificultado el cumplimiento de los objetivos trazados en su lucha
En el sector la parada municipio de villa del rosario, se exterioriza por la presencia de bandas criminales quienes por la situación de zona fronteriza del municipio con la república bolivariana de Venezuela y en su afán de controlar la actividad ilícita, del contrabando, transporte ilegal, extensión, el hurto en todas sus modalidades y el tráfico de estupefacientes, generan los homicidios y las lesiones personales, en esta zona de frontera se tiene injerencia y control de los grupos de delincuencia común organizada- GDCO y del bloque CARLOS GERMAN VELAZCO VILLAMIZAR del ELN.

Los hechos se estarían presentando por el control de los pasos no habilitados entre la zona de frontera de Colombia y Venezuela en las trochas conocidas como el Tomito, La Playita y Los Mangos, con el propósito de obtener un control que permita fortalecer las rentas criminales de las estructuras.
En las zona limítrofe o fronteriza, se encuentran ubicadas las trochas que comunican con el vecino país, las cuales son utilizadas para el transporte ilegal de mercancía e hidrocarburos, asimismo, esto es aprovechado por grupos al margen de la Ley para el cobro de cuotas extorsivas, en los 31 kilómetros de frontera, que están siendo disputados por grupos de delincuencia común organizada. Fuentes de financiamiento.

Se basa en el control de los diferentes pasos informales utilizados para el contrabando de Hidrocarburos y elementos como autopartes, víveres y productos de aseo. Cobro de

extorsiones a comerciantes de La Parada y Villa del Rosario, actividades realizadas desde territorio venezolano.

El municipio de Villa del Rosario ha hecho del tema la bandera de sus programas de gobierno abocando por una seguridad, que vaya más allá del sentido reducido del control y el orden público y que en la búsqueda de la protección del hombre del común, llama a nuevos actores a su construcción a partir del diálogo social y la implementación de medidas que disuadan al infractor y que reduzcan la posibilidad de comisión del delito. La policía cumple un papel esencial en la prevención del delito. Su función tradicionalmente ha estado asociada a la protección civil de los ciudadanos.

Resulta indispensable estructurar la organización de la institución policial y el funcionamiento operacional de la misma brindando total apoyo. Por años el municipio no ha contado con una estación de policía que cumpla con todos los requisitos para albergar los uniformados que prestan su servicio de vigilancia y seguridad en el municipio, solo cuenta con unas instalaciones, la cual fue adaptada en predios de una institución educativa del casco urbano que no ofrece ninguna garantía de seguridad y eficiencia al personal. El municipio ha mantenido en funcionamiento la estación de policía, pero no puede garantizar que la prestación de este servicio a la comunidad se haga de manera adecuada debido a que la estación funciona en una edificación improvisada que no cumple los parámetros de diseño y construcción establecidos en las Normas Sismo Resistentes NSR-10, logrando espacios que brinden al personal policial la seguridad y comodidad requeridas para la correcta prestación del servicio, lo que se verá reflejado en mayores niveles de seguridad para la población del municipio de Villa de Rosario.

En virtud de lo consagrado por el artículo 2 la ley 1150 de 2007 y lo adicionado por el numeral 1 del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, "(...) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo"

No tratándose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el mercado, es conclusión que no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de selección de contratación directa señaladas en el artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007.
No siendo aplicable las causales establecidas en artículo 2, numeral 2, literal a, c, d, e, f, g, h, i, de la ley 1150 de 2007, por tratarse de un contrato con objeto complejo como lo es la obra pública, es consecuencia, que la escogencia del contratista debe efectuarse bien por la modalidad de selección a aplicar es la de **LICITACIÓN PÚBLICA,** de acuerdo con lo consagrado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, decreto 1082 de2015 y la ley 1882 de 2018; de acuerdo con la cuantía del contrato y los parámetros legales para determinar la menor cuantía.

Teniendo como parámetro el monto del presupuesto **LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** para la vigencia 2021, así como el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, el presupuesto oficial se establece en la suma de **VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($ 22.982.010.588,00),** en el cual se encuentran incluidos todos los costos de diseños y obras.

Que, el Gobernador del Departamento Norte de Santander, mediante decreto No. 00252 del 11 de febrero de 2020 del departamento, delegó a los secretarios de despacho de la administración Departamental la competencia de expedir los actos administrativos y en general, ejecutar la actividad precontractual, contractual y postcontractual desde la generación de la necesidad, elaboración estudios previos, convocatoria, suscripción de contratos y acta e inicio, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la normatividad contractual vigente y el Manual de Contratación.

El Departamento Norte de Santander a través de la **SECRETARIA DE GOBIERNO,** pone a disposición de los interesados el proyecto de Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato para el **ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).**

El objeto del Contrato es el **ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).**

El alcance del objeto consiste en i) Elaborar los estudios y diseños y demás actividades requeridas en el marco del Convenio en el Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. ii) El desarrollo de las respectivas obras de construcción y iii) Posterior entrega del bien inmueble en completo funcionamiento.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

El proyecto se localiza en el departamento de norte de Santander en el municipio de villa del rosario exactamente en el sector de la parada zona de frontera con Venezuela, en donde las condiciones de frontera y las características de la misma resulta de mucha importancia su ejecución.

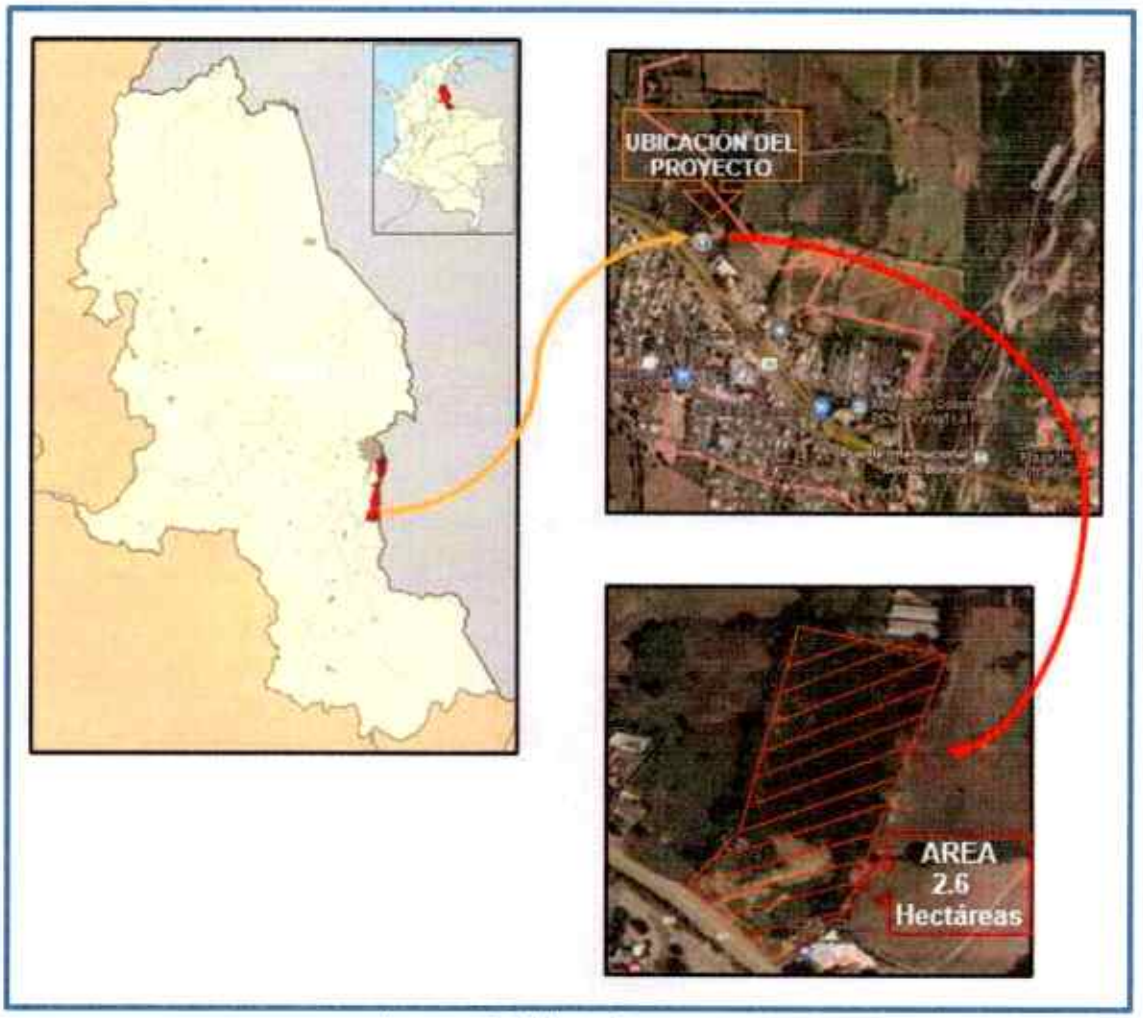


ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

2.2. Características técnicas del proyecto

El tema de seguridad pública se ha vuelto recurrente. El municipio de Villa Rosario Norte de Santander, donde se evidencia y se registra la evolución del delito, el incremento de las tasas poblacionales, los índices crecientes y permanentes de desempleo, la afectación económica por la que se atraviesa; conllevan a visionar y fortalecer e implementar diferentes mecanismos que contribuyan de manera significativa no solamente la disminución de los índices delincuenciales, sino en la inversión social partiendo desde la prevención, como actor representativo de los factores que inciden en mantener las condiciones necesarias para asegurar la convivencia pacífica y seguridad pública.

Por lo anterior, se considera necesario la ubicación de la base del tercer distrito de policía de villa del rosario, esta unidad servirá para albergue, apoyo y la integración de los componentes operacionales con grupos especializados de varias direcciones del nivel operativo de la Policía Nacional, teniendo en cuenta su misionalidad, características, funciones, ámbitos de acción y nivel de aplicabilidad, de tal forma que los comandantes puedan contar con unidades mejor organizadas para la prevención. Disuasión y el control delincuencial.

La ejecución de la obra "**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)**" tiene como fin contribuir a restablecer la seguridad en el territorio fronterizo, permitiendo avanzar y recuperar la legalidad, garantizando la seguridad y convivencia de acuerdo con las políticas de seguridad y las directrices nacionales.

Las especificaciones técnicas de construcción son las establecidas en la Norma Técnica Colombiana, norma sismo resistente NSR-10, las especificaciones técnicas de diseño y estudios técnicos comandos y distritos policía a nivel nacional y la resolución No. 0493 del 12 de diciembre del 2013.

2.3. Actividades a ejecutar

El proyecto tiene dos etapas que consisten en la elaboración de estudios y diseños y una siguiente etapa la construcción, de esta manera se garantiza el cumplimiento del alcance del proyecto.

En el desarrollo del primer componente de estudios y diseños se tendrá en cuenta el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño urbano del espacio público, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño de red de incendios, diseño de red de gas, diseño eléctrico e iluminación, diseño voz y datos, diseño mecánico y

bioclimático, presupuesto y programación de obra y otras que se deriven de los mismos.

Para el componente de construcción se desarrollará el presupuesto que salga del resultado del componente de estudios y diseños para el área de construcción cubierto y el área de construcción descubierto; dando cumplimiento a todos los estándares de calidad, durabilidad y estabilidad de esta.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Datos generales

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO Nº	LP-SG-01362-2021 del 31 de agosto del 2021
OBJETO:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN E MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C. Nº	1.090.407.083 DE CÚCUTA
ACTA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: DIECISIETE (17) MESES, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
PRORROGA No. 01	OTROSÍ ADICIONAL No. 01 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 POR DIECISIETE (17) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.
PRORROGA No. 02	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 DEL 15 DE ABRIL DE 2024 POR DOCE (12) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025.
PRORROGA No. 03	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 03 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 POR DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.
PRORROGA No. 04	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 04 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 POR DOS (02) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
PLAZO TOTAL	TREINTA Y OCHO MESES (38) Y VEINTICUATRO (24) DIAS, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
VALOR INICIAL	$ 892.406.699,00 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 22.089.603.889,00 – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: $ 22.982.010.588,00 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.
VALOR INICIAL SEGÚN	$ 889.503.871,00 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
BALANCE No. 01 (Estudios y Diseños)	$ 22.092.506.717,00 – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: $ 22.982.010.588,00 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.
VALOR ADICIONAL No. 01 (Presupuesto de Obra)	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 DEL 15 DE ABRIL DE 2024 POR UN VALOR DE $ 11.490.240.893,00
VALOR ADICIONAL No. 02 (Reparaciones)	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 03 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 POR UN VALOR DE $ 2.583.294.926,00
VALOR ADICIONAL No. 03 (Presupuesto de Obra)	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 04 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 POR UN VALOR DE $ 2.838.905.865,00
VALOR TOTAL (Presupuesto de Obra)	$ 36.421.653.475,00
VALOR TOTAL (Presupuesto de Obra + Reparaciones)	$ 39.004.948.401,00
VALOR TOTAL (Presupuesto de Obra + Reparaciones + Estudios y Diseños)	$ 39.894.452.272,00
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RUBRO	**2.3.2.02.02.008** – servicios prestados a las empresas y servicio de producción – 11 RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. **Rubro 2.3.2.02.02.055** – servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546 – 2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR **2.3.2.02.02.008** – Servicio de la construcción -11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE **2.3.2.02.02.009** – Servicio para la comunidad, sociales y personales, cuya fuente de recursos es 1.2.3.2.06 Contribución sobre contratos de obra pública, con Código BPIN 2020004540020-fortalecimiento institucional y servicio de apoyo integral, como estrategia para la seguridad ciudadana en el departamento Norte de Santander, producto DANE: 91199 – Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.
SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA

3.2. Aspectos financieros

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 002246 del 06 de julio de 2021

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $892.406.699,00 **TOTALES: $892.406.699,00**
	No. 002247 del 06 de julio de 2021 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 35-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR por un valor de $21.654.977.873,30 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $509.624.744,70 **TOTALES: $22.164.602.618,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3572 del 31 de agosto de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE – Disponibilidad 2246-juli-06/2021 por un valor de $892.406.699,00 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 35-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR – Disponibilidad 2247-juli-06/2021 por un valor de $21.654.977.873,30 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE – Disponibilidad 2247-juli-06/2021 por un valor de $434.626.015,70 **TOTALES: $22.982.010.588,00**
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. (**$ 22.982.010.588,00**)
FORMA DE PAGO:	**Anticipo: N.A.** El departamento pagara al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así: **a). COMPONENTE 1 – estudio y diseños:** un único pago correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($892.406.699,00) previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación de recibo a satisfacción de la interventoría de los estudios y diseños con sus anexos. Los diseños deben estar aprobados por la DIRAF, y el producto debe ser recibido por el ministerio del interior. **b). COMPONENTE 2 – CONSTRUCCIÓN:** El Cien por ciento (100%) del valor de la construcción se pagarán mediante Actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	Interventoría del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoría designado o contratado por la secretaria de GOBIERNO y con el Visto Bueno del secretario de GOBIERNO del Departamento. Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor del contrato, y supervisor de interventoría. Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Gobierno la factura o cuenta de cobro correspondiente. Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y probado. Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y especificaciones técnicas del proyecto.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **VIGENCIAS ACTUALIZADAS**	No. 00 001370 del 12 de abril de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S por un valor de $437.528.843,70 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.11.08-R.B OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35VE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR VIGENCIAS EXPIRADAS por un valor de $21.654.977.873,30 **TOTALES: $22.092.506.717,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS**	No. 00 001371 del 12 de abril de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S por un valor de $3.589.950.332,61 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR por un valor de $5.422.652.518,79 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S por un valor de $2.477.638.041,69 **TOTALES: $11.490.240.893,09**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 001232 del 15 de abril de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – DISPONIBILIDAD No. 001371-ABRIL-12/2024 por un valor de $3.589.950.332,61 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR – DISPONIBILIDAD No. 001371-ABRIL-12/2024 por un valor de $5.422.652.518,79 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – DISPONIBILIDAD No. 001371-ABRIL-12/2024 por un valor de $2.477.638.041,69 **TOTALES: $11.490.240.893,09**
VALOR ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA:	ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. (**$11.490.149.893,00**)
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. (**$34.472.251.481,00**)
REGISTRO PRESUPUESTAL **VIGENCIAS ACTUALIZADAS**	No. 00 002176 del 22 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – DISPONIBILIDAD No. 001370-ABRIL-12/2024 por un valor de $437.528.843,70 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.11.08-R.B OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35VE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	INTERIOR VIGENCIAS EXPIRADAS – DISPONIBILIDAD No. 001370-ABRIL-12/2024 por un valor de $21.654.977.873,30 **TOTALES: $22.092.506.717,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS**	No. 00 005031 del 15 de octubre de 2025 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $2.583.294.926,00 **TOTALES: $2.583.294.926,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS**	No. 00 005393 del 31 de octubre de 2025 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD No. 005031-15/10/2024 por un valor de $2.583.294.926,00 **TOTALES: $2.583.294.926,00**
VALOR ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA (REPARACIONES):	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE (**$2.583.294.926,00)**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 001367 del 12 de enero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $ 2.838.905.865,00 **TOTALES: $ 2.838.905.865,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 002851 del 11 de febrero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD No. 001367-

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	12/10/2026 por un valor de $ 2.838.905.865,00 **TOTALES: $ 2.838.905.865,00**
VALOR ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA:	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 2.838.905.865,00)**

3.2.1. Estado financiero del contrato de obra

A la fecha del presente informe se han generado doce (12) actas de recibo parcial, al contrato de obra, las cuales se describen en el siguiente cuadro:
(se actualiza porcentaje de actas de obra ejecutadas de acuerdo con el nuevo valor total del contrato de obra debido al adicional en recursos No. 03)

ESTADO FINANCIERO DE CONTRATO DE OBRA					
CONCEPTO	**FECHA**	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA**	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR DE ACTA DE OBRA EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO DE ACTAS DE OBRA**
Acta Parcial No. 01	13/05/2022	2,23%	2,23%	$ 889.503.871,00	$ 889.503.871,00
Acta Parcial No. 02	17/04/2024	17,59%	19,82%	$ 7.018.501.487,00	$ 7.908.005.358,00
Acta Parcial No. 03	28/05/2024	6,11%	25,93%	$ 2.437.008.899,00	$ 10.345.014.257,00
Acta Parcial No. 04	02/08/2024	4,24%	30,17%	$ 1.693.360.996,00	$ 12.038.375.253,00
Acta Parcial No. 05	21/10/2024	5,50%	35,67%	$ 2.192.783.899,00	$ 14.231.159.152,00
Acta Parcial No. 06	27/11/2024	3,62%	39,29%	$ 1.444.696.737,00	$ 15.675.855.889,00
Acta Parcial No. 07	13/12/2024	4,29%	43,58%	$ 1.710.779.195,00	$ 17.386.635.084,00
Acta Parcial No. 08	31/01/2025	2,91%	46,49%	$ 1.162.312.401,00	$ 18.548.947.485,00
Acta Parcial No. 09	19/02/2025	7,11%	53,60%	$ 2.834.860.248,00	$ 21.383.807.733,00
Acta Parcial No. 10	16/12/2025	0,39%	53,99%	$ 157.291.519,00	$ 21.541.099.252,00
Acta Parcial No. 11	11/03/2026	2,76%	56,76%	$ 1.102.566.931,00	$ 22.643.666.180,00
Acta Parcial No. 12	15/04/2026	4,07%	60,83%	$ 1.622.602.934,00	$ 24.266.269.114,00
Acta Parcial No. 13	EN CURSO	1,33%	62,16%	$ 529.537.598,00	$ 24.795.806.713,00
TOTAL		**62,16%**		**$ 24.795.806.713,00**	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA					**$ 39.894.452.272,00**
TOTAL, PAGADO EN ACTAS					**$ 24.266.269.114,00**
TOTAL, VALOR FALTANTE POR COBRAR					**$ 15.098.645.559,00**

3.3. Aspectos administrativos contractuales

A la fecha y para el periodo de corte del informe, se han emitido diversos actos administrativos que conforman la trazabilidad del contrato de obra No. LP-SG-01362-2021. Estos documentos se relacionan y describen a continuación según su respectiva línea de tiempo:

- ✓ Celebración de contrato de obra No. LP-SG-01362-2021 el dia 31 de Agosto del 2021 entre el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC

y la Gobernación del Departamento Norte de Santander, suscrito a la Secretaria de Gobierno.

- ✓ El día 19 de Octubre de 2021 se suscribe el Acta de Inicio al contrato de Obra No. LP-SG-01362-2021.

- ✓ El día 13 de Mayo de 2022 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, correspondiente a la elaboración y entrega de estudios y diseños del proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN E MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" por un valor de $889.503.871,00.

- ✓ El día 29 de Diciembre de 2022 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, PRORROGA No. 01 por diecisiete (17) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2024.

- ✓ El día 14 de Febrero de 2023 se suscribe el Acta de Suspensión No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.

- ✓ El día 03 de Noviembre de 2023 se suscribe el Acta de Reinicio No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.

- ✓ El día 15 de Abril de 2024 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, adicional en recursos No. 01 por un valor de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($11.490.240.893,00) y prorroga No. 02 por doce (12) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2025.

- ✓ El día 17 de Abril de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $7.018.501.487,00.

- ✓ El día 22 de Mayo de 2024 se suscribe la minuta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 02 Que mediante Decreto No. 000714 del 4 de abril de 2024, Por la cual se incorporan las vigencias expiradas y/o pasivos exigibles en el decreto de liquidación del Presupuesto General de rentas, recursos de capital y gasto del departamento Norte de Santander, para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), contenido en el Decreto No. 004167 del 28 de diciembre de 2023, se constituyó la vigencia expirada o pasivo exigible para el Convenio interadministrativo 1546-2020 con el Ministerio del Interior, derivado el contrato electrónico de obra pública No. 01362-2021.

- ✓ El día 28 de Mayo de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $2.437.008.899,00.

- ✓ El día 02 de Agosto de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 04 al contrato

de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.693.360.996,00.

- ✓ El día 21 de Octubre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 05 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $2.192.783.899,00.
- ✓ El día 27 de Noviembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 06 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.444.696.737,00.
- ✓ El día 13 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 07 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.710.779.195,00.
- ✓ El día 26 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Suspensión No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El 07 Enero de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 31 de Enero de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 08 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.162.312.401,00.
- ✓ El día 19 de Febrero de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 09 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $2.834.860.248,00.
- ✓ El día 24 de Febrero de 2025 se suscribe el Acta de Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 24 de Junio de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 25 de Agosto de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 25 de Septiembre de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 10 Octubre de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 31 de Octubre de 2025 se suscribe la minuta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, adicional en recursos No. 02 por un valor de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($2.583.294.926,00) y prorroga No. 03 por dos (02) meses y diecisiete (17) dias, hasta el 31 de Marzo de 2026.
- ✓ El día 16 de Diciembre de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 10 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $ 157.291.519,00.
- ✓ El día 11 de Febrero de 2026 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL

MODIFICATORIO No. 04 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, adicional en recursos No. 03 por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.838.905.865,00) y prorroga No. 04 por dos (02) meses, hasta el 31 de Mayo de 2026.

- ✓ El día 16 de febrero de 2026 se aprueba el balance al presupuesto de reparaciones sin afectar el valor contratado.
- ✓ El día 11 de Marzo de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 11 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $ 1.102.566.931,00.
- ✓ El día 15 de Abril de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 12 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $ 1.622.602.934,00.

3.3.1. Relación de documentos contractuales

RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	
DOCUMENTO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
Minuta Contrato de Obra	31 de Agosto del 2021
Acta de Inicio de Obra	19 de Octubre de 2021
Acta de Recibo Parcial No. 01	13 de Mayo de 2022
Minuta Otrosí Adicional No. 01	29 de Diciembre de 2022
Acta de suspensión No. 01	14 de Febrero del 2023
Acta de Reinicio No. 01	03 de Noviembre del 2023
Minuta Otrosí Adicional No. 02	15 de Abril de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 02	17 de Abril de 2024
Minuta Otrosí Modificatorio No. 02	22 de Mayo de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 03	28 de Mayo de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 04	02 de Agosto de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 05	21 de Octubre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 06	27 de Noviembre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 07	13 de Diciembre de 2024
Acta de Suspensión No. 02	26 de Diciembre de 2024
Acta de Reinicio No. 02	07 Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 08	31 de Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 09	19 de Febrero de 2025
Acta de Suspensión No. 03	24 de Febrero de 2025
Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03	24 de Junio de 2025
Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03	25 de Agosto de 2025
Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03	25 de Septiembre de 2025
Acta de Reinicio No. 03	10 Octubre de 2025
Minuta Otrosí Modificatorio No. 03	31 de Octubre de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 10	16 de Diciembre de 2025
Minuta Otrosí Adicional y Modificatorio No. 04	11 de Febrero de 2026
Balance presupuesto reparaciones No. 01	16 Febrero de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 11	11 de Marzo de 2026

RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	
DOCUMENTO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
Acta de Recibo Parcial No. 12	15 de Abril de 2026

3.4. Garantías

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN CONTRATO DE OBRA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. Fecha de Expedición: 08/09/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.059,00	08_09_2.021	08_05_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,00	30_12_2.021	30_12_2025
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,00	30_12_2022	30_12_2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. Fecha de Expedición: 08/09/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,00	08_09_2021	30_12_2022
	Patronal	$ 344.730.158,00	08_09_2021	30_12_2022
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,00	08_09_2021	30_12_2022
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,00	08_09_2021	30_12_2022

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4. Fecha de Expedición: 03/11/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.059,00	19_10_2.021	18_06_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,00	19_10_2.021	09_02_2026
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,00	09_02_2023	09_02_2028
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4. Fecha de Expedición:	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,00	19_10_2021	09_02_2023
	Patronal	$ 344.730.158,00	19_10_2021	09_02_2023
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,00	19_10_2021	09_02_2023
	Vehículos Propios y	$ 344.730.158,00	19_10_2021	09_02_2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA				
03/11/2021	No Propios			

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 01 (PRORROGA No. 01)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5. Fecha de Expedición: 24/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.058,80	29_12_2.022	01_10_2024
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,20	29_12_2.022	31_05_2027
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,40	31_05_2024	31_05_2029
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5. Fecha de Expedición: 24/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,40	19_10_2021	31_05_2024
	Patronal	$ 344.730.158,82	19_10_2021	31_05_2024
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,82	19_10_2021	31_05_2024
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,82	19_10_2021	31_05_2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 01				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 6. Fecha de Expedición: 28/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.058,80	03_11_2.023	17_06_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,20	03_11_2.023	17_02_2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,40	17_02_2025	17_02_2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 6. Fecha de Expedición: 28/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,40	19_10_2021	17_02_2025
	Patronal	$ 344.730.158,82	19_10_2021	17_02_2025
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,82	19_10_2021	17_02_2025
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,82	19_10_2021	17_02_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 01 Y PRORROGA No. 02)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 7. Fecha de Expedición: 16/04/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.447.225.148,10	16_04_2.024	30_09_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.170.837.722,15	16_04_2.024	31_05_2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 10.341.675.444,30	31_05_2025	31_05_2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 7. Fecha de Expedición: 16/04/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.723.612.574,05	19_10_2021	31_05_2025
	Patronal	$ 861.806.287,00	19_10_2021	31_05_2025
	Contratista y Subcontratistas	$ 861.806.287,00	19_10_2021	31_05_2025
	Vehículos Propios y No Propios	$ 861.806.287,00	19_10_2021	31_05_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 02				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 8-9. Fecha de Expedición: 16/01/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.447.225.148,10	26_12_2.024	12_10_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.170.837.722,15	26_12_2.024	12_06_2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 10.341.675.444,30	12_06_2025	12_06_2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 8-9. Fecha de Expedición: 16/01/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.723.612.574,05	19_10_2021	12_06_2025
	Patronal	$ 861.806.287,00	19_10_2021	12_06_2025
	Contratista y Subcontratistas	$ 861.806.287,00	19_10_2021	12_06_2025
	Vehículos Propios y No Propios	$ 861.806.287,00	19_10_2021	12_06_2025


RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 12. Fecha de Expedición: 05/11/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.705.554.640,70	10_10_2.025	31_03_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.558.331.961,05	10_10_2.025	31_03_2026
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 11.116.663.922,10	31_03_2026	31_03_2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 12. Fecha de Expedición: 05/11/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.852.777.320,35	19_10_2021	31_03_2026
	Patronal	$ 926.388.660,18	19_10_2021	31_03_2026
	Contratista y Subcontratistas	$ 926.388.660,18	19_10_2021	31_03_2026
	Vehículos Propios y No Propios	$ 926.388.660,18	19_10_2021	31_03_2026


RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 04 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 03 Y PRORROGA No. 04)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 14. Fecha de Expedición: 18/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.989.445.227,20	19_10_2.021	30_09_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.984.167.840,80	19_10_2.021	31_05_2029
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 11.968.335.681,60	31_05_2026	31_05_2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 13. Fecha de Expedición: 18/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.994.722.613,60	19_10_2021	31_05_2026
	Patronal	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_05_2026
	Contratista y Subcontratistas	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_05_2026
	Vehículos Propios y No Propios	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_05_2026

4. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DE OBRA

En el siguiente cuadro se presenta los porcentajes programados vs los ejecutados con sus respectivos valores acumulados al periodo comprendido del 19 de octubre de 2021 (inicio) al 24 de mayo de 2026 (fecha de corte), que se relacionan del semanal No. 01 al semanal No. 100. Estos porcentajes son actualizados de acuerdo con el adicional No. 03 en recursos. Los porcentajes reportados no incluye el valor de estudios y diseños, solo se relaciona el valor y porcentaje correspondiente a la ejecución de obra física.

OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (%)	**96,17%**	**VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**	**$ 37.511.639.888,33**
OBRA EJECUTADA ACUMULADA (%)	**59,92%**	**VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**$ 23.906.302.842,00**

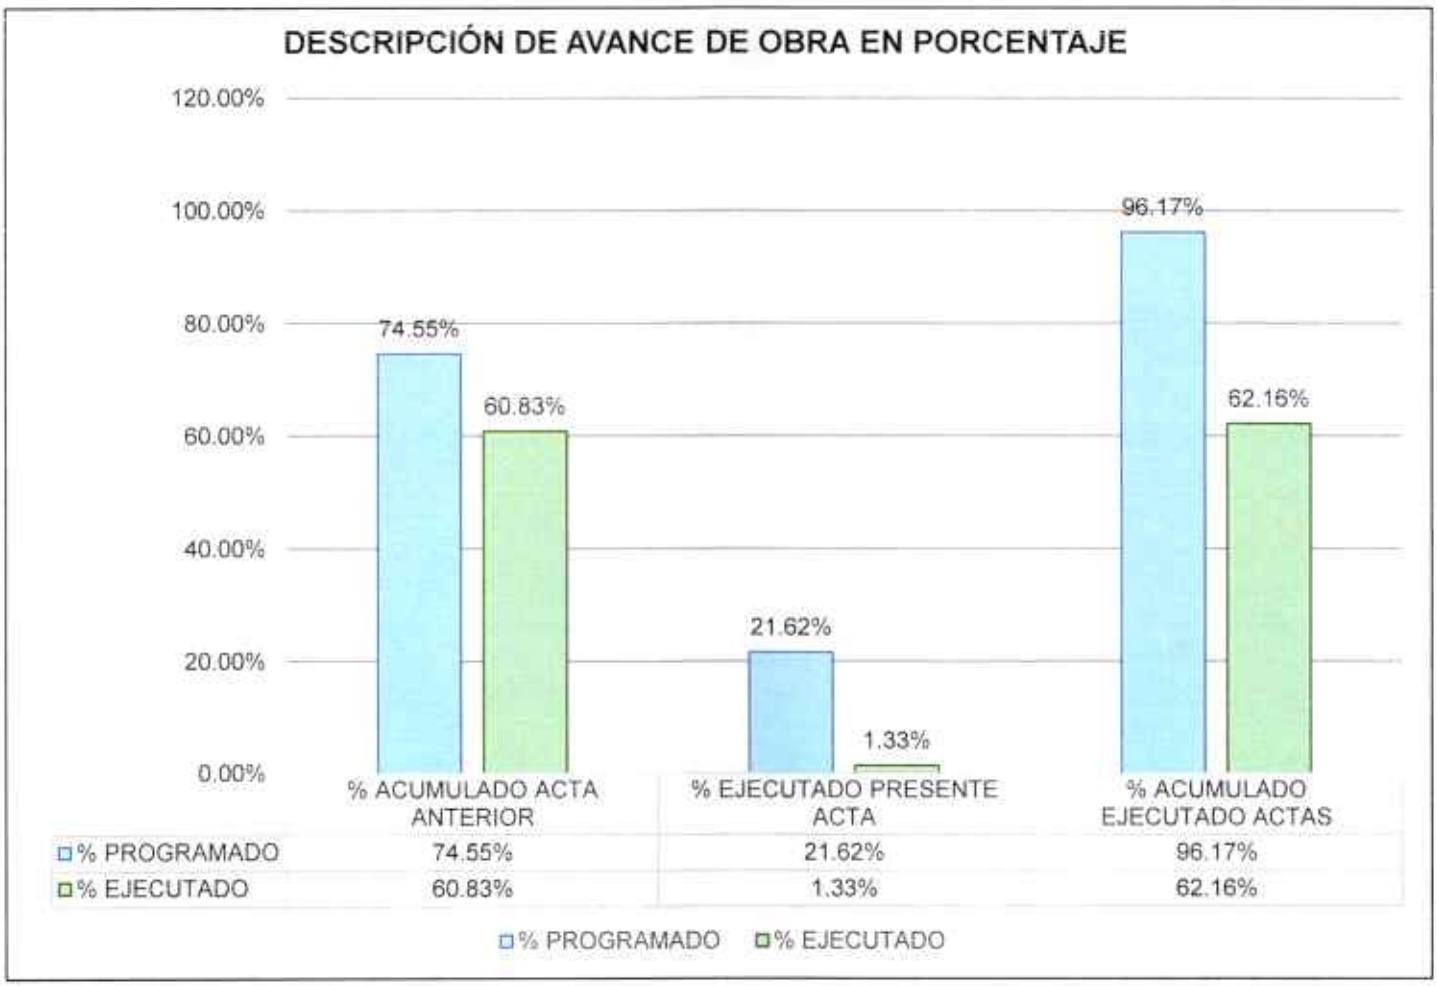

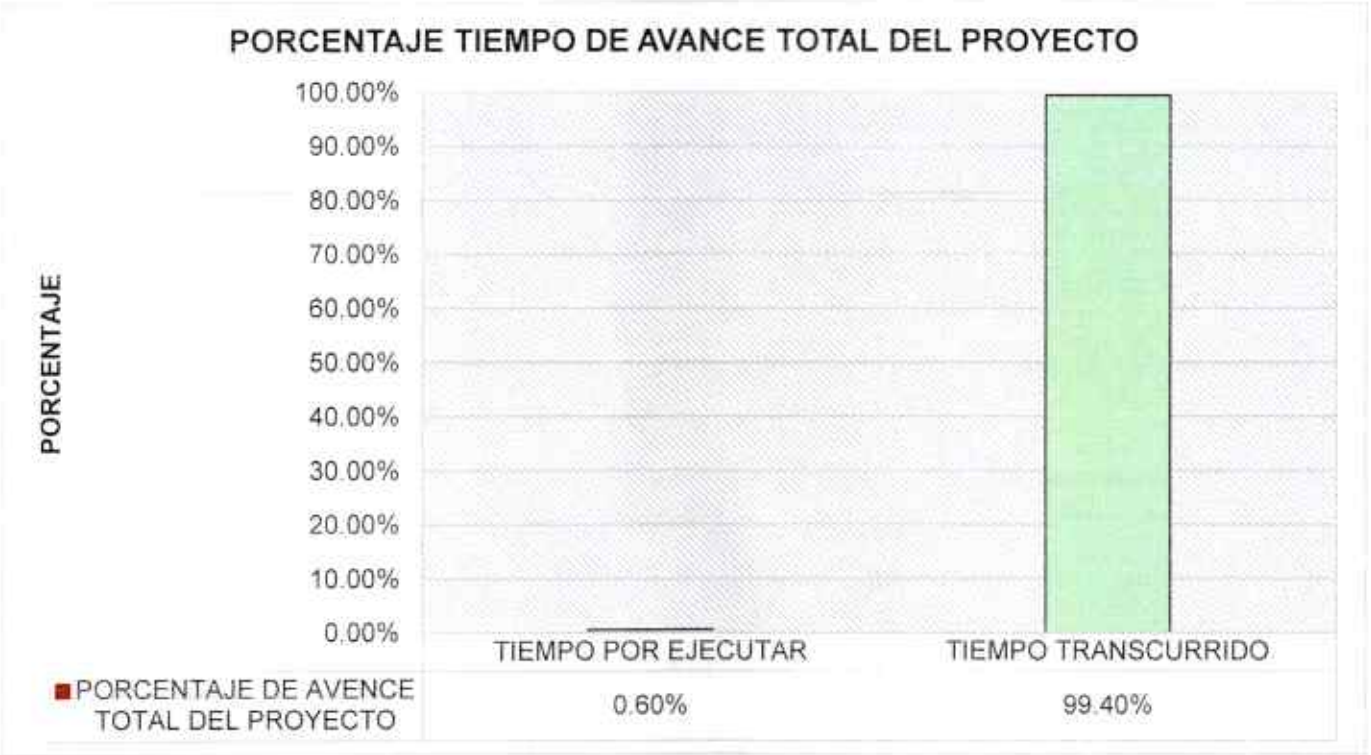

4.1. Actividades realizadas por el contratista

Durante el periodo comprendido entre el 16 de abril al 24 de mayo de 2026 el contratista ejecuta el presupuesto de reparaciones y realiza las siguientes actividades:

REPARACIONES

2.2.3 Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.





2.2.4 Acero de refuerzo.




2.4.1 Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.




2.4.3 Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.




2.4.5 Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.




2.4.6 NP Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg.




2.6.2 NP Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.




2.6.3 NP Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.





2.7.1 NP Sum./inst. tuberia PVC-conduit ø 3/4plg.



2.7.2 NP Salida de toma común. Reparación






3.4.2 Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.




3.4.7 Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.




3.5.1 Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.

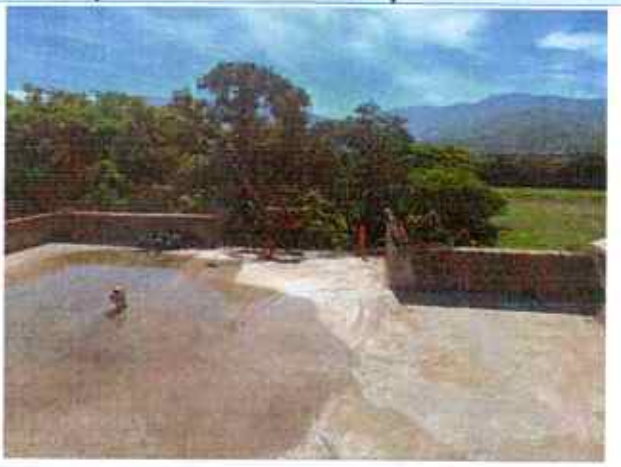

5.1.3 Demolición de muros con elementos no estructurales.



5.2.3 Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.






5.4.1 Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.





5.4.2 Muro perimetral dobie e: 0,24 m en ladrillo de obra común.

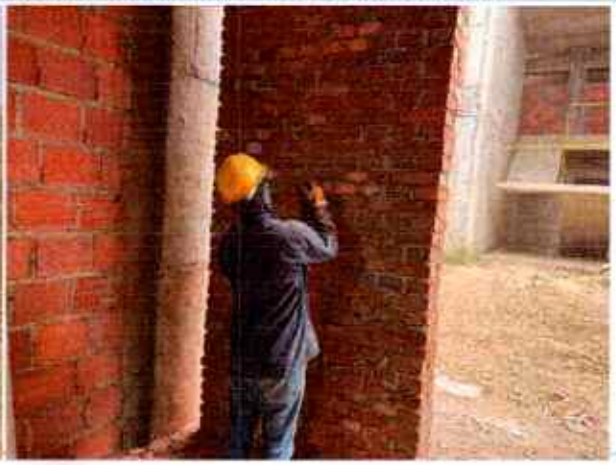5.4.4 Pañete liso para muro en mortero 1:4.




5.4.7 Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.




5.5.1 Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.




5.9.1 Sum./inst. tubería PVC-conduit ø 3/4plg.




5.9.2 Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.




5.9.3 NP Salida de toma común. Reparación.




5.9.4 NP Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación.




CONSTRUCCIÓN

2,005 Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tuberia. Compactada manualmente.





2,006 Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.




7,004 Filos y dilataciones.



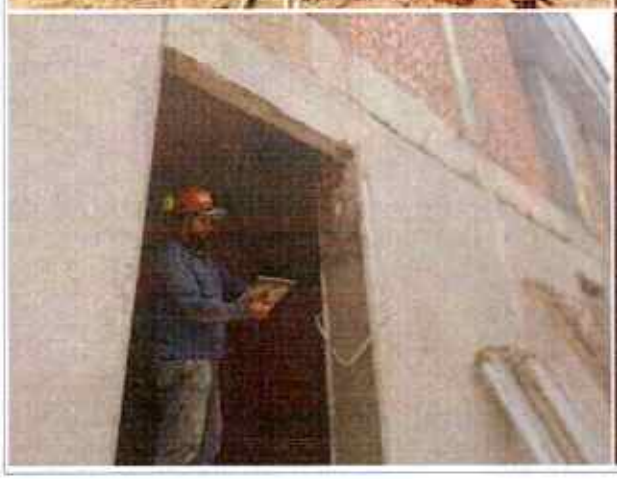


7,008 Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.




17,003 Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.




17,004 Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.




20,001	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.




20,002	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.




20,003	Sum./inst. Tubería PVC - Presion RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.





20,004	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.




20,006	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.




20,008	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.

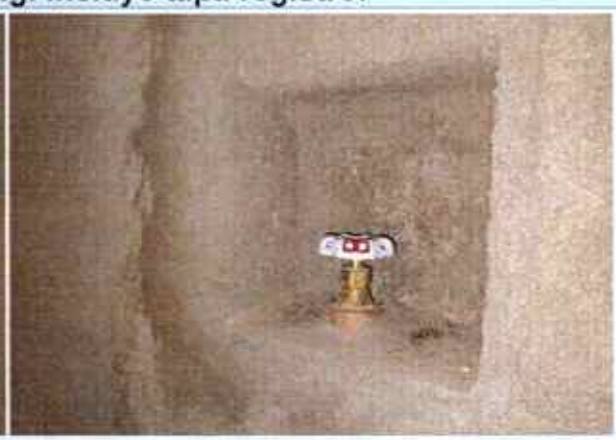20,011	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.




20,012	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.

21,002	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg.



21,006	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.

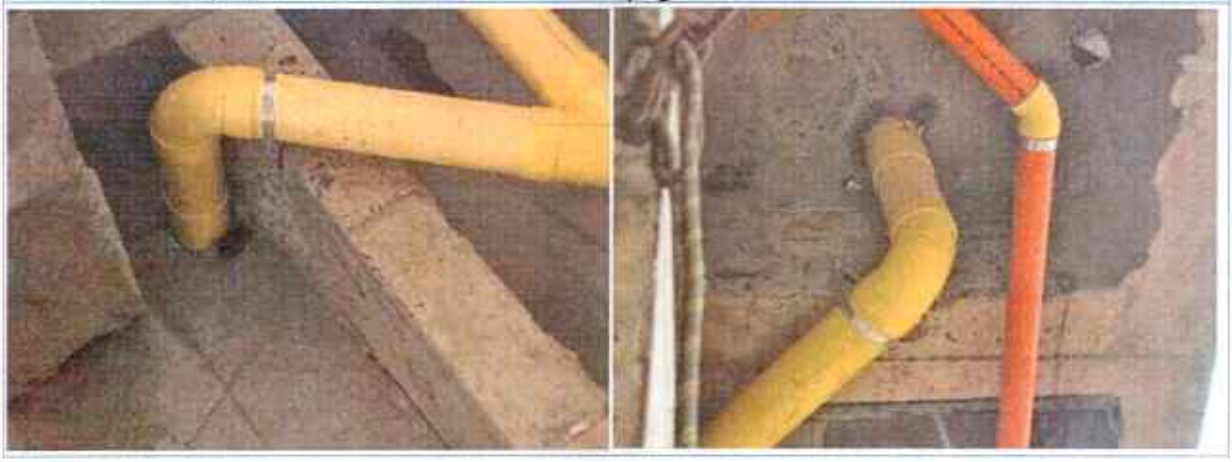

22,001	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg.



22,002	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.




22,006	Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm.




26,001	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg.




26,002	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg.

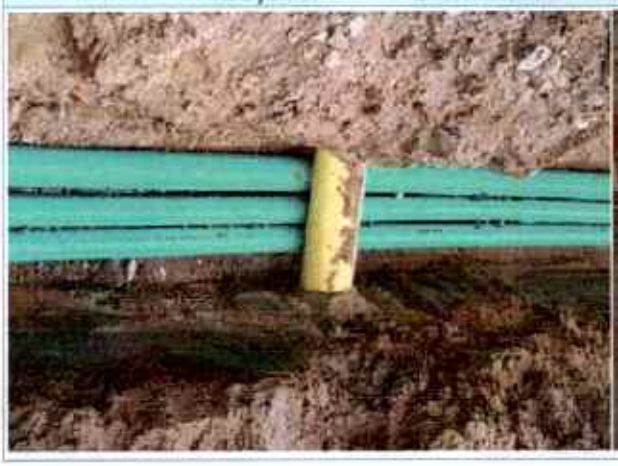


26,003	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg.




26,005	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg.




26,009	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.




28,011 Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI.





29,001 Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.




29,012 Salida de toma común.




29,013	Salida de toma GFCI.

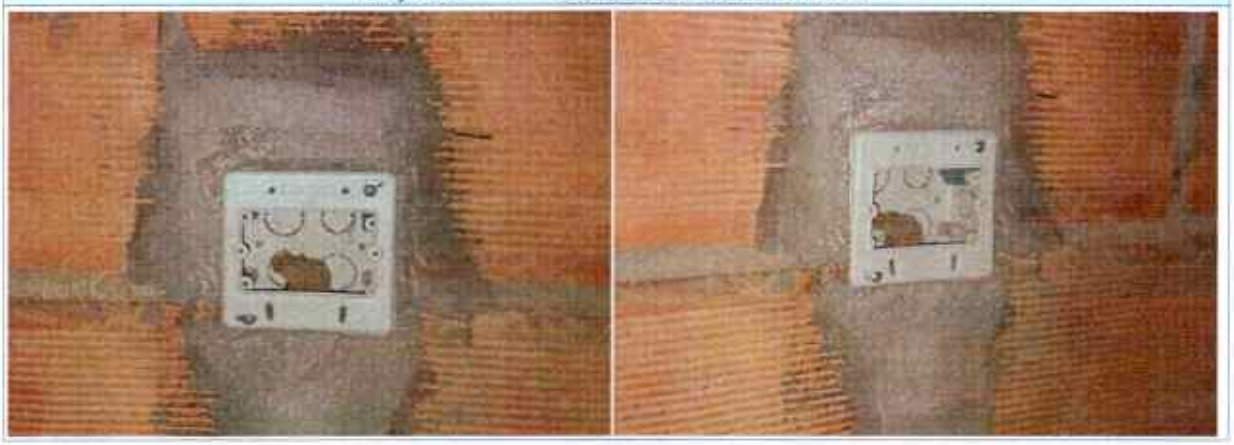

29,014	Salida de toma regulado color Naranja.



41,016	Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico



41,020 Rejillas para cunetas pluviales



5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Datos generales

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°	CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD
NIT	901.527.625-4
REPRESENTANTE LEGAL	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
C.C. N°	60.377.366 DE CÚCUTA
ACTA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: DIECISIETE (17) MESES, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
PRORROGA No. 01	OTROSÍ ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 POR DIECISIETE (17) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.
PRORROGA No. 02	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR DOCE (12) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025.
PRORROGA No. 03	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.
PRORROGA No. 04	OTROSÍ ADICIONAL No. 03 Y PRORROGA No. 04 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 POR DOS (02) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
PLAZO TOTAL	TREINTA Y OCHO MESES (38) Y VEINTICUATRO (24) DIAS, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
VALOR INICIAL	$ 535.444.020,00 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 1.881.750.620,00 – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: $ 2.417.194.640,00 DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.
VALOR ADICIONAL No. 01	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR UN VALOR DE NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 ($922.411.625,70)
VALOR ADICIONAL No. 02	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR UN VALOR DE CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE ($180.687.171,00)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR ADICIONAL No. 03	OTROSÍ ADICIONAL No. 03 Y PRORROGA No. 04 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 POR UN VALOR DE DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 227.964.141,00).
VALOR TOTAL (Contrato de Interventoria incluye estudios y Diseños)	TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 70/100 M/CTE ($ 3.748.257.577,70).
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RUBRO	**2.3.2.02.02.008** – servicios prestados a las empresas y servicio de producción – 11 RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE – 11-5% CONTRATO DE OBRA. **2.3.2.02.02.055** – servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546 – 2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR – OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO N.C.P. **2.3.2.02.02.008** Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – Fuente Recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario. **2.3.2.02.02.009** Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Codigo BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario.
SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO

5.2. Aspectos financieros

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2468 del 28 de julio de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $2.356.531.569,62. 11-5% CONTRATO DE OBRA $62.903.676,38. **TOTALES: $2.419.435.243,00**

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 4428 del 06 de octubre de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $2.356.531.569,62. 11-5% CONTRATO DE OBRA $60.663.070,38. **TOTALES: $2.417.194.640,00**
VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS **($2.417.194.640,00)** M/CTE. EL DEPARTAMENTO, pagará el valor del contrato celebrado según actas parciales en porcentajes equivalentes al avance ejecutado del contrato vigilado, de acuerdo a las actas suscritas, previa presentación de los informes de interventoría correspondientes, acompañados de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y acreditación del pago de sus obligaciones en seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos laborales, y parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. NOTA 1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: EL INTERVENTOR deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. producto(s) radicado(s) en medio físico ye en magnético, debidamente aprobados por el supervisor del contrato, 2. Constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas y, 3. Factura, luego haber sido emitido el recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **VIGENCIAS ACTUALIZADAS**	No. 00 002570 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 112 – EXPIRADAS DE FONDO DE SEGURIDAD por un valor de $1.959.485.819,00 **TOTALES: $1.959.485.819,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS**	No. 00 002557 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO DEL INTERIOR por un valor de $500.000.000,00 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso:

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 91199 – otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. por un valor de $422.411.625,70 **TOTALES: $922.411.625,70**
REGISTRO PRESUPUESTAL **VIGENCIAS ACTUALIZADAS**	No. 00 002362 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 112 – EXPIRADAS DE FONDO DE SEGURIDAD – DISPONIBILIDAD 002570-MAY-31/2024 por un valor de $1.959.485.819,00 **TOTALES: $1.959.485.819,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS**	No. 00 002363 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO DEL INTERIOR – DISPONIBILIDAD 002557-MAY-31/2024 por un valor de $500.000.000,00 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 91199 – otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. DISPONIBILIDAD 002557-MAY-31/2024 por un valor de $422.411.625,70 **TOTALES: $922.411.625,70**
VALOR ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 (**$922.411.625,70**).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02**	No. 00 005032 del 15 de octubre de 2025 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
EN RECURSOS	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729 – Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $180.687.171,00 **TOTALES: $180.687.171,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS**	No. 00 005393 del 07 de noviembre de 2025 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729 – Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD 005032 – 15/10/2025 por un valor de $180.687.171,00 **TOTALES: $180.687.171,00**
VALOR ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (REPARACIONES):	CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (**$180.687.171,00**)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 001366 del 12 de enero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $ 227.964.141,00 **TOTALES: $ 227.964.141,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 002876 del 19 de febrero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD 001366 – 12/01/2026 por un valor de $227.964.141,00 **TOTALES: $ 227.964.141,00**
VALOR ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE **($227.964.141,00).**
VALOR TOTAL (Contrato de Interventoría incluye estudios y Diseños)	TRES MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 70/100 (**$3.520.293.436,70**)

5.2.1. Estado financiero del contrato de interventoría

A la fecha del presente informe se han generado y pagado diez (10) acta de recibo parcial, las cuales se describen el ene siguiente cuadro:
(se actualiza porcentaje de actas parciales de interventoría cobradas de acuerdo con el actual valor del contrato de interventoria debido al adicional en recursos No. 03)

ESTADO FINANCIERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
CONCEPTO	**FECHA**	**PORCENTAJE DE ACTA COBRADA**	**PORCENTAJE DE ACTAS ACUMULADAS**	**VALOR DE ACTA COBRADA**	**VALOR ACUMULADO DE ACTAS DE INTERVENTORÍA**
Acta Parcial No. 01	13/05/2022	14,27%	14,27%	$ 534.948.153,00	$ 534.948.153,00
Acta Parcial No. 02	14/06/2024	12,47%	26,74%	$ 467.267.687,00	$ 1.002.215.840,00
Acta Parcial No. 03	09/08/2024	4,37%	31,11%	$ 163.974.667,65	$ 1.166.190.507,65
Acta Parcial No. 04	21/10/2024	5,67%	36,78%	$ 212.398.958,50	$ 1.378.589.466,15
Acta Parcial No. 05	27/11/2024	3,73%	40,51%	$ 139.929.502,53	$ 1.518.518.968,68
Acta Parcial No. 06	13/12/2024	4,37%	44,89%	$ 163.974.667,65	$ 1.682.493.636,33
Acta Parcial No. 07	31/01/2025	3,06%	47,94%	$ 114.548.494,91	$ 1.797.042.131,24
Acta Parcial No. 08	19/02/2025	7,32%	55,27%	$ 274.515.635,04	$ 2.071.557.766,28
Acta Parcial No. 09	11/03/2026	2,35%	57,62%	$ 88.121.133,30	$ 2.159.678.899,58
Acta Parcial No. 10	19/04/2026	3,21%	60,83%	$ 120.319.068,00	$ 2.279.997.967,58
Acta Parcial No. 11	EN CURSO	1,33%	62,16%	$ 49.851.826,00	$ 2.329.849.793,58
TOTAL		**62,16%**		**$ 2.329.849.793,58**	
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					**$ 3.748.257.577,70**
TOTAL, PAGADO EN ACTAS					**$ 2.279.997.967,58**
TOTAL, VALOR FALTANTE POR COBRAR					**$ 1.418.407.784,12**

5.3. Aspectos administrativos contractuales

A la fecha y para el periodo de corte del informe mensual, se han emitido diversos actos administrativos que conforman la trazabilidad del contrato de interventoria No. CM-SG-1568-

2021. Estos documentos se relacionan y describen a continuación según su respectiva línea de tiempo:

- ✓ Celebración de contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021 entre el contratista de interventor UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD y la Gobernación del Departamento Norte de Santander, suscrito a la Secretaria de Gobierno.

- ✓ El día 19 de Octubre de 2021 se suscribe el Acta de Inicio al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El día 13 de Mayo de 2022 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, correspondiente a la elaboración y entrega de estudios y diseños del proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN E MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" por un valor de $ 534.948.153,00.

- ✓ El día 30 de Diciembre de 2022 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, PRORROGA No. 01 por diecisiete (17) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2024.

- ✓ El día 14 de Febrero de 2023 se suscribe el Acta de Suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El día 03 de Noviembre de 2023 se suscribe el Acta de Reinicio No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El día 31 de Mayo de 2024 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, adicional en recursos No. 01 por un valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 ($922.411.625,70) y prorroga No. 02 por doce (12) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2025.

- ✓ El día 14 de Junio de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 467.267.687,00.

- ✓ El día 09 de Agosto de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 163.974.667,65.

- ✓ El día 21 de Octubre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 04 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 212.398.958,50.

- ✓ El día 27 de Noviembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 05 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 147.506.306,54.

- ✓ El día 13 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 06 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 172.853.452,29.
- ✓ El día 26 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Suspensión No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El 07 Enero de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 31 de Enero de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 07 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 120.750.986,02.
- ✓ El día 24 de Febrero de 2025 se suscribe el Acta de Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 24 de Junio de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 25 de Agosto de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 25 de Septiembre de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 10 Octubre de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 18 de Noviembre de 2025 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, adicional en recursos No. 02 por un valor de CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE ($180.687.171,00) y prorroga No. 03 por dos (02) meses y diecisiete (17) dias, hasta el 31 de Marzo de 2026.
- ✓ El día 20 de Febrero de 2026 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL MODIFICATORIO No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, adicional en recursos No. 03 por un valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 227.964.141,00) y prorroga No. 04 por dos (02) meses, hasta el 31 de Mayo de 2026.
- ✓ El día 11 de Marzo de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 09 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 88.121.133,30.
- ✓ El día 19 de Mayo de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 10 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 120.319.068,00.

5.3.1. Relación de documentos contractuales

RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	
DOCUMENTO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
Minuta Contrato de Obra	05 de Octubre del 2021
Acta de Inicio de Obra	19 de Octubre de 2021
Acta de Recibo Parcial No. 01	13 de Mayo de 2022
Minuta Otrosí Adicional No. 01	30 de Diciembre de 2022
Acta de suspensión No. 01	14 de Febrero del 2023
Acta de Reinicio No. 01	03 de Noviembre del 2023
Minuta Otrosí Adicional No. 02	31 de Mayo de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 02	14 de Junio de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 03	09 de Agosto de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 04	21 de Octubre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 05	27 de Noviembre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 06	13 de Diciembre de 2024
Acta de Suspensión No. 02	26 de Diciembre de 2024
Acta de Reinicio No. 02	07 Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 07	31 de Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 08	19 de Febrero de 2025
Acta de Suspensión No. 03	24 de Febrero de 2025
Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03	24 de Junio de 2025
Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03	25 de Agosto de 2025
Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03	25 de Septiembre de 2025
Acta de Reinicio No. 03	10 Octubre de 2025
Minuta Otrosí Modificatorio No. 03	18 de Noviembre de 2025
Munita Otrosí adicional No. 03 y prorroga No. 04	20 de Febrero de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 09	11 de Marzo de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 09	19 de Abril de 2026

5.4. Garantías

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN CONTRATO DE INTERVENTORIA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 0. Fecha de Expedición: 12/10/2021 Fecha de Aprobación: 12/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	05_10_2021	05_07_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	05_10_2021	05_03_2026
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	05_10_2021	05_07_2023
Póliza de	**AMPAROS**	**VALOR**	**VIGENCIA**	

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN CONTRATO DE INTERVENTORIA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 0. Fecha de Expedición: 12/10/2021 Fecha de Aprobación: 12/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	05_10_2021	05_07_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	05_10_2021	05_03_2026
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	05_10_2021	05_07_2023
Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 0. Fecha de Expedición: 12/10/2021 Fecha de Aprobación: 12/10/2021		**ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 363.410.400,00	05_10_2021	05_03_2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 2. Fecha de Expedición: 22/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	19_10_2021	19_07_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	19_10_2021	19_03_2026
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	19_10_2021	19_07_2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 2. Fecha de Expedición: 22/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 363.410.400,00	19_10_2021	19_03_2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 01 (PRORROGA No. 01)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 3. Fecha de Expedición: 03/02/2023 Fecha de Aprobación: 03/02/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	19_10_2021	01_10_2024
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	19_10_2021	31_05_2027
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	19_10_2021	01_10_2024
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 4. Fecha de Expedición: 03/02/2023 Fecha de Aprobación: 03/02/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 464.000.000,00	19_10_2021	31_05_2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 01				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 4. Fecha de Expedición: 07/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	19_10_2021	28_05_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	19_10_2021	28_01_2028
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	19_10_2021	28_05_2025
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 5.	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 464.000.000,00	19_10_2021	28_01_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 01				
Fecha de Expedición: 14/11/2023				

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 01 Y PRORROGA No. 02)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 6. Fecha de Expedición: 11/06/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 333.960.626,57	19_10_2021	31_09_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 333.960.626,57	19_10_2021	31_05_2028
	Calidad del servicio	$ 1.001.881.879,71	19_10_2021	30_09_2025
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 7. Fecha de Expedición: 12/06/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 520.000.000,00	19_10_2021	31_05_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 02				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 7. Fecha de Expedición: 11/06/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 333.960.626,57	19_10_2021	12_10_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 333.960.626,57	19_10_2021	12_06_2028
	Calidad del servicio	$ 1.001.881.879,71	19_10_2021	12_10_2025
Póliza de Responsabilidad	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 02				
Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 9. Fecha de Expedición: 10/01/2025	Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	19_10_2021	12_06_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 03				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 8. Fecha de Expedición: 17/10/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 333.960.626,57	19_10_2021	26_05_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 333.960.626,57	19_10_2021	26_01_2029
	Calidad del servicio	$ 1.001.881.879,71	19_10_2021	26_05_2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 10. Fecha de Expedición: 17/10/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	19_10_2021	26_01_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 10. Fecha de Expedición: 10/11/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 352.029.343,67	19_10_2021	01_08_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 352.029.343,67	19_10_2021	31_03_2029
	Calidad del servicio	$ 1.056.088.031,01	19_10_2021	01_08_2026
Póliza de	**AMPAROS**	**VALOR**	**VIGENCIA**	

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
		ASEGURADO	DESDE	HASTA
Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 10. Fecha de Expedición: 10/11/2025	Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	19_10_2021	31_03_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 03 Y PRORROGA No. 04 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 03 Y PRORROGA No. 04)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 12. Fecha de Expedición: 24/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 374.825.757,77	19_10_2021	01_10_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 374.825.757,77	19_10_2021	31_05_2029
	Calidad del servicio	$ 1.124.477.273,31	19_10_2021	01_10_2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 14. Fecha de Expedición: 24/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 700.362.000,00	19_10_2021	31_05_2026

6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA

6.1. Interventoría técnica

La **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** desarrollo la interventoría sobre las actividades comprendidas dentro del alcance del objeto pertenecientes al periodo comprendido entre el 08 de marzo al 15 de abril de 2026 en su etapa de reparaciones y construcción de las edificaciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas de la patología, estudios y diseños establecidos.

6.1.1. Actividades desarrolladas por la interventoría

La interventoría hizo seguimiento, control y verificación en el desarrollo de las actividades de la etapa de construcción, que comprenden el periodo del 08 de marzo al 15 de abril de 2026:

- ✓ Se supervisa constantemente la ejecución de cada una de las actividades descritas inicialmente, con el fin de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de estas.
- ✓ Seguimiento y control de suministro e instalación de acero en los elementos estructurales en reparación y reposición.
- ✓ Elaboración de asentamiento de al concreto instalado.
- ✓ Elaboración de especímenes de concreto instalado.
- ✓ Verificación de alineación y verticalidad de elementos estructurales.
- ✓ Acompañamiento y participación en vistas técnicas en obra realizadas por parte de las entidades involucradas en el proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA




SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA




✓ Acompañamiento y participación en comités virtuales, realizados por las entidades involucradas, de seguimiento con el fin de analizar el estado del avance del proyecto y asi tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los tiempos pactados.

ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN COMITÉS VIRTUALES

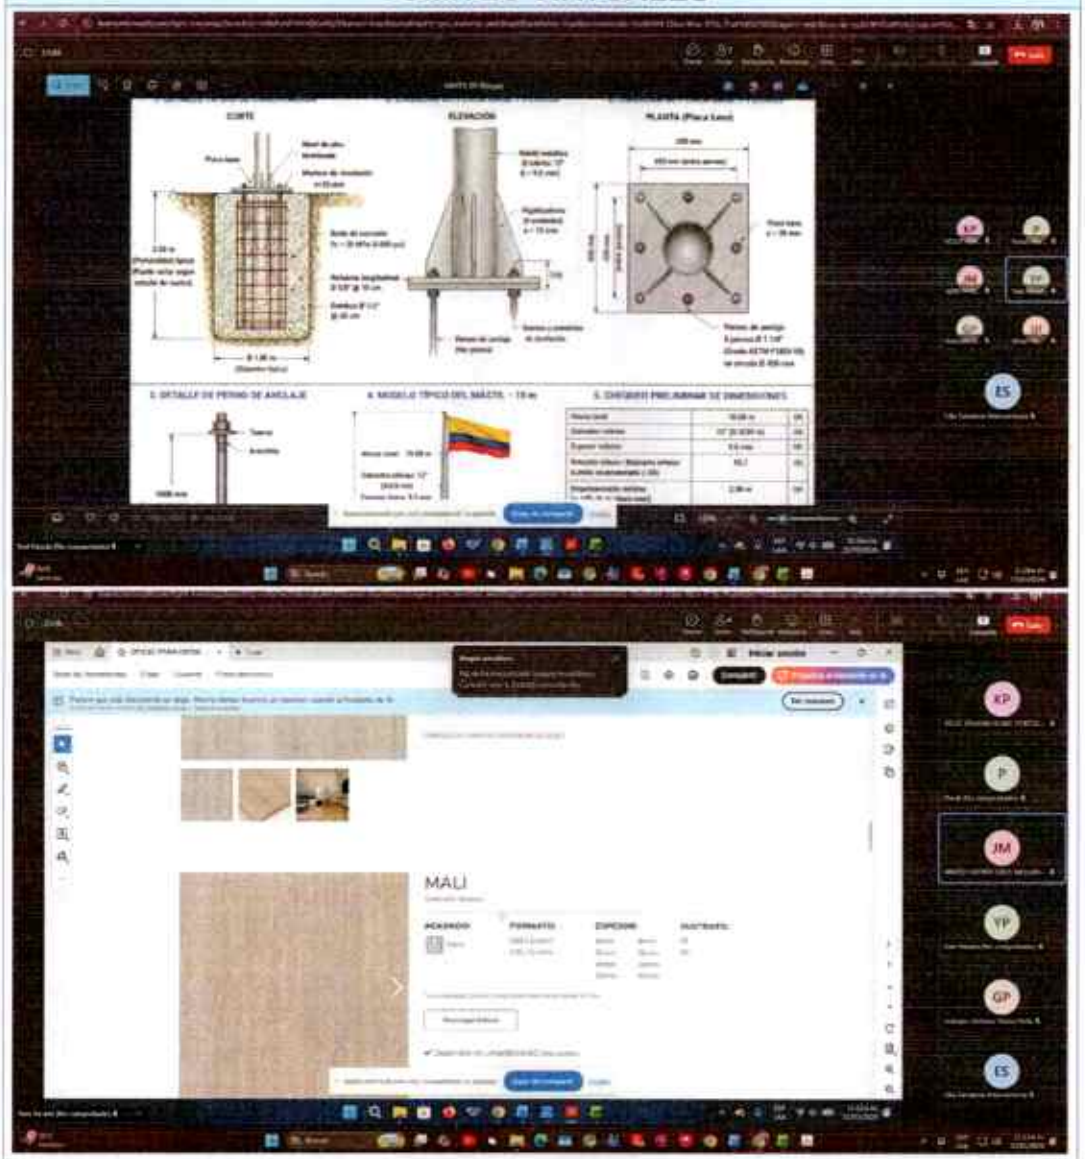

ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN COMITÉS VIRTUALES



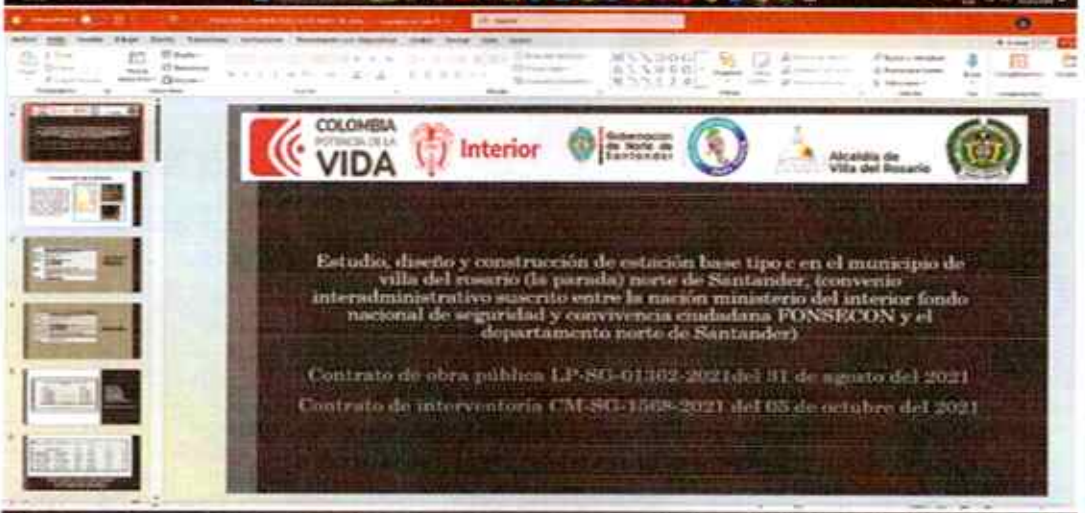



6.2. Personal de la interventoría

Para garantizar el seguimiento y control adecuado y las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER". Se cuenta con el siguiente personal:

CARGO	PERSONAL
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ERIKA MILENA SANABRIA GARCÍA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
INGENIERO ESTRUCTURAL	EDGAR VILLEGAS PALLARES
INGENIERO HIDROSANITARIO	EDGAR VILLEGAS PALLARES
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	ANDRES FELIPE PEREZ RUIZ
INGENIERO ELECTRICISTA	JHON ALEXANDER CARABALI ALVARADO
INGENIERO AMBIENTAL	MYRIAM ARTEAGA CÁRDENAS
PROFESIONAL HSEQ	ANGIE VIVIANA GALVIS SANGUINO
INGENIERO AUXILIAR HSEQ	MARIAM MÓNICA TRUJILLO TRIGOS
TOPÓGRAFO	WILSON ANEIRO NAVARRO CONTRERAS
AUXILIAR TOPÓGRAFO	LUIS ALBERTO CARRIEDO ESPINEL
SECRETARIA	LESLY YAHELVI GALVIS CORREA
CONTADOR	JHONNY TAPIAS NAVARRO
AUXILIAR CONTABLE	KAREN ALEXANDRA MORANTES BOHORQUEZ
CONDUCTOR	JORGE ANDRÉS SANDOVAL MOLINA

6.3. Equipos de la interventoria

Para la ejecución del contrato No. CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021, la interventoría utiliza los siguientes equipos:

- ✓ Oficina
- ✓ Camioneta
- ✓ Equipo de computación
- ✓ Elementos de oficina
- ✓ Equipos de topografía
- ✓ Equipos para la elaboración de mutras de concreto

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ha alcanzado un porcentaje de avance acumulado del 62,16%, en comparación con el 96,26% programado para este periodo de corte, dentro del presupuesto de $39.894.452.272,00, correspondiente a los estudios, diseños, la etapa de construcción y reparaciones según patología. Como resultado se genera un atraso del -34,10%

- Se evidencia que en el presente periodo de corte desde el 16 de abril al 24 de mayo de 2026 el porcentaje de avance es del 1,33%, con respecto a un porcentaje programado del 21,62%, correspondiente a la etapa de construcción y reparaciones según patología, cuyo sumatoria asciende a un valor total presupuestado de $ 39.004.948.401,00. Como resultado se genera un atraso del -20,29%

- En la etapa de construcción, que corresponde a un valor de $ 36.421.653.475,00 del proyecto, se ha alcanzado un porcentaje de ejecución acumulado del 60,86%, en comparación con el 95,90% programado acumulado, generando un atraso del -35,04%.

- En la etapa de ejecución de reparaciones según patología, que corresponde a un valor de $ 2.583.294.926,00 presupuestado, se ha alcanzado un porcentaje de avance acumulado del 67,34%, en comparación con el 100,00% programado acumulado, generando un atraso del -32,66%.

- Se evidencia que, en el presente periodo de corte desde el 16 de abril al 24 de mayo de 2026, en la etapa de ejecución de reparaciones según patología, el porcentaje de avance es del 3,92%.

- Se recomienda al contratista de obra aumentar la mano de obra para realizar con mayor celeridad las actividades correspondientes a la rehabilitación y reparaciones de estructuras. Es de aclarar que el contratista de obra manifiesta que los atrasos del ingreso del personal se deben a los procesos administrativos y de inteligencia que adelanta la fuerza pública para brindar seguridad en la ejecución del proyecto.

En constancia de lo anterior firma,

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD
Nit. 901.527.62-4

En constancia firman.

Residente de Obra

Residente de interventoria

Jueves 16 de abril de 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se da continuidad a la instalación de pañete con mortero para el segundo piso tanto en mampostería interna como de fachada de bloque A. Por otro lado se instaló la mampostería de antepechos en la cubierta del bloque C, adicionalmente se instaló tubería EMT 3/4" eléctrica en el pasillo del primer piso del bloque D, mientras que en el bloque E, se realizaron actividades de filos y dilataciones en puertas y ventanas e instalación de pañete en el primer piso, junto con la instalación de tubería hidraulica de 6" y 1/2" en segundo piso.

En constancia firman.

Residente de obra

Residente de Interventoria.

Viernes 17 de abril de 2026.

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingenieros residente de obra e interventoria, profesionales SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se da continuidad a la instalación de pañetes con mortero en bloque A. Del mismo modo se continua con instalación de pañete junto con ecoficado

de dinteles en el primer piso del bloque E, adicionalmente se realizaron regatas en el segundo piso de dicho bloque para posterior instalación de tubería hidráulica de 1/2". En el bloque C se instaló tubería pluvial en el segundo piso, junto con matero de nivelación en la placa de cubierta y en este bloque se instalaron cajas de inspección de 40x40 cm para tapones de inspección sanitaria.

En constancia firman.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 12 de abril de 2025

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoría, profesionales SST, maestros y ayudantes de obra
- Actividades: Se realizan actividades de pañete en fachada para bloque A, continuando con actividades de instalación de cajas de inspección de 40x40 cm, para inspección sanitaria junto al bloque C, del mismo modo se instaló pañete en el segundo piso del bloque D y en el pasillo del primer piso se continuó con la instalación de tubería EMT de 3/4", en el bloque E se realiza instalación de pañete en primer piso y se realiza encofrado de dinteles para posterior fundida.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 20 de abril de 2025.

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.

- Personal: Ingenieras residentes de obra e interventoria, profesionales SST, maestras y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se ejecutarán regatas en los muros de la fachada norte de bloque A para instalación de tubería PVC de 1", correspondiente al bayunte del sistema de puesta tierra, así mismo se realizó la aplicación de pañete en el muro pantalla del mismo bloque. En el bloque E primer piso, se llevó a cabo la instalación de tubería de ventilación y en el segundo piso se realizó fundida de columnetas con concreto de resistencia de 21mpa. En el bloque C se realiza instalación de tubería EMT, mientras que en el area de cubierta se instalaron valvulas de cote. Se construyeron cajas de inspección sanitaria de 40x40cm y se realizó instalación de tubería PVC para red hidraulica de bloque D.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de Interventoria

Martes 21 de abril de 2026.

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingenieras residentes de obra e interventoria, profesionales SST, maestras y ayudantes de obra.
- clima: Soleado.
- Actividades: Se continua con la instalación de pañetes en muros internos del segundo piso del bloque A. Se realizan regatas en el segundo piso del bloque B y se realiza instalación de llave de paso de 1"; También se realizó instalación de tubería hidraulica en el pasillo de primer piso de bloque D, mientras que el segundo nivel, se continuan actividades de pañete.

liderz

de la misma forma en el primer piso del bloque E. En constancia firman.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Miércoles 22 de abril de 2026.

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoría, profesionales SST, maestros y ayudantes de obra.
- clima: soleado
- Actividades: Se continuán actividades de instalación de mortero de filos de puertas y ventanas, junto con la aplicación de pañete en muros internos del bloque E primer piso, en el segundo piso se reportan actividades de desencofrado de columnetas junto con la instalación de cuantia de acero en dinteles. En el bloque D la instalación de tubería PVC de red hidraulica principal e instalación de tubería EMT de red electrica luminaria, junto con las cajas de paso horizontales, en el segundo nivel se continuán labores de pañete.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de Interventoría.

Jueves 23 de abril de 2026.

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingenieros de obra e interventoría, profesionales SST, maestros y ayudantes.
- clima: Nublado.
- Actividades: Se dio continuidad de la aplicación

líder=

de mortero para pañetes junto con filos y dilataciones en puertas y ventanas, se realizó desencofrado de dinteles de bloque A. Se realeza la instalación de tubería de ventilación en primer piso, junto a la instalación de llave de corte 1/2", instalación de tubería PVC de 1/2" de bloque B. Se continua con la instalación de tubería hidráulica en primer piso de bloque D, En el segundo piso se realiza instalación de pañete, se realiza instalación de filos en puertas y ventanas.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de Interventoría.

Viernes 24 de abril de 2026.

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoría, profesionales SST, maestros y ayudantes.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se realizan actividades de instalación de pañete en muros de fachada para el segundo piso de bloque A, se realiza construcción de cajas de 40x40 para tapones de limpieza junto a bloque D, en este mismo bloque se continua con instalación de tuberías EMT y construcción de cajas de inspección eléctrica, instalación de tubería hidráulica.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de Interventoría.

Sábado 25 de abril de 2026.

- Equipos: Herramienta menor.

- Maquinaria N/A
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoría, profesionales SST, maestros y ayudantes.
- clima: soleado.
- Actividades: Se continuaron con actividades de instalación de pañete en el segundo piso del bloque A para muros internos y fachada. Junto con la instalación continua de pañetes en primer piso de bloques E y D. se realiza construcción de cajas de inspección de 40x40 cm para tapones de limpieza junto con instalación de tubería hidraulica en bloque D.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 27 de abril de 2025.

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoría, profesionales SST, maestros y ayudantes.
- clima: soleado.
- Actividades: Se realiza la instalación de pañete para muros internos y de fachada de bloque A, mortero de nivelacion en placa de cubierta de bloque C, adicionalmente se instalarón cajas de 40x40 para tapones de limpieza de red sanitaria. Se realizaron actividades de instalación de cuantia de acero e instalación de concreto en columnetas y dinteles para segundo piso de bloque E.

contratista de obra

Contratista de Interventoría.

lider=

Martes, 28 de abril de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se dio continuidad a las actividades de pañete impermeabilizado en las fachadas de los bloques A y E, así como a la instalación de pañete en muros internos del bloque E. En el bloque A, además, se realizó la instalación de tubería EMT en el segundo piso, destinada al sistema de luminarias. En el bloque B se ejecutaron regatas para la instalación de tubería hidráulica y se adelantó el encofrado de dinteles y columnetas del primer piso, como preparación para el vaciado de concreto de 21 MPa. Por su parte, en el bloque D se realizó la instalación de tubería PVC correspondiente a la red hidráulica y ventilación. Finalmente, en el bloque E se continuó con la instalacion de tubería EMT de 3/4" para luminarias en el segundo piso, junto con el encofrado de columnetas, dejando los elementos preparados para las actividades posteriores de fundida.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría

Miércoles, 29 de abril del 2026
- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria. N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra, e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.

líder=

- Actividades: Se realiza la continuidad en la instalación de pañete en el bloque A tanto en la mampostería interna como en la fachada, junto con la instalación de tubería eléctrica EMT en el segundo piso. Por otra parte, en el bloque E se realizan regatas en muros internos para la posterior instalación de tubería eléctrica PVC, adicionalmente la instalación de tubería hidráulica en el segundo piso.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoría

Jueves, 30 de abril del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se realizaron actividades en el bloque A de instalacion de pañete en mampostería tanto interna como externa del segundo piso. En el bloque E la instalacion de cuantías de acero para columnetas del segundo piso, también se realizo posteriormente el encofrado de columnetas en el mismo nivel y en el primer piso se realizó la instalación de algunos puntos eléctricos.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoría

Sabado 2 de mayo del 2026

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional en seguridad y salud en el trabajo, maestros y

ayudantes de obra.
Clima: Soleado
- Actividades: Se dio continuidad a las actividades de instalacion de pañete en la fachada del bloque A. En el bloque D se realizó la instalacion de tuberia EMT de 3/4" en el segundo piso. De igual manera, en el bloque E se ejecutó la instalacion de tubería EMT de 3/4" en el primer piso, junto con actividades de pañete en el mismo bloque. Adicionalmente. En el segundo piso del bloque E se instaló tubería PVC para la red hidráulica.
En constancia firman:

Residente de obra. Residente de interventoría.

Lunes, 04 de mayo del 2026
- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se realizo la instalación de cuantías de acero en columnetas y dinteles, el posterior encofrado en columnetas del bloque B en el primer piso. De el mismo modo se prepara la instalacion de cuantía de acero para columnetas y dinteles del bloque E, asi como instalación de tubería PVC para la red hidraúlica principal, En la cubierta se dio instalación de cuantia de acero en el antepecho en este mismo bloque
En constancia firman:

Residente de obra Residente de interventoría.

Martes, 05 de mayo de 2026
- Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A
-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Se continuan actividades de instalación de tubería electrica EMT 3/4" en el segundo piso del bloque A El encofrado de dinteles y columnetas de primer piso y la instalación de concreto en elementos no estructurales del bloque B, se realizaron actividades de instalación de cuantía de acero para columnetas junto con la elaboración y suministro de concreto en el segundo nivel del bloque E.
En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria

Mercoles, 06 de mayo del 2026
-Equipos: Herramienta menor.
-Maquinaria: N/A.
-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se desencofraron elementos no estructurales del primer piso del bloque B. Se realizaron actividades de instalación de tubería PVC hidráulica de 1" y 1/2" en el segundo piso del bloque D. En el bloque E la instalacion de la cuantía de acero para dinteles y columnetas junto con el posterior encofrado de estos elementos, adicionalmente se instaló tubería de 1 1/2" para suministro hidraulico del bloque F.
En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria.

Jueves, 07 de mayo del 2026.

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se dio continuidad a las actividades de instalación de pañete con mortero de 17,5 MPa en muros internos y fachada de segundo piso del bloque A. Asimismo, en este mismo bloque se realizó la instalacion de tubería hidráulica de 1"/2" correspondiente a la red principal del primer piso. En el bloque E se ejecutó la fundida de concreto para elementos no estructurales en el segundo piso, así como la instalación de concreto en alfajías. De igual manera, se avanzó en la instalación de pañete en los muros externos del primer piso y en la instalación de tubería PVC para la red eléctrica.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría

Viernes, 08 de mayo del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de Seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se continua con la instalación de pañete en el segundo piso. La instalacion de cuantía de acero para columnetas, junto con la mampostería interna en el segundo piso del bloque E. En el bloque B la instalación de tubería EMT en el segundo piso. En el primer piso del bloque E se continua la instalacion de pañete y en el bloque D se da continuidad a la instalacion de tubería hidraulica en el segundo piso.

En constancia firman:

líder=

Residente de obra

Residente de interventoría

Sábado, 09 de mayo del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se continuan las actividades de instalación de pañete en el segundo piso del bloque A, adicionalmente en este bloque se instalaron muros bajos de mampostería en el segundo piso. Se realiza instalación de mortero de nivelación en el primer piso del bloque D. En el bloque E se continua con la instalación de pañete en fachada e instalación de mortero de nivelación en el primer piso.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría

Lunes, 11 de mayo del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se da continuidad a las actividades de pañetes en el bloque A, tanto en fachada como en muros internos, incluyendo la ejecución de filos y dilataciones. De igual manera, en el bloque E se continúan los trabajos de pañete en fachada, junto con la instalación de tubería PVC de 2" para ventilación. En el bloque D se realiza la instalación de mortero de nivelación y tubería eléctrica EMT de 3/4",

líder

adicionalmente se ejecutan filos en los ventanas del segundo piso del mismo bloque.
En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoría

Martes, 12 de mayo del 2026
- Equipos. Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal. Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se realizó la instalación de panete en el segundo piso y se dio continuidad a las actividades de instalación de tubería eléctrica EMT de 3/4" en el pañete del primer piso del bloque D. En el bloque E se ejecutó pañete en muros internos, junto con la instalación de cuantia de acero para columnetas y dinteles del segundo piso. En el bloque A se llevó a cabo la instalación de pañete en muros internos y la instalacion de red sanitaria en tuberia PVC en el segundo piso. Adicionalmente en el bloque E se instaló tubería hidraulica PVC de suministro, incluyendo valvula de corte de 3"
En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoría

Miércoles, 13 de mayo del 2026
- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria. N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.

lider=

-Actividades. Se realizo la instalacion de tuberia hidraulica y sanitaria en el bloque A, junto con la instalación de pañete en muros internos y fachada. Se dio continuidad a actividades de instalacion de pañete en pasillos del bloque D. En el bloque E se ejecutaron actividades de instalación de pañete para el primer piso. Adicionalmente junto al bloque I se construyeron cajas de inspeccion para valvulas de corte En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria

Jueves, 14 de mayo del 2026

-Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A.

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra

-Clima: Soleado

-Actividades: Se realizaron actividades de instalacion de tuberia hidraulica de 1" en bloque A primer piso, para el segundo piso la instalacion de mortero para filos de puertas y ventanas, En este bloque continua la instalación de pañete para fachada. En el bloque D se continua con la instalacion de pañete para muros internos del segundo piso junto con instalación de valvulas de corte de 1" y ventosas doble acción en tramos finales de acometida hidraulica, en el primer piso la instalacion de tuberia EMT de 3/4" para luminaria de pasillos. e instalacion de tuberia SCH 40 para red RCI del bloque D. En el bloque E la instalacion de pañetes en muros de antepechos de cubierta, junto con la instalación de concreto de 28MPa para dinteles de primer y segundo piso. En este mismo se instaló mampostena. En constancia firman

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 15 de mayo del 2026.
- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se realizaron actividades de filos y dilataciones en el bloque A, junto con la construccion de buitron en segundo piso. La instalación de tubería SCH40 para sistema de detección de incendios del bloque D y la instalacion válvulas ventosas doble accion e instalación de pañete en segundo piso. En el primer piso del bloque E la instalacion de pañete en tanto muros internos como de fachada. En segundo piso la instalacion de cuantías de acero en columnetas y dinteles junto con el posterior encofrado de dinteles.

En constancia firman

Residente de obra

Residente de interventoria

Sabado, 16 de mayo del 2026
- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Se dio continuidad a las actividades de pañete en la fachada del bloque A. En el bloque E se realizó la instalación de tubería electrica EMT en el primer piso, junto con la instalacion de acero de refuerzo en dinteles del segundo piso. Adicionalmente, se ejecutaron actividades de mampostería y pañete en este mismo bloque. Finalmente, en el bloque F se instaló tubería de 1 1/2" para el sistema de suministro hidraulico.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoria

Martes, 19 de mayo del 2026

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se realizaron actividades de instalacion de pañete en tanto fachada como muros interior, la instalacion de tuberia EMT electrica e instalacion de cuantia de acero para columneta, adicionalmente se instalo mamposteria para baitrinos en primer piso del bloque A. En el bloque B se instalo tuberia PVC electrica e instalacion de tuberia PVC red sanitaria de 2" y 4". En el bloque D la instalacion de cajas tipo 3 contra incendios en primer piso, instalacion de tuberia 3/4" hidraulica e instalacion de pañete en el segundo piso. En el bloque E la instalacion de pañete para fachada, junto con el encofrado de dinteles.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoria

Miercoles, 20 de mayo del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se realizo la instalacion de pañete en la fachada del bloque A, junto con la instalación de tubería eléctrica EMT. En el bloque E se ejecutaron actividades de pañete en

fachada y muros internos, ademas se realizo el encofrado de dinteles y columnetas en el segundo piso para su posterior fundida, asi como la elaboracion de regatas destinadas a la futura instalación de tuberia hidraulica. De igual manera se dio inicio a las excavaciones para la construccion del canal pluvial. En el bloque D se instalo tuberia hidraulica de 3/4" en los baños del primer piso, mientras que en el segundo piso se continuo con la instalacion de pañete y se realizo la instalacion de una caja tipo 3 de sistema contra incendios

En constancia firman

Residente de obra

Residente de interventoria

Jueves 21 de mayo del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: lluvia.
- Actividades: Se realizaron actividades para la posterior instalación de tuberia PVC electrica en el bloque A. en este mismo bloque se elaboraron filos para ventanas en el segundo piso, junto con la instalacion de pañete para fachada. En el bloque D se instalo pañete en muros internos. De igual forma en el bloque E se instalo pañete para fachada y muros internos, junto con la instalacion de cuantias de acero para columnetas y dinteles en el segundo piso, la instalacion de mortero de nivelaciones para zonas secas del primer piso. Se realizaron movimientos de tierra para la posterior construccion del canal pluvial

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria

lider

Viernes 22 de mayo del 2026.
- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se ejecutaron actividades de instalacion de cuantias de acero para viguetas de apoyo en la fachada del bloque E. Asimismo, se realizo la instalacion de mortero de nivelación en zonas secas del primer piso del bloque D. En el bloque E se continuo con la instalación de cuantias de acero y posturas encofrado y fundida correspondientes a columnetas no estructurales del segundo piso, junto con actividades de mampostoria y la preparacion para la instalacion de la caja tipo 3 contra incendios en el primer piso. La aplicacion de pañete en fachadas del bloque A y la continuidad de la excavacion para el canal pluvial. Adicionalmente, se realizó la instación de tuberia electrica. EMT en el primer piso del bloque A y la instacion de tuberia hidraulica de 3/4" en el primer piso del bloque D.

En constancia firman

Residente de obra

Residente de interventoria.

Sabado 23 de mayo del 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de dora e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Se realizó instalacion de tuberia PVC SCH40 contra incendios electrica, junto con la que se ejecutaron actividades de pañete en fachada del bloque A. Se continuaron actividades de excavaciones para el canal pluvial. En el bloque E

al encofrado de viga de apoyo para fachada, junto con los filos y dilataciones en todo este bloque, la fundida de elementos no estructurales e instalación de tubería PVC para ventilación.

En constancia firmamos:

Residente de obra

Residente de interventoría

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA:	25 DE MAYO DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	LP-SG-01362-2021 DE 31 DE AGOSTO 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
C.C. o N.I.T.	901514217-6
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON YOEL PARADA REYES
N.I.T	1090407083 DE CUCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.982.010.588,00 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
VALOR ADICIONAL No.1	$11.490.240.893,00 ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
VALOR ADICIONAL No.2	$2.583.294.926,00 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS
VALOR ADICIONAL No.3	$2.838.905.865,00 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$39.894.452.272,00 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. MCTE
LUGAR DE EJECUCIÓN	SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
PLAZO INICIAL	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL No.1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL No.2	DOCE (12) MESES
PLAZO ADICIONAL No.3	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL No.4	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL	CINCUENTA (50) MESES
FORMA DE PAGO	El DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así: a) COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOSNOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 892.406.699.00) previa presentación de la cuenta de cobro con

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

	la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los estudios y diseños con sus anexos. Los diseños deben estar aprobados por la DIRAF, y el producto debe ser recibido por el Ministerio del interior. b). COMPONENTE 2 – CONSTRUCCCIÓN: El noventa por ciento (90%) del valor de la construcción se pagarán mediante Actas de recibo parcial y se pagara un diez (10) con el recibo de la obra al 100% a satisfacción de interventoría, policía, Departamento, Municipio, y Ministerio. Las actas parciales deben estar respaldadas por las memorias de mapeo de cada una de las actividades ejecutadas, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoría del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoría designado o contratado por la Secretaría de GOBIERNO y con el Visto Bueno del Secretario de GOBIERNO del Departamento.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2246 del 06 de Julio del 2021 No. 00 2247 del 06 de Julio del 2021 No. 00 001371 del 12 de Abril del 2024 No. 00 005031 del 15 de Octubre del 2025 No. 00 001367 del 12 de Enero del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 2176 del 2 de mayo del 2024 No.00 001232 del 15 de abril del 2024 No. 00 005393 del 31 de Octubre del 2025 No. 00 002851 del 11 de Febrero del 2026
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR EXTERNO	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2021
PRORROGA	PRÓRROGA No. 01: DICIEMBRE 29 DE 2022 PRÓRROGA No. 02: ABRIL 15 DE 2024 PRORROGA No. 03: OCTUBRE 31 DE 2025 PRORROGA No. 04: FEBRERO 11 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	MAYO 31 DE 2026

ACTAS PARCIALES DE OBRAS	**ACTA DE RECIBO No.**	**FECHA**
	1	MAYO 13 DE 2022
	2	ABRIL 17 DE 2024
	3	MAYO 28 DE 2024
	4	AGOSTO 2 DE 2024
	5	OCTUBRE 21 DE 2024
	6	NOVIEMBRE 27 DE 2024
	7	DICIEMBRE 12 DE 2024
	8	FEBRERO 7 DE 2025
	9	FEBRERO 19 DE 2025
	10	DICIEMBRE 16 DE 2025
	11	MARZO 11 DE 2026
	12	ABRIL 15 DE 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	N/A				
RELACIÓN DE GARANTÍAS					
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
AMPARO	**PÓLIZA No**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
CUMPLIMIENTO	NB-100176880	19/10/2021	30/09/2026	$ 3,989,445,227.20	25/02/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	NB-100176880	19/10/2025	31/05/2029	$ 5,984,167,840.80	25/02/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100176880	31/05/2026	31/05/2031	$ 11,968,335,681.60	25/02/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	NB-100037857	19/10/2021	31/05/2026	$ 1,994,722,613.60	25/02/2026

2. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN/ ANTICIPO	VALOR PAGADO
PARCIAL 01	13/05/2022	$ 889.503.871,00	N/A	$ 889.503.871,00
PARCIAL 02	17/04/2024	$7.018.501.487,00	N/A	$7.018.501.487,00
PARCIAL 03	28/05/2024	$2.437.008.899,00	N/A	$2.437.008.899,00
PARCIAL 04	02/08/2024	$1.693.360.996,00	N/A	$1.693.360.996,00
PARCIAL 05	21/10/2024	$2.192.783.899,00	N/A	$2.192.783.899,00
PARCIAL 06	27/11/2024	$1.444.696.737	N/A	$1.444.696.737,00
PARCIAL 07	12/12/2024	$1.710.779.195	N/A	$1.710.779.195,00
PARCIAL 08	07/02/2025	$1.162.312.401	N/A	$1.162.312.401,00
PARCIAL 09	19/02/2025	$2.834.860.248	N/A	$2.834.860.248,00
PARCIAL 10	16/12/2025	$157,291,519	N/A	$157,291,519,00
PARCIAL 11	11/03/2026	$1,102,566,928	N/A	$1,102,566,928
PARCIAL 12	15/04/2026	$1,622,602,934	N/A	$1,622,602,934
PARCIAL 13	25/05/2026	$530,675,994	N/A	0

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

TOTAL			$ 24,266,269,114.00
TOTAL, CONTRATADO			$39,894,452,272
TOTAL, EJECUTADO EN ACTAS			$ 24,796,945,109.00
TOTAL, PAGADO			$ 24,266,269,114.00

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Frentes de trabajo:

2.005 y 2.005AP) Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. (10,12 m³). Se realizan actividades de Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. En estación de bombeo y en bloque A de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

2.006 y 2.006AP) Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. (138,71 m³). Se realizan actividades de Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. Para urbanismo interno de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

7.004 y 7.004AP) Filos y dilataciones. (1531,12 m). Se realizan actividades de filos y dilataciones en el bloque A,D, y E de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas dentro de los detalles del proyecto.

7.008 y 7.008AP) Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. (113,61 m). Se realizan actividades de Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo, en el bloque A,D y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

17.003 y 17.003AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (8,86 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios, en el bloque D y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

17.004 y 17.004AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. (20,65 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios, en el bloque A, D y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

20.001 y 21.001AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (6,20 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios en el tanque de acuerdo con directrices, en los bloques A, D y E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

20.002 y 20.002AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. (19.35 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios en el bloque B y F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

20.003 y 20.003AP) Sum./inst. Tubería PVC - Presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (24,61 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. y accesorios en el bloque D en el área de jardines de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

20.004 y 20.004AP) Sum./inst. Tubería PVC Presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. (27,38 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios en el bloque A y D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

20.006 y 20.006AP) Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. (72,00 und). Se realizan actividades de Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg en el bloque A, B, C, D, E, F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

20.008 y 20.008AP) Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. (15,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. En el bloque A, B, C, D, E y F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

20.011 y 20.011AP) Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. (12,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro en el bloque A, B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

20.012 y 20.012AP) Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. (1,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro en el bloque F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

21.002 y 21.002AP) Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. (13,17 m). Se realizan actividades Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria en el bloque A de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

21.006 y 21.006AP) Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. (5,00 und). Se realizan actividades Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria en el bloque A de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

22.001 y 22.001AP) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. (7,55 m). Se realizan actividades de línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg en los bloques C y D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

22.002 y 22.002AP) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. (20,53 m). Se realizan Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg en el bloque F de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

22.006 y 22.006 AP) Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm. (26,44 und). Se realizan bajantes de desagüe pluvial PVC Ø 4plg en la zona externa para un cárcamo - canal de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

26.001 y 26.001AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg. (753,92 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg en la zona externa media tensión, voz y datos, eléctrico baja tensión y detección incendios de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

26.002 y 26.002AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg. (181,72 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg en la zona eléctrico de baja tensión y redes de gas de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

26.003 y 26.003AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg. (178,32 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg en la zona externa de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

26.005 y 26.005AP) Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg. (91,95 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg en los bloques A, B, C, D, E, F de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

26.009 y 26.009AP) Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. (605,30 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg en el bloque D de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

28.011 y 28.011AP) Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI. (1,00 und). Se realizan actividades de Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI en el tanque de almacenamiento de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

29.001 y 29.001AP) Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. (337,00 und). Se realizan actividades de Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF en los bloques A, D, E y F de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

29.012 y 29.012AP) Salida de toma común. (79,57 und). Se realizan actividades de Salida de toma común en los bloques B y D de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

29.013 y 29.013AP) Salida de toma GFCI. (13,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma GFCI en los bloques B y D de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

29.014 y 29.014AP) Salida de toma regulado color Naranja. (36,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma regulado color Naranja en los bloques A y B de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

41.001) Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción (12,00 und). Se realizan actividades de Sum./Inst. válvulas admisora y expulsora de aire doble acción en el bloque D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

41.016) Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico. (20,00 und). Se realizan actividades de Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico en el bloque E y redes de servicio de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

41.020) Rejillas para cunetas pluviales (36,20 m²). Se realizan actividades de Rejillas para cunetas pluviales en el bloque A de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

- 2.1.10) PATOLOGIA_Excavación manual. (0,10 m³). Se realizan actividades de Excavación manual en el bloque B según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.

- 2.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,84 m³). Se realizan actividades de Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg en el bloque B según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.

- 2.2.4) PATOLOGIA_Acero de refuerzo. (282.88 kg). Se realizan actividades de suministro e instalación de acero de refuerzo en columnetas en el bloque B según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.

-2.4.1) PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (16,44 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-2.4.3) PATOLOGIA_Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (5,72 m). Se realizan actividades de Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-2.4.5) PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (42.29 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-2.4.6 NP) PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg. (1.47 m³). Se realizan actividades de Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-2.6.2 NP) PATOLOGIA_Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg. (9,60 m). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

-2.6.3 NP) PATOLOGIA_Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. (4,00 und). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-2.7.1 NP) PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg. (42,00 m). Se realizan actividades de Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-2.7.2 NP) PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación (7,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma común. Reparación, en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-3.1.3 NP) PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales. (9,20 m²). Se realizan actividades de Demolición de muros con elementos no estructurales, en el bloque C de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-3.3.3 NP) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). (3,00 und). Se realizan actividades de puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.4.2 NP) PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. (27,20 m²). Se realizan actividades de Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.4.7 NP) PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (8,80 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.5.1 NP) PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. (195.36 m). Se realizan actividades de Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.1.3) PATOLOGIA_Demolicion de muros con elementos no estructurales. (21,46 m²). Se realizan actividades de Demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque E de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.

-5.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,44 m³). Se realizan actividades de concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg en el bloque E de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de diseño.

-5.2.7) PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,15 m³). Se realizan actividades de concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa en el bloque E según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

-5.4.1) PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (17,48 m²). Se realizan actividades de instalación de mampostería en bloque No.4 con espesor de 0,10 m en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.4.2) PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. (7,09 m²). Se realizan actividades de instalación de muro perimetral doble en ladrillo de obra común con espesor de 0,24 m en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.4.4) PATOLOGIA_Pañete liso para muro en mortero 1:4. (59,22 m²). Se realizan actividades de dintel de 0,15x0,15 en concreto de 21Mpa en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.4.7) PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (110,03 m). Se realizan actividades columnetas en concreto de 21 Mpa con acero de refuerzo en el bloque E de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.5.1) PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. (121,60 m²). Se realizan actividades de Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m para el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.9.1) PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg. (19,05 m). Se realizan actividades de Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

-5.9.2) PATOLOGIA_Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg. (60,00 m). Se realizan actividades de Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

-5.9.3 NP) PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación. (8,00 und). Se realizan actividades de Salida de toma común. Reparación. en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

-5.9.4 NP) PATOLOGIA_Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación. (14,00 und). Se realizan actividades de Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Reparación. en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

CUADRO N° 1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$39.147.798.015,00	98.13%	-35.97%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$24.796.945.109,00	62.16%	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

2,005 y 2.005 AP_Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente.



2,006 y 2.006 AP_Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.




7,004 y 7.004 AP_Filos y dilataciones.



7,008 y 7.008 AP_Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.



17,003 y 17.003 AP_Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

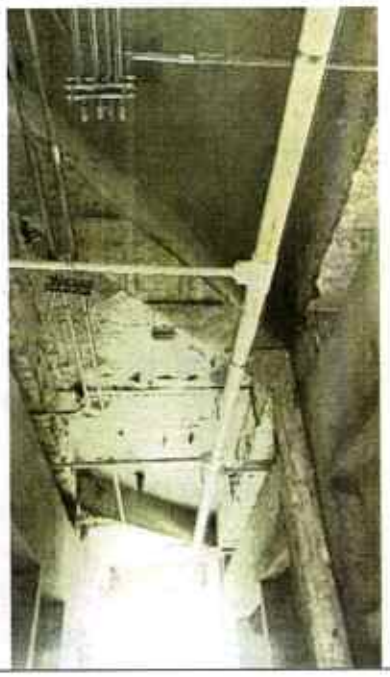


17,004 y 17.004 AP_Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.




20,001 y 20.001 AP_Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.



20,002 y 20.002 AP_Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.

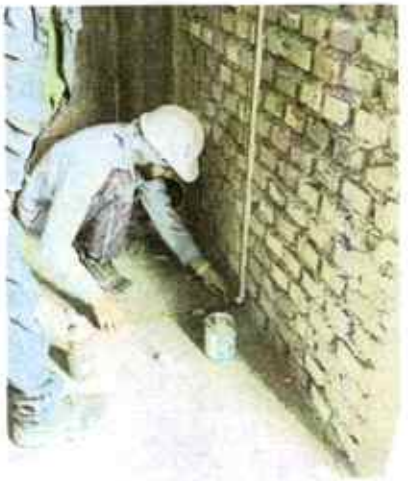

20,003 y 20.003 AP_Sum./inst. Tubería PVC - Presion RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

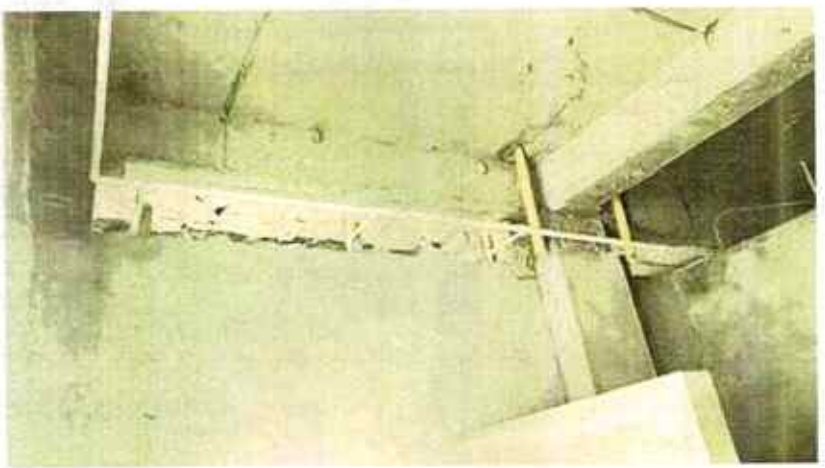

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA


20,004 y 20.004 AP_Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.



20,006 y 20.006 AP_Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.



20,008 y 20.008 AP_Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.

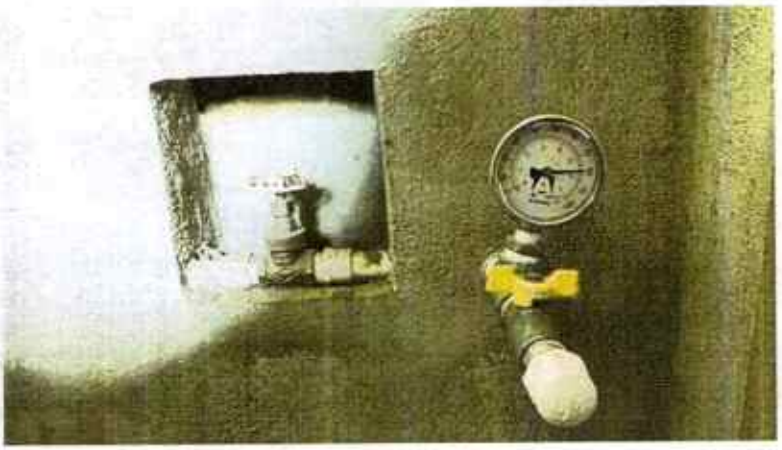


20,011 y 20.011 AP_Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.



20,012 y 20.012 AP_Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.



21,002 y 21.002 AP_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.

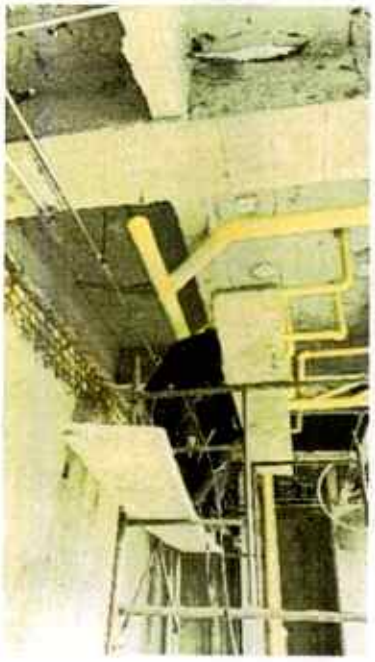

21,006 y 21.006 AP_Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.



22,001 y 22.001 AP_Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg.



22,002 y 22.002 AP_Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.



22,006 y 22.006 AP_Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm.



26,001 y 26.001 AP_Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg.



26,002 y 26.002 AP_Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg.



26,003 y 26.003 AP_Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg.



26,005 26.005 AP_Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg.



26,009 y 26.009 AP_Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.



28,011 y 28.011 AP_Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI.



29,001 y 29.001 AP_Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.




29,012 y 29.012 AP_Salida de toma común.



29,013 y 29.013 AP_Salida de toma GFCI.



29,014 y 29.014 AP_Salida de toma regulado color Naranja.

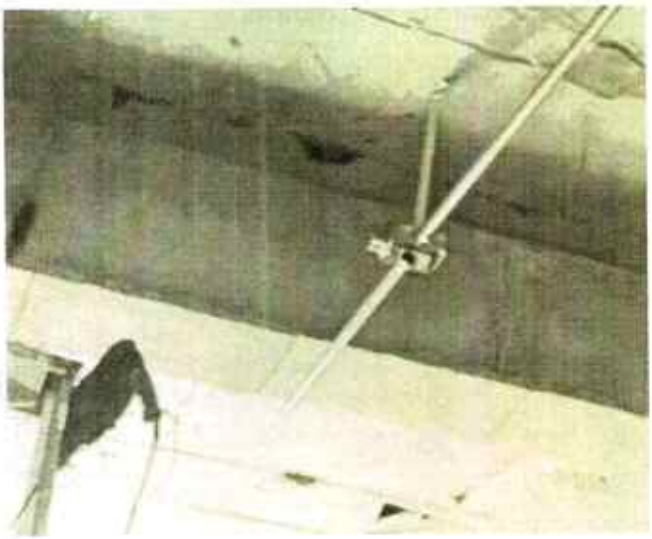

41,001_Sum./Inst. valvulas admisora y expulsora de aire doble accion



41,016_Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.90m, Incluye tapa concreto marco metálico



41,02_Rejillas para cunetas pluviales




2.1.10_PATOLOGIA_Excavación manual.




2.2.3_PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.



2.2.4_PATOLOGIA_Acero de refuerzo.

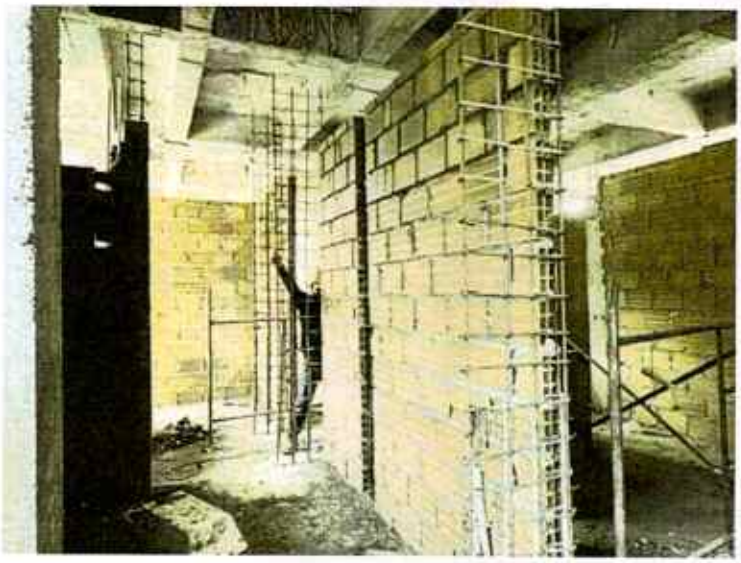


2.4.1_PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.

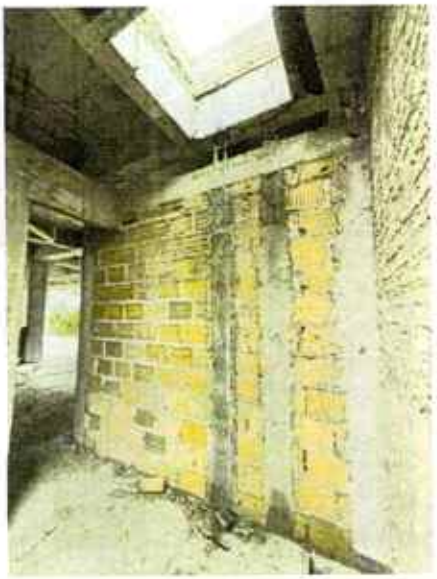


2.4.3_PATOLOGIA_Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.



2.4.5_PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

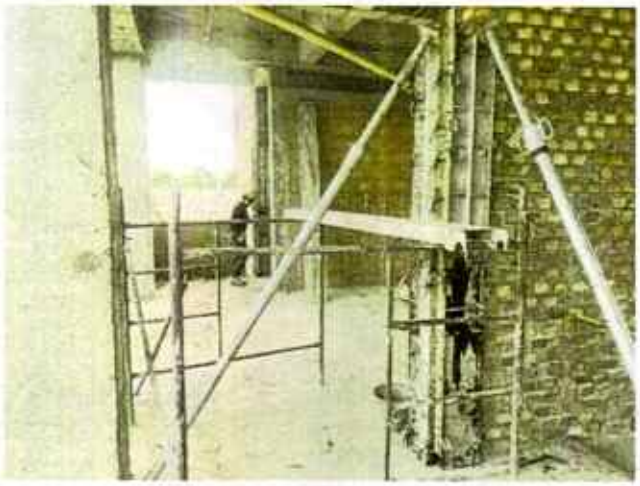

2.4.6 NP_PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg.

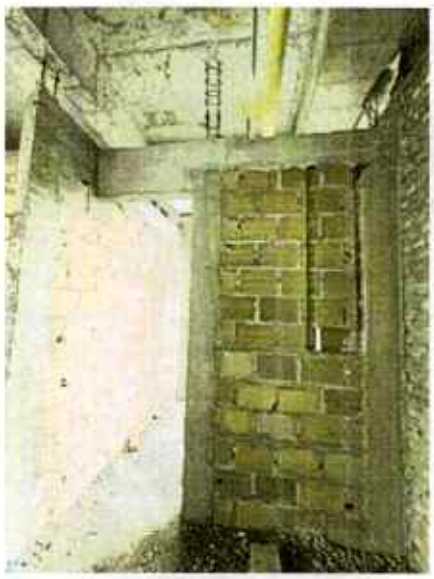

2.6.2 NP_PATOLOGIA_Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.



2.6.3 NP_PATOLOGIA_Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.



2.7.1 NP_PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-Conduit ø 3/4plg.




2.7.2 NP_PATOLOGIA_Salida de toma común. Reparación



3.1.3_PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales.



3.3.3 NP_PATOLOGIA_Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).

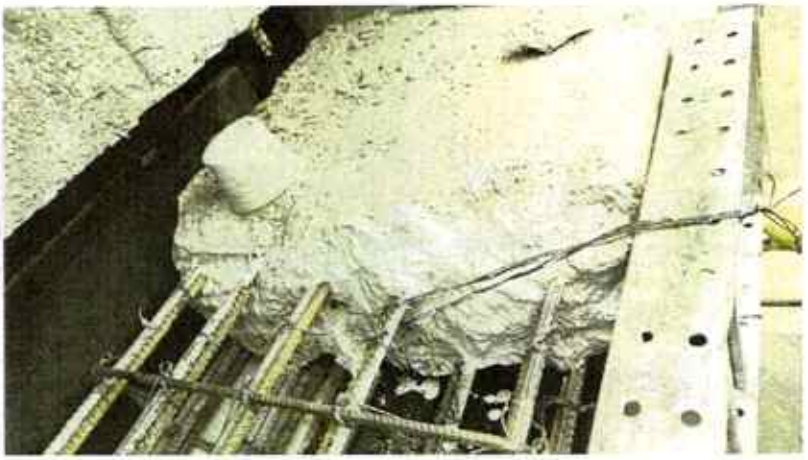


3.4.2_PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.



3.4.7_PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.



3.5.1_PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.

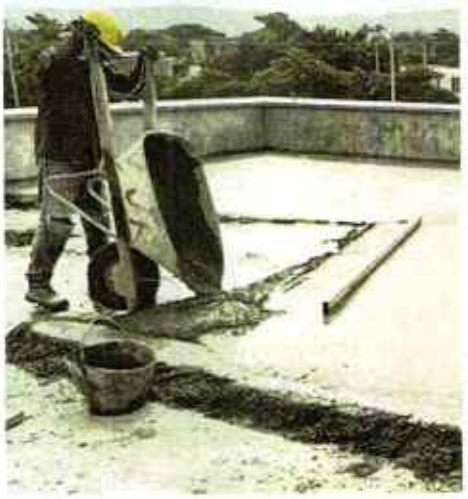

5.1.3_PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales.



5.2.3_PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.



5.2.7_PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.



5.4.1_PATOLOGIA_Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.



5.4.2_PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.



5.4.4_PATOLOGIA_Pañete liso para muro en mortero 1:4.




5.4.7_PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.




5.5.1_PATOLOGIA_Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.



5.9.1_PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC-conduit ø 3/4plg.

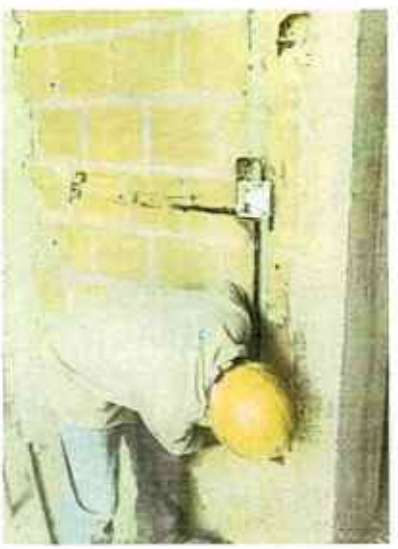

5.9.2_PATOLOGIA_Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.

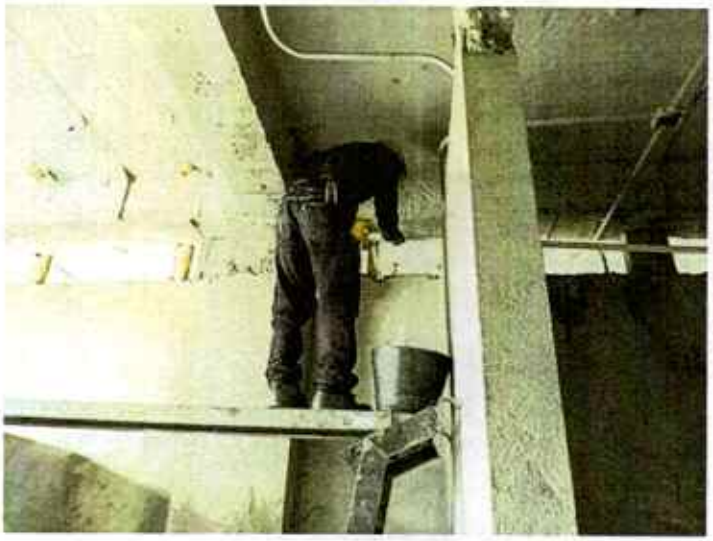

5.9.3 NP_PATOLOGIA_Salida de toma común.Reparación.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

5.9.4 NP_PATOLOGIA_Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.Reparación.



4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, CARLOS ALBERTO BRAHIM en mi condición de supervisor del contrato de obra LP-SG-01362-2021 DE 31 DE AGOSTO 2021, **CERTIFICO** que:

UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA), NORTE DE SANTANDER. Durante el período comprendido del 16/04/2026 al 24/05/2026, aprobado por la supervisión.

El valor por reconocer y pagar es la suma QUINIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO M/CTE. **$530.675.994 correspondiente** al pago de la parcial N.° 13.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago).

CARLOS ALBERTO BRAHIM
Supervisor

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DE CONTRATISTA MANIFESTANDO QUE REALIZÓ LOS RESPECTIVOS PAGOS DE FIC SENA DE ACUERDO CON LA LEY, ANEXAR COPIA SOPORTE FIC SENA

San José de Cúcuta, 25 de mayo de 2026

CERTIFICADO DE VERACIDAD DE APORTES AL FONDO DE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – FIC

NELSON YOEL PARADA REYES, identificado con cedula de ciudadanía N° **88.273.256** y **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA**, identificada con cedula de ciudadanía N° **1.091.060.360** de **CHITAGA**, con tarjeta profesional N° **274197-T** de la Junta de Central de Contadores, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** y **CONTADOR PUBLICO** respectivamente de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6** como consta en el RUT; bajo la gravedad de juramento **CERTIFICAMOS** que LA UNIÓN TEMPORAL se encuentra al día en el pago de los aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, desde su fecha de creación al día de hoy en virtud de la siguiente normatividad: Decreto 083 de 1976; Resolución 2370 de 2008, Resolución 1449 del 2012 y las demás que rijan la materia de acuerdo con la ley colombiana.

El método usado para liquidar el FIC es el de "***Contratos a Todo Costo***: *Se presume que la industria de la construcción destina para la realización de los trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento (25%) de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios; en consecuencia las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción, deberán pagar a título de contribución con destino al FIC, el punto veinticinco por ciento (0.25) del valor de las obras que ejecuten directamente o por medio de subcontratistas*".

Se expide la presente certificación con destino al **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - NIT 800.103.927-7**, para realizar el cobro del **ACTA PARCIAL N° 013** del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Atentamente,

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256 de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



274197-T

DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295337 308328

Identificación Plástica S.A. 180942/0139

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360
MOGOLLON BAUTISTA
APELLIDOS
DAYVEL DARILIANA
NOMBRES

Dayvel Mogollón
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997
CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2503100-00756956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BEA3032BCAB42DBC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-18
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 26/05/2026 15:35:18
FEC. VENCE: 25/06/2026
VAL. DIAN: 26/05/2026 03:35:48

CUFE: 3dce5632517d8f1bc5d8fd020ea1e78adb548acf9866a8d9363273a4715d8c5a72e8c61967a01de1cca8e62aa8de3151

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	326,539,793.00	0	0	0.00	326,539,793.00	326,539,793.00
2	3000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	84,717,711.00	0	0	0.00	84,717,711.00	84,717,711.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	1,632,699.00	0	0	0.00	1,632,699.00	1,632,699.00
4	A000889	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	11,611,528.00	0	0	0.00	11,611,528.00	11,611,528.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	5,000,000.00	0	0	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	429,501,731.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	429,501,731.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 013 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 16/04/2026 A 24/05/2026.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

26 May 2026 14:44
NIT 901514217
Usuario: ILEANA STELLA CARVAJAL ARENAS

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
181.53.181.26

Fecha
26 May 2026 14:44

Referencia 2
NIT

Número de factura
162814121

Referencia 3
901514217

Descripción del pago
Pago Ordinario FIC

Valor del Pago
$1.073.754

Número de comprobante
TR2605261444407xSIMN

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 2506**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	162814121	338032604	26/05/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.53.181.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,073,754.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,073,754.00	COP$ 1,073,754.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	162814121	338032604	26/05/2026

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3202435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 013

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
429501731.00

Costo Total Mano de Obra
107375432.00

Número de Trabajadores en el Periodo
31

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1073754.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1073754.00

ecollect
Seguro para ti

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-19
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 26/05/2026 15:36:46
FEC. VENCE: 25/06/2026
VAL. DIAN: 26/05/2026 03:37:16

CUFE: d8fd1185231641c98008766be2add1420c8bdd1d81dafb9905eff75c435769d91715504594a90bd4376e7f770e6d863b

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 Cl. 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	74,876,755.00	0	0	0.00	74,876,755.00	74,876,755.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	19,467,957.00	0	0	0.00	19,467,957.00	19,467,957.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	374,384.00	0	0	0.00	374,384.00	374,384.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UND	UTILIDAD CON IVA DES	3,743,838.00	0	19	711,329.00	3,743,838.00	4,455,167.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	2,000,000.00	0	0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	100,462,934.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	711,329.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	101,174,263.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: CIENTO UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 013 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 16/04/2026 A 24/05/2026.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

26 May 2026 14:53
NIT 901514217
Usuario: ILEANA STELLA CARVAJAL ARENAS

Pago exitoso
CUS 338069176

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
181.53.181.26

Fecha
26 May 2026 14:53

Referencia 2
NIT

Número de factura
162815182

Referencia 3
901514217

Descripción del pago
Pago Ordinario FIC

Valor del Pago
$251.157

Número de comprobante
TR260526145351PI7aG8

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 2506**

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	162815182	338069176	26/05/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.53.181.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 251,157.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 251,157.00	COP$ 251,157.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	162815182	338069176	26/05/2026

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3202435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 013

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
100462934.00

Costo Total Mano de Obra
25115734.00

Número de Trabajadores en el Periodo
31

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
251157.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
251157.00

ecollect
Seguro para ti

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICACIÓN DE ICA

San José de Cúcuta, 25 de mayo de 2026

Señores;
SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
E. S. D.

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021.**

ASUNTO: **CERTIFICADO RETENCIÓN ICA.**

Cordial saludo,

Mediante la presente, la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6,** en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, certifica que el cobro del **ACTA PARCIAL Nº 013** se ejecutó en el Barrio **LA PARADA**, ubicado en el municipio de **VILLA DEL ROSARIO**, las cuales fueron desarrolladas en el **PERIODO 16 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2026** en la obra cuyo objeto es: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER."

Cordialmente;

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256 de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

BALANCE FINANCIERO CON COPIA DE COMPROBANTES DE EGRESO

UNION TEMPORAL
ESTACION LA PARADA OCO

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	BASE	IVA	TOTAL
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 22,839,988,162	$ 142,021,426	$ 22,982,010,588
OTROSÍ ADICIONAL No 1	$ -	$ -	$ -
OTROSÍ ADICIONAL No 2	$ 11,490,240,853	$	$ 11,490,240,853
OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3	$ 2,564,804,931	$ 18,389,995	$ 2,583,294,926
OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4	$ 2,838,902,865		$ 2,838,902,865
TOTAL CONTRATO:	$ 39,734,046,811	$ 160,411,421	$ 39,894,458,232
TOTAL FACTURADO:	$ 24,642,568,254	$ 154,376,814	$ 24,796,945,068
% FACTURADO:			62.16%
PENDIENTE POR FACTURAR:	$ 15,091,472,207	$ 6,034,607	$ 15,097,507,154
FECHA DE TERMINACIÓN			

Nº de Factura		FE1	FE2	FE3	FE5	FE6	FE7	FE8	FE9	FE12	FEP13	FEP14	FEP16	FEP17	FEP18	FEP19
Nº cv Acta		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	012	013	013
Fecha de Factura		18/06/2023	17/04/2024	29/05/2024	28/06/2024	15/10/2024	27/11/2024	19/12/2024	11/02/2025	21/02/2025	17/12/2025	11/06/2026	18/04/2026	18/04/2026	28/05/2026	28/05/2026
Subtotal Factura		$ 141,852,244.50	$ 7,214,501,467.00	$ 2,457,008,896.00	$ 1,880,360,846.00	$ 2,102,783,888.00	$ 1,444,686,737.00	$ 1,710,779,196.00	$ 1,162,312,401.00	$ 2,034,880,248.00	$ 150,200,814.00	$ 1,094,705,368.00	$ 1,244,088,336.00	$ 376,833,904.00	$ 108,821,751.00	$ 192,450,000.00
IVA		$ 142,021,426.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,291,805.00	$ 7,467,560.00	$ -	$ 2,700,934.00	$ -	$ 171,000.00
SALDO ADEUDADO POR FACTURA		$ 988,503,670.50	$ 7,214,501,467.00	$ 2,457,008,896.00	$ 1,880,360,846.00	$ 2,102,783,888.00	$ 1,444,686,737.00	$ 1,710,779,196.00	$ 1,162,312,401.00	$ 2,034,880,248.00	$ 157,291,619.00	$ 1,102,998,928.00	$ 1,244,088,336.00	$ 379,533,838.00	$ 108,821,751.00	$ 192,621,000.00

DESCUENTOS APLICADOS																
Nº de Factura	Tarifas	FE1	FE3	FE4	FE5	FE6	FE7	FE8	FE9	FE12	FEP13	FEP14	FEP16	FEP17	FEP18	FEP19
Nº cv Acta	%	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	012	013	013
Nº Comprobante de Egreso		CE 000400	CE 001451	CE 002778	CE 004628	CE 012966	CE 013565	CE 017068	CE 020484	CE 020484	CE 019456	CE 023250	CE 008191	CE 008199	PENDIENTE	PENDIENTE
Fecha del Comprobante de Egreso		26/06/2023	16/04/2024	30/05/2024	04/06/2024	29/10/2024	29/10/2024	20/12/2024	21/02/2025	7/05/2025	24/12/2025	19/05/2026	22/04/2026	22/04/2026		
Retrapago Tesorería del Dto. Hoy Prosperia	2.50%	$ 10,687,000.00	$ 175,463,000.00	$ 60,421,000.00	$ 42,334,000.00	$ 54,800,000.00	$ 36,117,000.00	$ 42,770,000.00	$ 29,058,000.00	$ 3,800,000.00	$ 3,800,000.00	$ 27,368,000.00	$ 31,102,000.00	$ 9,308,000.00	$ 10,738,000.00	$ 2,313,000.00
Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesorería Financiera	5.00%	$ 22,424,000.00	$ 315,000,000.00	$ 73,110,000.00	$ 53,801,000.00	$ 65,784,000.00	$ 43,341,000.00	$ 51,324,000.00	$ 34,869,000.00	$ 4,687,000.00	$ 4,680,000.00	$ 32,841,000.00	$ 37,322,000.00	$ 11,376,000.00	$ 12,886,000.00	$ 2,774,000.00
Estampilla Pro desarrollo Distrital - Sobre Pagos Tesorería Profesionales	1.50%	$ 7,475,000.00	$ 105,375,000.00	$ 36,585,000.00	$ 25,420,000.00	$ 32,892,000.00	$ 21,670,000.00	$ 25,662,000.00	$ 17,436,000.00	$ 2,343,000.00	$ 2,340,000.00	$ 16,421,000.00	$ 18,661,000.00	$ 5,687,000.00	$ 6,443,000.00	$ 1,388,000.00
Retrapago Tesorería Profesionales 2022	2.50%	$ 7,475,000.00	$ 140,375,000.00	$ 48,780,000.00	$ 33,867,000.00	$ 43,856,000.00	$ 28,894,000.00	$ 34,216,000.00	$ 23,248,000.00	$ 3,124,000.00	$ 3,124,000.00	$ 21,894,000.00	$ 24,881,000.00	$ 7,517,000.00	$ 8,591,000.00	$ 1,851,000.00
Estamp Pro Desarrollo Adulto Mayor - Sobre pagos tesorería academicos 2023	1.50%	$ 7,475,000.00	$ 70,185,000.00	$ 24,375,000.00	$ 16,934,000.00	$ 21,928,000.00	$ 14,447,000.00	$ 17,108,000.00	$ 11,623,000.00	$ 1,563,000.00	$ 1,560,000.00	$ 10,947,000.00	$ 12,441,000.00	$ 3,759,000.00	$ 4,295,000.00	$ 924,000.00
Sobre pagos tesorería HUBAM 2023	2.50%	$ 14,950,000.00	$ 140,370,000.00	$ 48,780,000.00	$ 33,867,000.00	$ 43,856,000.00	$ 28,894,000.00	$ 34,216,000.00	$ 23,248,000.00	$ 3,124,000.00	$ 3,124,000.00	$ 21,894,000.00	$ 24,881,000.00	$ 7,517,000.00	$ 8,591,000.00	$ 1,851,000.00
Estampilla Prodeporte - Sobre pagos Tesorería Prodeportes 2020	0.50%	$ 3,960,000.00	$ 52,140,000.00	$ 18,496,000.00	$ 13,347,000.00	$ 17,542,000.00	$ 11,568,000.00	$ -	$ 9,298,000.00	$ 14,906,000.00	$ 1,250,000.00	$ 8,758,000.00	$ 9,952,000.00	$ 3,007,000.00	$ 3,437,000.00	$ 739,000.00
Contribuciones Contratos de Obra - Retrapago Tesorería 2023	5.00%		$ 350,925,074.00	$ 121,950,445.00	$ 84,668,050.00	$ 109,639,195.00	$ 72,234,857.00	$ 85,539,989.00	$ 58,115,025.00	$ 141,743,212.00	$ 7,812,500.00	$ 54,735,284.00	$ 62,203,467.00	$ 15,797,545.00	$ 21,475,000.00	$ 4,625,797.00
Retención Ganancias 0% - Retención en La Fuente	0.00%	$ 41,848,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Retención Ganancias 2% - Retención en La Fuente	2.00%	$ -	$ 140,370,000.00	$ 48,780,000.00	$ 33,867,000.00	$ 43,856,000.00	$ 28,894,000.00	$ 34,216,000.00	$ 23,248,000.00	$ 3,124,000.00	$ 3,124,000.00	$ 21,894,000.00	$ 24,881,000.00	$ 7,517,000.00	$ 8,591,000.00	$ 1,851,000.00
Impuesto a las Ventas Retenido	15.00%	$ 21,322,200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102,200.00	$ 1,170,200.00	$ -	$ 435,100.00	$ -	$ 166,000.00
Retención de ICA - 9*1000 Vlr del Rosario - Tarifa Obra	0.70%	$ -	$ 49,129,500.00	$ 17,059,062.00	$ 11,853,500.00	$ 15,349,500.00	$ 10,112,000.00	$ 11,975,000.00	$ 8,136,187.00	$ 1,093,000.00	$ 1,248,700.00	$ 7,662,900.00	$ 8,708,500.00	$ 2,630,900.00	$ 3,006,500.00	$ 647,850.00
Retención de ICA - 9*1000 Vlr del Rosario - Tarifa Consultoría	0.70%	$ 4,984,900.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	30.50%	$ 139,103,100.00	$ 1,436,760,574.00	$ 498,585,507.00	$ 347,136,550.00	$ 449,522,695.00	$ 296,163,737.00	$ 337,639,989.00	$ 238,272,907.00	$ 179,544,481.00	$ 32,340,941.50	$ 235,994,436.00	$ 268,053,967.00	$ 77,451,545.00	$ 88,454,500.00	$ 16,930,647.00
VALOR NETO A PAGAR POR EL CONTRATANTE		$ 734,400,770.60	$ 5,579,707,912.60	$ 1,937,423,393.00	$ 1,246,222,446.00	$ 1,743,261,264.00	$ 1,148,534,060.00	$ 1,373,752,730.30	$ 924,039,584.50	$ 1,855,215,767.00	$ 124,950,578.00	$ 876,972,522.00	$ 980,035,369.00	$ 301,982,053.00	$ 241,466,744.00	$ 98,471,233.00

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-1
FECHA: 18/05/2022 18:14:20
FEC. VENCE: 26/05/2022
VAL. DIAN: 18/05/2022 06:16:51
FORMA PAGO: CREDITO 8 días

Resolución Autorización DIAN N° 18764020182121 con Prefijo FE desde 1 hasta 1000 con vigencia desde 27/10/2021 hasta 27/10/2022

CUFE: 7ff3491d9e15112137161e4cedfdf0b954f66bac7f11e1f972f16885bf3e2c27b073fcf3b8d74374895bdf22faae46e6

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION
Ciudad: Cucuta , COLOMBIA
Establecimiento: 0
NIT: 800103927-7
Teléfono: 5710590
Email: tesoreria@nortedesantander.gov.co
Vendedor: NAPOLEON GUZMAN CASTILLO

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	A000465	1.00	A31	ESTUDIOS Y DISEÑOS	747,482,244.60	0	19	747,482,244.60

Total items: 1

IVA (%)	Base Gravada	IVA
19.00	747,482,245	142,021,626

Totales

Subtotal:	747,482,244.60
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	747,482,245.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	142,021,626.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	889,503,871.00

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (%) EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)
CONSTRUCTORA CCC S.A.	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE S.A.S.	39%
PEDELTA DE COLOMBIA S.A.S.	1%
C G B S.A.S.	1%
CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.	8%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	1%
GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO	1%

Monto en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE CON 00/100 CENTAVOS

Información adicional

ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC

Impresa por Software TNS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006400

ORDEN DE PAGO : 00 R0086-R
FECHA : may-20/2022
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA N. FE-1 (18-05-2022). CONTRATO N° 01362 DE 2021. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DE 2021

.EGISTRO : 00 3572

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4501001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-servicios de asistencia tecnica	00 R0086	2.3.2.02.02.008	00	240102.01	CONTRIBUCION SOBRE CONTRTOS DE OBRS RECURSOS DEL BALANCE	889,503,871.00

Und. Ejec: 1 **Prod. Inv:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** 83129

TOTALES **889,503,871.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	747,482,245.00	2.5	18,687,000.00
*.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	747,482,245.00	3.0	22,424,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	747,482,245.00	1.0	7,475,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	747,482,245.00	1.0	7,475,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	747,482,245.00	1.0	7,475,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	747,482,245.00	2.0	14,950,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	747,482,245.00	0.8	5,980,000.00
15020301	SERVICIOS EN GENERAL 6%	747,482,245.00	6.0	44,849,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	142,021,626.00	15.0	21,303,200.00
15030304	SERVICIOS TARIFA 0.6%	747,482,245.00	0.6	4,484,900.00

TOTAL DESCUENTOS **155,103,100.00**

NETO A PAGAR **734,400,771.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006400

ORDEN DE PAGO : 00 R0086-R
FECHA : may-20/2022
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA N. FE-1 (18-05-2022). CONTRATO N° 01362 DE 2021. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DE 2021

REGISTRO : 00 3572

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-2
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 17/04/2024 10:01:03
FEC. VENCE: 22/04/2024
VAL. DIAN: 17/04/2024 10:39:09

CUFE: d632e4eaa22314d1c73ea3b6f388bdc734e87c4f7b924292a0f52b4bc467c12571e6cd486dd6f3e78d0180d5f8e3e73a

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: - Cucuta
Teléfonos:
Email: utestacionlaparada@gmail.com

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cucuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	5,357,634,723.00	0	0	0.00	5,357,634,723.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	1,389,988,491.00	0	0	0.00	1,389,988,491.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	26,788,174.00	0	0	0.00	26,788,174.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	190,513,752.00	0	0	0.00	190,513,752.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	53,576,347.00	0	0	0.00	53,576,347.00

items: 5

Totales

Total:	7,018,501,487.00
Total Base Imponible:	7,018,501,487.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	7,018,501,487.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: SIETE MIL DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* ..BRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 03/11/2023 A 02/04/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001431

ORDEN DE PAGO : 00 001105-V
FECHA : abr-18/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO N.2 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE-2 DEL 17-04-2024. OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

AMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 001105	2.3.2.02.02.005	35	240102.19	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	5,422,652,518.79
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 001105	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,595,848,968.21
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
						TOTALES	**7,018,501,487.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

ODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	7,018,501,487.00	2.5	175,463,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	7,018,501,487.00	3.0	210,555,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	7,018,501,487.00	1.5	105,278,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	7,018,501,487.00	2.0	140,370,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	7,018,501,487.00	1.0	70,185,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	7,018,501,487.00	2.0	140,370,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	7,018,501,487.00	0.8	56,148,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	7,018,501,487.00	5.0	350,925,074.00
15020602	Contrato de Obra 2%	7,018,501,487.00	2.0	140,370,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	7,018,501,487.00	0.7	49,129,500.00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001431

ORDEN DE PAGO : 00 001105-V
FECHA : abr-18/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO N.2 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE-2 DEL 17-04-2024. OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

TOTAL DESCUENTOS	**1,438,793,574.00**
NETO A PAGAR	**5,579,707,913.00**

APROBÓ

Elaboró:
JAIMES ASDRUBAL AVILA MORENO

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-3
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 28/05/2024 16:17:53
FEC. VENCE: 02/06/2024
VAL. DIAN: 28/05/2024 04:24:04

CUFE: ca4ad892be6bb1f199a1d89dd22987ba1c80a7cea503e6561e0a982e0c30e021eb79a7ac1ff3ba09910e435f45f81cba

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cucuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cucuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,856,714,538.00	0	0	0.00	1,856,714,538.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	481,707,316.00	0	0	0.00	481,707,316.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	9,283,572.00	0	0	0.00	9,283,572.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	66,023,473.00	0	0	0.00	66,023,473.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	23,280,000.00	0	0	0.00	23,280,000.00

Items: 5

Totales

Total:	2,437,008,899.00
Total Base Imponible:	2,437,008,899.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,437,008,899.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 003 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* :3RADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 03/04/2024 A 28/05/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002778

ORDEN DE PAGO : 00 002390-V
FECHA : may-30/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA FE-3 DE 2024. OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 002390	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,555,219,825.52
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 002390	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	881,789,073.48
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
					TOTALES		**2,437,008,899.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	2,437,008,899.00	2.5	60,925,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,437,008,899.00	3.0	73,110,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,437,008,899.00	1.5	36,555,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,437,008,899.00	2.0	48,740,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,437,008,899.00	1.0	24,370,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,437,008,899.00	2.0	48,740,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,437,008,899.00	0.8	19,496,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	2,437,008,899.00	5.0	121,850,445.00
15020602	Contrato de Obra 2%	2,437,008,899.00	2.0	48,740,000.00
150605	LIBRANZAS	0.00	0.0	254,079,791.95
152201	RETEICA 7*1000 OBRA VILLA DEL ROSARIO	2,437,008,899.00	0.7	17,059,062.00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002778

ORDEN DE PAGO : 00 002390-V
FECHA : may-30/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA FE-3 DE 2024. OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 01362-2021

CUENTA : 260432992
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

TOTAL DESCUENTOS	**753,665,298.95**
NETO A PAGAR	**1,683,343,600.05**

APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-4
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 02/08/2024 08:27:27
FEC. VENCE: 07/08/2024
VAL. DIAN: 02/08/2024 08:30:39

CUFE: b0a0750824cf252025afdabf22ef32a23ddc37a7467a361661c6ad9894e4197628354872ddf07c1648156cf96b983a20

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,295,123,843.00	0	0	0.00	1,295,123,843.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	336,007,833.00	0	0	0.00	336,007,833.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	6,475,619.00	0	0	0.00	6,475,619.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	46,053,701.00	0	0	0.00	46,053,701.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	9,700,000.00	0	0	0.00	9,700,000.00

Items: 5

Totales

Total:	1,693,360,996.00
Total Base Imponible:	1,693,360,996.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,693,360,996.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* IRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 29/05/2024 A 31/07/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÀN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1
FORMA PAGO: CONTADO
FECHA: 02/08/2024 09:34:17
FEC. VENCE: 02/08/2024
VALIDACIÓN DIAN: 02/08/2024 09:34:41

CUFE: 8d289dfb15c55c8e4405b3a6447626268b82f5a7a02441d417d02faf4240b2dfc13ec111c325ab4cd6bafbfe5d757ff4

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: U.T. Estación la Parada OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO
Factura No. FE74

#	Código	Descripción	Cant.	Und.	Bodega	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	00000161	COSTO DIRECTO	1.00	UND	00	1,295,123,843.00	0.00	0.00	0.00	1,295,123,843.00
2	00000162	ADMINISTRACION	1.00	UND	00	336,007,833.00	0.00	0.00	0.00	336,007,833.00
3	00000163	IMPREVISTOS	1.00	UND	00	6,475,619.00	0.00	0.00	0.00	6,475,619.00
4	A000461	UTILIDAD SIN IVA	1.00	UND	00	46,053,701.00	0.00	0.00	0.00	46,053,701.00
5	A000462	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	1.00	UND	00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00

Totales

Subtotal:	1,693,360,996.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
ICUI:	0.00
TOTAL:	1,693,360,996.00

Monto en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).* PERIODO

Motivo devolución: ANULACION DE FACTURA

18764060800833

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-5
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 02/08/2024 09:38:28
FEC. VENCE: 07/08/2024
VAL. DIAN: 02/08/2024 09:41:15

CUFE: 1c902bcaa3bb7f7ce26bdfa9914d054013d5f1c65c6ccc9f5e02bdf48727b3efca6e052a66eb2e5a584c209bc496e2b9

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,295,123,843.00	0	0	0.00	1,295,123,843.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	336,007,833.00	0	0	0.00	336,007,833.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	6,475,619.00	0	0	0.00	6,475,619.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	46,053,701.00	0	0	0.00	46,053,701.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	9,700,000.00	0	0	0.00	9,700,000.00

items: 5

Totales

Total:	1,693,360,996.00
Total Base Imponible:	1,693,360,996.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,693,360,996.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

.BRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 29/05/2024 A 01/08/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006625

ORDEN DE PAGO : 00 007605-V
FECHA : ago-08/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO FACTURA FE-5 DEL 2/08/2024 OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 007605	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,693,360,996.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **1,693,360,996.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,693,360,996.00	2.5	42,334,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,693,360,996.00	3.0	50,801,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,693,360,996.00	1.5	25,400,000.00
..1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,693,360,996.00	2.0	33,867,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,693,360,996.00	1.0	16,934,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,693,360,996.00	2.0	33,867,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,693,360,996.00	0.8	13,547,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,693,360,996.00	5.0	84,668,050.00
15020602	Contrato de Obra 2%	1,693,360,996.00	2.0	33,867,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	1,693,360,996.00	0.7	11,853,500.00
150605	LIBRANZAS	0.00	0.0	453,841,417.93

TOTAL DESCUENTOS **800,979,967.93**

NETO A PAGAR **892,381,028.07**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006625

ORDEN DE PAGO : 00 007605-V
FECHA : ago-08/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO FACTURA FE-5 DEL 2/08/2024 OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-6
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 15/10/2024 11:48:42
FEC. VENCE: 20/10/2024
VAL. DIAN: 15/10/2024 11:56:13

CUFE: 75454b69cd2577a608c1123b25329082668c8c66f5acae4889c133cc88c00d5289cdada4db329910661723e051ff51fd

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,676,433,768.00	0	0	0.00	1,676,433,768.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	434,935,147.00	0	0	0.00	434,935,147.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	8,382,169.00	0	0	0.00	8,382,169.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	59,612,815.00	0	0	0.00	59,612,815.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	13,420,000.00	0	0	0.00	13,420,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,192,783,899.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,192,783,899.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 005 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* FIRMADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 02/08/2024 A 10/10/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 012565

ORDEN DE PAGO : 00 011772-V
FECHA : oct-25/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO FACTURA FE- 6 DEL 15/10/2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001370 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

PUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 011772	2.3.2.02.02.005	35VE	240102.19	1.3.3.11.08-R.B. OTRAS TRANSFERENCIA S DE CAPITAL	2,192,783,899.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **2,192,783,899.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	2,192,783,899.00	2.5	54,820,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,192,783,899.00	3.0	65,784,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,192,783,899.00	1.5	32,892,000.00
.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,192,783,899.00	2.0	43,856,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,192,783,899.00	1.0	21,928,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,192,783,899.00	2.0	43,856,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,192,783,899.00	0.8	17,542,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	2,192,783,899.00	5.0	109,639,195.00
15020602	Contrato de Obra 2%	2,192,783,899.00	2.0	43,856,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	2,192,783,899.00	0.7	15,349,500.00
159945	LIBRANZA A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.0	386,809,582.00

TOTAL DESCUENTOS **836,332,277.00**

NETO A PAGAR **1,356,451,622.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 012565

ORDEN DE PAGO : 00 011772-V
FECHA : oct-25/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO FACTURA FE- 6 DEL 15/10/2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001370 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-7
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 27/11/2024 14:55:01
FEC. VENCE: 02/12/2024
VAL. DIAN: 27/11/2024 03:12:13

CUFE: 2caab958fb42a297b8444811f1e6598bc5a35e64ef57edae9bc127c34da28d2cdb213e1393fca1e830e6a02dbfaf5a5d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,087,796,336.00	0	0	0.00	1,087,796,336.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	282,218,640.00	0	0	0.00	282,218,640.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	5,438,982.00	0	0	0.00	5,438,982.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	38,681,279.00	0	0	0.00	38,681,279.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	30,561,500.00	0	0	0.00	30,561,500.00

Items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,444,696,737.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,444,696,737.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 006 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 11/10/2024 A 14/11/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014371

ORDEN DE PAGO : 00 013642-V, 00 013645-V
FECHA : dic-03/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO No. 07 SEGUN FACTURA FE-07 DE 2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 001370, 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232, 00 002176 - 15/04/2024

PUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 013642	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	341,369,511.09
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 013645	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	437,528,843.70
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 013645	2.3.2.02.02.005	35VE	240102.19	1.3.3.11.08-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	665,798,382.21
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
						TOTALES	**1,444,696,737.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,444,696,737.00	2.5	36,117,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,444,696,737.00	3.0	43,341,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,444,696,737.00	1.5	21,670,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,444,696,737.00	2.0	28,894,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,444,696,737.00	1.0	14,447,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,444,696,737.00	2.0	28,894,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,444,696,737.00	0.8	11,558,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,444,696,737.00	5.0	72,234,837.00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014371

ORDEN DE PAGO : 00 013642-V, 00 013645-V
FECHA : dic-03/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO No. 07 SEGUN FACTURA FE-07 DE 2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 001370, 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232, 00 002176 - 15/04/2024

15020602	Contrato de Obra 2%	1,444,696,737.00	2.0	28,894,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	1,444,696,737.00	0.7	10,112,900.00
150605	LIBRANZAS	0.00	0.0	234,515,000.00

TOTAL DESCUENTOS **530,677,737.00**

NETO A PAGAR **914,019,000.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-8
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 18/12/2024 12:17:59
FEC. VENCE: 23/12/2024
VAL. DIAN: 18/12/2024 12:31:42

CUFE: 33987a68fe12d4ddd5fe518157f5a4a2a8ba13a0eef9f7d8038dde8dddda784acfff33470f97380adcfdd285f77c1729

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,301,528,997.00	0	0	0.00	1,301,528,997.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	337,669,591.00	0	0	0.00	337,669,591.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	6,507,645.00	0	0	0.00	6,507,645.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	46,281,462.00	0	0	0.00	46,281,462.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	18,791,500.00	0	0	0.00	18,791,500.00

Items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,710,779,195.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,710,779,195.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 007 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* EBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 15/11/2024 A 12/12/2024.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017098

ORDEN DE PAGO : 00 016847-V
FECHA : dic-20/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : CUENTA No. 8 SEGUN FACTURA FEP-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001370 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 016847	2.3.2.02.02.005	35VE	240102.19	1.3.3.11.08-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,710,779,195.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **1,710,779,195.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,710,779,195.00	2.5	42,770,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,710,779,195.00	3.0	51,324,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,710,779,195.00	1.5	25,662,000.00
.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,710,779,195.00	2.0	34,216,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,710,779,195.00	1.0	17,108,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,710,779,195.00	2.0	34,216,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,710,779,195.00	5.0	85,538,959.80
15020602	Contrato de Obra 2%	1,710,779,195.00	2.0	34,216,000.00
152201	RETEICA 7*1000 OBRA VILLA DEL ROSARIO	1,710,779,195.00	0.7	11,975,500.00

TOTAL DESCUENTOS **337,026,459.80**

NETO A PAGAR **1,373,752,735.20**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017098

ORDEN DE PAGO : 00 016847-V
FECHA : dic-20/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : CUENTA No. 8 SEGUN FACTURA FEP-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001370 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-9
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 11/02/2025 18:01:05
FEC. VENCE: 19/02/2025
VAL. DIAN: 11/02/2025 06:04:14

CUFE: a20d532ffaa89d8ab13bfe0956c4c3fa87d2ead4578eef520d157839fbf2c954de9501dfa3f416561ec3ac6aed69f837

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	883,531,462.00	0	0	0.00	883,531,462.00	883,531,462.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	229,224,019.00	0	0	0.00	229,224,019.00	229,224,019.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	4,417,657.00	0	0	0.00	4,417,657.00	4,417,657.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	31,417,763.00	0	0	0.00	31,417,763.00	31,417,763.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	13,721,500.00	0	0	0.00	13,721,500.00	13,721,500.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,162,312,401.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,162,312,401.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 008 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

)RADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 13/12/2024 A 30/01/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-10
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025 16:06:59
FEC. VENCE: 01/03/2025
VAL. DIAN: 21/02/2025 05:08:14

CUFE: 97ff8d4a573b52169d4c3e48fc6eb5ac00b6266b19dbd1be20fb47969e3cfc93bd6b314da70664727f4c9ba9d97fcc9d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	2,178,864,528.00	0	0	0.00	2,178,864,528.00	2,178,864,528.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	565,286,134.00	0	0	0.00	565,286,134.00	565,286,134.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	10,894,323.00	0	0	0.00	10,894,323.00	10,894,323.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	77,478,903.00	0	0	0.00	77,478,903.00	77,478,903.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	21,788,645.00	0	0	0.00	21,788,645.00	21,788,645.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,854,312,533.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,854,312,533.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

4 PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 31/01/2025 A 19/02/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE2
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025 17:54:33
FEC. VENCE: 01/03/2025
VALIDACIÓN DIAN: 21/02/2025 06:10:19

5dbbb29a607777a226ca5ee0d0e320d90429f4720b2f8a155ce39d9a6ab4f38c1445b0aa2835ec4f434fb27d148ccf86

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: U.T. Estación la Parada OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO
Factura No. FE710

#	Código	Descripción	Cant.	Und.	Bodega	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	00000161	COSTO DIRECTO	1.00	UND	00	2,178,864,528.00	0.00	0.00	0.00	2,178,864,528.00
2	00000162	ADMINISTRACION	1.00	UND	00	565,286,134.00	0.00	0.00	0.00	565,286,134.00
3	00000163	IMPREVISTOS	1.00	UND	00	10,894,323.00	0.00	0.00	0.00	10,894,323.00
4	00000461	UTILIDAD SIN IVA	1.00	UND	00	77,478,903.00	0.00	0.00	0.00	77,478,903.00
5	00000462	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	1.00	UND	00	21,788,645.00	0.00	0.00	0.00	21,788,645.00

Totales

Subtotal:	2,854,312,533.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
ICUI:	0.00
TOTAL:	2,854,312,533.00

Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD YCONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).* PERIODO

Motivo devolución: ANULACION DE FACTURA

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FE desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-11
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025
FEC. VENCE: 01/03/2025
VAL. DIAN: 21/02/2025 05:59:23

CUFE: 7e1b7042a3ffd316faf8d7016e500dff78cdee03b373c8bed74b1ca60bcd7118141192fb3a7acdff2bcf10b46736b352

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	2,164,015,456.00	0	0	0.00	2,164,015,456.00	2,164,015,456.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	561,433,680.00	0	0	0.00	561,433,680.00	561,433,680.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	10,820,077.00	0	0	0.00	10,820,077.00	10,820,077.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	76,950,880.00	0	0	0.00	76,950,880.00	76,950,880.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	21,640,155.00	0	0	0.00	21,640,155.00	21,640,155.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,834,860,248.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,834,860,248.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 31/01/2025 A 19/02/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-12
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025
FEC. VENCE: 01/03/2025
VAL. DIAN: 21/02/2025 07:25:30

CUFE: 47087e8d1acaaeffba3c2814bcafe542b7ccccc65459c04ea1a3994671fd9fbfdd41c96d8ebf44f225c12cd82dbca00d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	2,164,015,172.00	0	0	0.00	2,164,015,172.00	2,164,015,172.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	561,433,606.00	0	0	0.00	561,433,606.00	561,433,606.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	10,820,076.00	0	0	0.00	10,820,076.00	10,820,076.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	76,950,870.00	0	0	0.00	76,950,870.00	76,950,870.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	21,640,524.00	0	0	0.00	21,640,524.00	21,640,524.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,834,860,248.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,834,860,248.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* A PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 31/01/2025 A 19/02/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000484

ORDEN DE PAGO : 00 000362-R
FECHA : mar-07/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : CUENTA No. 9 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FEP-12 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 000362	2.3.2.02.02.005	35VE	240102.19	1.3.3.11.08-R.B. OTRAS TRANSFERENCIA S DE CAPITAL	2,834,860,248.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **2,834,860,248.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.01	Tasa Deporte y Recreacion	2,834,860,248.00	2.5	70,872,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,834,860,248.00	3.0	85,046,000.00
1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,834,860,248.00	1.5	42,523,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,834,860,248.00	2.0	56,697,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,834,860,248.00	1.0	28,349,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,834,860,248.00	2.0	56,697,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,834,860,248.00	0.8	22,679,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,710,779,195.00	0.8	13,686,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	2,834,860,248.00	5.0	141,743,012.00
15020602	Contrato de Obra 2%	2,834,860,248.00	2.0	56,697,000.00
150605	LIBRANZAS	0.00	0.0	472,409,891.00
152201	RETEICA 7*1000 OBRA VILLA DEL ROSARIO	2,834,860,248.00	0.7	19,844,022.00

TOTAL DESCUENTOS **1,067,242,925.00**

NETO A PAGAR **1,767,617,323.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000484

ORDEN DE PAGO : 00 000362-R
FECHA : mar-07/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : CUENTA No. 9 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FEP-12 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-13
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 17/12/2025 09:53:07
FEC. VENCE: 25/12/2025
VAL. DIAN: 17/12/2025 11:53:03

CUFE: 9e0c6b70cbb6aa23abb5174b61d22b9b2946e4793cc0a27bec8c732e6d546a1f9463bcc6b4ebdcc8889558580b21ced2

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	113,853,167.00	0	0	0.00	113,853,167.00	113,853,167.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	29,601,823.00	0	0	0.00	29,601,823.00	29,601,823.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	569,266.00	0	0	0.00	569,266.00	569,266.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UND	UTILIDAD CON IVA DES	5,692,658.00	0	19	1,081,605.00	5,692,658.00	6,774,263.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	6,493,000.00	0	0	0.00	6,493,000.00	6,493,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	156,209,914.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	1,081,605.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	157,291,519.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 010 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

JRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 20/02/2025 A 24/02/2025 Y 10/10/2025 AL 16/12/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 019458

ORDEN DE PAGO : 00 019354-V
FECHA : 24/12/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO No. 11 SEGUN FACTURA FEP-13 DE 2025. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 005031 - 15/10/2025
REGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501066	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - Estaciones de policia construidas y dotadas	00 019354	2.3.2.02.02.005	00	240102.28	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	157,291,519.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501066 **Código BPIN:** 2024004540020 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **157,291,519.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	156,209,914.00	2.5	3,905,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	156,209,914.00	3.0	4,686,000.00
.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	156,209,914.00	1.5	2,343,149.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	156,209,914.00	2.0	3,124,198.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	156,209,914.00	1.0	1,562,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	156,209,914.00	2.0	3,124,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	156,209,914.00	0.8	1,250,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	156,209,914.00	5.0	7,810,496.00
15020602	Contrato de Obra 2%	156,209,914.00	2.0	3,124,198.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,081,605.00	15.0	162,200.00
150340.03	RETE ICA ACTIVIDAD SERVICIOS OBRA. INTERVENTORIA VILLA CARO	156,209,914.00	0.8	1,249,700.00

TOTAL DESCUENTOS **32,340,941.00**

NETO A PAGAR **124,950,578.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 019458

ORDEN DE PAGO : 00 019354-V
FECHA : 24/12/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO No. 11 SEGUN FACTURA FEP-13 DE 2025. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 005031 - 15/10/2025
REGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-14
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 11/03/2026 19:13:48
FEC. VENCE: 10/04/2026
VAL. DIAN: 11/03/2026 07:44:03

CUFE: 35590defff0f917d131c65ccb9c76f1518f617ff0187ed4c57b03b1441282a691703f4dbdb38c43ba7ab348df27e1c9d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	827,532,600.00	0	0	0.00	827,532,600.00	827,532,600.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	215,158,476.00	0	0	0.00	215,158,476.00	215,158,476.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	4,137,662.00	0	0	0.00	4,137,662.00	4,137,662.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UND	UTILIDAD CON IVA DES	41,376,630.00	0	19	7,861,560.00	41,376,630.00	49,238,190.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	6,500,000.00	0	0	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,094,705,368.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	7,861,560.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,102,566,928.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 011 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 17/12/2025 A 07/03/2026.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003293

ORDEN DE PAGO : 00 002750-R
FECHA : 19/03/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO No. 12 SEGUN FACTURA FEP-14 DE 2026. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

REGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501066	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - Estaciones de policia construidas y dotadas	00 002750	2.3.2.02.02.005	00	240102.28	1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,102,566,928.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501066 **Código BPIN:** 2024004540020 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **1,102,566,928.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,094,705,368.00	2.5	27,368,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,094,705,368.00	3.0	32,841,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,094,705,368.00	1.5	16,421,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,094,705,368.00	2.0	21,894,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,094,705,368.00	1.0	10,947,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,094,705,368.00	2.0	21,894,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,094,705,368.00	0.8	8,758,000.00
1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,094,705,368.00	5.0	54,735,268.00
15020602	Contrato de Obra 2%	1,094,705,368.00	2.0	21,894,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	7,861,560.00	15.0	1,179,200.00
152201	RETEICA 7*1000 OBRA VILLA DEL ROSARIO	1,094,705,368.00	0.7	7,662,938.00

TOTAL DESCUENTOS **225,594,406.00**

NETO A PAGAR **876,972,522.00**

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003293

ORDEN DE PAGO : 00 002750-R
FECHA : 19/03/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO No. 12 SEGUN FACTURA FEP-14 DE 2026. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

REGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-15
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 16/04/2026 10:27:54
FEC. VENCE: 16/05/2026
VAL. DIAN: 16/04/2026 10:34:31

CUFE: 38674b6412aae700169723223ff9d1955628bfb9f45f012c9568886cca0421557e4bfcc0f568e09977088c11a45bcdef

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	952,745,643.00	0	0	0.00	952,745,643.00	952,745,643.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	247,180,994.00	0	0	0.00	247,180,994.00	247,180,994.00
	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	4,763,728.00	0	0	0.00	4,763,728.00	4,763,728.00
4	A000889	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	33,878,971.00	0	0	0.00	33,878,971.00	33,878,971.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	5,500,000.00	0	0	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
6	A000888	1.00	UND	PATOLOGIA	378,533,598.00	0	0	0.00	378,533,598.00	378,533,598.00

Total items: 6

Totales

Total Base Imponible:	1,622,602,934.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,622,602,934.00

Total Cantidades: 6

Monto en letras: MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 012 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 08/03/2026 A 15/04/2026.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNION TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE4
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 16/04/2026 11:25:09
FEC. VENCE: 16/05/2026
VALIDACIÓN DIAN: 16/04/2026 11:38:26

d536d24b8ef2d14d323cde2836e43f73ed4d38e8e92ce7604acf81184eba2b2f263c35932e4c0da4ae424474baea1ed0

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: U.T. Estación la Parada OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO
Factura No. FE715

#	Código	Descripción	Cant.	Und.	Bodega	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	00000161	COSTO DIRECTO Observación:	1.00	UND	00	952,745,643.00	0.00	0.00	0.00	952,745,643.00
2	00000162	ADMINISTRACION	1.00	UND	00	247,180,994.00	0.00	0.00	0.00	247,180,994.00
	00000163	IMPREVISTOS	1.00	UND	00	4,763,728.00	0.00	0.00	0.00	4,763,728.00
	000889	UTILIDAD SIN IVA	1.00	UND	00	33,878,971.00	0.00	0.00	0.00	33,878,971.00
5	A000462	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	1.00	UND	00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6	A000888	PATOLOGIA	1.00	UND	00	378,533,598.00	0.00	0.00	0.00	378,533,598.00

Totales

Subtotal:	1,622,602,934.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
ICUI:	0.00
TOTAL:	1,622,602,934.00

Monto en letras: MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 012 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR [illegible]O NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).* PERIODO DE C

[illegible]o devolución: ANULACION DE FACTURA

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FE desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-16
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 16/04/2026 11:08:10
FEC. VENCE: 16/05/2026
VAL. DIAN: 16/04/2026 11:23:11

CUFE: 98dae46c8eee615ea0d1dd9c19f3013de5aadc38e00d020bd0d7f977217af5fdfd5ba564698792a2a26cd9b0feb8ef19

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	952,745,643.00	0	0	0.00	952,745,643.00	952,745,643.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	247,180,994.00	0	0	0.00	247,180,994.00	247,180,994.00
	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	4,763,728.00	0	0	0.00	4,763,728.00	4,763,728.00
4	A000889	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	33,878,971.00	0	0	0.00	33,878,971.00	33,878,971.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	5,500,000.00	0	0	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,244,069,336.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,244,069,336.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

I. mación adicional

* ACTA PARCIAL N° 012 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 08/03/2026 A 15/04/2026.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-17
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 16/04/2026 11:21:00
FEC. VENCE: 16/05/2026
VAL. DIAN: 16/04/2026 11:23:03

CUFE: 3ded28a23a78a7590013b221718a13ab51491e365070f4a36dcb372fbe1cb82b642de822fa1fd1df95631a50be65507e

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	284,283,577.00	0	0	0.00	284,283,577.00	284,283,577.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	73,913,730.00	0	0	0.00	73,913,730.00	73,913,730.00
	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	1,421,418.00	0	0	0.00	1,421,418.00	1,421,418.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UND	UTILIDAD CON IVA DES	14,214,179.00	0	19	2,700,694.00	14,214,179.00	16,914,873.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	2,000,000.00	0	0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	375,832,904.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	2,700,694.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	378,533,598.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

I. mación adicional

* ACTA PARCIAL N° 012 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021 - PATOLOGIA
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 08/03/2026 A 15/04/2026.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006180

ORDEN DE PAGO : 00 005483-R
FECHA : 22/04/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO 14 FACTURA FEP-17 DEL DEL 16/04/2026. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

REGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501066	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - Estaciones de policia construidas y dotadas	00 005483	2.3.2.02.02.005	00	240102.28	1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	378,533,598.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501066 **Código BPIN:** 2024004540020 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **378,533,598.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	375,832,904.00	2.5	9,396,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	375,832,904.00	3.0	11,275,000.00
.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	375,832,904.00	1.5	5,637,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	375,832,904.00	2.0	7,517,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	375,832,904.00	1.0	3,758,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	375,832,904.00	2.0	7,517,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	375,832,904.00	0.8	3,007,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	375,832,904.00	5.0	18,791,645.00
15020602	Contrato de Obra 2%	375,832,904.00	2.0	7,517,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	2,700,694.00	15.0	405,100.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	375,832,904.00	0.7	2,630,800.00

TOTAL DESCUENTOS **77,451,545.00**

NETO A PAGAR **301,082,053.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006180

ORDEN DE PAGO : 00 005483-R
FECHA : 22/04/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO 14 FACTURA FEP-17 DEL DEL 16/04/2026. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

..EGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006181

ORDEN DE PAGO : 00 005484-V
FECHA : 22/04/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.3 ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNIC
OBJETO : PAGO 13 FACTURA FEP-16 DEL 16/04/2026. CONTRATO NO. 1362-2021 ADICIONAL N.3 ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERAMERICATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 1362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001367 - 12/01/2026
FGISTRO : 00 002851 - 11/02/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4501066	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - Estaciones de policia construidas y dotadas	00 005484	2.3.2.02.02.009	00	240102.28	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,244,069,336.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501066 **Código BPIN:** 2024004540020 **Prod. DANE:** 91199

TOTALES **1,244,069,336.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,244,069,336.00	2.5	31,102,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,244,069,336.00	3.0	37,322,000.00
.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,244,069,336.00	1.5	18,661,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,244,069,336.00	2.0	24,881,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,244,069,336.00	1.0	12,441,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,244,069,336.00	2.0	24,881,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,244,069,336.00	0.8	9,953,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,244,069,336.00	5.0	62,203,467.00
15020602	Contrato de Obra 2%	1,244,069,336.00	2.0	24,881,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	1,244,069,336.00	0.7	8,708,500.00

TOTAL DESCUENTOS **255,033,967.00**

NETO A PAGAR **989,035,369.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006181

ORDEN DE PAGO : 00 005484-V
FECHA : 22/04/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.3 ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNIC
OBJETO : PAGO 13 FACTURA FEP-16 DEL 16/04/2026. CONTRATO NO. 1362-2021 ADICIONAL N.3 ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERAMERICATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 1362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001367 - 12/01/2026
REGISTRO : 00 002851 - 11/02/2026

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-18
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 26/05/2026 15:35:18
FEC. VENCE: 25/06/2026
VAL. DIAN: 26/05/2026 03:35:48

CUFE: 3dce5632517d8f1bc5d8fd020ea1e78adb548acf9866a8d9363273a4715d8c5a72e8c61967a01de1cca8e62aa8de3151

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	326,539,793.00	0	0	0.00	326,539,793.00	326,539,793.00
2	J000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	84,717,711.00	0	0	0.00	84,717,711.00	84,717,711.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	1,632,699.00	0	0	0.00	1,632,699.00	1,632,699.00
4	A000889	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	11,611,528.00	0	0	0.00	11,611,528.00	11,611,528.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	5,000,000.00	0	0	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	429,501,731.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	429,501,731.00

Total Cantidades: 5
M[illegible] en letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 013 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 16/04/2026 A 24/05/2026.

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-19
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 26/05/2026 15:36:46
FEC. VENCE: 25/06/2026
VAL. DIAN: 26/05/2026 03:37:16

CUFE: d8fd1185231641c98008766be2add1420c8bdd1d81dafb9905eff75c435769d91715504594a90bd4376e7f770e6d863b

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	74,876,755.00	0	0	0.00	74,876,755.00	74,876,755.00
2	000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	19,467,957.00	0	0	0.00	19,467,957.00	19,467,957.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	374,384.00	0	0	0.00	374,384.00	374,384.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UND	UTILIDAD CON IVA DES	3,743,838.00	0	19	711,329.00	3,743,838.00	4,455,167.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	2,000,000.00	0	0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	100,462,934.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	711,329.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	101,174,263.00

Total Cantidades: 5
M[illegible] en letras: CIENTO UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 013 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 16/04/2026 A 24/05/2026.
