
Id	Modo de	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado	Duración real
1		**SENA KENNEDY CONTRATO DE CONSULTORÍA**	**121,13 días**	**vie 30/05/25**	**mar 25/11/25**	**$2.653.490.098,00**	**86%**	**104,13 días**
2		**FASE 1**	**39 días**	**vie 30/05/25**	**vie 25/07/25**	**$530.697.650,00**	**100%**	**39 días**
3		**ENTREGA 1 - AJUSTE ANTEPROYECTO**	**30,13 días**	**vie 30/05/25**	**lun 14/07/25**	**$0,00**	**100%**	**30,13 días**
4		Hojas de vida del equipo de trabajo y carta de compromiso de las especialidades	22,75 días	vie 30/05/25	vie 4/07/25	$0,00	100%	22,75 días
5		Cronograma detallado	13 días	lun 7/07/25	vie 25/07/25	$0,00	100%	13 días
6		Acta de inicio	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25	$0,00	100%	1 día
7		Plan de calidad	30 días	vie 30/05/25	lun 14/07/25	$0,00	100%	30 días
8		Informe preliminar	5 días	vie 18/07/25	jue 24/07/25	$0,00	100%	5 días
9		Anteproyecto Arquitectonico ajustado segun recomendaciones del jura	7 días	jue 17/07/25	vie 25/07/25	$0,00	100%	7 días
10		FASE 2	72 días	vie 30/05/25	vie 12/09/25	$1.061.395.848,00	99%	**72 días**
11		**ENTREGA 2 - PROYECTO CURADURIA**	**72 días**	**vie 30/05/25**	**vie 12/09/25**	**$0,00**	**100%**	**72 días**
12		**GEOTÉCNIA**	**15 días**	**lun 14/07/25**	**vie 1/08/25**	**$0,00**	**100%**	**15 días**
13		Estudio detallado e informe definitivo suelos	15 días	lun 14/07/25	vie 1/08/25	$0,00	100%	15 días
14		**ESTRUCTURA**	**43 días**	**lun 14/07/25**	**vie 12/09/25**	**$0,00**	**100%**	**43 días**
15		Predimensionamiento estructural	15 días	lun 14/07/25	vie 1/08/25	$0,00	100%	15 días
16		Proyecto estructural para radicacion en curaduria	38 días	lun 21/07/25	vie 12/09/25	$0,00	100%	38 días
17		**ARQUITECTURA**	**72,13 días**	**vie 30/05/25**	**vie 12/09/25**	**$0,00**	**100%**	**72,13 días**
18		A000 - LOCALIZACIÓN Y CUADRO DE AREAS	15 días	lun 28/07/25	mar 19/08/25	$0,00	100%	15 días
19		A100 - PLANTAS GENERALES.	20 días	lun 21/07/25	mar 19/08/25	$0,00	100%	20 días
20		A200 - SECCIONES GENERALES	38 días	lun 21/07/25	vie 12/09/25	$0,00	100%	38 días
21		A300 - ALZADOS GENERALES	10 días	lun 1/09/25	vie 12/09/25	$0,00	100%	10 días
22		**ANTEPROYECTO TECNICOS**	**43 días**	**lun 14/07/25**	**vie 12/09/25**	**$0,00**	**100%**	**43 días**
23		Anteproyecto iluminación	28 días	lun 14/07/25	vie 22/08/25	$0,00	100%	28 días
24		Anteproyecto seguridad humana	28 días	lun 14/07/25	vie 22/08/25	$0,00	100%	28 días
25		Anteproyecto electrico	28 días	lun 14/07/25	vie 22/08/25	$0,00	100%	28 días
26		Anteproyecto hidráulico y sanitario	28 días	lun 28/07/25	vie 5/09/25	$0,00	100%	28 días
27		Anteproyecto bioclimatico	28 días	lun 28/07/25	vie 5/09/25	$0,00	100%	28 días
28		Anteproyecto coordinacion BIM	28 días	lun 28/07/25	vie 5/09/25	$0,00	100%	28 días
29		Anteproyecto Acustico	28 días	lun 28/07/25	vie 5/09/25	$0,00	100%	28 días
30		Anteproyecto Aire acondicionado	28 días	lun 28/07/25	vie 5/09/25	$0,00	100%	28 días
31		Anteproyecto Presupuesto, programacion y especificaciones de obra	27,13 días	lun 4/08/25	jue 11/09/25	$0,00	100%	27,13 días
32		Disponibilidad de servicios publicos	15,13 días	lun 14/07/25	vie 1/08/25	$0,00	100%	15,13 días
33		Certificado de radicacion legal y debida forma	5,13 días	lun 8/09/25	vie 12/09/25	$0,00	100%	5,13 días
34		FASE 3 (30%) - PROYECTO FINAL-DETALLES	176 días	vie 12/09/25	vie 22/05/26	$796.047.622,00	79%	**139,04 días**
35		**ENTREGA DE PROYECTO FINAL - DETALLES**	**176 días**	**vie 12/09/25**	**vie 22/05/26**	**$0,00**	**79%**	**139,04 días**
36		**ARQUITECTURA**	**50 días**	**vie 12/09/25**	**mar 25/11/25**	**$0,00**	**100%**	**50 días**
37		ARQ0900 _ Llamado detalles	6 días	vie 12/09/25	vie 19/09/25	$0,00	100%	6 días
38		ARQ1000 _ Cortes por Fachada	15 días	lun 22/09/25	vie 10/10/25	$0,00	100%	15 días
39		ARQ2000 _ Escaleras	6 días	vie 19/09/25	vie 26/09/25	$0,00	100%	6 días
40		ARQ3000 _ Baños - ctos técnicos	10 días	lun 29/09/25	vie 10/10/25	$0,00	100%	10 días
41		ARQ4000 _ Pisos + guardaescobas + mediacañas	11 días	vie 12/09/25	vie 26/09/25	$0,00	100%	11 días
42		ARQ4200 _ Cielo rasos + mediacañas	10 días	lun 20/10/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	10 días
43		ARQ4400 _ Muros tipología	5 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	5 días
44		ARQ4600 _ Muros acabados	4 días	mar 4/11/25	vie 7/11/25	$0,00	100%	4 días
45		ARQ5000 _ Localización y Cuadro de puertas	5 días	lun 15/09/25	vie 19/09/25	$0,00	100%	5 días
46		ARQ5200 _ Localización y Cuadro de Ventanas + Barandas	10 días	lun 22/09/25	vie 3/10/25	$0,00	100%	10 días
47		ARQ5400 _ Localización muebles fijos y dotacionales	9 días	lun 6/10/25	vie 17/10/25	$0,00	100%	9 días
48		ARQ5600 _ Cuadro muebles fijos	10 días	lun 20/10/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	10 días
49		ARQ5800 _ Cuadro muebles dotacionales	15 días	mar 4/11/25	mar 25/11/25	$0,00	100%	15 días
50		ARQ6000 _ Detalles especiales - (SEGÚN SKP)	11 días	lun 10/11/25	mar 25/11/25	$0,00	100%	11 días
51		ARQ7000 _ Espacio público + exteriores	15 días	mar 4/11/25	mar 25/11/25	$0,00	100%	15 días
52		TXT0000 _ Textos	14 días	mar 14/10/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	14 días
53		**PROYECTO TECNICO DEFINITIVO**	**49 días**	**lun 15/09/25**	**mar 25/11/25**	**$0,00**	**100%**	**49 días**
54		iluminación	26 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	26 días
55		seguridad humana	26 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	26 días
56		Electrico	26 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	26 días
57		Hidraulico y sanitario	26 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	26 días
58		Bioclimatico	26 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	26 días
59		Coordinacion BIM	26 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	26 días
60		Acustico	26 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	26 días
61		Aire acondicionado	26 días	jue 25/09/25	vie 31/10/25	$0,00	100%	26 días
62		Presupuesto, programacion y especificaciones de obra	49 días	lun 15/09/25	mar 25/11/25	$0,00	100%	49 días
63		**APROBACIÓN DE LICENCIAS**	**175 días**	**lun 15/09/25**	**vie 22/05/26**	**$0,00**	**54%**	**94,77 días**
64		**Aprobacion licencia de construccion**	**130 días**	**lun 15/09/25**	**vie 20/03/26**	**$0,00**	**73%**	**95 días**
65		Revisión Interventoria	49 días	lun 15/09/25	mar 25/11/25	$0,00	100%	49 días
66		Ajuste observaciones	26 días	mar 25/11/25	jue 1/01/26	$0,00	100%	26 días
67		Revisión Interventoria	15 días	lun 5/01/26	vie 23/01/26	$0,00	100%	15 días
68		Ajuste observaciones	15 días	lun 26/01/26	vie 13/02/26	$0,00	33%	5 días
69		Aprobacion licencia- preliquidacion expensas	5 días	lun 16/02/26	vie 20/02/26	$0,00	0%	0 días
70		pago expensas a cargo SENA	15 días	lun 23/02/26	vie 13/03/26	$0,00	0%	0 días
71		Resolucion licenca ejecutoriada	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	$0,00	0%	0 días
72		**Aprobacion servicio publico**	**174 días**	**mar 16/09/25**	**vie 22/05/26**	**$0,00**	**43%**	**74,69 días**
73		Radicacion servicios publicos	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	$0,00	0%	0 días
74		revision empresa servicios publicos	16 días	vie 27/03/26	vie 17/04/26	$0,00	0%	0 días
75		Ajuste observaciones	5 días	lun 20/04/26	vie 24/04/26	$0,00	0%	0 días
76		tiempo de revision SP	15 días	lun 27/04/26	vie 15/05/26	$0,00	0%	0 días
77		Aprobacion servicios publicos	4 días	lun 18/05/26	jue 21/05/26	$0,00	0%	0 días
78		**Suscripcion dolacta de terminacion de la etapa de diseños**	174 días	mar 16/09/25	vie 22/05/26	$0,00	54%	94 días
79		ETAPA 4 -LIQUIDACION (10%)	20 días	lun 25/05/26	vie 19/06/26	$265.348.978,00	0%	**0 días**
80		Acta de Liquidacion del Contrato	20 días	lun 25/05/26	vie 19/06/26	$0,00	0%	0 días

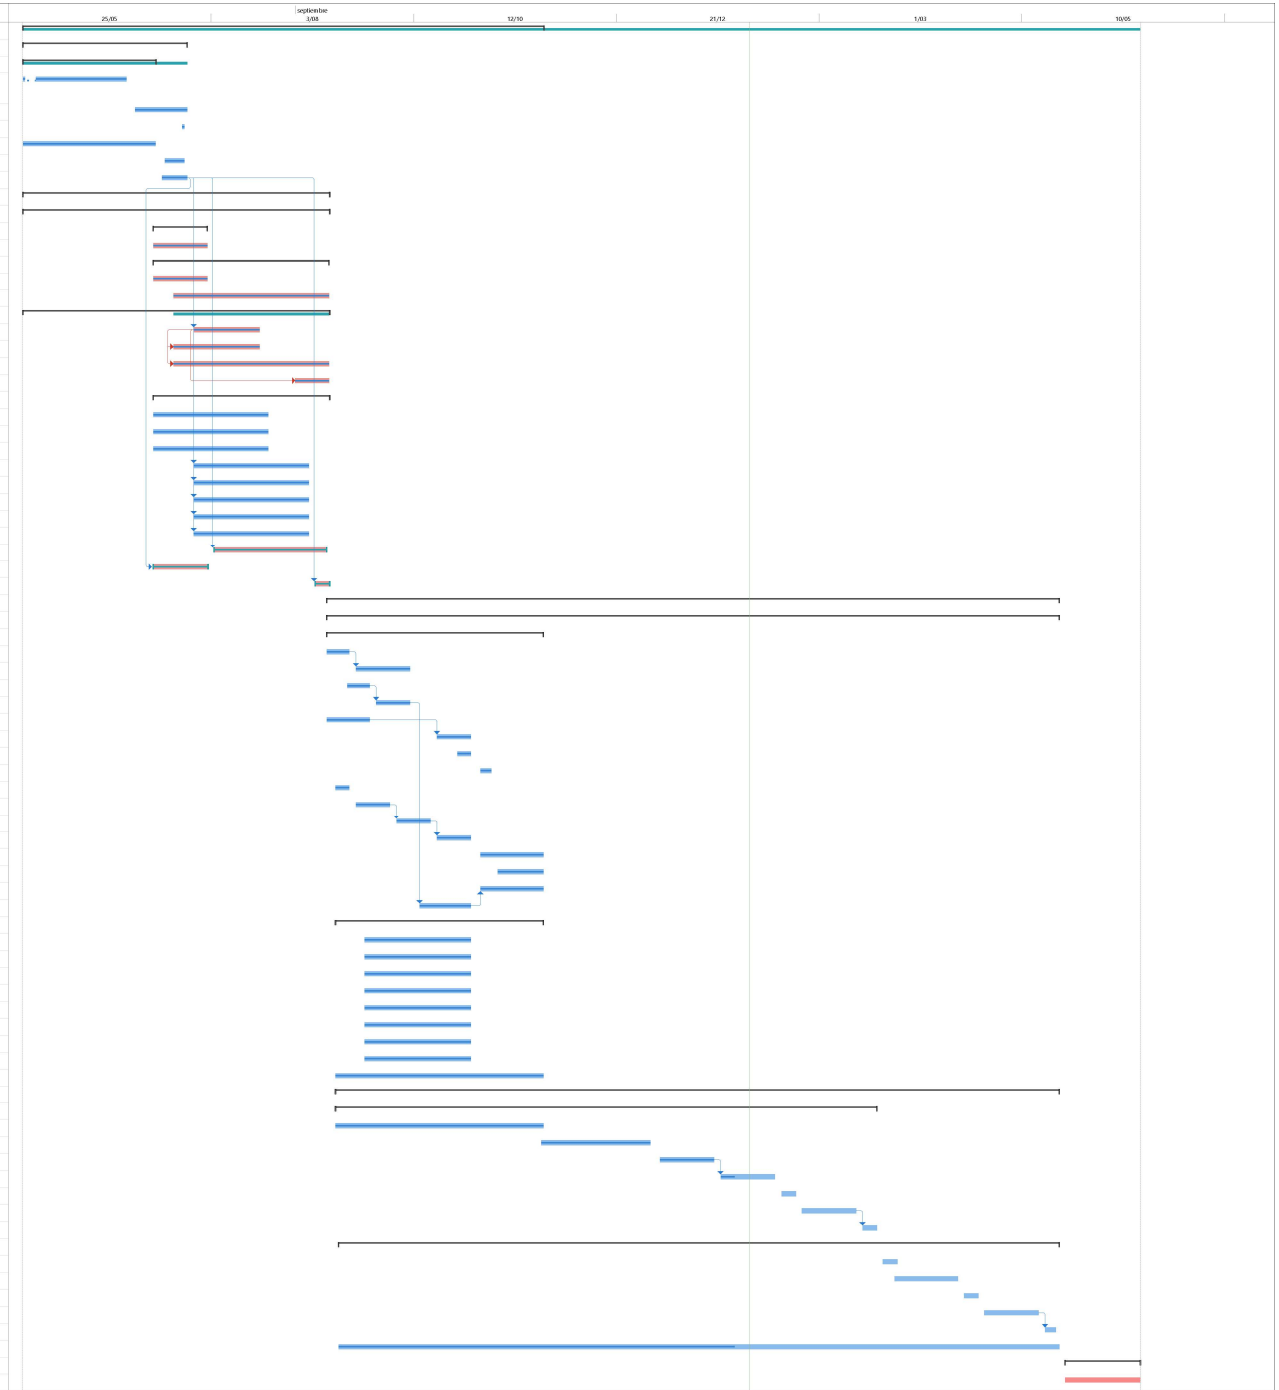

Project: TA_CIÉNAGA DE ORO_C
Date: jue 5/02/26

División crítica · Split · Summary · Inactive Task · Inactive Summary · Duration-only · Manual Summary · Finish-only · External Milestone · Progress · Tareas críticas
Task · Milestone · Project Summary · Inactive Milestone · Manual Task · Manual Summary Rollup · Start-only · External Tasks · Deadline · Manual Progress
