INFORME AVANCE DE OBRA

OBJETO: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIEZ (10) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA”.



I.E EL PLACER - CORREGIMIENTO EL REAL PLACER MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO- I.E. MANUEL DOLORES MONDRAGON – CORREGIMIENTO LA TULIA MUNICIPIO BOLIVAR – I.E. MARIA INMACULADA SEDE PRIMARIA – CORREGIMIENTO LA TULIA MUNICIPIO BOLIVAR – I.E. ISABEL LA CATOLICA SEDE PRIMARIA – CORREGIMIENTO NARANJAL MUNICIPIO BOLIVAR – I.E. MARIA DOLORES MONDRAGON SEDE BACHIDERATO – CORREGIMIENTO NARANJAL MUNICIPIO OBLIVAR – I.E. COLEGIO GILBERTO ALZATE AVENDAÑO – CORREGIMIENTO ALBAN MUNICIPIO EL CAIRO – I.E. LA PRESENTACION – CORREGIMIENTO ALBAN MUNICIPIO EL CAIRO – I.E. CAMILO TORRES – CORREGIMEINTO LA ZULIA MUNICIPIO RIOFRIO – I.E. HERACLIO URIBE URIBE – CORREGIMIENTO EL CRUCERO MUNICIPIO SEVILLA – I.E. TECNICA AGROPECUARIA – CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO MUNICIPIO TORO – I.E. MARIA INMACULADA – CORREGIMEINTO MOCTEZUMA MUNICIPIO ULLOA – I.E MANUELA BELTRAN – CORREGIMEINTO LA RIVERA MUNICIPIO VIJES – I.E. DIEGO RENGIFO SALAZAR – CORREGIMIENTO EL BOSQUE MUNICIPIO YOTOCO

2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA

Contrato: 2000.13.03.007-2025

Objeto:

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de diez (10) sistemas de tratamiento de agua potable en beneficio de instituciones educativas rurales del departamento del Valle del Cauca, que incluyen la implementación de un sistema lúdico-pedagógico de formación y capacitación en el programa Cultura del Agua.

1. Introducción

El presente informe tiene como finalidad presentar los avances realizados en la ejecución del contrato 2000.13.03.007-2025, cuyo objetivo es fortalecer el acceso a agua potable en instituciones educativas rurales mediante la instalación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y la implementación del componente pedagógico “Cultura del Agua”.

El contrato contempla la intervención de las siguientes instituciones educativas:

N	Municipio	Corregimiento	Institución Educativa
1	Ansermanuevo	El Real Placer	IE El Placer
2	Bolivar	La Tulia	Manuel Dolores Mondragon Bachillerato
3	Bolivar	La Tulia	María Inmaculada Primaria
4	Bolivar	Naranjal	Isabel La católica Primaria
5	Bolivar	Naranjal	Manuel Dolores Mondragon Bachillerato
6	El Cairo	Alban	Col Gilberto Álzate Avendaño
7	El Cairo	Alban	La Presentación
8	Riofrio	La Zulia	Camilo Torres
9	Sevilla	El Crucero	Heraclio Uribe Uribe

10	Toro	San Francisco	Técnica Agropecuaria
11	Ulloa	Moctezuma	María Inmaculada
12	Vijes	La Rivera	Manuela Beltran
13	Yotoco	El Bosque	Diego Rengifo Salazar

Aclaración:

En el corregimiento de Naranjal solo se benefició directamente la IE Manuel Dolores Mondragón. Inicialmente se evaluó la posibilidad de interconectar ambas sedes del corregimiento, pero no fue viable debido a la distancia entre ellas y a que la intervención requeriría afectar vías principales, generando impactos significativos a la comunidad.

2. Avances por Corregimiento

2.1 Ansermanuevo – El Real Placer

- Proyecto completamente ejecutado.
- Actividades realizadas:
  - Charlas de Cultura del Agua a estudiantes.
  - Entrega de cartillas informativas.
  - Capacitación a docentes y comunidad interesada.
  - Entrega formal de la PTAP en plena operación y funcionamiento.

2.2 Bolívar – La Tulia

- Proyecto completamente ejecutado.
- Actividades realizadas:
  - Charlas de Cultura del Agua a estudiantes.
  - Entrega de cartillas informativas.
  - Capacitación a docentes y comunidad interesada.
  - Entrega formal de la PTAP en plena operación y funcionamiento.

2.3 Bolívar – Naranjal

- Proyecto completamente ejecutado.

- Actividades realizadas:
    - Charlas de Cultura del Agua.
    - Entrega de cartillas informativas.
    - Capacitación a docentes y comunidad.
    - Entrega de la PTAP en operación y funcionamiento.

2.4 El Cairo – Albán

- Instalación de PTAP con capacidad de 3 LPS.
- Actividades realizadas:
    - Charlas de Cultura del Agua y entrega de cartillas en las instituciones educativas del corregimiento.
    - Capacitación y entrega del proyecto a la comunidad, con participación del presidente de la Junta, concejales y representantes de la alcaldía.
    - Recepción formal de la PTAP por parte de Agualbán, entidad encargada del acueducto veredal.

2.5 Riofrío – La Zulia

- Proyecto completamente ejecutado.
- Actividades realizadas:
    - Charlas de Cultura del Agua a estudiantes.
    - Entrega de cartillas informativas.
    - Capacitación a docentes y comunidad interesada.
    - Entrega formal de la PTAP en plena operación y funcionamiento.

2.6 Sevilla – El Crucero

- Ya se realizó fundida de la placa de concreto
- Se descargo la ptap y materiales requeridos para la instalación del equipo
- Se proyecta realizar la instalación entre la semanas del ejecutando actividades de instalación esta semana del 28 de mayo al 11 de junio.

2.7 Toro – San Francisco

- Proyecto completamente ejecutado.
- Actividades realizadas:
    - Charlas de Cultura del Agua.
    - Entrega de cartillas informativas.
    - Capacitación a docentes y comunidad.
    - Entrega de la PTAP en operación y funcionamiento.

2.8 Ulloa – Moctezuma

- Proyecto completamente ejecutado.
- Actividades realizadas:
    - Charlas de Cultura del Agua a estudiantes.
    - Entrega de cartillas informativas.
    - Capacitación a docentes y comunidad interesada.
    - Entrega formal de la PTAP en plena operación y funcionamiento.

2.9 Vijes – La Rivera

- Ya se realizo fundida de la placa de concreto
- Se descargo la ptap y materiales requeridos para la instalación del equipo
- Se esta ejecutando actividades de instalación esta semana del 27 de abril al al 12 de mayo

2.10 Yotoco – El Bosque

- Ya se realizó fundida de la placa de concreto
- Se descargo la ptap y materiales requeridos para la instalación del equipo
- Se proyecta realizar la instalación entre la semanas del ejecutando actividades de instalación esta semana del 13 de mayo al 27 de mayo.

3. Conclusiones

El proyecto presenta un avance significativo, con varios corregimientos ya finalizados y entregados, y otros en fase de infraestructura o programación. Las actividades pedagógicas y de capacitación se han desarrollado satisfactoriamente en las sedes donde la PTAP ya se encuentra instalada y operativa.

Se recomienda continuar con la programación establecida para garantizar el cumplimiento del cronograma y asegurar que todas las instituciones beneficiarias reciban tanto la infraestructura como el componente formativo del programa Cultura del Agua.

Registro Fotográfico

Moctezuma, Ulloa


9 de abril de 2026 12:29
I.E. María Inmaculada


9 de abril de 2026 13:23
5-54 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada

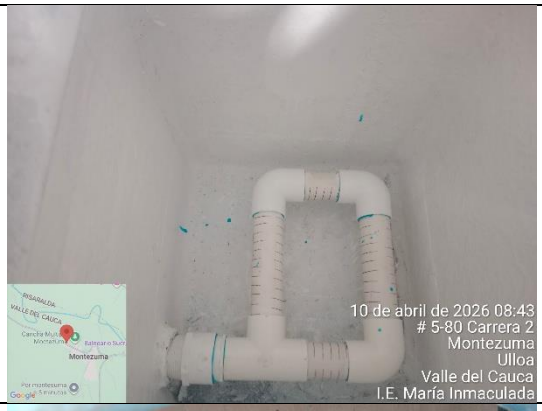

9 de abril de 2026 13:30
5-65 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


9 de abril de 2026 13:31
5-80 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


9 de abril de 2026 17:29
5-65 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


9 de abril de 2026 17:29
5-65 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


10 de abril de 2026 07:10
5-80 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


10 de abril de 2026 08:43
5-80 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


10 de abril de 2026 08:57
5-80 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


10 de abril de 2026 09:25
5-80 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


10 de abril de 2026 11:07
5-80 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


22 de abril de 2026 08:04
5-54 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


22 de abril de 2026 08:04
5-54 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada

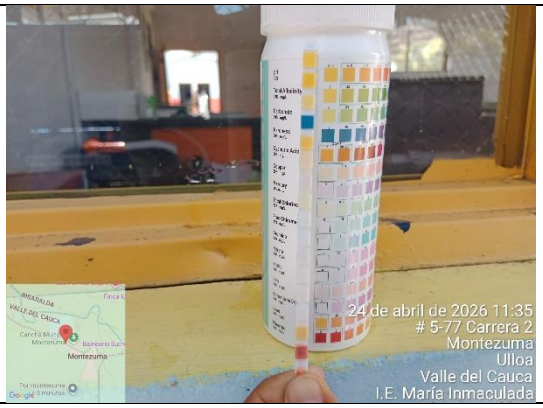

22 de abril de 2026 08:05
5-35 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


22 de abril de 2026 08:06
5-35 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


FLOCULADOR
SEDIMENTADOR
FILTRO
23 de abril de 2026 18:00
5-77 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


24 de abril de 2026 14:46
5-77 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada


24 de abril de 2026 14:46
5-77 Carrera 2
Montezuma
Ulloa
Valle del Cauca
I.E. María Inmaculada





El Placer, Ansermanuevo










11 de abril de 2026 18:05
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer


11 de abril de 2026 18:15
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer


12 de abril de 2026 08:02
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer


12 de abril de 2026 08:12
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer


12 de abril de 2026 08:19
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer


12 de abril de 2026 11:45
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer

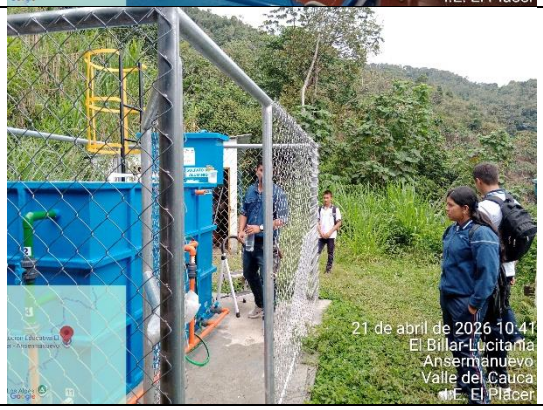

19 de abril de 2026 10:50
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer


19 de abril de 2026 10:51
I.E. El Placer


19 de abril de 2026 12:19
I.E. El Placer


20 de abril de 2026 08:10
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer


20 de abril de 2026 08:28
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer


21 de abril de 2026 10:41
El Billar-Lucitania
Ansermanuevo
Valle del Cauca
I.E. El Placer



La Zulia, Riofrio




13 de abril de 2026 11:54
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


13 de abril de 2026 11:54
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


13 de abril de 2026 18:09
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


13 de abril de 2026 18:09
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


13 de abril de 2026 18:15
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


13 de abril de 2026 18:51
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


14 de abril de 2026 08:12
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres

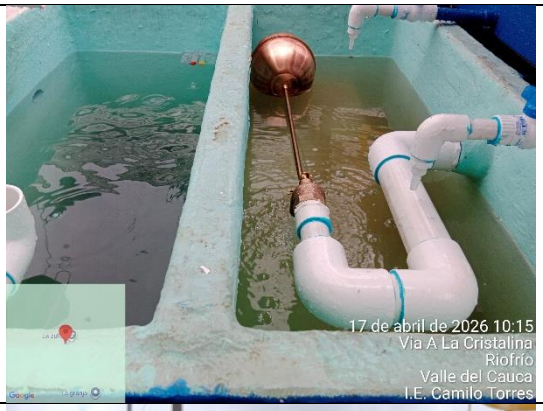

14 de abril de 2026 08:28
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


14 de abril de 2026 09:02
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


14 de abril de 2026 09:06
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


14 de abril de 2026 09:06
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres


14 de abril de 2026 18:19
Via A La Cristalina
Riofrío
Valle del Cauca
I.E. Camilo Torres







4. Estado General de Actividades por Corregimiento

N	Municipio	Corregimiento	Institucion Educativa	VISITA PREVIA	UBICACIÓN PTAP	PLACA DE CONCRETO	CERRAMIENTO	CHARLAS	INSTALACION PTAP	CAPACITACIONES
1	Ansermanuevo	El Real Placer	IE El Placer	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
2	Bolivar	La Tulia	Manuel Dolores Mondragon Bachillerato	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
3	Bolivar	La Tulia	María Inmaculada Primaria	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
4	Bolivar	Naranjal	Isabel La Católica Primaria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Bolivar	Naranjal	María Dolores Mondragón Bachillerato	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
6	El Cairo	Alban	Col Gilberto Álzate Avendaño	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
7	El Cairo	Alban	La Presentación	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
8	Riofrio	La Zulia	Camilo Torres	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO

9	Sevilla	El Crucero	Heraclio Uribe Uribe	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
10	Toro	San Francisco	Técnica Agropecuaria	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
11	Ulloa	Moctezuma	María Inmaculada	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO
12	Vijes	La Rivera	Manuela Beltran	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
13	Yotoco	El Bosque	Diego Rengifo Salazar	LISTO	LISTO	LISTO	LISTO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

Elaborado por

Ing. Joseph Guecha Rojas

Coordinador
