ANEXO 1: BITACORA

Yuli P.H.
Directa interventoria.

RESIDENTE INTERVENTORIA

lunes 4 de Mayo de 2026.

Director de obra - 1
Residente de obra arquitecto = 1
Residente de obra ing civil = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 8
Ayudantes = 26

Actividades de obra.

Se realiza vaciado de concreto premezclado en las placas de circulación parte baja del Teatrino en zona 1 Se realiza vaciado de 4 pilotes para la cubierta del Teatrino, se realiza vaciado con concreto premezclado en la rampa de acceso desde la calle 48 a la circulación de la parte baja de zona 1 (Plazoleta), se realiza lleno compactado en los zapatas del portico de zona 6, se realiza instalación perimetral de Bordillos para el parqueadero de zona 2. se realiza el lleno compactado detras de los Bordillos de zona 2 para estabilidad del Bordillo. se realiza excavación manual para bordillo de confinamiento de Tablestado en Terraza de zona 11-D., se continua con la instalación de la Baranda perimetral en zona 10-B. se realiza el Traslado de cerramiento provisional de obra en parqueadero de zona 2 para cortes mecanicos se realiza empradización en zona 10-A, se continua con revoque en Baños.

Residente de obra.

Yuli P.H.
ing interventoria

Martes 5 de Mayo de 2026 (Dia Nuboso)
Jornada: 2:00pm a 3:00pm

Personal de obra

Director de obra: 1
Residente Arquitecto: 1
Residente ing civil: 1
Profesional SST: 1
Aux administrativa: 1
Maestro de obra: 1
Oficiales: 7
Ayudantes: 25

Actividades de obra.

se realiza Instalación de Bordillo perimetral en zona 10-A para contener Tierra del Talud, se continua con la pulida de las placas de zona 10-A y 10-B para la instalación de la grama Sintetica, se realiza instalacion de arena Silica en la cancha de Voleibol arena (zona 8) se realiza retiro de Material de corte de parqueadero de zona 3, se continua con la instalación de postes para cerramiento definitivo perimetral en zona 3 se realiza descargue de Mobiliario, se continua con la siembra de arboles ornamentales en Taludes de zona 14, se continua con la conformación en Tierra y piedra de las gradas de Teatrino de zona 1 se realiza aseo a los baños de zona 4 para Mortero de nivelación, se continua con el Revoque perimetral de los Baños de zona 4, se continua con la pintura del cerramiento de la cancha Multiple de zona (9), se continua con la fabricación de la baranda o pasamanos de zona 5 se realiza conformación en Tierra para Viga entre pilotes de Z1

Residente de obra

Directora de interventoria

Miercoles 6 de Mayo de 2026.

Personal de obra.

Director de obra: 1
Residente de obra-Arquitecto: 1
Residente de obra ing. civil: 1
Profesional SST: 1
Aux administrativa: 1
Maestro de obra: 1
Oficiales: 7
Ayudantes: 22

Actividades de obra.

Se realizan cortes mecanicos en zona 3 para el cajeo de parqueadero, se continua con la conformación en Tierra y piedras de las gradas del Teatrino de zona 1 e instalación de formaleta, se continua con el vaciado de postes perimetrales en zona 14 y zona 3 para el cerramiento definitivo, se continua con la, Se realiza vaciado de rampa en el costado norte de zona 1, que conecta zona 6 con rampa circular de zona 1, se realiza el Traslado del cerramiento provisional en la zona 3 para conformación de Taludes, se realiza demolición de viga perimetral en el parqueadero de zona 3, se realiza fundida de concreto en graderias de zona 1, se realiza instalación de puertas metalicas en las casetas de ventas de zona 1, se continua con el vaciado de las placas de piso en Terrazas de zona 11-D, se realiza instalación de Bordillos de zona 10-A para contener Tierra en zona H se continua con la conformacion en Tierra y piedras en Graderias de zona 5, se realiza descargue de Mobiliario para el proyecto.

Residente de obra

ing interventoria.

Jueves 7 de Mayo de 2026

Personal en obra.

Directora de obra = 1
Residente de obra Arquitecto = 1
Residente de obra ing. civil = 1
Profesional SST = 1
Profesional aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 6
Ayudantes = 23


Actividades de obra.

se realiza reunión con interventoria en donde se establece que el formato de 60 x 60 cm color Habano, se ubicara en piso a Tope, y en parede se instalará Baldosa color blanca de 0.30 x 0.60 m y el modo de instalación es Trabado. (se anexa el detalle aprobado por interventoria), se realiza el izaje de la estructura metalica para patio de zona 6, se realiza instalación de la formaleta metalica para las paredes de la Piscina de. de zona 1, se realiza, se realizan cortes mecanicos en parqueadero de Zona 3, se continua con el traslado del cerramiento provisional de zona 3 se realiza vaciado de descanso en escaleras de zona 5 (costado sur de cancha de Voleiball arena) se continua con instalación de plaqueta de piso en zona II-C y II-D.

Yolima Herrera

Residente de obra

Yolima Herrera
ing interventoria.

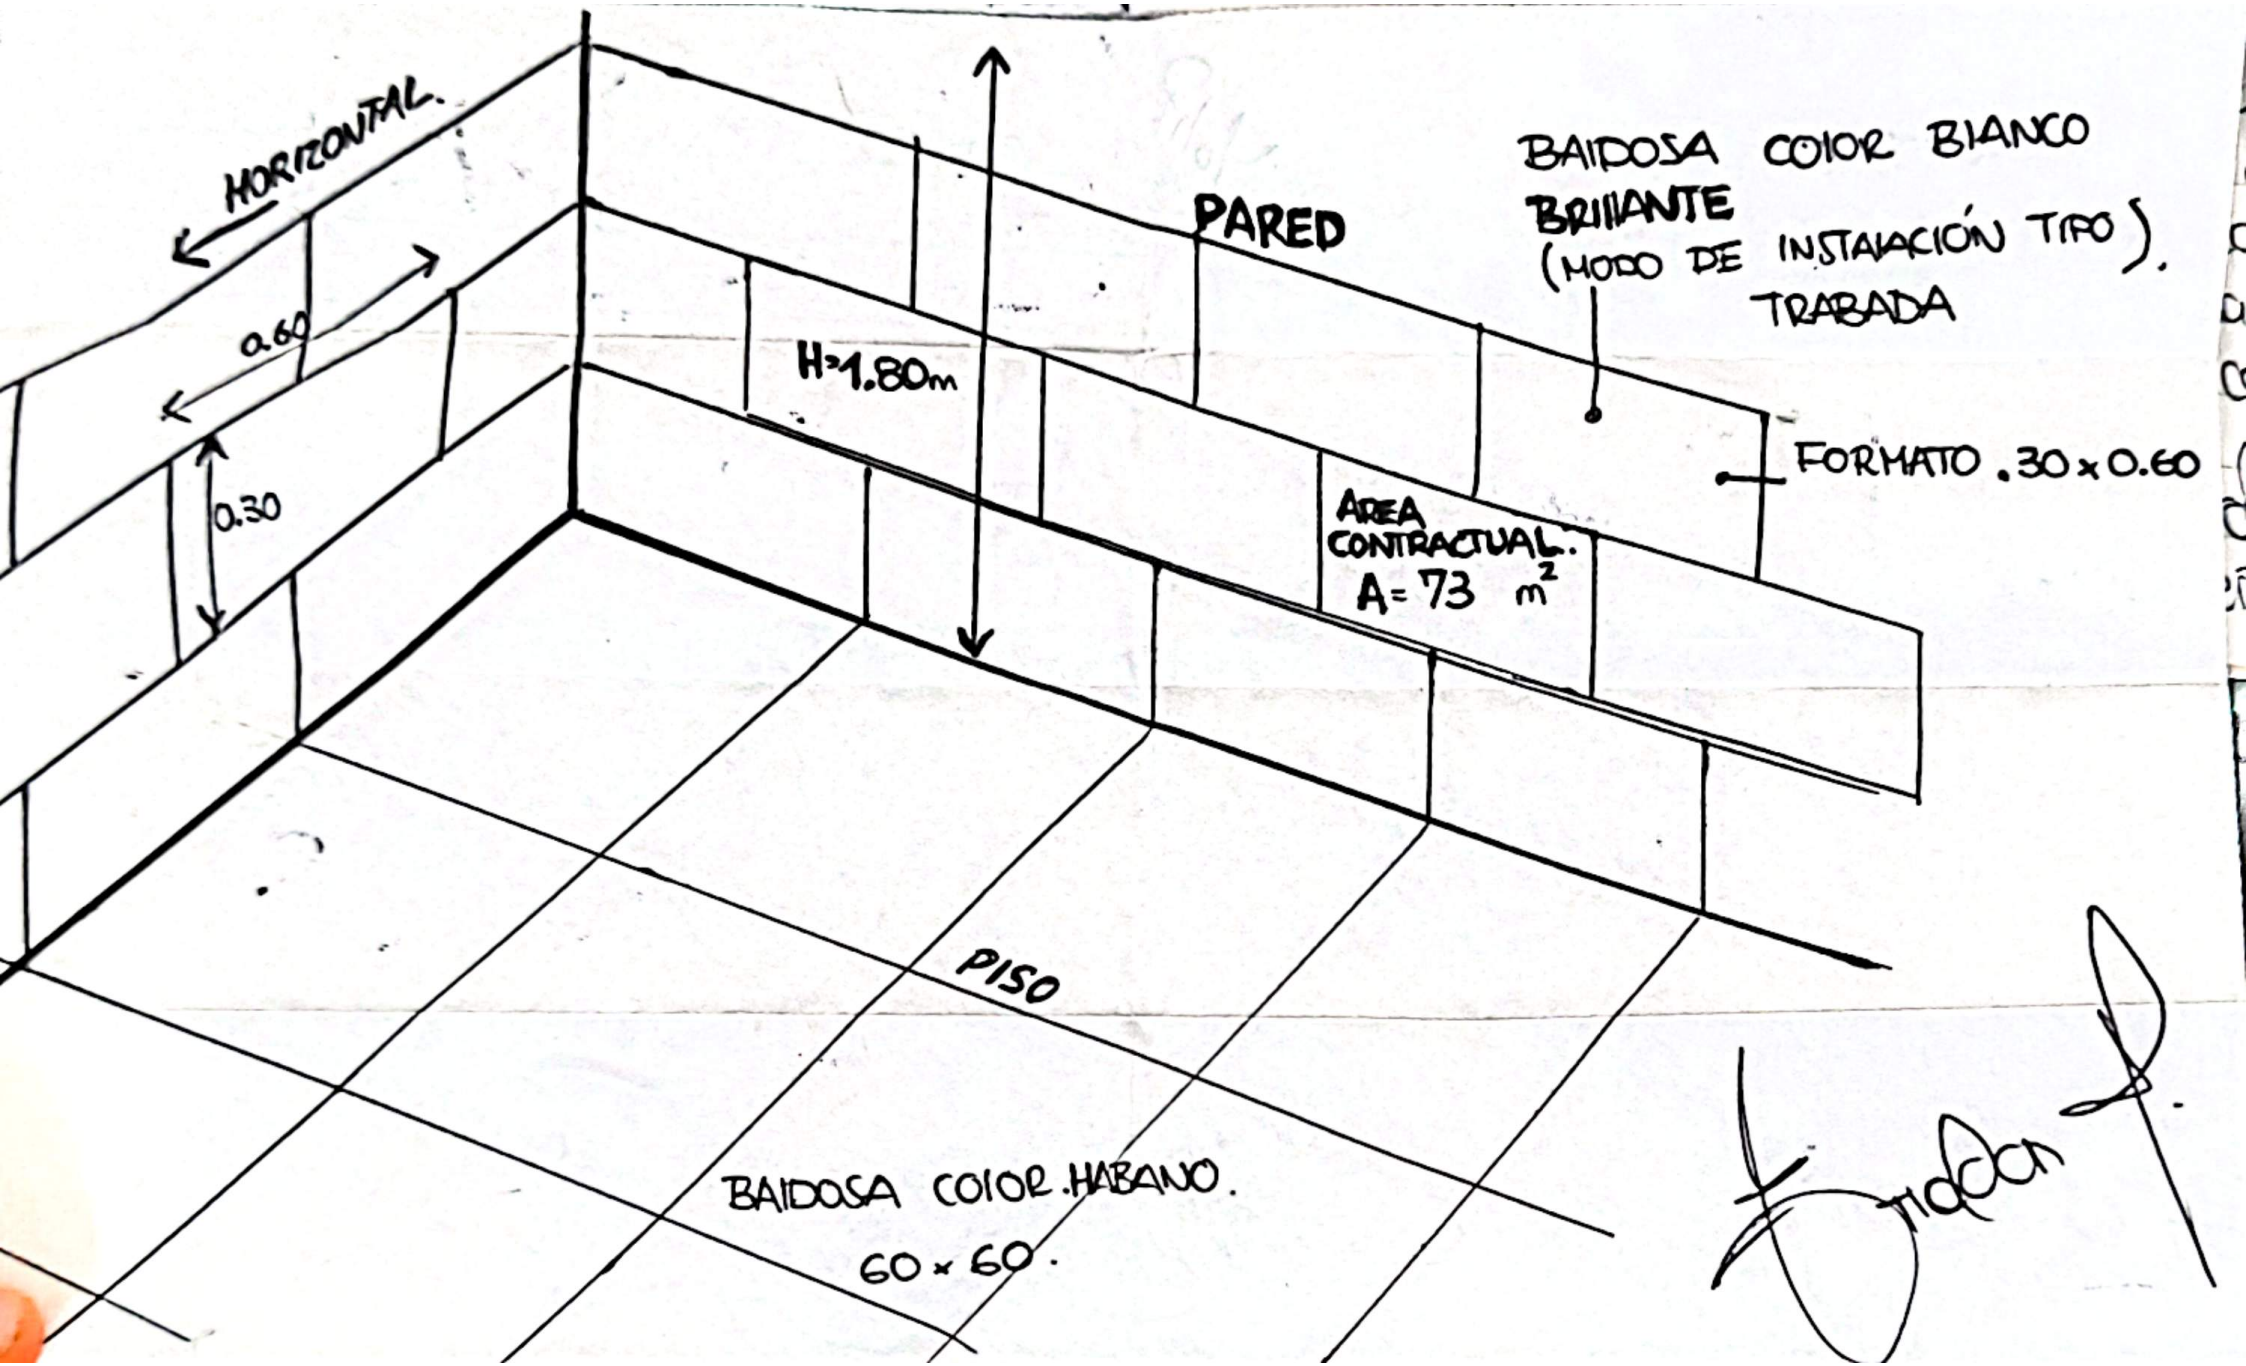

Powered by CamScanner

Viernes 8 de Mayo de 2026.

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto residente = 1
Ing civil residente = 1
Profesional SST = 1
Profesional aux adm = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 6
Ayudantes = 24

Actividades de obra.

se realiza descargue de mobiliario para el proyecto. se realiza izaje para pórtico de zona 6, se continua con los cortes mecanicos en el parqueadero de zona 3 para cajeo de estructura, se realiza instalación de Mortero de nivelación en los baños de zona 4, se realiza instalación de afirmado compactado sobre las Terrazas de zona 11-D, se continua con la instalación de bordillo perimetral en la zona 10-A se realiza el vaciado de Bateas de las canales para los espejos de agua de zona 1, se realiza instalación de formaleta para los muros perimetrales de la piscina de zona 1, se realiza instalación de la formaleta para los muros de los espejos circulares de la plazoleta de zona 1. se continua con la instalación de la arena Silice. en la concha de voleibol arena se continua con la fabricación de la baranda metalica de zona 5, se hacen movimientos de Tierra de forma mecanica en el costado sur de los baños de zona 4.

Residente de obra

Yuli P. Henao.
Ing. INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

Sabado 9 de May de 2026.

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Pagersonal SST = 1
Aux administrativo = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 6
Ayudantes = 25

Actividades De obra

Se continuan con los cortes mecanicos en el parqueadero de zona 3, se realiza sellado de la subbase en parqueadero de zona 2-3, se realiza instalación de bordillos perimetrales de zona 10-B para cortines zona verde cerca a parqueaderos de zona 2, se realiza instalación de afirmado en las Terrazas en zona 11-D, se continua con la fundida de placas de piso en Terrazas de zona 11-C, se aplica pintura blanca en las casetas de ventas de zona 1, se realiza el vaciado de los muros de los espejos de agua navibles, se realiza limpieza para instalar grama sintetica en zona 10-B. se continua en la soldadura en baranda perimetriales de zona 5. Se realiza llenos con material de prestamo en parqueadero de zona 2 (detras del bordillo, se empieza con la instalación de ceramica en las paredes del Baño de zona 4, se realiza instalación de la formaleta para las paredes perimetriales de la Piscina de zona 1 principal, se continua con el vaciado de gradas de zona 1

Residente de obra

Yoli Alfonso
Ing interventoria.

Lunes 11 de Mayo de 2026.

Personal de obra.

Director de obra : 1
Residente residente : 1
Residente ing civil : 1
Profesional SST : 1
Aux administrativa : 1
Maestro de obra : 1
oficiales : 6
Ayudantes : 22

Actividades de obra.

Se realiza aplicacion de pintura interna en los (baños) cabinas de ventas de zona 1, se realiza. fundida de Muros perimetrales en los cirvulos de agua de zona 1, se realiza limpieza para instalar la espuma para la grama Sintetica, en zona 10-B, se realiza soldaduras en barandas metalicas de los senderos de zona 5, se continua con la instalacion de la arena Silice en la concha de vaibal arena. se realiza instalacion de Tuberia para la redeccion del agua lluvia para el sendero de zona 5. (long : 70m). se realiza llenos con material de prestamo en senderos de zona 5, y en parqueadero de zona 3, se realiza llenos con material de prestamo en zona 14 para conformacion de Taludes, se continua con el vaciado de gradas en zona 1 para el Teatrino, se realiza instalacion de acero de refuerzo para la parte superior del pilote. de la cubierta. del Teatrino, se continua con el Traslado del cerramiento perimetral para instalacion de cerramiento definitivo. se continua con la pega de enchape en los baños de zona 4.

Residente de obra

Yuli P. Herrera
Ing. Interventoria.

Martes : 12 de Mayo de 2026.

Personal de obra

Director de obra = 1
Residente Arquitecto = 1
Residente ing civil = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro = 1
oficiales . 06
Ayudantes . = 25

Actividades de Obra.

Se realizan lleros con material de prestamo en el parqueadero de 3 entre zona 10-B, para la conformacion de Taludes de zona 14, se continua con la instalación del enchape de los baños de zona 4. se, se realiza el compactado de la sobbase de parqueadero de zona 2 con vibrodompactador de 7tn. se realiza la instalación de la espuma negra para la grama sintetica de zona 10-B, se continua con la instalación de Tuberia hidraulica, electrica y el rebose de la Piscina grande para la instalación de la formaleta para muros, se continua pegando Bordillo perimetral en el parqueadero de zona 2, se continua con la formaleta de los muros de los cajas de agua circulares, de zona 1, se realiza instalación de cerramiento perimetral definitivo en el parqueadero de zona 2, se realiza instalación de cielroso en Baños de zona 4.

Yuli P. Henao
ING. INTERVENTORIA.

1052441731.
Residente de obra

Miercoles 13 de Mayo de 2026. (Dia lluvioso)

Personal de obra.

Director de obra: 1
Residente de obra Arquitecto: 1
Residente de obra ing. civil: 1
Profesional SST: 1
Aux administrativa: 1
Maestro: 1
oficiales: 6
Ayudantes: 25

Actividades de obra.

Se continua con la instalación del elevados. de los baños de zona 4, se realiza la marcación de la grama Sintetica con ayuda de Topografica, se continúa con la instalación de la Subbase del parqueadero en zona 3 se realiza fundida de graderias en concreto en el area del Teatrino de zona 1, se realiza empradización de Taludes de zona 14 (cerca) entre el parqueadero de zona 2 y zona 1., se realiza el vaciado de la parte superior de los pilotes de zona 1 para la instalación de la cubierta de zona 1 se realiza instalación de la formaleta metalica para los muros de la piscina de zona 1, se continua con el vaciado de muros para los espejos circulares de zona 1., se realiza pintura cada regra en la pergola de zona 1, se realiza excavación para tubería de invama en el sendero peatonal de zona 14, se corrige el descanso de manuales con la rampa perimetral de zona 1 (arriba).
Se presentaron fuertes lluvias durante toda la Tarde

Residente de obra

Ing interventoria.

Jueves 14 de Mayo de 2026

Personal de obra

Dirección de obra = 1
Arquitecto residente de obra = 1
Ing civil residente de obra = 1
Profesional SST 1
Aux administrativo = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 6
Ayudantes = 25

Actividades de obra

Se realiza estuco y pintura en los baños de zona 4 se continua con la instalación de enchape en los baño de zona 4, se continua con la instalación de Bordillos en zona 10 para contiene Tierra de zona 14 se continua con las soldadura en barandas de zona 13 se recibe mobiliario para el proyecto, se realiza figurado de acero de refuerzo para viga de Teatrino de zona 1, se realiza pintura exterior de casetas de ventas en zona 1, se realiza instalación eléctrica interna en casetas, se continua con la pintura de la pergola de color negro en la zona 1, se realiza instalación de formaleta para muros de espejos de agua de zona 1, se realiza nivelación de terreno para placa de piso de zona 6. (a caso), se continua con la instalación de la grama sintética de zona 10 se realiza instalación de la subbase y nivelación en el parqueadero de zona 3.

Residente de obra

Yuli B. H
Directa interv.
ing. interventoría-

Viernes 15 de Mayo de 2026.

Personal de obra.

Director de obra = 1
Residente de obra Arquitecto. = 1
Residente de obra ing. civil. = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 6
Ayudantes = 24

Actividades de obra

Se continua con la compactacion de la subbase en el parqueadero de zona 2 parqueadero, se realiza instalación de subbase compactada en el parqueadero de zona 3, se realiza instalación de la grama sintetica en la zona 10-A y 10B, se realiza vaciado de graderia en el teatrino de zona 1, se continua con la instalación de la formaleta para las paredes de los espejos de agua circulares de zona 1, se realiza pegado de Taludes de zona 14, para empradizacion se hace instalación de malla electrosoldada para las placas de acceso de zona 6 y posterior fundida. se realiza demolición de pared de camara para conectar Tuberia de caicamo. de rampa longitudinal (70m) en sendero de zona 5, se realizan llenos compensados con material de prestamo en senderos de zona 5 y en Taludes de zona 14. se continua con la instalación de baldosa en zona 4.

Residente de obra

Director. interv.
ing interventoria.

Sabado 16 de Mayo de 2026.

Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto residente de obra = 1
Ing civil Residente de obra = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra: 0
oficiales = 5
Ayudantes = 22

Actividades de obra

Se continua con el enchape de los muros de los baños de zona 4, se continua con la nivelación de la sobre del parqueadero de zona 3. y compactación con vibrocompactador, se realiza instalación de grama sintetica en zona 10-A- y zona 10-B. se realiza limpieza y retiro de plasticos y geotextil de protección en concha de zona 9, se continua con la demolición del muro de la camara para instalación de Tubo para cargamo de sendero de zona 5. se realiza nivelación de senderos de acceso de zona 6, se realiza instalación electrica interna de cajetas de ventas de zona 1, se realiza instalación de pintura de puertas y ventanas de cajetas de ventas de zona 1., se realiza empradización de zona 2, se instala el Tubo para desague de la piscina. se continua con la Nivelación de forma manual para placas de paso en circulación del teatrino, se realiza nivelación de rampa de zona 3.

Residente de obra

Ing Interventoria

Ing. Interventoria.

lunes 18 de Mayo de 2026 (dia festivo).

Personal de obra.


Director de obra: 1
Residente de obra Arquitecto: 1
Residente de obra ing. civil: 1
Profesional SST: 1
Aux administrativa: 1
Maestro de obra: 0
Oficiales: 4
Ayudantes: 21

Actividades de obra.

Se realiza vaciado de graderia del teatrino de zona 1, se realiza demolicion de pared de la camara para conectar tubo de desagüe de carcamo en sendero de zona 5. (Rampa long 70 m) se realiza lleno compensado en excavacion de tuberia hidraulica, se realizan corte manuales para replantear escaleras laterales del Teatrino. Se realiza formaleteado e instalacion de Malla electrosoldada para sendero de acceso a los baños de zona 4. entre zona 5. se realiza vaciado de placas de piso de zona 5. se realiza el replanteo de la rampa de acceso desde la calle 48 a el portico de zona 6, se continua con trabajos de soldadura en barandas de zona 5, se realizan modificaciones arquitectonicas de la rampa de zona 3 por solicitud de el ing. Oscar Zuluaga donde se propone circulación. DISEÑO DE RAMPA Y ESCAERA DE ZONA 3.
Pinta y remate en escaleras.

Residente de obra

PARQUEAD

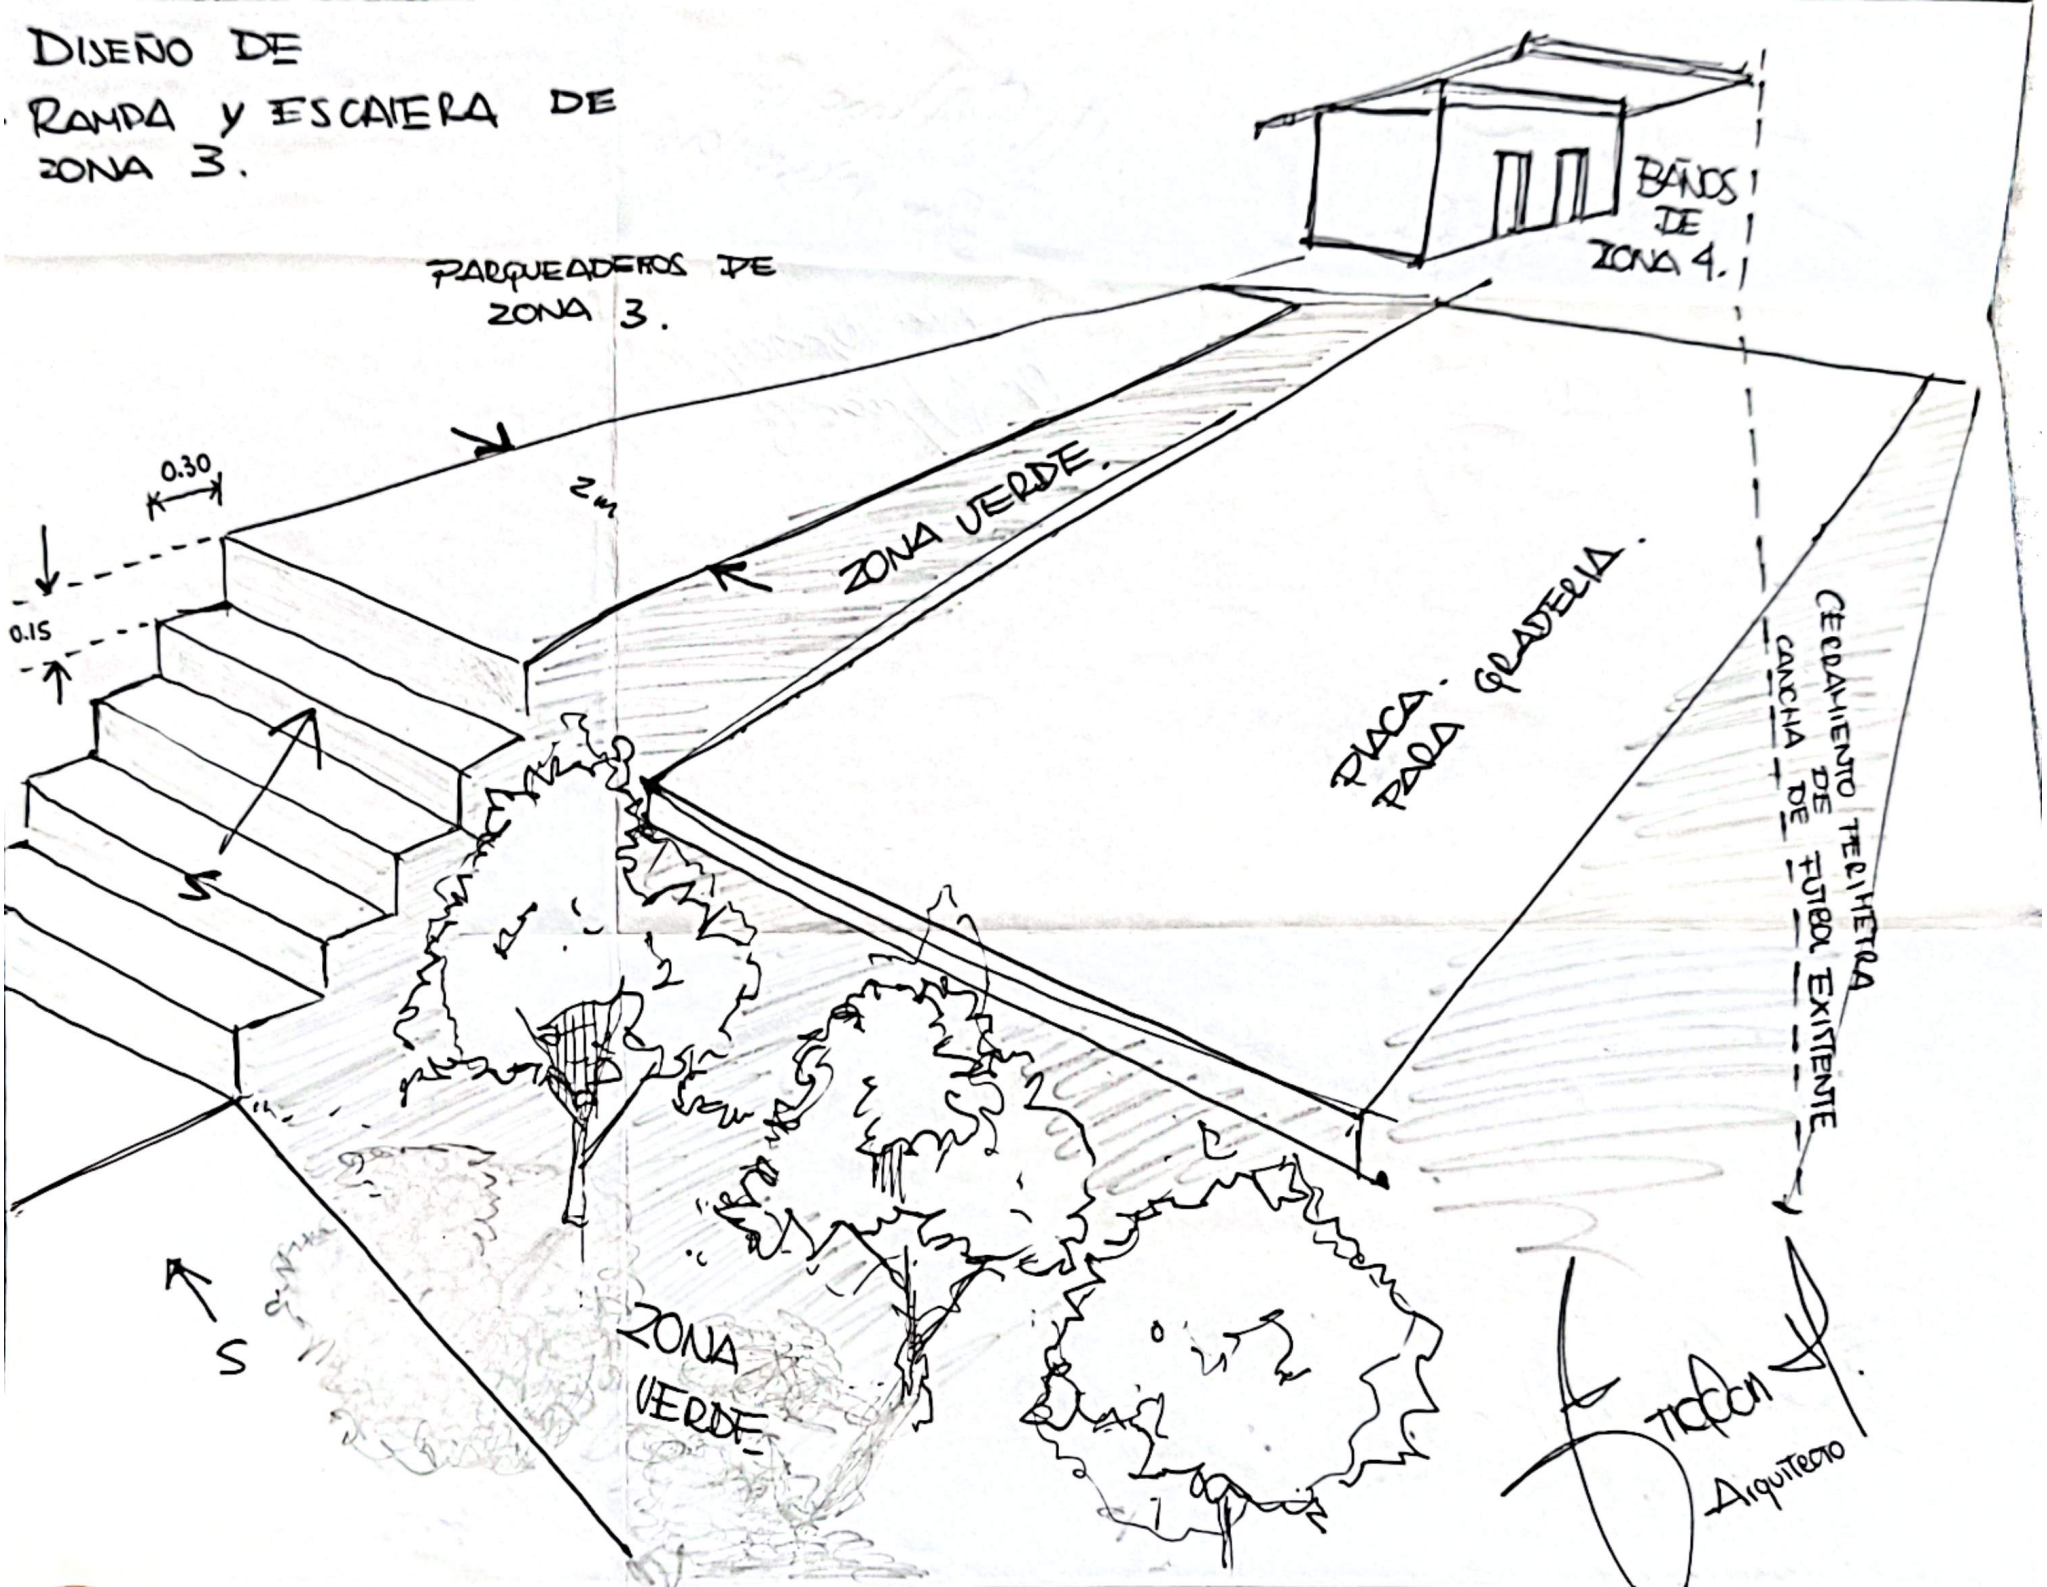

Powered by CamScanner

Martes 19 de Mayo de 2026

Personal de obra

Director de obra : 1
Residente de obra Arquitecto : 1
Residente de obra ing civil : 1
Profesional SST : 1
Aux administrativa : 0
Maestro de obra : 0
Oficiales : 4
Ayudantes : 21

Actividades de obra

Se realiza reunión y mesa de trabajo con relación a los nuevos NP pendientes por autorizar, la Arquitecta Monica apoyo a la supervisión de la alcaldía, Director obra Rodrigo y Director interventoria Yuli Henao la entidad en representación Arq. Monica hace observaciones al correo enviado por la interventoria donde se ajustan codigos de NP basados en una de cristal, se solicitan nuevas cotizaciones con el fin de tener varias opciones y poder elegir la que se ajuste al presupuesto, se deben cambiar algunos APU porque no se encuentran bien discriminados, el Director de obra tiene el compromiso de hacer llegar a la interventoria lo antes posible el resto de cotizaciones. estamos a 11 dias de terminar el contrato y todo debe quedar legalizado por la entidad lo antes posible. se le solicita al contratista hacer llegar la inframación completa para la aprobación de dichos NP.

Residente de obra.

Yuli B. Henao R.
Yuli B.H. director.
ing. interventoria

Miercoles 20 de Mayo de 2026.

Personal de obra.

Director de obra: 1
Residente de obra Arquitecto : 1
Residente de obra ing civil = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 0
oficiales = 4
Ayudantes = 21

Actividades de obra.

se realiza emporadizacion de zona 14, se continua con la instalacion de acrimado compactado en el sendero long de zona 5 de (70 m).
Se realiza vaciado de la placa de piso de zona 6 zona de acceso por la CALLE 48, se realiza desformaleteo de las piscinas o espejos circulares de agua en zona 1, se realiza limpieza de fondos de espejo de agua circular. se realiza emporadizacion en los (6k3) Taludes de zona 3-2. se continua con la instalacion de Bordillo perimetral de parqueadero de zona 2. para confinamiento de Tierra de zona 14, se continua con la instalacion de la grama Sintetica de zona 10-A - 10-B, se continua con el vaciado de la graderia (paredes y paso) de los grados para el teatrino de zona 1.

Yuli P. Henao R.
Dir. Interventoria.

Residente de obra

ing interventoria

Jueves 21 de Mayo de 2026

Personal de obra

Director de obra = 1
Residente de obra Arquitecto = 1
Residente de obra ing civil = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 0
Oficiales = 4
Ayudantes = 19.

Actividades de obra

Se realiza cafeteado interno de cortes de ventas de zona 1, (se) corte de cesped por parte de la empresa de emas, se realiza soldadura en barandas de sendero de zona 5 se, realizan Trinchos en Taludes, derrumbados, de zona 14, se realiza retiro de material sobrante en zona 6, se continua con la empradizacion de Taludes a un costado de las Torres de zona 11-D. Se realiza el vaciado de la viga perimetral del teatrino, se continua con la instalacion del enchape y enco y pintura en los muros internos del baño de zona 4, se realiza instalacion del aulorios en baños se continua con la instalacion de la grama sintetica en zona 10-A - 10-B, se realiza fundida de paso de escalera en acceso de zona 6 a zona 1, se realiza instalacion de gradering en pergola de zona 1, se realiza instalacion de formaleta para las paredes de las canales de agua de aguacero

Residente de obra

Yuli Fernanda R.
Dir. interventoria.
Ing interventoria.

Viernes 22 de Mayo de 2026

Personal de obra

Director de obra: 1
Residente de obra Arquitecto = 1
Residente de obra ing. civil. = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 0
Oficiales = 4
Ayudantes. = 19.

Actividades de Obra.

se realiza instalación de bordillo o sardineles perimetrales. en el parqueadero de zona 3, se realiza lleno con afirmado en el sendero long de (70 m), para conformación de sendero de zona 5, se realiza emparadización de taludes de zona 14., se realiza replanteo y compactación de afirmado para rampa de acceso de la calle 48 hacia la zona 6. se realiza el replanteo de las escaleras al lado izquierdo de las graderías de Teatrino de zona 1.
se continua con corte manuales de Tierra para conformación de escaleras de Teatrino del lado derecho de zona 1, Se realiza replanteo, corte manual e instalación de (afirmado) Soldadura para la circulación perimetral de la parte baja - lado derecho del Teatrino, se realiza instalación de estructura metalica para la cubierta del Teatrino de 21

Residente de obra.

Ing. Interventoria.

Juan P. Ramos R.
Dir. interventoria.

Sabado 23 de Mayo de 2026

Personal de obra.

Director de obra = 1
Residente de obra Arquitecto = 1
Residente de obra Ing. civil = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativo = 0
Maestro de obra = 1
Oficiales = 4
Ayudantes 19.


Actividades de Obra.

Se realiza instalación de la base en el parqueadero de zona 3, se realiza instalación de bordillo perimetral para confinamiento de estructuras del parqueadero de zona 3. se realiza formaleteado de las escaleras de acceso para zona 1 desde zona 6, se realiza corte manuales para la conformación de las escaleras de zona 1 en cada costado de las graderias de Teatrino se realiza pega de la baldosa de piso de las bancas de zona 4. se realiza limpieza de placas de zona 5 costado sur de la cancha de Badminto y se realiza el traslado de el Mobiliario a las Terrazas de zona 11-A-B-C-D. se continua con la instalación de formaleta y Malla electrosoldada en placas de acceso cerca de zona 6.

Residente de obra

Director interventoria

Director de obra de INTERVENTORIA.

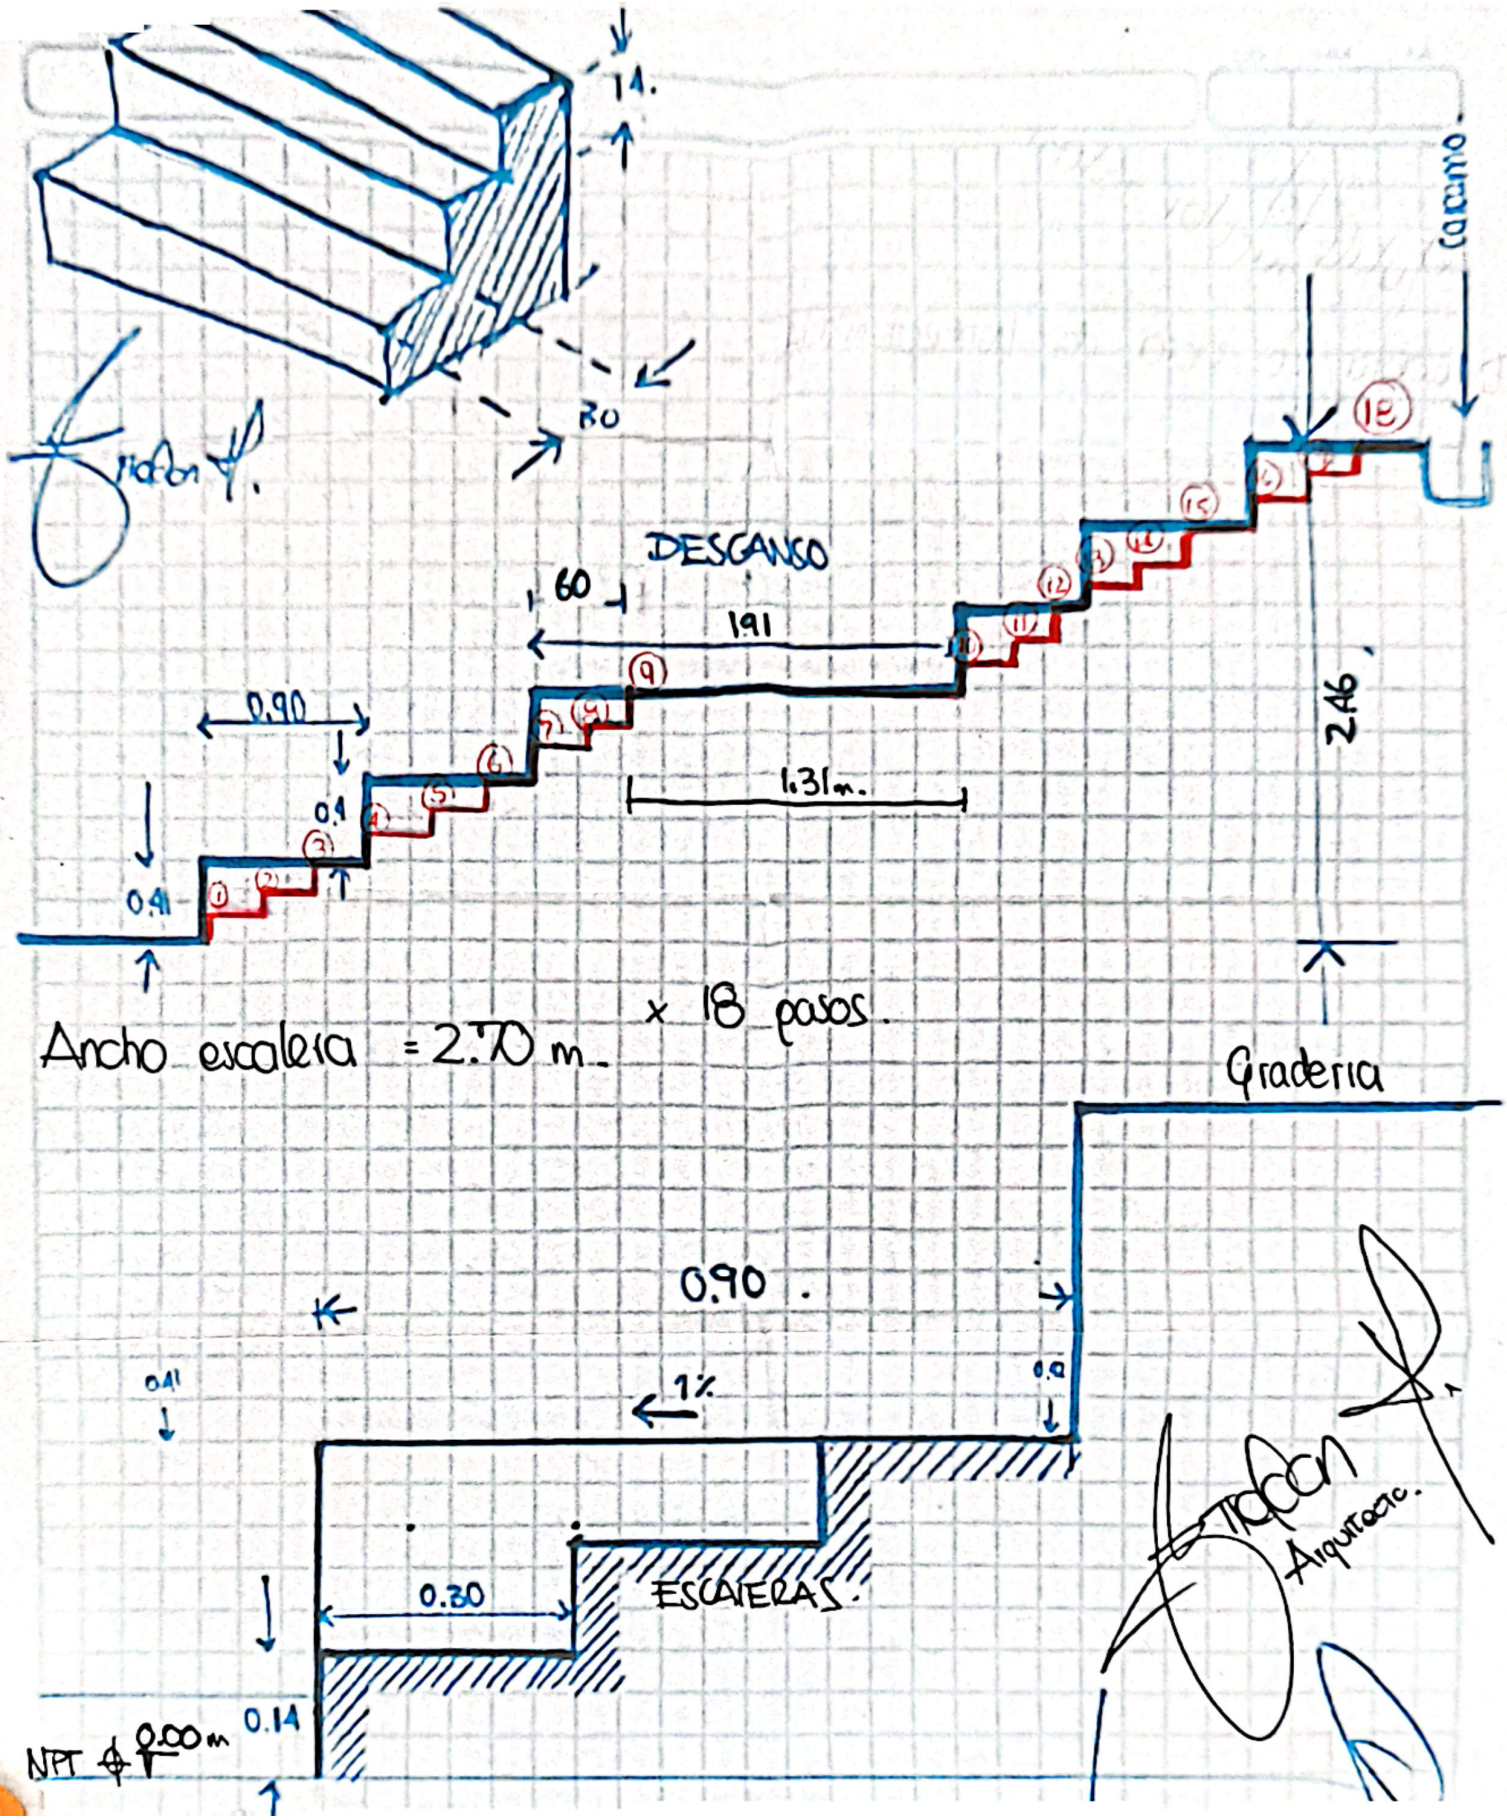

Powered by CamScanner

lunes 25 de Mayo de 2026

Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing Civil Residente. = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 0
Oficiales = 4
Ayudantes = 19

Actividades de Obra.

Se realiza la instalación de formaleta en rampa de acceso desde la calle 48 a la zona 6.
se realiza vaciado de placas de piso para el acceso de zona 6. se realiza el vaciado de muros de escalera de zona 1., se realiza la instalación del cable de acero para la cubierta del teatrino en zona 1, se continua con la instalación del acero y de la formaleta para los pasos de la escalera de acceso de zona 6 long. aprox (10 m) se continua con la instalación del sardinel en zona 2 y zona 3 parqueadero, se realiza la instalación de la base (0.10 m) en el parqueadero de la zona Norte zona 3, se realiza el vaciado de las escaleras del costado izquierdo del Teatrino al lado de las gradas. se continua con la conformación en tierra de las escaleras del costado derecho de la graderia de la zona 1

Residente de obra

Ing. P. Henao
Director interv.

Director de obra interven.


Martes 26 de Mayo de 2026.

Personal de obra.

Director de obra. = 1
Residente de obra Arquitecto = 1
Residente de obra ing civil = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativo = 1
Maestro de obra = 0
Oficiales = 4
Ayudantes = 19.

Actividades de obra.

Se realiza Traslado del mobiliario en los Terrazas de zona 1 - A - B - C - D para su posterior instalación, por petición del ing. de la alcaldia Oscar Zuluaga, se realiza diseño de rampa para acceso de personas con movilidad reducida (PMR) sobre la zona verde que queda entre la zona 10-B y parqueadero de zona 3, por modificaciones a rampa de zona 3 solicitadas por él mismo el dia 18 de Mayo. se realiza instalación de ventana en fachada para casetas de zona 1 se realiza corte de la empradización de los senderos de zona 5. para delimitar dicho costado, se Termina la instalación de la base del parqueadero de zona 3.

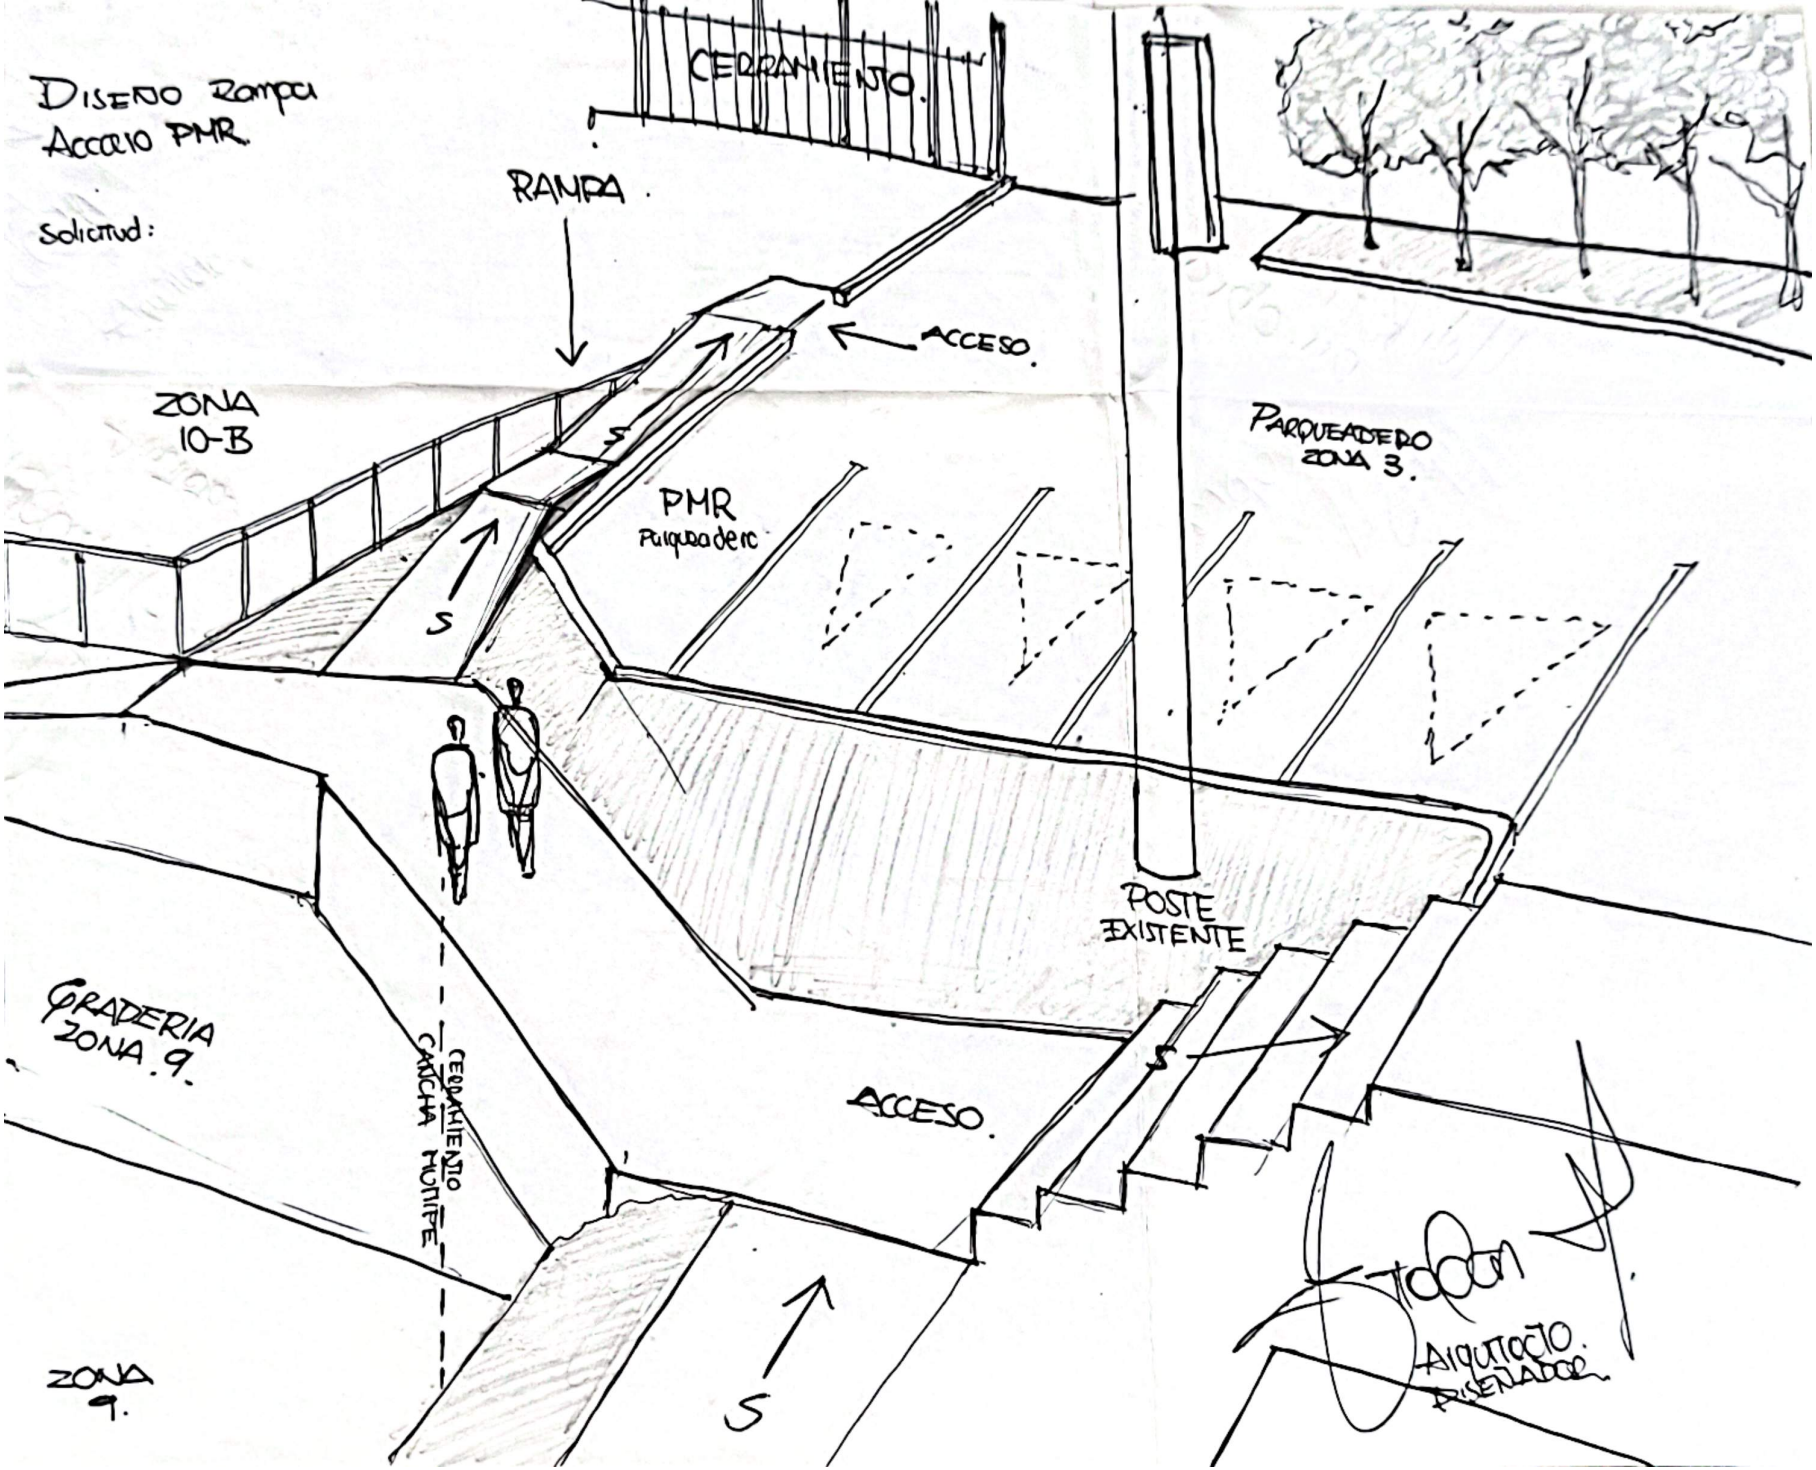

Powered by CamScanner

Miercoles 27 de Mayo de 2026.

Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing Civil Residente = 1
Profesional Aux administrativa - 1
Profesional SST = 1
Maestro de obra = 0
Oficiales = 4
Ayudantes = 19

Actividades de obra.

Se realiza marcación perimetral de los parqueaderos de zona 3 se continua el serviado del parqueadero de zona 3. de la base, se realiza el formaleteo de la rampa longitudinal de zona 5 (70m) aprox. de forma curva en el costado (oeste) con anchos entre 2.5m y 3m, se continua con el vaciado de las escaleras de acceso desde zona 6 a zona 1, se continua con la pega del enchape de paredes y piso en los Baño de zona 4, se realiza desformaleteado de rampa. que comunica los baños de zona 4. con la escalera que baja a zona 5 y se realiza lleno con material compensado en los perimetros de dicha rampa para empradización, se realiza corte en el perimetro de las zona 5 (senderos) para controlar crecimiento del prado. sobre senderos, se continuan con Trabajos de soldadura y pintura en las barandas perimetrales de zona 5. y zona 13. se continua con la conformación en tierra de las escaleras laterales e instalación de acero de refuerzo en los costados derecho e izquierdo de las graderias de zona 1 del teatrino, Se realiza recorrido con la profesional Ambiental en todas la zonas para ver estado fitosanitario de los elementos Arboreos y ornamentales, la profesional Ambiental Sugiere como medida de seguridad Talar el arbol de zona 13 -Carbonero-, ya que se encuentra seco (Muerto)

Residente de obra
Arquitecto

Director de obra INTERVENTORIA
