SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

Leticia, mayo 28 de 2026

ISF – 030

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Remisión Acta Parcial No. 02.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito el Acta Parcial No. 02, comprendido entre 23 de enero al 28 de mayo de 2026, respecto a las actividades ejecutadas por el CONSORCIO PEATONES CEL, debidamente revisado y aprobado por parte de esta interventoría, con un porcentaje de ejecución de 80,65%, equivalente a MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.168.148.068,00) M/CTE.

Para su conocimiento y fines pertinentes,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONSORCIO PEATONALES CEL
conectando comunidades
NIT 902007682-7

Leticia, 28 de mayo de 2026 *CPC-OF-2026-024*

Señores.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
R/L: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA No. 2594-2025 "CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

ASUNTO: Entrega Acta Parcial # 2.

Cordial saludo,

Mediante la presente nos permitimos hacer entrega de manera formal del acta parcial de obra # 2, correspondiente al periodo entre el 26 de enero y el 28 de mayo del año en curso. Se relaciona la siguiente información, en el orden estipulado en el siguiente listado:

1.0. CERTIFICACIÓN AUTORIZACIÓN PAGO SUPERVISOR
2.0. FACTURA ELECTRÓNICA
3.0. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2
4.0. MEMORIAS DE CALCULO
5.0. AUTORIZACIÓN DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS
6.0. INFORME DE INTERVENTORÍA
7.0. INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA
8.0. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
9.0. CONTRATO DE OBRA
10.0. OTROSÍ 001 Y OTROSI 002
11.0. ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA
12.0. CDP Y RP
13.0. ACTAS
14.0. PÓLIZAS Y/O ACTUALIZACIÓN
15.0. MEMORANDO DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR
16.0. RUT
17.0. CEDULA R/L
18.0. CERTIFICADO BANCARIO

Atentamente.

ING. OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
R.L. CONSORCIO PEATONALES CEL

Proyecto: Ing. Cesar Gasca.

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

CONSORCIO
PEATONALES CEL
conectando comunidades
NIT 902007682-7

Leticia, 28 de mayo de 2026 *CPC-OF-2026-025*

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Gobernación del Amazonas
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA No. 2594-2025 “CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

ASUNTO: Compromiso pago FIC al final del contrato.

Cordial saludo,

En atención me dirijo a ustedes con el fin de informarles que los valores a cancelar por concepto FIC, serán cancelados al final del contrato.

Atentamente.



ING. OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
R.L. CONSORCIO PEATONALES CEL

Proyecto: Ing. Cesar Gasca.

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

1.0. CERTIFICACIÓN AUTORIZACIÓN PAGO SUPERVISOR

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que el CONSORCIO PEATONES CEL identificado con NIT: 902.007.682 – 7, representado legalmente por OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA, cumplió con el objeto contractual del contrato de obra No 2594 de 2025 dentro de las condiciones técnicas del estudio previo y cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS y cumplió con el pago de la seguridad social y parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 en concordancia con la ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

Por lo cual certifico que el valor del Acta Parcial No 02 del contrato de obra No 2594 – 2025 corresponde a MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.168.148.068,00) M/CTE los cuales se ven reflejados en el Acta Parcial No. 2 de obra que comprende las actividades y cantidades ejecutadas.

El contratista de obra presento factura electrónica No FE-3 de 26 de mayo de 2026.

A continuación, se presenta el resumen del valor a pagar en el Acta Parcial No 02:

VALOR DEL CONTRATO	$	3.555.780.983,00
VALOR ANTICIPO 50%	$	1.777.890.491,50
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	1.699.746.070,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$	1.168.148.068,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 2	$	584.074.034,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2	**$**	**584.074.034,00**
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE OBRA		**80,65 %**

El supervisor APRUEBA y AUTORIZA el pago por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 584.074.034,00) M/CTE correspondiente al Acta Parcial No. 02.

Para constancia se firma en Leticia- Amazonas a los 29 días del mes de mayo de 2026.

ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato 2594 – 2025

2.0. FACTURA ELECTRÓNICA

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

CONSORCIO PEATONAL CEL
NIT: 902007682 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 10 6 37, LETICIA, Amazonas, Colombia
Tel. 3102489488
Email. oscarandres181@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764102094118 válida desde 2025-11-26 hasta 2027-11-26 rango desde FE1 hasta FE100

Nombre/Razón Social: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
NIT: 899999336
Dirección: CL 10 10 77 BARRIO CENTRO, LETICIA, Amazonas, Colombia, CP 910001
Teléfono: 6085926629
Email: facturacion@amazonas.gov.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE3**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **09:19:44**
FECHA FIRMADO: **01/06/2026 09:19:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Valor Acta Parcial No. 2	94	1,00	$1.168.148.068,00				$0,00	$1.168.148.068,00

Notas:

SON: (mil ciento sesenta y ocho millones ciento cuarenta y ocho mil sesenta y ocho pesos cero centavos)

CUFE: 51ab2bbbfb5d04ea68f1da1c1ec8197f0aa3353f32b69446209dff65f3d374c66b73278a980a2ed40ac87504abd6b63b

Subtotal:	$1.168.148.068,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.168.148.068,00

Firma Digital: DpB5vtPQnVX9k757A/lwvLsfXF+gl50N7HeK/NPUfQqsyJtvkxraaufsXm60eOI3
5d9sOqynm+TFm+I8g9VvhgA85CYtyS1s019FlS3gA+9p/cansNgkOZkt3/DQgVPn
YYm1zSQcschhrYzru8z9Q/OqRnWt8hdfCdx/WDkpZasySVksZTQ0zi/45Vr/I5UJ
xmaPqRYBRvhlJARATEEdizPBxrIeIE6rKW6JHylNwCLRAXxNHE/knwtVtx89eE+U
/J/X6hE/j9TRsypvZdoqkIIoluT/ceRNjQmy1Q9MTGhajSHbcRQOQWVBy3g9r2U+
xB3yx1UCTiT4krBWydLSqA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

3.0. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO: 2594-2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL AMAZONAS

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PEATONALES CEL

INTERVENTORÍA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S

1. IDENTIFICACIÓN			2. CANTIDADES CONTRACTUALES			2. CORTE DE OBRA N° 1			3. SALDO ANTES DE MODIFICAR		4. BALANCE MAYORES / MENORES			5. PRESUPUESTO ACTUALIZADO			6. CORTE DE OBRA N° 2			7. SALDO EJECUTADO ACUMULADO		8. SALDO POR EJECUTAR		
Nº	Descripción	Und	Cant. Original	VU Original	Valor Original	Cant. Ejecutada	Valor Corte 1	% Avance Físico	Cant. Saldo (pre-modif)	Valor Saldo (pre-modif)	Δ Cantidad (+may / -men)	Valor Modificación	Tipo	Cant. Vigente	VU Vigente	Valor Vigente	Cant. Ejecutada	Valor Corte 2	% Avance Físico	Valor Por Ejecutar	% Ejecutado	Cant. Por Ejecutar	Valor Por Ejecutar	% por ejecutar
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$10.139	$51.039.726	4.499,64	$45.621.830	89,4%	534,36	$5.417.896	-0,40	-$4.056	Menor	5.033,60	$10.139	$51.035.670	533,96	$5.413.841	10,61%	$ 51.035.670,40	100,0%	0,00	$0	0,0%
2	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$2.535	$12.292.215	0,00	$0	0,0%	4.849,00	$12.292.215	-894,19	-$2.266.771	Menor	3.954,81	$2.535	$10.025.444	3954,81	$10.025.444	100,00%	$ 10.025.444,36	100,0%	0,00	$0	0,0%
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$108.293	$8.663.440	48,00	$5.198.064	60,0%	32,00	$3.465.376	28,74	$3.112.661	Mayor	108,74	$108.293	$11.776.101	60,74	$6.578.037	55,86%	$ 11.776.101,37	100,0%	0,00	$0	0,0%
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$105.559	$56.474.065	415,91	$43.903.020	77,7%	119,09	$12.571.045	294,57	$31.094.001	Mayor	829,57	$105.559	$87.568.066	413,66	$43.665.045	49,86%	$ 87.568.065,95	100,0%	0,00	$0	0,0%
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$16.703	$84.082.902	3.126,84	$52.227.575	62,1%	1.907,16	$31.855.327	-117,50	-$1.962.684	Menor	4.916,50	$16.703	$82.120.218	1789,66	$29.892.643	36,40%	$ 82.120.218,43	100,0%	0,00	$0	0,0%
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$1.603.215	$3.206.430	0,00	$0	0,0%	2,00	$3.206.430	0,00	$0	Sin cambio	2,00	$1.603.215	$3.206.430	1,00	$1.603.215	50,00%	$ 1.603.215,00	50,0%	1,00	$1.603.215	50,0%
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$702.267	$8.427.204	0,00	$0	0,0%	12,00	$8.427.204	0,00	$0	Sin cambio	12,00	$702.267	$8.427.204		$0	0,00%	$ 0,00	0,0%	12,00	$8.427.204	100,0%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$115.004	$28.981.008	218,66	$25.146.775	86,8%	33,34	$3.834.233	-31,88	-$3.666.286	Menor	220,12	$115.004	$25.314.722	1,46	$167.947	0,66%	$ 25.314.721,53	100,0%	0,00	$0	0,0%
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$1.608.146	$480.835.654	185,86	$298.891.624	62,2%	113,14	$181.944.030	0,20	$321.629	Mayor	299,20	$1.608.146	$481.157.283	113,34	$182.265.659	37,88%	$ 481.157.283,20	100,0%	0,00	$0	0,0%
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$21.577	$174.946.316	4.543,75	$98.040.597	56,0%	3.564,25	$76.905.719	669,47	$14.445.197	Mayor	8.777,47	$21.577	$189.391.513	4050,48	$87.397.261	46,15%	$ 185.437.857,89	97,9%	183,23	$3.953.655	2,1%
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$2.867.009	$857.235.691	185,86	$532.865.160	62,2%	113,14	$324.370.531	0,20	$573.402	Mayor	299,20	$2.867.009	$857.809.093	113,34	$324.943.933	37,88%	$ 857.809.092,80	100,0%	0,00	$0	0,0%
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$39.316	$138.392.320	2.186,60	$85.968.366	62,1%	1.333,40	$52.423.954	0,00	$0	Sin cambio	3.520,00	$39.316	$138.392.320	1333,40	$52.423.954	37,88%	$ 138.392.320,00	100,0%	0,00	$0	0,0%
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$234.100	$802.494.800	2.186,60	$511.883.060	63,8%	1.241,40	$290.611.740	59,00	$13.811.900	Mayor	3.487,00	$234.100	$816.306.700	1300,40	$304.423.640	37,29%	$ 816.306.700,00	100,0%	0,00	$0	0,0%
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40	$3.382.951	$8.119.082	0,00	$0	0,0%	2,40	$8.119.082	-0,90	-$3.044.656	Menor	1,50	$3.382.951	$5.074.427		$0	0,00%	$ 0,00	0,0%	1,50	$5.074.427	100,0%
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$237.851	$815.353.228	0,00	$0	0,0%	3.428,00	$815.353.228	-259,66	-$61.761.560	Menor	3.168,34	$237.851	$753.591.668	501,77	$119.347.448	15,84%	$ 119.347.447,67	15,8%	2.666,56	$634.244.221	84,2%
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$13.412	$13.371.764	0,00	$0	0,0%	997,00	$13.371.764	697,00	$9.348.164	Mayor	1.694,00	$13.412	$22.719.928		$0	0,00%	$ 0,00	0,0%	1.694,00	$22.719.928	100,0%
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$2.357	$11.865.138	0,00	$0	0,0%	5.034,00	$11.865.138	-0,40	-$943	Menor	5.033,60	$2.357	$11.864.195		$0	0,00%	$ 0,00	0,0%	5.033,60	$11.864.195	100,0%
VALORES					**$3.555.780.983,00**		**$1.699.746.070**	**47,8%**		**$1.856.034.913**						**$3.555.780.983**		**$1.168.148.068,00**		**$2.867.894.139,00**	**80,65%**		**$687.886.845,00**	**19,35%**

CONTROL DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	3.555.780.983,00
VALOR ANTICIPO 50%	$	1.777.890.491,50
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	1.699.746.070,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$	1.168.148.068,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 2	$	584.074.034,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2	$	584.074.034,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE OBRA		80,65%

FIRMAS DE APROBACIÓN

Nombre: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Entidad: RCONSORCIO PEATONALES CEL
C.C. N°: CC. 1.032.364.610 DE BOGOTA

Nombre: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA SAS 2025
C.C. N°: CC. 93.123.714 ESPINAL, TOLIMA

Nombre: ROBIN CARDENAS PAREDES
Cargo: Director de Infraestructura
Entidad: GOBERNACION DE AMAZONAS
C.C. N°:

4.0. MEMORIAS DE CALCULO

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**1,0**	**UND:**	**M2**	**CAP:**	
DESC:	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,86		717,54		717,54	OK
2	EJE 2	85,083	2,86		243,34		243,34	OK
3	EJE 3	166,270	2,86		475,53		475,53	OK
4	RAMAL - EJE A	67,438	2,86		192,87		192,87	ok
5	EJE A-1	74,059	2,86		211,81		211,81	ok
6	EJE A-2	130,185	2,86		372,33		372,33	ok
7	EJE B	269,108	2,86		769,65		769,65	ok
8	EJE C	220,353	2,86		630,21		630,21	ok
9	EJE D	36,741	2,86		105,08		105,08	ok
10	EJE - ACCESO - CENTRO DE SALUD	5,216	2,86		14,92		14,92	ok
11	EJE - ACCESO - SALÓN COMUNAL	5,535	2,86		15,83		15,83	ok
12	EJE - ACCESO - C. D. I.	9,867	2,86		28,22		28,22	ok
13	EJE - ACCESO - IGLESIA 1	34,805	2,86		99,54		99,54	ok
14	EJE - ACCESO - IGLESIA 2	5,728	2,86		16,38		16,38	ok
15	EJE - ACCESO - MALOKA ESTE	10,495	2,86		30,02		30,02	ok
16	EJE - ACCESO - MALOKA OESTE	10,619	2,86		30,37		30,37	ok
17	EJE 1 NUEVO JARDIN	71,703	2,86		205,07		205,07	ok
18	EJE 2 NUEVO JARDIN	34,776	2,86		99,46		99,46	ok
19	EJE A NUEVO JARDIN	181,946	2,86		520,37		520,37	ok
20	EJE B NUEVO JARDIN	82,716	2,86		236,57		236,57	ok
21	EJE - ACCESO - IGLESIA	6,470	2,86		18,50		18,50	ok

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**5.033,60**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	4.499,64	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+533,9620**	**CANTIDAD A COBRAR**

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**2,0**	**UND:**	**M2**	**CAP:**	
DESC:	**ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESQUEMA / PLANO DE LOCALIZACIÓN



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**AREA**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2)**	**Observaciones**
1					0,00		0,00	
2	AREA A DEMOLER DE ANDENES EXISTENTE, DE LA MEMORIA ITEM 3			-1.078,79	0,00		-1.078,79	SE DESCUENTA DADO A QUE EL AREA CORRESPONDIENTE A LA DEMOLICION NO SE REALIZO DESCAPOTE
3	AREA TOTAL DE INTERVENCION	1.760,00	2,86	5.033,60	0,00		5.033,60	
4					0,00		0,00	
5					0,00		0,00	
6					0,00		0,00	
7					0,00		0,00	
8					0,00		0,00	
9					0,00		0,00	
10					0,00		0,00	
11					0,00		0,00	
12					0,00		0,00	
13					0,00		0,00	
14					0,00		0,00	
15					0,00		0,00	
16					0,00		0,00	
17					0,00		0,00	
18					0,00		0,00	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**3.954,81**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	0,00	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+3.954,81**	**CANTIDAD A COBRAR**

CESAR AGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**3,0**	**UND:**	**M3**	**CAP:**	
DESC:	**DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M3)**	**Observaciones**
1	EJE 1 SANTA SOFIA	191,00	1,20	0,10	229,20		22,92	
2	EJE 2 SANTA SOFIA	84,37	1,20	0,10	101,24		10,12	
3	EJE 3 SANTA SOFIA	119,98	1,20	0,10	143,97		14,40	
4	EJE A SANTA SOFIA	73,59	1,20	0,10	88,31		8,83	
5	EJE B SANTA SOFIA	183,00	1,20	0,10	219,60		21,96	
6	EJE C SANTA SOFIA	172,00	1,20	0,10	206,40		20,64	
7	LARGO DE CANCHA EN NUEVO JARDIN	25,50	1,70	0,10	43,35		4,34	
	RAMPA ACCESO NUEVO JARDIN	1,70	0,50	0,10	0,85		0,09	
	DADO EN CONCRETO COSTADO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0,30	0,30	1,60	0,14	6	0,86	
	EJE A NUEVO JARDIN COSTADO CASETA COMUNAL	38,218	1,20	0,10	45,86	1	4,59	
				AREA	1.078,79			

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**108,74**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	48,00	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+60,74**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70702-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**4,0**	**UND:**	**M3**	**CAP:**	
DESC:	**EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M3)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,86	0,16	113,29		113,29	
2	EJE 2	85,083	2,86	0,22	53,84		53,84	
3	EJE 3	166,270	2,86	0,19	88,44		88,44	
4	RAMAL-EJE A	67,438	2,86	0,07	13,52		13,52	
5	EJE A-1	73,590	2,86	0,17	35,42		35,42	
6	EJE A-2	130,190	2,86	0,34	126,72		126,72	
7	EJE B	269,108	2,86	0,13	101,54		101,54	
8	EJE C	220,353	2,86	0,21	129,49		129,49	
9	EJE D	36,741	2,86	0,17	17,55		17,55	
10	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,86	0,18	5,06		5,06	
11	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,86	0,18	2,75		2,75	
12	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,86	0,19	18,48		18,48	
13	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,86	0,33	5,34		5,34	
14	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,500	2,86	0,20	5,91		5,91	
15	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,620	2,86	0,14	4,20		4,20	
16	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,86	0,25	3,88		3,88	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,86	0,10	21,28		21,28	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,86	0,15	15,27		15,27	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,86	0,14	74,70		74,70	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,86	0,13	31,38		31,38	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,86	0,30	5,57		5,57	
22	DESCUENTO POR AJUSTE DE BALANCE (CORRELACIÓN CUNETA)	293,7		0,1500	-44,0497		-44,0497	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**829,57**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	415,91	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+413,66**	**CANTIDAD A COBRAR**

Cesar Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**5,0**	**UND:**	**M2**	**CAP:**	
DESC:	**NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,86		717,54		717,54	
2	EJE 2	85,083	2,86		243,34		243,34	
3	EJE 3	166,270	2,86		475,53		475,53	
4	RAMAL-EJE A	67,438	2,86		192,87		192,87	
5	EJE A-1	74,059	2,86		211,81		211,81	
6	EJE A-2	130,185	2,86		372,33		372,33	
7	EJE B	269,108	2,86		769,65		769,65	
8	EJE C	220,353	2,86		630,21		630,21	
9	EJE D	36,741	2,86		105,08		105,08	
10	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,86		28,22		28,22	
11	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,86		14,92		14,92	
12	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,86		99,54		99,54	
13	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,86		16,38		16,38	
14	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	2,86		30,02		30,02	
15	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	2,86		30,37		30,37	
16	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,86		15,83		15,83	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,86		205,07		205,07	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,86		99,46		99,46	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,86		520,37		520,37	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,86		236,57		236,57	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,86		18,50		18,50	
	TRAMO A DESCONTAR EN NUEVO JARDIN	-40,9	2,86		-117,105		-117,10	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**4.916,50**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	3.126,84	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1.789,657**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70402 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**6,0**	**UND:**	**UND**	**CAP:**	
DESC:	**CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Cant.**			**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2)**	**Observaciones**
1	CAJA SUMIDERO Nº 1 EJE 1				1,00		1,00	
2	CAJA SUMIDERO Nº 2				0,00		0,00	No ejecutada en este corte
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**1,00**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	0,00	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1,000**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	8,0	UND:	M3	CAP:	
DESC:	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**Nº Elem.**	**Subtotal (M3)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,860	0,051	36,500		36,500	
2	EJE 2	85,083	2,860	0,048	11,755		11,755	
3	EJE 3	166,270	2,860	0,048	23,038		23,038	
4	RAMAL-EJE A	67,438	2,860	0,050	9,696		9,696	
5	EJE A-1	74,059	2,860	0,049	10,291		10,291	
6	EJE A-2	130,185	2,860	0,049	18,143		18,143	
7	EJE B	269,108	2,860	0,049	37,611		37,611	
8	EJE C	220,353	2,860	0,049	30,886		30,886	
9	EJE D	36,741	2,860	0,049	5,165		5,165	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,860	0,049	0,737		0,737	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,860	0,050	0,794		0,794	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,860	0,049	1,391		1,391	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,860	0,050	4,934		4,934	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,860	0,050	0,814		0,814	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,500	2,860	0,050	1,497		1,497	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,620	2,860	0,050	1,518		1,518	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,860	0,050	10,338		10,338	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,860	0,051	5,028		5,028	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,860	0,051	26,380		26,380	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,860	0,051	12,026		12,026	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,860	0,051	0,943		0,943	
22	DESCUENTO POR AJUSTE DE BALANCE (CORRELACIÓN CUNETA)	293,7		0,10	-29,3665		-29,3665	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**220,12**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	218,66	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1,46**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**9,0**	**UND:**	**M3**	**CAP:**	
DESC:	**BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M3)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,89	1,70	0,10	42,65		42,65	
2	EJE 2	85,08	1,70	0,10	14,46		14,46	
3	EJE 3	166,27	1,70	0,10	28,27		28,27	
4	RAMAL-EJE A	67,44	1,70	0,10	11,46		11,46	
5	EJE A-1	74,06	1,70	0,10	12,59		12,59	
6	EJE A-2	130,19	1,70	0,10	22,13		22,13	
7	EJE B	269,11	1,70	0,10	45,75		45,75	
8	EJE C	220,35	1,70	0,10	37,46		37,46	
9	EJE D	36,74	1,70	0,10	6,25		6,25	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,22	1,70	0,10	0,89		0,89	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,54	1,70	0,10	0,94		0,94	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,87	1,70	0,10	1,68		1,68	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,81	1,70	0,10	5,92		5,92	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,73	1,70	0,10	0,97		0,97	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,50	1,70	0,10	1,78		1,78	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,62	1,70	0,10	1,81		1,81	
17	EJE 1 (NJ)	71,70	1,70	0,10	12,19		12,19	
18	EJE 2 (NJ)	34,78	1,70	0,10	5,91		5,91	
19	EJE A (NJ)	181,95	1,70	0,10	30,93		30,93	
20	EJE B (NJ)	82,72	1,70	0,10	14,06		14,06	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,47	1,70	0,10	1,10		1,10	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**299,20**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	185,86	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+113,34**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**10,0**	**UND:**	**kg**	**CAP:**	
DESC:	**REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**PESO KG/M2**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (KG**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,40	2,08	1.251,22		1.251,22	
2	EJE 2	85,083	2,40	2,08	424,33		424,33	
3	EJE 3	166,270	2,40	2,08	829,22		829,22	
4	RAMAL-EJE A	67,438	2,40	2,08	336,33		336,33	
5	EJE A-1	74,059	2,40	2,08	369,35		369,35	
6	EJE A-2	130,185	2,40	2,08	649,26		649,26	
7	EJE B	269,108	2,40	2,08	1.342,10		1.342,10	
8	EJE C	220,353	2,40	2,08	1.098,94		1.098,94	
9	EJE D	36,741	2,40	2,08	183,23			
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,40	2,08	26,01		26,01	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,40	2,08	27,60		27,60	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,40	2,08	49,21		49,21	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,40	2,08	173,58		173,58	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,40	2,08	28,57		28,57	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	2,40	2,08	52,34		52,34	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	2,40	2,08	52,96		52,96	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,40	2,08	357,60		357,60	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,40	2,08	173,43		173,43	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,40	2,08	907,40		907,40	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,40	2,08	412,52		412,52	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,40	2,08	32,27		32,27	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**8.594,24**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	4.543,75	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+4.050,48**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**11,0**	**UND:**	**M3**	**CAP:**	
DESC:	**CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESQUEMA / PLANO DE LOCALIZACIÓN



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**ESPESOR**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M3**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	1,70	0,10	42,65		42,65	
2	EJE 2	85,083	1,70	0,10	14,46		14,46	
3	EJE 3	166,270	1,70	0,10	28,27		28,27	
4	RAMAL-EJE A	67,438	1,70	0,10	11,46		11,46	
5	EJE A-1	74,059	1,70	0,10	12,59		12,59	
6	EJE A-2	130,185	1,70	0,10	22,13		22,13	
7	EJE B	269,108	1,70	0,10	45,75		45,75	
8	EJE C	220,353	1,70	0,10	37,46		37,46	
9	EJE D	36,741	1,70	0,10	6,25		6,25	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	1,70	0,10	0,89		0,89	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	1,70	0,10	0,94		0,94	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	1,70	0,10	1,68		1,68	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	1,70	0,10	5,92		5,92	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	1,70	0,10	0,97		0,97	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	1,70	0,10	1,78		1,78	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	1,70	0,10	1,81		1,81	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	1,70	0,10	12,19		12,19	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	1,70	0,10	5,91		5,91	
19	EJE A (NJ)	181,946	1,70	0,10	30,93		30,93	
20	EJE B (NJ)	82,716	1,70	0,10	14,06		14,06	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	1,70	0,10	1,10		1,10	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**299,20**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	185,86	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+113,34**	**CANTIDAD A COBRAR**

Cesar Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP. 7020 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**12,0**	**UND:**	**M2**	**CAP:**	
DESC:	**ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**ESPESOR**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,00	1,00	501,77		501,77	
2	EJE 2	85,083	2,00	1,00	170,17		170,17	
3	EJE 3	166,270	2,00	1,00	332,54		332,54	
16	RAMAL-EJE A	67,438	2,00	1,00	134,88		134,88	
4	EJE A-1	74,059	2,00	1,00	148,12		148,12	
5	EJE A-2	130,185	2,00	1,00	260,37		260,37	
6	EJE B	269,108	2,00	1,00	538,22		538,22	
7	EJE C	220,353	2,00	1,00	440,71		440,71	
8	EJE D	36,741	2,00	1,00	73,48		73,48	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,00	1,00	10,43		10,43	
15	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,00	1,00	11,07		11,07	
9	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,00	1,00	19,73		19,73	
11	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,00	1,00	69,61		69,61	
12	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,00	1,00	11,46		11,46	
13	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	2,00	1,00	20,99		20,99	
14	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	2,00	1,00	21,24		21,24	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,00	1,00	143,41		143,41	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,00	1,00	69,55		69,55	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,00	1,00	363,89		363,89	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,00	1,00	165,43		165,43	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,00	1,00	12,94		12,94	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**3.520,00**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	2.186,60	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1.333,40**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**13,0**	**UND:**	**ML**	**CAP:**	
DESC:	**CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**ESPESOR**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (ML**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	0,00	1,00	0,00	2	501,77	
2	EJE 2	85,083	0,00	0,00	0,00	2	170,17	
3	EJE 3	166,270	0,00	0,00	0,00	2	332,54	
4	RAMAL-EJE A	67,438	0,00	0,00	0,00	2	134,88	
5	EJE A-1	74,059	0,00	0,00	0,00	2	148,12	
6	EJE A-2	130,185	0,00	0,00	0,00	2	260,37	
7	EJE B	269,108	0,00	0,00	0,00	2	538,22	
8	EJE C	220,353	0,00	0,00	0,00	2	440,71	
9	EJE D	36,741	0,00	0,00	0,00	2	73,48	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	0,00	0,00	0,00	2	10,43	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	0,00	0,00	0,00	2	11,07	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	0,00	0,00	0,00	2	19,73	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	0,00	0,00	0,00	2	69,61	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	0,00	0,00	0,00	2	11,46	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	0,00	0,00	0,00	2	20,99	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	0,00	0,00	0,00	2	21,24	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	0,00	0,00	0,00	2	143,41	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	0,00	0,00	0,00	2	69,55	
19	EJE A (NJ)	181,946	0,00	0,00	0,00	2	363,89	
20	EJE B (NJ)	82,716	0,00	0,00	0,00	2	165,43	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	0,00	0,00	0,00	2	12,94	
	TRAMOS A DESCONTAR POR INTERCCIONES	2,75				12	-33,00	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**3.487,00**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	2.186,60	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1.300,40**	**CANTIDAD A COBRAR**

Cesar Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**15,0**	**UND:**	**ML**	**CAP:**	
DESC:	**CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

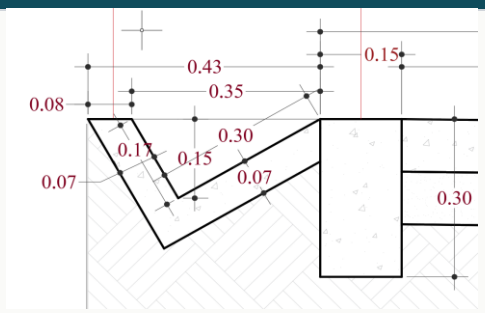

Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**ESPESOR**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (ML**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887			0,00	2	501,77	
2	EJE 2	85,083			0,00	0	0,00	
3	EJE 3	166,270			0,00		0,00	
4	RAMAL-EJE A	67,438			0,00		0,00	
5	EJE A-1	74,059			0,00		0,00	
6	EJE A-2	130,185			0,00		0,00	
7	EJE B	269,108			0,00		0,00	
8	EJE C	220,353			0,00		0,00	
9	EJE D	36,741			0,00		0,00	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216			0,00		0,00	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535			0,00		0,00	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867			0,00		0,00	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805			0,00		0,00	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728			0,00		0,00	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495			0,00		0,00	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619			0,00		0,00	
17	EJE 1 (NJ)	71,703			0,00		0,00	SE RESTA EL COSTADO DERECHO DE LA CANCHA
18	EJE 2 (NJ)	34,776			0,00		0,00	
19	EJE A (NJ)	181,946			0,00		0,00	
20	EJE B (NJ)	82,716			0,00		0,00	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,47			0,00		0,00	
22	TRAMOS A DESCONTAR POR INTERCCIONES	2,75			0,00		0,00	
23	DESCUENTO POR AJUSTE DE BALANCE (CORRELACIÓN CUNETA)	293,7					0,0000	Reducción correlacionada con items 4, y 8

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD TOTAL CALCULADA (requerida para completar la obra)	**501,77**	
Cantidad contractual (saldo por ejecutar pre-modificatoria)	0,00	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+501,77**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP 76202-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

5.0. AUTORIZACIÓN DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
OFICINA DE RENTAS

LIQUIDACIÓN DE DEDUCCIONES N° 977

DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, FONDOS ESPECIALES Y TASAS

En atención a lo establecido en el Parágrafo 2 y Parágrafo 3 del Artículo 301 de la Ordenanza 027 de 2022 (Estatuto de Rentas de Amazonas), solicito respetuosamente se realice la DEDUCCIÓN del valor de las estampillas departamentales, fondos especiales y tasas, con los pagos derivados del siguente contrato en las siguientes condiciones:

El Jefe de Rentas Departamental, autoriza la deducción de estampillas departamentales, fondos especiales y tasas de la siguiente manera:

Contrato de obra N° **2594** de fecha **10/11/2025** por un valor total de **$ 3,555,780,983** suscrito entre **CONSORCIO PEATONAL CEL** identificado con la C.C/NIT con número **902007682-7** y la Gobernacion del Amazonas, con plazo de ejecucion de **0** meses y **50** días, con el siguiente objeto:

CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA, COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE A AMAZONAS. ID del contrato en SECOP.8561976

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE ESTAMIPILLA DEPARTAMENTALES

NOMBRE ESTAMPILLA	No. CUENTA BANCARIA	PORCENTAJE	VALOR ESTAMPILLA
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	407-243609	1.5%	$ 53,336,715
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	407-243617	1.5%	$ 53,336,715
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	407-243625	1%	$ 35,557,810
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	407-21097-0	1%	$ 35,557,810
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION	407-298454	1%	$ 35,557,810
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	407-243633	4%	$ 142,231,239
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR/ BANCOLOMBIA	903-000014-33	2%	$ 71,115,620
	VALOR TOTAL	**12.0%**	**$ 426,693,718**

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE FONDOS ESPECIALES Y TASAS

NOMBRE ESTAMPILLA	CUENTA BANCARIA	PORCENTAJE	VALOR ESTAMPILLA
FONDO ESPECIAL DE BOMBEROS	407-298462	0.5%	$ 17,778,905
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	407-020294	5.0%	$ 177,789,049
TASA PRO DEPORTE	407-27506-4	1.5%	$ 53,336,715
	VALOR TOTAL	**7.0%**	**$ 248,904,669**

LIQUIDACIÓN TOTAL DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y FONDOS ESPECIALES

Valor total de estampillas departamentales	$	426,693,718
Valor total de fondos especiales, tasas y contribuciones	$	248,904,669
VALOR TOTAL A PAGAR	$	**675,598,387**

Se firma en Leticia - Amazonas, el día **miércoles, 10 de diciembre de 2025**

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Jefe de Rentas

CONSORCIO PEATONAL CEL
Contratista

Elaboró:Viviana Holanda
Aprobó: David Salomon Alvarez Barros
Revisó: David Salomon Alvarez Barros

Powered by CamScanner

6.0. INFORME DE INTERVENTORÍA

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2604** de 2025

INTERVENTORÍA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
NIT: 901.730.540 – 6



SUPERVISOR
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura

INFORME DE INTERVENTORÍA
ACTA PARCIAL DE OBRA **No. 02**

26 DE ENERO AL 28 DE MAYO DE 2026


Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

VALIDACIÓN DE INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJECUTADO

POR INTERVENTORÍA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
ELABORÓ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES	
REVISÓ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	KEVIN EDUARDO ANDRADE SARMIENTO	
APROBÓ	REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	

REVISIÓN Y AVAL SUPERVISIÓN

La supervisión ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información en él descrita,

FECHA DE REVISIÓN	POR SUPERVISIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA
01/06/2026	Revisó	director de infraestructura	Robin Cardenas Paredes	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	REVISIÓN	
	FECHA ENTREGA	FECHA REVISIÓN
Vo. 001	28-05-2026	

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 9
2. OBJETIVOS 11
2.1. OBJETIVO GENERAL 11
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 12
3.1. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
3.2. PÓLIZAS INTERVENTORÍA 13
3.3. REPORTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
3.4. PERSONAL DE INTERVENTORÍA 16
3.5. REPORTE DE MAQUINARÍA, EQUIPOS, VEHÍCULOS, INSTALACIONES Y DEMÁS REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 17
3.6. REPORTE DEL PLAN SST DE INTERVENTORÍA 17
3.6.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS 17
3.7. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 17
3.7.1. ENTREGA Y CAMBIO DE EPP 21
3.7.2. INSPECCIONES REALIZADAS 22
3.7.3. CONTROL OPERACIONAL, INSPECCIONES PREOPERACIONALES Y PERMISOS DE ALTO RIESGO 23
4. INFORME DE INTERVENTORÍA 29
4.1. REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2594 DE 2025 29
4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 29
4.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 30
4.1.3. SEGUIMIENTO DE LAS PÓLIZAS 31
4.1.4. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y DEBIDOS PROCESOS 32
4.1.5. PERSONAL EN OBRA 32
4.1.6. VERIFICACIÓN HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES Y OTROS 35
4.1.7. ANEXOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 37

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.2. REPORTE SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO 37
4.2.1. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSTRUCTOR 38
4.2.2. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONSTRUCTOR 61
4.2.3. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA 61
4.2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS 67
4.2.5. ANÁLISIS UNITARIOS NO PREVISTOS APROBADOS EN EL PERIODO 71
4.2.6. COMPONENTE CALIDAD 72
4.2.7. REPORTE DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 72
4.2.8. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LEGALIDAD DE SITIOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES 73
4.2.9. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN BITÁCORA 73
4.3. REPORTE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 74
4.3.1. BALANCE DE OBRA DEL PERIODO 74
4.3.2. ANEXOS DEL COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 79
4.4. REPORTE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST DE ACUERDO CON EL PAGA (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) DEL CONTRUCTOR 80
4.4.1. ANEXOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 80
4.4.2. CONTROL DE LLUVIAS 84
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 85
6. ANEXOS 87

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. *Información Contractual Interventoría No. 2604 de 2025* 12
Tabla 2. *Pólizas iniciales Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 13
Tabla 3. *Pólizas Reinicio Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 14
Tabla 4. *Pólizas Otrosí No.2 Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 14
Tabla 5. *Control estado de pagos al Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 15

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

Tabla 6. *Control de Contratos de Interventoría* 15
Tabla 7. *Balance General de Interventoría* 16
Tabla 8. *Profesionales Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 16
Tabla 9. *Relación Periodo de seguridad social Interventoría* 16
Tabla 10. *Equipos reportados Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 17
Tabla 11. *Relación Inducciones y Reinducciones* 18
Tabla 12. *Relación capacitaciones realizadas* 18
Tabla 13. *Relación charlas realizadas* 21
Tabla 14. *Relación Dotación entregada al personal de Ingreso* 22
Tabla 15. *Relación EPP entregados al personal en Obra* 22
Tabla 16. *Relación inspecciones de EPP realizadas* 23
Tabla 17. *Inspección Botiquín* 23
Tabla 18. *Inspección Extintor* 23
Tabla 19. *Plantilla de Tabla de Control Operacional* 28
Tabla 20. *Tramos a intervenir* 29
Tabla 21. *Pólizas iniciales Contrato de Obra No. 2594 de 2025* 31
Tabla 22. *Pólizas Reinicio Contrato de Obra No. 2594 de 2025* 31
Tabla 23. *Pólizas Otrosí No. 2 Contrato de Obra No. 2594 de 2025* 32
Tabla 24. *Profesionales Contrato de Obra No. 2594 de 2025* 33
Tabla 25. *Personal Operativo de la Obra* 34
Tabla 26. *Relación Periodo de seguridad social Obra* 35
Tabla 27. *Verificación herramientas, maquinaría, equipos y demás* 36
Tabla 28. *Información contractual Obra No. 2594 de 2025* 37
Tabla 29. *Cantidades contractuales Contrato de Obra No. 2594 de 2025* 38
Tabla 30. *Seguimiento mensual Programación de Obra* 62
Tabla 31. *Relación Actas de Comité 2026* 67
Tabla 32. *Relación Actas de Comité Técnico 2026* 68
Tabla 33. *Relación correspondencia enviada y recibida* 71
Tabla 34. *Resultados ensayos de laboratorio* 73
Tabla 35. *Relación certificados de calidad de materiales* 73
Tabla 36. *Control estado de pagos al Contrato de obra* 74
Tabla 37. *Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra* 75
Tabla 38. *Ejecución mensual Parte 1* 76
Tabla 39. *Ejecución mensual Parte 2* 77
Tabla 40. *Ejecución mensual Parte 3* 78
Tabla 41. *Estado financiero y contable del Contrato de Obra* 79
Tabla 42. *Seguimiento al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental* 83
Tabla 43. *Seguimiento Financiero Acumulado al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental* 84
Tabla 44. *Resumen Financiero de PAGA* 84

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONTENIDO DE IMÁGENES

Imagen 1. *Corte transversal anden* 30
Imagen 2. *Ubicación del Proyecto* 30
Imagen 3. *Replanteo Nuevo Jardín* 39
Imagen 4. *Control de niveles y demarcación eje A* 39
Imagen 5. *Control de niveles en excavaciones* 39
Imagen 6. *Verificación de trazo y niveles* 39
Imagen 7. *Rocería en eje A entre 2 y 3* 40
Imagen 8. *Rocería en eje 1* 40
Imagen 9. *Descapote Nuevo Jardín* 40
Imagen 10. *Descapote en vías Nuevo Jardín* 40
Imagen 11. *Placas existentes sobrepuestas en vía Nuevo Jardín* 41
Imagen 12. *Retiro de placas existentes* 41
Imagen 13. *Excavaciones eje A entre 2 y 3* 42
Imagen 14. *Excavación en eje 3 entre C y A* 42
Imagen 15. *Excavaciones en eje A entre 2 y 3* 42
Imagen 16. *Excavación manual en eje A* 42
Imagen 17. *Excavaciones frente a maloca* 43
Imagen 18. *Excavaciones en eje A a Puerto* 43
Imagen 19. *Excavaciones Nuevo Jardín* 43
Imagen 20. *Excavaciones eje 3 a Nuevo Jardín* 43
Imagen 21. *Nivelación y compactación eje A entre 2 y 3* 44
Imagen 22. *Nivelación y compactación de suelo* 44
Imagen 23. *Nivelación y compactación Nuevo Jardín con pisón* 44
Imagen 24. *Compactado eje A entre 3 y puerto* 44
Imagen 25. *Nivelación y compactación en Nuevo Jardín* 45
Imagen 26. *Compactación vías internas en Nuevo Jardín* 45
Imagen 27. *Nivelación en eje A* 45
Imagen 28. *Compactación de suelo eje A entre 2 y 3* 45
Imagen 29. *Construcción caja sumidero en eje 1* 46
Imagen 30. *Excavación y canasta caja sumidero* 46
Imagen 31. *Formaleteo caja sumidero* 46
Imagen 32. *Vaciado estructura aleta* 46
Imagen 33. *Caja sumidero sin tapa* 46
Imagen 34. *Vista lateral caja sumidero* 46
Imagen 35. *Relleno en intersección eje A y 3* 47
Imagen 36. *Relleno con material e=0,10m* 47
Imagen 37. *Relleno en eje A entre 2 y 3* 47
Imagen 38. *Relleno vía a Nuevo Jardín* 47
Imagen 39. *Extendido arena cemento en eje 3* 48

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

Imagen 40. *Extendido arena cemento eje C* 48
Imagen 41. *Arena cemento e=0,10m a puerto en eje B* 48
Imagen 42. *Arena cemento 1:10 e=0,10m* 48
Imagen 43. *Arena cemento en eje 3 a Nuevo Jardín* 49
Imagen 44. *Arena cemento eje 2 de 1 a puente* 49
Imagen 45. *Extendido arena cemento eje A* 49
Imagen 46. *Extendido arena cemento a Nuevo Jardín* 49
Imagen 47. *Compactado con pisón* 50
Imagen 48. *Extendido arena cemento 1:10 Nuevo Jardín* 50
Imagen 49. *Vías internas Nuevo Jardín* 50
Imagen 50. *Arena Cemento Nuevo Jardín 1,70m* 50
Imagen 51. *Instalación de malla amarre a bordillo* 51
Imagen 52. *Instalación malla #5* 51
Imagen 53. *Malla amarrada a bordillo* 51
Imagen 54. *Malla instalada sobre arena cemento* 51
Imagen 55. *Malla #5 amarrada a bordillo "S"* 52
Imagen 56. *Uso de panelas de concreto para recubrimiento malla* 52
Imagen 57. *Amarre malla y acero de refuerzo* 52
Imagen 58. *Instalación malla en Nuevo Jardín* 52
Imagen 59. *Vaciado de concreto 3000PSI* 53
Imagen 60. *Extendido de concreto con regleta* 53
Imagen 61. *Vaciado de concreto losa y bordillo* 53
Imagen 62. *Uso vibrador de concreto* 53
Imagen 63. *Vaciado concreto 3000PSI losa y bordillo* 54
Imagen 64. *Extendido de concreto 3000PSI* 54
Imagen 65. *Vaciado concreto 3000PSI* 54
Imagen 66. *Uso regleta superficial en vaciado* 54
Imagen 67. *Vaciado de concreto y paso de regleta* 55
Imagen 68. *Vaciado concreto Nuevo Jardín* 55
Imagen 69. *Vaciado concreto losa y bordillo a=2,00m* 55
Imagen 70. *Vaciado concreto 3000PSI maloca Nuevo Jardín* 55
Imagen 71. *Uso tapete para estampado* 56
Imagen 72. *Estampado final* 56
Imagen 73. *Uso pisón para estampado* 57
Imagen 74. *Uso mineral color rojo tipo espiga* 57
Imagen 75. *Vista final estampado tipo espigado* 57
Imagen 76. *Estampado tipo espigado color rojo* 57
Imagen 77. *Estampado eje C entre 1 y 3* 58
Imagen 78. *Estampado final en eje 3 entre B y C* 58
Imagen 79. *Estampado tipo espiga en Nuevo Jardín* 58
Imagen 80. *Estampado en vías internas Nuevo Jardín* 58

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

Imagen 81. *Vaciado en sistema monolítico losa y bordillo* 59
Imagen 82. *Instalación acero de refuerzo* 59
Imagen 83. *Excavación para bordillo* 59
Imagen 84. *Vaciado concreto 3000PSI losa y bordillo* 59
Imagen 85. *Extendido de arena cemento* 60
Imagen 86. *Instalación formaleta para cuneta ambos costados* 60
Imagen 87. *Vista sección de cuneta* 60
Imagen 88. *Vaciado de concreto para cuneta ambos costados* 60

CONTENIDO DE GRÁFICAS

Gráfica 1. *Programación Actual Contrato de Obra No. 2594 de 2026* 64
Gráfica 2. *Programación Actual Parte II Contrato de Obra No. 2594 de 2026* 65
Gráfica 3. *Programación Actual Parte III Contrato de Obra No. 2594 de 2026* 66

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Amazonas, dentro del plan de desarrollo "*Amazonas para la vida*" busca dentro de los programas de transporte mejorar y construir la red de infraestructura peatonal dentro del casco de las comunidades indígenas del departamento del Amazonas, en especial aquellas que están en constante desarrollo y emprendimiento ecoturístico en el departamento y ante la necesidad de mejorar la conectividad vial fortaleciendo estratégicamente el desarrollo socioeconómico y turístico de la región, así como mejorando la calidad de vida de los pobladores, quienes hacen parte del sector rural deben recorrer largas distancias por medio fluvial o por trochas y caminos ancestrales que dificultan la movilidad.

La inspección de policía / Santa Sofía del municipio de Leticia carece de malla vial transitada por vehículos automotores, siendo los senderos peatonales las vías a través de las cuales las comunidades se comunican a los diferentes lugares de interés de sus territorios. De acuerdo con lo anterior, ante la carencia de senderos peatonales, la alternativa resulta en la solución adecuada para atender la situación actual de la población, con motivo de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes la administración departamental decide por medio de los recursos FSSG MT asignados al departamento, contratar la ejecución de la construcción de vías peatonales en concreto estampado en la comunidad de SANTA SOFIA – municipio de Leticia – Departamento de Amazonas.

Con el fin de darle cumplimiento al deber constitucional y legal, de garantizar los derechos fundamentales a la población, la gobernación de Amazonas formuló y estructuró el proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", identificado con código BPIN 2023006910053, con el fin de realizar la construcción de siete tramos de vías que van a generar dos senderos peatonales principales entre la comunidad de Nuevo Jardín hacia Santa Sofia y la interconexión del nuevo puente en concreto peatonal entre la ribera del río

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

Amazonas y las comunidades de Nuevo Jardín / Santa Sofía. Con estas nuevas vías peatonales a construir con recursos de la nación (FSSG 2023), se verán beneficiadas ambas comunidades con un alcance total de 1762ml x 2.86 de ancho (con bordillo y cunetas), y, además, todas estas nuevas vías peatonales concurren entre ellas, generando una red de movilidad peatonal general, incluyendo el acceso fluvial de turistas y habitantes del sector.

En tal sentido, para la ejecución del proyecto en mención, se requiere contar con la "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", que vigile, coordine, verifique, controle técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y socialmente, como todas las funciones propias de una interventoría de construcción al objeto "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Reportar la ejecución y el desempeño de las actividades técnicas, administrativas, financieras, ambientales y sociales de las actividades realizadas por el contratista de obra, bajo el contrato de interventoría No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"" desarrolladas entre el 26 de enero y el 28 de mayo de 2026.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidad de materiales, programación de obra, plazos contractuales y demás exigencias contempladas en los pliegos de condiciones por parte del contratista de obra.
- Dar cumplimiento a todas las operaciones, lineamientos y controles de normatividad del SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
- Realizar el seguimiento, verificación y mantenimiento de las medidas señaladas en el plan de trabajo del contratista, respecto a señalización, personal y demás requerimientos y recomendaciones descritas en el documento.
- Identificar las diferentes actividades que se realizaran en las obras para revisar e implementar los mecanismos de control presentados en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y el PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA del contratista.
- Verificar las labores de gestión social que debe ejecutar el Contratista durante el periodo, corroborando su cumplimiento.
- Mantener registro fotográfico diario y detallado que permita evaluar el estado y evolución de la obra.
- Verificar el aseo y condiciones óptimas de trabajo, durante la ejecución del proyecto.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
NÚMERO DE CONTRATO:	2604 DE 2025	
DATOS DEL CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONCURSO DE MÉRITOS GOB-AMA-CM-03-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	
DATOS DEL CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. NIT: 901.730.540 – 6
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL C.C. 93.123.714
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 4624 DE 19-09-2025 RP 7254 DE 11-11-2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 264.627.409,00	
FECHA DEL CONTRATO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	23 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN 01:	05 DE ENERO DE 2026	
FECHA REINICIO 01:	26 DE ENERO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	50 DÍAS	
OTROSÍ No. 02:	04 DE FEBRERO DE 2026	
TIEMPO A PRORROGAR:	4 MESES Y 10 DÍAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	180 DÍAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE JUNIO DE 2026**	

Tabla 1. *Información Contractual Interventoría No. 2604 de 2025*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

3.2. PÓLIZAS INTERVENTORÍA

El contrato de interventoría No. 2604 de 2025, se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento No. 99223, expedida por la compañía de seguros BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., las cuales fueron aprobadas por medio de la resolución No. 0122 de fecha 13 de noviembre de 2025:

AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	99223	11/11/2025	30/04/2026	$ 52.925.481,80	20%	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	99223	11/11/2025	31/12/2028	$ 39.694.111,35	100%	
PAGO SALARIOS	99223	11/11/2025	31/12/2028	$ 26.462.740,90	15%	
CALIDAD	99223	31/12/2025	31/12/2030	$ 79.388.222,70	30%	

Tabla 2. *Pólizas iniciales Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

Por temas ajenos al contratista de interventoría, se toma la decisión de suspender el contrato de interventoría, teniendo en cuenta que:

- **SUSPENSIÓN 01:** De acuerdo al oficio CPC-PF-2025-007, se solicita suspensión debido a las lluvias intensas y persistentes han generado inundaciones, saturación de suelos y deslizamientos en las áreas de intervención, imposibilitando la ejecución normal de actividades y representando riesgos para la seguridad del personal y la calidad de las estructuras. Por lo que se suspende el proyecto hasta el 05 de enero de 2026.
- **AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN 01:** Teniendo en cuenta el oficio CPC-PF-2025-008, se solicita ampliación a la suspensión puesto que se presenta alteración grave de las condiciones logísticas por descenso del nivel del río, puesto que el río Amazonas presenta un descenso crítico en su cauce, disminuyendo su nivel aproximadamente 1m en un tiempo de 5 días (fenómeno de estiaje severo), impactando el acceso al brazuelo o quebrada a la comunidad de Santa Sofía, impidiendo el ingreso y transporte de carga y materiales del proyecto, imposibilitando el ingreso de materiales puesto que, la comunidad no cuenta con rutas alternas y el puente peatonal existente en concreto, es estrictamente peatonal y no tiene capacidad técnica para soportar maquinaria ni materiales pesados.

Por lo que se tuvo que realizar una actualización a las pólizas del contrato, así como se enuncia a continuación y también se anexan a este informe:

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	99223	11/11/2025	04/06/2026	$ 52.925.481,80	20%	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	99223	11/11/2025	04/02/2029	$ 39.694.111,35	100%	
PAGO SALARIOS	99223	11/11/2025	04/02/2029	$ 26.462.740,90	15%	
CALIDAD	99223	31/12/2025	31/12/2030	$ 79.388.222,70	30%	

Tabla 3. *Pólizas Reinicio Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

De la misma forma, por medio del otrosí No. 02 del 04 de febrero de 2026, se prorrogó el contrato por un término de 04 meses y 10 días, por lo cual se procedió a realizar nuevamente actualización de pólizas:

AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	99223	11/11/2025	14/10/2026	$ 52.925.481,80	20%	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	99223	11/11/2025	14/06/2029	$ 39.694.111,35	100%	
PAGO SALARIOS	99223	11/11/2025	14/06/2029	$ 26.462.740,90	15%	
CALIDAD	99223	31/12/2025	14/06/2031	$ 79.388.222,70	30%	

Tabla 4. *Pólizas Otrosí No.2 Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

Estas pólizas se encuentran aprobadas por parte de la Entidad por medio de Resolución No. 0022 del 21 de febrero de 2026.

3.3. REPORTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el presente contrato, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. por medio del oficio ISF – 002 renuncia al valor del anticipo, soportado en el Otrosí No. 001. En la siguiente tabla se hace la relación de los pagos parciales que se han realizado al contrato de interventoría No. 2604 de 2025, para su debido control:

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONCEPTO	% PRESENTADO	VALORES PAGADOS	VLR PRESENTE ACTA	AMORTIZACION	VALOR ACUMULADO
PAGO ANTICIPO	0 %	$ 0,00			$ 0,00
ACTA PARCIAL No. 1	47,80 %		$ 126.491.901,00	$ 0,00	$ 126.491.901,00
				VALOR PAGADO	**$ 126.491.901,00**

Tabla 5. *Control estado de pagos al Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

CONTROL DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	264.627.409,00
VALOR ANTICIPO 50%	$	0,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	126.491.901,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$	126.491.901,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE OBRA		**47,80 %**

Tabla 6. *Control de Contratos de Interventoría*

ACTA PARCIAL No. 01							
CANT	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	ACTA PARCIAL No. 01	
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4)=(5)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.129.481,00	$ 1,00	5	$ 30.647.405,00	47,80%	$ 14.649.459,59
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 5.200.262,00	$ 1,00	5	$ 26.001.310,00	47,80%	$ 12.428.626,18
PERSONAL TÉCNICO							
1	PROFESIONAL SISOMA	$ 2.607.675,00	$ 1,00	4,5	$ 11.734.537,50	47,80%	$ 5.609.108,93
1	TOPOGRAFO	$ 3.463.031,00	$ 1,00	4	$ 13.852.124,00	47,80%	$ 6.621.315,27
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1	SECRETARIA GENERAL	$ 2.192.818,00	$ 1,00	5	$ 10.964.090,00	47,80%	$ 5.240.835,02
1	AUXILIAR CONTABLE	$ 2.963.268,00	$ 1,00	5	$ 14.816.340,00	47,80%	$ 7.082.210,52
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					**$ 108.015.807,00**		**$ 51.631.555,51**
FACTOR MULTIPICADOR (7)					**1,987**		**1,987**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)*(7) = (A)					**$ 214.627.409,00**		**$ 102.591.901,00**
CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO ($)**	**UTILIZACIÓN**	**VALOR PARCIAL ($)**		
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10)=(11)		
OTROS COSTOS DIRECTOS							
VIÁTICOS							
1	TRANSPORTE AÉREO - FLUVIAL - TERRESTRE	MES	$ 1.200.000,00	5	$ 6.000.000,00	47,80%	$ 2.868.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

1	ARREDAMIENTOS	MES	$ 1.400.000,00	5	$ 7.000.000,00	47,80%	$ 3.346.000,00
1	SUMINISTRO DE EQUIPOS OFICINA PAPELERIA E IMPRESIÓN	MES	$ 1.000.000,00	5	$ 5.000.000,00	47,80%	$ 2.390.000,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS	MES	$ 500.000,00	5	$ 2.500.000,00	47,80%	$ 1.195.000,00
OTROS COSTOS							
1	LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD	MES	$ 1.500.000,00	5	$ 7.500.000,00	47,80%	$ 3.585.000,00
1	ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	MES	$ 3.000.000,00	4	$ 12.000.000,00	47,80%	$ 5.736.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11)					**$ 40.000.000,00**		**$ 19.120.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (12)					**1,250**		**1,250**
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS = (11)*(12)= (B)					**$ 50.000.000,00**		**$ 23.900.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A)+(B)= (C)					**$ 264.627.409,00**		**$ 126.491.901,00**
COSTO TOTAL					**$ 264.627.409,00**	**47,80%**	**$ 126.491.901,00**

Tabla 7. *Balance General de Interventoría*

3.4. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal presente en la obra durante el periodo reportado, de acuerdo a la oferta presentada por parte de la interventoría.

NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	% DEDICACIÓN
KEVIN EDUARDO ANDRADE SARMIENTO	1.110.540.061	ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA	45 %
DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES	1.106.713.403	ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100 %
JONATHAN DAVID BARRETO MOLINA	1.110.521.542	TOPOGRAFO	50 %
YURLEY SANDOVAL CACERES	1.093.781.548	PROFESIONAL SISOMA	100 %

Tabla 8. *Profesionales Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

Se anexa certificado del revisor fiscal donde confirma que la empresa ha pagado correctamente sus aportes a salud, pensión, riesgos laborales (ARL), ICBF, SENA y Cajas de Compensación durante los últimos meses, bajo la gravedad de juramento y cumpliendo la Ley 789 de 2002.

RELACIÓN PERIODO SEGURIDAD SOCIAL		
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSION**	**NUMERO DE PLANILLA**
2026 – 05	2026 – 04	37269170

Tabla 9. *Relación Periodo de seguridad social Interventoría*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

3.5. REPORTE DE MAQUINARÍA, EQUIPOS, VEHÍCULOS, INSTALACIONES Y DEMÁS REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo a lo establecido contractualmente en el contrato de interventoría No. 2604 de 2025, para las actividades de revisión, control y demás referentes al objeto contractual, se tiene contemplado hacer uso de equipos necesarios para verificar información. En este orden de ideas, para el periodo reportado, se relacionan los equipos con los que cuenta la interventoría; de la misma forma, se cuenta con instalaciones de oficina física en la ciudad de Leticia, en la Transversal 3 No. 14 – 33, para realizar reuniones, comités de obra y demás.

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	No. DE REFERENCIA
COMPUTADOR PORTATIL	HP LAPTOP 15
COMPUTADOR DE MESA ACER	AMD BLACK EDITION

Tabla 10. *Equipos reportados Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

3.6. REPORTE DEL PLAN SST DE INTERVENTORÍA

3.6.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

El CONSORCIO PEATONES CEL y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S., en su Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen como actividad indispensable para el inicio de las actividades laborales en el proyecto, la notificación de peligros y riesgos en cada una de las inducciones al personal vinculado, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, la prevención de riesgos y posibles accidentes en el lugar de trabajo, la notificación de riesgo al personal de la interventoría se realizará con anterioridad al inicio de obras.

3.7. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Como metodología para la promoción de la higiene y seguridad industrial en el lugar de trabajo, prevención de riesgos y formación en temas afines al cargo contratado, todo el personal vinculado al CONSORCIO PEATONAL CEL y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. recibe inducción y re inducción al cargo cuando sea necesario. Dentro de las actividades de inducción se realiza capacitación al personal en temas como: POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST; POLÍTICA DE NO ALCOHOL,

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

TABACO Y DROGAS; PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD PUBLICA, USO DE EPP, Notificación del Riesgo entre otras.

Para el periodo reportado, se realizó reinducción al personal que continua en la obra y se realiza inducción al personal nuevo, antes de ingresar al proyecto:

INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN			
FECHA	**TEMA**	**ASISTENTES**	**TIEMPO**
26-01-2026	Reinducción de ingreso	13	1 hora
03-02-2026	Inducción de ingreso	4	1 hora
10-02-2026	Inducción de ingreso	9	1 hora
21-02-2026	Inducción de ingreso	3	1 hora
07-04-2026	Inducción de ingreso	11	1 hora
06-05-2026	Inducción de ingreso	2	1 hora
11-05-2026	Inducción de ingreso	7	1 hora

Tabla 11. *Relación Inducciones y Reinducciones*

De igual forma, se realizaron las siguientes capacitaciones y charlas, antes de dar inicio con las actividades en obra:

CAPACITACIONES			
FECHA	**TEMA**	**ASISTENTES**	**TIEMPO**
27-01-2026	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Uso y Mantenimiento de EPP	13	1 hora
26-02-2026	Ergonomía e Higiene Postural Riesgo químico	26	1 hora
07-03-2026	Manejo seguro de sustancias químicas	28	1 hora
16-03-2026	Prevención de golpe de calor	28	1 hora
25-03-2026	Ergonomía y mecánica corporal en trabajo a nivel de suelo	28	1 hora
11-04-2026	Riesgos biológicos y ambientales	36	1 hora
18-04-2026	Seguridad en la labor	36	1 hora
25-04-2026	Ofidismo y animales ponzoñosos	36	1 hora
08-05-2026	Seguridad química en acabados de concreto	36	1 hora
15-05-2026	Ergonomía y mecánica corporal	43	1 hora
22-05-2026	Operación segura de equipos y herramientas	43	1 hora

Tabla 12. *Relación capacitaciones realizadas*

CHARLAS DIARIAS			
FECHA	**TEMA**	**ASISTENTES**	**TIEMPO**
26-01-2026	Uso correcto de EPP’s	13	10 min

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

27-01-2026	Manejo manual de cargas	13	10 min
28-01-2026	Seguridad en excavaciones	13	10 min
29-01-2026	Reporte de actos y condiciones inseguras	13	10 min
30-01-2026	Higiene y salud	13	10 min
31-01-2026	Cuidado con las manos	13	10 min
02-02-2026	Uso adecuado de herramientas	13	10 min
03-02-2026	Trabajo en equipo	17	10 min
04-02-2026	Señalización en obra	17	10 min
05-02-2026	El autocuidado	17	05 min
06-02-2026	Agotamiento por calor	17	10 min
07-02-2026	Protección de ojos	17	05 min
09-02-2026	Seguridad en excavaciones	16	05 min
10-02-2026	Conciencia ambiental	24	10 min
11-02-2026	Higiene postural	24	10 min
12-02-2026	Cuidado de la piel	24	05 min
13-02-2026	Tropiezos, resbalones y caídas	24	10 min
14-02-2026	Prevención de caídas y lesiones	24	10 min
16-02-2026	Limpieza de manos	24	05 min
17-02-2026	Uso adecuado de dotación	24	10 min
18-02-2026	Manejo estrés laboral	24	05 min
19-02-2026	¿Qué hacer en caso de accidente?	24	05 min
20-02-2026	Hidratación constante	24	05 min
21-02-2026	Protección de piel y cabeza	24	10 min
23-02-2026	Golpe de calor	27	10 min
24-02-2026	Orden y aseo	27	10 min
25-02-2026	Primeros auxilios	27	15 min
26-02-2026	Golpes por objetos	27	05 min
27-02-2026	Capacitación botiquín	27	20 min
28-02-2026	Exceso de confianza	27	15 min
02-03-2026	Prevención de resbalones y caídas	13	15 min
03-03-2026	Uso correcto de EPP (impermeable)	13	10 min
04-03-2026	Reporte condiciones inseguras	13	10 min
05-03-2026	Tormentas y clima severo	13	15 min
06-03-2026	Seguridad vial y desplazamientos	13	10 min
07-03-2026	Salud respiratoria	13	05 min
09-03-2026	Estabilidad de suelos en excavaciones	13	10 min
10-03-2026	Trasiego seguro en terrenos irregulares	17	10 min
11-03-2026	Manejo de arena y cemento	17	10 min
12-03-2026	Choque térmico	17	10 min
13-03-2026	Orden y aseo	17	10 min

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

14-03-2026	Uso correcto de EPP	17	10 min
16-03-2026	El clima y la ventana de trabajo para concreto	16	1 hora
17-03-2026	Manejo seguro de minerales y colorantes	24	10 min
18-03-2026	Ergonomía en el estampado	24	10 min
19-03-2026	Dilatación de losas y herramientas	24	05 min
20-03-2026	Uso adecuado de herramienta menor	24	10 min
21-03-2026	Orden y aseo final de jornada	24	05 min
23-03-2026	Tus manos son tu herramienta principal	24	10 min
24-03-2026	El casco no es obstáculo, es seguro de vida	24	05 min
25-03-2026	Protección solar	24	1 hora
26-03-2026	Hidratación y sombra estratégica	24	05 min
27-03-2026	Cuidado del equipo	24	05 min
28-03-2026	Uso del botiquín de emergencias	24	05 min
30-03-2026	Levantamiento de cargas	27	10 min
31-03-2026	Técnicas de uso seguro de herramientas	27	10 min
06-04-2026	¿Por qué estamos aquí?	25	15 min
07-04-2026	El casco y el calor	36	10 min
08-04-2026	Tus manos son tu herramienta de vida	36	10 min
09-04-2026	El “ritmo” y la seguridad	36	10 min
10-04-2026	Uso adecuado de EPP’s	36	15 min
11-04-2026	Orden y aseo	36	10 min
13-04-2026	Riesgo biológico	36	10 min
14-04-2026	Convivencia con los perros sueltos	36	15 min
15-04-2026	Cuidado con la piel y el concreto	36	15 min
16-04-2026	Logística y esfuerzo físico	36	10 min
17-04-2026	El clima y la hidratación	36	15 min
18-04-2026	Cuidado con las manos	36	10 min
20-04-2026	Mezcladoras ¡Cuidado con atrapamientos!	36	10 min
21-04-2026	El vibro y tus articulaciones	36	15 min
22-04-2026	Cuidado con los ojos	36	10 min
23-04-2026	Riesgo de chispa y disco	36	10 min
24-04-2026	Derecho a decir no	36	15 min
25-04-2026	Uso guantes obligatorio	36	10 min
27-04-2026	Protección solar	36	15 min
28-04-2026	Manejo de residuos en la selva	36	15 min
29-04-2026	Primeros auxilios básicos	36	15 min
30-04-2026	Comunicación asertiva y trabajo en equipo	36	10 min
02-05-2026	Riesgo ergonómico (posturas)	36	10min
04-05-2026	Riesgos de lesiones lumbares	34	10min
05-05-2026	Uso de herramientas manuales	34	10min

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

06-05-2026	Señalización en obra	36	15min
07-05-2026	Atrapamiento y golpes en manos	36	10min
08-05-2026	Seguridad química	36	5min
09-05-2026	Cuidado de la piel	36	10min
11-05-2026	Posturas ergonómicas	43	10min
12-05-2026	Protección respiratoria	43	10min
13-05-2026	Orden y limpieza	43	10min
14-05-2026	Hidratación y protección	43	15min
15-05-2026	Elementos de protección personal	43	10min
16-05-2026	Peligro oculto del desmoldante químico	43	10min
19-05-2026	Uso correcto de llanas	43	15min
20-05-2026	Peligros de polvo del mineral rojo	43	15min
21-05-2026	Posturas al nivelar	43	10min
22-05-2026	Operación segura de mezcladora	43	10min
23-05-2026	Orden y limpieza de escombros	43	10min
25-05-2026	Manejo de seguro de moldes de estampado	43	10min
26-05-2026	Peligro de carretillas sobrecargadas	43	10min
27-05-2026	Ruido y vibración en el corte de dilataciones	43	10min
28-05-2026	Hidratación y golpe de calor	43	10min

Tabla 13. *Relación charlas realizadas*

3.7.1. ENTREGA Y CAMBIO DE EPP

En cumplimiento a la legislación vigente y con el objetivo de proteger al personal del CONSORCIO PEATONES CEL y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S., se hará entrega de elementos de protección personal de acuerdo a la labor a desarrollar a cada uno de sus trabajadores al inicio de las obras.

Durante el periodo evaluado, se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente respecto al suministro de dotación inicial y de reposición para el personal de obra del CONSORCIO PEATONES CEL. En la fase de ingreso, se garantizó la entrega equitativa de once unidades por cada insumo crítico de seguridad, incluyendo camisas, cascos, gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo (ver Tabla 14).

Asimismo, se gestionó oportunamente la reposición por desgaste de los EPP en frente de trabajo, registrando el suministro de guantes de vaqueta, gafas oscuras y tapabocas (ver Tabla 15), asegurando la continuidad de las operaciones bajo condiciones seguras.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PANTALON	30 UNIDADES

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

BOTAS CAUCHO	30 PARES
IMPERMEABLE	28 UNIDADES
CAMISA	41 UNIDADES
CASCO	39 UNIDADES
GAFAS OSCURAS	38 UNIDADES
GUANTES DE VAQUETA	41 UNIDADES
GUANTES DE NITRILO	11 UNIDADES

Tabla 14. *Relación Dotación entregada al personal de Ingreso*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
GUANTES DE VAQUETA	48 UNIDADES
GAFAS OSCURAS	14 UNIDADES
TAPABOCAS	24 UNIDADES
TAPAOÍDOS	16 UNIDADES

Tabla 15. *Relación EPP entregados al personal en Obra*

Se observa una alta tasa de reposición en los guantes de vaqueta durante el periodo. Esto es técnicamente normal y esperado en actividades de construcción de andenes peatonales estampados, debido a la continua manipulación de agregados, formaletas pesadas y herramientas manuales.

3.7.2. INSPECCIONES REALIZADAS

En lo referente al control operacional, la interventoría realizó el seguimiento a las inspecciones periódicas del uso de EPP. Se destaca que, en términos generales, se tiene como novedad permanente la presencia de personal laborando sin la camisa de dotación; no obstante, tras las acciones correctivas implementadas por el CONSORCIO PEATONES CEL, no se reportaron reincidencias ni novedades en los ciclos de inspección posteriores.

Por último, la última semana del mes, se auditó el estado y suministro del botiquín ubicado en el almacén de obra, dictaminando un estado óptimo y sin novedades que reportar, lo cual valida el cumplimiento de los estándares de primeros auxilios requeridos para el proyecto.

Para el periodo correspondiente, se realizan las siguientes inspecciones a los elementos de protección personal:

INSPECCIÓN AL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
DESDE	**HASTA**	**NOVEDAD**
30-01-2026	06-02-2026	REPOSICIÓN CONTINUA DE GUANTES

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

06-02-2026	14-02-2026	REPOSICIÓN CONTINUA DE GUANTES
14-02-2026	21-02-2026	SOLICITUD USO DE EPP's
23-02-2026	02-03-2026	NINGUNA
06-03-2026	13-03-2026	NINGUNA
13-03-2026	21-03-2026	NINGUNA
21-03-2026	28-03-2026	NINGUNA
28-03-2026	04-04-2026	NINGUNA
10-04-2026	17-04-2026	PERSONAL SIN USO DE CAMISA
17-04-2026	24-04-2026	NINGUNA
24-04-2026	04-05-2026	NINGUNA
04-05-2026	09-05-2026	NINGUNA
09-05-2026	16-05-2026	NINGUNA
16-05-2026	23-05-2026	NINGUNA
26-05-2026	01-06-2026	NINGUNA

Tabla 16. *Relación inspecciones de EPP realizadas*

INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUÍN		
FECHA	**UBICACION**	**NOVEDAD**
30-03-2026	Almacén	NINGUNA
25-04-2026	Almacén	NINGUNA
25-05-2026	Almacén	NINGUNA

Tabla 17. *Inspección Botiquín*

INSPECCIÓN DE EXTINTOR		
FECHA	**UBICACION**	**FECHA VENCIMIENTO RECARGA**
30-03-2026	Almacén	07-2027
25-04-2026	Almacén	07-2027
25-05-2025	Almacén	07-2027

Tabla 18. *Inspección Extintor*

3.7.3. CONTROL OPERACIONAL, INSPECCIONES PREOPERACIONALES Y PERMISOS DE ALTO RIESGO

Como parte de los protocolos de aseguramiento de calidad y seguridad industrial exigidos por esta interventoría, se constató la implementación y diligenciamiento diario de las inspecciones preoperacionales para la maquinaria menor e instrumental crítico empleado en la fundición y acabado de los andenes peatonales estampados. Específicamente, se verificaron y avalaron las hojas de control preoperacional para la mezcladora, el vibrador de concreto y la cortadora de mano de pavimento, garantizando que los sistemas

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

mecánicos, eléctricos y de guarda se encontraran en condiciones óptimas antes del inicio de cada jornada, mitigando así fallas técnicas o accidentes en el frente de trabajo.

Asimismo, para las actividades que involucraron riesgos significativos, se auditó la gestión preventiva en campo mediante las siguientes herramientas de control:

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS): Diligenciados en sitio por el personal operativo y aprobados por el supervisor SST de la obra, asegurando la identificación previa de peligros (atrapamientos, posturas ergonómicas, proyección de partículas) y la aplicación de sus respectivas medidas de control.

PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE: Emitidos de manera estricta para las actividades de corte de pavimento asfáltico o juntas de dilatación con la cortadora de mano. Se verificó el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos, el uso de elementos de protección facial y respiratoria, y la delimitación del área para evitar la afectación de peatones o terceros.

La interventoría destaca que la documentación técnica reposa en los archivos de obra y cumple con los estándares contractuales exigidos para el proyecto.

FECHA DE REGISTRO	TIPO DE INSPECCIÓN	EQUIPO / ACTIVIDAD EVALUADA	ESTADO DE OPERACIÓN	VISTO BUENO INTERVENTORÍA
26/01/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
30/01/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
31/01/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
02/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
03/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
03/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
04/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
05/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
05/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
06/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
06/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
07/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
09/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
09/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
10/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
10/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
11/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
11/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
11/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
11/02/2026	Análisis de Trabajo Seguro	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

	Permiso de Trabajo en Caliente			
12/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
12/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
13/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
13/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
14/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
14/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
16/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
16/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
16/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
16/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
16/02/2026	Análisis de Trabajo Seguro Permiso de Trabajo en Caliente	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI
17/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
17/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
17/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
17/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
18/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
18/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
18/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
19/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
19/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
19/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
19/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
20/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
20/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
20/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
20/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
21/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
21/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
21/02/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
23/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
23/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
23/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
23/02/2026	Análisis de Trabajo Seguro Permiso de Trabajo en Caliente	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI
24/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
24/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
25/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
25/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
25/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
26/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
26/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
26/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
27/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
27/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
27/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

28/02/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
28/02/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
28/02/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
02/03/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
04/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
05/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
05/03/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
05/03/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
05/03/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
06/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
06/03/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
07/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
10/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
11/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
11/03/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
11/03/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
12/03/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
13/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
16/03/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
16/03/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
16/03/2026	Inspección Preoperacional	Motosierra	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
16/03/2026	Análisis de Trabajo Seguro Permiso de Trabajo en Caliente	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI
17/03/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
17/03/2026	Inspección Preoperacional	Motosierra	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
24/03/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
24/03/2026	Análisis de Trabajo Seguro Permiso de Trabajo en Caliente	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI
25/03/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
26/03/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
26/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
26/03/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
27/03/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
27/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
27/03/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
28/03/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
28/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
28/03/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
28/03/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
29/03/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
06/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
07/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
07/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
08/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
08/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
09/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
09/04/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

09/04/2026	Análisis de Trabajo Seguro Permiso de Trabajo en Caliente	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI
10/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
10/04/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
10/04/2026	Análisis de Trabajo Seguro Permiso de Trabajo en Caliente	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI
11/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
13/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
15/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
15/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
16/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
16/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
17/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
17/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
18/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
21/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
21/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
22/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
22/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
23/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
23/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
24/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
24/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
27/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
27/04/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
27/04/2026	Análisis de Trabajo Seguro Permiso de Trabajo en Caliente	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI
28/04/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
28/04/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
04/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
04/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
04/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
05/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
05/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
06/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
06/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
06/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
07/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
07/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
07/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
08/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
08/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
09/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
11/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
11/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
11/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

11/05/2026	Análisis de Trabajo Seguro Permiso de Trabajo en Caliente	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI
12/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
12/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
12/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
13/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
13/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
13/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
14/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
14/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
15/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
15/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
15/05/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
16/05/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
16/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
17/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
19/05/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
19/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
20/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
20/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
21/05/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
21/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
21/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
20/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
22/05/2026	Inspección Preoperacional	Planta Eléctrica	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
22/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
22/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
23/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
23/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
23/05/2026	Inspección Preoperacional	Vibrador de Concreto	Operativo – Limpieza de manguera de acople	SI
25/05/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
25/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
25/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
25/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
25/05/2026	Análisis de Trabajo Seguro Permiso de Trabajo en Caliente	Corte de juntas de dilatación	Autorizado – Extintor PQS vigente	SI
26/05/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
26/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
26/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
26/05/2026	Inspección Preoperacional	Minicargador	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
27/05/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
27/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
27/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
28/05/2026	Inspección Preoperacional	Cortadora de pavimento	Operativo – Disco de diamante verificado	SI
28/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI
28/05/2026	Inspección Preoperacional	Mezcladora de Concreto	Operativo – Sin Novedades Críticas	SI

Tabla 19. *Plantilla de Tabla de Control Operacional*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

4. INFORME DE INTERVENTORÍA

4.1. REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2594 DE 2025

4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se conforma con SIETE tramos de vías que van a generar DOS senderos peatonales principales entre la comunidad de Nuevo Jardín hacia la comunidad de Santa Sofia y la interconexión del nuevo puente en concreto peatonal entre la ribera del río Amazonas y las comunidades Nuevo Jardín / Santa Sofia. Con estas nuevas vías a construir con recursos de la nación (FSSG 2023) se verán beneficiadas ambas comunidades con un alcance total de 1782 ml x 2.86ml de ancho (incluye bordillo y cunetas), tal como se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	CANT.	DIMENSIONES		M2
		LARGO	ANCHO	
VÍA COMUNIDAD NUEVO JARDÍN	1	318,00	2,86	909,48
VÍA ACCESO PRINCIPAL	1	250,00		715,00
VÍA MALOKA	1	270,00		772,20
VÍA A LA ESCUELA COMUNITARIA	1	371,00		1.061,06
VÍA A PUESTO DE SALUD	1	214,00		612,04
VÍA CENTRAL – IGLESIA	1	246,00		703,56
VÍAS INTERNAS – INTERSECCIONES	1	91,00		260,26
TOTAL	**7**	**1760,00**		**5.034,00**

Tabla 20. *Tramos a intervenir*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

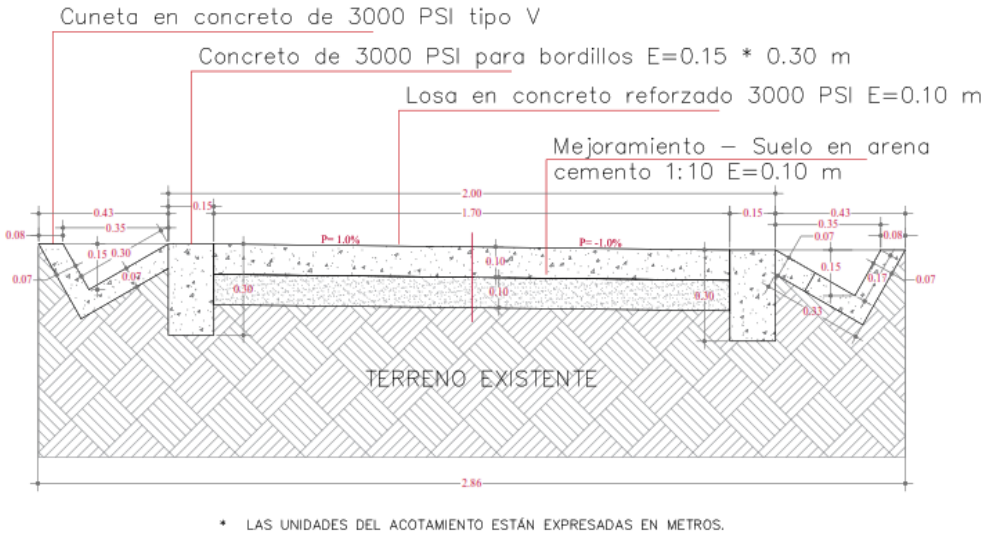


Imagen 1. *Corte transversal anden*

4.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO



Imagen 2. *Ubicación del Proyecto*

La comunidad de Santa Sofía, se encuentra ubicada a 35 Km del municipio de Leticia, departamento de Amazonas, con coordenadas Latitud 4° 0′ 21″ sur y Longitud 70° 7′ 59″ oeste.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.1.3. SEGUIMIENTO DE LAS PÓLIZAS

El contrato de obra No. 2594 de 2025 se encuentra amparado por las siguientes pólizas, la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21 – 44 – 101484742, Anexo 0 y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21 – 40 – 101265750, Anexo 0, expedidas por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., las cuales se encuentran activas y vigentes a la fecha de presentación del informe, aprobadas por medio de la resolución No. 0121 del 13 de noviembre de 2025:

RESOLUCION No. 0121 del 13-11-2025						
AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	10/11/2025	30/04/2026	$ 711.156.196,60	20%	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	21-44-101484742	10/11/2025	30/04/2026	$ 1.777.890.491,50	100%	
PAGO SALARIOS	21-44-101484742	10/11/2025	30/12/2028	$ 177.789.049,15	5%	
ESTABILIDAD Y CALIDAD	21-44-101484742	30/12/2025	30/12/2030	$ 355.578.098,30	10%	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	21-40-101265750	10/11/2025	30/12/2025	$ 569.400.000,00	400 SMMLV	

Tabla 21. *Pólizas iniciales Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

Teniendo en cuenta que, el contrato de obra estuvo suspendido, se tuvo que realizar una actualización a las pólizas del contrato al momento de dar reinicio al mismo. De la misma forma, por medio del otrosí No. 02 se prorrogó por un término de 04 meses y 10 días, por lo cual se procedió a realizar nuevamente la actualización de las garantías, las cuales fueron aprobadas el día 21 de febrero de 2026.

AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	10/11/2025	04/06/2026	$ 711.156.196,60	20%	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	21-44-101484742	10/11/2025	04/06/2026	$ 1.777.890.491,50	100%	
PAGO SALARIOS	21-44-101484742	10/11/2025	04/02/2029	$ 177.789.049,15	5%	
ESTABILIDAD Y CALIDAD	21-44-101484742	30/12/2025	30/12/2030	$ 355.578.098,30	10%	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	21-40-101265750	10/11/2025	30/12/2025	$ 569.400.000,00	400 SMMLV	

Tabla 22. *Pólizas Reinicio Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

RESOLUCIÓN No. 0021 del 21-02-2026						
AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	10/11/2025	15/10/2026	$ 711.156.196,60	20%	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	21-44-101484742	10/11/2025	15/10/2026	$ 1.777.890.491,50	100%	
PAGO SALARIOS	21-44-101484742	10/11/2025	15/06/2029	$ 177.789.049,15	5%	
ESTABILIDAD Y CALIDAD	21-44-101484742	30/12/2025	30/12/2030	$ 355.578.098,30	10%	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	21-40-101265750	10/11/2025	04/02/2026	$ 569.400.000,00	400 SMMLV	

Tabla 23. *Pólizas Otrosí No. 2 Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

4.1.4. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y DEBIDOS PROCESOS

En el periodo comprendido entre el 26 de enero al 28 de mayo de 2026, no se realizaron llamados de atención al personal, ni se ha presentado situación que haya requerido un debido proceso, teniendo en cuenta que se encuentran en ejecución las actividades por parte del Contratista CONSORCIO PEATONES CEL.

4.1.5. PERSONAL EN OBRA

A continuación, se lista el personal presente en la obra durante el periodo reportado, de acuerdo a la oferta presentada durante la etapa precontractual.

4.1.5.1. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y PAGO DE SEGURIDAD

Esta interventoría avala y certifica que el contratista CONSORCIO PEATONES CEL, en virtud del contrato de Obra No. 2594 de 2025, presenta los soportes de afiliación del personal de acuerdo a lo pactado contractualmente para cada uno de los profesionales relacionados a continuación, para el periodo que abarca este informe del 23 de enero al 28 de mayo de 2026.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	% DEDICACIÓN
OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	1.032.364.610	ING. DIRECTOR DE OBRA	100 %
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	1.147.686.840	ING. RESIDENTE DE OBRA	100 %
MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS	51.809.026	ESPECIALISTA EN PAVIMENTO	10 %
JAIME ALBERTO CASTRO RENGIFO	80.768.573	INGENIERO AMBIENTAL	100%
ARLEY LEONOR DUARTE AMAYA	56.056.223	TRABAJADOR SOCIAL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	100%
JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	1.094.940.910	TOPOGRAFO	10 %

Tabla 24. *Profesionales Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

De igual manera, la interventoría se permite certificar y avalar que el personal operativo de obra relacionado a continuación, cuenta con la afiliación y los soportes de afiliación de seguridad social se anexa en el presente informe, junto con la documentación pertinente entregada por el contratista CONSORCIO PEATONES CEL.

No.	NOMBRE	No IDENTIFICACIÓN	CARGO	ACTIVO		FECHA INGRESO
				SI	NO	
1.	JAIR ANDREY GONZALEZ HENAO	93.400.332	MAESTRO DE OBRA	X		26/01/2026
2.	CARLOS ANDRES PARRA CAMELO	1.118.121.309	OFICIAL	X		26/01/2026
3.	EMEL DARIO CHAMORRO SAMPAYO	1.006.784.374	OFICIAL		X	31/03/2026
4.	YOLVER REVELO LEON	1.121.211.864	OFICIAL	X		03/02/2026
5.	DAVID CAHUCHI AHUANARY	6.565.823	OFICIAL	X		23/02/2026
6.	YETUR GARAY CAYETANO	1.121.200.963	AYUDANTE	X		26/01/2026
7.	CRISTIAN DAVID REVELO DIAZ	1.007.769.189	AYUDANTE	X		26/01/2026
8.	DIEGO ANDRES RAMOS VENTO	1.121.205.946	AYUDANTE	X		26/01/2026
9.	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	15.877.597	AYUDANTE	X		26/01/2026
10.	FREDY ANGEL VENTO LORENZO	1.007.366.231	AYUDANTE	X		26/01/2026
11.	MILTON RAMOS VENTO	1.121.201.303	AYUDANTE	X		26/01/2026
12.	JORGE REVELO LEON	6.566.886	AYUDANTE	X		26/01/2026
13.	ROBERTH YANCA ALMEIDA	1.147.684.486	AYUDANTE	X		03/02/2026
14.	JUAN CARLOS REVELO LEON	6.567.562	AYUDANTE	X		26/01/2026
15.	LUIS JORGE DEL AGUILA RAMOS	15.875.906	SERVICIOS GENERALES	X		26/01/2026
16.	YAISON CAHUACHE HUAHUARI	1.007.344.470	CADENERO	X		26/01/2026
17.	OMAR ROLIN ROMERO FALCON	6.566.029	OPERADOR		X	
18.	HANSEL EDRIEGUER LEONARDO REVELO	1.006.739.912	AYUDANTE	X		03/02/2026

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

19.	LISARDO WILDER CARIHUASARI CAYETANO	6.566.668	AYUDANTE		X	02/05//2026
20.	ELKIN FABRICIO YUCUNA YUCUNA	1.122.269.221	AYUDANTE	X		10/02/2026
21.	RONI PARENTE SANTOS	15.877.726	AYUDANTE	X		10/02/2026
22.	NILO MIGUEL ALMEIDA FERNANDEZ	1.121.204.626	AYUDANTE	X		10/02/2026
23.	ROBERTO JOHN CASTILLO COELLO	1.007.769.132	AYUDANTE	X		10/02/2026
24.	JHON CARLOS SANGAMA CUELLAR	1.007.682.297	AYUDANTE		X	02/05/2026
25.	WILLY CAMILO FERNANDEZ RAMOS	1.007.628.288	AYUDANTE	X		10/02/2026
26.	DIEGO NIXON RODRIGUEZ PURICHO	1.122.269.518	AYUDANTE	X		10/02/2026
27.	CRISPIN ANTONIO PEREIRA	1.006.733.322	AYUDANTE	X		10/02/2026
28.	OMAR DIEGO RAMOS CUELLAR	1.007.682.555	AYUDANTE	X		23/02/2026
29.	JORGE LUIS DEL AGUILA ROJAS	1.006.731.977	CELADOR	X		16/12/2025
30.	ALCINDO FERNANDEZ ANGARITA	1.006.739.372	AYUDANTE	X		07/04/2026
31.	FRANS FRANKLIN LEON	1.122.270.107	AYUDANTE	X		07/04/2026
32.	JAIDER FERNANDEZ ANGARITA	1.121.212.338	AYUDANTE	X		07/04/2026
33.	JUNIOR FABIAN QUINTERO MIJO	1.121.446.499	AYUDANTE	X		07/04/2026
34.	LUIS ALBERTO RAMOS	1.121.210.537	AYUDANTE	X		07/04/2026
35.	LUIS ALEJANDRO CAHUACHE GAMARRA	1.006.732.296	AYUDANTE	X		07/04/2026
36.	MARTIN FRANCISCO	1.121.446.557	AYUDANTE		X	02/05/2026
37.	OSCAR FERNANDEZ LORENZO PEDRO	1.006.739.428	AYUDANTE	X		07/04/2026
38.	VILAN JESUS GARAY CAYETANO	15.879.858	AYUDANTE	X		07/04/2026
39.	WILSON GERONIMO RAMOS ÑEÑETOFE	1.007.472.725	AYUDANTE	X		07/04/2026
40.	YEISON ALEXANDER FERNANDEZ FERNANDEZ	1.121.197.024	AYUDANTE	X		07/04/2026
41.	ADAN MURAYARI AYAMA	1.006.733.244	AYUDANTE	X		06/05/2026
42.	ALEX RAFAEL VASQUEZ TAPAYURI	1.122.702.047	AYUDANTE	X		06/05/2026
43.	ANDRES LOSADA CURICO	1.121.207.495	AYUDANTE	X		11/05/2026
44.	DIEGO MURAYARI AYAMA	1.006.733.242	AYUDANTE	X		11/05/2026
45.	DIXSON GABRIEL AYAMA YAICATE	1.131.534.434	AYUDANTE	X		11/05/2026
46.	EDGAR COELLO PINEDA	1.131.534.148	AYUDANTE	X		11/05/2026
47.	GERALD ALEXIS CHOTA PEÑA	1.122.266.252	AYUDANTE	X		11/05/2026
48.	JAIME LISANDRO PINEDA CASADO	1.121.209.556	AYUDANTE	X		11/05/2026
49.	ROY ERIK AYAMA YAICATE	1.121.199.883	AYUDANTE	X		11/05/2026

Tabla 25. *Personal Operativo de la Obra*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y la protección del talento humano del proyecto, esta interventoría realizó la auditoría correspondiente a los soportes de pago del personal de obra contratado:

RELACIÓN PERIODO SEGURIDAD SOCIAL		
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSION**	**NUMERO DE PLANILLA**
2026 – 01	2025 – 12	92520924
2026 – 02	2026 – 01	45643818
2026 – 03	2026 – 02	69543847
2026 – 04	2026 – 03	77323712
2026 – 05	2026 – 04	86822478

Tabla 26. *Relación Periodo de seguridad social Obra*

Al corte metodológico del presente informe, el CONSORCIO PEATONES CEL se encuentra dentro de los plazos legales e institucionales establecidos para el recaudo y la facturación del ciclo fiscal subsiguiente. Por consiguiente, la planilla de pago del periodo de mayo no ha sido exigida de manera perentoria, toda vez que su fecha límite de pago no ha vencido.

El CONSORCIO PEATONES CEL asumió el compromiso formal de allegar dicho soporte documental al correo de la interventoría inmediatamente se efectúe la transacción bancaria y se genere la certificación correspondiente, asegurando la continuidad del flujo de caja y la trazabilidad del control contractual.

4.1.6. VERIFICACIÓN HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES Y OTROS

La interventoría se permite avalar y certificar que las herramientas, maquinaria, equipos, instalaciones y demás, relacionados a continuación están de acuerdo a lo presentado en la oferta y a lo pactado contractualmente, en virtud del contrato de obra No. 2594 de 2025 (se anexa Control de Maquinaria y Equipo). Para la fecha, se cuenta con las herramientas y equipos en obra y, se ha hecho uso de herramienta menor y equipo para topografía y demás que se mencionan a continuación:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPO TOPOGRAFÍA			
Estación total Hi – Target	HTS – 420 R	1	BUENO

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

Trípode		1	BUENO
Bastón		2	BUENO
Prisma		2	BUENO
Radios de comunicación		2	BUENO
Sombrilla		1	BUENO
Flexómetros		2	BUENO
Decámetro		1	BUENO
Macetas		1	BUENO
Estacas		30	BUENO
Pintura		2	BUENO
Machete		1	BUENO
Serrucho		1	BUENO
EQUIPOS			
MINICARGADOR	CASE SR200 LOADER	1	BUENO
VIBROCOMPACTADOR	MAKITA M0920	1	BUENO
MEZCLADORAS	GX390	2	BUENO
PLANTA ELÉCTRICA	KOHLER PRO 5.2	1	BUENO
CORTADORA PARA CONCRETO	HUSQVARNA K770	1	BUENO
MOTOSIERRA	STIHL MS 260	1	BUENO
HERRAMIENTA MENOR			
TAPETES ESTAMPADOS		10	BUENO
FLOTA CANAL		1	BUENO
CARRETILLAS		10	BUENO
NIVELES DE MANO		3	BUENO
CIZALLA		2	BUENO
ZARANDA		2	BUENO
TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA		2	BUENO

Tabla 27. *Verificación herramientas, maquinaría, equipos y demás*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.1.7. ANEXOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
NÚMERO DE CONTRATO:	2594 DE 2025	
DATOS DEL CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA No. GOB-AMA-LP-04-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	
DATOS DEL CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CONSORCIO PEATONES CEL NIT: 902.007.682 – 7
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA C.C. 1.032.364.610
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 4623 DE 19-09-2025 RP 7229 DE 10-11-2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.555.780.983,00	
FECHA DEL CONTRATO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	23 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN 01:	05 DE ENERO DE 2026	
FECHA REINICIO 01:	26 DE ENERO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	50 DÍAS	
OTROSÍ No. 02:	04 DE FEBRERO DE 2026	
TIEMPO A PRORROGAR:	4 MESES Y 10 DÍAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	180 DÍAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE JUNIO DE 2026**	

Tabla 28. *Información contractual Obra No. 2594 de 2025*

4.2. REPORTE SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO

A continuación, se describe lo concerniente al componente técnico, ejecutado durante el periodo reportado. El día 22 de mayo de 2026, se procede a aprobar un Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, donde se relaciona un solo capítulo conformado por 17 actividades, las cuales se mencionan a continuación:

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.033,60
2	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	3.954,81
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	108,74
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	829,57
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	4.916,50
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	220,12
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,20
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15)	KL	8.777,47
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,20
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.487,00
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	1,50
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.168,34
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	1.694,00
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.033,60

Tabla 29. *Cantidades contractuales Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

4.2.1. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSTRUCTOR

Para el periodo comprendido de este informe de corte No. 02, se han realizado o desarrollado las siguientes actividades:

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 1.0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	5.033,60	533,96



Imagen 3. *Replanteo Nuevo Jardín*



Imagen 4. *Control de niveles y demarcación eje A*



Imagen 5. *Control de niveles en excavaciones*



Imagen 6. *Verificación de trazo y niveles*

DESCRIPCIÓN	La interventoría realizó el seguimiento, verificación y aprobación de los trabajos de localización y replanteo correspondientes a 533,96 m² del área del proyecto. Se procedió a confrontar los puntos de control topográfico (BM) implantados por el contratista contra los planos de diseño oficiales, verificando la correcta distribución de los ejes estructurales y niveles de excavación.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 2.0	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	3.954,81	3.954,81



Imagen 7. *Rocería en eje A entre 2 y 3*



Imagen 8. *Rocería en eje 1*



Imagen 9. *Descapote Nuevo Jardín*



Imagen 10. *Descapote en vías Nuevo Jardín*

DESCRIPCIÓN	Se realizó el seguimiento técnico y la liberación en campo de 3.954,81 m² de la actividad de rocería, descapote y limpieza. Se verificó que el contratista retirara la totalidad de la capa vegetal y suelo orgánico hasta una profundidad promedio de 0,15 m, garantizando una subrasante limpia y firme para el inicio de las obras estructurales.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 3.0	DEMOLICIÓN DE VÍAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	108,74	60,74



Imagen 11. *Placas existentes sobrepuestas en vía Nuevo Jardín*



Imagen 12. *Retiro de placas existentes*

DESCRIPCIÓN	La interventoría realizó el seguimiento y la cuantificación de 60,74m³ de demolición de vías peatonales en mal estado. Se constató que el contratista implementó las medidas de seguridad peatonal necesarias mediante el uso de señalización y senderos provisionales seguros. Asimismo, se verificó el uso de herramientas menores como barras y palas para delimitar el área, garantizando que no se afectaran los predios privados ni las zonas peatonales adyacentes. El material resultante fue retirado de la obra el mismo día de su demolición, manteniendo el espacio público libre de obstáculos y limpio.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 4.0	EXCAVACIÓN MANUAL MENOR A 0,50MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	829,57	413,66



Imagen 13. *Excavaciones eje A entre 2 y 3*



Imagen 14. *Excavación en eje 3 entre C y A*



Imagen 15. *Excavaciones en eje A entre 2 y 3*



Imagen 16. *Excavación manual en eje A*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 17. *Excavaciones frente a maloca*



Imagen 18. *Excavaciones en eje A a Puerto*



Imagen 19. *Excavaciones Nuevo Jardín*



Imagen 20. *Excavaciones eje 3 a Nuevo Jardín*

DESCRIPCIÓN	Se realizó el control técnico y la cubicación de la excavación manual menor a 0.50 m. Se verificó mediante topografía y cinta métrica que las secciones excavadas cumplieran con los anchos y profundidades de diseño, garantizando un fondo regular y firme para el desplante de las estructuras. Al ejecutarse de forma manual, se garantizó la integridad de las acometidas domiciliarias existentes en la zona de influencia.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 5.0	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL SUELO	M2
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	4.916,50	1.789,66



Imagen 21. *Nivelación y compactación eje A entre 2 y 3*



Imagen 22. *Nivelación y compactación de suelo*



Imagen 23. *Nivelación y compactación Nuevo Jardín con pisón*



Imagen 24. *Compactado eje A entre 3 y puerto*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 25. *Nivelación y compactación en Nuevo Jardín*



Imagen 26. *Compactación vías internas en Nuevo Jardín*



Imagen 27. *Nivelación en eje A*



Imagen 28. *Compactación de suelo eje A entre 2 y 3*

DESCRIPCIÓN	Esta interventoría realizó el seguimiento técnico y la aprobación de 1789,66m² de nivelación y compactación del suelo. Se verificó en campo el uso del equipo mecánico adecuado pisón de tierra manual y se controló visualmente que la superficie no presentara deformaciones ni materiales sueltos. Mediante topografía se chequearon las pendientes longitudinales y transversales, las cuales se encuentran conformes a los planos de diseño.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 6.0	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	2,00	1,00



Imagen 29. *Construcción caja sumidero en eje 1*



Imagen 30. *Excavación y canasta caja sumidero*



Imagen 31.*Formaleteo caja sumidero*



Imagen 32. *Vaciado estructura aleta*



Imagen 33. *Caja sumidero sin tapa*



Imagen 34. *Vista lateral caja sumidero*

DESCRIPCIÓN	La interventoría realizó el seguimiento técnico y la liberación de 1 caja sumidero en concreto. Se verificó en campo el correcto alineamiento de las caras internas, el espesor de los muros y la resistencia del concreto utilizado. Se constató que las tuberías de entrada y salida quedaron perfectamente empotradas y selladas a la estructura. Finalmente, se aprobó la instalación de las tapas de rejilla metálica, verificando que los niveles superiores queden enrasados perfectamente con la rasante del andén para garantizar la escorrentía pluvial y la seguridad en la zona.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 8.0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	220,12	1,46



Imagen 35. *Relleno en intersección eje A y 3*



Imagen 36. *Relleno con material e=0,10m*



Imagen 37. *Relleno en eje A entre 2 y 3*



Imagen 38. *Relleno vía a Nuevo Jardín*

DESCRIPCIÓN	Se realizó seguimiento técnico y la cubicación de 1,46 m³ de relleno con material seleccionado y compactado. Se verificó que el material utilizado fuera de tipo granular seleccionado, libre de arcillas expansivas o raíces. El proceso de extendido se controló rigurosamente en capas que no superaron los 0,051 de espesor compactado, utilizando el pisón en el perímetro para garantizar el óptimo confinamiento de las estructuras. Los niveles finales coinciden con los niveles de subrasante aprobados.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 9.0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	299,20	113,34



Imagen 39. *Extendido arena cemento en eje 3*



Imagen 40. *Extendido arena cemento eje C*



Imagen 41. *Arena cemento e=0,10m a puerto en eje B*



Imagen 42. *Arena cemento 1:10 e=0,10m*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 43. *Arena cemento en eje 3 a Nuevo Jardín*



Imagen 44. *Arena cemento eje 2 de 1 a puente*



Imagen 45. *Extendido arena cemento eje A*



Imagen 46. *Extendido arena cemento a Nuevo Jardín*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 47. *Compactado con pisón*



Imagen 48. *Extendido arena cemento 1:10 Nuevo Jardín*



Imagen 49. *Vías internas Nuevo Jardín*



Imagen 50. *Arena Cemento Nuevo Jardín 1,70m*

DESCRIPCIÓN	La interventoría realizó el control técnico y la liberación de 113,34m³ de base estabilizada en arena-cemento 1:10 con espesor de 0,10m. Se supervisó el proceso de mezclado en seco y húmedo, constatando que se cumpliera la dosificación volumétrica exigida en los pliegos de condiciones. El material fue extendido y compactado manualmente mediante pisón dentro de los tiempos técnicamente permitidos previos al fraguado inicial del ligante. Se chequearon los espesores en diferentes puntos de la sección, validando el cumplimiento del espesor mínimo 10cm y la correcta regularidad superficial de la capa.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 10.0	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5 MM (0,15*0,15)	KL
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	8.777,47	4.050,48



Imagen 51. *Instalación de malla amarre a bordillo*



Imagen 52. *Instalación malla #5*



Imagen 53. *Malla amarrada a bordillo*



Imagen 54. *Malla instalada sobre arena cemento*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 55. *Malla #5 amarrada a bordillo "S"*



Imagen 56. *Uso de panelas de concreto para recubrimiento malla*



Imagen 57. *Amarre malla y acero de refuerzo*



Imagen 58. *Instalación malla en Nuevo Jardín*

DESCRIPCIÓN	Finalizado el extendido de la base estabilizada, se realizó la inspección técnica y el recibo de 4.050,48kl de refuerzo en acero tipo concremalla de 5mm. Se verificó que el material estuviera limpio, libre de óxido excesivo, grasas o pinturas que afectaran su adherencia con el concreto. Se controló rigurosamente el amarrado de los paneles y la ejecución de traslapos mínimos. Así mismo, se dejó constancia de la instalación de distanciadores para garantizar que la malla mantenga la altura de diseño y quede embebida correctamente en la sección central del elemento durante la posterior fundición, otorgando la liberación técnica para el vaciado de concreto.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 11.0	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000PSI	M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	299,20	113,34



Imagen 59. *Vaciado de concreto 3000PSI*



Imagen 60. *Extendido de concreto con regleta*



Imagen 61. *Vaciado de concreto losa y bordillo*



Imagen 62. *Uso vibrador de concreto*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 63. *Vaciado concreto 3000PSI losa y bordillo*



Imagen 64. *Extendido de concreto 3000PSI*



Imagen 65. *Vaciado concreto 3000PSI*



Imagen 66. *Uso regleta superficial en vaciado*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 67. *Vaciado de concreto y paso de regleta*



Imagen 68. *Vaciado concreto Nuevo Jardín*



Imagen 69. *Vaciado concreto losa y bordillo a=2,00m*



Imagen 70. *Vaciado concreto 3000PSI maloca Nuevo Jardín*

DESCRIPCIÓN	La interventoría realizó el seguimiento técnico y la aprobación de 113,34m³ de concreto de 3000PSI para andenes y bordillo ejecutados en sistema monolítico. Se verificó la correcta colocación y estabilidad del formaleteado, asegurando los anchos y alturas de diseño. El proceso de vaciado se controló de manera continua para garantizar la transición monolítica entre el andén y el bordillo, aplicando vibrado mecánico para eliminar hormigueros. La superficie recibió un acabado escobillado uniforme y antideslizante, y las aristas del bordillo fueron debidamente boleadas. Se constató la aplicación inmediata de la película de curado y la ejecución oportuna de las juntas de dilatación, encontrándose los tramos recibidos en óptimas condiciones técnicas y estéticas.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 12.0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO – INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	3.520,00	1.333,40



Imagen 71. *Uso tapete para estampado*



Imagen 72. *Estampado final*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 73. *Uso pisón para estampado*



Imagen 74. *Uso mineral color rojo tipo espiga*



Imagen 75. *Vista final estampado tipo espigado*



Imagen 76. *Estampado tipo espigado color rojo*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 77. *Estampado eje C entre 1 y 3*



Imagen 78. *Estampado final en eje 3 entre B y C*



Imagen 79. *Estampado tipo espiga en Nuevo Jardín*



Imagen 80. *Estampado en vías internas Nuevo Jardín*

DESCRIPCIÓN	La interventoría realizó el seguimiento técnico y la aprobación de 1333,40m² de estampado en concreto color mineral tipo adoquín espigado. Se verificó que la incorporación del color se realizara de forma homogénea en toda el área y que los moldes se aplicaran en el tiempo de plasticidad requerido para lograr una huella nítida y uniforme. Asimismo, se controló la alineación del patrón espigado en las transiciones de los andenes. Tras el lavado técnico de la superficie y la verificación de ausencia de humedad, se autorizó la aplicación de la capa de sellante acrílico tipo lustre, constatando un acabado brillante, uniforme, libre de manchas y con excelente adherencia, dejando la zona protegida y estéticamente conforme a los requerimientos urbanísticos del proyecto.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 13.0	CONCRETO 3000PSI PARA BORDILLOS E=0,15*0,30 – INCLUYE HIERRROS DE 38000 PSI	ML
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	3.487,00	1.300,40



Imagen 81. *Vaciado en sistema monolítico losa y bordillo*



Imagen 82. *Instalación acero de refuerzo*



Imagen 83. *Excavación para bordillo*



Imagen 84. *Vaciado concreto 3000PSI losa y bordillo*

DESCRIPCIÓN	La interventoría realizó el seguimiento técnico, control de armadura y liberación de 1.300,40m² a ambos costados de la actividad de bordillos en concreto de 3000PSI con sección de 0,15x0,30m. Inicialmente, se avaló la canasta de acero de refuerzo de 38000PSI, verificando sus diámetros, espaciamientos y amarres según planos. Posteriormente, se inspeccionó el correcto alineamiento y plomada del formaleteado. Durante el vaciado, se controló la manejabilidad del concreto y el vibrado mecánico. Se verificó la aplicación de la película de curado y la ejecución oportuna de las juntas de contracción, recibiéndose el tramo a entera satisfacción.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 15.0	CONCRETO 3000PSI PARA CUNETAS ALL EN “V” E=0,07MTS	ML
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
	3.168,34	501,77



Imagen 85. *Extendido de arena cemento*



Imagen 86. *Instalación formaleta para cuneta ambos costados*



Imagen 87. *Vista sección de cuneta*



Imagen 88. *Vaciado de concreto para cuneta ambos costados*

DESCRIPCIÓN	Se verificó visual y topográficamente que la sección en “V” mantuviera el espesor mínimo de 0,07m y que la pendiente longitudinal fuera la adecuada para evitar el empozamiento de agua. Se realizó el control del asentamiento del concreto en estado fresco y se tomaron los cilindros de prueba correspondientes para verificar la resistencia de 3000PSI a los 28 días. La actividad se midió y recibió a satisfacción por metro lineal, conforme a las secciones reales ejecutadas en campo.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.2.2. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONSTRUCTOR

En el presente informe, se presenta una breve descripción de las actividades ejecutadas durante la ejecución del periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de mayo de 2026, a las cuales se les realizó seguimiento y verificación para su correcta ejecución, cumpliendo las especificaciones técnicas y procesos constructivos. En ellas se han ejecutado actividades para preparar y mejorar el terreno, tales como la localización y replanteo, rocería y descapote, excavaciones manuales menores a 0,50m, demolición de placas existentes, seguidamente de nivelación y compactación de terreno e instalación de base estabilizada 1:10 con un espesor de 10cm.

Actividades previas para dar inicio a las actividades de fundición de la siguiente forma: instalación de acero de refuerzo concremalla #5, vaciado de concreto para pavimento y bordillo de 3000PSI y estampado en concreto color mineral tipo espigado. Se ha dado inició al vaciado de concreto 3000PSI para cuneta de acuerdo a las especificaciones técnico y diseños para obtener un ancho total de 2,86m.

Igualmente, se realizaron actividades adiciones que no se encuentran contempladas contractualmente, pero son necesarias para la correcta ejecución del proyecto como lo es el cerramiento en lona verde a tramos para evitar el paso peatonal de la población y animales, carpas temporales para no ser interrumpidas las actividades de vaciado de concreto ante la presencia de lluvias, trasiego de materiales desde el puerto a los puntos de acopio y construcción de panelas (calzas) de concreto para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo.

4.2.3. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA

De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría a la programación del contrato de obra No. 2594 de 2025, en el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de mayo de 2026. La interventoría evidencia que se a la fecha se viene ejecutando según lo programado las actividades en los tiempos y cantidades establecidas.

Al corte del presente informe, el proyecto acumula un tiempo de ejecución transcurrido de 163 días, registrando un avance físico real del **80,65%**. La programación evaluada corresponde al acumulado hasta el Mes 06, escenario en el cual se evidencia un retraso respecto al cronograma del 13,99%.

Con el objetivo de mitigar este impacto técnico y recuperar la holgura en la ruta crítica, el contratista implementó las siguientes acciones correctivas de choque:

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

- ✓ ***Optimización Logística***: Se adquirió e incorporó al frente de trabajo un vehículo tipo motocarga, agilizando de manera sustancial las actividades de trasiego interno de agregados, cemento y formaletas en zonas de difícil acceso peatonal.
- ✓ ***Reincorporación de Maquinaria:*** Se reactivó la operación en campo del minicargador de obra, el cual se encuentra nuevamente operativo al 100% de su capacidad mecánica.
- ✓ ***Aumento en el personal operativo:*** Se incorporó al proyecto un total de 9 ayudantes de obra, con el fin de adelantar las actividades rezagadas y disminuir la brecha de retraso de acuerdo al cronograma de actividades.

La combinación de estas herramientas de transporte y cargue mecanizado permitirá incrementar el rendimiento en el rendimiento diario de la excavación y el extendido de concreto, proyectando equilibrar el balance de las actividades rezagadas y estabilizar la curva programada durante el periodo correspondiente.

SEGUIMIENTO PORCENTUAL DEL CONTRATO No. 2594 DE 2025							
SEMANA	13 NOV - 30 NOV	01DIC - 22DIC	26ENE-28FEB	01MAR-31MAR	01ABR-30ABR	01MAY-31MAY	01JUN-15JUN
MES	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**
PROGRAMA ACUMULADO	1,28%	47,80%	48,33%	52,26%	72,51%	94,64%	100,00%
PROGRAMADO	1,28%	46,52%	0,53%	3,93%	20,25%	22,14%	5,36%
EJECUTADO ACUMULADO	1,28%	47,80%	48,33%	50,14%	54,42%	**80,65%**	
EJECUTADO	1,28%	46,52%	0,53%	1,81%	4,28%	26,23%	
ADELANTO O ATRASO	0,00%	0,00%	0,00%	-2,12%	-18,09%	-13,99%	

Tabla 30. *Seguimiento mensual Programación de Obra*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

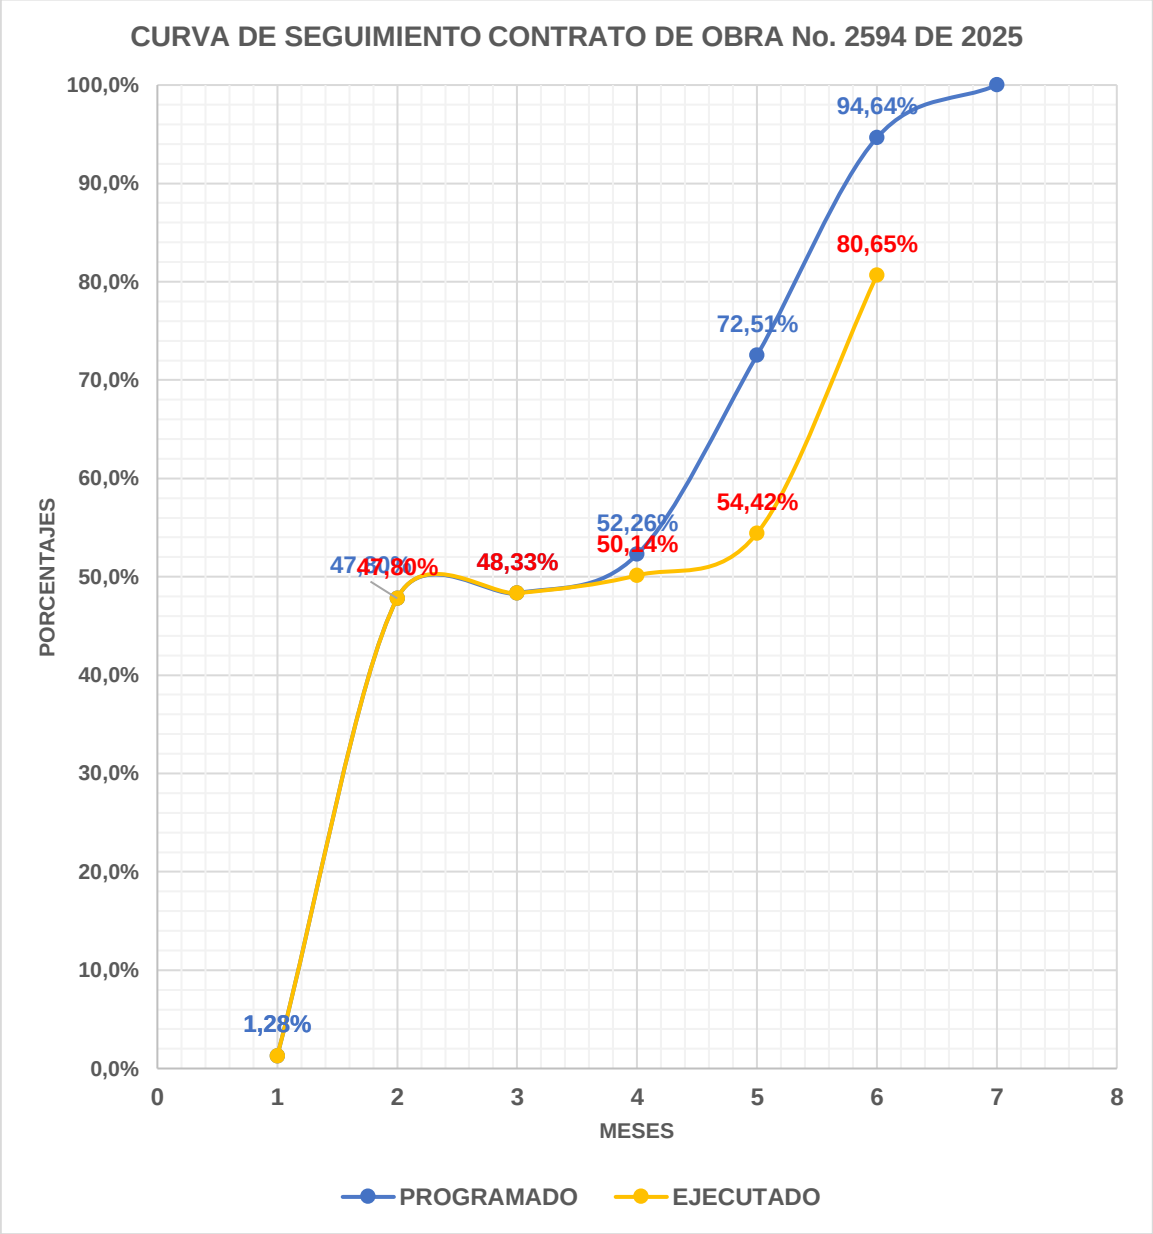


Ilustración 1. *Curva de seguimiento Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						FEBRERO 2026				MARZO 2026			
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$ 10.139,00	$ 51.039.726,00		$ 1.083.579,26	$ 1.083.579,26	$ 1.083.579,26	$ 1.083.579,26	$ 1.083.579,26		
2,0	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$ 2.535,00	$ 12.292.215,00	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67
3,0	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$ 108.293,00	$ 8.663.440,00					$ 693.075,20	$ 693.075,20	$ 693.075,20	$ 693.075,20
4,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$ 105.559,00	$ 56.474.065,00		$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45
5,0	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$ 16.703,00	$ 84.082.902,00			$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69
6,0	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00								
7,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00								
8,0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$ 115.004,00	$ 28.981.008,00								$ 766.846,67
9,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$ 1.608.146,00	$ 480.835.654,00							$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03
10,0	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$ 21.577,00	$ 174.946.316,00								$ 7.690.571,87
11,0	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$ 2.867.009,00	$ 857.235.691,00								$ 32.437.053,13
12,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00								$ 5.242.395,44
13,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$ 234.100,00	$ 802.494.800,00								$ 29.061.174,00
14,0	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40	$ 3.382.951,00	$ 8.119.082,40								
15,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$ 237.851,00	$ 815.353.228,00								
16,0	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$ 13.412,00	$ 13.371.764,00								
17,0	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$ 2.357,00	$ 11.865.138,00								
SUBTOTAL					$ 3.555.780.983,00								
TOTAL OBRAS					$ 3.555.780.983,00	$ 1.365.801,67	$ 3.706.485,38	$ 6.892.018,07	$ 6.892.018,07	$ 7.585.093,27	$ 7.585.093,27	$ 24.695.917,04	$ 99.893.958,14
						$ 18.856.323,19				$ 139.760.061,73			

Gráfica 1. *Programación Actual Contrato de Obra No. 2594 de 2026*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ABRIL 2026				MAYO 2026			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$ 10.139,00	$ 51.039.726,00								
2,0	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$ 2.535,00	$ 12.292.215,00	$ 1.365.801,67							
3,0	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$ 108.293,00	$ 8.663.440,00	$ 693.075,20							
4,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$ 105.559,00	$ 56.474.065,00	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45					
5,0	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$ 16.703,00	$ 84.082.902,00	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69				
6,0	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00	$ 3.206.430,00							
7,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00		$ 8.427.204,00						
8,0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$ 115.004,00	$ 28.981.008,00	$ 766.846,67	$ 766.846,67	$ 766.846,67	$ 766.846,67				
9,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$ 1.608.146,00	$ 480.835.654,00	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03
10,0	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$ 21.577,00	$ 174.946.316,00	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87
11,0	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$ 2.867.009,00	$ 857.235.691,00	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13
12,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44
13,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$ 234.100,00	$ 802.494.800,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00
14,0	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40	$ 3.382.951,00	$ 8.119.082,40	$ 4.059.541,20	$ 4.059.541,20						
15,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$ 237.851,00	$ 815.353.228,00		$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50
16,0	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$ 13.412,00	$ 13.371.764,00				$ 2.228.627,33	$ 2.228.627,33	$ 2.228.627,33	$ 2.228.627,33	$ 2.228.627,33
17,0	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$ 2.357,00	$ 11.865.138,00								
SUBTOTAL					$ 3.555.780.983,00								
				TOTAL OBRAS	$ 3.555.780.983,00	$ 107.159.929,34	$ 212.240.979,98	$ 199.754.234,78	$ 200.725.757,66	$ 196.773.378,30	$ 196.773.378,30	$ 196.773.378,30	$ 196.773.378,30
						$ 719.880.901,75				$ 787.093.513,18			

Gráfica 2. *Programación Actual Parte II Contrato de Obra No. 2594 de 2026*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						JUNIO 2026			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$ 10.139,00	$ 51.039.726,00				
2,0	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$ 2.535,00	$ 12.292.215,00				
3,0	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$ 108.293,00	$ 8.663.440,00				
4,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$ 105.559,00	$ 56.474.065,00				
5,0	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$ 16.703,00	$ 84.082.902,00				
6,0	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00				
7,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00				
8,0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$ 115.004,00	$ 28.981.008,00				
9,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$ 1.608.146,00	$ 480.835.654,00				
10,0	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$ 21.577,00	$ 174.946.316,00	$ 7.690.571,87			
11,0	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$ 2.867.009,00	$ 857.235.691,00	$ 32.437.053,13			
12,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	$ 5.242.395,44			
13,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$ 234.100,00	$ 802.494.800,00	$ 29.061.174,00			
14,0	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40	$ 3.382.951,00	$ 8.119.082,40				
15,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$ 237.851,00	$ 815.353.228,00	$ 101.919.153,50			
16,0	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$ 13.412,00	$ 13.371.764,00	$ 2.228.627,33			
17,0	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$ 2.357,00	$ 11.865.138,00	$ 11.865.138,00			
SUBTOTAL					$ 3.555.780.983,00				
				TOTAL OBRAS	**$ 3.555.780.983,00**	**$ 190.444.113,27**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
						$ 190.444.113,27			

Gráfica 3. *Programación Actual Parte III Contrato de Obra No. 2594 de 2026*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS

Para el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de mayo de 2026, se desarrollaron los siguientes comités técnicos entre el contratista de obra y la interventoría:

ACTA No.	FECHA	TEMAS TRATADOS
02	30-01-2026	Gestión de contingencias
03	06-02-2026	Definir medidas de mitigación para garantizar movilidad peatonal y evaluar el aprovechamiento de materiales de demolición (RCD) ante la presencia de la ola invernal.
04	13-02-2026	Evaluar el avance semanal de ejecución bajo medidas de contingencia climática, verificar la calidad de las obras y el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.
05	20-02-2026	Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas en la semana, coordinar logística para la jornada electoral y definir ajustes técnicos en el acceso a la iglesia.
06	27-02-2026	Realizar balance de cierre mensual, evaluar la calidad de los acabados y establecer medidas preventivas de seguridad en zonas escolares.
07	06-03-2026	Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas en la semana e intervención en eje 1.
08	13-03-2026	Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas en la semana.
09	20-03-2026	Evaluar el avance semanal de ejecución bajo medidas de contingencia climática, verificar la calidad de las obras y el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.
10	27-03-2026	Evaluar el avance mensual, verificación de cantidades de obra y calidad de obras. Programación de actividades para semana santa
11	01-04-2026	Presentación y aprobación de equipo de trabajo obra e interventoría Estado del proyecto y empalme
12	07-04-2026	Seguimiento al cronograma y plan de contingencia por Semana Santa Reporte de ingreso de personal operativo Balance de la visita de la comisión oficial (Min Transporte, Contraloría y Supervisión)
13	18-04-2026	Reporte de logística y suministro de materiales Avance en los frentes de excavaciones y replanteo Seguimiento a fundiciones de concreto Definición de prioridades técnicas: Andenes VS cunetas y sellado

Tabla 31. *Relación Actas de Comité 2026*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

A su vez se desarrolló un comité técnico en presencia del contratista de obra, interventoría y supervisión durante el mes de abril de 2026:

ACTA No.	FECHA	TEMAS TRATADOS
2	28-04-2026	Contextualización de avance mensual y verificación de procesos constructivos. Informe de estado de frentes de excavaciones y rellenos (Nuevo Jardín y ejes A y 3) Reporte de fundiciones y avance por ejes 1, A, B y C. Evaluación del rendimiento del personal de refuerzo. Recorrido de campo y verificación de calidad de obras.

Tabla 32. *Relación Actas de Comité Técnico 2026*

Así mismo, se relaciona la correspondencia enviada y recibida entre CONSORCIO PEATONES CEL y la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.:

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
02-01-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	TANIA MARÍA SANZ ROSERO DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–011. Remisión informe de Interventoría No. 2.
03-01-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2025-008. Ampliación a la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 2594-2025.
03-01-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	JHONY FERNEY PINTO SERAFIN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)	Oficio ISF–012. Aprobación solicitud ampliación a suspensión.
27-01-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-011. Solicitud prorroga.
27-01-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–013. Aprobación solicitud prorroga.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

27-01-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–014. Solicitud prorroga No.1.
02-02-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-012. Entrega póliza reinicio.
02-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–015. Remisión pólizas para aprobación.
03-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–016. Solicitud aprobación de pólizas.
06-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–017. Solicitud aprobación de pólizas.
06-02-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-013. Entrega pólizas Otrosí No. 02.
09-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–018. Remisión pólizas para aprobación.
16-02-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-014. Entrega de pólizas de acuerdo a observaciones.
16-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–020. Remisión pólizas de acuerdo a observaciones.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

23-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–021. Solicitud estado actual trámite de aprobación de pólizas.
09-02-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-015. Entrega de programación oficial Otrosí.
11-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–022. Aprobación Programación de Obra.
03-03-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-017. Entrega de informe mensual de Febrero 2026.
06-03-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–023. Remisión informe de interventoría No. 3.
17-03-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-019. Entrega de Anális de Precios Unitarios (APU).
18-03-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–024. Remisión APU's contractuales.
01-04-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-022. Solicitud aprobación y cambio de perfil profesional
04-04-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	Oficio ISF–026. Respuesta a oficio CPC-OF-2026-022.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

09-04-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-021. Entrega de informe mensual de marzo 2026.
10-04-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–025. Remisión informe de interventoría No. 4.
18-04-2026	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio 720 – 2522. Solicitud de información de aprobación de los perfiles profesionales y técnicos para el desarrollo del contrato de obra No. 2594 de 2025 y pago de seguridad social
27-04-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–027. Respuesta a oficio 720 – 2522 del 20 de abril de 2026.
15-05-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF-028. Remisión informe de interventoría No. 5 15-05-2026.
19-05-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-023. Entrega y solicitude de aprobación del Blance de Mayores y Menores Cantidades de Obra # 1.
22-05-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF-029. Aprobación mayores y menores cantidades de obra

Tabla 33. *Relación correspondencia enviada y recibida*

4.2.5. ANÁLISIS UNITARIOS NO PREVISTOS APROBADOS EN EL PERIODO

No se tienen actividades no previstas aprobadas por parte de la entidad contratante a la fecha.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.2.6. COMPONENTE CALIDAD

4.2.6.1. INSPECCIÓN Y REPORTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN OBRA

Durante la ejecución de las actividades realizadas en el periodo que abarca este informe, se verificó la información suministrada por el CONSORCIO PEATONES CEL, se anexa certificado de calibración No. 2981 de fecha 01 de marzo de 2025 sobre el equipo Estación Total de marca HI - TARGET modelo HTS – 420 R con serial No. H242291, emitido por el Centro Autorizado de Servicio Técnico.

4.2.7. REPORTE DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD

En cumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad para la fundición de la placa contrapiso de los andenes peatonales, esta interventoría realizó el seguimiento al comportamiento mecánico del concreto de 3000 PSI, mediante el control de tres (3) muestras compuestas por tres probetas cilíndricas cada una.

Al corte del presente informe, el análisis se concentra en los resultados obtenidos para la edad de falla inicial de 7 días, registrando un concepto favorable de Cumplimiento en todos los cilindros ensayados.

MUESTRA	CILINDRO	ELEMENTO	FECHA MUESTREO	FECHA FALLADO	EDAD DE FALLO	RESISTENCIA OBTENIDA	CUMPLE / NO CUMPLE
M - 01	C – 01	Placa	05/03/2026	02/04/2026	7	1980	CUMPLE
M - 01	C – 02	Placa	05/03/2026	19/03/2026	14	2580	CUMPLE
M - 01	C – 03	Placa	05/03/2026	26/03/2026	28	3150	CUMPLE
M - 02	C – 04	Placa	12/03/2026	26/03/2026	7	2010	CUMPLE
M - 02	C – 05	Placa	12/03/2026	26/03/2026	14	2610	CUMPLE
M - 03	C – 07	Placa	19/03/2026	26/03/2026	7	1950	CUMPLE
M - 01	C – 01	Placa	08/04/2026	15/04/2026	7	1806	CUMPLE
M - 02	C – 04	Placa	16/04/2026	23/04/2026	7	2731	CUMPLE
M - 03	C – 07	Placa	23/04/2026	30/04/2026	7	3214	CUMPLE
M - 01	C – 01	Placa	14/05/2026	21/05/2026	7	2250	CUMPLE
M - 01	C – 02	Placa	14/05/2026	28/05/2026	14	2700	CUMPLE
M - 01	C – 03	Placa	14/05/2026	11/06/2026	28		
M - 02	C – 04	Placa	22/05/2026	29/05/2026	7	2310	CUMPLE
M - 02	C – 05	Placa	22/05/2026	05/06/2026	14		
M - 02	C – 06	Placa	22/05/2026	19/06/2026	28		

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

M - 03	C – 07	Placa	29/05/2026	05/06/2026	7		
M - 03	C – 08	Placa	29/05/2026	12/06/2026	14		
M - 03	C – 09	Placa	29/05/2026	26/06/2026	28		

Tabla 34. *Resultados ensayos de laboratorio*

Revisada la Tabla 34. Resultados ensayos de laboratorio, la interventoría certifica que el concreto colocado en las estructuras ("Placa contrapiso" y "Placa") cumple con las especificaciones técnicas de resistencia estructural. Los ensayos de compresión correspondientes a los meses de marzo, abril y los cortes concluidos de mayo de 2026 arrojan un cumplimiento del 100%, superando los umbrales de diseño establecidos.

Así mismo, se deja constancia de que los cilindros remanentes de los muestreos de mayo se encuentran bajo cadena de custodia y curado normativo, programados para ser fallados durante el próximo periodo según los plazos de 14 y 28 días de edad establecidos en el cronograma de control de calidad.

4.2.8. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LEGALIDAD DE SITIOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES

Durante la ejecución de las actividades realizadas en el periodo que abarca este informe, se está revisando la información suministrada por el contratista de certificación del material utilizado hasta el momento:

MATERIAL	CERTIFICADO
CONCRETE COLOR ROJO C – 140	LOTE No.13749 – 13750 – 13752 – 13753 – 13754
DESMOL CONCRETE ROJO 140	LOTE No. 7597
SELLA CONCRETE	LOTE No. 4664
CEMENTO	CHIMBORAZO HIDRAULICO TIPO GU

Tabla 35. *Relación certificados de calidad de materiales*

4.2.9. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN BITÁCORA

Se realiza el registro y anotación diaria del personal, revisión y verificación de cumplimiento de los parámetros de seguridad industrial y salud en el trabajo, condiciones climáticas, actividades ejecutadas durante el día, y revisión de la bitácora diaria en obra.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.3. REPORTE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Esta interventoría realiza el seguimiento continuo a la parte financiera y contable del proyecto bajo el contrato de interventoría No. 2604 de 2025, verificando el estado de los pagos realizados por parte de la entidad contratante, para el contrato de obra No. 2594 de 2025, contractualmente se tiene un pago inicial como ANTICIPO del proyecto por un 50% del valor del contrato y un pago por concepto de ACTA PARCIAL No. 1, correspondiente al avance ejecutado de 47,80%. En el presente informe se presenta un ACTA PARCIAL No. 2 para un avance ejecutado acumulado del 80,65%; en la siguiente tabla se evidencia lo anterior expuesto:

CONCEPTO	% PRESENTADO	VALORES PAGADOS	VLR PRESENTE ACTA	AMORTIZACION	VALOR ACUMULADO
PAGO ANTICIPO	50 %	$1.777.890.491,50			$ 1.777.890.491,50
ACTA PARCIAL No. 1	47,80 %	$1.699.746.070,00		$ 849.873.035,00	$ 849.873.035,00
ACTA PARCIAL No. 2	80,65 %		$1.168.148.068,00	$ 584.074.034,00	
				VALOR PAGADO	**$ 2.627.763.526,50**

Tabla 36. *Control estado de pagos al Contrato de obra*

La Interventoría procedió a realizar la verificación de las planillas de pago No. 92520924, No. 45643818, No. 69543847, No. 77323712 y No. 86822478 del operador MIPLANILLA, correspondiente al mes de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO de 2026. Se constató el pago oportuno de los aportes a la seguridad social (Salud, Pensión, ARL) y aportes parafiscales de los trabajadores vinculados al proyecto, cumpliendo estrictamente con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Tras confrontar el Resumen de Corte de Obra con los registros contables de la interventoría, se verifica la concordancia absoluta en los saldos, aprobando un valor neto a pagar de $584.074.034,00.

4.3.1. BALANCE DE OBRA DEL PERIODO

En el periodo de este informe se presenta un acta modificatoria de mayores y menores cantidades de obra, las cuales son presentados a continuación:

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

1. IDENTIFICACIÓN			2. CANTIDADES CONTRACTUALES			5. BALANCE MAYORES / MENORES		6. PRESUPUESTO ACTUALIZADO		
Nº	Descripción	Und	Cant. Original	VU Original	Valor Original	Δ Cantidad (+may / −men)	Valor Modificación	Cant. Vigente	VU Vigente	Valor Vigente
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$ 10.139,00	$ 51.039.726,00	-0,40	-$ 4.055,60	5.033,60	$ 10.139,00	$ 51.035.670,40
2	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$ 2.535,00	$ 12.292.215,00	-894,19	-$ 2.266.770,64	3.954,81	$ 2.535,00	$ 10.025.444,36
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$ 108.293,00	$ 8.663.440,00	28,74	$ 3.112.661,37	108,74	$ 108.293,00	$ 11.776.101,37
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$ 105.559,00	$ 56.474.065,00	294,57	$ 31.094.000,95	829,57	$ 105.559,00	$ 87.568.065,95
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$ 16.703,00	$ 84.082.902,00	-117,50	-$ 1.962.683,57	4.916,50	$ 16.703,00	$ 82.120.218,43
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00	0,00	$ -	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$ 115.004,00	$ 28.981.008,00	-31,88	-$ 3.666.286,47	220,12	$ 115.004,00	$ 25.314.721,53
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$ 1.608.146,00	$ 480.835.654,00	0,20	$ 321.629,20	299,20	$ 1.608.146,00	$ 481.157.283,20
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$ 21.577,00	$ 174.946.316,00	669,47	$ 14.445.197,34	8.777,47	$ 21.577,00	$ 189.391.513,34
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$ 2.867.009,00	$ 857.235.691,00	0,20	$ 573.401,80	299,20	$ 2.867.009,00	$ 857.809.092,80
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	0,00	$ -	3.520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$ 234.100,00	$ 802.494.800,00	59,00	$ 13.811.900,00	3.487,00	$ 234.100,00	$ 816.306.700,00
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40	$ 3.382.951,00	$ 8.119.082,40	-0,90	-$ 3.044.655,90	1,50	$ 3.382.951,00	$ 5.074.426,50
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$ 237.851,00	$ 815.353.228,00	-259,66	-$ 61.761.559,71	3.168,34	$ 237.851,00	$ 753.591.668,29
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$ 13.412,00	$ 13.371.764,00	697,00	$ 9.348.164,00	1.694,00	$ 13.412,00	$ 22.719.928,00
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$ 2.357,00	$ 11.865.138,00	-0,40	-$ 942,80	5.033,60	$ 2.357,00	$ 11.864.195,20
VALORES					**$ 3.555.780.983,40**		**$ -**			**$ 3.555.780.983,37**

Tabla 37. *Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EQUIVAL	NOVIEMBRE 2025			DICIEMBRE 2025		
							CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5033,60	$ 10.139,00	$ 51.035.670,40	1,44%	4.499,64	$ 45.621.829,68	1,28%	0,00	$ -	0,00%
2	ROCERIA SUPERFICIE,DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	3954,81	$ 2.535,00	$ 10.025.444,36	0,28%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	108,74	$ 108.293,00	$ 11.776.101,37	0,33%		$ -	0,00%	48,00	$ 5.198.064,00	0,15%
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	829,57	$ 105.559,00	$ 87.568.065,95	2,46%		$ -	0,00%	415,91	$ 43.903.020,47	1,23%
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	4916,50	$ 16.703,00	$ 82.120.218,42	2,31%		$ -	0,00%	3126,84	$ 52.227.575,11	1,47%
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00	0,09%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00	0,24%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	220,12	$ 115.004,00	$ 25.314.721,56	0,71%		$ -	0,00%	218,66	$ 25.146.774,64	0,71%
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,20	$ 1.608.146,00	$ 481.157.283,20	13,53%		$ -	0,00%	185,86	$ 298.891.623,71	8,41%
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15)	KL	8777,47	$ 21.577,00	$ 189.391.513,34	5,33%		$ -	0,00%	4543,75	$ 98.040.597,32	2,76%
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,20	$ 2.867.009,00	$ 857.809.092,80	24,12%		$ -	0,00%	185,86	$ 532.865.159,75	14,99%
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	3,89%		$ -	0,00%	2186,60	$ 85.968.365,60	2,42%
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3487,00	$ 234.100,00	$ 816.306.700,00	22,96%		$ -	0,00%	2186,60	$ 511.883.060,00	14,40%
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e=0,10mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	1,50	$ 3.382.951,00	$ 5.074.426,50	0,14%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E=0,07MTS	ML	3168,34	$ 237.851,00	$ 753.591.668,29	21,19%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	1694,00	$ 13.412,00	$ 22.719.928,00	0,64%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5033,60	$ 2.357,00	$ 11.864.195,20	0,33%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
				TOTAL OBRAS	**$ 3.555.780.983,00**	**100,00%**		**$ 45.621.829,68**	**1,28%**		**$ 1.654.124.240,60**	**46,52%**
								TOTAL ACUMULADO			**$ 1.699.746.070,28**	**47,80%**

Tabla 38. *Ejecución mensual Parte 1*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

							FEBRERO 2026			MARZO 2026		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EQUIVAL	CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5033,60	$ 10.139,00	$ 51.035.670,40	1,44%	320,62	$ 3.250.737,79	0,09%	213,74	$ 2.167.109,86	0,06%
2	ROCERIA SUPERFICIE,DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	3954,81	$ 2.535,00	$ 10.025.444,36	0,28%	2155,11	$ 5.463.206,67	0,15%	2155,11	$ 5.463.206,67	0,15%
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	108,74	$ 108.293,00	$ 11.776.101,37	0,33%		$ -	0,00%	25,60	$ 2.772.300,80	0,08%
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	829,57	$ 105.559,00	$ 87.568.065,95	2,46%	35,73	$ 3.771.313,36	0,11%	47,64	$ 5.028.417,81	0,14%
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	4916,50	$ 16.703,00	$ 82.120.218,42	2,31%	381,43	$ 6.371.065,38	0,18%	762,86	$ 12.742.130,75	0,36%
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00	0,09%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00	0,24%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	220,12	$ 115.004,00	$ 25.314.721,56	0,71%		$ -	0,00%	6,67	$ 766.846,67	0,02%
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,20	$ 1.608.146,00	$ 481.157.283,20	13,53%		$ -	0,00%	3,42	$ 5.500.000,00	0,15%
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15)	KL	8777,47	$ 21.577,00	$ 189.391.513,34	5,33%		$ -	0,00%	356,42	$ 7.690.571,87	0,22%
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,20	$ 2.867.009,00	$ 857.809.092,80	24,12%		$ -	0,00%	2,96	$ 8.500.000,00	0,24%
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	3,89%		$ -	0,00%	133,34	$ 5.242.395,44	0,15%
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3487,00	$ 234.100,00	$ 816.306.700,00	22,96%		$ -	0,00%	36,31	$ 8.500.000,00	0,24%
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e=0,10mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	1,50	$ 3.382.951,00	$ 5.074.426,50	0,14%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E=0,07MTS	ML	3168,34	$ 237.851,00	$ 753.591.668,29	21,19%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	1694,00	$ 13.412,00	$ 22.719.928,00	0,64%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5033,60	$ 2.357,00	$ 11.864.195,20	0,33%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
				TOTAL OBRAS	**$ 3.555.780.983,00**	**100,00%**		**$ 18.856.323,19**	**0,53%**		**$ 64.372.979,87**	**1,81%**
								1.718.602.393,47	**48,33%**		**$1.782.975.373,35**	**50,14%**

Tabla 39. *Ejecución mensual Parte 2*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EQUIVAL	ABRIL 2026			MAYO 2026		
							CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5033,60	$ 10.139,00	$ 51.035.670,40	1,44%	0,00	$ 48,67	0,00%	-0,40	-$ 4.055,60	0,00%
2	ROCERIA SUPERFICIE,DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	3954,81	$ 2.535,00	$ 10.025.444,36	0,28%	182,72	$ 463.206,67	0,01%	-538,14	-$ 1.364.184,90	-0,04%
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	108,74	$ 108.293,00	$ 11.776.101,37	0,33%	0,00	$ -	0,00%	35,14	$ 3.805.736,57	0,11%
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	829,57	$ 105.559,00	$ 87.568.065,95	2,46%	9,74	$ 1.028.417,81	0,03%	320,55	$ 33.836.896,50	0,95%
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	4916,50	$ 16.703,00	$ 82.120.218,42	2,31%	523,39	$ 8.742.130,75	0,25%	121,97	$ 2.037.316,42	0,06%
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00	0,09%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.603.215,00	0,05%
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00	0,24%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	220,12	$ 115.004,00	$ 25.314.721,56	0,71%	7,54	$ 866.846,67	0,02%	-12,75	-$ 1.465.746,42	-0,04%
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,20	$ 1.608.146,00	$ 481.157.283,20	13,53%	6,65	$ 10.689.099,00	0,30%	103,27	$166.076.560,49	4,67%
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15)	KL	8777,47	$ 21.577,00	$ 189.391.513,34	5,33%	1468,72	$ 31.690.571,87	0,89%	2225,34	$ 48.016.116,84	1,35%
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,20	$ 2.867.009,00	$ 857.809.092,80	24,12%	19,41	$ 55.657.890,00	1,57%	90,96	$260.786.043,05	7,33%
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	3,89%	692,91	$ 27.242.395,44	0,77%	507,15	$ 19.939.163,52	0,56%
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3487,00	$ 234.100,00	$ 816.306.700,00	22,96%	67,36	$ 15.768.900,00	0,44%	1196,73	$280.154.740,00	7,88%
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e=0,10mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	1,50	$ 3.382.951,00	$ 5.074.426,50	0,14%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E=0,07MTS	ML	3168,34	$ 237.851,00	$ 753.591.668,29	21,19%	0,00	$ -	0,00%	501,77	$119.347.447,67	3,36%
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	1694,00	$ 13.412,00	$ 22.719.928,00	0,64%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5033,60	$ 2.357,00	$ 11.864.195,20	0,33%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
				TOTAL OBRAS	**$ 3.555.780.983,00**	**100,00%**		**$ 152.149.506,88**	**4,28%**		**$932.769.249,14**	**26,23%**
								$1.935.124.880,23	**54,42%**		**$2.867.894.129,37**	**80,65%**

Tabla 40. *Ejecución mensual Parte 3*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.3.2. ANEXOS DEL COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento, control y vigilancia financiera estipuladas para la interventoría, se presenta el soporte documental y analítico correspondiente a la revisión del Acta de Cobro Parcial No. 02. Este componente certifica que las obligaciones económicas derivadas de la ejecución contractual se encuentran alineadas con los avances físicos de la obra y el marco legal vigente durante el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de mayo de 2026.

A la fecha de corte del presente informe, el estado financiero general del contrato se resume de la siguiente manera:

CONTROL DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	3.555.780.983,00
VALOR ANTICIPO 50%	$	1.777.890.491,50
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	1.699.746.070,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$	1.168.148.068,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 2	$	584.074.034,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2	**$**	**584.074.034,00**
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE OBRA		**80,65 %**

Tabla 41. *Estado financiero y contable del Contrato de Obra*

El contratista ha presentado la documentación de soporte contable, fiscal y parafiscal en debida forma. Tras la verificación detallada por parte de esta interventoría, se constata que los valores cobrados guardan estricta correspondencia con las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción en el sitio del proyecto.

Para dar constancia y soporte legal a lo anterior, se anexan al presente informe los siguientes documentos:

- Cuadro de Balance y Resumen del Corte de Obra (Acta de Cobro Parcial No. 02).
- Factura electrónica radicada por el contratista.
- Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales del periodo correspondiente.
- Cuadro de control y amortización del anticipo.
- Copia de las pólizas de seguro vigentes.
- Copia de contrato, otrosí y actas generadas en el periodo correspondiente.
- Informe de actividades y sus soportes ejecutados en el periodo.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.4. REPORTE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST DE ACUERDO CON EL PAGA (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) DEL CONTRUCTOR

El CONSORCIO PEATONES CEL y, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S., realizan el seguimiento del componente ambiental, teniendo en cuenta el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) presentado por la entidad contratante y adoptado por el contratista de obra.

4.4.1. ANEXOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

A continuación, se presenta el seguimiento y control al PAGA estipulado dentro de los estudios previos del proyecto:

<table>
<tr><th rowspan="2">PROGRAMA</th><th rowspan="2">PROYECTO</th><th colspan="2">CUMPLE</th><th rowspan="2">OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td rowspan="3">GESTIÓN DEL PROYECTO</td><td>Conformación del grupo de gestión ambiental</td><td>X</td><td></td><td>Se cuenta con un gestor ambiental y anexa el Registro Semanal de Inspección Ambiental.
Se cumple el 100% de las obligaciones cumplidas y ejecución de programas en el mes.</td></tr>
<tr><td>Capacitación y sensibilización para el personal de obra</td><td>X</td><td></td><td>Se realiza las siguientes inducciones y capacitaciones:
<table>
<tr><th>FECHA</th><th>TEMÁTICA</th></tr>
<tr><td>10-02-2026</td><td>Inducción</td></tr>
<tr><td>13-02-2026</td><td>Manejo de materiales de construcción</td></tr>
<tr><td>24-02-2026</td><td>Manejo de residuos sólidos – Orden y Aseo</td></tr>
<tr><td>04-03-2026</td><td>Manejo de materiales de construcción</td></tr>
<tr><td>18-03-2026</td><td>Manejo de residuos sólidos – Orden y aseo</td></tr>
<tr><td>14-04-2026</td><td>Manejo de residuos sólidos – Orden y aseo</td></tr>
<tr><td>22-04-2026</td><td>Manejo de materiales de construcción</td></tr>
<tr><td>12-05-2026</td><td>Manejo de residuos sólidos – Orden y aseo</td></tr>
<tr><td>26-05-2026</td><td>Manejo de materiales de construcción</td></tr>
</table>
Se cumple el 100% de las capacitaciones programadas e inducción a todo el personal que hace parte del proyecto. Se realiza inducción a 9 personas que ingresaron al proyecto.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento requerimientos legales</td><td>X</td><td></td><td>El PAGA se encuentra formulado desde su etapa previa. NO APLICAN permisos ambientales.</td></tr>
</table>

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

<table>
<tr>
<td rowspan="2">MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS</td>
<td>Manejo integral de materiales de construcción</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>El contratista cuenta con campamento y bodega, evitando exposición a la intemperie.

La mezcla de concreto se realiza mediante mezcladoras manuales evitando mezcla directa sobre el suelo.

El cemento se encuentra acopiado en estibas y recubierto con plástico.

Se anexa licencia ambiental material de arrastre importado (arena – gravilla).
La madera utilizada es suministrada por proveedores y establecimientos legales.</td>
</tr>
<tr>
<td>Señalización para el manejo ambiental en frente de obra y sitios temporales</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>Se evidencia la señalización en todos los tramos intervenidos con cinta de peligro y señalización de seguridad y medio ambiente.
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Cinta peligro x 500m</td><td>1 rollo</td></tr>
<tr><td>Señalización de seguridad y medio ambiente</td><td>10</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

	Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.	X		Cuenta con punto ecológico en el frente de obra. 
PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA	Manejo y protección de aguas superficiales	X		Se cuenta con punto de hidratación en el frente de obra.  Se evita derrames, y uso de aceites para el lavado y reparación de maquinaria en la obra. Se realiza la separación, limpieza, acopio, transporte de empaques de cemento, las cuales tienen como disposición final la empresa AMAZONAS SIN LÍMITE.   FUNDACION AMAZONAS SIN LÍMITES NIT 900.416.586-5 CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LA FUNDACIÓN AMAZONAS SIN LÍMITES, COMO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS POR LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO DE ACUERDO AL DECRETO 596 DEL 11 DE ABRIL DE 2016, CERTIFICA QUE RECIBIO DE LA ENTIDAD **CONSORCIO PEATONALES CEL** LAS CANTIDADES DETALLADAS DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES A SU VEZ CERTIFICAMOS QUE DICHOS RESIDUOS SOLIDOS SON ENTREGADOS A LAS CORRESPONDIENTES INDUSTRIAS PARA SER PROCESADOS Y CONVERTIDOS EN MATERIA PRIMA SEGÚN SU TIPO. ENTIDAD | MES | MATERIAL | PESO CONSORCIO PEATONALES CEL | Diciembre 2025 | PAPEL KRAFT | 1654 kg Enero | plástico | 0 kg Febrero | cartón | 0 kg Marzo 2026 | Archivo | 0 kg TOTAL | 1654 kg DE ACUERDO A LO ANTERIOR, SE FIRMA EL PRESENTE EN LETICIA, EL 27 DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTISEIS (2026). Atentamente, Zayda Patricia Mora Quiceno Representante Legal Fundación Amazonas Sin Límites
	Manejo de residuos líquidos domésticos e Industriales	X		Se habilita área para mantenimiento preventivo en la obra. La bodega cuenta con recipiente para la recolección de aceite quemado. Se cuenta con área para el almacenamiento y contención de combustible. 

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	X		Se cuenta con campamento, donde se acopia la maquinaria, equipos, herramientas y materiales.
	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	X		Se realizará mantenimiento rutinario de inspección por medio de formatos con el fin de controlar los mantenimientos preventivos y correctivos.
GESTIÓN SOCIAL	Atención e información a la comunidad	X		Se cuenta con punto de atención al ciudadano ubicado en la oficina administrativa. No se cuenta con solicitudes presentadas en el periodo. No se realizaron reuniones y/o socializaciones en el periodo. No es entregaron volantes en el periodo.
	Contratación mano de obra	X		Se presenta relación del personal que se encuentra en el proyecto. Se presentan soportes de las inducciones realizadas al personal nuevo (Anexo en informe SST).
	Protección al patrimonio cultural y monumentos	X		Hasta el momento no se tiene ningún elemento catalogado como patrimonio cultural o monumento.

Tabla 42. *Seguimiento al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental*

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PAGA				
COMP. EGRESO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**VALOR**	
CE – 46	30/12/2025	AUXILIAR AMBIENTAL	$	1.077.840
CE – 17	22/12/2025	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	$	29.400
		SEÑALIZACIÓN	$	150.000
		BOTELLONES PARA AGUA	$	100.000
		LONAS	$	100.100
		BOLSAS PARA LA BASURA	$	66.300
		COMPRA DE CANECAS DE COLORES	$	234.000
		RECARGA DE EXTINTOR	$	120.000
		TOTAL DICIEMBRE 2025	**$**	**1.877.640**
CE – 104	24/01/2026	PROFESIONAL AMBIENTAL	$	1.500.000
CE – 134	20/01/2026	AUXILIAR AMBIENTAL	$	1.172.830
CE – 77	09/01/2026	MADERA (VARILLON – TABLA)	$	1.536.000
CE – 120	28/01/2026	LONAS	$	150.000
		TOTAL ENERO 2026	**$**	**4.358.830**

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CE – 206	04/02/2026	PROFESIONAL AMBIENTAL	$	1.500.000
CE – 196	20/02/2026	AUXILIAR AMBIENTAL	$	966.576
CE – 154	20/02/2026	BOTIQUÍN	$	51.210
		SEÑALIZACIÓN	$	60.000
		TOTAL FEBRERO 2026	**$**	**2.577.786**
CE – 309	18/03/2026	CABO DE MADERA – RASTRILLO PLASTICO	$	8.400
		TAPAOÍDOS	$	33.000
		CINTA DE PELIGRO	$	56.000
		TAPABOCAS TERMOSELLADO	$	17.150
CE – 335	10/04/2026	PROFESIONAL AMBIENTAL	$	1.500.000
CE – 354	10/04/2026	AUXILIAR AMBIENTAL	$	1.172.830
		TOTAL MARZO 2026	**$**	**2.787.380**
CE – 457	07/05/2026	PROFESIONAL AMBIENTAL	$	2.000.000
CE – 439	07/05/2026	AUXILIAR AMBIENTAL	$	929.965
		TOTAL ABRIL 2026	**$**	**2.929.965**
		TOTAL DICIEMBRE 2025 – FEBRERO – MARZO - ABRIL 2026	**$**	**14.288.736**

Tabla 43. *Seguimiento Financiero Acumulado al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental*

RESUMEN FINANCIERO DEL PAGA		
MES	**VALOR**	
DICIEMBRE 2025	$	1.877.640
ENERO 2026	$	4.358.830
FEBRERO 2026	$	2.577.786
MARZO 2026	$	2.787.380
ABRIL 2026	$	2.929.965
TOTAL	**$**	**11.601.636**

Tabla 44. *Resumen Financiero de PAGA*

4.4.2. CONTROL DE LLUVIAS

De acuerdo al periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de mayo de 2026, El CONSORCIO PEATONES CEL y, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. hacen seguimiento a los días soleados y lluvias, especificando la fecha y horas de los eventos climatológicos, para lo cual se anexa en el presente informe.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se concluye que, durante el periodo reportado del 26 de enero al 28 de mayo de 2026, el contrato de obra No. 2504 de 2025 presenta un porcentaje de ejecución física de 80,65% sobre un periodo ejecutado. Si bien se presenta un retraso temporal del 13,99%, la implementación del plan de contingencia mediante la incorporación de nuevo personal (9 ayudantes de obra) garantizan la optimización del trabajo y proyectan la estabilización de la ruta crítica para el próximo mes.

- Las actividades constructivas ejecutadas en los 7 tramos priorizados (red vial peatonal de 1.760 ml) cumplen con los perfiles del diseño típico aprobado. Se verificó el correcto extendido de la base de suelo arena-cemento (proporción 1:10, e=0,10m, la disposición del acero de refuerzo (malla electrosoldada amarrada a bordillos y soportada sobre panelas de concreto) y el vaciado monolítico de concreto de 3.000 PSI para losas y bordillos, finalizando con un proceso controlado de estampado color rojo tipo espiga.

- El CONSORCIO PEATONES CEL implementó de manera conforme el Plan SG-SST. Se destaca el cumplimiento en las inducciones, la ejecución de 9 capacitaciones técnicas específicas y el desarrollo diario de charlas de seguridad orientadas a mitigar riesgos ergonómicos y golpes de calor. Aunque se detectaron novedades menores por el desuso temporal de la camisa de dotación, estas fueron subsanadas eficazmente sin registrarse incidentes ni accidentes de trabajo en el periodo.

- En el componente preventivo se califica como Favorable. El CONSORCIO PEATONES CEL cumple con los estándares legales mediante el suministro equitativo de EPP iniciales y de reposición, el control diario de herramientas menores (mezcladora, vibrador y cortadora) y la planeación del riesgo en tareas críticas (ATS y Permisos en Caliente). Las novedades de campo fueron corregidas eficazmente, manteniendo el indicador de accidentalidad del proyecto en cero.

- El CONSORCIO PEATONES CEL hace entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio a la resistencia a la compresión, del vaciado de concreto correspondiente al mes de abril de 2026. Los ensayos de resistencia a la compresión para el concreto de 3000 PSI de la placa contrapiso muestran un comportamiento

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

inicial satisfactorio. El 100% de las probetas falladas a la edad de 7 días cumplieron con los umbrales de resistencia esperados.

- Se constató el cumplimiento de las obligaciones parafiscales al corte metodológico utilizando la planilla MIPLANILLA del periodo vencido, encontrándose el contratista dentro de los plazos de ley para el nuevo ciclo.

- En el aspecto ambiental, persisten oportunidades de mejora respecto al acopio transitorio de material de excavación en los laterales de la vía pública.

- El material RCD proveniente de las actividades de demolición de los andenes existentes es reutilizado como parte de la estabilización y mejoramiento del paso peatonal de la comunidad. En el eje 3 entre A y B, se realiza mejoramiento de suelo con material RCD en puntos definidos, con el fin de brindar mayor estabilidad a la obra.

- El CONSORCIO PEATONES CEL realiza protección del estampado tipo espigado, por medio de lona verde, para evitar deterior por agentes externos (pisadas y tránsito de animales), garantizando que la superficie del andén mantenga su textura y niveles de diseño sin improntas no deseadas.

- La interventoría insta a supervisar con especial detalle el proceso de hidratación y curado del concreto estampado ante las altas temperaturas de la región, así como garantizar la oportunidad del corte de las juntas de dilatación para prevenir agrietamientos prematuros por contracción plástica en las losas.

- Se detectó un desgaste prematuro en el estampado frente al restaurante (casa del profesor Daniel) eje B3, por lo que se recomienda realizar la reparación técnica a la brevedad posible.

- El CONSORCIO PEATONES CEL, ha venido adelantando actividades de mejoramiento de terreno con madera y material proveniente de las excavaciones, para el paso de minicargador para trasiego de materiales.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

6. ANEXOS

Anexo 1. Formato Control de Maquinaria y Equipo

Anexo 2. Control lluvias

Anexo 3. Informe Acta Parcial No. 02 de Obra – CONSORCIO PEATONES CEL

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ANEXO 1. FORMATO CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

SINERGIA Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S. NIT. 901.730.540-6	**CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**Código:** ESPS-FO-002 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 13-NOV-2025

CONTRATO	X	**PROYECTO**		**FASE O ETAPA**	**1**	**No. FASE / ETAPA:**	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1-may** **Y EL** **30-may** **2026**

INFORME No. **5**

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL CONTRATO No. 2594 DE 2025

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP S. CONTRATO No. 2604 DE 2025

SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO TOPOGRAFÍA	X	X	X		SANTA SOFIA	REPLANTEO	
MINICARGADOR	X	X	X			VARIAS	
VIBROCOMPACTADOR	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO	
MEZCLADORA 1	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
MEZCLADORA 2	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
PLANTA ELÉCTRICA	X	X	X			VARIAS	
CORTADORA PARA CONCRETO						DILATACIÓN CONCRETO	
FLOTA CANAL	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO	
MOTOSIERRA							

Firma:

DIEGO ALEJANDRO MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SINERGIA Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S. NIT. 901.730.540-6	**CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**Código:** ESPS-FO-002 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 13-NOV-2025

CONTRATO	X	**PROYECTO**		**FASE O ETAPA**	**1**	**No. FASE / ETAPA:**	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1-abr** **Y EL** **30-abr** **2026**

INFORME No. **4**

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL CONTRATO No. 2594 DE 2025

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP S CONTRATO No. 2604 DE 2025

SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO TOPOGRAFÍA	X	X	X		SANTA SOFIA	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO	
MINICARGADOR	X	X	X			VARIAS	
VIBROCOMPACTADOR	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO	
MEZCLADORA 1	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
MEZCLADORA 2	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
PLANTA ELÉCTRICA	X	X	X			VARIAS	
CORTADORA PARA CONCRETO						DILATACIÓN CONCRETO	
FLOTA CANAL	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO	
MOTOSIERRA							

Firma:

DIEGO ALEJANDRO MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SINERGIA Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S. NIT. 901.730.540-6	**CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**Código:** ESPS-FO-002 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 13-NOV-2025

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE O ETAPA	1	No. FASE / ETAPA:	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1-mar** **Y EL** **31-mar** **2026**

INFORME No. **4**

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL CONTRATO No. 2594 DE 2025

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP S. CONTRATO No. 2604 DE 2025

SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO TOPOGRAFÍA	X	X	X		SANTA SOFIA	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO	
MINICARGADOR	X	X	X			VARIAS	
VIBROCOMPACTADOR	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO	
MEZCLADORA 1	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
MEZCLADORA 2	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
PLANTA ELÉCTRICA	X	X	X			VARIAS	
CORTADORA PARA CONCRETO						DILATACIÓN CONCRETO	
FLOTA CANAL	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO	
MOTOSIERRA	X	X	X			CORTE DE MADERA PARA FORMALETA	SE CUENTA CON PERMISOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD (CURACA)

Firma:

FREDY VALLARDO BARRERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SINERGIA Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S. NIT. 901.730.540-6	**CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**Código:** ESPS-FO-002 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 13-NOV-2025

CONTRATO	X	**PROYECTO**		**FASE O ETAPA**	1	**No. FASE / ETAPA:**	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **26-ene** **Y EL** **28-feb** **2026**

INFORME No. **3**

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL CONTRATO No. 2594 DE 2025

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP S. CONTRATO No. 2604 DE 2025

SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO TOPOGRAFÍA	X	X	X		SANTA SOFIA	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO	
MINICARGADOR	X	X	X			VARIAS	
VIBROCOMPACTADOR 1	X	X	X			FUNDICIÓN CONCRETO	
MEZCLADORA 1	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
MEZCLADORA 2	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
PLANTA ELÉCTRICA	X	X	X			VARIAS	
CORTADORA PARA CONCRETO						DILATACIÓN CONCRETO	
FLOTA CANAL	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO	

Firma:

FREDY VALLARDO BARRERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2. CONTROL LLUVIAS

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

SINERGIA Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S. NIT. 901.730.540-6	**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	Código: ESPS-FP-003 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 13-NOV-2025

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE O ETAPA	1	No. FASE / ETAPA:	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1-may** **Y EL** **30-may** **2026**

INFORME No. **5**

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL — CONTRATO No. 2594 DE 2025

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP SAS — CONTRATO No. 2604 DE 2025

SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																																		
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**				**Total**
Seco	24	24	24	24	17	22	23	23	22	23	24	24	24	24	22	24	22	24	21	23	24	24	24	24	24	23	23	24							648
Lluvias moderadas	0	0	3	0	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0							19
Lluvias intensas	0	0	8	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0							16
Total	24	24	35	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24							

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SINERGIA Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S. NIT. 901.730.540-6	**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	Código: ESPS-FP-003 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 13-NOV-2025

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE O ETAPA	1	No. FASE / ETAPA:	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1-abr** **Y EL** **30-abr** **2026**

INFORME No. **4**

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL — CONTRATO No. 2594 DE 2025

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP SAS — CONTRATO No. 2604 DE 2025

SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																																
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**					**Total**
Seco	24	24	13	24	24	22	24	24	22	23	24	24	24	24	24	24	22	22	24	23	21	22	24	24	24	24	23	16	24	24					685
Lluvias moderadas	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	3	2	0	0	0	0	1	8	0	0					25
Lluvias intensas	0	0	8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					10
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24					

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Código: ESPS-FP-003
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 13-NOV-2025

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE O ETAPA	1	No. FASE / ETAPA:	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1-mar** **Y EL** **31-mar** **2026**

INFORME No. **4**
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA
OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
NOMBRE DEL PROYECTO VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA
CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL CONTRATO No. 2594 DE 2025
INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP SAS CONTRATO No. 2604 DE 2025
SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																		Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Seco	20	17	24	24	24	24	24	24	23	19	21	18	24	24	23	23	24	16	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	20				702
Lluvias moderadas	3	3	0	0	0	0	0	0	1	5	1	4	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4				27
Lluvias intensas	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				15
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma:
FREDY VALLARDO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Código: ESPS-FP-003
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 13-NOV-2025

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE O ETAPA	1	No. FASE / ETAPA:	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **26-ene** **Y EL** **28-feb** **2026**

INFORME No. **3**

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO: VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL — CONTRATO No. 2594 DE 2025

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP SAS — CONTRATO No. 2604 DE 2025

SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
Seco	17	18	18	19	24	24	24	22	24	24	24	18	24	24	24	16	24	18	19	14	24	24	24	24	18	22	24	24	18	16	15	20	21	21	714
Lluvias moderadas	6	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	5	4	0	0	0	0	6	2	0	0	0	2	3	4	3	3	60
Lluvias intensas	1	1	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	42
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma:

FREDY VALLARDO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 3. INFORME ACTA PARCIAL No. 02 DE OBRA – CONSORCIO PEATONES CEL

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

7.0. INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

"CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CONTRATO DE OBRA **No. 2594-2025**

OBRA

CONSORCIO PEATONALES CEL
NIT. 902007682-7

INTERVENTORÍA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S
NIT. 901.730.540-6



SUPERVISOR

Ing. ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de infraestructura
GOBERNACION DEL AMAZONAS

INFORME ACTA PARCIAL # 2


MAYO 2026

VALIDACIONES DE INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJECUTADO

Por Obra	CARGO	NOMBRE	FIRMA
ELABORO	RESIDENTE DE OBRA	CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	
	DIRECTOR DE OBRA	OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	
APROBÓ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	KEVIN EDUARDO ANDRADE SARMIENTO	

REVISIÓN Y AVAL SUPERVISIÓN

La supervisión ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información en él descrita.

FECHA DE REVISIÓN	POR SUPERVISIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA
	Revisó y Aprobó	Supervisor Contrato de Obra	ROBIN CARDENAS PAREDES	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	REVISIÓN	
	FECHA ENTREGA	FECHA REVISIÓN
Vo. 001		
Vo. 002		

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1. OBJETIVO GENERAL 6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 7
3.1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.2. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 8
3.3. REPORTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.4. PERSONAL DE OBRA Y RELACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 11
3.5. RELACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN OBRA 12
3.6. REPORTE DEL PLAN SST DE OBRA 13
3.6.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS 13
3.7. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 14
3.7.1. ENTREGA Y CAMBIO DE EPP 14
4. INFORME DE OBRA 15
4.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO No. 2594-2025 15
4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 15
4.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 16
4.1.3. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y DEBIDOS PROCESOS 16
4.1.4. PERSONAL EN OBRA 16
4.2. REPORTE COMPONENTE TÉCNICO 17
4.2.1. BITÁCORA DE OBRA 17
4.2.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 18
4.2.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 22
4.2.4. ANÁLISIS UNITARIOS NO PREVISTOS APROBADOS EN EL PERIODO 23
4.2.5. REPORTE DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 23
4.2.6. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LEGALIDAD DE SITIOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES 23
4.3. REPORTE COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 23
4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO 29

BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS 30
REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15) 31
CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI 31
ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO – INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE) 33
CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI 33

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contractual Obra 7
Tabla 2. Pólizas iniciales del Contrato 8
Tabla 3. Pólizas de reinicio del Contrato 8
Tabla 4. Pólizas Otrosí No. 2 del Contrato 9
Tabla 5. Control Pagos Contrato Obra 10
Tabla 6. Reporte mensual 10
Tabla 7. Profesionales Obra 11
Tabla 8. Personal Operativo de Obra 12
Tabla 9. Relación maquinaria y equipos 13
Tabla 10. Relación Maquinaria y Herramienta Menor 13
Tabla 11. Tramos a intervenir 15
Tabla 12. Relación de personal 16
Tabla 13. Componente técnico del Contrato 17

CONTENIDO DE ANEXOS

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 2: CORTE DE OBRA No. 02
ANEXO 3: INFORME SG-SST 05
ANEXO 4: CERTIFICADO CALIBRACION EQUIPO TOPOGRAFICO E INSUMOS DE OBRA
ANEXO 5: BITACORA DE OBRA
ANEXO 6: CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES
ANEXO 7: INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL-PAGA
ANEXO 8: ENSAYOS DE LABORATORIO

1. INTRODUCCIÓN

La administración regional del territorio amazónico, guiada por su carta de navegación **"AMAZONAS PARA LA VIDA"**, persigue el objetivo de **desarrollo autosuficiente** y estabilidad territorial.

Numerosos asentamientos, como la Inspección de Santa Sofía, muestran un déficit en trazados de tránsito, obstaculizando el paso seguro de sus residentes y visitantes. Para honrar el mandato superior de proteger las prerrogativas ciudadanas, se diseñó una obra de ingeniería civil que responda a esta falencia territorial.

Se trata de la **instalación de Pasajes para Caminantes con Superficie de Hormigón Pulido en la Localidad de Santa Sofía, Jurisdicción de Leticia, Código BPIN 2023006910053**. El propósito implica la edificación de **siete (7) segmentos** de aceras, abarcando cerca de **1760 metros lineales**, con una **extensión de 2.86 metros**, que incluyen sistemas de drenaje perimetral. Esta labor integrará una nueva articulación peatonal que se suma a la infraestructura previa.

Esta intervención corrige la ausencia de corredores seguros, incrementando notoriamente el bienestar vecinal. Además, representa un factor vital para la expansión del comercio y eleva los estándares de prosperidad en el área.

La iniciativa de estas intervenciones fue viabilizada por el Ministerio de Transporte, a través de la Coordinadora del Grupo de Apoyo Regional de la Dirección de Infraestructura, según el **oficio radicado MT No. 20235300197681 del 28 de febrero de 2023** y la **viabilización oficial bajo el radicado MT N. 20233030594992 del 30 de agosto de 2023** para el Departamento del Amazonas. Estos proyectos fueron priorizados por la Secretaría de Planeación Departamental y forman parte integral de nuestro Plan de Acción para la vigencia 2025.

La materialización de estas obras prioritarias generará un **impacto significativo en el bienestar de los habitantes**, garantizando una operación segura de la movilidad peatonal. Adicionalmente, esta inversión contribuirá activamente a la **generación de empleo local**, dinamizará la comercialización de productos y, en última instancia, **elevará la calidad de vida** de la comunidad de Santa Sofía.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Consolidar los indicadores de desempeño y el progreso físico de las obras ejecutadas por el contratista a corte de mayo de 2026. La revisión cubre transversalmente los frentes técnico, administrativo, financiero, ambiental y social estipulados para el contrato: **"CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"**.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. **Construir vías peatonales en concreto estampado** en la Inspección de Policía Comunidad de Santa Sofía, Municipio de Leticia.

II. Ejecutar las cantidades de obra detalladas en la propuesta económica utilizando medios propios (materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal) hasta su total terminación y aceptación final.

III. Desarrollar el objeto del contrato en un plazo estimado de **180 días calendario.**

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
NÚMERO DE CONTRATO:	**No. 2594-2025**	
DATOS DEL CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACION PUBLICA 04 DE 2025	
OBJETO DE CONTRATO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	
DATOS DEL CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO PETATONALES CEL
	SUSCRITO CONTRATO – REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 2.3.2.24.02.001-111. 2.3.2.24.02.001-214	
VALOR DEL CONTRATO:	**$3.555.780.983,00**	
FECHA DE CONTRATO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN:	05 DE ENERO DE 2026	
FECHA REINICIO:	26 DE ENERO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	50 DIAS	
OTROSÍ No. 02:	04 DE FEBRERO DE 2026	
TIEMPO A PRÓRROGAR:	4 MESES Y 10 DÍAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	**180 DÍAS CALENDARIO**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE JUNIO DE 2026**	

Tabla 1. *Información Contractual Obra*

3.2. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra No. 2594-2025 se encuentra amparado por las siguientes pólizas, la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21-44-101484742 la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-44-101265750 expedidas por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO SA., las cuales se encuentran activas y vigentes a la fecha de presentación del informe:

AMPARO	No PÓLIZA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGURO
				DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	$711.156.196.60	$7,527,600.00	10-11-2025	30-04-2026	SEGUROS DEL ESTADO SA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101484742	$1,777,890,491.50		10-11-2025	30-04-2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101484742	$177,789,049.15		10-11-2025	30-12-2028	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101484742	$355,578,098.30		5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-44-101265750	$569,400,000.00	$235,620.00	10-11-2025	30-12-2025	

Tabla 2. *Pólizas iniciales del Contrato*

AMPARO	No PÓLIZA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGURO
				DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	$711.156.196.60	$7,527,600.00	10-11-2025	04-06-2026	SEGUROS DEL ESTADO SA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101484742	$1,777,890,491.50		10-11-2025	04-06-2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101484742	$177,789,049.15		10-11-2025	04-02-2029	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101484742	$355,578,098.30		30-12-2025	30-12-2030	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-44-101265750	$569,400,000.00	$235,620.00	10-11-2025	30-12-2025	

Tabla 3. *Pólizas de reinicio del Contrato*

AMPARO	No PÓLIZA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGURO
				DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	$711.156.196.60	$7,527,600.00	10-11-2025	15-10-2026	SEGUROS DEL ESTADO SA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101484742	$1,777,890,491.50		10-11-2025	15-10-2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101484742	$177,789,049.15		10-11-2025	15-06-2029	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101484742	$355,578,098.30		30-12-2025	30-12-2030	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-44-101265750	$569,400,000.00	$235,620.00	10-11-2025	15-06-2026	

Tabla 4. *Pólizas Otrosí No. 2 del Contrato*

3.3. REPORTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA


En las siguientes tablas se presenta la relación de los pagos parciales y el estado financiero del Contrato de Obra No. 2594-2025 para su debido control. A la fecha del presente informe se ha realizado el desembolso del anticipo por el 50% del valor del contrato, equivalente a $1.777.890.491,50, y el pago del Acta Parcial No. 1 por un valor de $1.699.746.070,28.

Para el periodo comprendido hasta mayo de 2026, correspondiente al Acta Parcial No. 2 (Corte de Obra No. 2 – mayo 2026), se ejecutaron obras por un valor de $1.168.148.068,00, equivalente al 32,85% del valor vigente del contrato. Con este corte, la ejecución acumulada asciende a $2.867.894.138,28, lo que representa un avance financiero del 80,65% sobre el valor vigente del contrato ($3.555.780.983,00), quedando un saldo por ejecutar de $687.886.844,76 (19,35%).

Durante el periodo se tramitaron modificaciones de cantidades (mayores y menores) que, en su balance neto, mantienen el valor total del contrato sin variación respecto al valor original ($3.555.780.983,00), conservando el equilibrio económico del mismo.

CONCEPTO	VALOR ($)	% DEL CONTRATO
Valor Total del Contrato	$ 3.555.780.983,00	100,00%
ANTICIPO Y AMORTIZACIÓN		
Anticipo entregado (50%)	$ 1.777.890.491,50	50,00%
Amortización Corte #1 (50% del corte)	$ 849.873.035,00	23,90%
Amortización Corte # 2 (50% del corte)	$ 584.074.034,00	16,43%
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 343.943.422,50	9,67%
ACTA PARCIAL # 1	$ 1.699.746.070,00	47,80%
ACTA PARCIAL # 2	$ 1.168.148.068,00	32,85%
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 2.867.894.138,00	80,65%
Programado Acumulado a mayo 2026	$ 2.617.997.029,05	73,63%
SALDO POR EJECUTAR	$ 687.886.845,00	19,35%
Desviación (Ejecutado vs Programado)	$ 249.897.108,95	7,03%

Tabla 5. *Control Pagos Contrato Obra*

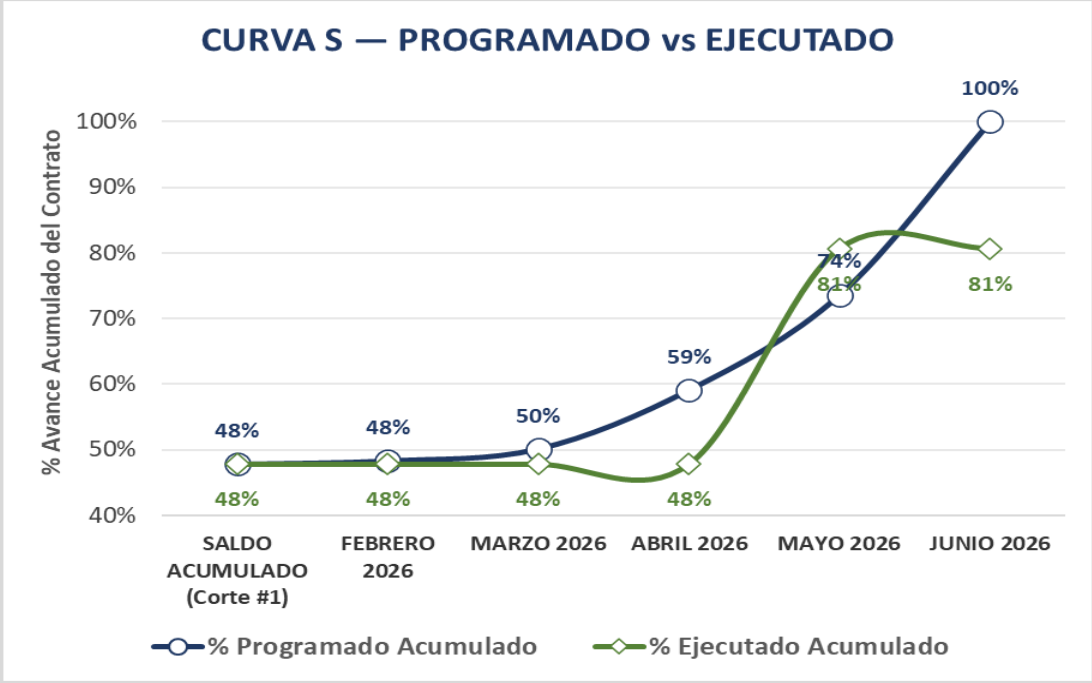

Gráfica 1. *Curva S Avance de Obra*

MES	PROGRAMADO MENSUAL ($)	EJECUTADO MENSUAL ($)	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	EJECUTADO ACUMULADO ($)	%PROG. ACUM.	%EJEC. ACUM.
SALDO ACUMULADO (Corte #1)	$ 1.699.746.070,00	$ 1.699.746.070,00	$ 1.699.746.070,00	$ 1.699.746.070,00	47,80%	47,80%
FEBRERO 2026	$ 18.856.323,19	$ 18.856.323,19	$ 1.718.602.393,19	$ 1.718.602.393,19	48,33%	48,33%
MARZO 2026	$ 64.373.028,54	$ 62.500.000,00	$ 1.782.975.421,74	$ 1.781.102.393,19	50,14%	50,09%
ABRIL 2026	$ 319.130.532,75	$ 154.850.800,00	$ 2.102.105.954,49	$ 1.935.953.193,19	59,12%	54,45%
MAYO 2026	$ 515.891.074,57	$ 931.940.945,14	$ 2.617.997.029,05	$ 2.867.894.138,33	73,63%	80,65%
JUNIO 2026	$ 937.783.954,07	$ 0,00	$ 3.555.780.983,12	$ 2.867.894.138,33	100,00%	80,65%
TOTAL	$ 3.555.780.983,12	$ 2.867.894.138,33	$ 3.555.780.983,12	$ 2.867.894.138,33	100,00%	80,65%

Tabla 6. *Reporte mensual*

3.4. PERSONAL DE OBRA Y RELACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

A continuación, se relaciona el personal presente en la obra durante el periodo reportado, de acuerdo con la oferta presentada por parte del contratista de obra.

NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	% DEDICACIÓN
OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	1.032.364.610	Director de Obra	20%
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	1.147.686.840	Residente de Obra	100%
JAIME ALBERTO CASTRO RENGIFO	80.768.573	Ingeniero Ambiental	100%
ARLEY LEONOR DUARTE AMAYA	56.056.223	Trabajador Social Especialista en Salud Ocupacional	100%
JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	1.094.940.910	Tecnólogo En Topografía	10%
MARTHA AURORA GONZÁLEZ CELIS	51.809.026	Especialista De Pavimentos	10%

Tabla 7. *Profesionales Obra*

A continuación, se registra el personal operativo activo que hace parte del proyecto, anexo al informe SG-SST se entregan los soportes de afiliación del siguiente personal en obra:

ITEM	NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	FECHA INGRESO	CARGO
1	JAIR ANDREY GONZALEZ HENAO	93.400.332	26/01/2026	MAESTRO DE OBRA
2	CARLOS ANDRES PARRA CAMELO	1.118.121.309	26/01/2026	OFICIAL DE CONSTRUCCION
3	YOLVER REVELO LEON	1.121.211.864	03/02/2026	OFICIAL DE CONSTRUCCION
4	DAVID CAHUCHI AHUANARY	6.565.823	23/02/2026	OFICIAL DE CONSTRUCCION
5	YETUR GARAY CAYETANO	1.121.200.963	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
6	CRISTIAN DAVID REVELO DIAZ	1.007.769.189	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
7	DIEGO ANDRES RAMOS VENTO	1.121.205.946	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
8	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	15.877.597	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
9	FREDY ANGEL VENTO LORENZO	1.007.366.231	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
10	MILTON RAMOS VENTO	1.121.201.303	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
11	JORGE REVELO LEON	6.566.886	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
12	ROBERTH YANCA ALMEIDA	1.147.684.486	03/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
13	JUAN CARLOS REVELO LEON	6.567.562	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
14	LUIS JORGE DEL AGUILA RAMOS	15.875.906	26/01/2026	SERVICIOS GENERALES
15	YAISON CAHUACHE HUAHUARI	1.007.344.470	26/01/2026	CADENERO
16	HANSEL EDRIEGUER LEONARDO REVELO	1.006.739.912	03/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
17	ELKIN FABRICIO YUCUNA YUCUNA	1.122.269.221	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA

18	RONI PARENTE SANTOS	15.877.726	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
19	NILO MIGUEL ALMEIDA FERNANDEZ	1.121.204.626	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
20	ROBERTO JOHN CASTILLO COELLO	1.007.769.132	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
21	WILLY CAMILO FERNANDEZ RAMOS	1.007.628.288	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
22	DIEGO NIXON RODRIGUEZ PURICHO	1.122.269.518	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
23	CRISPIN ANTONIO PEREIRA	1.006.733.322	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
24	OMAR DIEGO RAMOS CUELLAR	1.007.682.555	23/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
25	ALCINDO FERNANDEZ ANGARITA	1.006.739.372	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
26	FRANS FRANKLIN LEON	1.122.270.107	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
27	JAIDER FERNANDEZ ANGARITA	1.121.212.338	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
28	JUNIOR FABIAN QUINTERO MIJO	1.121.446.499	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
29	LUIS ALBERTO RAMOS	1.121.210.537	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
30	LUIS ALEJANDRO CAHUACHE GAMARRA	1.006.732.296	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
31	OSCAR FERNANDEZ LORENZO PEDRO	1.006.739.428	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
32	VILAN JESUS GARAY CAYETANO	15.879.858	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
33	WILSON GERONIMO RAMOS ÑEÑETOFE	1.007.472.725	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
34	YEISON ALEXANDER FERNANDEZ FERNANDEZ	1.121.197.024	07/04/2026	AYUDANTE DE OBRA
35	ADAN MURAYARI AYAMA	1.006.733.244	11/05/2026	AYUDANTE DE OBRA
36	ALEX RAFAEL VASQUEZ TAPAYURI	1.122.702.047	11/05/2026	AYUDANTE DE OBRA
37	ANDRES LOSADA CURICO	1.121.207.495	11/05/2026	AYUDANTE DE OBRA
38	DIEGO MURAYARI AYAMA	1.006.733.242	6/05/2026	AYUDANTE DE OBRA
39	DIXSON GABRIEL AYAMA YAICATE	1.131.534.434	11/05/2026	AYUDANTE DE OBRA
40	EDGAR COELLO PINEDA	1.131.534.148	11/05/2026	AYUDANTE DE OBRA
41	GERALD ALEXIS CHOTA PEÑA	1.122.266.252	11/05/2026	AYUDANTE DE OBRA
42	JAIME LISANDRO PINEDA CASADO	1.121.209.556	6/05/2026	AYUDANTE DE OBRA
43	ROY ERIK AYAMA YAICATE	1.121.199.883	11/05/2026	AYUDANTE DE OBRA

Tabla 8. *Personal Operativo de Obra*

3.5. RELACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN OBRA

De acuerdo con lo establecido contractualmente en el contrato de **No. 2594-2025** para las actividades de revisión, control y demás referentes al objeto contractual, se tiene contemplado hacer uso de los equipos necesarios para verificar información.

Se procede a relacionar la maquinaria y herramientas que se tienen actualmente en obra, debidamente ordenadas e inventariadas en el almacén de la obra:

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
MINICARGADOR	1
VIBRO COMPACTADOR	1
MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS	2
VIBRADOR DE CONCRETO	2
CORTADORA DE MANO PARA PAVIMENTO	1
ESTACIÓN TOTAL DE MARCA Hi-Target REFERENCIA: HTS-420 R	1
TRIPODE	1
BASTON	2
PRISMA	2
RADIO DE COMUNICACION	2
CINTA MEDICION	2
HERRAMIENTAS MENORES ADICIONALES	
PLANTA ELÉCTRICA	1
MOTOBOMBA DIESEL 3”	1
MOTOSIERRA	1

Tabla 9. *Relación maquinaria y equipos*

HERRAMIENTA MENOR	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
PULIDORA	1
TAPETES ESTAMPADOS	10
FLOTA CANAL	1
CARRETILLAS	10
NIVELES DE MANO	3
CIZALLA	2
ZARANDA	2
TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA	2
FORMALETA METALICA	8

Tabla 10. *Relación Maquinaria y Herramienta Menor*

Anexo No. 4. CERTIFICADO CALIBRACION EQUIPO TOPOGRAFICO E INSUMOS DE OBRA

3.6. REPORTE DEL PLAN SST DE OBRA

3.6.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONSORCIO PETATONALES CEL en su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo tiene como actividad indispensable para el inicio de las actividades laborales en los diferentes proyectos, la notificación de peligros y riesgos en cada una de las inducciones al personal vinculado, con el fin de

dar cumplimiento a la normatividad, la prevención de riesgos y posibles accidentes en el lugar de trabajo.

3.7. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Como metodología para la promoción de la higiene y seguridad industrial en el lugar de trabajo, prevención de riesgos y formación en temas afines al cargo contratado, todo el personal vinculado al CONSORCIO PEATONALES CEL recibe inducción y reinducción al cargo cuando sea necesario. Dentro de las actividades de inducción se realiza capacitación al personal en temas como: POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST; POLÍTICA DE NO ALCOHOL, TABACO Y DROGAS; PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, USO DE EPP, Notificación del Riesgo, entre otras.

Anexo No. 3. INFORME SG-SST.

3.7.1. ENTREGA Y CAMBIO DE EPP

En cumplimiento a la legislación vigente y con el objetivo de proteger al personal de CONSORCIO PEATONALES CEL, para el periodo aquí presentado se realizó entrega de elementos de protección personal de acuerdo con la labor a desarrollar, soportadas en el informe SG-SST.

4. INFORME DE OBRA

4.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO No. 2594-2025

4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de vías peatonales en concreto estampado en la Inspección de Policía Comunidad de Santa Sofía, Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas.

LOCALIZACIÓN:	Inspección de Policía de Santa Sofía, zona rural del Municipio de Leticia.
MARCO DE PLANEACIÓN:	El proyecto se alinea con el Plan de Desarrollo "Amazonas para la Vida", bajo la línea estratégica de "Productividad y Sostenibilidad" y el programa "Andenes para la Vida". Alcance Físico y Técnico El proyecto contempla la intervención de la infraestructura vial peatonal mediante la construcción de siete (7) tramos específicos que se interconectan para formar una red de movilidad.
DIMENSIONES TOTALES:	Una longitud total aproximada de 1.760 metros lineales con un ancho de 2,86 metros (incluyendo canaletas).
ÁREA TOTAL A INTERVENIR:	Aproximadamente 5.034 metros cuadrados.
TRAMOS A CONSTRUIR:	- Vía Comunidad Nuevo Jardín (incluye inicio hacia puente peatonal): 318.0 ml. - Vía de Acceso Principal: 250.0 ml. - Vía Maloka: 270.0 ml. - Vía a la Escuela Comunitaria: 371.0 ml. - Vía a Puesto de Salud: 214.0 ml. - Vía Central Iglesia: 246.0 ml. - Vías Internas Intersecciones: 91.0 ml.

		DIMENSIONES		
SECTOR	**CANT.**	**Largo**	**Ancho**	**M2**
SENDERO 01 - Vía Comunidad Nuevo Jardín	1	318	2.86	909.48
SENDERO 02 - Vía de Acceso Principal:		250	2.86	715
SENDERO 03 - Vía Maloka	1	270	2.86	772.20
SENDERO 04 - Vía a la Escuela Comunitaria	1	371	2.86	1061.06
SENDERO 05 - Vía a Puesto de Salud	1	214	2.86	612.04
SENDERO 06 - Vía Central Iglesia	1	246	2.86	703.56
SENDERO 07 - Vías Internas Intersecciones	1	91	2.86	260.26
TOTALES	**7**	**1760**		**5.034.00**

Tabla 11. *Tramos a intervenir*

4.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

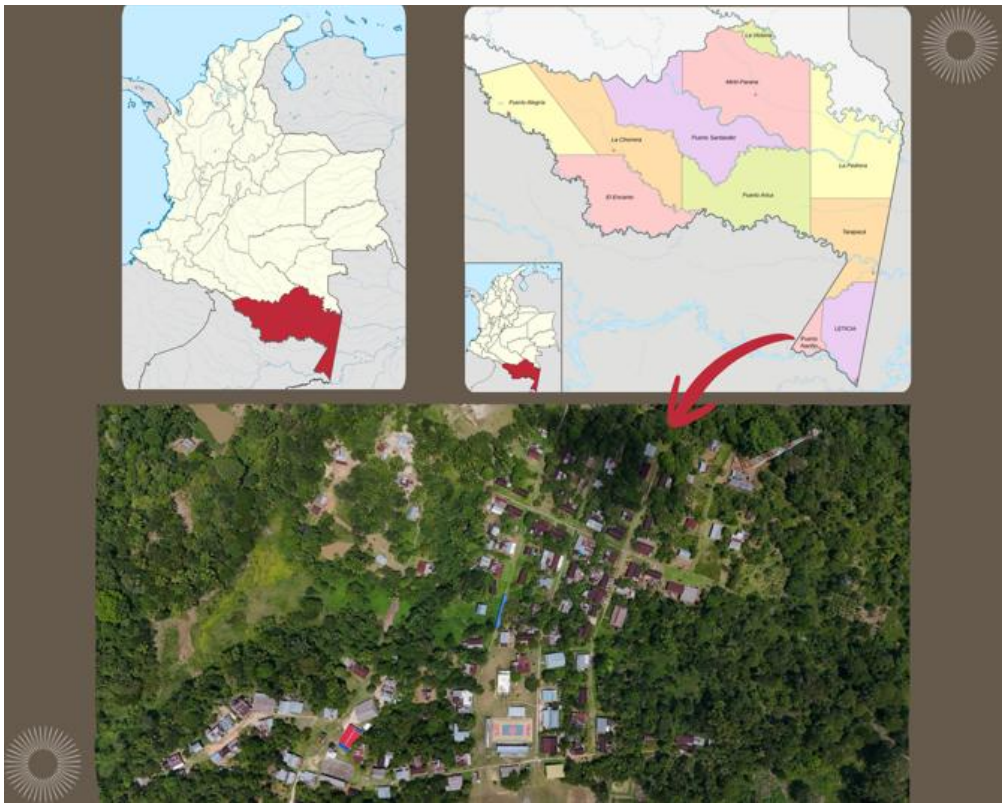


***Imagen 1**. Ubicación del Proyecto*
***Fuente:** Obra.*

4.1.3. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y DEBIDOS PROCESOS

En el periodo comprendido del presente correspondiente al acta parcial de obra # 2, no se presentaron llamados de atención al personal.

4.1.4. PERSONAL EN OBRA

A corte mes de mayo año 2026 se relaciona el personal activo, un total de 41 personas en campo del componente operativo.

MES	ACTIVOS	INGRESOS	RETIROS
ENERO	0	15	0
FEBRERO	15	16	0
MARZO	31	0	0
ABRIL	41	0	1
MAYO	37	9	3
TOTAL, PERSONAL OPERATIVO			**43**

Tabla 12. *Relación de personal*

4.2. REPORTE COMPONENTE TÉCNICO

A continuación, se describe lo concerniente al componente técnico dentro del contrato, se tienen un capítulo conformado por las siguientes actividades, donde se evidencia el cambio realizado mediante balance de mayores y menores, se ajustaron las cantidades según requerimiento real en campo sin afectar el alcance del contrato.

1. IDENTIFICACIÓN			2. CANTIDADES CONTRACTUALES			6. PRESUPUESTO ACTUALIZADO		
Nº	Descripción	Und	Cant. Original	VU Original	Valor Original	Cant. Vigente	VU Vigente	Valor Vigente
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$10.139	$51.039.726	5.033,60	$10.139	$51.035.670
2	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$2.535	$12.292.215	3.954,81	$2.535	$10.025.444
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$108.293	$8.663.440	108,74	$108.293	$11.776.101
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$105.559	$56.474.065	829,57	$105.559	$87.568.066
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$16.703	$84.082.902	4.916,50	$16.703	$82.120.218
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$1.603.215	$3.206.430	2,00	$1.603.215	$3.206.430
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE	ML	12,00	$702.267	$8.427.204	12,00	$702.267	$8.427.204
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$115.004	$28.981.008	220,12	$115.004	$25.314.722
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$1.608.146	$480.835.654	299,20	$1.608.146	$481.157.283
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$21.577	$174.946.316	8.777,47	$21.577	$189.391.513
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$2.867.009	$857.235.691	299,20	$2.867.009	$857.809.093
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$39.316	$138.392.320	3.520,00	$39.316	$138.392.320
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$234.100	$802.494.800	3.487,00	$234.100	$816.306.700
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA	M3	2,40	$3.382.951	$8.119.082	1,50	$3.382.951	$5.074.427
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$237.851	$815.353.228	3.168,34	$237.851	$753.591.668
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$13.412	$13.371.764	1.694,00	$13.412	$22.719.928
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$2.357	$11.865.138	5.033,60	$2.357	$11.864.195
VALORES					**$3.555.780.983**			**$3.555.780.983**

Tabla 13. *Componente técnico del Contrato*

4.2.1. BITÁCORA DE OBRA

Se llevo control diario en el sitio de la obra del estado del clima, personal en obra, horario de trabajo, actividades desarrolladas y equipo de obra empleados para las actividades desarrolladas, ver *Anexo No. 5. BITÁCORA DE OBRA, mayo de 2026.*

4.2.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Contrato de Obra No: 2594-2025 Objeto: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. Periodo de Ejecución Reportado: ejecutado a corte mayo de 2026.

A continuación, se presenta la descripción técnica detallada de las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción durante el periodo en mención:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.0 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Durante el presente corte de obra se ejecutaron las actividades de localización, demarcación y replanteo sobre los tramos definidos para la construcción de los andenes peatonales en las comunidades de Santa Sofia y Nuevo Jardín. A partir de las cotas de diseño suministradas por el estudio topográfico, se llevó a cabo el estacado del eje y los bordes de los andenes, estableciendo los niveles de referencia necesarios para garantizar el cumplimiento de las pendientes longitudinales y transversales proyectadas. Este proceso de seguimiento y control topográfico se mantuvo de manera permanente durante el avance de la obra, asegurando la correcta materialización del trazado en campo.
ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

2.0 ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

Se ejecuto la adecuación preliminar del terreno en la totalidad de los tramos definidos por la topografía. Las actividades comprendieron la eliminación manual de la cobertura vegetal mediante el uso de herramienta menor (machetes y palas), seguida de la remoción de la capa vegetal entre 0.10 y 0.20 m de profundidad hasta encontrar suelo mineral firme, garantizando la extracción total de raíces. El material vegetal retirado fue debidamente reubicado en puntos de acopio temporal dispuestos a los costados del perfil intervenido, con el fin de ser aprovechado en la etapa de paisajismo y acabados finales del proyecto.
ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

3.0 DEMOLICIÓN DE VÍAS PEATONALES EN MAL ESTADO

Se ejecuto la remoción de las placas de concreto y estructuras antiguas existentes que presentaban deterioro severo y comprometían la estabilidad del nuevo trazado. El proceso se llevó a cabo mediante el empleo de herramienta menor y manual (barretas y macetas), fracturando el concreto en secciones manejables para facilitar su retiro. Durante la ejecución de los trabajos se aplicaron las medidas de precaución necesarias para evitar afectaciones a las redes de acueducto existentes y a las propiedades colindantes al proyecto. Es de anotar que durante el proceso de demolición se evidencio que los andenes existentes contaban con áreas y longitudes superiores a las proyectadas en el diseño, situación que genero un mayor volumen de demolición con respecto a las cantidades contratadas originalmente, lo cual será objeto de ajuste en el balance de mayores y menores cantidades de obra.
ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

4.0 EXCAVACIÓN MANUAL MENOR A 0.50 MTS Y DESALOJO

Se adelantaron los trabajos de corte manual del terreno hasta alcanzar los niveles de subrasante definidos en el diseño. Se realizo el cajeo manual del andén para conformar la sección transversal requerida. El material sobrante, compuesto por RCD (Residuos de Construcción y Demolición) y tierra orgánica no apta, fue cargado en carretillas y transportado hasta los puntos de acopio temporal habilitados fuera del área de circulación peatonal. El material RCD fue reutilizado íntegramente para la estabilización de los tramos intervenidos, no generándose material sobrante derivado de las demoliciones. Cabe destacar que la topografía irregular del terreno obligo a profundizar las excavaciones por encima de los 0.50 m en algunos sectores, incrementando las cantidades inicialmente previstas, lo cual será contemplado en el balance de mayores y menores cantidades.
ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

2. CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

5.0 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL SUELO

Una vez concluidas las excavaciones, se continuo con el tratamiento de la subrasante natural en los tramos ejecutados. Se realizo el perfilado del terreno para eliminar irregularidades superficiales, seguido de la aplicación de energía de compactación mediante pisón manual, logrando una superficie firme, uniforme y apta para recibir las capas granulares superiores. Durante el proceso se verifico la ausencia de zonas blandas o material orgánico inestable que comprometiera la capacidad portante de la estructura.
ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

6.0 CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00x1,00x0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA

Se inicio la construcción de las cajas sumidero en concreto de 3.000 PSI, con dimensiones de 1,00 m x 1,00 m x 0,80 m, incluyendo la instalación de su respectiva tapa en rejilla metálica. Para cada unidad ejecutada se realizó la excavación puntual, el replanteo y verificación de niveles, el armado de la formaleta, el vaciado y vibrado del concreto, y finalmente la instalación de la tapa metálica. A la fecha del presente corte se ha ejecutado una (1) unidad de las dos (2) contratadas, lo que corresponde a un avance acumulado del 50% de este ítem.
Avance acumulado: 50% - Ejecución en proceso

8.0 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO

Se ejecuto el suministro e instalación de material de préstamo procedente de las mismas excavaciones en los sectores donde se requirió mejorar la capacidad portante de la estructura de soporte. El material fue extendido en capas uniformes, humedecido hasta alcanzar la humedad optima de compactación y sometido a energía de compactación mecánica hasta alcanzar la densidad requerida conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la estabilidad volumétrica de la base del andén.
ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

9.0 BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 (E=0.10 MTS)

Dadas las condiciones geotécnicas de los suelos de la zona, se construyó una base mejorada mediante la mezcla homogénea in situ de arena limpia con cemento portland en proporción 1:10 (una parte de cemento por diez partes de arena). La mezcla fue extendida sobre el relleno compactado

formando una capa de 10 cm de espesor uniforme, la cual fue nivelada y compactada de inmediato para permitir el fraguado inicial y conformar la losa de soporte rígida sobre la que se apoya la placa de concreto estampado.
ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

3. PAVIMENTACIÓN Y ACABADOS

10. REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0.15*0.15)

Sobre la base estabilizada se procedió a la instalación de la malla electrosoldada (Grafil) de 5 mm de diámetro con retícula de 15x15 cm, la cual actúa como refuerzo a la tensión de la losa de concreto peatonal. La malla fue instalada con el apoyo de distanciadores (panelas) de concreto, garantizando que el acero quedara ubicado en el tercio superior de la losa y cumpliera con el recubrimiento técnico especificado, asegurando la resistencia estructural y el control de fisuración de la placa. A la fecha del presente corte se registra un avance acumulado del 97,9% del total contratado, con una cantidad mínima pendiente por ejecutar correspondiente al 2,1% restante.
Avance acumulado: 97,9% - Ejecución en proceso

11. CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI Vaciado de la losa de rodadura peatonal.

Se ejecuto el suministro y vaciado de concreto con resistencia a la compresión de 3.000 PSI a los 28 días sobre la malla de refuerzo previamente instalada. Durante el vaciado se realizó el vibrado mecánico de la mezcla para garantizar su adecuada densificación y la eliminación de vacíos internos, así como el regleado superficial para preparar la superficie para el proceso de estampado posterior. Se respetaron las juntas de dilatación y contracciones indicadas en el diseño. Como medida de protección ante las precipitaciones propias de la zona, se instalaron carpas temporales sobre las áreas recién vaciadas, evitando la interrupción de los trabajos y preservando la integridad de la mezcla durante el proceso de fraguado.
ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

12. ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUÍN ESPIGADO Proceso de acabado arquitectónico y endurecimiento superficial.

Estando el concreto en estado plástico, se aplicó el proceso de acabado arquitectónico en tres etapas secuenciales: en primer lugar, se espolvoreo uniformemente el endurecedor de color mineral (color rojo) integrándolo a la superficie mediante llanas de acero hasta obtener un color uniforme y saturado. Posteriormente se aplicó el agente desmoldante en polvo, el cual evita la adherencia de los moldes al concreto y otorga el efecto de envejecido (tonalidad secundaria) al acabado. Finalmente, se colocaron los moldes de poliuretano con textura tipo Adoquín Espigado de manera secuencial y alineada, apisonandolos para transferir la textura y huella al concreto. Al termino de cada jornada de estampado las superficies fueron cubiertas con lona verde para garantizar un proceso de curado controlado, proteger el acabado frente a factores climáticos adversos y evitar el deterioro por pisadas o transito no autorizado. Como actividad final se aplicó el sellante acrílico con acabado lustre para proteger y realzar la textura estampada.
ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

13. CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS (E=0.15 * 0.30)

Previo a la fundición de la placa principal, se construyeron los elementos de confinamiento lateral del andén. Para ello se instaló formaleta de madera debidamente alineada y nivelada, se dispuso el acero de refuerzo de 38.000 PSI conformando la canasta del bordillo tipo S, y se realizó el vaciado del concreto de 3.000 PSI de forma monolítica con la placa del andén, asegurando la continuidad estructural entre ambos elementos. Durante el vaciado se aplicó vibrado mecánico para evitar la formación de hormigueros y se realizó el acabado manual en las caras superiores y expuestas del bordillo. Estos elementos actúan como confinamiento lateral de la vía peatonal, garantizando la estabilidad del borde de la calzada y el correcto encauce de las aguas lluvias.

ITEM CULMINADO EN SU TOTALIDAD - Avance: 100%

15. CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS

Se inicio la construcción de las cunetas en V con concreto de 3.000 PSI y espesor de 0.07 m, las cuales tienen como función el encauzamiento y evacuación de las aguas lluvias que escurren sobre la superficie del andén y las zonas aledañas. Se realizo el trazado y replanteo de las cunetas conforme al diseño hidráulico, la conformación de la sección en V sobre el terreno previamente perfilado, la instalación de formaleta lateral donde fue requerido, el vaciado del concreto y el acabado superficial de las caras expuestas. A la fecha del presente corte se registra un avance acumulado del 15,84% del total contratado (501,77 ML de 3.428,00 ML), con ejecución en proceso en los tramos definidos como prioritarios dentro del cronograma de obra.

Avance acumulado: 15,84% - Ejecución en proceso

4.2.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

1. IDENTIFICACIÓN			2. CANTIDADES CONTRACTUALES			2. CORTE DE OBRA N° 1			6. CORTE DE OBRA N° 2			7. SALDO POR EJECUTAR			
Nº	Descripción	Und	Cant. Original	VU Original	Valor Original	Cant. Ejecutada	Valor Corte 1	% Avance Físico	Cant. Ejecutada	Valor Corte 2	% Avance Físico	Cant. Por Ejecutar	Valor Por Ejecutar	% Ejecutado	% Pendiente
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$10.139	$51.039.726	4.499,64	$45.621.830	89,4%	533,96	$5.413.841	10,61%	0,00	$0	100,0%	0,0%
2	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$2.535	$12.292.215	0,00	$0	0,0%	3954,81	$10.025.444	100,00%	0,00	$0	100,0%	0,0%
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$108.293	$8.663.440	48,00	$5.198.064	60,0%	60,74	$6.578.037	55,86%	0,00	$0	100,0%	0,0%
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$105.559	$56.474.065	415,91	$43.903.020	77,7%	413,66	$43.665.045	49,86%	0,00	$0	100,0%	0,0%
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$16.703	$84.082.902	3.126,84	$52.227.575	62,1%	1789,66	$29.892.643	36,40%	0,00	$0	100,0%	0,0%
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$1.603.215	$3.206.430	0,00	$0	0,0%	1,00	$1.603.215	50,00%	1,00	$1.603.215	50,0%	50,0%
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE	ML	12,00	$702.267	$8.427.204	0,00	$0	0,0%		$0	0,00%	12,00	$8.427.204	0,0%	100,0%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$115.004	$28.981.008	218,66	$25.146.775	86,8%	1,46	$167.947	0,66%	0,00	$0	100,0%	0,0%
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$1.608.146	$480.835.654	185,86	$298.891.624	62,2%	113,34	$182.265.659	37,88%	0,00	$0	100,0%	0,0%
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$21.577	$174.946.316	4.543,75	$98.040.597	56,0%	4050,48	$87.397.261	46,15%	183,23	$3.953.655	97,9%	2,1%
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$2.867.009	$857.235.691	185,86	$532.865.160	62,2%	113,34	$324.943.933	37,88%	0,00	$0	100,0%	0,0%
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$39.316	$138.392.320	2.186,60	$85.968.366	62,1%	1333,40	$52.423.954	37,88%	0,00	$0	100,0%	0,0%
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$234.100	$802.494.800	2.186,60	$511.883.060	63,8%	1300,40	$304.423.640	37,29%	0,00	$0	100,0%	0,0%
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA	M3	2,40	$3.382.951	$8.119.082	0,00	$0	0,0%		$0	0,00%	1,50	$5.074.427	0,0%	100,0%
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$237.851	$815.353.228	0,00	$0	0,0%	501,77	$119.347.448	15,84%	2.666,56	$634.244.221	15,8%	84,2%
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$13.412	$13.371.764	0,00	$0	0,0%		$0	0,00%	1.694,00	$22.719.928	0,0%	100,0%
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$2.357	$11.865.138	0,00	$0	0,0%		$0	0,00%	5.033,60	$11.864.195	0,0%	100,0%
VALORES					**$3.555.780.983,00**		**$1.699.746.070**	**47,8%**		**$1.168.148.068,00**			**$687.886.844,76**	**80,65%**	**19,35%**

4.2.4. ANÁLISIS UNITARIOS NO PREVISTOS APROBADOS EN EL PERIODO

En el periodo del presente informe de obra no se presentaron ítem nuevos a los contractuales.

4.2.5. REPORTE DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD

Anexo 05: ENSAYO DE CILINDROS A LA COMPRESION, el resultado de los testigos fallados en el periodo correspondido en el presente corte de obra # 2

4.2.6. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LEGALIDAD DE SITIOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES

Para la ejecución de las actividades se cuenta con los certificados de los materiales utilizados hasta el momento:

- Concrete Color Rojo 140
- Desmol Concrete
- Sella concrete
- Licencia ambiental material de arrastre importado (arena – gravilla)
- Cemento Chimborazo hidráulico tipo GU
- Acero

4.3. REPORTE COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESUMEN DE AVANCE AL CORTE N° 2

N°	Actividad	Estado	Avance
1	Localizacion y Replanteo	CULMINADO	100%
2	Roceria, Descapote y Limpieza	CULMINADO	100%
3	Demolicion de Vias Peatonales	CULMINADO	100%
4	Excavacion Manual < 0.50 m	CULMINADO	100%
5	Nivelacion y Compactacion del Suelo	CULMINADO	100%
6	Cajas Sumideros (1 und ejecutada de 2)	EN PROCESO	50%
8	Relleno con Material Seleccionado	CULMINADO	100%
9	Base Estabilizada Arena Cemento 1:10	CULMINADO	100%
10	Refuerzos Concremalla #5mm (0.15x0.15)	EN PROCESO	97,9%
11	Concreto para Pavimentos 3.000 PSI	CULMINADO	100%
12	Estampado Adoquin Espigado + Sellante	CULMINADO	100%
13	Bordillos Concreto 3.000 PSI	CULMINADO	100%
15	Cunetas en V - E=0.07 m	EN PROCESO	15,84%

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO: Al cierre del Corte de Obra N° 2 se ha ejecutado el 80,65% del valor total del contrato ($1.168.148.068), registrando un saldo por ejecutar del 19,35% equivalente a $687.886.844,76.

2.1 Actividades Preliminares y Movimiento de Tierras

Aspectos positivos:

- La totalidad de las actividades preliminares —localización, replanteo, rocería, descapote y limpieza— fueron ejecutadas y culminadas en su integridad, garantizando la correcta preparación del terreno para las etapas constructivas subsiguientes.
- Las demoliciones de estructuras peatonales existentes y la excavación manual fueron completadas al 100%, habiendo superado las cantidades inicialmente contratadas como resultado directo de las condiciones reales del terreno.
- La nivelación y compactación de la subrasante se concluyó satisfactoriamente en los tramos intervenidos, obteniéndose una superficie estable y uniforme que sirve de soporte adecuado a toda la estructura de pavimento.

Situaciones identificadas:

- Durante las demoliciones se evidencio que los andenes existentes presentaban áreas y longitudes superiores a las proyectadas en el diseño, generando un incremento en las cantidades ejecutadas que requiere tramite contractual formal.
- La topografía irregular del terreno obligo a profundizar excavaciones manuales mas allá de los 0.50 m en sectores específicos, incrementando las cantidades de obra frente a lo contratado originalmente.

2.2 Conformación de la Estructura de Pavimento

Aspectos positivos:

- El relleno con material seleccionado fue ejecutado al 100%, aprovechando integralmente el material proveniente de las excavaciones propias, optimizando el manejo de residuos y reduciendo costos asociados al acarreo y disposición.
- La base estabilizada en arena cemento 1:10 (e=0.10 m) fue construida en su totalidad, aportando la rigidez estructural requerida para soportar las cargas peatonales transmitidas a través de la losa de concreto.
- La instalación de concremalla de refuerzo presenta un avance acumulado del 97,9%, encontrándose prácticamente finalizada, con una mínima cantidad pendiente de ejecución en tramos residuales.

2.3 Pavimentación y Acabados

Aspectos positivos:

- El vaciado de concreto de 3.000 PSI para pavimentos fue completado en la totalidad de los tramos intervenidos, logrando la resistencia especificada y respetando las juntas de dilatación y contracción proyectadas. Las carpas de protección ante lluvia demostraron ser una medida efectiva para garantizar la continuidad de los vaciados en una zona de alta pluviosidad.
- El estampado tipo Adoquín Espigado fue ejecutado al 100% con aplicación de endurecedor mineral color rojo, desmoldante y sellante acrílico lustre, obteniéndose un acabado estético y funcional que cumple las especificaciones técnicas del proyecto.
- Los bordillos de confinamiento lateral fueron construidos de forma monolítica con la placa de anden, garantizando la continuidad estructural e hidráulica del sistema vial peatonal.

Situaciones identificadas:

- Las cunetas en V registran el mayor rezago de ejecución con solo el 15,84% de avance acumulado (501,77 ML de 3.428,00 ML). La ausencia de este sistema de drenaje en los tramos ya pavimentados constituye un riesgo para la durabilidad de las obras en una zona de precipitaciones elevadas como la Amazonia colombiana.
- La segunda caja sumidero permanece pendiente de construcción (50% de avance), lo que limita la captación y evacuación de aguas lluvias en el punto crítico definido por el diseño hidráulico.

3. RECOMENDACIONES

3.1 Gestión Contractual — Balance de Mayores y Menores Cantidades

SOPORTE CONTRACTUAL VIGENTE: El balance de mayores y menores cantidades de obra fue aprobado por la entidad contratante, avalando las nuevas cantidades ejecutadas en demolición y excavación. Dicha aprobación constituye el respaldo contractual pleno de todas las actividades realizadas en campo por encima de las cantidades originalmente pactadas.

- Documentar mediante registros fotográficos, topográficos y de laboratorio todas las evidencias que soporten el incremento en demolición y excavación, como insumo para la sustentación técnica ante la entidad contratante.
- Verificar el equilibrio financiero del contrato frente a las variaciones de cantidades, garantizando que no se genere afectación al valor total sin el trámite administrativo correspondiente.

3.2 Aceleración de la Ejecución de Cunetas en V

ALERTA DE SEGUIMIENTO: El avance del 15,84% en cunetas en V representa el mayor rezago del proyecto. Sin un sistema de drenaje superficial completo, las áreas de anden ya pavimentadas quedan expuestas a danos por escorrentía en una zona de alta pluviosidad como la región Amazónica.

- Programar de manera prioritaria la ejecución de los 2.926,23 ML restantes, articulando este frente con el avance de la concremalla pendiente y ajustando el cronograma para garantizar el cierre hidráulico del proyecto antes de la entrega final.
- Evaluar la posibilidad de incrementar el frente de trabajo o los rendimientos diarios en esta actividad, dado que su bajo porcentaje puede convertirla en la ruta crítica del cronograma de obra.

3.3 Finalización de Ítems con Avance Parcial

- Concluir la construcción de la segunda caja sumidero (ítem 6), cuya ausencia compromete la captación de aguas lluvias en el punto de diseño correspondiente y puede generar encharcamientos sobre la vía peatonal ya terminada.
- Ejecutar el 2,1% restante de concremalla (ítem 10) en los tramos residuales pendientes, previo al vaciado del concreto en dichos sectores, para garantizar la integridad estructural de la totalidad de la losa peatonal.

3.4 Control de Calidad y Protección de Obras Terminadas

- Mantener la protección con lona verde sobre las superficies de concreto estampado durante el periodo mínimo de curado de 7 días, restringiendo el tránsito de personas y maquinaria no autorizada.

- Programar la aplicación del sellante de juntas con alquitrán (ítem 16 — 0% de ejecución) en la totalidad de los tramos ya pavimentados, como medida preventiva ante la expansión térmica del concreto en clima tropical.
- Ejecutar el aseo general de obras (ítem 17) de manera progresiva por tramos culminados, garantizando la entrega de espacios en condiciones óptimas de transpirabilidad y presentación ante la comunidad beneficiaria.

3.5 Gestión Ambiental de Residuos (RCD)

- Continuar con el aprovechamiento del material RCD como relleno en los tramos pendientes, garantizando su clasificación, acopio y disposición conforme a la normativa ambiental aplicable en Leticia, Amazonas.
- Mantener un registro fotográfico y documental del manejo de RCD como soporte ante la interventoría y la entidad contratante, en cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra.

3.6 Control Topográfico Continuo

- Continuar el acompañamiento topográfico permanente en los tramos pendientes, verificando que las pendientes longitudinales y transversales garanticen el drenaje superficial hacia las cunetas y eviten la acumulación de agua sobre los andenes.
- Realizar verificación de cotas de nivel en los tramos ya construidos antes de la aplicación del sellante de juntas, con el fin de detectar y corregir oportunamente cualquier desviación respecto al diseño original.

4. CONSIDERACIONES FINALES

El avance global del Corte de Obra N° 2 refleja un comportamiento satisfactorio en la ejecución de las actividades de mayor complejidad técnica: pavimentación en concreto estampado, construcción de bordillos y conformación de la estructura de pavimento, todas culminadas en los tramos intervenidos. Sin embargo, el proyecto presenta un saldo por ejecutar del 19,35%, concentrado principalmente en las cunetas en V, cajas sumidero, juntas de dilatación y aseo general de obras, actividades determinantes para la funcionalidad hidráulica y la entrega definitiva a la comunidad.

La interventoría recomienda al contratista trasladar el nivel de organización y recursos evidenciado en las actividades de pavimentación hacia los frentes pendientes, con énfasis prioritario en las cunetas en V, cuya ejecución oportuna es condición necesaria para garantizar la durabilidad y funcionalidad de los andenes peatonales ya construidos.



OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PEATONALES CEL
NIT. 902007682-7

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIZACION Y REPLANTEO	
	


ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	
	

DEMOLICIONES	
	

EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	
	

NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	
	

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	
	

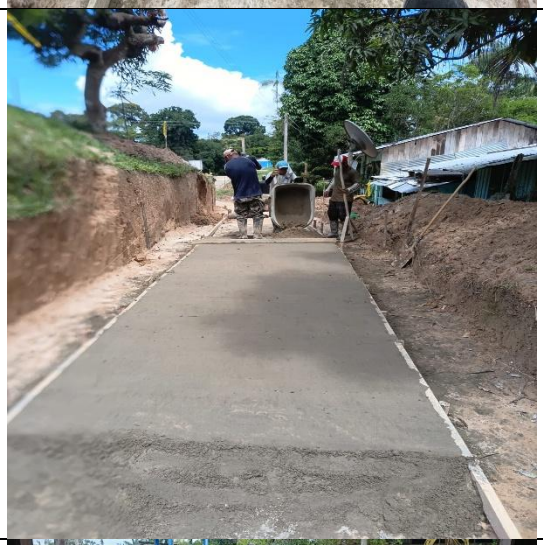BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	
	
	
	


REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15)






CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI

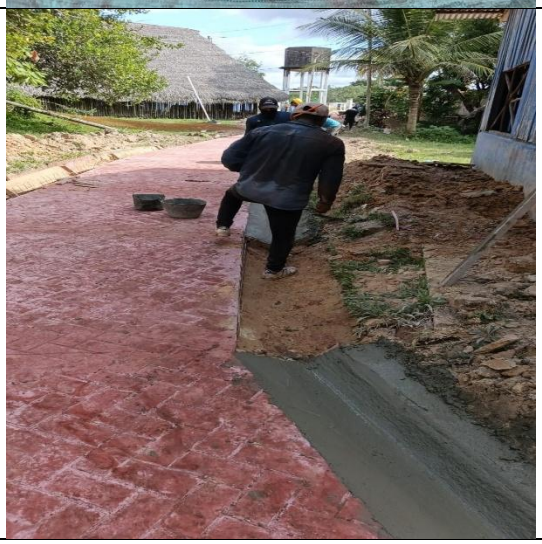

ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO – INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	
	

CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	
	

ANEXO 2: *CORTE DE OBRA No. 02*

CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO: 2594-2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL AMAZONAS

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PEATONALES CEL

INTERVENTORÍA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S

1. IDENTIFICACIÓN			2. CANTIDADES CONTRACTUALES			2. CORTE DE OBRA N° 1			3. SALDO ANTES DE MODIFICAR		4. BALANCE MAYORES / MENORES			5. PRESUPUESTO ACTUALIZADO			6. CORTE DE OBRA N° 2			7. SALDO EJECUTADO ACUMULADO		8. SALDO POR EJECUTAR		
Nº	Descripción	Und	Cant. Original	VU Original	Valor Original	Cant. Ejecutada	Valor Corte 1	% Avance Físico	Cant. Saldo (pre-modif)	Valor Saldo (pre-modif)	Δ Cantidad (+may / −men)	Valor Modificación	Tipo	Cant. Vigente	VU Vigente	Valor Vigente	Cant. Ejecutada	Valor Corte 2	% Avance Físico	Valor Por Ejecutar	% Ejecutado	Cant. Por Ejecutar	Valor Por Ejecutar	% por ejecutar
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$10.139	$51.039.726	4.499,64	$45.621.830	89,4%	534,36	$5.417.896	-0,40	-$4.056	Menor	5.033,60	$10.139	$51.035.670	533,96	$5.413.841	10,61%	$ 51.035.670,40	100,0%	0,00	$0	0,0%
2	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$2.535	$12.292.215	0,00	$0	0,0%	4.849,00	$12.292.215	-894,19	-$2.266.771	Menor	3.954,81	$2.535	$10.025.444	3954,81	$10.025.444	100,00%	$ 10.025.444,36	100,0%	0,00	$0	0,0%
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$108.293	$8.663.440	48,00	$5.198.064	60,0%	32,00	$3.465.376	28,74	$3.112.661	Mayor	108,74	$108.293	$11.776.101	60,74	$6.578.037	55,86%	$ 11.776.101,37	100,0%	0,00	$0	0,0%
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$105.559	$56.474.065	415,91	$43.903.020	77,7%	119,09	$12.571.045	294,57	$31.094.001	Mayor	829,57	$105.559	$87.568.066	413,66	$43.665.045	49,86%	$ 87.568.065,95	100,0%	0,00	$0	0,0%
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$16.703	$84.082.902	3.126,84	$52.227.575	62,1%	1.907,16	$31.855.327	-117,50	-$1.962.684	Menor	4.916,50	$16.703	$82.120.218	1789,66	$29.892.643	36,40%	$ 82.120.218,43	100,0%	0,00	$0	0,0%
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$1.603.215	$3.206.430	0,00	$0	0,0%	2,00	$3.206.430	0,00	$0	Sin cambio	2,00	$1.603.215	$3.206.430	1,00	$1.603.215	50,00%	$ 1.603.215,00	50,0%	1,00	$1.603.215	50,0%
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$702.267	$8.427.204	0,00	$0	0,0%	12,00	$8.427.204	0,00	$0	Sin cambio	12,00	$702.267	$8.427.204		$0	0,00%	$ 0,00	0,0%	12,00	$8.427.204	100,0%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$115.004	$28.981.008	218,66	$25.146.775	86,8%	33,34	$3.834.233	-31,88	-$3.666.286	Menor	220,12	$115.004	$25.314.722	1,46	$167.947	0,66%	$ 25.314.721,53	100,0%	0,00	$0	0,0%
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$1.608.146	$480.835.654	185,86	$298.891.624	62,2%	113,14	$181.944.030	0,20	$321.629	Mayor	299,20	$1.608.146	$481.157.283	113,34	$182.265.659	37,88%	$ 481.157.283,20	100,0%	0,00	$0	0,0%
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$21.577	$174.946.316	4.543,75	$98.040.597	56,0%	3.564,25	$76.905.719	669,47	$14.445.197	Mayor	8.777,47	$21.577	$189.391.513	4050,48	$87.397.261	46,15%	$ 185.437.857,89	97,9%	183,23	$3.953.655	2,1%
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$2.867.009	$857.235.691	185,86	$532.865.160	62,2%	113,14	$324.370.531	0,20	$573.402	Mayor	299,20	$2.867.009	$857.809.093	113,34	$324.943.933	37,88%	$ 857.809.092,80	100,0%	0,00	$0	0,0%
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$39.316	$138.392.320	2.186,60	$85.968.366	62,1%	1.333,40	$52.423.954	0,00	$0	Sin cambio	3.520,00	$39.316	$138.392.320	1333,40	$52.423.954	37,88%	$ 138.392.320,00	100,0%	0,00	$0	0,0%
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$234.100	$802.494.800	2.186,60	$511.883.060	63,8%	1.241,40	$290.611.740	59,00	$13.811.900	Mayor	3.487,00	$234.100	$816.306.700	1300,40	$304.423.640	37,29%	$ 816.306.700,00	100,0%	0,00	$0	0,0%
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40	$3.382.951	$8.119.082	0,00	$0	0,0%	2,40	$8.119.082	-0,90	-$3.044.656	Menor	1,50	$3.382.951	$5.074.427		$0	0,00%	$ 0,00	0,0%	1,50	$5.074.427	100,0%
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$237.851	$815.353.228	0,00	$0	0,0%	3.428,00	$815.353.228	-259,66	-$61.761.560	Menor	3.168,34	$237.851	$753.591.668	501,77	$119.347.448	15,84%	$ 119.347.447,67	15,8%	2.666,56	$634.244.221	84,2%
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$13.412	$13.371.764	0,00	$0	0,0%	997,00	$13.371.764	697,00	$9.348.164	Mayor	1.694,00	$13.412	$22.719.928		$0	0,00%	$ 0,00	0,0%	1.694,00	$22.719.928	100,0%
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$2.357	$11.865.138	0,00	$0	0,0%	5.034,00	$11.865.138	-0,40	-$943	Menor	5.033,60	$2.357	$11.864.195		$0	0,00%	$ 0,00	0,0%	5.033,60	$11.864.195	100,0%
VALORES					**$3.555.780.983,00**		**$1.699.746.070**	**47,8%**		**$1.856.034.913**						**$3.555.780.983**		**$1.168.148.068,00**		**$2.867.894.139,00**	**80,65%**		**$687.886.845,00**	**19,35%**

CONTROL DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	3.555.780.983,00
VALOR ANTICIPO 50%	$	1.777.890.491,50
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	1.699.746.070,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$	1.168.148.068,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 2	$	584.074.034,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2	$	584.074.034,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE OBRA		80,65%

FIRMAS DE APROBACIÓN

Nombre: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Entidad: RCONSORCIO PEATONALES CEL
C.C. N°: CC. 1.032.364.610 DE BOGOTA

Nombre: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA SAS 2025
C.C. N°: CC. 93.123.714 ESPINAL, TOLIMA

Nombre: ROBIN CÁRDENAS PAREDES
Cargo: Director de Infraestructura
Entidad: GOBERNACION DE AMAZONAS
C.C. N°:

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**1,0**	**UND:**	**M2**	**CAP:**	
DESC:	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,86		717,54		717,54	OK
2	EJE 2	85,083	2,86		243,34		243,34	OK
3	EJE 3	166,270	2,86		475,53		475,53	OK
4	RAMAL - EJE A	67,438	2,86		192,87		192,87	ok
5	EJE A-1	74,059	2,86		211,81		211,81	ok
6	EJE A-2	130,185	2,86		372,33		372,33	ok
7	EJE B	269,108	2,86		769,65		769,65	ok
8	EJE C	220,353	2,86		630,21		630,21	ok
9	EJE D	36,741	2,86		105,08		105,08	ok
10	EJE - ACCESO - CENTRO DE SALUD	5,216	2,86		14,92		14,92	ok
11	EJE - ACCESO - SALÓN COMUNAL	5,535	2,86		15,83		15,83	ok
12	EJE - ACCESO - C. D. I.	9,867	2,86		28,22		28,22	ok
13	EJE - ACCESO - IGLESIA 1	34,805	2,86		99,54		99,54	ok
14	EJE - ACCESO - IGLESIA 2	5,728	2,86		16,38		16,38	ok
15	EJE - ACCESO - MALOKA ESTE	10,495	2,86		30,02		30,02	ok
16	EJE - ACCESO - MALOKA OESTE	10,619	2,86		30,37		30,37	ok
17	EJE 1 NUEVO JARDIN	71,703	2,86		205,07		205,07	ok
18	EJE 2 NUEVO JARDIN	34,776	2,86		99,46		99,46	ok
19	EJE A NUEVO JARDIN	181,946	2,86		520,37		520,37	ok
20	EJE B NUEVO JARDIN	82,716	2,86		236,57		236,57	ok
21	EJE - ACCESO - IGLESIA	6,470	2,86		18,50		18,50	ok

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**5.033,60**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	4.499,64	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+533,9620**	**CANTIDAD A COBRAR**

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**2,0**	**UND:**	**M2**	**CAP:**	
DESC:	**ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESQUEMA / PLANO DE LOCALIZACIÓN



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**AREA**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2)**	**Observaciones**
1					0,00		0,00	
2	AREA A DEMOLER DE ANDENES EXISTENTE, DE LA MEMORIA ITEM 3			-1.078,79	0,00		-1.078,79	SE DESCUENTA DADO A QUE EL AREA CORRESPONDIENTE A LA DEMOLICION NO SE REALIZO DESCAPOTE
3	AREA TOTAL DE INTERVENCION	1.760,00	2,86	5.033,60	0,00		5.033,60	
4					0,00		0,00	
5					0,00		0,00	
6					0,00		0,00	
7					0,00		0,00	
8					0,00		0,00	
9					0,00		0,00	
10					0,00		0,00	
11					0,00		0,00	
12					0,00		0,00	
13					0,00		0,00	
14					0,00		0,00	
15					0,00		0,00	
16					0,00		0,00	
17					0,00		0,00	
18					0,00		0,00	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**3.954,81**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	0,00	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+3.954,81**	**CANTIDAD A COBRAR**

CESAR AGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**3,0**	**UND:**	**M3**	**CAP:**	
DESC:	**DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M3)**	**Observaciones**
1	EJE 1 SANTA SOFIA	191,00	1,20	0,10	229,20		22,92	
2	EJE 2 SANTA SOFIA	84,37	1,20	0,10	101,24		10,12	
3	EJE 3 SANTA SOFIA	119,98	1,20	0,10	143,97		14,40	
4	EJE A SANTA SOFIA	73,59	1,20	0,10	88,31		8,83	
5	EJE B SANTA SOFIA	183,00	1,20	0,10	219,60		21,96	
6	EJE C SANTA SOFIA	172,00	1,20	0,10	206,40		20,64	
7	LARGO DE CANCHA EN NUEVO JARDIN	25,50	1,70	0,10	43,35		4,34	
	RAMPA ACCESO NUEVO JARDIN	1,70	0,50	0,10	0,85		0,09	
	DADO EN CONCRETO COSTADO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0,30	0,30	1,60	0,14	6	0,86	
	EJE A NUEVO JARDIN COSTADO CASETA COMUNAL	38,218	1,20	0,10	45,86	1	4,59	
				AREA	1.078,79			

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**108,74**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	48,00	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+60,74**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70702-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**4,0**	**UND:**	**M3**	**CAP:**	
DESC:	**EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M3)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,86	0,16	113,29		113,29	
2	EJE 2	85,083	2,86	0,22	53,84		53,84	
3	EJE 3	166,270	2,86	0,19	88,44		88,44	
4	RAMAL-EJE A	67,438	2,86	0,07	13,52		13,52	
5	EJE A-1	73,590	2,86	0,17	35,42		35,42	
6	EJE A-2	130,190	2,86	0,34	126,72		126,72	
7	EJE B	269,108	2,86	0,13	101,54		101,54	
8	EJE C	220,353	2,86	0,21	129,49		129,49	
9	EJE D	36,741	2,86	0,17	17,55		17,55	
10	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,86	0,18	5,06		5,06	
11	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,86	0,18	2,75		2,75	
12	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,86	0,19	18,48		18,48	
13	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,86	0,33	5,34		5,34	
14	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,500	2,86	0,20	5,91		5,91	
15	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,620	2,86	0,14	4,20		4,20	
16	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,86	0,25	3,88		3,88	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,86	0,10	21,28		21,28	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,86	0,15	15,27		15,27	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,86	0,14	74,70		74,70	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,86	0,13	31,38		31,38	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,86	0,30	5,57		5,57	
22	DESCUENTO POR AJUSTE DE BALANCE (CORRELACIÓN CUNETA)	293,7		0,1500	-44,0497		-44,0497	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**829,57**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	415,91	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+413,66**	**CANTIDAD A COBRAR**

Cesar Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**5,0**	**UND:**	**M2**	**CAP:**	
DESC:	**NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,86		717,54		717,54	
2	EJE 2	85,083	2,86		243,34		243,34	
3	EJE 3	166,270	2,86		475,53		475,53	
4	RAMAL-EJE A	67,438	2,86		192,87		192,87	
5	EJE A-1	74,059	2,86		211,81		211,81	
6	EJE A-2	130,185	2,86		372,33		372,33	
7	EJE B	269,108	2,86		769,65		769,65	
8	EJE C	220,353	2,86		630,21		630,21	
9	EJE D	36,741	2,86		105,08		105,08	
10	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,86		28,22		28,22	
11	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,86		14,92		14,92	
12	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,86		99,54		99,54	
13	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,86		16,38		16,38	
14	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	2,86		30,02		30,02	
15	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	2,86		30,37		30,37	
16	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,86		15,83		15,83	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,86		205,07		205,07	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,86		99,46		99,46	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,86		520,37		520,37	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,86		236,57		236,57	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,86		18,50		18,50	
	TRAMO A DESCONTAR EN NUEVO JARDIN	-40,9	2,86		-117,105		-117,10	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**4.916,50**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	3.126,84	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1.789,657**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70402 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**6,0**	**UND:**	**UND**	**CAP:**	
DESC:	**CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Cant.**			**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2)**	**Observaciones**
1	CAJA SUMIDERO Nº 1 EJE 1				1,00		1,00	
2	CAJA SUMIDERO Nº 2				0,00		0,00	No ejecutada en este corte
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**1,00**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	0,00	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1,000**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	8,0	UND:	M3	CAP:	
DESC:	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**Nº Elem.**	**Subtotal (M3)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,860	0,051	36,500		36,500	
2	EJE 2	85,083	2,860	0,048	11,755		11,755	
3	EJE 3	166,270	2,860	0,048	23,038		23,038	
4	RAMAL-EJE A	67,438	2,860	0,050	9,696		9,696	
5	EJE A-1	74,059	2,860	0,049	10,291		10,291	
6	EJE A-2	130,185	2,860	0,049	18,143		18,143	
7	EJE B	269,108	2,860	0,049	37,611		37,611	
8	EJE C	220,353	2,860	0,049	30,886		30,886	
9	EJE D	36,741	2,860	0,049	5,165		5,165	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,860	0,049	0,737		0,737	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,860	0,050	0,794		0,794	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,860	0,049	1,391		1,391	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,860	0,050	4,934		4,934	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,860	0,050	0,814		0,814	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,500	2,860	0,050	1,497		1,497	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,620	2,860	0,050	1,518		1,518	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,860	0,050	10,338		10,338	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,860	0,051	5,028		5,028	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,860	0,051	26,380		26,380	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,860	0,051	12,026		12,026	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,860	0,051	0,943		0,943	
22	DESCUENTO POR AJUSTE DE BALANCE (CORRELACIÓN CUNETA)	293,7		0,10	-29,3665		-29,3665	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**220,12**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	218,66	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1,46**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**9,0**	**UND:**	**M3**	**CAP:**	
DESC:	**BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**Alto/Esp**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M3)**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,89	1,70	0,10	42,65		42,65	
2	EJE 2	85,08	1,70	0,10	14,46		14,46	
3	EJE 3	166,27	1,70	0,10	28,27		28,27	
4	RAMAL-EJE A	67,44	1,70	0,10	11,46		11,46	
5	EJE A-1	74,06	1,70	0,10	12,59		12,59	
6	EJE A-2	130,19	1,70	0,10	22,13		22,13	
7	EJE B	269,11	1,70	0,10	45,75		45,75	
8	EJE C	220,35	1,70	0,10	37,46		37,46	
9	EJE D	36,74	1,70	0,10	6,25		6,25	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,22	1,70	0,10	0,89		0,89	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,54	1,70	0,10	0,94		0,94	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,87	1,70	0,10	1,68		1,68	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,81	1,70	0,10	5,92		5,92	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,73	1,70	0,10	0,97		0,97	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,50	1,70	0,10	1,78		1,78	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,62	1,70	0,10	1,81		1,81	
17	EJE 1 (NJ)	71,70	1,70	0,10	12,19		12,19	
18	EJE 2 (NJ)	34,78	1,70	0,10	5,91		5,91	
19	EJE A (NJ)	181,95	1,70	0,10	30,93		30,93	
20	EJE B (NJ)	82,72	1,70	0,10	14,06		14,06	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,47	1,70	0,10	1,10		1,10	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**299,20**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	185,86	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+113,34**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**10,0**	**UND:**	**kg**	**CAP:**	
DESC:	**REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**PESO KG/M2**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (KG**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,40	2,08	1.251,22		1.251,22	
2	EJE 2	85,083	2,40	2,08	424,33		424,33	
3	EJE 3	166,270	2,40	2,08	829,22		829,22	
4	RAMAL-EJE A	67,438	2,40	2,08	336,33		336,33	
5	EJE A-1	74,059	2,40	2,08	369,35		369,35	
6	EJE A-2	130,185	2,40	2,08	649,26		649,26	
7	EJE B	269,108	2,40	2,08	1.342,10		1.342,10	
8	EJE C	220,353	2,40	2,08	1.098,94		1.098,94	
9	EJE D	36,741	2,40	2,08	183,23			
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,40	2,08	26,01		26,01	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,40	2,08	27,60		27,60	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,40	2,08	49,21		49,21	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,40	2,08	173,58		173,58	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,40	2,08	28,57		28,57	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	2,40	2,08	52,34		52,34	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	2,40	2,08	52,96		52,96	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,40	2,08	357,60		357,60	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,40	2,08	173,43		173,43	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,40	2,08	907,40		907,40	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,40	2,08	412,52		412,52	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,40	2,08	32,27		32,27	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**8.594,24**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	4.543,75	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+4.050,48**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**11,0**	**UND:**	**M3**	**CAP:**	
DESC:	**CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESQUEMA / PLANO DE LOCALIZACIÓN



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**ESPESOR**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M3**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	1,70	0,10	42,65		42,65	
2	EJE 2	85,083	1,70	0,10	14,46		14,46	
3	EJE 3	166,270	1,70	0,10	28,27		28,27	
4	RAMAL-EJE A	67,438	1,70	0,10	11,46		11,46	
5	EJE A-1	74,059	1,70	0,10	12,59		12,59	
6	EJE A-2	130,185	1,70	0,10	22,13		22,13	
7	EJE B	269,108	1,70	0,10	45,75		45,75	
8	EJE C	220,353	1,70	0,10	37,46		37,46	
9	EJE D	36,741	1,70	0,10	6,25		6,25	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	1,70	0,10	0,89		0,89	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	1,70	0,10	0,94		0,94	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	1,70	0,10	1,68		1,68	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	1,70	0,10	5,92		5,92	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	1,70	0,10	0,97		0,97	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	1,70	0,10	1,78		1,78	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	1,70	0,10	1,81		1,81	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	1,70	0,10	12,19		12,19	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	1,70	0,10	5,91		5,91	
19	EJE A (NJ)	181,946	1,70	0,10	30,93		30,93	
20	EJE B (NJ)	82,716	1,70	0,10	14,06		14,06	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	1,70	0,10	1,10		1,10	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**299,20**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	185,86	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+113,34**	**CANTIDAD A COBRAR**

Cesar Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP. 7020 - 434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**12,0**	**UND:**	**M2**	**CAP:**	
DESC:	**ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**ESPESOR**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (M2**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	2,00	1,00	501,77		501,77	
2	EJE 2	85,083	2,00	1,00	170,17		170,17	
3	EJE 3	166,270	2,00	1,00	332,54		332,54	
16	RAMAL-EJE A	67,438	2,00	1,00	134,88		134,88	
4	EJE A-1	74,059	2,00	1,00	148,12		148,12	
5	EJE A-2	130,185	2,00	1,00	260,37		260,37	
6	EJE B	269,108	2,00	1,00	538,22		538,22	
7	EJE C	220,353	2,00	1,00	440,71		440,71	
8	EJE D	36,741	2,00	1,00	73,48		73,48	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	2,00	1,00	10,43		10,43	
15	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	2,00	1,00	11,07		11,07	
9	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	2,00	1,00	19,73		19,73	
11	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	2,00	1,00	69,61		69,61	
12	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	2,00	1,00	11,46		11,46	
13	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	2,00	1,00	20,99		20,99	
14	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	2,00	1,00	21,24		21,24	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	2,00	1,00	143,41		143,41	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	2,00	1,00	69,55		69,55	
19	EJE A (NJ)	181,946	2,00	1,00	363,89		363,89	
20	EJE B (NJ)	82,716	2,00	1,00	165,43		165,43	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	2,00	1,00	12,94		12,94	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**3.520,00**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	2.186,60	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1.333,40**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**13,0**	**UND:**	**ML**	**CAP:**	
DESC:	**CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**ESPESOR**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (ML**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887	0,00	1,00	0,00	2	501,77	
2	EJE 2	85,083	0,00	0,00	0,00	2	170,17	
3	EJE 3	166,270	0,00	0,00	0,00	2	332,54	
4	RAMAL-EJE A	67,438	0,00	0,00	0,00	2	134,88	
5	EJE A-1	74,059	0,00	0,00	0,00	2	148,12	
6	EJE A-2	130,185	0,00	0,00	0,00	2	260,37	
7	EJE B	269,108	0,00	0,00	0,00	2	538,22	
8	EJE C	220,353	0,00	0,00	0,00	2	440,71	
9	EJE D	36,741	0,00	0,00	0,00	2	73,48	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216	0,00	0,00	0,00	2	10,43	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535	0,00	0,00	0,00	2	11,07	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867	0,00	0,00	0,00	2	19,73	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805	0,00	0,00	0,00	2	69,61	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728	0,00	0,00	0,00	2	11,46	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495	0,00	0,00	0,00	2	20,99	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619	0,00	0,00	0,00	2	21,24	
17	EJE 1 (NJ)	71,703	0,00	0,00	0,00	2	143,41	
18	EJE 2 (NJ)	34,776	0,00	0,00	0,00	2	69,55	
19	EJE A (NJ)	181,946	0,00	0,00	0,00	2	363,89	
20	EJE B (NJ)	82,716	0,00	0,00	0,00	2	165,43	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,470	0,00	0,00	0,00	2	12,94	
	TRAMOS A DESCONTAR POR INTERCCIONES	2,75				12	-33,00	

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD EJECUTADA	**3.487,00**	
CANTIDAD COBRADA EN ACTA PARCIAL # 1	2.186,60	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+1.300,40**	**CANTIDAD A COBRAR**

Cesar Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP: 70202-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE TÉCNICO PARA CORTE DE OBRA # 2

CONTRATO:	2594-2025	**HOJA:**	1 DE 1
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		
FECHA:	MAYO 2025	**REVISÓ:**	CONSORCIO PEATONALES CEL
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEATONALES CEL	**APROBÓ:**	SINERGIA SAS
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S		

SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM:	**15,0**	**UND:**	**ML**	**CAP:**	
DESC:	**CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS**				

SECCIÓN 2 — ESQUEMA (SIN ESCALA) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

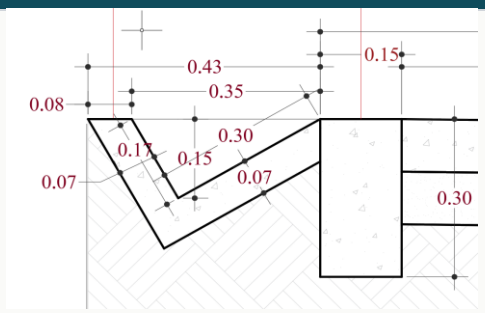

Fuente: Plano de diseño / levantamiento topográfico



Fuente: Registro fotográfico de campo

SECCIÓN 3 — MEMORIA DE CÁLCULO (DETALLE DE MEDICIONES)

		DIMENSIONES (m)						
Nº	**LOCALIZACIÓN / TRAMO / ELEMENTO**	**Largo**	**Ancho**	**ESPESOR**	**Cant. Parcial**	**N° Elem.**	**Subtotal (ML**	**Observaciones**
1	EJE 1	250,887			0,00	2	501,77	
2	EJE 2	85,083			0,00	0	0,00	
3	EJE 3	166,270			0,00		0,00	
4	RAMAL-EJE A	67,438			0,00		0,00	
5	EJE A-1	74,059			0,00		0,00	
6	EJE A-2	130,185			0,00		0,00	
7	EJE B	269,108			0,00		0,00	
8	EJE C	220,353			0,00		0,00	
9	EJE D	36,741			0,00		0,00	
10	EJE-ACCESO C. SALUD (SS)	5,216			0,00		0,00	
11	EJE-ACCESO-SALÓN COMUNAL	5,535			0,00		0,00	
12	EJE-ACCESO C. D. I.	9,867			0,00		0,00	
13	EJE-ACCESO IGLESIA (SS)	34,805			0,00		0,00	
14	EJE-ACCESO IGLESIA 2 (SS)	5,728			0,00		0,00	
15	EJE-ACCESO MALOKA ESTE	10,495			0,00		0,00	
16	EJE-ACCESO MALOKA OESTE	10,619			0,00		0,00	
17	EJE 1 (NJ)	71,703			0,00		0,00	SE RESTA EL COSTADO DERECHO DE LA CANCHA
18	EJE 2 (NJ)	34,776			0,00		0,00	
19	EJE A (NJ)	181,946			0,00		0,00	
20	EJE B (NJ)	82,716			0,00		0,00	
21	EJE-ACCESO IGLESIA (NJ)	6,47			0,00		0,00	
22	TRAMOS A DESCONTAR POR INTERCCIONES	2,75			0,00		0,00	
23	DESCUENTO POR AJUSTE DE BALANCE (CORRELACIÓN CUNETA)	293,7					0,0000	Reducción correlacionada con items 4, y 8

SECCIÓN 4 — TOTALIZACIÓN Y CRUCE CON SALDO CONTRACTUAL

CANTIDAD TOTAL CALCULADA (requerida para completar la obra)	**501,77**	
Cantidad contractual (saldo por ejecutar pre-modificatoria)	0,00	
Δ CANTIDAD (DIFERENCIA)	**+501,77**	**CANTIDAD A COBRAR**

César Augusto Gasca Vargas
INGENIERO CIVIL
MP 76202-434454 TLM

CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS
Residente de Obra
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIEGO ALEJANDRO MORALES CORTES
Residente de Interventoría
SINERGIA SAS

ANEXO 3: *INFORME SG-SST*

INFORME MENSUAL No. 05
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CONTRATO DE OBRA No. 2594-2025

OBRA
CONSORCIO PEATONALES CEL
NIT. 902007682-7

INTERVENTORÍA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S
NIT. 901.730.540-6

01 AL 28 DE MAYO DE 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
2.1. Objetivo General 4
2.2. Objetivos Específicos 4
3. GENERALIDADES 5
3.1. Descripción del Proyecto 5
3.2. Pólizas 5
4. ACTIVIDADES REALIZADAS 6
5. RELACIÓN PERSONAL EN OBRA 7
5.1. Control de Aportes Legales y Seguridad Social 7
6. ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL 11
7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
7.1. Control al Pago de Seguridad Social 14
7.2. Revisión y control de las afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social 14
7.3. Estadística de ausentismo y accidentalidad 15
7.4. Señalización frentes de obra y sitios temporales 16
8. CAPACITACIONES, INDUCCIONES Y CHARLAS 16
8.1. Inducciones 16
8.2. Capacitaciones y charlas 17
9. MAQUINARIA Y EQUIPOS 18
9.1. Relación maquinaria, herramientas y equipos 18
9.2. Inspecciones a instalaciones de maquinaria y equipos 19
10. ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 19
10.1. Cumplimiento de la Entrega de Dotación 20
10.2. Suministro y reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) 20
11. ANEXOS 20

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información General del Proyecto 5
Tabla 2. Relación Garantías del Proyecto 5
Tabla 3. Profesional en Obra 7
Tabla 4. Personal Ingreso 8
Tabla 5. Personal Desvinculado 8
Tabla 6. Personal Operativo en Obra 10
Tabla 7. Indicadores ATEL 15
Tabla 8. Registro a Inducción de Personal 17
Tabla 10. Registro Capacitaciones a Personal 17
Tabla 11. Registro Charlas Diarias a Personal 18
Tabla 12. Relación maquinaria y equipo menor 19
Tabla 13. Relación inspecciones realizadas 19

1. INTRODUCCIÓN

La seguridad y salud en el trabajo es un área multidisciplinar relacionada con la seguridad, salud y la calidad de vida de las personas en la ocupación. El CONSORCIO PEATONES CEL, adopta las diferentes políticas, reglamentos y procesos que impactan el SG SST y establecen los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento. Este documento describe el compromiso asumido por la organización estableciendo una política de seguridad y salud en el trabajo la cual esta relacionada con los diferentes procesos productivos y administrativos de la entidad, además determina el alcance del sistema de gestión, las responsabilidad de los diferentes participantes del consorcio en el y se presenta información general de las actividades adelantadas, procedimientos e instructivos generados durante el mes de mayo de 2026, que permitirán el desarrollo del sistema de gestión involucrado a todos los niveles de la organización en su implementación basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), permitiendo así mejorar los procesos con un alto desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente dar cumplimiento a la resolución 0312 de 2019, la resolución 666 de 2020 y la resolución 0223 de 2021.

Acorde con normatividad emitida por el Ministerio de Trabajo con el ánimo de promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y controlar los factores de riesgo que pueden afectar a sus servidores, visitantes y contratistas a través de accidentes o enfermedades laborales en las instalaciones de la entidad.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) el CONSORCIO PEATONES CEL, realizara la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la dirección y de todos los trabadores con los principios de Seguridad y Salud en el Trabajo y conservación del medio ambiente, por ello, se inicia el acompañamiento y verificación de las actividades pre-constructivas y el diseño de planeación cumpliendo así con el plan de seguridad y salud en el trabajo elaborado para la obra.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del proyecto “CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.

2.2. Objetivos Específicos

- Dar cumplimiento a los criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos dentro del contrato de obra No. 2594 de 2025.
- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y los resultados de la aplicación de la Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como la reducción de incidencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentados en la ejecución del proyecto.
- Realizar seguimiento al CONSORCIO PEATONES CEL sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en obra y establecer los respectivos controles.
- Evaluar las condiciones laborales que puedan afectar al trabajador, a las instalaciones, al equipo y maquinaria y en general a toda la obra, manteniendo las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores.
- Verificar el cumplimiento de las actividades, tareas y requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de promover las mejoras pertinentes con respecto al cuidado y protección del bienestar físico de los trabajadores.
- Constatar cada una de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que el contratista debe desarrollar durante el avance del proyecto.

3. GENERALIDADES

3.1. Descripción del Proyecto

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
NÚMERO DE CONTRATO:	**No. 2594-2025**	
DATOS DEL CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
OBJETO DE CONTRATO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	
DATOS DEL CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO PEATONALES CEL
	SUSCRITO CONTRATO – REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
VALOR DEL CONTRATO:	**$3.555.780.983,00**	
FECHA DE CONTRATO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	180 DÍAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL

Tabla 1. *Información General del Proyecto*

3.2. Pólizas

GARATÍAS						
AMPARO	No PÓLIZA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA	VIGENCIA		COMPAÑÍA SEGURO
				DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	$711.156.196.60	$7,527,600.00	10-11-2025	15-10-2026	SEGUROS DEL ESTADO SA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101484742	$1,777,890,491.50		10-11-2025	15-10-2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101484742	$177,789,049.15		10-11-2025	15-06-2029	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101484742	$355,578,098.30		30-12-2025	30-12-2030	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-44-101265750	$569,400,000.00	$235,620.00	10-11-2025	15-06-2026	

Tabla 2. *Relación Garantías del Proyecto*

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se relacionan las actividades que se han desarrollado durante el periodo reportado, como ecuánime de realizar un trabajo en conjunto entre el contratista de obra e interventoría, en pro de manejar y velar por la seguridad en obra de los miembros de todo el equipo de trabajo dispuesto en la zona de influencia del proyecto y sus labores:


- Se realiza reposición de EPP en mal estado a todo el personal que lo requirió.
- Se colocó cerramiento en lona verde en las áreas luego de realizarse el vaciado de concreto, los cuales fueron reubicados según dinámica de la ejecución de la obra.
- Se realizó recorrido y supervisión diaria a los trabajadores de las distintas actividades.
- Se realizaron las capacitaciones y charlas de seguridad conforme al cronograma de charlas.
- Se ha exigido el llenado de formatos como ATS, Permisos de Trabajo y Preoperacional antes del inicio de labores.
- Se realizó la inspección del extintor.
- Se ha realizado la inspección del botiquín y sus implementos.
- Se realizó la inspección de camilla en obra.
- Se realizó inspección de EPP’s
- Se realizó inspecciones de herramientas eléctricas.
- Se realizó inspección del almacén
- Se realizó inspección de los frentes de obra.
- Se hizo mantenimiento de los puntos de acopio para material agregado.
- Seguimiento al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- Seguimiento a la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

5. RELACIÓN PERSONAL EN OBRA

5.1. Control de Aportes Legales y Seguridad Social

Durante el periodo ejecutado, el personal de la empresa CONSORCIO PEATONES CEL se gestionó de la siguiente manera:

- Personal total (operativo y administrativo): 49 trabajadores en total.
- Profesionales de servicios: 6 personas vinculadas (Ver Tabla 3).
- Ingresos: 9 ayudantes de obra (Ver Tabla 4).
- Retiros: 3 personas desvinculada durante el periodo.
- Personal Operativo final: 43 trabajadores activos al cierre (Ver Tabla 5).

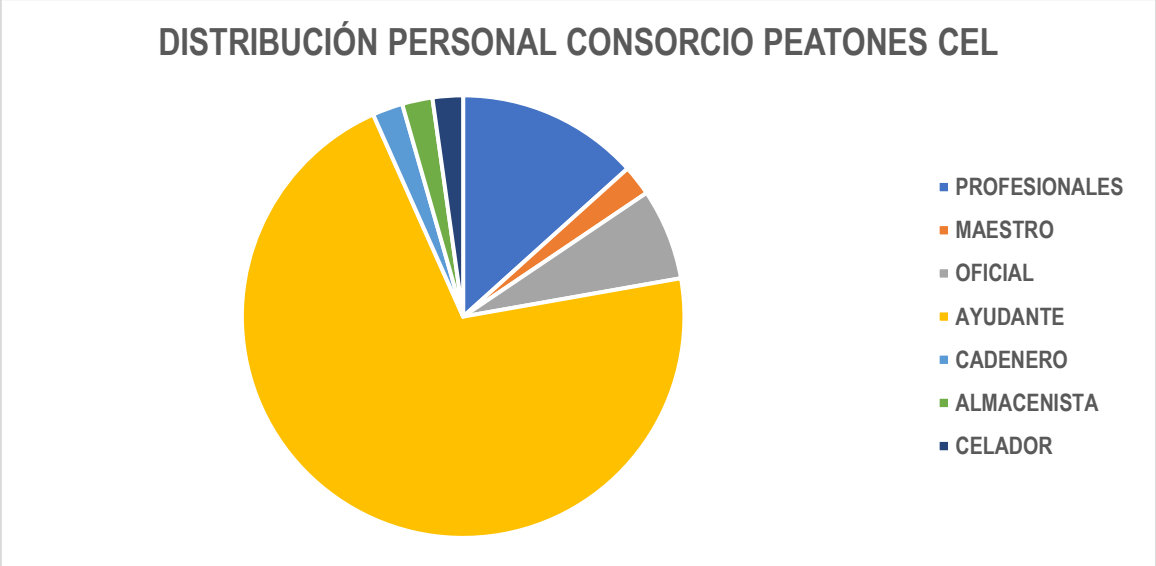

Gráfica 1. *Distribución de Personal*

PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA			
NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	% DEDICACIÓN
OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	1.032.364.610	Director de Obra	20%
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	1.147.686.840	Residente de Obra	100%
JAIME ALBERTO CASTRO RENGIFO	80.768.573	Ingeniero Ambiental	100%
ARLEY LEONOR DUARTE AMAYA	56.056.223	Trabajador Social Especialista en Salud Ocupacional	100%
JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	1.094.940.910	Tecnólogo En Topografía	10%
MARTHA AURORA GONZÁLEZ CELIS	51.809.026	Especialista De Pavimentos	10%

Tabla 3. *Profesional en Obra*

Los nuevos ingresos en el CONSORCIO PEATONES CEL se presentaron de la siguiente manera:

PERSONAL INGRESADO EN MAYO 2026							
	NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	SALUD	AFP	ARL	FECHA INGRESO
1	ADAN MURAYARI AYAMA	1.006.733.244	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
2	ALEX RAFAEL VASQUEZ TAPAYURI	1.122.702.047	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
3	ANDRES LOSADA CURICO	1.121.207.495	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
4	DIEGO MURAYARI AYAMA	1.006.733.242	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	6/05/2026
5	DIXSON GABRIEL AYAMA YAICATE	1.131.534.434	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
6	EDGAR COELLO PINEDA	1.131.534.148	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
7	GERALD ALEXIS CHOTA PEÑA	1.122.266.252	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	11/05/2026
8	JAIME LISANDRO PINEDA CASADO	1.121.209.556	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	6/05/2026
9	ROY ERIK AYAMA YAICATE	1.121.199.883	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	11/05/2026

Tabla 4. *Personal Ingreso*

PERSONAL DESVINCULADO EN MAYO 2026							
	NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	SALUD	AFP	ARL	FECHA RETIRO
1	LISARDO WILDER CARIHUASARI CAYETANO	6.566.668	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	01/05/2026
2	MARTIN FRANCISCO	1.121.446.557	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	01/05/2026
3	JHON CARLOS SANGAMA CUELLAR	1.007.682.297	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	01/05/2026

Tabla 5. *Personal Desvinculado*

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA							
	NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	SALUD	AFP	ARL	FECHA INGRESO
1	JAIR ANDREY GONZALEZ HENAO	93.400.332	MAESTRO DE OBRA	SANITAS	PROTECCION	SURA	26/01/2026
2	CARLOS ANDRES PARRA CAMELO	1.118.121.309	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	26/01/2026
3	YOLVER REVELO LEON	1.121.211.864	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	03/02/2026
4	DAVID CAHUCHI AHUANARY	6.565.823	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	23/02/2026
5	YETUR GARAY CAYETANO	1.121.200.963	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	26/01/2026
6	CRISTIAN DAVID REVELO DIAZ	1.007.769.189	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	26/01/2026
7	DIEGO ANDRES RAMOS VENTO	1.121.205.946	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	26/01/2026
8	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	15.877.597	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	26/01/2026
9	FREDY ANGEL VENTO LORENZO	1.007.366.231	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	26/01/2026
10	MILTON RAMOS VENTO	1.121.201.303	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	26/01/2026
11	JORGE REVELO LEON	6.566.886	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	26/01/2026
12	ROBERTH YANCA ALMEIDA	1.147.684.486	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	03/02/2026
13	JUAN CARLOS REVELO LEON	6.567.562	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	26/01/2026
14	LUIS JORGE DEL AGUILA RAMOS	15.875.906	SERVICIOS GENERALES	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	26/01/2026
15	YAISON CAHUACHE HUAHUARI	1.007.344.470	CADENERO	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	26/01/2026
16	HANSEL EDRIEGUER LEONARDO	1.006.739.912	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	03/02/2026
17	ELKIN FABRICIO YUCUNA YUCUNA	1.122.269.221	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	10/02/2026
18	RONI PARENTE SANTOS	15.877.726	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PROTECCION	SURA	10/02/2026
19	NILO MIGUEL ALMEIDA FERNANDEZ	1.121.204.626	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	10/02/2026
20	ROBERTO JOHN CASTILLO COELLO	1.007.769.132	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	10/02/2026

21	WILLY CAMILO FERNANDEZ RAMOS	1.007.628.288	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	10/02/2026
22	DIEGO NIXON RODRIGUEZ PURICHO	1.122.269.518	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	10/02/2026
23	CRISPIN ANTONIO PEREIRA	1.006.733.322	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	10/02/2026
24	OMAR DIEGO RAMOS CUELLAR	1.007.682.555	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	23/02/2026
25	ALCINDO FERNANDEZ ANGARITA	1.006.739.372	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	07/04/2026
26	FRANS FRANKLIN LEON	1.122.270.107	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	07/04/2026
27	JAIDER FERNANDEZ ANGARITA	1.121.212.338	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	07/04/2026
28	JUNIOR FABIAN QUINTERO MIJO	1.121.446.499	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	07/04/2026
29	LUIS ALBERTO RAMOS	1.121.210.537	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	07/04/2026
30	LUIS ALEJANDRO CAHUACHE GAMARRA	1.006.732.296	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	07/04/2026
31	OSCAR FERNANDEZ LORENZO PEDRO	1.006.739.428	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	07/04/2026
32	VILAN JESUS GARAY CAYETANO	15.879.858	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	07/04/2026
33	WILSON GERONIMO RAMOS ÑEÑETOFE	1.007.472.725	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	07/04/2026
34	YEISON ALEXANDER FERNANDEZ	1.121.197.024	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	07/04/2026
35	ADAN MURAYARI AYAMA	1.006.733.244	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
36	ALEX RAFAEL VASQUEZ TAPAYURI	1.122.702.047	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
37	ANDRES LOSADA CURICO	1.121.207.495	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
38	DIEGO MURAYARI AYAMA	1.006.733.242	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	6/05/2026
39	DIXSON GABRIEL AYAMA YAICATE	1.131.534.434	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
40	EDGAR COELLO PINEDA	1.131.534.148	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	11/05/2026
41	GERALD ALEXIS CHOTA PEÑA	1.122.266.252	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	COLPENSIONES	SURA	11/05/2026
42	JAIME LISANDRO PINEDA CASADO	1.121.209.556	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	6/05/2026
43	ROY ERIK AYAMA YAICATE	1.121.199.883	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	11/05/2026

Tabla 6. *Personal Operativo en Obra*

6. ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de mayo de 2026, se realizó:

- ✓ Rocería superficie, descapote y limpieza




- ✓ Demolición de vías peatonales en mal estado




- ✓ Excavación manual menor a 0.50mts y desalojo




✓ Nivelación y compactación del suelo




✓ Relleno con material seleccionado y compactado




✓ Base estabilizada en arena cemento 1:10 (e=0.10 mts)




✓ Refuerzos en acero concremalla # 5 mm (0.15*0.15)




✓ Concreto para pavimentos y bordillos 3000PSI




✓ Estampado en concreto color mineral tipo adoquín espigado




✓ Vaciado de concreto para cunetas



7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Conforme al cronograma de actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo establecido para la presente obra, a continuación, se presenta un resumen ejecutivo del cumplimiento de este.

7.1. Control al Pago de Seguridad Social

Teniendo en cuenta las fechas para el pago de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales del personal activo en obra, mensualmente se realiza la verificación de pago de seguridad social del periodo directo y contratista. En el anexo 1, se adjunta estos registros de pago.

7.2. Revisión y control de las afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social

Se realiza revisión y validación de las afiliaciones al sistema integral de seguridad social de todos los trabajadores de la obra, encontrándose todos en estado activo. El personal de CONSORCIO PEATONES CEL, se encuentra afiliado a la ARL SURA, los radicados de las afiliaciones del personal nuevo se pueden evidenciar en el Anexo 2.

Previo a la contratación del personal nuevo, se verificó la documentación de soporte correspondiente a las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP, ARL y Caja de Compensación Familiar).

7.3. Estadística de ausentismo y accidentalidad

Los indicadores de gestión son la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede señalar una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según sea el caso, evaluados bajo la Resolución 0312 de 2019:

FRECUENCIA DE ACCIDENTES: Mide cuántos accidentes de trabajo ocurren por cada 240.000 horas de exposición laboral. Permite evaluar la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso en la obra.
SEVERIDAD DE ACCIDENTES: Mide la gravedad de las lesiones calculando el número de días de incapacidad (perdidos o cargados) generados por cada 240.000 horas de trabajo.
AUSENTISMO LABORAL: Es la proporción de días de trabajo programados que se pierden debido a incapacidades médicas de cualquier origen (accidentes, enfermedades comunes o laborales).
INCIDENCIA Y PREVALENCIA: Indicadores de salud que miden la aparición de casos nuevos (incidencia) y la existencia de casos totales (prevalencia) de enfermedades causadas por la actividad de la construcción en la empresa.
HORAS HOMBRE TRABAJADAS (HHT): Es la variable de control que mide el tiempo real de exposición de los 39 trabajadores al riesgo en campo durante el mes.

PERIODO EVALUADO	Mayo 2026
POBLACIÓN OBJETO	43 trabajadores operativos
DÍAS LABORADOS EN EL MES	24 días
HORAS HOMBRE TRABAJADAS (HHT)	8.256

INDICADOR ATEL	FORMULA APLICADA	RESULTADO MES	META	ESTADO
Frecuencia de Accidentes	$\frac{0\ AT}{8256 HHT} \times 240000$	0,00	$< 2{,}0$	EXITOSO
Severidad de Accidentes	$\frac{0\ días}{8256 HHT} \times 240000$	0,00	$< 10{,}0$	EXITOSO
Mortalidad Laboral	$\frac{0\ AT\ Mortales}{43\ Trabaj} \times 100$	0,0%	0,0%	EXITOSO
Incidencia Enf. Laboral	$\frac{0\ casos\ nuevos}{43\ Trabaj} \times 100000$	0,00	0,00	EXITOSO
Prevalencia Enf. Laboral	$\frac{0\ casos\ prev}{43\ Trabaj} \times 100000$	0,00	0,00	EXITOSO
Tasa de Ausentismo	$\frac{0\ días\ perdidos}{24\ días\ programados} \times 100$	0,0%	$< 2{,}0$	EXITOSO

Tabla 7. *Indicadores ATEL*

Durante el periodo evaluado, la obra registró un desempeño sobresaliente con cero (0) Accidentes de Trabajo (AT) y cero (0) días de ausentismo laboral, acumulando un total de 7.488 Horas Hombre Trabajadas (HHT)

seguras. Este comportamiento refleja la efectividad de los controles operativos implementados en campo para tareas críticas como el vaciado de concreto, el uso de herramientas para estampado y la manipulación manual de cargas. La tasa de ausentismo del 0% demuestra, además, un alto compromiso del personal con el autocuidado y condiciones óptimas de salud ocupacional.

7.4. Señalización frentes de obra y sitios temporales

En el periodo del 1 al 30 de mayo se mantuvo señalizado en área de trabajo en los frentes de obra, se capacito al personal en temas relacionados con la seguridad vial, con el fin de evitar accidentes con la comunidad que circula normalmente por estos tramos.

A través del siguiente registro fotográfico se puede evidenciar la señalización.



8. CAPACITACIONES, INDUCCIONES Y CHARLAS

8.1. Inducciones

Concientizar el trabajador, será la estrategia para que este se comprometa con el cumplimiento de las metas propuestas por el CONSORCIO PEATONES CEL, a través de la disposición de sus conocimientos, talento, habilidades y entusiasmo. Actividades relacionadas con la formación de seguridad laboral, capacitaciones, adecuación del puesto de trabajo, fortalecimiento de la comunicación interna y desarrollo de valores.

El CONSORCIO PEATONES CEL en el periodo reportado ha realizado actividades encaminadas a la prevención y protección de la salud y la seguridad de todo el personal que labora en el proyecto, con el fin de generar una cultura de autocuidado y mantener unos índices de accidentalidad acorde con las metas planteada en nuestros objetivos. Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de mayo de 2026, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

INDUCCIÓN	
FECHA	**NÚMERO DE PARTICIPANTES**
06-05-2026	2
11-05-2026	7

Tabla 8. *Registro a Inducción de Personal*

En el Anexo 3 (Soporte de inducciones) y el Anexo 4 (Encuesta de perfil sociodemográfico), se adjuntan las evidencias de las inducciones realizadas al personal.

Esta actividad se realizó previo al ingreso de los trabajadores y tuvo como finalidad dar a conocer al personal las políticas, normas, reglamentos y procedimiento que deben ser aplicados en el proyecto, además del cumplimiento legal que deben tener tanto el consorcio como los trabajadores.

Durante la inducción también se le comunica al trabajador sus derechos y deberes, riesgos por cargo, medidas preventivas que debe tener en cuenta según el oficio que vaya a desempeñar.

8.2. Capacitaciones y charlas

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de mayo de 2026, se realizaron sesiones de capacitación (Anexo 2) y charlas diarias (Anexo 3) en diferentes temas de interés en seguridad y salud en el trabajo, estas actividades tienen como objetivo formar y capacitar al personal respecto a las medidas preventivas y de identificación de riesgos y peligros que deben aplicar en su puesto de trabajo y dentro de su ambiente laboral.

CAPACITACIONES		
FECHA	**TEMA**	**PARTICIPANTES**
08-05-2026	Seguridad química en acabados de concreto	36
15-05-2026	Ergonomía y mecánica corporal	43
22-05-2026	Operación segura de equipos y herramientas	43
29-05-2026	Plan de señalización y riesgo público	43

Tabla 9. *Registro Capacitaciones a Personal*

CHARLAS DIARIAS			
FECHA	**TEMA**	**TIEMPO**	**PARTICIPANTES**
02-05-2026	Riesgo ergonómico (posturas)	10min	36
04-05-2026	Riesgos de lesiones lumbares	10min	34
05-05-2026	Uso de herramientas manuales	10min	34
06-05-2026	Señalización en obra	15min	36
07-05-2026	Atrapamiento y golpes en manos	10min	36

08-05-2026	Seguridad química	5min	36
09-05-2026	Cuidado de la piel	10min	36
11-05-2026	Posturas ergonómicas	10min	43
12-05-2026	Protección respiratoria	10min	43
13-05-2026	Orden y limpieza	10min	43
14-05-2026	Hidratación y protección	15min	43
15-05-2026	Elementos de protección personal	10min	43
16-05-2026	Peligro oculto del desmoldante químico	10min	43
19-05-2026	Uso correcto de llanas	15min	43
20-05-2026	Peligros de polvo del mineral rojo	15min	43
21-05-2026	Posturas al nivelar	10min	43
22-05-2026	Operación segura de mezcladora	10min	43
23-05-2026	Orden y limpieza de escombros	10min	43
25-05-2026	Manejo de seguro de moldes de estampado	10min	43
26-05-2026	Peligro de carretillas sobrecargadas	10min	43
27-05-2026	Ruido y vibración en el corte de dilataciones	10min	43
28-05-2026	Hidratación y golpe de calor	10min	43

Tabla 10. *Registro Charlas Diarias a Personal*

9. MAQUINARIA Y EQUIPOS

9.1. Relación maquinaria, herramientas y equipos

La maquinaria, las herramientas y equipos menores son máquinas y equipos que sirven de apoyo o implementación en las actividades constructivas y son de soporte los cuales pueden variar de tamaños y capacidades.

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
MINICARGADOR	1
VIBRO COMPACTADOR	1
MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS	2
VIBRADOR DE CONCRETO	2
CORTADORA DE MANO PARA PAVIMENTO	1
ESTACIÓN TOTAL DE MARCA Hi-Target REFERENCIA: HTS-420 R	1
TRIPODE	1
BASTON	2
PRISMA	2
RADIO DE COMUNICACION	2

CINTA MEDICION	2
HERRAMIENTAS MENORES ADICIONALES	
PLANTA ELÉCTRICA	1
MOTOBOMBA DIESEL 3”	1
MOTOSIERRA	1

Tabla 11. *Relación maquinaria y equipo menor*

9.2. Inspecciones a instalaciones de maquinaria y equipos

Mediante inspecciones en campo se verifica el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en las diferentes actividades que se encuentran en ejecución y se realiza retroalimentación al personal respecto a las oportunidades de mejora y acciones correctivas que deben aplicarse para la prevención y atención de accidentes.

TIPO DE INSPECCIÓN	ANEXO
Preoperacional de Mezcladora	Anexo 7
Preoperacional de Vibrador de concreto	Anexo 8
Preoperacional de Cortadora de mano de pavimento	Anexo 9
Preoperacional de Planta Eléctrica	Anexo 10
Preoperacional de Minicargador	Anexo 11
Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	Anexo 12
Permiso de Trabajo en Caliente	Anexo 13
Botiquín y camilla	Anexo 14
Extintores	Anexo 15

Tabla 12. *Relación inspecciones realizadas*

10. ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del plan de seguridad y salud en el trabajo, el cual abarca la evaluación completa de los riesgos, presentes en obra a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, de igual forma exigir el uso adecuado de los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son esenciales para el control de los riesgos laborales.

10.1. Cumplimiento de la Entrega de Dotación

En estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y la Ley 70 de 1988, el CONSORCIO PEATONCES CEL garantiza el suministro gratuito de un par de zapatos de labor y un vestido de labor (camisa y pantalón) adaptados a las condiciones climáticas y operativas de la región.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de mayo de 2026, se ejecutó la gestión de dotación bajo los siguientes parámetros:

- **PERSONAL NUEVO INGRESO:** Se suministró de forma inmediata la dotación correspondiente al 100% de los nueve (09) ayudantes de obra ingresados el 06 de mayo y el 11 de mayo de 2026 (ver Tabla 4), asegurando su inserción segura a las actividades de obra civil.
- **PERSONAL ANTIGUO ACTIVO**: Se verificó el estado de las prendas del personal operativo remanente.
- **REGISTRO DE CONTROL:** Las firmas de recibido y las tallas asignadas quedaron debidamente asentadas de forma explícita en los formatos individuales de control de entrega de dotación, adjuntos en el Anexo 16.

10.2. Suministro y reposición de Elementos de Protección Personal (EPP)

Los elementos de protección personal se administran como barrera de control final frente a los riesgos evaluados en la matriz general del proyecto, bajo los lineamientos de la Resolución 2400 de 1979.

ENTREGA INICIAL Y REPOSICIÓN: Durante el mes de mayo de 2026, se realizó reposición al personal con guantes de carnaza, protección auditiva de inserción y lentes de protección con filtro UV para radiación solar. (Anexo 17).

INSPECCIÓN Y RETIRO: Conforme al Anexo 14, se realizaron inspecciones semanales de EPP's en campo. Aquellos elementos que presentaron desgaste crítico por la manipulación de herramientas de estampado y mezclas de concreto 3000 PSI fueron sustituidos de inmediato. El personal que omitió el uso de sus EPP's fue retirado temporalmente de los frentes hasta subsanar la novedad, mitigando la ocurrencia de Accidentes de Trabajo (AT).

11. ANEXOS

Anexo 1. Planilla Seguridad Social
Anexo 2. Afiliaciones de personal nuevo
Anexo 3. Soporte inducciones
Anexo 4. Encuesta Perfil Sociodemógrafico

Anexo 5. Soportes Capacitaciones
Anexo 6. Soportes Charlas Diarias
Anexo 7. Preoperacional de Mezcladora
Anexo 8. Preoperacional de Vibrador de concreto
Anexo 9. Preoperacional de Cortadora de mano de pavimento
Anexo 10. Preoperacional de Planta Eléctrica
Anexo 11. Preoperacional de Minicargardor
Anexo 12. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
Anexo 13. Permiso de Trabajo en Caliente
Anexo 14. Inspección de Botiquín y camilla
Anexo 15. Inspección Extintores
Anexo 16. Reposición de EPP's
Anexo 17. Inspección de EPP's



ARLEY LEONOR DUARTE AMAYA
Licencia profesional con Resolución No. 0719

Anexo 1. Planilla Seguridad Social

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	902007682-7	CONSORCIO PEATONALES CEL	CL 10 6 37 BRR CENTRO	3212523397	contabilidadccacosta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		AMAZONAS	LETICIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86822478	29/05/2026	29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$53,759,452	$10.826.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	216.000	0		0		0	7	1.100	0	217.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	195.800	0		0		0	7	1.000	0	196.800	9
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	175.500	0		0		0	7	900	0	176.400	15
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	11.700	0		0		0	7	100	0	11.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	760.200	0	0	0	0	7	3.900	0	764.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.570.200	0	0	0	0	7	17.900	0	3.588.100	12
231001	Colfondos	800227940-6	1.120.800	0	0	0	0	7	5.700	0	1.126.500	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.082.300	0	0	0	0	7	15.500	0	3.097.800	11

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.030.500				1.030.500	7	5.200	1.035.700			10.305	1.035.700	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	609.300	7	3.100	612.400	29

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	599.000	602.100
Pensión	4	8.533.500	8.576.500
Riesgos Laborales	1	1.030.500	1.035.700
CCF	1	609.300	612.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.772.300	10.826.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	902007682-7	CONSORCIO PEATONALES CEL		CL 10 6 37 BRR CENTRO	3212523397	contabilidadccacosta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			AMAZONAS	LETICIA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86822478	29/05/2026	29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$53,759,452	$10.826.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1006731977	DEL AGUILA ROJAS JORGE LUIS	1	0			S																	25-14	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS005	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	5	109.700	CCF65	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
2	CC 1006731977	DEL AGUILA ROJAS JORGE LUIS	1	0			S										L							25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	5	0	CCF65	175.091	3	0	0	0	0	0	0
3	CC 1006733322	ANTONIO PEREIRA CRISPIN	1	0			S																	231001	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
4	CC 1006733322	ANTONIO PEREIRA CRISPIN	1	0			S									X								231001	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
5	CC 1006739912	LEONARDO REVELO HANSEL EDRIEGUER	1	0			S																	230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
6	CC 1006739912	LEONARDO REVELO HANSEL EDRIEGUER	1	0			S									X								230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS005	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
7	CC 1007344470	CAHUACHE HUAHUARI YAISON	1	0			S																	231001	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
8	CC 1007344470	CAHUACHE HUAHUARI YAISON	1	0			S									X								231001	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
9	CC 1007366231	VENTO LORENZO FREDY ANGEL	1	0			S																	230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
10	CC 1007366231	VENTO LORENZO FREDY ANGEL	1	0			S									X								230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
11	CC 1007628288	FERNANDEZ RAMOS WILLY CAMILO	1	0			S																	230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
12	CC 1007628288	FERNANDEZ RAMOS WILLY CAMILO	1	0			S									X								230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
13	CC 1007682555	RAMOS CUELLAR OMAR DIEGO	1	0			S																	25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
14	CC 1007682555	RAMOS CUELLAR OMAR DIEGO	1	0			S									X								25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
15	CC 1007769132	CASTILLO COELLO ROBERTO JOHN	1	0			S																	230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS037	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
16	CC 1007769132	CASTILLO COELLO ROBERTO JOHN	1	0			S									X								230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS037	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
17	CC 1007769189	REVELO DIAZ CRISTIAN DAVID	1	0			S																	25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
18	CC 1007769189	REVELO DIAZ CRISTIAN DAVID	1	0			S									X								25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
19	CC 1016029688	CURICO NARVAEZ YUSBELY JENNYFER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF65	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1118121309	PARRA CAMELO CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	416.667	5	66.700	0	0	0	0	EPS037	416.667	5	16.700	14-11	416.667	5	5	29.100	CCF65	416.667	5	16.700	0	0	0	0	0
21	CC 1118121309	PARRA CAMELO CARLOS ANDRES	1	0			S									X								230301	2.083.334	25	333.400	0	0	0	0	EPS037	2.083.334	25	0	14-11	2.083.334	25	5	0	CCF65	2.083.334	25	0	0	0	0	0	0
22	CC 1121201303	RAMOS VENTO MILTON	1	0			S																	231001	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
23	CC 1121201303	RAMOS VENTO MILTON	1	0			S									X								231001	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
24	CC 1121204626	ALMEIDA FERNANDEZ NILO MIGUEL	1	0			S																	25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
25	CC 1121204626	ALMEIDA FERNANDEZ NILO MIGUEL	1	0			S									X								25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
26	CC 1121205946	RAMOS VENTO DIEGO ANDRES	1	0			S																	231001	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
27	CC 1121205946	RAMOS VENTO DIEGO ANDRES	1	0			S									X								231001	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	902007682-7	CONSORCIO PEATONALES CEL		CL 10 6 37 BRR CENTRO	3212523397	contabilidadccacosta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			AMAZONAS	LETICIA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86822478	29/05/2026	29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$53,759,452	$10.826.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CC 1121208337	CHUÑA MACEDO YANI MARITZA	1	0			S	X																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF65	2.186.803	30	87.500	0	0	0	0	0
29	CC 1121211864	REVELO LEON YOLVER	1	0			S																	230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS037	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
30	CC 1121211864	REVELO LEON YOLVER	1	0			S									X								230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS037	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
31	CC 1007682297	SANGAMA CUELLAR JHON CARLOS	1	0			S																	25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
32	CC 1007682297	SANGAMA CUELLAR JHON CARLOS	1	0			S									X								25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
33	CC 1122296221	YUCUNA YUCUNA ELKIN FABRICIO	1	0			S																	25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
34	CC 1122296221	YUCUNA YUCUNA ELKIN FABRICIO	1	0			S									X								25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
35	CC 1147684486	YANCA ALMEIDA ROBERTH	1	0			S																	25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
36	CC 1147684486	YANCA ALMEIDA ROBERTH	1	0			S									X								25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
37	CC 15875906	DEL AGUILA RAMOS LUIS JORGE	1	0			S																	25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	MIN002	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
38	CC 15875906	DEL AGUILA RAMOS LUIS JORGE	1	0			S									X								25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	MIN002	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
39	CC 15877597	FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO	1	0			S																	230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
40	CC 15877597	FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO	1	0			S									X								230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
41	CC 15877726	PARENTE SANTOS RONI	1	0			S																	230201	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
42	CC 15877726	PARENTE SANTOS RONI	1	0			S									X								230201	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
43	CC 1121200963	GARAY CAYETANO YETUR	1	0			S																	230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS037	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
44	CC 1121200963	GARAY CAYETANO YETUR	1	0			S									X								230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS037	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
45	CC 6565823	CAHUACHI AHUANARY DAVID	1	0			S							X										230301	383.334	5	61.400	0	0	0	0	EPS037	383.334	5	15.400	14-11	383.334	5	5	26.700	CCF65	383.334	5	15.400	0	0	0	0	0
46	CC 6565823	CAHUACHI AHUANARY DAVID	1	0			S									X								230301	1.916.667	25	306.700	0	0	0	0	EPS037	1.916.667	25	0	14-11	1.916.667	25	5	0	CCF65	1.916.667	25	0	0	0	0	0	0
47	CC 6566668	CARIHUASARI CAYETANO LISARDO WILDER	1	0			S																	25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSIC5	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
48	CC 6566668	CARIHUASARI CAYETANO LISARDO WILDER	1	0			S									X								25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSIC5	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
49	CC 6566886	REVELO LEON JORGE	1	0			S																	230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS037	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	5	40.700	CCF65	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
50	CC 6566886	REVELO LEON JORGE	1	0			S									X								230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS037	1.167.270	20	0	14-11	1.167.270	20	5	0	CCF65	1.167.270	20	0	0	0	0	0	0
51	CC 6567562	REVELO LEON JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS037	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	5	40.700	CCF65	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
52	CC 6567562	REVELO LEON JUAN CARLOS	1	0			S									X								25-14	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS037	1.167.270	20	0	14-11	1.167.270	20	5	0	CCF65	1.167.270	20	0	0	0	0	0	0
53	CC 93400332	GONZALEZ HENAO JAIR ANDREY	1	0			S							X										230201	1.600.000	16	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	16	64.000	14-11	1.600.000	16	5	111.400	CCF65	1.600.000	16	64.000	0	0	0	0	0
54	CC 93400332	GONZALEZ HENAO JAIR ANDREY	1	0			S									X								230201	1.400.000	14	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	14	0	14-11	1.400.000	14	5	0	CCF65	1.400.000	14	0	0	0	0	0	0
55	CC 1122269518	RODRIGUEZ PURICHO DIEGO NIXON	1	0			S																	230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS037	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	20.400	CCF65	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
56	CC 1122269518	RODRIGUEZ PURICHO DIEGO NIXON	1	0			S									X								230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS037	1.459.088	25	0	14-11	1.459.088	25	5	0	CCF65	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo 2. Afiliaciones de personal nuevo
